

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL				
Pagina: 1 de 1		DIA		21	MES	12	AÑO	2022
SEMANA N°	25	DEL	15 de diciembre de 2022			AL	21 de diciembre de 2022	
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022		FECHA TERMINO :	3 de marzo de 2023				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN							
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ			NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA			NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO			
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS				
PRELIMINARES	3,662%	3,638%	REDES HIDROSANITARIAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS					
CIMENTOS	0,194%	0,194%						
PISOS-BASES-RELLENOS	0,384%	0,363%						
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,527%	0,527%						
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	2,681%	2,642%						
OBRAS EXTERIORES	25,209%	24,742%	SE CONTINUAN CON ANDENES Y MUROS DE CONEXIÓN					
BM-26 BASES MILITARES	34,530%	34,530%	SE TERMINAN DE INSTALAR MODULARES A EXCEPCION DE ENFERMERIA, Y FALTA DOTACION DE LOS MODULARES, FALTA CUBIERTA DE RANCHO, COMANDO Y BAÑOS					
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	6,833%	6,833%	SE BALANCEO EN MAYOR CANTIDAD POR TRASIEGO DE TODOS LOS MATERIALES					
TOTALES	74,02%	73,47%	Semana Anterior	71,83%				
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO		
	3.525.659.318,55	2.590.239.909,45	935.419.409,10		1,64%	73,47%		
IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA				V.ESTADO DEL TIEMPO				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-					SI ☐ NO ☐
INGENIEROS	1,0	OBRREROS	5,0					
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	11,0					
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO								

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1

DIA

21

MES

12

AÑO

2022

SEMANA N°

25


DEL

15 de diciembre de 2022

AL

21 de diciembre de 2022

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

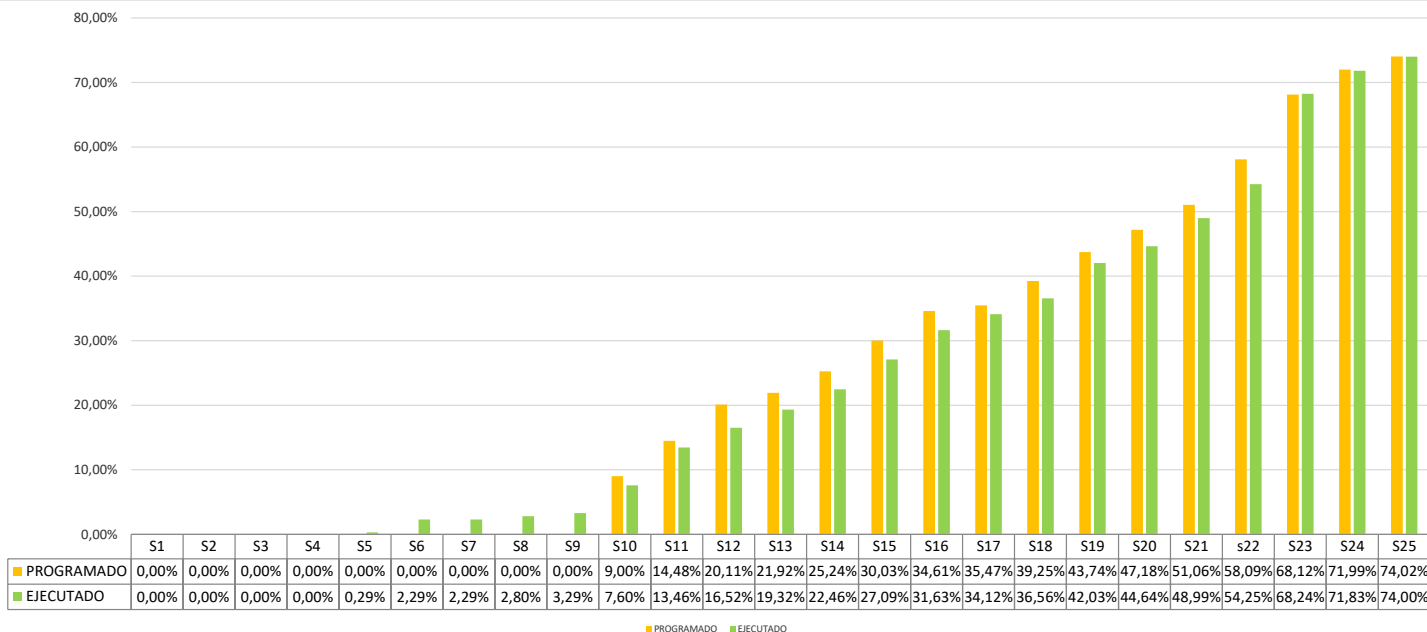

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se Acordo Balance No 2 de Obra de cantidades tomando como referencia la obligacion de allegar a la parte alta de la Montaña todos los materiales para que la Base quede totalmente funcional

Se prorroga el contrato por analisis de tiempos en Transporte vertical de Materiales, problemas de seguridad para el ingreso de vehiculos de carga y por Mivimientos de tierra de forma Manual (por que no se presento el apoyo Aereo para el ingreso de Equipo Mecanico tipo Bobcat) El contratista entrego soportes y la Interventoria Viabilizo

EL contratista continua con el Trasiego de Materiales a la parte alta de la Montaña.

El contratista continua con trabajos de Modulares en campo (instalacion de estructuras, pisos y cubiertas), Se terminan de instalar modulares a excepcion de enfermeria, y falta dotacion de los modulares, falta cubierta de rancho, comando y baños

El contratista Continua con Fundicion de Andenes en concreto

El contratista Continua con Muros de conexión en sitio, **REALIZANDO DE MANERA MANUAL MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA ESTE MURO (esta actividad en adelante se tomara tiempo por la magnitud de movimientos de material de relleno para el Muro) ya se tienen todos los Modulos en Malla Armados en sitio**

Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra

El Contratista continua con trabajo de taller de Muros de Modulares

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 21/12/2022	Página:
SEMANA N°	25 DEL	15 de diciembre de 2022	AL
FECHA INICIO :	1/07/2022	FECHA TERMINO :	3/03/2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE- CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	MUROS CONEXIÓN PERIMETRAL



Fotografía 2

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	MUROS CONEXIÓN PERIMETRAL



Fotografía 3

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	MURO CONEXIÓN INTERNO



Fotografía 4

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	MURO CONEXIÓN INTERNO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 21/12/2022	Página:
SEMANA N°	25 DEL	15 de diciembre de 2022	AL
FECHA INICIO :	1/07/2022	FECHA TERMINO :	3/03/2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE- CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MODULARES	



Fotografía 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MODULARES	



Fotografía 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MODULARES	



Fotografía 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
MODULARES	
