


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL				
Página: 1 de 1		DÍA	8	MES	3	ANO	2023	
SEMANA N°	29	DEL	2 de marzo de 2023		AL	8 de marzo de 2022		
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022		FECHA TERMINO :	7 de junio de 2023				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN							
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ			NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA			NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO				
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO		PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO		ACTIVIDADES		MOTIVOS	
PRELIMINARES	3,6615%		3,6591%		REDES HIDROSANITARIAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS			
CIMIENTOS	0,1938%		0,1938%					
INS. SANITARIAS Y PTAR	0,5216%		0,5046%		TUBERIA SANITARIA, DE ALCANTARILLADO, CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y CAJAS DE VALVULAS			
PISOS-BASES-RELLENOS	0,3842%		0,3842%					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,6868%		0,6868%					
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	4,8436%		4,8436%		TUBERIA HIDRAULICA, ACOMETIDA DESDE BOCATOMA HASTA PTAP, REDES INTERNAS			
OBRAS EXTERIORES	26,0599%		26,0224%		SE CONTINUAN CON MUROS DE CONEXIÓN, CUNETAS Y REMATES EN ANDENES			
NO PREVISTOS	9,0779%		9,0779%		SE BALANCEO EN MAYOR CANTIDAD POR TRASIEGO DE TODOS LOS MATERIALES			
BM-26 BASES MILITARES	37,5774%		37,3117%		SE TERMINAN DE INSTALAR MODULARES A EXCEPCION DE ENFERMERIA, Y FALTA DOTACION DE LOS MODULARES, FALTA			
TOTALES	83,01%		82,68%		Semana Anterior		79,50%	
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO	
	3.525.659.318,55	2.915.163.941,84	610.495.376,71			3,18%	82,68%	
IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA				V.ESTADO DEL TIEMPO				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS SI ☐ NO ☒
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-					
INGENIEROS	1,0	OBREROS	5,0					
TOPOGRAFO	-	AYUDANTES	11,0					
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO								

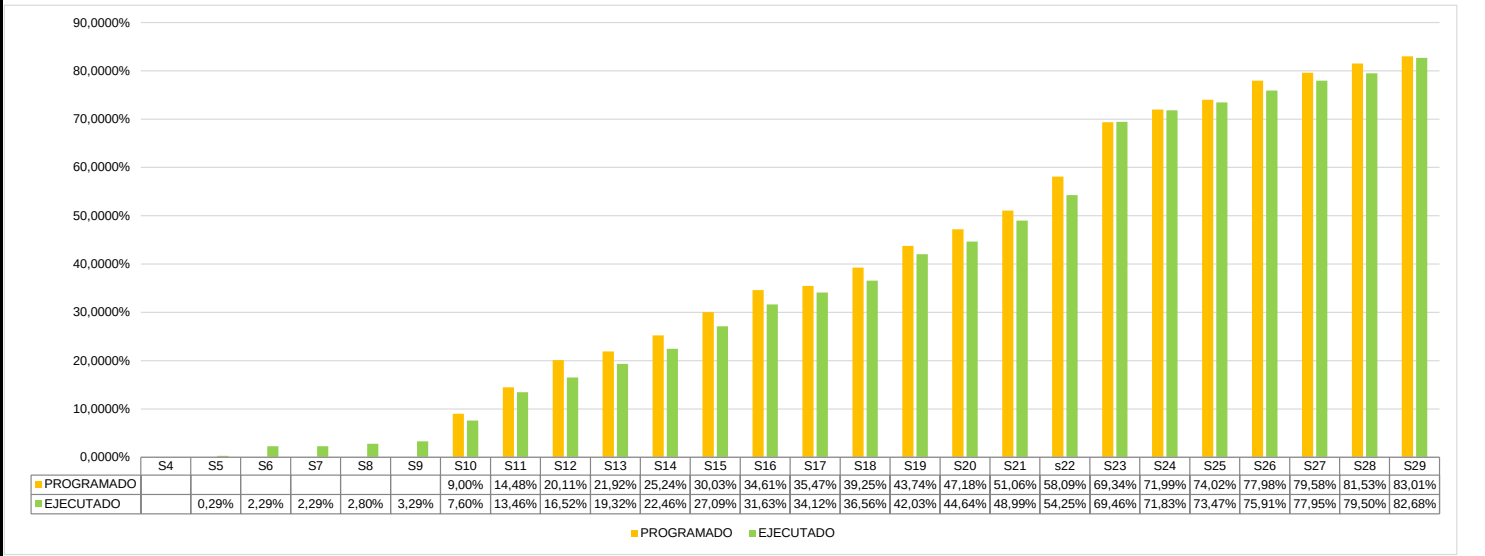

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista Termina acometida desde Bocatoma Hasta la Base entrada a la PTAP

El contratista Continúa con construccion de cunetas en concreto reforzado

El contratista Continúa con construccion Andenes pendientes

El contratista inicia con cajas de aguas negras y Cajas para valvulas

El contratista inicia con relleno de tubería Hidrosanitaria

El contratista instala acometidas Hidrosanitarias dentro de la Base

El contratista inicia con Cribado y Pozo de Infiltracion

El contratista manifiesta que se han presentado problemas para el ingreso en los vehiculos de carga desde el centro del pais tomando tiempos hasta una semana en llegar a Argelia Cauca; esto incrementa costos y a futuro se pueden presentar intermitencias en el ingreso de materiales a Obra

Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra

El Contratista continua con trabajo de taller de Materiales pendientes



FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR



Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 08/03/2023	Página:
SEMANA N°	29 DEL	2 de marzo de 2023	AL
FECHA INICIO :	1/07/2022	FECHA TERMINO :	7/06/2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 3



Fotografía 4



UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	CAJAS DE INSPECCION PARA ALCATARILLADO



Fotografía 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	REGISTROS RED WHITE

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL



Fotografía 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	TUBERIA NOVAFORT Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 08/03/2023	Página:
SEMANA N°	29 DEL	2 de marzo de 2023	AL
FECHA INICIO :	1/07/2022	FECHA TERMINO :	7/06/2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE- CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	TANQUES DE 10.000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE



Fotografía 8

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	ESTADO BASE



Fotografía 9

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	MUROS CONEXIÓN INTERNOS
