

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**NIT 901537748****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00556****Fecha de Pago: 27-12-2023****Estado: PAGADO**Usuario Pago:
LUSME
545**PAGADO A:**

ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. : SSTI20

PGNOR

Vir Bruto: 130,670,428.00 **Vir Deducc.:** 20,645,927.00 **Vir Amortiz.:**0.00 **Valor Neto:** 110,024,501.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	334-000007-08	1757631	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEG	\$110,024,501.00
Total:				\$110,024,501.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$130,670,428	\$1,045,363	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$130,670,428	\$2,613,409
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$130,670,428	\$5,226,817	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	\$130,670,428	\$653,352
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$130,670,428	\$1,960,056	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	\$130,670,428	\$6,533,521
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	\$130,670,428	\$2,813,409				

TOTAL Deducibles:**\$20,645,927.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERALLEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LUSME

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-545

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

27/12/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: OTRO SÍ N° 1 IF

PAGADO A: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Doc. Ref. : SSTI20

Vir Bruto: 130,670,428.00

Vir Deducc.: 20,645,927.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 110,024,501.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
418	424	01	01	2.4.5.02.05.09.12:CI-005-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE PE	\$50,063,379.00
243	260	01	01	2.4.5.02.05.09.12:CI-005-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE PE	\$80,607,049.00

TOTAL: \$130,670,428.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$130,670,428	\$1,045,363	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$130,670,428	\$2,613,409
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	\$130,670,428	\$5,226,817	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	\$130,670,428	\$653,352
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$130,670,428	\$1,960,056	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	\$130,670,428	\$6,533,521
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	\$130,670,428	\$2,613,409				

TOTAL Deducibles:

\$20,645,927.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERALLEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA



ASESORIA Y SERVICIOS SST
 NIT 900.988.730-3
 Cr 19 Cl 3 69
 Tel: 3104157490
 El Peñol - Colombia
 sst.integral@gmail.com



Factura electronica de venta
 N° SSTI 20

señores	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL		
LIENDRE	901.537.748-4	Teléfono	(604) 3104491096
Dirección	CR 18 02 91	ciudad	El Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	18/12/2023, 19:45
expedición	18/12/2023, 19:45
Vencimiento	18/12/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Carga
1	Mantenimiento y Adecuación de la Institución Educativa Rural Palmira del Municipio de El Peñol	1.00	102.086.272,00	0 %
2	Administración y utilidad (AU)	1.00	28.584.156,00	0 %

Total de artículos: 2

Valor en Letras:

Ciento treinta millones seiscientos setenta mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de pago:

transferencia

ps 130.670.428,00

Total Bruto	130.670.428,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	130.670.428,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764061629331 aprobado en 20231210 prefijo SSTI desde el número 4 al 2000**

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: dff38e7bd9706148ccfa0bae719f9c0ace429a82b7a09059115c2aa6f1fbdaced4c923d6bc69defee7a4cb43650774c4



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FINALIP009
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 334000000708

Fecha: 28-12-2023
Fecha de Generación: 28-12-2023

Hora: 08:00:49
Fecha de envío del pago: 27-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2023

Impreso por: AUTONOMA21

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$110,024,501.00	Valor Registros Procesados: \$110,024,501.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

33426281177	Ahorros	900988730	ASESORIAS Y SERVIC	110,024,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2023
-------------	---------	-----------	--------------------	----------------	-------------	--	------------

**INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP**

Versión: 1
Fecha: 20/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA

Contratista:	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S
Contrato número:	IP-009-2023
Objeto del contrato:	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA
Valor inicial del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$229.370.800)
Plazo inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
Acta de Inicio	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación Inicial	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	<ul style="list-style-type: none"> ADICIÓN DE CINCUENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$50.063.379)
Valor actual de contrato:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (\$279.434.179)
Fecha de terminación actual:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
Supervisor:	JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO - Representante Legal

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato IP-009-2023 del 11 de agosto de 2023, y desempeñó el objeto contractual a cabalidad.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DEL ITEM RECIBIDO	FECHA DEL RECIBIDO	EVIDENCIAS O SOPORTES
ACTA N°2 Y FINAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.	N/A	05/12/2023	En informe anexo

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 2.4.5.02.05.09.12
	Suma

**INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP**

Versión: 1
Fecha: 20/12/2021

Valor inicial del contrato	\$229.370.800
Valor Adición 1	\$50.063.379
Valor Adición 2	\$0
Valor Adición total	\$50.063.379
Valor Total del Contrato	\$279.434.179
Valor Ejecutado	\$279.434.179
Valor Pagado a la fecha	\$148.763.751
Valor que se autoriza pagar	\$130.670.428
Valor Saldo por Ejecutar	\$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:		
Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Número de factura: SSTI-18 Pago N° 1 Concepto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	#Egreso: 2023-00438 Fecha de Egreso: 26/10/2023	\$148.763.751
Total		\$148.763.751

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la seguridad social de diciembre de 2023, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales indicando estar al día en el pago, Certificación Bancaria y factura.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
SSTI-20	\$130.670.428	18/12/2023	ACTA N°2 Y FINAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES


JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO, actuando en calidad de supervisor del contrato IP-009-2023, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 26/12/2023, que luego de revisar la factura SSTI-20, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el

**INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP**

Versión: 1
Fecha: 20/12/2021

producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día veintiseis (26) de diciembre de 2023.


JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Supervisor del Contrato

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a list or series of notes.

El Peñol, 06 de diciembre de 2023.

OP-64-2023

Señores:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA
Nit: 811.021.952-9
VEREDA PALMIRA

Asunto: Acta de entrega final y recepción física de las obras de adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa Rural Palmira.

Referencia: Contrato Interadministrativo N° CI 005 DE 2023 entre el Municipio de El Peñol y la Empresa Autónoma del Municipio de El Peñol "EAP" cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN QUE TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE PEÑOL, ANTIOQUIA".

1.LUGAR, FECHA Y HORA

En el Municipio de El Peñol, Antioquia, en la vereda Palmira siendo las 10:00 a.m., del día jueves treinta (30) de noviembre del 2023, se participa en el acto de entrega final y recepción física de las obras de mantenimiento y adecuación del contrato en referencia. Nos reunimos los abajo firmantes en las instalaciones de la Institución Educativa rural Palmira con el fin de hacer entrega de todos los trabajos realizados en el marco del contrato.

2.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

Las obras de mantenimiento que se entregan en el acta final y quedan plasmados en el presente documentos son los siguientes:

- Canoas de aguas lluvias en cubiertas con su respectiva reposición de bajantes y sin filtraciones.
- Mantenimiento de cubiertas evitando el ingreso de goteras al interior de las aulas de clases.
- Cubiertas en tejas con material UPVC en buen estado y bien ancladas tanto a la estructura en madera como metálica.
- Pintura con resanes tanto en muros interiores como exteriores en buen estado y libre de suciedad y humedad.
- Bajantes de aguas lluvias en buen estado, funcionales y sin filtraciones.
- Pintura base de aceite de puertas, ventanas y zócalos en buen estado y sin suciedad.
- Chapas de puertas en buen estado.
- Luminarias bien instaladas y funcionales.



- Salidas eléctricas (tomas de corriente e interruptores nuevos), en buen estado y funcionales.
- Cielos falsos bien instalados sin dilataciones, humedad o desprendimientos.
- Enchapes de pisos nuevos, sin dilataciones, en buen estado, nivelados y unidades de cerámica bien fijas al mortero libres de suciedad.
- Puertas metálicas nuevas con chapas funcionales bien instaladas y en buen estado.

3. FICHA TECNICA EJECUTADA:

CONTRACTUAL CON ADOPCION DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI N°1 Y MODIFICATORIO N°2						ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL	
IT EM	ACTIVIDAD	UNI DAD	CANTI DAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTI DAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.TOT AL
1	Desmante de cubierta en teja de barro.	m2	320,00	\$ 21.010	\$ 6.723.200	313,60	\$ 6.588.736	0,00	\$ 0
2	Desmante de cubierta en teja traslucida. incluye cargue, transporte hasta sitio final.	m2	100,00	\$ 14.057	\$ 1.405.700	72,47	\$ 1.018.711	0,00	\$ 0
3	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura en madera. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	320,00	\$ 143.465	\$ 45.908.800	313,60	\$ 44.990.624	0,00	\$ 0
4	Suministro, transporte e instalación de caballete UPVC. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	32,00	\$ 142.071	\$ 4.546.272	32,00	\$ 4.546.272	0,00	\$ 0
5	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura metálica. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	100,00	\$ 143.465	\$ 14.346.500	84,84	\$ 12.171.571	0,00	\$ 0



6	Mantenimiento de estructura en madera para cubierta.	m2	320,00	\$ 7.655	\$ 2.449.600	313,60	\$ 2.400.608	0,00	\$ 0
7	Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.	m2	80,00	\$ 12.092	\$ 967.360	72,47	\$ 876.307	0,00	\$ 0
8	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar manos de pintura anticorrosiva, manos de esmalte base aceite mate, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	500,00	\$ 21.252	\$ 10.626.000	300,00	\$ 6.375.600	0,00	\$ 0
9	Suministro, transporte y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	ml	85,00	\$ 91.364	\$ 7.765.940	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0



10	Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogéneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para la colocación de tuberías de aguas lluvias	m3	20,00	\$ 56.288	\$ 1.125.760	20,00	\$ 1.125.760	0,00	\$ 0
11	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o Re ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	60,00	\$ 61.046	\$ 3.662.765	60,00	\$ 3.662.765	80,00	\$ 4.883.687
12	Demolición de estructuras (pisos y Concreto reforzado. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2	400,00	\$ 45.044	\$ 18.017.600	163,00	\$ 7.342.172	0,00	\$ 0
13	Suministro, transporte e instalación de piso tipo cantera. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	m2	400,00	\$ 154.126	\$ 61.650.440	163,00	\$ 25.122.554	0,00	\$ 0
OE	OBRAS EXTRAS								



OE .1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para piso aulas y de unidad sanitaria de un espesor de 10 cm. Incluye malla electrosoldada de .15".15 mts, transporte de todos los materiales, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2		\$ 107.459		0,00	\$ 0	163,00	\$ 17.515.817
OE .2	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a base de agua para muros exteriores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		\$ 27.060		0,00	\$ 0	325,00	\$ 8.794.500
OE .3	Suministro y aplicación de pintura viniltex a base de agua para muros interiores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		\$ 25.087		0,00	\$ 0	668,90	\$ 16.780.694





MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

OE .4	Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para puertas rejas y ventanas.	m2		\$ 40.078		0,00	\$ 0	136,25	\$ 5.460.524
OE .5	Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para zócalos.	m2		\$ 34.906		0,00	\$ 0	58,99	\$ 2.059.105
OE .6	Demolición de estructuras (concreto mortero de losa. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2		\$ 44.294		0,00	\$ 0	155,90	\$ 6.905.435
OE .7	Desmonte y retiro de estructura Casetones en madera Incluye, lavado del concreto con hidrolavadora, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2		\$ 42.094		0,00	\$ 0	155,90	\$ 6.562.455



OE .8	Suministro transporte e instalación de drywall, incluye placa de yeso rf 1/2, masillado, dilatación perimetral en z perfilaria de aluminio para soportes chazos, cintas, ángulos, cortes y andamios.	m2		\$ 90.090		0,00	\$ 0	207,17	\$ 18.663.945
OE .9	Reparación de salidas red eléctrica iluminación, incluye lámparas ojos de buey led redondas cable dúplex, todo lo necesario para su correcta instalación.	un		\$ 115.008		0,00	\$ 0	17,00	\$ 1.955.136
OE .10	Reparación de salidas red eléctrica tomas y suiches, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	un		\$ 115.008		0,00	\$ 0	24,00	\$ 2.760.192
OE .11	Suministro, transporte e instalación de puertas metálicas de .75x180, ala y marco calibre 22, Incluye chapa, anticorrosivo y pintura a base aceite.	un		\$ 808.364		0,00	\$ 0	3,00	\$ 2.425.092
OE .12	Suministro, transporte y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. con tapa ruana y pestaña interna. Incluye embudo galvanizado calibre 16, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	ml		\$ 86.114		0,00	\$ 0	85,00	\$ 7.319.690




COSTO DIRECTO OBRA		\$	179.195.937	\$	116.221.680	\$	102.086.272		
ADMINISTRACIÓN	23,00%	\$	41.215.066	\$	26.730.986	\$	23.479.843		
UTILIDAD	5,00%	\$	8.959.797	\$	5.811.084	\$	5.104.314		
COSTO TOTAL OBRA		\$	229.370.800	\$	148.763.751	\$	130.670.428		
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS		\$	13.670.844	\$	8.872.378	\$	7.777.237		
TOTAL	CONTRAC TUAL	\$	243.041.644	ACTA N°1	\$	157.636.129	ACTA N°2 Y FINAL	\$	138.447.665

4. NOTAS IMPORTANTES: Es importante resaltar que las obras ya terminadas se entregan en buen estado, funcionales y son revisadas por todas las partes durante el recorrido final y serán responsabilidad de la Institución Educativa las reparaciones locativas que resulten necesarias por el deterioro generado o daños ocasionados por las actividades educativas a partir del día del acta de entrega.

Dicha entrega se realiza para que se puedan seguir operando los procesos Educativos en la Institución Educativa Rural Palmira.

Para constancia firman las siguientes personas:

Cargo	Nombre	Firma
Representante legal Empresa Autónoma de El Peñol "EAP" (Contratista)	JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO	
Secretaria de Educación, Cultura y Juventud (Ordenadora del gasto)	GLADIS EMILSE ATEHORTUA USME	
Rector (a) Institución Educativa Rural Palmira	ELVIA ROSA RESTREPO RESTREPO	
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura (Supervisor)	KARY YULIANA MORALES RIOS	
Apoyo a la Supervisión Obras Publicas e Infraestructura	MATEO STIVEN OSSA CORREA	
Apoyo a la Supervisión Empresa Autónoma de El Peñol "EAP"	BRAHIAN GOMEZ VALLEJO	
Contratista Asesorías y Servicios SST INTEGRAL S.A.S	KATHERINE VELEZ GALLEG0	



El Peñol, 05 de diciembre de 2023

Señores:
Empresa Autónoma De El Peñol
El Peñol

REFERENCIA: Presentación acta No.2 y final del contrato de obra No IP-009-2023 del Once (11) de agosto de 2023.

Cordial Saludo,


En atención a la referencia, muy comedidamente estamos presentando acta No. 2 y final del contrato de obra No IP-009-2023 del once (11) de agosto de 2023. El cual tiene por objeto, **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"**.

Así mismo estamos entregando los siguientes documentos:

- Certificado de paz y salvo en seguridad social
- Parafiscales
- Memorias de cálculos
- Factura.
- Pólizas actualizadas

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,



KATHERINE VELEZ GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



El Párrafo 13 de agosto de 2023

Señores
Ejército Armado de El Párrafo
El Párrafo

REFERENCIA: Transmisión de la propiedad de los bienes de la
Asociación (1) de agosto de 2023

Caros señores,

En primer lugar, le saludo muy cordialmente. Le informo que en el día 13 de agosto de 2023, el Comité de la Asociación de la Institución Educativa Rural Palmar del Municipio de El Párrafo, Antioquia,

si me permito, le informo que los siguientes documentos:

- Documento de paz y amor en segunda copia
- Escrituras
- Escrituras de compra y venta
- Escrituras
- Planos de terreno

se encuentran en estado de conservación

Atentamente,

KATHERINE E. EL PÁRRAFO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ACTA N°. 2 Y FINAL

**CONTRATO DE OBRA NO IP-009-2023 DEL ONCE (11) DE
AGOSTO DE 2023.**

**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL
PEÑOL ANTIOQUIA".**



ASESORÍAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S

INFORMACION GENERAL

NUMERO DE CONTRATO: IP-009-2023 del once (11) de agosto de 2023

OBJETO: "Mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa rural palmira del Municipio de El Peñol Antioquia".

VALOR INICIAL: \$ 229.370.800

OTOR SI N0:1 \$ 50.063.379

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 279.434.179,00

FECHA DE INICIO: 17 de agosto de 2023

PLAZO: 134 días calendario

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2023

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN: 100%

% DE AVANCE EN TIEMPO: 75,3%


La Alcaldía realizo mediante contrato interadministrativo 2023-CI-005 firmado con el municipio de El Peñol y la Empresa autónoma de El Peñol y está el contrato IP - 009-2023 con la empresa Asesorías y servicios SST integral S.A.S; para la ejecución del "Mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa rural palmira del Municipio de El Peñol Antioquia "

La supervisión del proyecto estará a cargo del Municipio de El Peñol secretaria de obras públicas y la Empresa autónoma de El Peñol.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la vereda palmira del Municipio de El Peñol.





INFORMACION GENERAL

NUMERO DE CONTRATO: P-002-2023 del Oficio 111) de agosto de 2023

OBJETO: Mantenimiento y adecuación de la institución Educativa rural escuela del Municipio de El Peral

VALOR INICIAL: \$ 2.275.000,00

OTROS \$: \$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 2.275.000,00

FECHA DE INICIO: 1 de agosto de 2023

PLAZO: 104 días calendario

FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2023

% DE AVANCE DE EJECUCION: 100%


% DE AVANCE EN TIEMPO: 100%

La Asesoría realizó mediante contrato administrativo 2023-01-002 firmado con el Municipio de El Peral y la Empresa Asesora y Asesoría S.A.S. para la ejecución del mantenimiento y adecuación de la institución Educativa rural escuela del Municipio de El Peral.

La asesoría valoró el proyecto sobre el estado del Municipio de El Peral respecto de la ejecución y la empresa Asesora y Asesoría S.A.S.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la vereda parí del Municipio de El Peral.



PERSONAL EN OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	OCUPACION
Héctor Fabian Marín Salazar	Maestro de obra
Carlos David Ríos Hincapié	ayudante
Juan David Acevedo Henao	ayudante
Julián esteban Marín Acevedo	oficial

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Pólizas Iniciales

COMPañÍA DE SEGUROS:		MUNDIAL DE SEGUROS	
No: DE POLIZAS:		100045760 RCE -100206556CUM	
FECHA DE EXPEDICIÓN:		15/08/2023	15/08/2023
GARANTÍAS OTORGADAS			
1: CUMPLIMIENTO	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 45.874.160,00	11/08/2023	08/05/2024
2: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 22.937.080,00	11/08/2023	08/01/2027
3: ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 22.937.080,00	08/01/2024	08/01/2027
4: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 232.000.000,00	11/08/2023	08/01/2024

Pólizas Actualizadas

COMPañÍA DE SEGUROS:		MUNDIAL DE SEGUROS	
No: DE POLIZAS:		100206556 RCE -100201475 CUM	
FECHA DE EXPEDICIÓN:		09/11/2023	15/08/2023
GARANTÍAS OTORGADAS			
1: CUMPLIMIENTO	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 55,886.835,80	09/11/2023	08/05/2024
2: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 27,943.417,90	09/11/2023	08/01/2027

3: ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 27,943.417,90	08/01/2024	08/01/2027
4: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	\$ 232.000.000,00	11/08/2023	08/01/2024

CONTROL DOCUMENTAL:

Otro SI N1: 09 de noviembre de 2023

ASPECTOS FINANCIEROS:

ACTA N0:	VALOR A CANCELAR	V. TOTAL EJECUTADO ACTA 2 Y FINAL	VALOR TOTAL ACUMULADO	SALDO A LIBERAR
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 229.370.800		
OTOR SI No: 1		\$ 50.063.379		
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 279.434.179,00		
ACTA N0: 1	\$ 229.370.800	\$ 148.763.751	\$ 148.763.751	\$ 80.607.049
ACTA 2 Y FINAL	\$ 279.434.179	\$ 130.670.428	\$ 279.434.179	\$ 0

HERRAMIENTAS EN OBRA:

Pulidoras
Trozadora
Taladros Demoledores
Soldador
Concretadora
Radial
Rotomartillo
Herramienta menor

MATERIALES EN OBRA:

Placas de Drywal
Cemento
Perfilería metálica
canoas
Tubería pvc
Pintura



3. ESTABILIDAD DE LAS	Valor Asignado	00001000	00001000
4. RESPONSABILIDAD	Valor Asignado	00001000	00001000
5. CIVIL	Valor Asignado	00001000	00001000
EXTRAORDINARIO	Valor Asignado	00001000	00001000
POR GANOS A TRABAJOS	Valor Asignado	00001000	00001000

CONTROL DOCUMENTAL

00001000 de noviembre de 2000

ASPECTOS FINANCIEROS

ACTA NO.	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
1. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
2. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
3. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
4. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
5. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
6. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
7. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
8. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
9. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000
10. GANANCIAS	00001000	00001000	00001000

HERRAMIENTAS EN OBRA

- 1. HERRAMIENTAS
- 2. HERRAMIENTAS
- 3. HERRAMIENTAS
- 4. HERRAMIENTAS
- 5. HERRAMIENTAS
- 6. HERRAMIENTAS
- 7. HERRAMIENTAS
- 8. HERRAMIENTAS
- 9. HERRAMIENTAS
- 10. HERRAMIENTAS

MATERIALES EN OBRA

- 1. MATERIALES
- 2. MATERIALES
- 3. MATERIALES
- 4. MATERIALES
- 5. MATERIALES
- 6. MATERIALES
- 7. MATERIALES
- 8. MATERIALES
- 9. MATERIALES
- 10. MATERIALES

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLADAS

OE1: Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm² o 3000 PSI) para piso aulas y de unidad sanitaria de un espesor de 10 cm. Incluye malla electrosoldada de .15*.15 mts, transporte de todos los materiales, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta construcción. se desarrolló la actividad en un 100%.

ANTES



DURANTE



DESPUES





ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLADAS


Este subprograma contempla y abarca de concreto clase D (210 kg/cm²) 3000 PSI para piso interior y de concreto clase D (210 kg/cm²) 3000 PSI para piso exterior de 15 cm espesor de todos los materiales acrílicos internos y todo lo necesario para la correcta construcción de la obra y su mantenimiento.

DURANTE	ANTES
DESPUES	

OE2: Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a base de agua para muros exteriores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. se desarrolló la actividad en un 100%.



063. Suministro y conexión de pintura tipo látex a base de agua para
pintar exterior y tres pisos. Color a definir por el supervisor del
contrato. Incluye transporte de todos los materiales, propósitos y
accesorios de la superficie a pintar y todo lo necesario para su
correcta instalación se detallan en el 063.



OE.3. Suministro y aplicación de pintura viniltex a base de agua para muros interiores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. La actividad se realizó en un 100% de lo contractual.

ANTES



DURANTE




DESPUES






023. Suministro y colocación de pintura blanca a base de agua para interiores a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, pintura y colocación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. La actividad se realiza en un 100% de la obra.


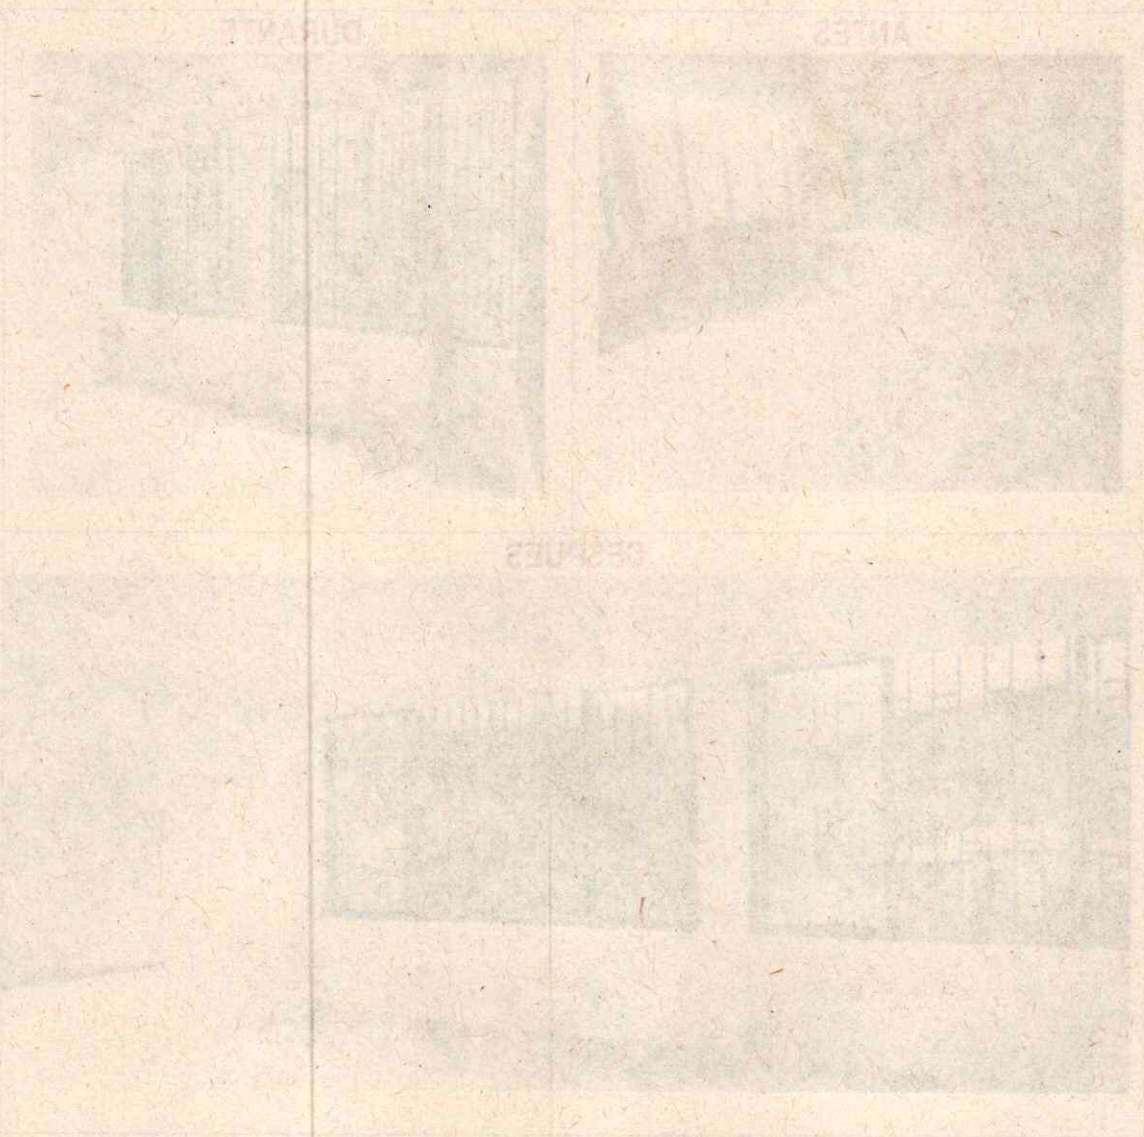


0E.4. Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para puertas rejas y ventanas. La actividad se realizó en un 100% de lo contractual.

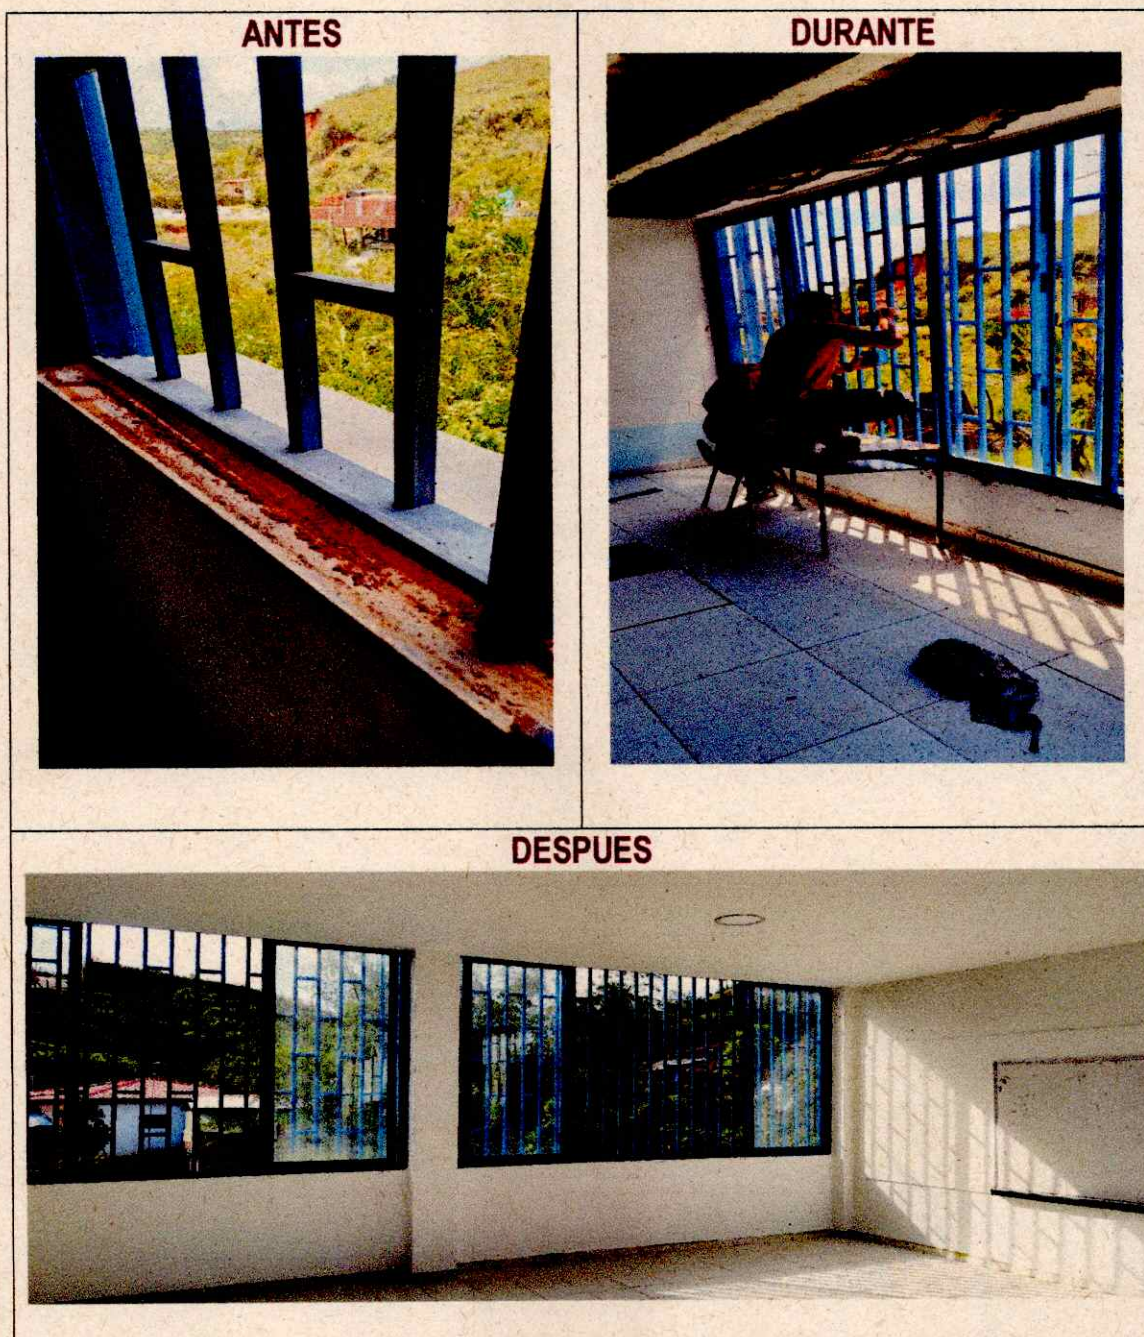



El suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a nivel nacional, debe ser por el proveedor de pintura, incluyendo el transporte de los materiales, pintura y aditivos de la superficie a pintar y todo lo necesario para su correcta instalación, para pintura tejado y paredes de edificios, se debe en un 100% cubierto.

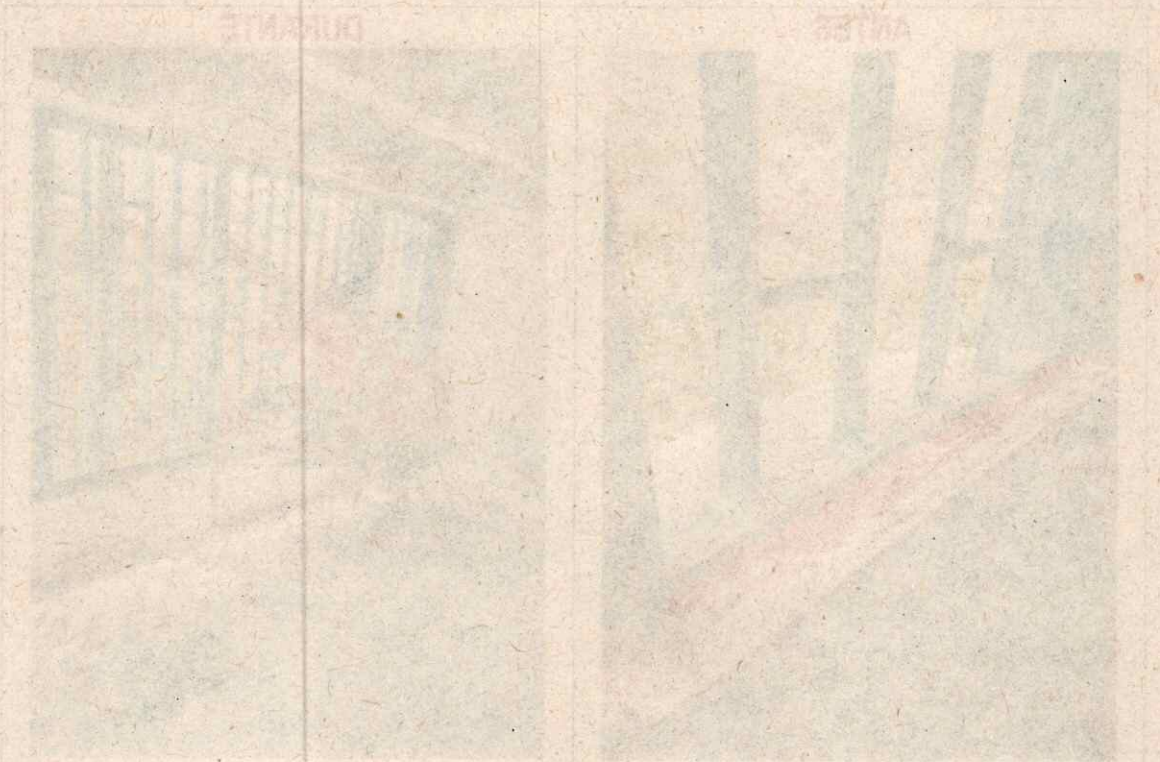



Asimismo, se debe garantizar la calidad de la pintura y aditivos, para lo cual se debe solicitar el certificado de calidad de los materiales, el cual debe ser presentado al momento de la instalación.

OE.5. Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para zócalos. La actividad se realizó en un 100% de lo contractual.






SE 1. Suministro, transporte y colocación de pintura a base de agua
mancha. Color a elegir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos
los materiales, mano de obra y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo
necesario para su correcta instalación para colocar la pintura se realiza en un
100% de la construcción.

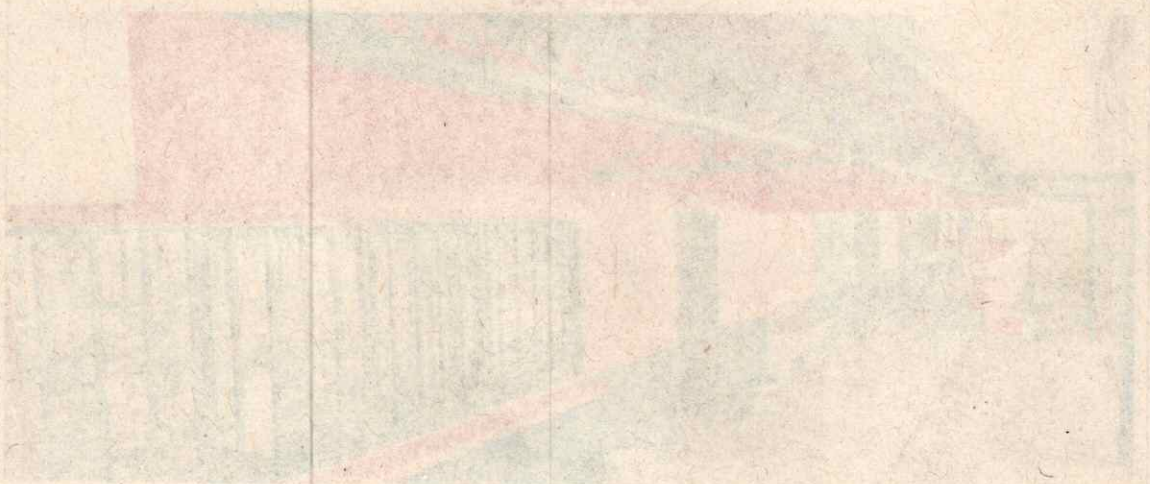

OE.6. Demolición de estructuras (concreto mortero de losa, Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. La actividad se realizó en un 100% de lo contractual.


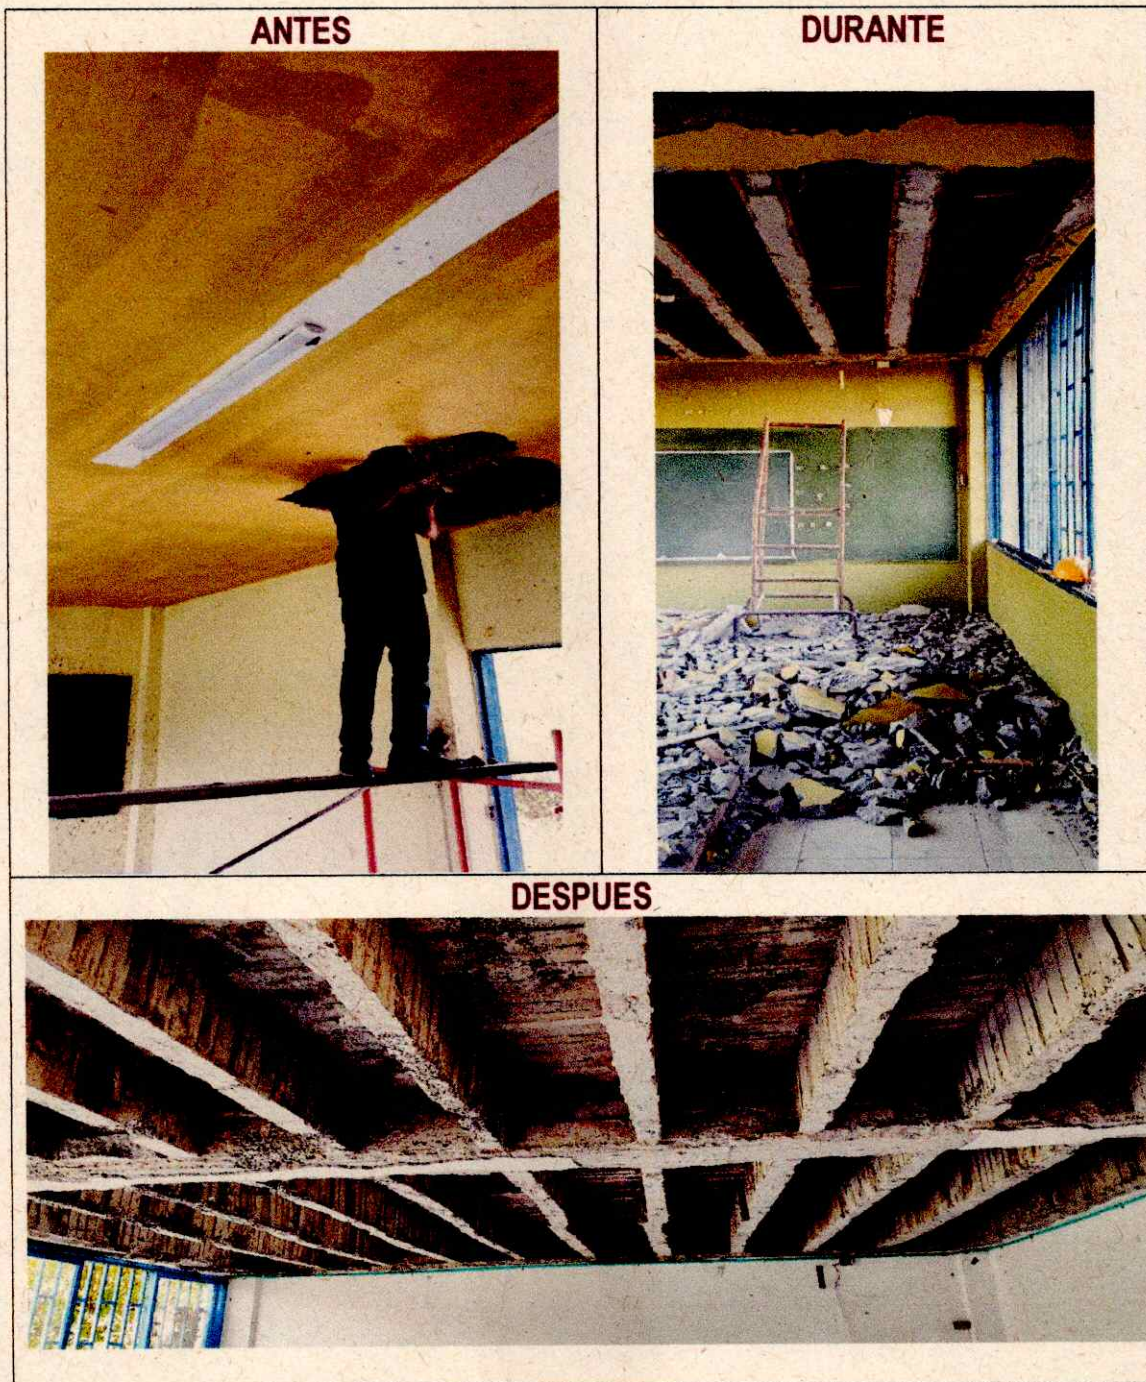





DE A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (CONCRETO Y ACERO)
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN. LA
MATERIA SE RECIPIE EN UN 100% DE CONTROL.

DE ANTES

DE ANTES



DE DESPUES



DE ANTES DE LA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO
DE DESPUES DE LA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO

OE.7. Desmonte y retiro de estructura Casetones en madera Incluye, lavado del concreto con hidrolavadora, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

ANTES




DURANTE




DESPUES





Gr. 1. Desmonte y retiro de estructuras existentes en muelles incluye: levante del concreto con hidroavión, carga, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. La actividad se realizará en un 100 % de la central.

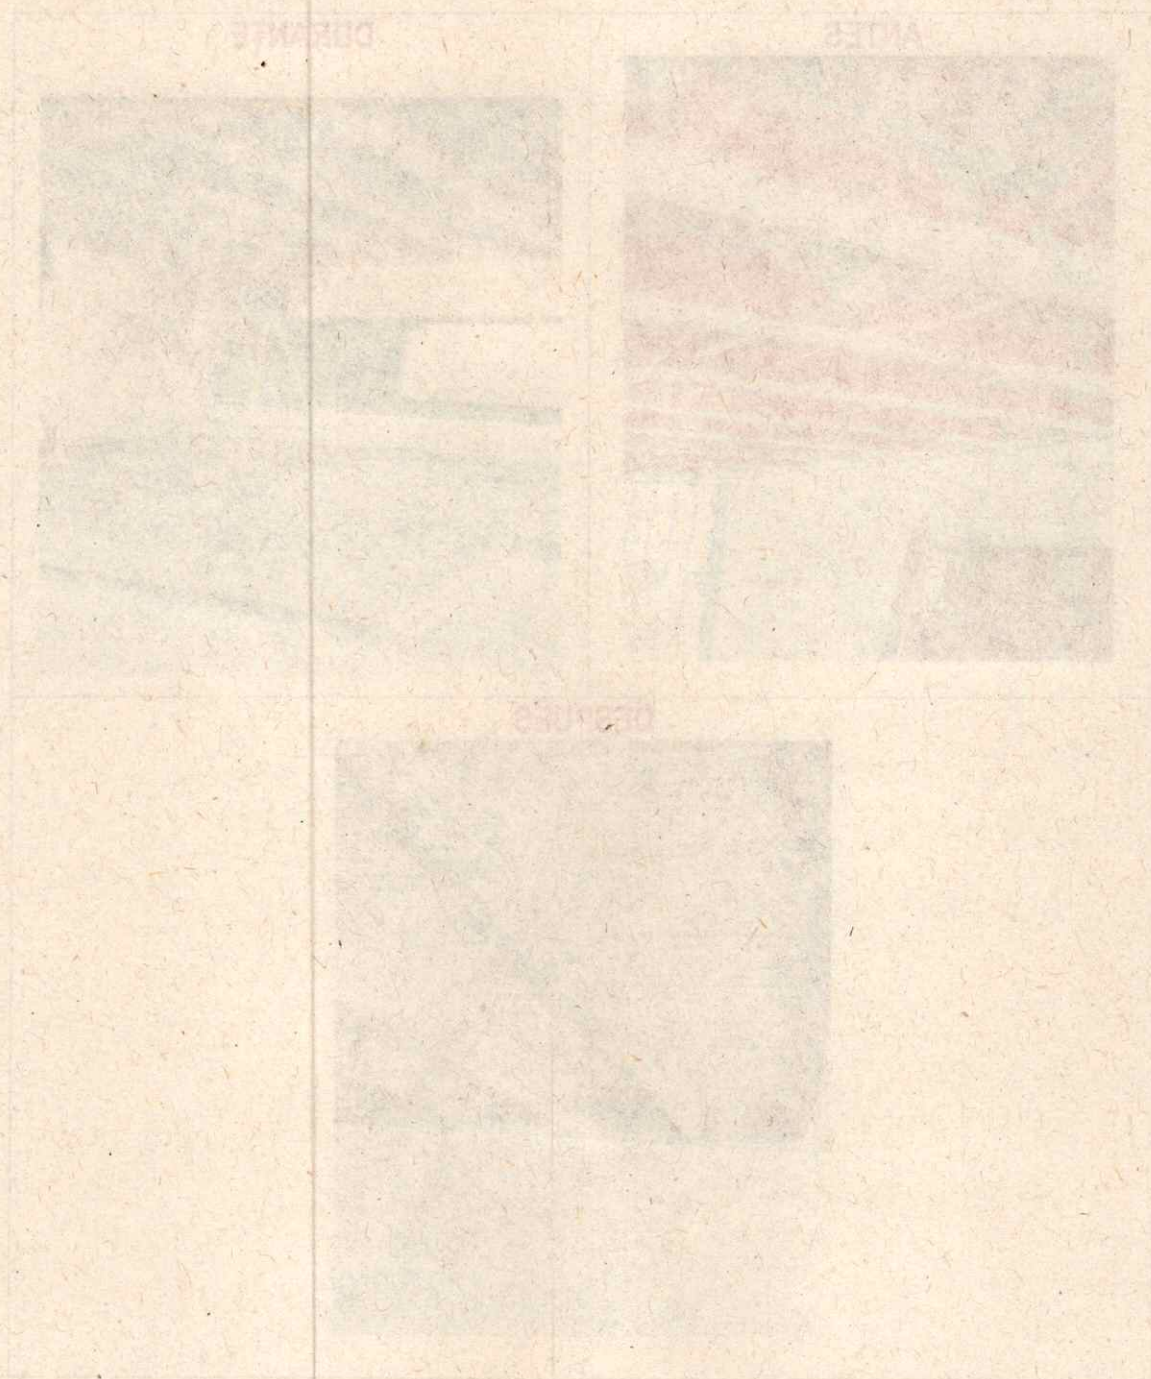


OE.8. Suministro transporte e instalación de drywall, incluye placa de yeso rf 1/2, masillado, dilatación perimetral en z perfilaría de aluminio para soportes chazos, cintas, ángulos, cortes y andamios. La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.





El presente informe tiene como finalidad informar a la comunidad sobre los resultados de la investigación realizada en el año 2010, en relación con la salud pública y el bienestar de la población.

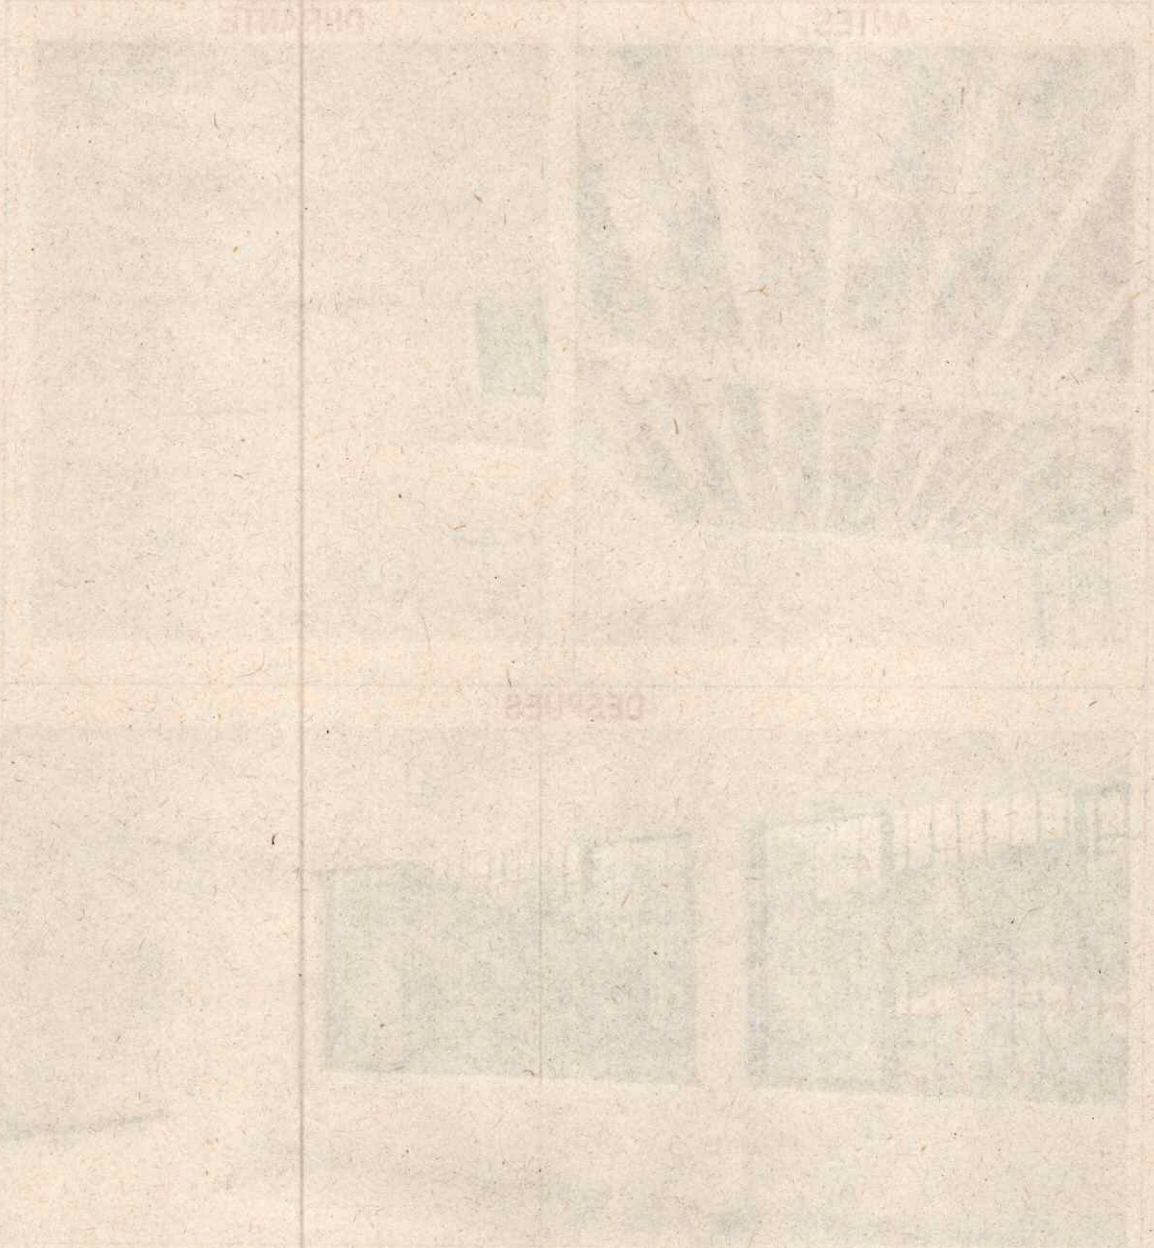

OE.9. Reparación de salidas red eléctrica iluminación, incluye lámparas ojos de buey led redondas cable dúplex , todo lo necesario para su correcta instalación.
La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.






Of 2. Repetition of studies and electrical installation include laminates plus de
pour les recherches cable duplex, tous les necessaires pour la correcte installation
la activades se resko en un 100% de la contractual

DEPART

ANTEE



LESQUES




OE.10. Reparación de salidas red eléctrica tomas y suiches, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.


ANTES



DESPUES

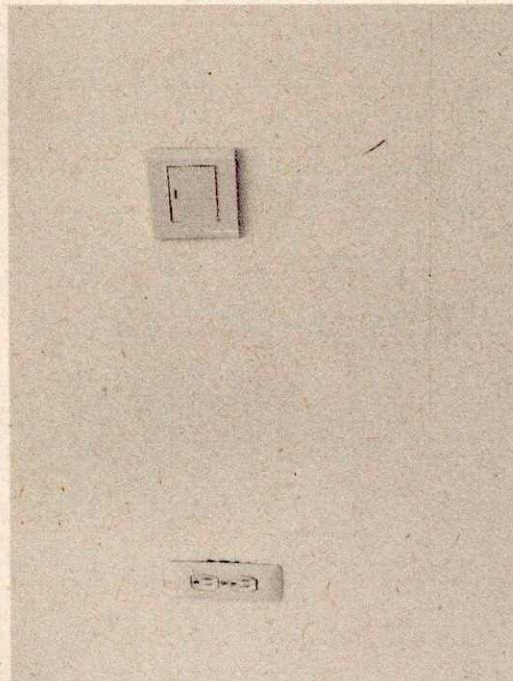

DESPUES

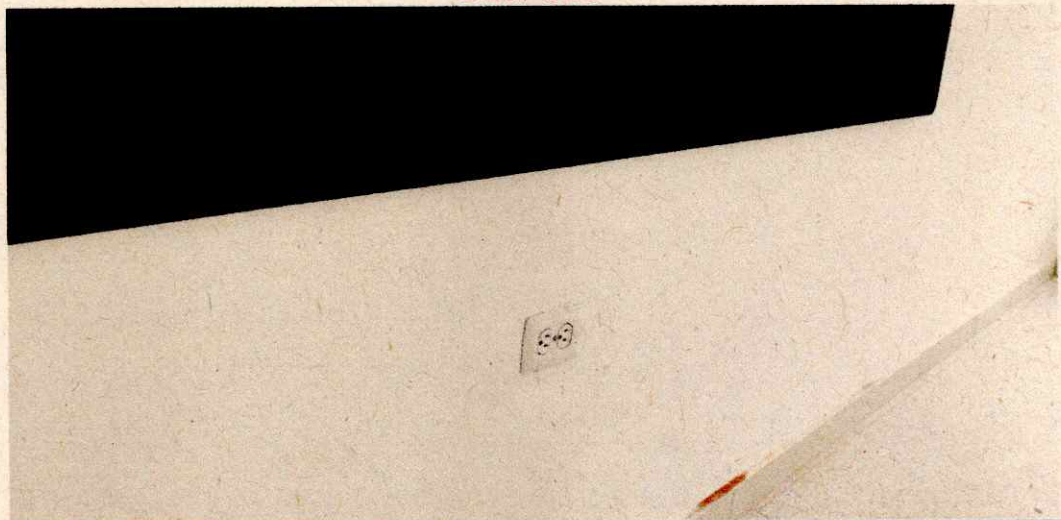




DE-101 Report on the results of the analysis of the data collected in the field of the project. The report is a summary of the findings of the analysis and is intended to provide a clear and concise overview of the results of the analysis. The report is a key document in the project and is used to inform the decision-making process.

Continúa

DE-101

DE-101




DE-101



OE. 11. Suministro, transporte e instalación de puertas metálicas de .75x180, ala y marco calibre 22, Incluye chapa, anticorrosivo y pintura a base aceite.

La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

ANTES

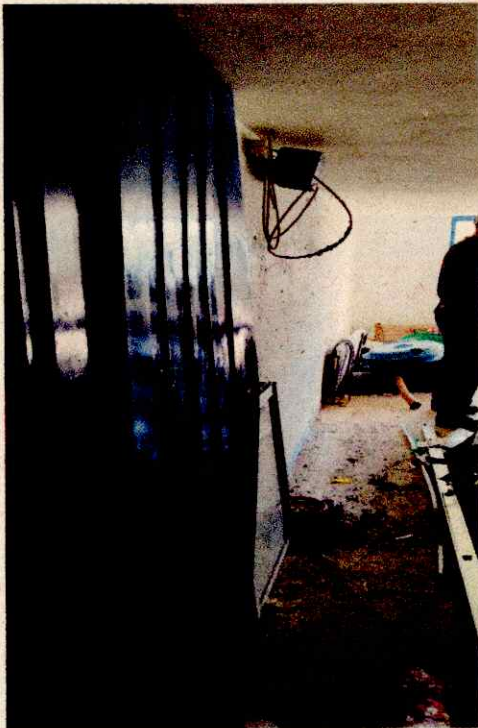


DURANTE



DESPUES




0E.12. Suministro, transporte y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. con tapa ruana y pestaña interna. Incluye embudo galvanizado calibre 16, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta. La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

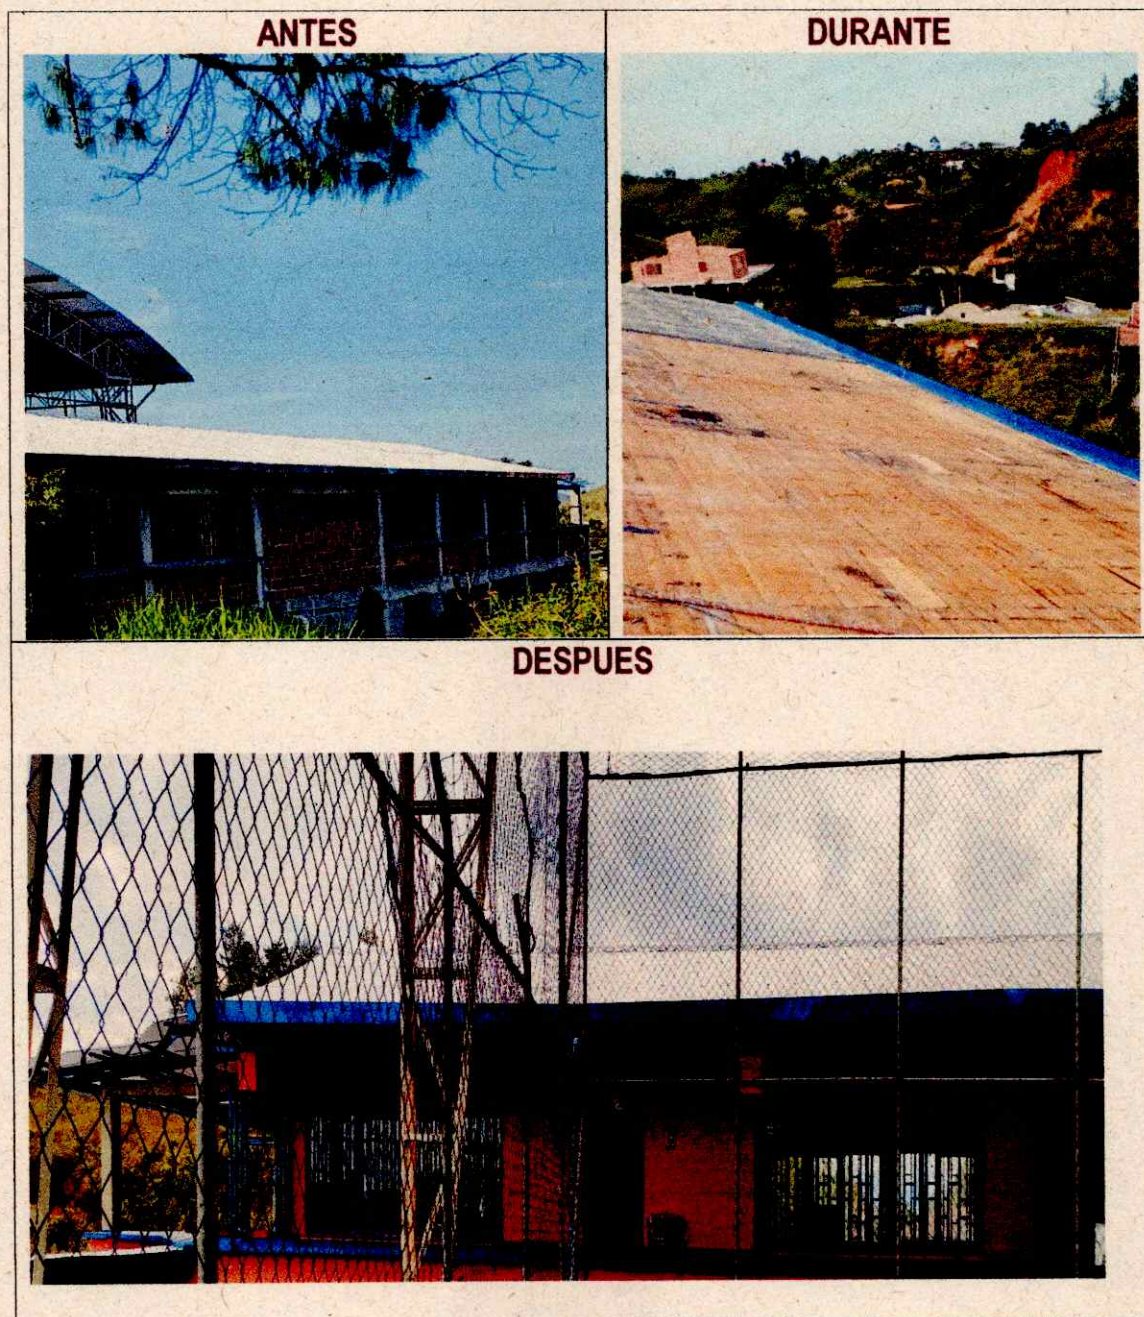



DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICET) Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INIC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICET) Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INIC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICET) Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INIC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

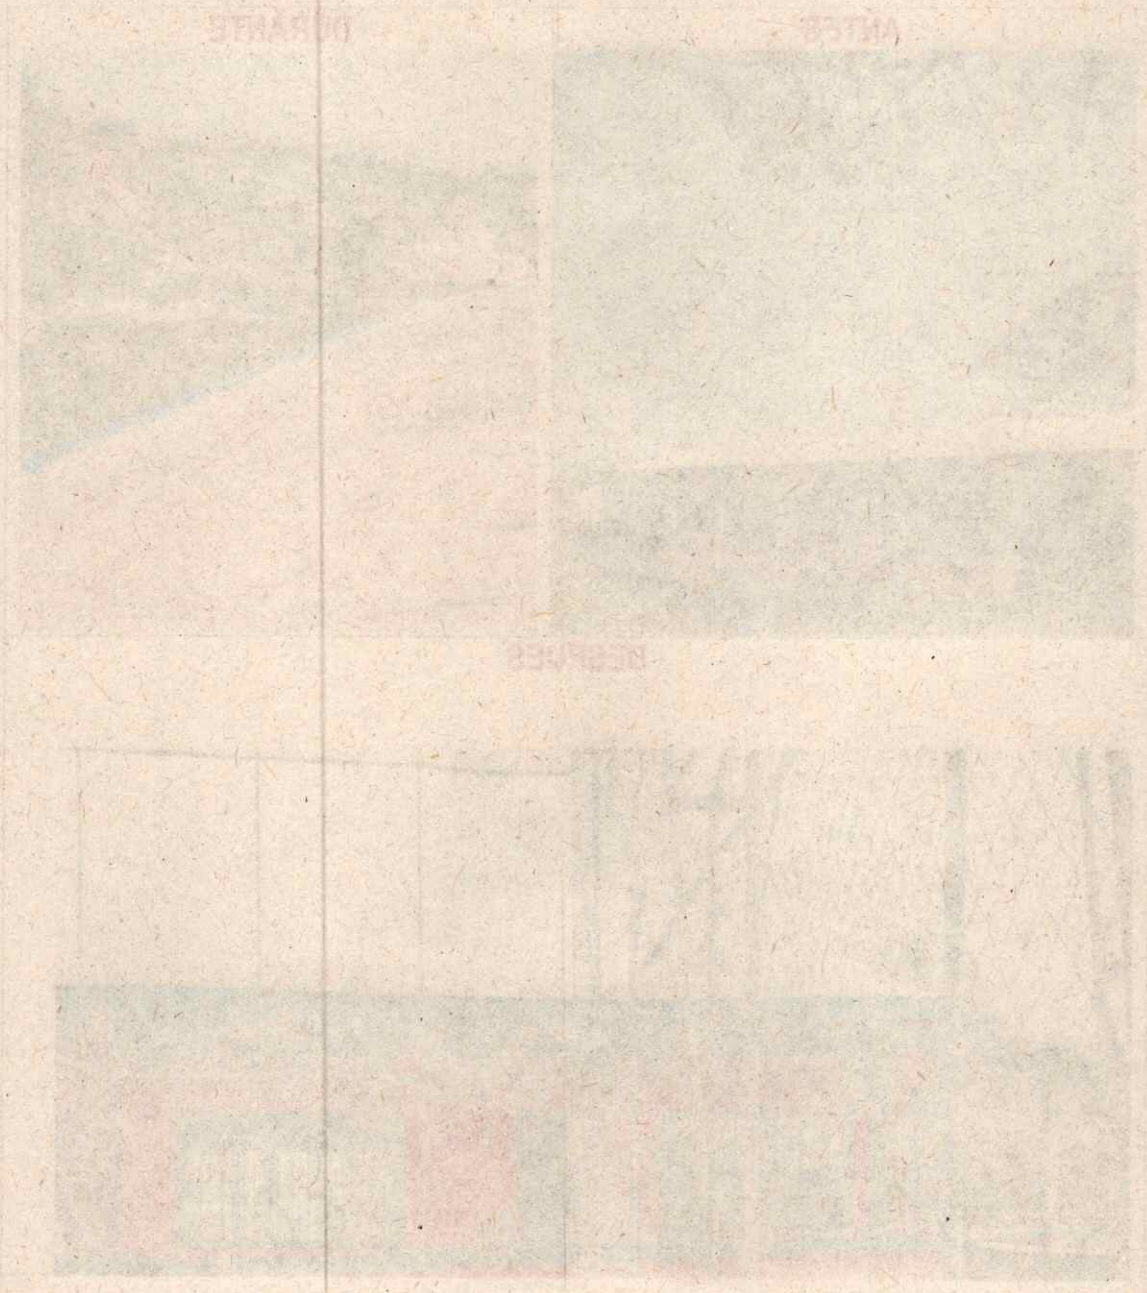

11. Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o Re ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

ANTES




DURANTE



DESPUES




El suministro, transporte, instalación de TUBERÍA PVC, así como DIÁMETRO DE 4", para sistemas de agua fría y/o ventilación, incluye: transporte de la tubería, botes, accesorios, pegante, limpieza, sellado, montaje en obra, corte a medida por parte de los instaladores, soldaduras, soldaduras y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La solución se realizó en un 100% de contractual.

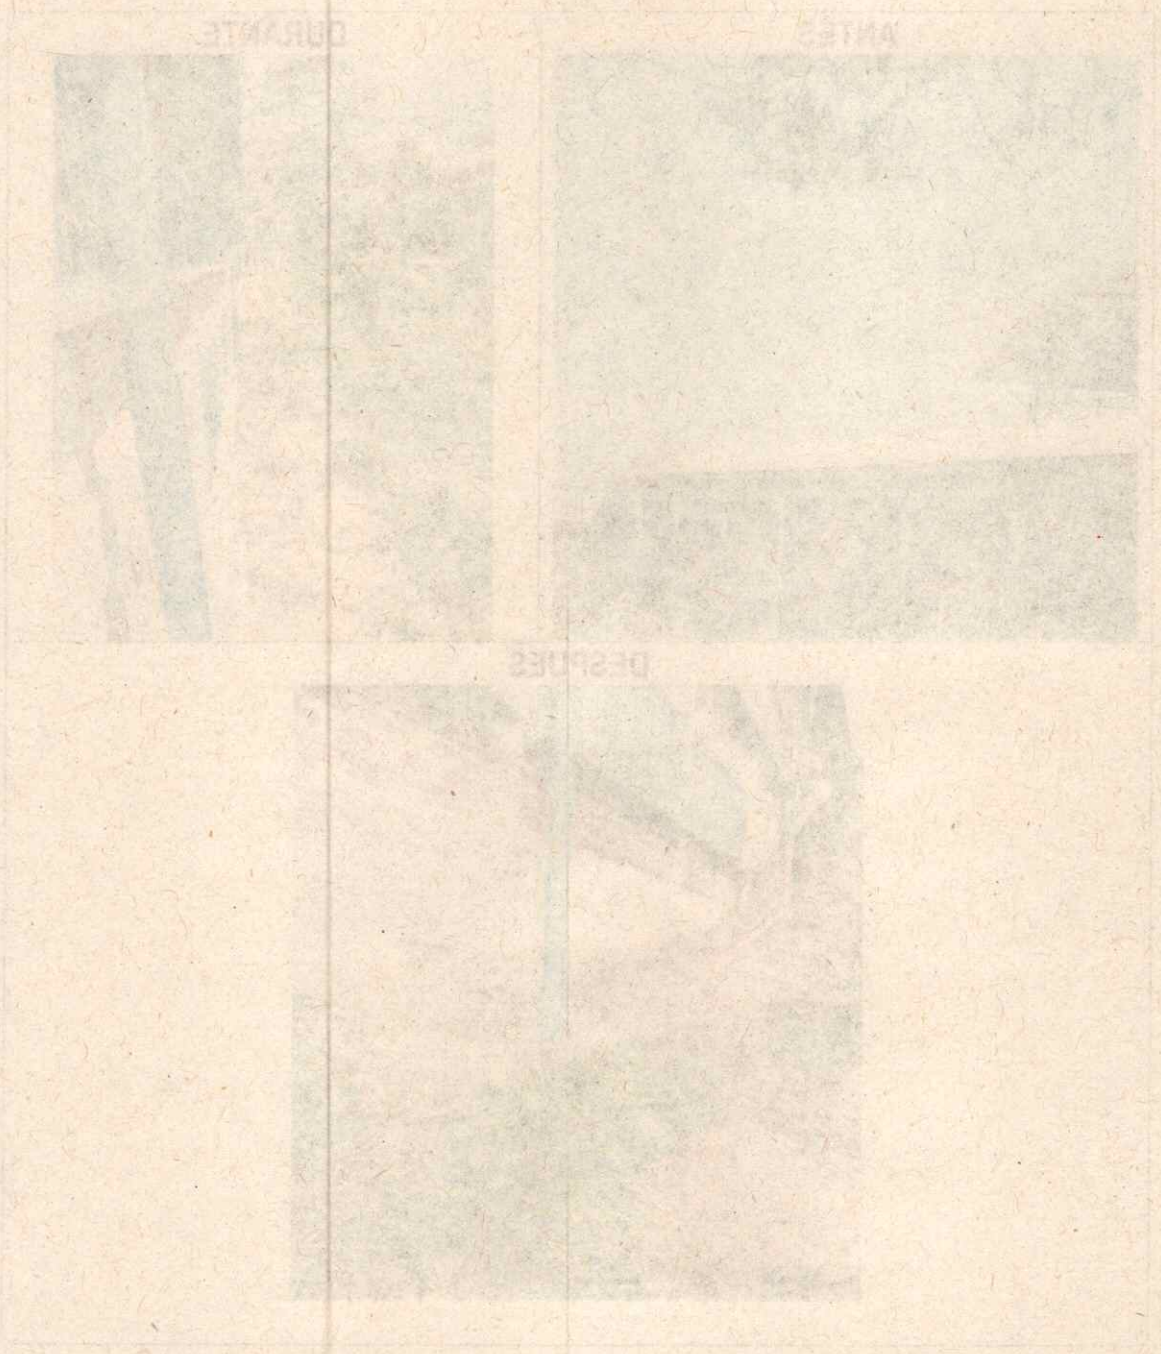

ANEXOS:

**Seguridad social
Parafiscales
Memorias de calculo
Factura
pólizas actualizadas**



REPRESENTANTE LEGAL
Asesorías y Servicios SST Integral S.A.S



ANEXOS

Programa social
Presupuestos
Muestras de trabajo
Facturas
Políticas administrativas

REPRESENTANTE LEGAL
Asesorías y Servicios SOT Integral S.A.S



ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA *														
CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS														
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS														
PLAZO ADICIONAL: N/A														
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023														
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023														
CONTRATUAL CON ADOPCION DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROS!														
N°1 Y MODIFICATORIO N°2														
ITEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROS! N°1				CONDICIONES ACTUALIZADAS 2				ACUMULADOS
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Desmonte de cubierta en teja de barro.	m2	320,00	\$ 21.010	\$ 6.723.200	313,60	\$ 6.588.736	313,60	\$ 6.588.736	0,00	\$ 0	313,60	\$ 6.588.736	
2	Desmonte de cubierta en teja traslucida. Incluye cargue, transporte hasta sitio final.	m2	100,00	\$ 14.057	\$ 1.405.700	72,47	\$ 1.018.711	72,47	\$ 1.018.711	0,00	\$ 0	72,47	\$ 1.018.711	
3	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura en madera. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	320,00	\$ 143.465	\$ 45.908.800	313,60	\$ 44.990.624	313,60	\$ 44.990.624	0,00	\$ 0	313,60	\$ 44.990.624	
4	Suministro, transporte e instalación de caballete UPVC. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	32,00	\$ 142.071	\$ 4.546.272	32,00	\$ 4.546.272	32,00	\$ 4.546.272	0,00	\$ 0	32,00	\$ 4.546.272	
5	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura metálica. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	100,00	\$ 143.465	\$ 14.346.500	84,84	\$ 12.171.571	84,84	\$ 12.171.571	0,00	\$ 0	84,84	\$ 12.171.571	
6	Mantenimiento de estructura en madera para cubierta.	m2	320,00	\$ 7.655	\$ 2.449.600	313,60	\$ 2.400.608	313,60	\$ 2.400.608	0,00	\$ 0	313,60	\$ 2.400.608	
7	Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.	m2	80,00	\$ 12.092	\$ 967.360	72,47	\$ 876.307	72,47	\$ 876.307	0,00	\$ 0	72,47	\$ 876.307	

187



ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA *

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$229.370.800
PLAZO ADICIONAL: IVA	VALOR ADICIONAL: \$50.063.379
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023	FECHA ACTA No. 02 Y FINAL: \$130.670.428
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRACTUAL CON ADOPCIÓN DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1 Y MODIFICATORIO N°2

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL		ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
8	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERÍA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, planchas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar manos de pintura anticorrosiva, mano de esmalte base aceite mate, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	500,00	\$ 21.252	\$ 10.626.000	300,00	\$ 6.375.600	300,00	\$ 6.375.600	300,00	\$ 6.375.600	0,00	\$ 0	300,00	\$ 6.375.600
9	Suministro, transporte y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	ml	85,00	\$ 91.364	\$ 7.765.940	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10	Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogéneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para la colocación de tuberías de aguas lluvias	m3	20,00	\$ 56.288	\$ 1.125.760	20,00	\$ 1.125.760	20,00	\$ 1.125.760	20,00	\$ 1.125.760	0,00	\$ 0	20,00	\$ 1.125.760

Handwritten mark

STANDARDIZATION UNIT



ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA *

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										ADICION DE RECURSOS OTROSÍ N°1: \$50.083.379									
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS										VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$279.434.179									
PLAZO ADICIONAL: N/A										FECHA OTROSÍ N°1: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023									
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023										SUPERVISOR:									
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023										SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA									
CONTRACTUAL CON ADOPCION DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1 Y MODIFICATORIO N°2										ACTA No. 2 Y FINAL									
ITEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		ACTA No. 1		CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ACUMULADOS	VR. TOTAL
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL								
11	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventillación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	60,00	\$ 61.046	\$ 3.662.765	140,00	\$ 8.546.452	140,00	\$ 8.546.452	60,00	\$ 3.662.765	80,00	\$ 4.883.687	140,00	\$ 8.546.452				\$ 8.546.452
12	Demolición de estructuras (pisos y Concreto reforzado. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2	400,00	\$ 45.044	\$ 18.017.600	163,00	\$ 7.342.172	163,00	\$ 7.342.172	163,00	\$ 7.342.172	0,00	\$ 0	163,00	\$ 7.342.172				\$ 7.342.172
13	Suministro, transporte e instalación de piso tipo cantera. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	m2	400,00	\$ 154.126	\$ 61.650.440	163,00	\$ 25.122.554	163,00	\$ 25.122.554	163,00	\$ 25.122.554	0,00	\$ 0	163,00	\$ 25.122.554				\$ 25.122.554
OBRAS EXTRAS																			
OE.1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para piso aulas y de unidad sanitaria de un espesor de 10 cm. Incluye malla electrosoldada de 15" x 15 mts, transporte de todos los materiales, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2		\$ 107.459		163,00	\$ 17.515.817	163,00	\$ 17.515.817	0,00	\$ 0	163,00	\$ 17.515.817	163,00	\$ 17.515.817				\$ 17.515.817

140



ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA *

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$229.370.800
PLAZO ADICIONAL: N/A	VALOR ADICIONAL: \$50.063.379
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023	VALOR ACTA No. 02 Y FINAL: \$130.670.428
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATUAL CON ADOPCIÓN DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1 Y MODIFICATORIO N°2				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL		ACUMULADOS	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
OE.2	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a base de agua para muros exteriores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		\$ 27.060		370,00	\$ 10.012.200	325,00	\$ 8.794.500	0,00	\$ 0	325,00	\$ 8.794.500
OE.3	Suministro y aplicación de pintura vinilíx a base de agua para muros interiores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		\$ 25.087		850,00	\$ 21.323.950	668,90	\$ 16.780.694	0,00	\$ 0	668,90	\$ 16.780.694
OE.4	Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para puertas rejas y ventanas.	m2		\$ 40.078		108,00	\$ 4.328.424	136,25	\$ 5.460.524	0,00	\$ 0	136,25	\$ 5.460.524
OE.5	Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato. Incluye transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación. para zócalos.	m2		\$ 34.906		62,00	\$ 2.164.172	58,99	\$ 2.059.105	0,00	\$ 0	58,99	\$ 2.059.105

18

RECEIVED CONTINUED

ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023



OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA *																			
CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS					CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL ANTIOQUIA					ADICION DE RECURSOS OTROS! N°1: \$50.063.379									
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS					VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$229.370.800					VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$279.434.179									
PLAZO ADICIONAL: N/A					VALOR ADICIONAL: \$50.063.379					FECHA OTROS! N°1: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023									
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023					VALOR ACTA No. 02 Y FINAL: \$130.670.428					SUPERVISOR:									
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023					FECHA ACTA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023					SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA									
CONTRACTUAL CON ADOPCION DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROS! N°1 Y MODIFICATORIO N°2										CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROS! N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL		ACUMULADOS	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
OE.6	Demolición de estructuras (concreto mortero de losa. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2		\$ 44.294		155,90	\$ 6.905.435	155,90	\$ 6.905.435	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	155,90	\$ 6.905.435	155,90	\$ 6.905.435		\$ 6.905.435
OE.7	Desmonte y retiro de estructura Casetones en madera Incluye, lavado del concreto con hidrolavadora, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2		\$ 42.094		155,90	\$ 6.562.455	155,90	\$ 6.562.455	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	155,90	\$ 6.562.455	155,90	\$ 6.562.455		\$ 6.562.455
OE.8	Suministro transporte e instalación de drywall, incluye placa de yeso rf 1/2", masillado, dilatación perimetral en z perflaría de aluminio para soportes chazos, cintas, ángulos, cortes y andamios.	m2		\$ 90.090		155,90	\$ 14.045.031	207,17	\$ 18.663.945	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	207,17	\$ 18.663.945	207,17	\$ 18.663.945		\$ 18.663.945
OE.9	Reparación de salidas red eléctrica iluminación, incluye lámparas ojos de buey led redondas cable dúplex , todo lo necesario para su correcta instalación.	un		\$ 115.008		30,00	\$ 3.450.240	17,00	\$ 1.955.136	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	17,00	\$ 1.955.136	17,00	\$ 1.955.136		\$ 1.955.136
OE.10	Reparación de salidas red eléctrica tomas y sulches, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	un		\$ 115.008		10,00	\$ 1.150.080	24,00	\$ 2.760.192	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	24,00	\$ 2.760.192	24,00	\$ 2.760.192		\$ 2.760.192
OE.11	Suministro, transporte e instalación de puertas metálicas de .75x180, ala y marco calibre 22, incluye chapa, anticorrosivo y pintura a base aceite.	un		\$ 808.364		3,00	\$ 2.425.092	3,00	\$ 2.425.092	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	3,00	\$ 2.425.092	3,00	\$ 2.425.092		\$ 2.425.092


KG

ACTA No. 2 y FINAL CONTRATO IP-09-2023



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "																												
CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS						CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL ANTIOQUIA						ADICION DE RECURSOS OTROSI N°1: \$50.063.379																
PLAZO INICIAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS						VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$229.370.800						VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$279.434.179																
PLAZO ADICIONAL: N/A						VALOR ADICIONAL: \$50.063.379						FECHA OTROSI N°1: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023																
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023						VALOR ACTA No. 02 Y FINAL: \$130.670.428						SUPERVISOR:																
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023						FECHA ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023						SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA																
CONTRACTUAL CON ADOPCION DE PRECIOS Y CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI N°1 Y MODIFICATORIO N°2												CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI N°1			CONDICIONES ACTUALIZADAS 2			ACTA No. 1			ACTA No. 2 Y FINAL			ACUMULADOS				
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID AD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL											
OE.12	Suministro, transporte y colocación de canoa en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. con tapa ruana y pestafa interna. Incluye embudo galvanizado calibre 16 ,pintura anticorrosiva, esmalte base acetate y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	ml		\$ 86.114		85,00	\$ 7.319.690			85,00	\$ 7.319.690	0,00	\$ 0			85,00	\$ 7.319.690					85,00	\$ 7.319.690				\$ 7.319.690	
							\$ 218.307.962				\$ 218.307.962				\$ 116.221.680				\$ 102.086.272					\$ 218.307.962				\$ 50.210.829
COSTO DIRECTO OBRA ADMINISTRACION						23,00%	\$ 41.215.066				\$ 50.210.829				\$ 26.730.986				\$ 23.479.843					\$ 50.210.829				\$ 10.915.398
UTILIDAD						5,00%	\$ 8.959.797				\$ 10.915.398				\$ 5.811.084				\$ 5.104.314					\$ 10.915.398				\$ 279.434.179
COSTO TOTAL OBRA							\$ 229.370.800				\$ 279.434.179				\$ 148.763.761				\$ 130.670.428					\$ 279.434.179				

Katharine Velez
KATHERINE VELEZ GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL

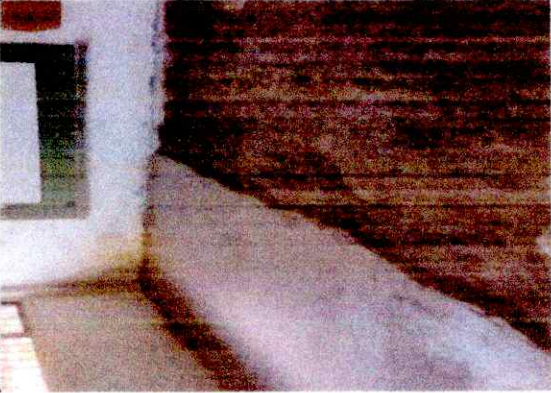MEMORIA DE CÁLCULO									
CONTRATO IP-009-2023									
Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "									
Daniel Cardona									
Elaboró									
Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para piso aulas y de unidad sanitaria de un espesor de 10 cm. Incluye malla electrosoldada de 15" x 15 mts, transporte de todos los materiales, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta construcción.									
OE.1									
ITEM									
ASesorias y servicios SST Integral SAS									
UNIDAD									
m2									
CANT CONDICIONES ACTUALIZADAS 2									
163,00									
No de Elementos									
Medida Total									
Ancho									
Largo									
L									
Localización									
SALON 1									
SALON 2									
SALON 3									
SALON EXTERNO 1									
UNIDAD SANITARIA									
TOTAL									
163,0									
<div> <div>   </div> </div>									
OBSERVACIONES									
REGISTRO FOTOGRAFICO									
ESTADO DE LA ACTIVIDAD									
Contratista									
FIRMA									
NOMBRE									
Interventoria y/o supervisor:									
FIRMA									
NOMBRE									

CONTRATO IP-009-2023				MEMORIA DE CÁLCULO			
ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS				Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA"			
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	2 Y FINAL	ELABORO	Daniel Cardona
SUPERVISOR							Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a base de agua para muros exteriores, a tres manos. Color a definir por el supervisor del contrato
CONTRATISTA						ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	OE.2
						ITEM	
						UNIDAD	
						CANT. CONDICIONES ACTUALIZADAS 2	
						Medida Total	
						m2	
						No de Elementos	
						Ancho	
						Largo	
						Medida Total	
						VIGAS SALIENTES DE CUBIERTA	
						MURO FACHADA FRONTAL	
						RESTA AREA DE VANOS PUERTAS Y VENTANAS	
						MURO FACHADA LATERAL COSTADO OESTE	
						MUROS EXTERIORES	
						PINTURA VIGAS Y COLUMNAS EXTERIORES	
						MURO BALCON	
						MURO EXTERIOR	
						AREAS MUROS EN DIAGONAL EXTERIORES Y ESQUINAS EN BALCONES	
						SUMATORIA AREAS DE OTROS MUROS EXTERNOS	
						TOTAL	
						325.00	




OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE LA ACTIVIDAD

Contralista

FIRMA

NOMBRE

Interventoria y/o supervisor

FIRMA


NOMBRE


1000


1000





ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS				MEMORIA DE CALCULO			
CONTRATO IP-009-2023				ntegral			
Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"				Daniel Cardona			
FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	2 Y FINAL	ELABORO
SUPERVISOR				MUNICIPIO DE EL PEÑOL			
CONTRATISTA				ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS			
ITEM				OE.3			
UNIDAD				m2			
CANT CONDICIONES ACTUALIZADAS 2				668.90			
LOCALIZACIÓN				Medida Total			
AULA 06				70.75			
AULA 07				58.51			
BANO INTERNO SALON				24.54			
AULA 08				60.92			
BODEGA GRANDE				57.12			
BODEGA PEQUEÑA 2				18.98			
AULA 09				62.69			
AULA 10				41.80			
AULA 11				45.95			
AULA 12				49.95			
BANO GRANDE Y PRINCIPAL				99.20			
TABLEROS				51.86			
BODEGA				15.5			
TOTAL				668.90			
							
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <p>OBSERVACIONES: CANTIDADES DE OBRA TOTALES POR UNIDAD DE METRO CUADRADO POR AULA DONDE YA SE HIZO EL DESCUENTO DE VANOS DE PUERTAS VENTANAS Y ESPACIOS QUE NO SE PINTARON</p> <p>ESTADO DE LA ACTIVIDAD:</p>				<p>Interventoria y/o supervisor:</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: </p>			
<p>Contratista:</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: </p>							









[illegible]



[illegible]



1000000

1000000

1000000


1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

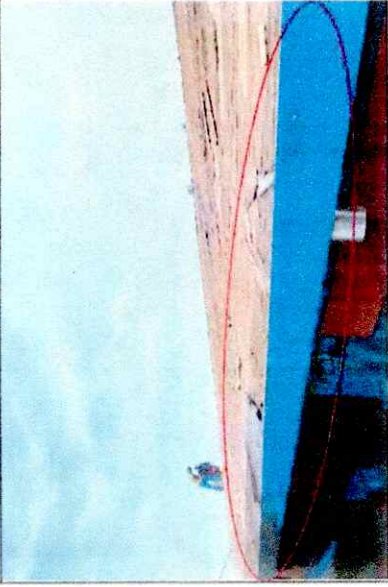ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										MEMORIA DE CALCULO									
CONTRATO IP-009-2023										integral									
Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA"																			
FECHA	DD	MM	AA	2023	CORTE N°	2 Y FINAL	ELABORO	Daniel Cardona											
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PENOL					ITEM	OE.12	Suministro, transporte y colocación de canoa en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. con tapa ruana y pesaña interna. Incluye embudo galvanizado calibre 16, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Segun diseño de cubierta.		UNIDAD	m	CANT CONTRAC	85.00						
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										Dimensiones		No de Elementos		Medida Total				
										Ancho		Largo		L		Medida Total			
										FACHADA FRONTAL		32.00		32.00		32.0			
										FACHADA TRASERA		32.00		32.00		32.0			
										CANDAS FACHADA		21.00		21.00		21.0			
										BALCONES									
OBSERVACIONES:										REGISTRO FOTOGRAFICO									
ESTADO DE LA ACTIVIDAD:										TOTAL									
Contratista					Interventoria y/o supervisor.					FIRMA					FIRMA				
NOMBRE:					NOMBRE:					NOMBRE:					NOMBRE:				

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Cumplamos los sueños de nuestra patria creciendo y avanzando.
Devuélvase al medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100206556	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821577	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.





LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100206556 y endoso, 0 cuyo afianzado es:
ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S Asegurado o Beneficiario: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP
/ EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP , expedida por la Compañía en 15/08/2023, no expirará por falta
de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o
por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 15 días del mes AGOSTO del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





LA COMPANIA MUNICIPAL DE SERVICIOS S.A.

CERTIFICADO

Por lo tanto, el suscrito, en virtud de sus facultades, declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Gerencia General de la Compañía Municipal de Servicios S.A., y que el mismo es válido para todos los efectos legales que correspondan.

En San José, Costa Rica, a los 15 días del mes de mayo del año 2011.

[Handwritten signature]

Gerente General de la Compañía Municipal de Servicios S.A.

No. PÓLIZA	M-180845760	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821578	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 11/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 08/01/2024	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S			No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3		
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69			TÉLEFONO	3104157490		
ASEGURADO	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S			No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3		
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69			TÉLEFONO	3104157490		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			No. DOC. IDENTIDAD			
DIRECCIÓN				TÉLEFONO			

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IP - 009 - 2023 , CUYO OBJETO ES:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA.

SE CONFIRMA COMO ASEGURADO/ BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116000000.00	232000000.00	232.000.000,00	190.685,00
PATRONAL	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2023		

PRIMA BRUTA	\$	190.685,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	190.685,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	37.180,00
TOTAL A PAGAR	\$	232.865,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text, possibly a date or reference number.]



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100045760	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821578	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV



No. PÓLIZA	M-100206556	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14843152	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLÍN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 11/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 08/01/2027	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S			No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3		
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69			TELÉFONO	3104157490		
ASEGURADO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP			No. DOC. IDENTIDAD	901.537.748-4		
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91			TELÉFONO	3104491096		
BENEFICIARIO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP			No. DOC. IDENTIDAD	901.537.748-4		
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91			TELÉFONO	3104491096		

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE ACUERDO CON EL OTROSI NO. 01 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023; SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$ 50.063.379 PARA UN TOTAL DE \$ 279.434.179.

LOS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. IP - 009 - 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/11/2023	24:00 Horas Del 08/05/2024	55.886.835,80	9.930,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/11/2023	24:00 Horas Del 08/01/2027	27.943.417,90	31.711,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/01/2024	24:00 Horas Del 08/01/2027	27.943.417,90	30.065,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 111.773.671,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00		71.706,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 71.706,00
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 0,00
			IVA	\$ 13.624,00
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/01/2024		TOTAL A PAGAR	\$ 85.330,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

Nacional: 01 8000 111 935
Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100206556	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14843152	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	09/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE CONFIRMA COMO ASEGURADO/ BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

NOTA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.



**LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A****CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100206556 y endoso, 1 cuyo afianzado es:
ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP**
/ **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP**, expedida por la Compañía en 09/11/2023, no expirará por falta
de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o
por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 09 días del mes NOVIEMBRE del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





LA COMPANIA MINERAL DE SEGURIDAD

LA COMPANIA MINERAL DE SEGURIDAD

LA COMPANIA MINERAL DE SEGURIDAD

CERTIFICADO

Que la Compañía de Cementos y Cerámicas, S.A. ha sido declarada en concurso de acreedores por el Jefe del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia de quiebras, con fecha 15 de mayo de 1994, en el expediente 1/94, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 10 de la Ley de Quiebras, de 1992.

Por lo tanto, se declara que la Compañía de Cementos y Cerámicas, S.A. está en concurso de acreedores.

[Firma manuscrita]

Por el Jefe del Poder Judicial de la Federación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900988730	3	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA HORIZONTES	PENOL-ANTIOQUIA	8516738	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-11	2023-12	319190253	9459372014	E	2023/12/11	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$1,436,800


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1007109396	ACEVEDO JUAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30			\$0	
2	CC 18000838	MARIN HECTOR	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30			\$0	
3	CC 1007115650	MARIN JULIAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30			\$0	
4	CC 100085274	RIOS CARLOS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30			\$0	
Total Afiliados(4)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$323,200				\$0	



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Katherine Vélez Gallego**, en calidad de representante legal de la empresa **ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.**, manifiesto que la empresa que represento **ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (06) meses anteriores al cierre del proceso, de los pagos de los aportes a los que tenemos obligación, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de El Peñol a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2023.



KATHERINE VELEZ GALLEGO

Representante Legal.

ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

La empresa Integral, S.A. declara que en el desarrollo de sus actividades comerciales y de producción, así como en la gestión de sus recursos humanos, financieros y materiales, ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sociales y ambientales, de acuerdo con la legislación vigente en España.

Esta declaración se hace en virtud de la Ley 18/2004, de 29 de abril, de acceso a la información pública.

LA DIRECTORA GENERAL

PROFESIONAL

ASISTENTE Y SERVIDOR INTEGRAL S.A.
