

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/Oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Tipo de Contrato:	
OBRA ☒	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número: <u>1</u>	Periodo comprendido entre el <u>2</u> de Diciembre de 2019 hasta el <u>13</u> de Diciembre de 2019
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. <u>4162.010.26.1.3732</u> de <u>2019</u>	
Nombre Completo del Contratista: DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	
Documento de identificación del contratista: 901.066.0987-6	
Nombre (s) del Supervisor (es): FERNANDO ALBERTO PADILLA RAMIREZ	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN	
Obra Física Ejecutada del Periodo: <u>34.5</u> %	Obra Física Ejecutada Acumulada: <u>34.5</u> %
Objeto del contrato:	
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SENA, CALLE 47 CO CARRERA 3 Y 4C B.P 26000842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS.	
3. INFORME JURÍDICO	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/Oct/2019

Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
7 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Modificación del contrato: N.A			
Suspensión: N.A			
Reanudación: N.A			
Cesión: N.A			
Terminación anticipada: N.A			
Acta de recibo final de obra: N.A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del Contrato: CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$190.614.323)			
Adición: N.A			
Prórroga: N.A			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$190.614.323	\$ 65.754.874	0	\$ 124.859.449

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/Oct/2019

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: _____

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

No. Planilla: 42363623

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador: ARUS

Fecha de Pago: 2019-11-29

Periodo de pago:201912

Datos Certificación o Planilla de Pago de MARGARITA VERGARA GUERRERO

No. Planilla: 9400254754

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 06639360

Operador: Aportes en linea

Fecha de Pago: 2019-11-29

Periodo de pago:201911

Datos Certificación o Planilla de Pago de GESTION Y SOPORTE AYS SAS

No. Planilla: 1024949420

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador: SIMPLE

Fecha de Pago: 2019-12-04

Periodo de pago:201912

Observaciones al informe contable y financiero: N.A

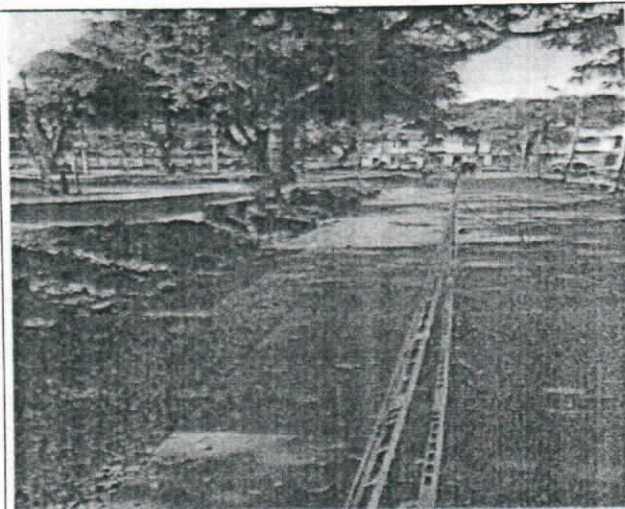
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/Oct/2019

5. INFORME TÉCNICO

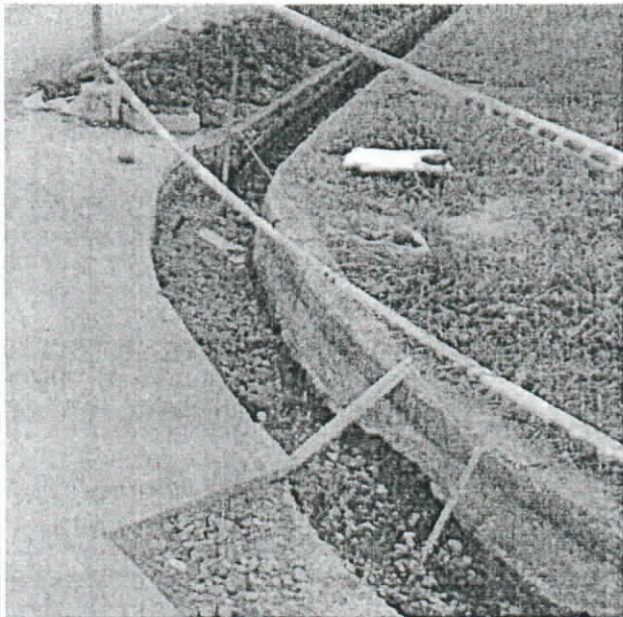
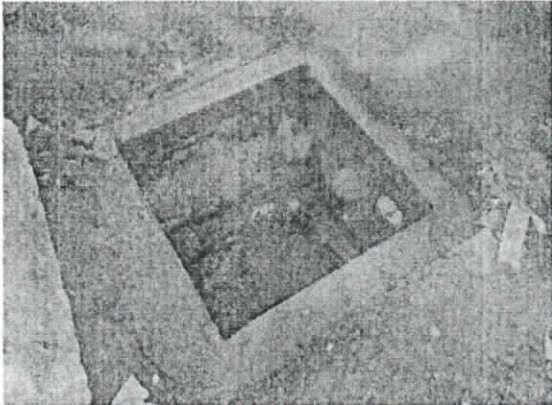
Actividades realizadas en el periodo:

- Socialización del proyecto con la comunidad.
- Socialización con el ingeniero residente de la obra para la localización del proyecto.
- Cerramiento de la zona intervenida para la protección de la comunidad.
- Realización de filtro francés, el cual incluye excavación, retiro de escombros, compactación subrasante, instalación del geotextil e instalación del medio filtrante.
- El ingeniero residente procedió a realizar la toma de los niveles con el fin de obtener la pendiente deseada del filtro.
- Se recibe a los funcionarios del DAGMA los cuales dan recomendaciones sobre las especies arbóreas existentes y sobre el manejo de residuos.
- Se realizó el tratamiento de las raíces con el fin proteger el medio ambiente.


REGISTRO FOTOGRÁFICO:



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/Oct/2019

		 	
Foto No. 1	Descripción: Realización de filtro francés, incluye excavación compactación subrasante, geotextil, grava para filtro, instalación de tubería. Excavación del terreno existente para realización de cárcamos.	Foto No. 2	Descripción: Excavación, compactación y fundición de las cajas de inspección. Corte de pavimento para la instalación de tubería de alcantarillado.
RECIBO A SATISFACCIÓN: N.A			
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se ha desarrollado la obra según las especificaciones del contratante. Cumpliendo los anexos técnicos, estudios previos, y pliego de condiciones.			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/Oct/2019

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 <hr/> FERNANDO ALBERTO PADILLA RAMIREZ CC. 16.720.470
Fecha de suscripción del informe de supervisión: <u>13 DE DICIEMBRE DE 2019</u>
