

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DEL 04 DE ENERO DE 2023

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 05
PERIODO: 25 DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024

**“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE BOYACA.”**



ELABORÓ: CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
NIT. 901.063.647-3 R.L. JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
CONTRATISTA



APROBÓ: CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1 R.L. JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ NIT 891.800.498-1
ENTIDAD CONTRATANTE



1. TABLA DE CONTENIDO

	pág.
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS	3
2.1 ANTECEDENTES	3
2.2 LOCALIZACIÓN	4
2.3 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.4 INFORMACIÓN CONTRACTUAL:.....	10
2.4.1 Aspectos Contractuales	11
2.5 Alcance e impacto del proyecto.....	11
2.6 ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO DE OBRA.....	12
2.6.1 Forma de Pago	12
2.7 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas	12
2.8 Relación de personal del contrato de obra.....	16
2.9 Estados de avance.....	17
2.10 Estado general del tiempo	17
2.11 Relación de Actas Generadas.....	17
2.12 Resumen de las actividades que ejecutara el contratista de obra en cada municipio	17
2.13 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	26
2.14 Equipos y materiales utilizados por el contratista	36
2.12 SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA.....	36
3. RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA	36
4. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	37
5. ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS	37
5.1 ENSAYOS REALIZADOS	37
6. UBICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES	42
7. REGISTRO FOTOGRAFICO	43
8. ANEXOS	45

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de obra, elaborado por **CONSTRUCTORA PAIS SAS** en cumplimiento de lo establecido por la entidad interventora y los documentos que son parte integral del contrato de obra N 002 que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.” firmado el día cuatro (04) del mes de Enero del año 2023 entre la gobernación de BOYACÁ y CONSTRUCTORA PAIS SAS con fecha de inicio del día veinticinco (25) del mes de Agosto de 2023.

Así mismo en este documento se registra y se dan a conocer las actividades ejecutadas, así como de cada uno de los procesos constructivos empleados y demás información concerniente relacionadas con el objeto del contrato de Obra Pública No. 002 del 2023 con el objeto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.” Asimismo, la ejecución de labores técnicas y administrativas que permitan dar cabal cumplimiento al objeto contractual.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS

2.1 ANTECEDENTES

El Gobernador de Boyacá, por medio del decreto 000400 de 04 de mayo de 2022 declara la situación de calamidad pública en parte del territorio del departamento de Boyacá, prorrogada mediante decreto 0660 de 01 de septiembre de 2022 y ampliada por el decreto 1696 del 26 de octubre de 2022, lo anterior en uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas por los artículos 2,209 y 305 de la constitución política, la ley 2200 de 2022 y artículos 57 y siguientes de la ley 1523 de 2012.

Mediante Circular CDGRD-003-2022, del 02 de marzo de 2022, la UAEGRD lanzó un plan de contingencia frente a la primera temporada de lluvias de 2022, atendiendo los métodos de pronóstico (IDDEAM-IRI), que advertían que los volúmenes de precipitación estaban en aumento, razón por la cual era necesario realizar una serie de recomendaciones, entre otros, con el propósito de alertar a la comunidad con el fin de adelantarse y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier situación de desastre.

2.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.” fue suscrito entre la gobernación de BOYACÁ y CONSTRUCTORA PAIS SAS, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia de acuerdo a la localización relacionada a continuación:



Ilustración 1. Municipios de Boyacá Afectados por Temporada Invernal.

2.3 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se desarrollará en los siguientes municipios al Occidente del departamento de Boyacá:

PAUNA

Pauna es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 149 km de Tunja, la capital del departamento.

El municipio limita al norte con Florián (Santander), al sur con Caldas y Maripí, al oriente con Briceño y Tununguá y al occidente con Otanche y San Pablo de Borbur.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°41'29.48"N	73°59'37.61"O	1278



Ilustración 2. Localización Proyecto en Pauna Boyacá

MARIPÍ

Maripí es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 115 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento y a 40 km aproximadamente del municipio de Chiquinquirá capital de la provincia. Limita con los municipios de Pauna, Buenavista, Coper, San pablo de Borbur, Caldas y Muzo.

COORDENADAS SECTOR LAGUNAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°34'43.21" N	74°01'15.65" W	1312

COORDENADAS SECTOR LAS CRUCES		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°31'37.56" N	74°02'19.06" W	1088

COORDENADAS SECTOR NARAPAY		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°31'09.31" N	74°02'16.94" W	904

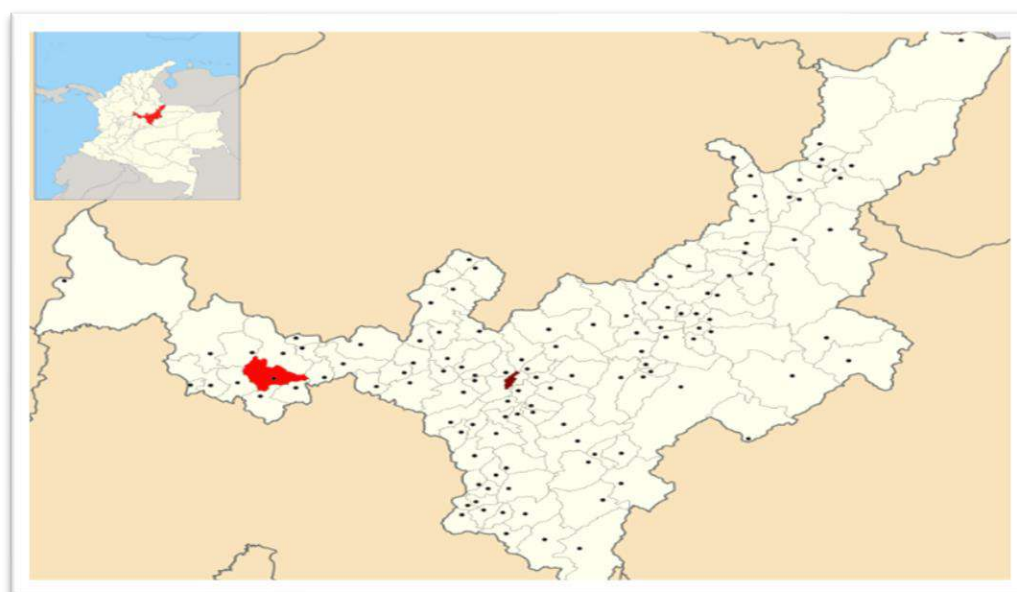


Ilustración 3. Localización proyectos en Maripi Boyacá.

COPER

Coper es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 133 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento y a 65 km aproximadamente del municipio de Chiquinquirá capital de la provincia. Limita con los municipios de Maripi, Paimé, San Cayetano, Muzo, Buenavista y Carmen de Carupa.

COORDENADAS ESCUELA CUCUNUBA		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°26'7.99"	74°2'15.61"	1194

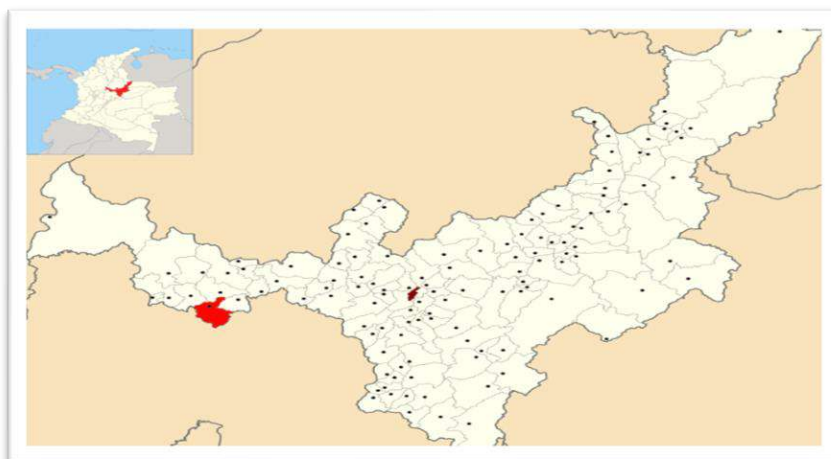


Ilustración 4. Localización proyecto en Coper Boyacá.

LA VICTORIA

Los municipios de Quípama y la Victoria se localizan en la provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá. Quípama limita con los municipios de Muzo, Otanche y La Victoria (Departamento de Boyacá), y con los municipios de Paimé y Yacopí (Departamento de Cundinamarca). La Victoria limita al norte y este, con el municipio de Quípama, Boyacá; al sur y al oeste, con el departamento de Cundinamarca.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°32'04.07" N	74°11'38.08" W	1277

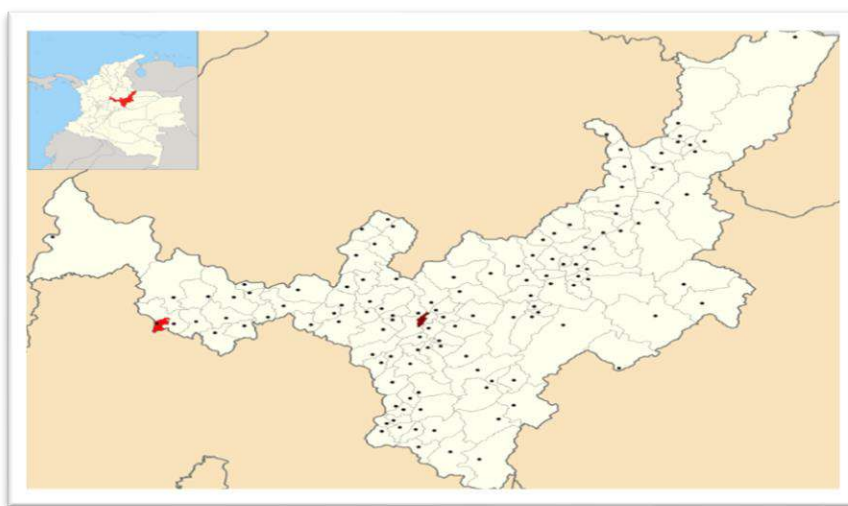


Ilustración 5. Localización Proyecto en la Victoria Boyacá.

SAN PABLO DE BORBUR

San Pablo de Borbur es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá.

El municipio está situado a unos 65 km de la ciudad de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con Otanche y Pauna, al sur con Muzo, al oriente con Maripí y Pauna y al occidente con Otanche.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°37'31.79" N	74° 9'7.47" O	1251

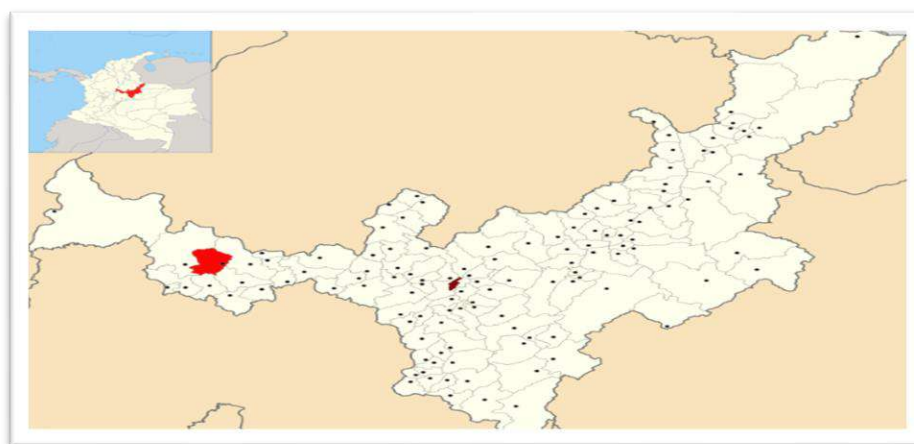


Ilustración 6. Localización Proyecto en San Pablo de Borbur Boyacá

PUERTO BOYACÁ

Puerto Boyacá es un municipio y puerto colombiano del departamento de Boyacá. Es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio y con una población cercana a los 50.000 habitantes.

También es a la vez el principal puerto fluvial del departamento de Boyacá. El tramo vial Departamental D1557201 (Las Mercedes – El 14) visitado hace parte de la red terciaria a cargo de la Gobernación de Boyacá este tramo comunica a las veredas de Las Mercedes, Las Pavitas, Puerto Pineda, El Trapiche y Los Naranjos.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°50'51.40" N	74°24'30.48"O	278

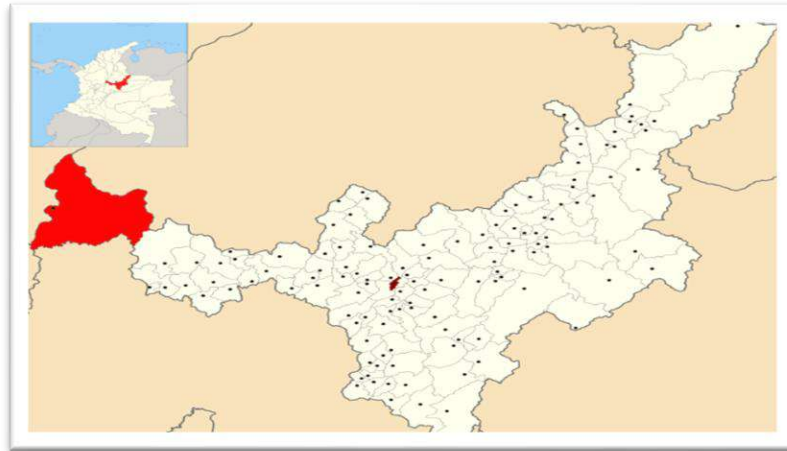


Ilustración 7. Localización Proyecto en Puerto Boyacá

MUZO

Muzo es un municipio colombiano, localizado en la provincia de occidente del departamento de Boyacá. El municipio es conocido por sus yacimientos esmeralderos. Se encuentra a 170 km de Tunja la capital del departamento y a 90 km de Chiquinquirá la capital de la provincia.

Los puntos objeto de la visita se encuentran ubicados en la red vial entre los sectores Cantino - La Vega, Muzo - la Mina y Santa Bárbara – Muzo.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°35'43.5" N	74°07'58.8" W	647

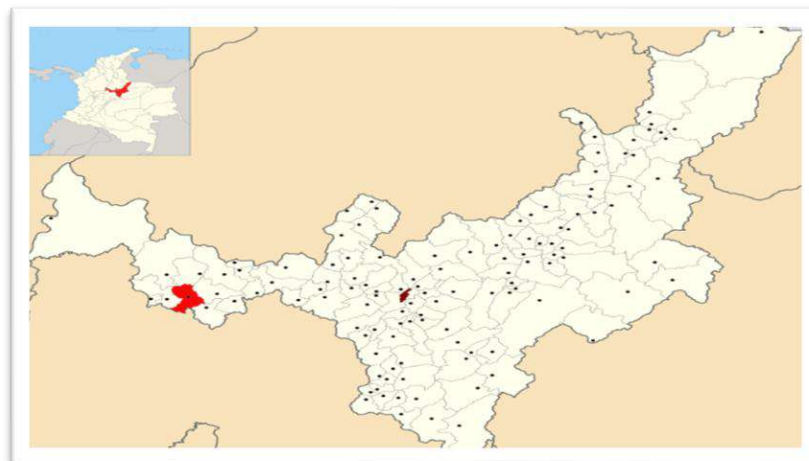


Ilustración 8. Localización Proyecto en Muzo Puente la Caca.

BRICEÑO

Briceño es un municipio colombiano, ubicado en la provincia de occidente del departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 130 km a la ciudad de Tunja, capital del departamento.

Los puentes objeto de protecciones en su mayoría se localizan sobre la red vial del departamento, identificada con código 60BY06, denominada: CRUCE RUTA 60 (PIEDRA GORDA) - LA VENTA SECTOR PIEDRA GORDA LIMITES CON SANTANDER; no obstante, también se encuentran puentes de la red municipal o terciaria.

COORDENADAS		
LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
5°40'11.95"N	73°55'51.94"O	1278

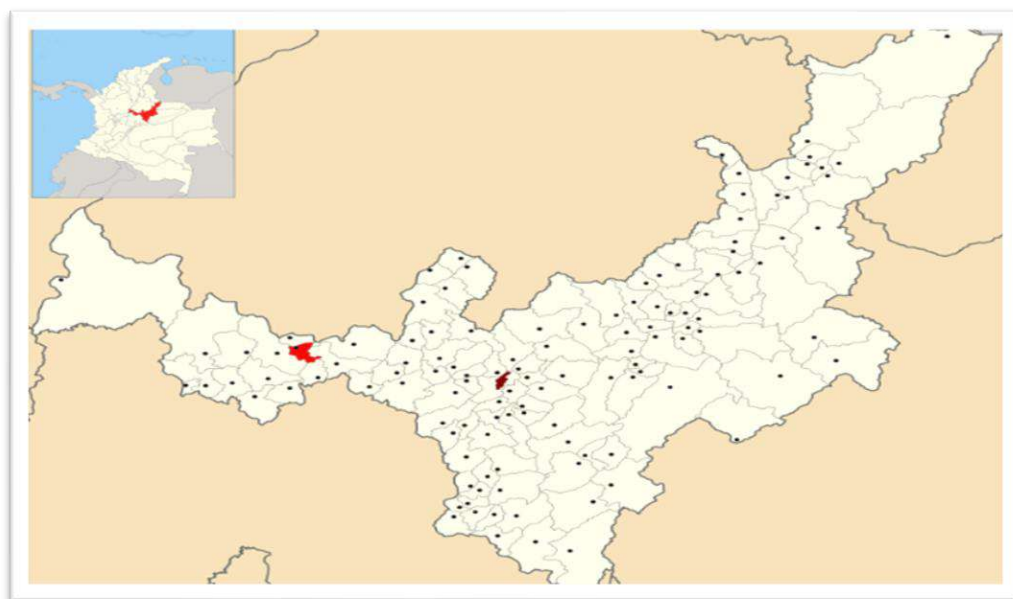


Ilustración 9. Localización Proyecto Briceño Boyacá

2.4 INFORMACIÓN CONTRACTUAL:

El día 04 de enero del 2023, se firmó virtual el Contrato de Obra No. 002 de 2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.”, entre CONSTRUCTORA PAIS S.A.S, en su calidad de CONTRATISTA, y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE

2.4.1 Aspectos Contractuales

ASPECTOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No	002 DEL 04 DE ENERO DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBRENACIÓN DE BOYACÁ NIT 891.800.498-1
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S. NIT. 901.063.647-3 JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO C.C. 80.217.561 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1,522,157,240.00).
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRORROGA No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2024
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	"Mejores vías para Boyacá que avanza"

Tabla 1. Aspectos Contractuales del contrato de Obra.

2.5 Alcance e impacto del proyecto.

De acuerdo a las visitas de inspección realizadas por los profesionales de la dirección técnica y de obras de la secretaría de Infraestructura, se realizarán obras de mitigación que permitan la estabilización y puesta en funcionamiento de los tramos viales descritos.

El objeto del contrato de obra es realizar la construcción de diferentes obras de mitigación sobre la red vial departamental del occidente de Boyacá en ocho municipios del departamento, los cuales se ha visto afectados por la temporada de lluvias, por ende, se deberán atender las necesidades urgentes y garantizar la protección de las estructuras a intervenir.

2.6 ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO DE OBRA

2.6.1 Forma de Pago

El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

- El treinta por ciento (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo.
- El sesenta por ciento (60%) se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el supervisor delegado y con Vo. Bo del director de desarrollo de la infraestructura vial, que correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados.
- El diez (10%) restante, correspondiente al último pago, que se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación.

FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA				
PAGO	COMPONENTE	FORMA DE PAGO	PORCENTAJE	VALOR A PAGAR
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	ANTICIPO	30%	\$ 456.647.172,00
2		ACTAS DE RECIBO PARCIAL	60%	\$ 913.294.344,00
3		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	\$ 152.215.724,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				\$ 1.522.157.240,00

2.7 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

El contrato de obra pública No. 002 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA SEXTA “GARANTÍAS”, establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ES DECIR POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE ESTE.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
EL AMPARO DEBE PROTEGER AL DEPARTAMENTO DE EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL QUE SURJA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE SU CONTRATISTA; IGUALMENTE DEBE CUBRIR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL QUE SURJAN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO, QUE ACREDITE QUE EL SUBCONTRATISTA CUENTA CON UN SEGURO PROPIO CON EL MISMO OBJETO Y QUE LA ENTIDAD ESTATAL SEA EL ASEGURADO	IGUAL AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE A 300 SMMLV

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según acta de inicio del contrato de obra, Pólizas expedidas el 27 de septiembre del 2023 por la entidad aseguradora (SEGUROS MUNDIAL S.A.).

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. CBC-100041968 (ANEXO 2)			
ASEGURADORA	COMPANIA SEGUROS MUNDIAL S.A.		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/09/2023		
AMPARO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2023	01/07/2024	\$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25/08/2023	25/01/2024	\$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	25/08/2023	01/07/2027	\$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	25/01/2024	25/01/2027	\$ 304,431,448.00

Las Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas de acuerdo al acta de inicio del contrato de obra del día 25 de agosto del 2023, Pólizas expedidas el 02 de octubre del 2023 por la entidad aseguradora (SEGUROS MUNDIAL S.A.).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. CBC-100007126 (ANEXO 2)			
ASEGURADORA	COMPañIA SEGUROS MUNDIAL S.A.		
FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2023		
AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	04/01/2023	01/07/2024	\$ 348,000,000.00
PATRONAL	04/01/2023	01/07/2024	\$ 104,400,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/01/2023	01/07/2024	\$ 104,400,000.00
Vehículos propios y no propios	04/01/2023	01/07/2024	\$ 104,400,000.00

El día 9 de octubre de 2023 se da aprobación de las pólizas de cumplimiento por parte de la secretaria de contratación de la Gobernación de Boyacá y el mismo día se aprobación de la responsabilidad civil extracontractual por parte de la secretaria de contratación de la Gobernación de Boyacá por medio de la plataforma SECOP II.

A la fecha las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad Civil Extracontractual se encuentran actualizadas de acuerdo a acta de inicio del día 25 de agosto de 2023, fueron aceptadas por secretaria de contratación.

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO BURGOS GUIO 09-10-2023 17:32

Id de la garantía CO1.WRT.12596517

Referencia de la garantía

Estado Aceptada

Justificación

- ☐ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza CBC-100007126

Tomador CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.

Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	348.000.000,00 COP	1/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Descripción	Nombre del documento	

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO BURGOS GUIO 09-10-2023 17:32

Id de la garantía CO1.WRT.12596503
Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO
Estado Aceptada
Justificación

- ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza CBC-100041968
Tomador CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	456.647.172,00 COP	25/01/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	228.323.586,00 COP	1/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

2.8 Relación de personal del contrato de obra.

Para el periodo comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero de 2024, se relaciona el personal de obra que estará presente durante la ejecución de Obra.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	C.C. No. 18'386.964 DE CALARCA, QUINDIO	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	C.C. No. 74'373.208 DE DUITAMA, BOYACÁ	INGENIERO CIVIL
GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	C.C. No. 79'383.126 DE BOGOTÁ D.C.	GÉOLOGO
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74'321.878 DE SOACHA, CUNDINAMARCA	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS)

ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74'321.878 DE SOACHA, CUNDINAMARCA	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS)
ASESOR HIDRÁULICO O HIDROLÓGICO	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	C.C. No. 9'658.759 DE YOPAL CASANARE	INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRICOS URBANOS

2.9 Estados de avance

A la fecha del presente informe con corte al día 24 de enero se reportan los siguientes estados de Avance:

- Avance de Tiempo Transcurrido: **49,03 %**
- Avance de Obra Ejecutada: **0 %**
- Avance de Obra Programada: **55 %**

2.10 Estado general del tiempo

Para el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024 no se reporta el control y seguimiento a las condiciones climáticas, el contratista a la fecha del presente informe no ha iniciado las actividades en los frentes de Obra.

2.11 Relación de Actas Generadas

Para el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024 no se presenta relación de actas.

2.12 Resumen de las actividades que ejecutara el contratista de obra en cada municipio

Muzo

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE MUZO-SECTOR LA CACO			
1		PRELIMINARES	
1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

2	RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPANAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.		
2,1	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
2,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
2,3	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
2,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
2,5	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	METRO LINEAL
2,6	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
2,7	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	METRO CÚBICO
2,8	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
2,9	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
2,10	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	METRO LINEAL
2,11	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
2,12	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector las Cruces

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAS CRUCES			
3	PRELIMINARES		
3,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
4	ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN, DISIPADORES Y FILTROS		
4,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

4,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
4,3	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
4,4	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
4,5	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
4,6	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
4,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
4,8	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
4,9	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
4,10	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
4,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

La Victoria

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE LA VICTORIA			
5	PRELIMINARES		
5,1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KILÓMETRO
5,2	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
6	DESPLAZAMIENTO VIAL Y PUNTOS CRÍTICOS A LO LARGO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL D1558005 QUÍPAMA - LA VICTORIA TERRACEO, AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES		
6,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

6,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
6,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
6,4	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	METRO CÚBICO
6,5	3.03.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	METRO LINEAL
6,6	3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (SOLADOS)	METRO CÚBICO
6,7	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	METRO CÚBICO
6,8	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	METRO CUADRADO
6,9	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
6,10	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
6,11	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
6,12	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
6,13	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
6,14	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	KILÓMETRO
6,15	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
6,16	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
6,17	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Puerto Boyacá

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
------	------------	-------------	--------

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - SECTOR LA CONFUSA			
7	PRELIMINARES		
7,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
8	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBO, CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE, APLICACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO		
8,1	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	METRO CÚBICO
8,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
8,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
8,4	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
8,5	3.10.03	CONCRETO DE 28 MPA - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS, LONGITUD DE 0 A 7.0 MTS.	METRO CÚBICO
8,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
8,7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
8,8	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
8,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Briceño

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE BRICEÑO			
9	PRELIMINARES		
9,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
10	RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.		
10,1	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

10,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
10,3	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
10,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
10,5	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	METRO LINEAL
10,6	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
10,7	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	METRO CÚBICO
10,8	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
10,9	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
10,10	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	METRO LINEAL
10,11	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
10,12	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Briceño

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE PAUNA - SECTOR CARARE			
11	PRELIMINARES		
11,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
12	RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.		
12,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
12,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

12,3	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
12,4	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
12,5	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
12,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
12,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
12,8	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector Lagunas Santa Rosa

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAGUNAS SANTA ROSA			
13	PRELIMINARES		
13,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
14	TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA		
14,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
14,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
14,3	1.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12	METRO CÚBICO
14,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
14,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
14,6	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
14,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

14,8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
14,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector Narapay

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR NARAPAY			
15	PRELIMINARES		
15,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
16	TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, APLICACIÓN DE MATERIAL		
16,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
16,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
16,3	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
16,4	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
16,5	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
16,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
16,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
16,8	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	METRO CÚBICO
16,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Coper

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE COPER - SECTOR ESCUELA CUCUNUBA			
17	PRELIMINARES		
17,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
18	AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, REDIRECCIONAMIENTO CAUCE QUEBRADA		
18,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
18,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
18,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
18,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
18,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
18,6	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UNIDAD
18,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
18,8	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	METRO CÚBICO
18,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

San Pablo de Borbur

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - SECTOR CAIPAL VÍA MUZO			
19	PRELIMINARES		
19,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
20	TERRACEO, AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES.		

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DEL OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>
--	---	---

20,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
20,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
20,3	1.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12	METRO CÚBICO
20,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
20,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
20,6	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
20,7	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UNIDAD
20,8	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
20,9	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
20,10	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
20,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM
11. TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS DESPUES DE 5 KM			
21	PRELIMINARES		
21,1	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM

2.13 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Estudios y diseños

A la fecha del presente informe comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero de 2024 se atienden a las observaciones y solicitudes por la supervisión de la Gobernación de Boyacá donde junto con la interventoría en mesa técnica y reuniones llevadas a cabo en las

instalaciones de la gobernación, han solicitado minimizar los estudios y diseños, o de ser el caso omitir actividades que no afectan la estabilidad de la estructura a implementar, ya que los estudios presentados han superado el presupuesto contractual, se continua realizando los ajustes de diseño y ajustes en los presupuestos con la finalidad de reducir el valor presentado.

Para el mes de enero de 2024, se han radicado a la interventoría todos los componentes que contemplan los estudios y diseños (Topografía, Estudio de suelos – Recomendaciones de Cimentación y Estudio Hidráulico), cada componente con todos los soportes para los 10 puntos contractuales, dando cumplimiento a lo descrito de en el contrato.

ESTUDIOS DE SUELOS

Los estudios de suelos se comprenden entre los 10 frentes de trabajo El presente estudio tiene como propósito el reconocimiento de las condiciones geotécnicas, estratigráficas e hidrogeológicas presentes en la zona con las cuales servirán de base para la determinación de las características de capacidad portante y análisis de asentamientos para la obra proyectada. El alcance del estudio prevé análisis de estabilidad de taludes. No se prevé ensayos de colapso y tipo REMI.

Para determinar las condiciones geotécnicas del subsuelo en el sitio del proyecto, se realizaron sondeos de reconocimiento y muestreo entre 3.50 y 4.00 metros de profundidad aproximadamente, a los cuales se le tomaron muestras alteradas con cuchara partida (Ensayo SPT) y muestras inalteradas en tubo shelby, con el fin de determinar propiedades físicas y mecánicas del subsuelo, las condiciones de agua subterránea y las características geotécnicas para cada nivel de suelo explorado. De la misma manera se realizaron ensayos de resistencia en campo correspondientes a ensayos de penetración estándar SPT en donde por medio de correlaciones derivadas de la geotecnia se determinó la resistencia del material.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la exploración y estudios del suelo para los 8 frentes contractuales:

➤ **San Pablo de Borbur Sector el Silencio.**



➤ **Pauna**



➤ **Maripi Narapay**



➤ **Maripi Las Cruces**



➤ **Maripi Las Lagunas**



➤ **Muzo – Sector Puente la Caco.**



➤ **Puerto Boyacá – Sector la Confusa.**




➤ **Briceño – Sector Peña Quemada**



ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO

Es fundamental realizar un estudio hidrológico de la zona afectada para comprender los patrones de lluvia, la intensidad de las precipitaciones y el caudal de agua esperado. Esto ayudará a determinar las dimensiones y capacidades requeridas para los sistemas de drenaje. El diseño hidráulico para obras de mitigación sobre la red vial afectada por la temporada de lluvias es una parte crucial del proceso de construcción. Este tipo de obras se enfocan en minimizar los impactos negativos de las lluvias en las carreteras, como inundaciones, erosión del suelo y daños a la infraestructura vial.




En el presente documento se realiza el estudio hidrológico y los respectivos cálculos hidráulicos para la dimensión de las estructuras que realizarán el manejo de aguas de infiltración que podrían afectar las obras a realizar en los municipios de Maripi-Sector Las Cruces y Maripi-Sector Lagunas. Por otra parte, según las recomendaciones de especialistas hidráulicos surge la medida de que en las obras que se plantean como contención de movimiento de tierras en este caso los gaviones no se genera ningún tipo de obra hidráulica, debido a la acción tipo filtro que tiene el material de enrocado que conforma el bloque de gaviones por ende no hay afectaciones por acciones hidráulicas.


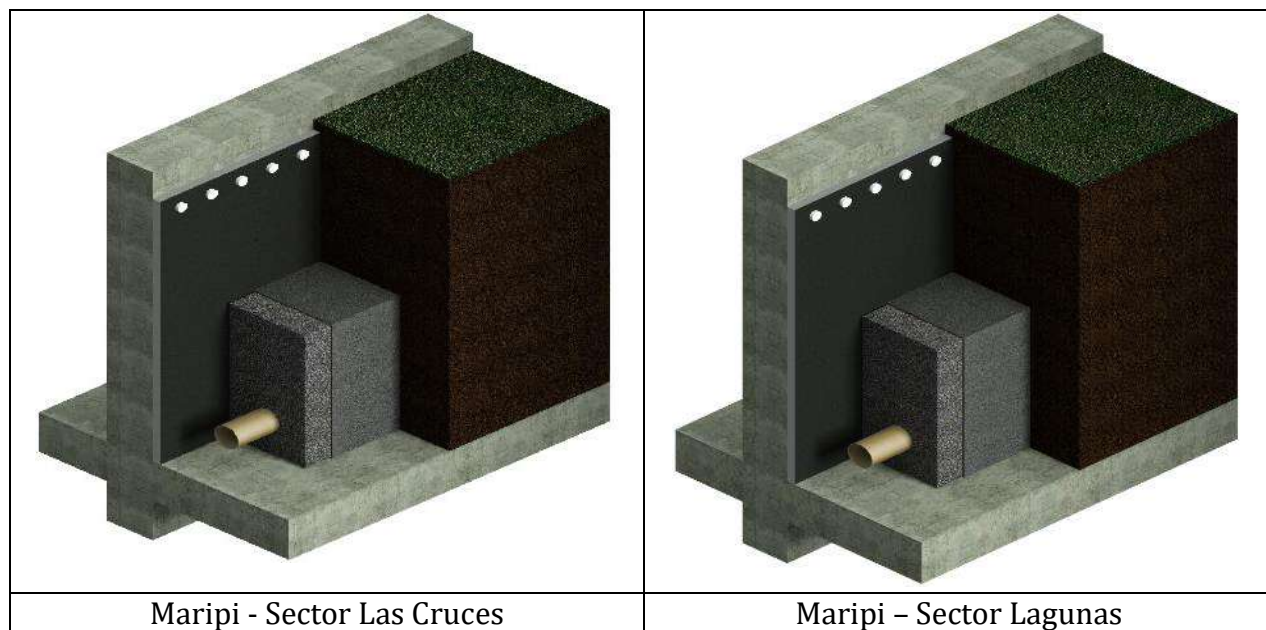



DISEÑO ESTRUCTURAL

Se realiza el diseño estructural para cada uno de los 10 puntos de trabajo relacionados en la parte inicial de la elaboración de estudios y diseños. El cual se compone por Muros de Contención, Gaviones, Muro en tierra reforzada, Alcantarilla Tipo Invias.

Para el caso en particular del municipio de Muzo Sector Puente la Caco, bajo la premisa de controlar los fenómenos de socavación sobre las unidades de infraestructura del puente y la afectación de los taludes expuestos a la acción erosiva del flujo se proyectan obras de protección tipo revestimiento, las cuales de acuerdo con la accesibilidad a materiales y las condiciones hidráulicas del flujo en la corriente de agua superficial, se han concebido mediante la disposición de mantos de colchacreto articulado.
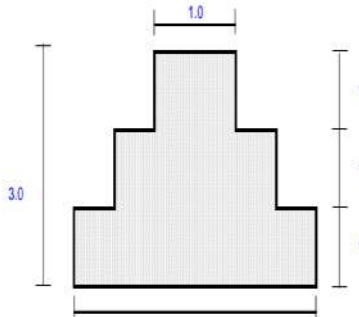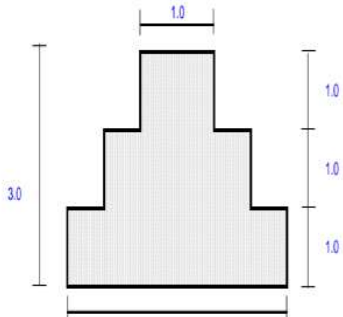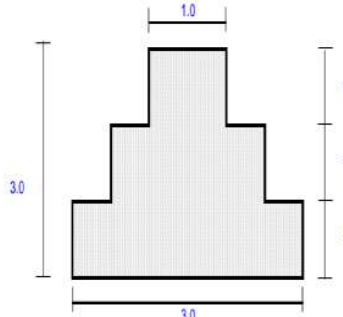
<p>1. Predimensionamiento:</p> 	<p>1. Predimensionamiento:</p> 	<p>1. Predimensionamiento:</p> 
Pauna	San Pablo de Borbur	Maripi – Sector Narapay

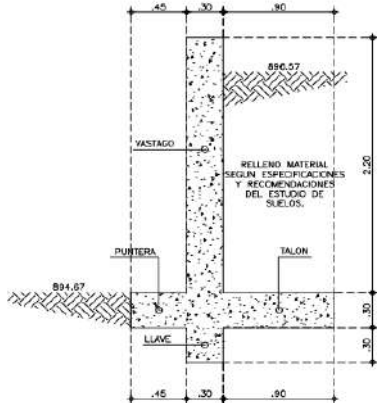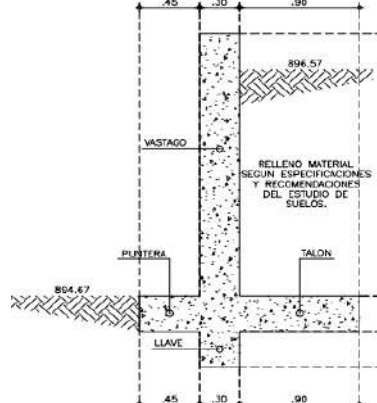	
Maripi - Sector Las Cruces	Maripi – Sector Lagunas

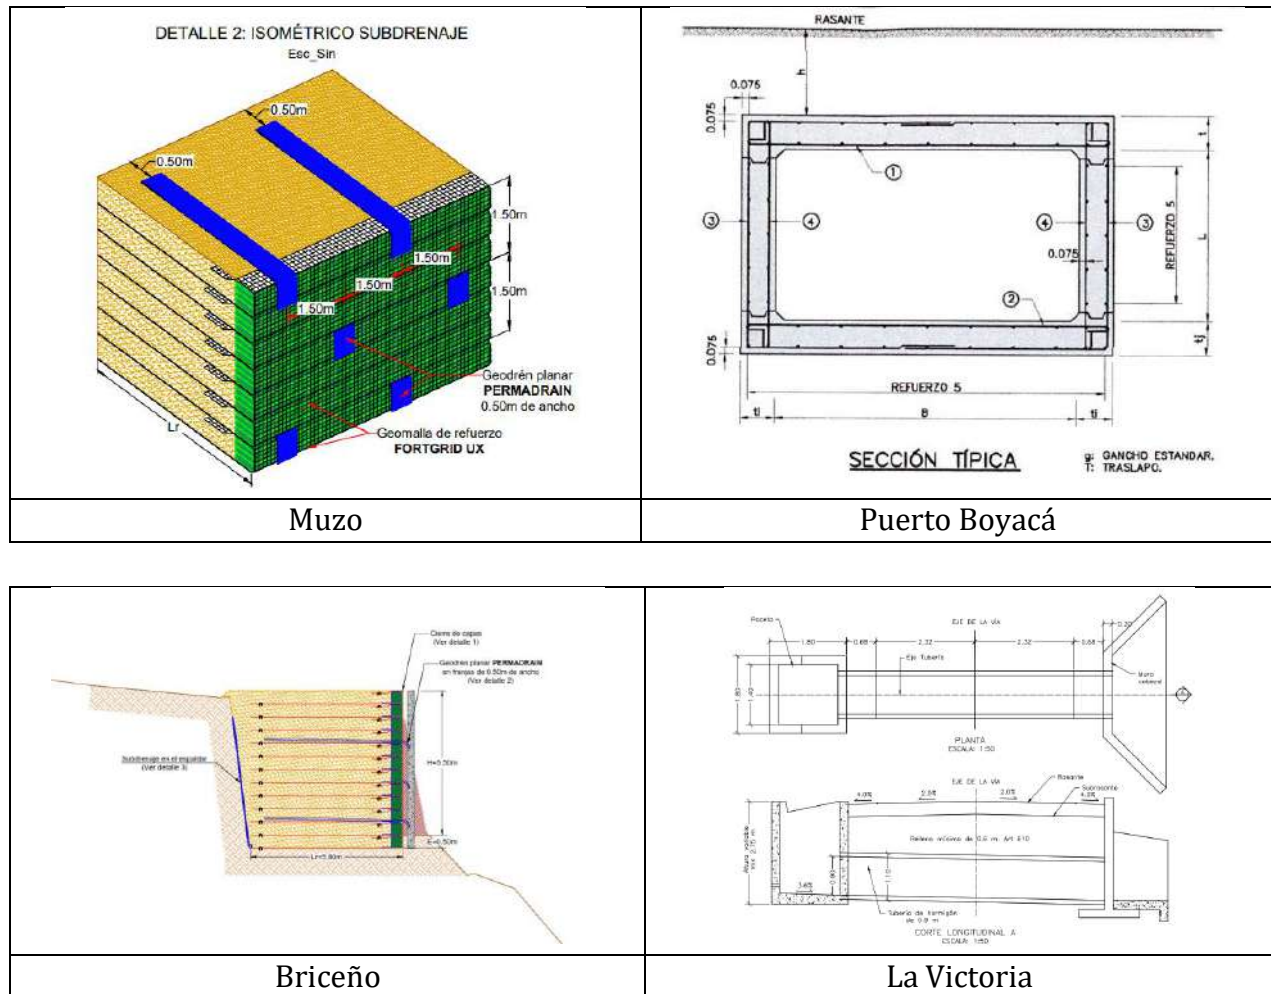

ESTUDIO TOPOGRÁFICO

El estudio topográfico está comprendido en los 10 frentes de trabajo donde se van a realizar las actividades de obra, se realizó la visita a los municipios para identificar los tramos a realizar los levantamientos, La comisión de topografía realiza los levantamientos de los sectores a intervenir en los municipios recopilando toda la información, toma de puntos para generar planta, perfiles, curvas de nivel, eje del proyecto longitudinal y secciones trasversales del terreno.

La ejecución del levantamiento se realizará con base en los procedimientos requeridos por la supervisión garantizando el buen desarrollo de las actividades del levantamiento.

San Pablo de Borbur: Se realiza el levantamiento topográfico de la zona de interés en el Municipio de Borbur en donde se van a realizar la ejecución de actividades en obra.



Levantamiento topográfico

Pauna: Se realiza un levantamiento topográfico de la zona de interés tomando evidencias del talud que está afectando el paso vehicular donde se van a realizar los trabajos para el mejoramiento mismo de la vía.



Levantamiento topográfico

Maripi – Sector las Cruces: Se realizan los levantamientos y la materialización de puntos sobre los frentes de trabajo ubicados en los sectores de Las Cruces, Narapay y Las Lagunas, con la identificación del terreno y plasmado con la nomenclatura correspondiente.



Maripi – Sector las Narapay



Maripi – Sector las Lagunas



Muzo: Se realiza un levantamiento topográfico de la zona de interés tomando evidencias del talud que está afectando el paso vehicular donde se van a realizar los trabajos para el mejoramiento mismo de la vía.



Levantamiento topográfico

Puerto Boyacá: Se realiza el levantamiento topográfico de la zona de interés en el Municipio de Puerto Boyacá en donde se van a realizar la ejecución de actividades en obra.



Levantamiento topográfico

Coper: Se realiza el levantamiento topográfico de la zona de interés en el Municipio de Coper en donde se van a realizar la ejecución de actividades en obra.



Levantamiento topográfico.

2.14 Equipos y materiales utilizados por el contratista

EQUIPO Y MATERIALES:

- ESTACIÓN TOTAL TOPCON GTS 246NW SERIAL V20160
- ACCESORIOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS.
- HERRAMIENTA MENOR
- SOFTWARE COMO TOPCONLINK, AUTOCAD Y CIVILCAD INTERNET PÁGINA DEL IGAC.
- SOFTWARE COMO MAGNA SIRGAS PRO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDENADAS INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI (IGAC)
- PRISMA
- TUBO SHELBY SPT
- MALACATE DE ROTACIÓN
- VARILLAS O TUBOS DE PERFORACIÓN
- BROCAS TRICONO
- BARRENAS HELICOIDALES DE VÁSTAGO HUECO

2.12 SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños, no se han radicado actas parciales.

3. RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA

La relación de la correspondencia enviada durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024 del presente, se muestra en la siguiente tabla:

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO A	ASUNTO
C.P. 002-23-017	24-ene-23	JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ Representante Legal CONSORCIO CARINGA	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA No.4 - DICIEMBRE 2023.

4. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el periodo del presente informe no se han realizado actividades de control ambiental y seguridad industrial

5. ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS

5.1 ENSAYOS REALIZADOS

La determinación de las características de cada uno de los estratos, incluye los siguientes ensayos:

- Contenido de agua (Humedad) NTC - 1495
- Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200 NTC -77
- Determinación del Límite Líquido NTC – 4630 Método A
- Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad NTC –4630 Mét. A
- Compresión Inconfinada en muestras de suelos NTC - 1527.
- Ensayos de penetración estándar SPT ASTM D1586.

La totalidad de las muestras obtenidas fueron identificadas en campo y laboratorio y sobre un número representativo de ellas se efectuaron los diferentes ensayos.

A continuación, se presenta la tabla resumen con los resultados de los ensayos realizados en campo y laboratorio:

Ensayos realizados en San Pablo de Borbur

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-2,50)	1,25	8,55	33,05	25,10	8,0	-2,08	8	32,02	3,7	64,3	G M
S-2 (0,00-1,70)	0,85	16,07	35,17	23,72	11,5	-0,67	11	22,83	14,7	62,5	G C
S-2 (1,70-4,00)	2,85	14,94	37,07	25,50	11,6	-0,91	11	25,91	7,9	66,2	G M

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-2,50)	Material compuesto por grava limosa de color gris con café.
S-2 (0,00-1,70)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café
S-2 (1,70-4,00)	Material compuesto por grava limosa de color gris con café.

Ensayos realizados en Pauna

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación									
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio (%)	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas
S-1 (0,05-1,20)	0,63	27,49	45,69	26,08	19,6	0,07	17	40,91	59,1	
S-1 (1,20-3,50)	2,35	18,95	43,52	27,60	15,9	-0,54	13	48,67	51,3	
S-2 (0,60-4,00)	2,30	23,62	48,50	31,72	16,8	-0,48	15	45,97	21,5	32,6

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,05-1,20)	Material compuesto por grava arcillosa con arena de color café.
S-1 (1,20-3,50)	Material compuesto por grava limosa de color café
S-2 (0,60-4,00)	Material compuesto por grava limosa de color café

Ensayos realizados en Maripi - Sector Narapay

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-1,90)	0,95	19,86	41,48	24,18	17,3	-0,25	13	37,64	31,9	30,5	G C
S-1 (1,90-3,50)	2,70	21,48	31,51	20,50	11,0	0,09	14	42,31	46,9	10,8	G C
S-2 (0,00-2,00)	1,00	13,68	45,99	26,24	19,7	-0,64	10	33,30	27,7	39,0	G C
S-2 (2,00-3,00)	2,50	13,84	29,44	18,62	10,8	-0,44	10	37,84	37,5	24,6	G C
S-3 (0,00-2,50)	1,25	11,16	44,37	26,09	18,3	-0,82	9	40,12	28,2	31,7	G C

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-1,90)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.
S-1 (1,90-3,50)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris
S-2 (0,00-2,00)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.
S-2 (2,00-3,00)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris
S-3 (0,00-2,50)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.

Ensayos realizados en Maripi - Sector Las cruces.

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-1,80)	0,90	9,07	31,74	22,84	8,9	-1,55	8	22,72	34,8	42,5	G C
S-1 (1,80-3,00)	2,40	13,00	34,89	22,00	12,9	-0,70	10	20,95	25,2	53,8	G C
S-2 (0,00-1,00)	0,50	13,27	34,16	26,20	8,0	-1,63	10	15,12	12,5	72,4	G M
S-2 (1,00-3,00)	2,00	9,06	32,12	23,20	8,9	-1,59	8	18,91	18,2	62,9	G C
S-3 (0,00-2,00)	1,00	8,11	32,38	25,21	7,2	-2,39	7	14,18	21,1	64,7	G M

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-1,80)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.
S-1 (1,80-3,00)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.
S-2 (0,00-1,00)	Material compuesto por grava limosa de color gris con café
S-2 (1,00-3,00)	Material compuesto por grava arcillosa de color gris con café.
S-3 (0,00-2,00)	Material compuesto por grava limosa de color gris con café

Ensayos realizados en Maripi - Sector Lagunas

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0,075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-0,80)	0,40	13,43	40,35	26,78	13,6	-0,98	10	21,93	42,9	35,1	G M
S-1 (0,80-2,50)	1,65	15,05	38,78	26,20	12,6	-0,89	11	42,39	57,0	0,6	G M
S-2 (0,00-2,00)	1,00	14,43	48,34	32,78	15,6	-1,18	10	50,23	24,2	25,6	M L
S-3 (0,00-2,00)	1,00	12,64	46,08	29,97	16,1	-1,08	10	26,79	21,9	51,3	G M

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-0,80)	Material compuesto por grava limosa con arena de color gris.
S-1 (0,80-2,50)	Material compuesto por grava limosa de color gris.
S-2 (0,00-2,00)	Material compuesto por limo arenoso con grava de color gris.
S-3 (0,00-2,00)	Material compuesto por grava limosa de color gris.

Ensayos realizados en Muzo

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-3,50)	1,75	10,65	37,96	24,58	13,4	-1,04	9	33,10	29,4	37,5	G C
S-2 (0,00-2,50)	1,25	9,77	37,28	25,83	11,4	-1,40	8	58,12	26,0	15,9	M L
S-2 (2,50-7,00)	4,75	10,20	34,75	23,02	11,7	-1,09	8	20,82	18,6	60,6	G C

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-3,50)	Material compuesto por grava arcillosa de color negro
S-2 (0,00-2,50)	Material compuesto por limo arenoso con grava de color negro
S-2 (2,50-7,00)	Material compuesto por grava arcillosa de color negro

Ensayos realizados en Puerto Boyacá

Barreno N° Prof. (m)	Propiedades físicas y clasificación										
	Profundidad promedio del Estrato	Humedad natural (%)	Límite Líquido (%)	Límite plástico (%)	Índice de plasticidad (%)	Índice de liquidez	Humedad de equilibrio	Pasa 200 (<0.075mm)	% Arenas	% Gravas	Clasificación USC
S-1 (0,00-2,60)	1,30	18,65	32,44	23,94	8,5	-0,62	12	80,06	5,3	14,6	M L
S-1 (2,60-5,50)	4,05	24,63	32,57	19,60	13,0	0,39	15	86,73	13,3		C L
S-2 (0,00-0,80)	0,40	31,41	44,53	32,50	12,0	-0,09	18	82,34	17,7	0,0	M L
S-2 (0,80-4,00)	2,40	25,72	28,40	20,94	7,5	0,64	16	52,02	12,3	35,7	C L

Barreno N° Prof. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL
S-1 (0,00-2,60)	Material compuesto por limo con arena de color amarillo
S-1 (2,60-5,50)	Material compuesto por arcilla delgada de color gris.
S-2 (0,00-0,80)	Material compuesto por limo con arena de color amarillo
S-2 (0,80-4,00)	Material compuesto por arcilla delgada con mucha grava de color gris.

6. UBICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES

Para el inicio de las actividades de obra se tiene previsto el suministro de materiales por Agregados el triángulo: Km 22 vía Chiquinquirá – Pauna



COMITÉS DE OBRA

En el periodo del presente informe no se realizaron comités de obra

REPORTE MANEJO DEL ANTICIPO

En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades financieras:

Manejo del anticipo: En el mes de diciembre se llevó a cabo los siguientes movimientos financieros, a la fecha no se cuenta con el desembolso del anticipo.

Saldo inicial a 25 de diciembre 2023	\$ 0
Rendimientos después de gastos	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0.00
Costo de transacciones	\$ 0.00
Retención en la fuente	\$ 0.00
Penalización	\$ 0.00
Saldo Final a 24 enero 2024	\$ 0.00

Entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024 no se realizaron movimientos financieros por parte del contratista.

USO DE EPP

En el periodo del presente informe no se tiene registro de uso de EPP debido a que no se inician actividades en obra.

ANALISIS DEL RIESGO Y CONTROL DE SEGURIDAD

En el periodo del presente informe no se tiene información debido a que no se inician actividades en obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta un registro fotográfico de los trabajos de topografía y estudios de suelos realizados por el contratista de obra durante la etapa de Estudios y Diseños.



SAN PABLO DE BORBUR



MARIPI - SECTOR NARAPAY



PAUNA

MARIPI - LAS CRUCES

MARIPI - LAGUNAS



MUZO



PUERTO BOYACÁ

8. ANEXOS

ANEXO A

SEGUIMIENTO AL CONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCIDENTE

ACTIVIDAD	19/01/2023	20/01/2023	21/01/2023	22/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	04/02/2023	05/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	11/02/2023	12/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	18/02/2023	19/02/2023	20/02/2023	21/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	25/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	04/03/2023	05/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	11/03/2023	12/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	18/03/2023	19/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	25/03/2023	26/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	01/04/2023	02/04/2023	03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	07/04/2023	08/04/2023	09/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/04/2023	16/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	30/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	06/05/2023	07/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	21/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	27/05/2023	28/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	02/06/2023	03/06/2023	04/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	10/06/2023	11/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	17/06/2023	18/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	24/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	01/07/2023	02/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	08/07/2023	09/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	15/07/2023	16/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	22/07/2023	23/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	29/07/2023	30/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	05/08/2023	06/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	12/08/2023	13/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	20/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	27/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	02/09/2023	03/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	16/09/2023	17/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	23/09/2023	24/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	01/10/2023	02/10/2023	03/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	07/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	10/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	14/10/20
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

ANEXO B

SOPORTES DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO A	ASUNTO
C.P. 002-23-017	23-ene-24	JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ Representante Legal CONSORCIO CARINGA	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA No.4 - DICIEMBRE 2023

OF C.P. 002-23-017 ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4_DICIEMBRE 2023.**CONSTRUCTORA PAIS** <constructorapais@hotmail.com>

Mar 23/01/2024 12:08

Para: CONSORCIO CARINGA <consorciocaringa@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (86 KB)

OF C.P. 002-23-017 ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4_DICIEMBRE 2023..pdf;

Cordial Saludo.

ING. JHONATAN MENESES.

Nos permitimos hacer la entrega del informe mensual No.4 del contrato de Obra No. 002 de 2023, para su revisión y Aprobación.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

 [INFORME No.4 OBRA_DICIEMBRE_2023.rar](#)

Cordialmente,

CONSTRUCTORA PAIS

CALLE 18 # 7 - 28 CHIQUINQUIRA

Teléfonos: 3043947366

**CONSTRUCTORA PAIS***Cumplimiento Total*

CERTIFICACIÓN DE
PARAFISCALES SUSCRITA POR
LA EMPRESA DE
INTERVENTORÍA.

ENERO DE 2024.



CC-2422-2023-044

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

Ingeniero

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

C.C

Ingeniero

OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN
Supervisor contrato de interventoría
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

REF: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

ASUNTO: Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista de Obra del mes de enero de 2024.

Cordial saludo,

La interventoría a través del seguimiento SST revisa, verifica y aprueba las planillas de los aportes de seguridad social, afiliaciones y parafiscales del período comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero del 2024, de los profesionales del contratista CONSTRUCTORA PAIS S.A.S conforme a lo requerido por la entidad contratante.

Cordialmente,

JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

DIRECCIÓN:
Carrera 72 L 35 – 06 Sur,
Bogotá D.C.

EMAIL:
consorciocaringa@hotmail.com

TELEFONO:
311 4 77 82 52

CERTIFICACIÓN DE
PARAFISCALES SUSCRITA POR
EL REVISOR FISCAL.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
ENERO DE 2024.



CONSTRUCTORA PAIS

Cumplimiento Total

NIT. 901.063.647-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.328.390 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 212722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUCTORA PAIS S.A.S identificada con NIT 901.063.647-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la empresa, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la empresa durante los últimos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (artículo 3 *Decreto 1047 de 1983*) se realizará en cuanto se obtenga el acta de recibo final.

Lo anterior se certifica en Chiquinquirá, Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2024.

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
REVISOR FISCAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
R/LEGAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212722-T

JEHISSON EDUARDO
POVEDA CASTRO
C.C. 1053328390
RESOLUCION INSCRIPCION 12
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 29/01/2016

225103



NO VALIDA SIN FIRMA

215522

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dccs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6E0699825FE35EC6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053328390 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 212722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLAS
EMPRESA CONTRATISTA.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
ENERO DE 2024.

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIOUINOUIRÁ		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	31/01/2024	74212320	\$90.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2024-01	Y	31/01/2024	74212320	\$90.500

10

TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	74373208	RINCON ZAMBRANO CARLOS AUGUSTO	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74341767	TOTAL A PAGAR
					\$365.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	19	800	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	19	3.200	0	188.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	80.800				80.800	19	1.400	82.200			808	82.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF10	Comfaboy				891800213-8	46.400	19
						800	47.200
							1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	47.200
Pensión	1	185.600	188.800
Riesgos Laborales	1	80.800	82.200
CCF	1	46.400	47.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	365.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74341767	\$365.400

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Salario	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74321878	VERGARA SILVA JIMMY	1	0		S	X																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74212855	TOTAL A PAGAR \$289.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	19	800	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	19	3.200	0	188.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.100				6.100	19	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF10	Comfaboy				891800213-8	46.400	19

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	47.200
Pensión	1	185.600	188.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	46.400	47.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	289.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74212855	\$289.500

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053328390	POVEDA CASTRO JEHISSON EDGARDO	1	0		S	X	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	90
					TOTAL A PAGAR
					\$3.031.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	118.400	0		0		0	0	0	0	118.400	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	467.200	0	0	0	0	0	0		467.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	755.200	0	0	0	0	0	0		755.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	622.100				622.100	0	0	622.100			6.221	622.100	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	401.600	0	0	401.600	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	TOTAL A PAGAR
					\$3.031.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	401.600	401.600
Pensión	3	1.606.400	1.606.400
Riesgos Laborales	1	622.100	622.100
CCF	1	401.600	401.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.031.700	3.031.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTM AIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	\$3.031.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1003774661	MARTIN MONTENEGRO LUIS MIGUEL	1	0			S		X																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
3	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																		230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1049634400	BAUTISTA MACIAS IVAN FERNANDO	1	0			S																		25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1049645784	RUIZ VALERO BRAYAN STEVEN	1	0			S		X																230201	600.000	96.000	0	0	0	0	0	0	EPS041	600.000	24.000	14-4	600.000	5	41.800	CCF10	600.000	24.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1053325259	PINEDA GONZALEZ ANDRES CAMILO	1	0			S																		230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1000123863	CARRANZA PACHON ANDIRI ANETH	1	0			S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
8	CC	1053346534	TINJACA DELGADILLO DAVID STIVEN	1	0			S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
9	CC	1056506586	SIERRA VELANDIA JONNIER SAMUEL	1	0			S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0

PLANILLAS

EQUIPO PROFESIONAL.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.

ENERO DE 2024.

No.	PLANILLAS PERSONAL	CARGO	N DE PLANILLA ENERO DE 2024
1	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	REPRESENTANTE LEGAL	73689369
2	NELSON ODENS MORA FRANCO	DIRECTOR DE OBRA	28628141
3	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	RESIDENTE DE OBRA	28760358
4	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	GEOLOGO	7910257476
5	JIMMY VERGARA SILVA	ASESOR EN ESTRUCTURAS	74341767
6	JIMMY VERGARA SILVA	ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	74341767
7	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	ASESOR HUDRAHULICO O HDROLOGICO	7909429875
8	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	REVISOR FISCAL - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	74212855

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28628141
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELSON ODENS MORA FRANCO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18386964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 12 N033 55	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	NELSONODENS@YAHOO.COM	TELÉFONO	3457072
FAX	3457072	SUCURSAL	7	NOMBRE SUCURSAL	GOBERNACION
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$4.000.000		28628141

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18386964	59	No	No	No	66	1	3711001	Salario	MORA FRANCO NELSON ODENS	\$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18386964																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18386964	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18386964	EPS SURA	30	\$4.000.000	0.1250000	\$500.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	3711001	0.0243600	\$97.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18386964	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$4.000.00 0	0.0060000	\$24.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$640.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$640.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$500.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$500.000	0	\$0	\$0	\$500.000	\$0	0	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$500.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APOORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APOORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$97.500	0	\$0	\$0	\$97.500	0	\$0	\$97.500	0	\$0	\$0	\$97.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR RISARALDA		1		\$24.000	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$500.000
PENSIONES	1	\$640.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$97.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$24.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.261.500



RAZON SOCIAL :	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO
IDENTIFICACION:	CC-74373208
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-02-05
FECHA DE PAGO:	2024-01-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	28760358
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28760358
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 456.000	\$ 456.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2024
----------------------------------	------------

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2024-01	Y	31/01/2024	74212320	10
					TOTAL A PAGAR
					\$90.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre			NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
								Días Mora	
								Valor Mora Aporte	
								Total a Pagar	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2024-01	Y	31/01/2024	74212320	\$90.500

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	74373208	RINCON ZAMBRANO CARLOS AUGUSTO	59	0				N	X																0	0	0	0	0	0	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79383126	NÚMERO PLANILLA:	7910257476	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VICTOR HUGO DIAZ HERRERA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:	enero AÑO	2024	enero AÑO
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 75SUR-81 APTO.1201	TELÉFONO:	5505231	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		2024/01/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	423453922
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000	\$ 0	\$ 288.000
SUBTOTALES:												\$ 288.000	\$ 0	\$ 288.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 225.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000
SUBTOTALES:									\$ 225.000				\$ 225.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 125.300	\$ 125.300	\$ 0	\$ 0	\$ 125.300
SUBTOTALES:									\$ 125.300	\$ 0	\$ 0	\$ 125.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR								
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA				1	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000
SUBTOTALES:						\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO				SALUD				ARP				IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 79383126	DIAZ HERRERA VICTOR HUGO	INDEPENDI NTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO									01-31									25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 288.000	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	30	\$ 1.800.000	\$ 225.000	\$ 0	\$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.800.000	\$ 79383126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74341767	TOTAL A PAGAR
					\$365.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	19	800	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	19	3.200	0	188.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	80.800				80.800	19	1.400	82.200			808	82.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF10	Comfaboy				891800213-8	46.400	19
						800	47.200
							1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	47.200
Pensión	1	185.600	188.800
Riesgos Laborales	1	80.800	82.200
CCF	1	46.400	47.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	365.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74341767	\$365.400

10
TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74321878	VERGARA SILVA JIMMY	1	0	S	X																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658759	NÚMERO PLANILLA:	7909429875	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	2024		2024
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO 10 - 23	TELÉFONO:	6356149	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	415859311
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		2024/01/25		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000
SUBTOTALES:												\$ 250.000	\$ 0	\$ 0		\$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500
SUBTOTALES:									\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					IBCF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO				TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 9658759	CAMACHO REYES VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 2.000.000			NO																		230301-PORVENIR	30		\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 9658759	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 580.500
--------------	-------------------

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74212855	TOTAL A PAGAR \$289.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	19	800	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	19	3.200	0	188.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.100				6.100	19	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF10	Comfaboy				891800213-8	46.400	19
						800	47.200
							1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	47.200
Pensión	1	185.600	188.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	46.400	47.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	289.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	31/01/2024	74212855	\$289.500

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053328390	POVEDA CASTRO JEHISSON EDGARDO	1	0		S	X	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	90
					TOTAL A PAGAR
					\$3.031.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	118.400	0		0		0	0	0	0	118.400	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	467.200	0	0	0	0	0	0		467.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	755.200	0	0	0	0	0	0		755.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	622.100				622.100	0	0	622.100			6.221	622.100	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	401.600	0	0	401.600	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	TOTAL A PAGAR
					\$3.031.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	401.600	401.600
Pensión	3	1.606.400	1.606.400
Riesgos Laborales	1	622.100	622.100
CCF	1	401.600	401.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.031.700	3.031.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTM AIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9 0
2024-01	2023-12	E	11/01/2024	73689369	\$3.031.700

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1003774661	MARTIN MONTENEGRO LUIS MIGUEL	1	0				S	X																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
2	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0				S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1049634400	BAUTISTA MACIAS IVAN FERNANDO	1	0				S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	1049645784	RUIZ VALERO BRAYAN STEVEN	1	0				S	X																230201	600.000	96.000	0	0	0	0	0	EPS041	600.000	24.000	14-4	600.000	5	41.800	CCF10	600.000	24.000	0	0	0	0	0
6	CC	1053325259	PINEDA GONZALEZ ANDRES CAMILO	1	0				S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
7	CC	1000123863	CARRANZA PACHON ANDIRI ANETH	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1053346534	TINJACA DELGADILLO DAVID STIVEN	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1056506586	SIERRA VELANDIA JONNIER SAMUEL	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
