



Convenio Interadministrativo No. 182-2023
Informe de supervisión No. 2

1. FECHA:

22 de septiembre de 2023
2. SUPERVISOR:

Juan Fernando Ospina Berrio
3. COORD. SUPERVISIÓN:

Liliana Asened Ciro Duque
4. CONTRATISTA:

Municipio de Nariño
5. OBJETO:

IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
6. VALOR:

\$ 139.196.669
- APORTANTES:
- APOORTE CORNARE:

\$ 110.607.579
- APOORTE MUNICIPIO:

\$ 28.589.090
7. FECHA DE INICIACIÓN:

18 de abril de 2023
8. FECHA DE TERMINACIÓN:

18 de octubre de 2023
9. LOCALIZACIÓN:

Municipio de Nariño
- 10.PLAZO:

Seis (6) meses

11.INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO
DIRECCION: CALLE 10 No. 10-15 PARQUE PRINCIPAL
TELEFONO: 8680179
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN FREDY CIFUENTES MARIN

12. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

Se realiza visita de inspección ocular el día 13 de septiembre en compañía del señor Diego Medina Orozco funcionario de la secretaria de Planeación del municipio de

Nariño como apoyo técnico al proyecto a fin de inspeccionar y verificar las obras ejecutadas a la fecha, de acuerdo lo estipulado en la ficha BPIAC.

En la vereda El Llano como se había reportado en el primer informe en el predio del señor Enrique Tabares López coordenadas X: $-75^{\circ}10'03.90''$ Y: $5^{\circ}36'07.21''$ Z: 1421 m.s.n.m se observa la construcción de 40 m trinchos, perfilada de terreno y revegetalización, en el sector La Capilla en zona urbana del municipio se verifica la construcción de gaviones 18 metros cúbicos con su respectivo revestimiento en el punto con coordenadas X: $-75^{\circ}10'37.96''$ Y: $5^{\circ}36'36.2''$ Z: 1681 m.s.n.m, en el barrio el pomo se verifica perfilada del terreno y la construcción de 26 metros de trinchos en las coordenadas X: $-75^{\circ}10'46.22''$ Y: $5^{\circ}36'34.75''$ Z: 1676 m.s.n.m, en el barrio la milagrosa se observa la construcción de 42 metros de trinchos y la perfilada del terreno en el punto con coordenadas X: $-75^{\circ}10'46.81''$ Y: $5^{\circ}36'39.51''$ Z: 1710 m.s.n.m, en el sector cancha de futbol en las coordenadas X: $-75^{\circ}10'32.28''$ Y: $5^{\circ}36'33.70''$ Z: 1651 m.s.n.m se verifica la construcción de 90 metros de trinchos y la perfilada del área intervenida, en el sector el centro de bienestar del adulto mayor se verifica la construcción de 72 metros de trinchos y la perfilada del área intervenida en las coordenadas X: $-75^{\circ}10'33.97''$ Y: $5^{\circ}36'54.63''$ Z: 1760 m.s.n.m, en el sector la piscina de la zona urbana se verifica la construcción de muro de contención en gavión 36 metros cúbicos debidamente revestidos y la construcción de 19 metros de trinchos en las coordenadas X: $-75^{\circ}10'41.39''$ Y: $5^{\circ}36'38.36''$ Z: 1698 m.s.n.m; es de anotar que las obras inspeccionadas se ajustan a las especificaciones técnicas establecidas en la ficha BPIAC de Cornare.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades ejecutadas con corte a la primera acta de avance.

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL
Perfilada de talud	m2	169	\$ 4.618	169	\$ 780.442
Estructura en gavion 1x1x1 malla galvanizada triple torcion calibre 3mm numero 17	m3	110	\$ 603.507	54	\$ 32.589.378
Construcción de trincho en guadua de 3" a 4" Incluye su inmunización e impermeabilización	ml	461	\$ 75.777	373	\$ 28.264.821
Revegetalización útil para la estabilización de taludes y control de erosión	m2	500	\$ 10.000	-	\$ -
Construcción cuneta en 'U'	ml	40	\$ 84.214	-	\$ -
Fundición de concreto 21 mpa (3000 psi), suministro y todo lo necesario para su correcta.	m3	30,0	\$ 1.000.000	-	\$ -
Geo membrana suministro e instalación.	m2	200	\$ 38.358	-	\$ -
Conducción de aguas de escorrentía que cusan procesos erosivos en áreas expuestas	m	40	\$ 47.273	-	\$ -
Construcción muro de contención en mampostería confinada	m	5	\$ 865.263,00	-	\$ -
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	Taller	3	\$ 429.955,00	-	\$ -
Apoyo técnico y administrativo	Mes	6	\$ 2.000.000,00	4	\$ 8.000.000
Valla Publicitaria	Valla	1	\$ 550.000,00	1	\$ 550.000
TOTAL ACTA DE AVANCE # 1					\$ 70.184.641

12.2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

El municipio realizo el respectivo proceso de selección del Contratista conforme a las normas vigentes y de acuerdo a las obligaciones establecidas en clausula cuarta de la minuta del convenio 182-2023, el contrato de obra fue adjudicado a la firma A&J INGENIERÍA S.A.S por un valor de CIENTO VEINTI SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$ 127.196.620) valor inferior al establecido en los estudios previos por cuanto el apoyo técnico no hace parte de las actividades a contratar, las cantidades contratadas y las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar guardan conformidad con las exigidas por la Corporación.

12.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

En la presente tabla se presenta el resumen financiero del proyecto:

ACTA	FECHA ACTA	VALOR ACTA	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO
ACTA DE AVANCE # 1	22-09-2023	\$ 70.184.641	\$ 58.777.857	\$ 11.406.784

Valor ejecutado / valor contratado: \$ 70.184.641 / \$ 139.196.669

Ejecución presupuestal: 50.42 %

Avance ejecución del proyecto: 55 % de acuerdo a los reportes presentados por el municipio.

Tiempo de ejecución: N° de días transcurridos / tiempo de ejecución del proyecto
= 150/180 = 83 %

12.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA

El convenio cuenta con una carpeta con toda la documentación precontractual requerida, con minuta y acta de inicio legalizada, a la fecha no se han gestionado cambios en el convenio que impliquen una actuación desde el orden jurídico.

12.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista viene dando cumplimiento a esta obligación con la vinculación de los obreros al sistema de seguridad social y riesgos profesionales que tienen a cargo la construcción de las obras, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos por cuanto los excedentes de excavaciones se incorporan a las áreas adyacentes y a la geomorfología propia de los terrenos donde se desarrolla el proyecto; por otro lado no se tiene registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra.

13. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago respectivo del acta de avance No. 1.

Se continuará con las visitas de supervisión del convenio, se recomendó al municipio como ente ejecutor acelerar la ejecución de las obras y en la medida de

lo posible ampliar los frentes de trabajo para que se dé cumplimiento con los plazos establecidos en el convenio.

14. ANEXOS

Informe de supervisión 6 folios

Acta de avance 4 folios

Cuenta de cobro 1 folio

Parafiscales 1 folios

Rut 2 folios

Informe municipio 9 folios



Juan Fernando Ospina Berrio
Supervisor
Regional Paramo

Registro fotográfico Convenio 182-2023



Intervención sector cancha de futbol



Intervención sectores matadero y el pomo



Intervención sector la piscina





ACTA DE AVANCE N° 1 182-2023



1 de 4

ACTA N°
1
FECHA
22-09-2023
CONTRATO
182-2023
EJECUTOR
MUNICIPIO DE NARIÑO
NIT EJECUTOR
809812560

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
139,196,669
APORTE CORNARE EN DINERO
110,601,379
APORTE CORNARE EN SERVICIOS
0
APORTE OTROS EN DINERO
28,589,690
APORTE OTROS EN SERVICIOS
0

OBJETO
"IMPLEMENTAR OBRAS FÍSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIQUÍA"
CONTRATISTA EJECUTOR
MUNICIPIO DE NARIÑO
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
LILIANA ASENED CERO DUQUE
SUPERVISOR
JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO

LOCALIZACIÓN
NARIÑO
INICIA
2023-04-18
TERMINA
2023-10-18
ADICIONES
Número
Fecha Inicio
Fecha de Terminación

ACTIVIDAD	OBRA ORDINARIA				ACTA N° 1							EJECUTADO	
	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONOMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLOSA CORNARE	CANT	VALOR
Perfilado de talud	Obras para el control de erosión	169	4,618	780,442	169	4,618	780,442	780,442	0	0	0	169	780,442
Estructura en gavión 1x11 malla galvanizada triple torsión calibre 3mm número 17	Gavión (Metro cúbico)	310	603,507	66,385,770	54	603,507	32,589,378	29,182,594,09091	0	3,406,783,997	0	54	32,589,378
Construcción de trincho en grados de 3" a 4" incluye su cimentación e impermeabilización	Trinchos (Metro)	461	73,777	34,033,197	373	73,777	28,264,821	28,264,821	0	0	0	373	28,264,821
Revegetación del para la estabilización de taludes y control de erosión	Obras para estabilización de taludes	500	10,000	5,000,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
Construcción cuneta en "L"	Cuneta (Metro)	40	84,214	3,368,560	0	84,214	0	0	0	0	0	0	0



ACTA DE AVANCE N° 1
182-2023



2 de 4 EJECUTADO													
OBRA ORDINARIA						ACTA N° 1							
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Fundación de concreto 21 mps (3000 psi), cantilanes y todo lo necesario para su correcta	Viga de fundación para gestión del riesgo (metro cúbico)	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Gen electrónicas sanitarias e instalación	Construcción NT (metro cuadrado)	700	38,353	7,671,600	0	38,353	0	0	0	0	0	0	0
Condicionamiento de aguas de recreación que cubra procesos móviles en áreas expuestas	Obras para el control de averías sanitarias	40	47,273	1,890,920	0	47,273	0	0	0	0	0	0	0
Construcción muro de contención en rampa para camión	Obras para la prevención y control de deslizamientos en zona	5	865,263	4,326,315	0	865,263	0	0	0	0	0	0	0
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, erosión y prevención de desastres	Eventos	5	429,955	1,299,865	0	429,955	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo técnico y administrativo	Técnicos contratista (Mes)	6	2,000,000	12,000,000	4	2,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	0	4	8,000,000
Valle Publicitaria	Otras Edificación anticorrosión (Plásticos, alfileres, arcos, cantiles etc.)	1	550,000	550,000	1	550,000	550,000	0	0	0	0	1	550,000
VALORES TOTALES				139,196,469		70,164,641	58,777,557,000	0		11,496,781,920	0		70,164,641
OBRA ADICIONAL						ACTA N° 1							
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
VALORES TOTALES				0		0	0	0	0	0	0	0	0



ACTA DE AVANCE N° 1
182-2023



3 de 4

BFIAC
Cornare

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	ACTA N° 1 APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	EJECUTADO CANT	VALOR
VALORES TOTALES			0			0	0	0	0	0	0	0	

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
Estructura en gavión 1x1x1 malla galvanizada triple sección calibre 1mm número 12	MUNICIPIO DE NARIÑO	3,406,783.90909	3,406,783.90909	0
Apoyo técnico y administrativo	MUNICIPIO DE NARIÑO	8,000,000	8,000,000	0
APORTANTE MUNICIPIO DE NARIÑO		TOTAL APORTE ECONÓMICO 11,406,783.90909	TOTAL APORTE EN SERVICIOS 0	


VALOR ACTA	70,184,641
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	38,777,857.09091
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MEJOR VALOR PAGADO	0
MAJOR VALOR PAGADO	0
PAGO CRUCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	38,777,857




ACTA DE AVANCE N° 1
182-2023



4 de 4


COORDINADOR DE SUPERVISIÓN


SUPERVISOR


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectúe el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____
CORRIENTE _____ BANCO _____ TIPO: AHORROS _____

Comentarios: Se presenta acta de avance # 1 luego de recibir informe por parte del municipio y recibir las obras por parte de la supervisión.

COPIA COMUNITARIA



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA
NIT: 890982566-9
DEPENDENCIA: ALCALDÍA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NRO 20232209-31

Fecha: 22/09/2023

**CORPORACION AUTONAMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
NIT. 8 9 0 9 8 5 1 3 8 -3**

DEBE A:

**MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
NIT: 890982566-9**

LA SUMA DE:

**CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ML (\$58.777.857)**

Por concepto de:


Avance parcial 01 de la ejecución del convenio 182-2023 cuyo objeto es
"IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR
DESIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO
ANTIOQUIA." Convenio CORNARE MUNICIPIO

Atentamente,

Favor consignar a la cuenta corriente No 672-212440-43 de Bancolombia,
denominada Municipio de Nariño convenios CORNARE.


JOHN FREDY CIFUENTES MARIN
C.C./98.454.590
Representante Legal

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA

CÓDIGO:30.07.40

VERSIÓN: 1.0

PÁG: 1 de 1

FECHA:02/01/2020

Nariño Antioquia 14 de Septiembre de 2023

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE NARIÑO ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que, el municipio de Nariño Antioquia, identificado con NIT: 890.982.566-9, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,


JOHN FREDY CIFUENTES MARÍN
Alcalde Municipal

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14831396327			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 2 5 6 6 9		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social MUNICIPIO DE NARIÑO	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Nariño		41. Dirección principal CR 9 5 35	
42. Correo electrónico hacienda@nariño-antioquia.gov.co		43. Código postal 0 5 4 8 4 0		44. Teléfono 1 8 6 8 0 0 7 6	
45. Teléfono 2 3 2 0 6 8 2 5 5 1 9		46. Código 8 4 1 2		47. Fecha inicio actividad 1 9 1 3 0 4 2 3	
48. Código 1		49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2	
51. Código		52. Número establecimientos		53. Código 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
07- Retención en la fuente a título de rent					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2022 - 06 - 03 / 10 : 02 : 21					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CIFUENTES MARIN JOHN FREDY					
985. Cargo Representante legal Certificado					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14831396327



(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 8 2 5 6 6 | 9

Impuestos de Medellán

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

3

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

3 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 7

72. Número

3 7

73. Fecha

1 9 1 3 0 4 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 4

76. Fecha de registro

1 9 1 3 0 4 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

4 8 3

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

1 0 0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

1 9 1 3 0 4 2 3

81. Hasta

3 0 0 0 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Contraloría Departamental

1 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14831396327



(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 8 2 5 6 6 9

Impuestos de Medellín

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 9 8 4 5 4 5 9 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CIFUENTES	105. Segundo apellido MARIN	106. Primer nombre JOHN
		107. Otros nombres FREDY
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14831396327



(415)7707212489984(8020) 00001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 8 2 5 6 6

Impuestos de Medellín

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

128. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 0 4 1 7 3 0 8

8 1 6 5 0 T

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

TABORDA

TABORDA

DIEGO

MARIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 0 0 1 0 1



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



INFORME DE AVANCE NO. 1

CONVENIO 182-2023

OBJETO: IMPLEMENTAR OBRAS BIOFÍSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NARIÑO – MUNICIPIO DE NARIÑO N° 182-2023

Fecha de inicio: 18-04-2023

Fecha de finalización: 18-10-2023

Plazo: 6 meses

CONTRATISTA EJECUTOR ASIGNADO POR EL MUNICIPIO:

A&J INGENIERÍA SAS

NIT. 900768556-4

VALOR:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$139'196.669)

APORTE MUNICIPIO: VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVELTA PESOS M/L (\$28'589.090)

CORNARE: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (110'607.509)

SUPERVISIÓN CORNARE:

JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado

Revisó: Héctor David López Quintero

CARGO: Técnico auxiliar

CARGO: secretario de planeación y d.t




TABLA DE CONTENIDO.

Pág.

INTRODUCCIÓN.....	2
1.1. Descripción general del proyecto.....	3
1.2. Localización del proyecto.....	3
1.3. Información general contrato	4
2. ASPECTOS TÉCNICOS.....	4
3. REGISTRO FOTOGRAFICO	5
4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	165
5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.....	165
6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	166


INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene El INFORME DE AVANCE DE OBRA, correspondiente a las obras ejecutadas, Elaborado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato interadministrativo CONI-182-2023 suscrito entre el Municipio de Nariño y Cornare, cuyo objeto es: "IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO."

En este informe se incluyen los aspectos más relevantes que le permitan a CORNARE, o a quien lo consulte, tener una visión general de los trabajos que se ejecutaron.

En el presente informe, se relaciona un avance parcial del contrato de obra, en el que se incluye principalmente el registro fotográfico que sustenta las actividades realizadas en los puntos de intervención.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA




1.1. Descripción general del proyecto.

En general las actividades del convenio consisten principalmente en:

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO
Perfilado de talud	m2	169	\$ 4,618	\$ 780,442	780,442	
Estructura en gavión 1x1x1 m/la galvanizada triple torsión calibre 3mm número 17	m3	110	\$ 603,507	\$ 66,385,770	55,506,690	10,879,080
Construcción de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su impermeabilización e impermeabilización	ml	461	\$ 75,777	\$ 34,933,197	31,554,637	3,358,560
Revegetación: útil para la estabilización de taludes y control de erosión	m2	500	\$ 10,000	\$ 5,000,000	5,000,000	
Construcción cuneta en 'U'	ml	40	\$ 84,214	\$ 3,368,560	3,368,560	
Fundición de concreto 21 mpa (3000 psi), suministro y todo lo necesario para su correcta.	m3	1.0	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	1,000,000	
Geo membrana suministro e instalación.	m2	200	\$ 38,358	\$ 7,671,600	4,171,600	3,500,000
Conducción de aguas de escorrentía que causan procesos erosivos en áreas expuestas	m	40	\$ 47,273	\$ 1,890,920	0	1,890,920
Construcción muro de contención en mampostería confinada	m	5	\$ 865,263.00	\$ 4,326,315	4,326,315	
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	Taller	3	\$ 429,955.00	\$ 1,289,865	400,000	889,865
Apoyo técnico y administrativo	Mes	6	\$ 2,000,000.00	\$ 12,000,000	0	12,000,000
Valla Publicitaria	Valla	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000	550,000	
total:				\$ 139,196,659	\$ 105,668,244	\$ 32,528,425

1.2. Localización del proyecto.

Las obras ejecutadas se encuentran en la zona urbana y rural en el Municipio de Nariño Antioquia.

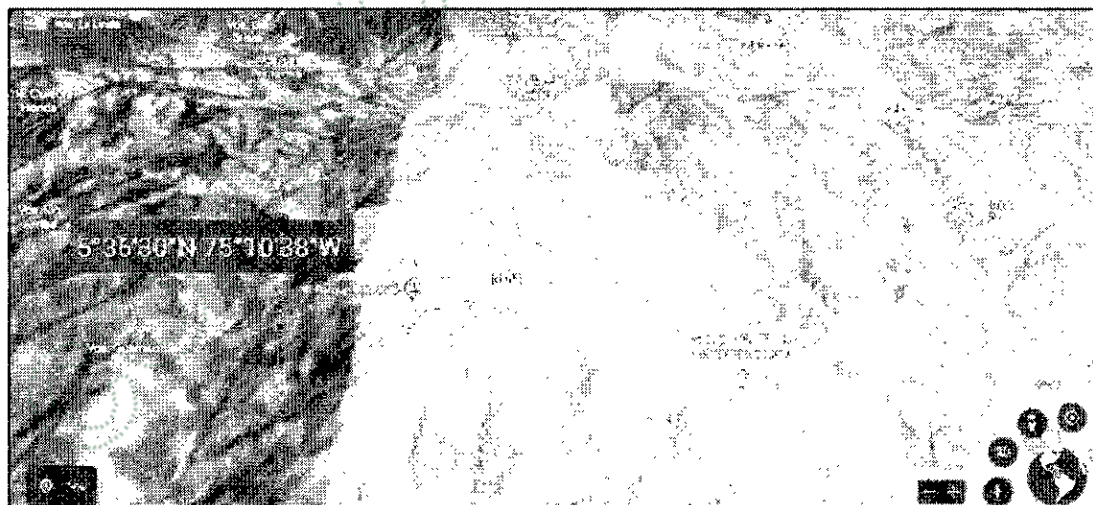

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

**MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA**

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA

**1.3. Información general contrato**

A continuación, se relacionan los datos del contrato

Tabla 1 RESUMEN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCION	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONI-182-2023
OBJETO	IMPLEMENTAR OBRAS BIOFISICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NARIÑO
CONTRATISTA	A&J INGENIERÍA SAS NIT. 900768556-4
REPESSENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO CC. 75.075.556 CEL: 315 4616130
VALOR CONVENIO	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$139'196.669) APORTE MUNICIPIO: VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVEA PESOS M/L (\$28'589.090) CORNARE: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (110'607.509)
VALOR CONTRATO OBRA	SA-006-2023
A&J INGENIERÍA SAS	CIENTO VEITICETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$127'196.620)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato se establece en seis (06) MESES, contados a partir del Acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal del 2023.
FECHA ACTA DE INICIO	18 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de octubre de 2023

2. ASPECTOS TÉCNICOS.


A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el presente convenio el cual se especifican unitariamente en el registro fotográfico.

Ítem 1: Para la ejecución de los 169 m de perfilada de talud se ejecutan en 8 diferentes puntos con la mano de obra idónea y herramienta adecuada para la ejecución adecuada del mismo y demás labores requeridas tanto en zona rural y urbana del municipio.

Ítem 2: Para la ejecución de los 110 m³ de muro en sistema gavión se han ejecutado hasta el presente informe se han consolidado 54 m³ de sistema de contención por masa muro gavión el cual consisten en su respectivo solado de 10 cm de espesor en concreto simple, malla gavión 2x1 m triple torsión C. 13 y hueco 10x10, alambre galvanizado C.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



14 para las respectivas tensoras, recubrimiento en concreto simple de 0.06 m y los respectivos oídos en el solado; se ejecutan en dos diferentes puntos en la zona urbana del municipio.

Ítem 3. Para la ejecución de los 461 m de sistema de contención de talud en trincho de guadua se han construido hasta el presente informe 373 m de trincho en guadua calentana con los respectivos parales en sepa, alambre de amarre galvanizado C.14, emulsión en brea para impermeabilización de sepa y el respectivo geotextil para que pase el agua y no los sedimentos.

Ítem 4. La valla publicitaria del proyecto se dispone con las especificaciones requeridas.

Ítem 5. El municipio de Nariño cuenta con apoyo técnico y administrativo el cual brinda al proyecto con profesional idóneo en ingeniería civil el ing. Heber Morelo Tirado.

LOS DEMÁS ITEMS SE PRESENTAN PARA EL SIGUIENTE INFORME.

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el sitio de la obra.

PEDRO JAIME PALACIO - VEREDA EL LLANO - CEL: 320 6441788

40 m de trincho y 25 m de perfilada de talud.



Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



TALUD ENTRE EL BARRIO SAGRADA FAMILIA Y VILLANUEVA AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD:

18 M3 DE GAVIÓN



CONSTRUCCIÓN DE SOLADO, DISPOSICIÓN DE PIEDRA Y COLOCACIÓN DE MALLA



FUNDICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 6 CM

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** **alcaldia@narino-antioquia.gov.co**



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9


DEPENDENCIA: ALCALDÍA



MURO GAVIÓN DE 18 M3 YA CULMINADO

GILDARDO GRANADA – BARRIO LA MILAGROSA AL FRENTE DEL MATADERO – CEL: 317 4384515

42 m de trincho y 14 m de perfilada de talud.

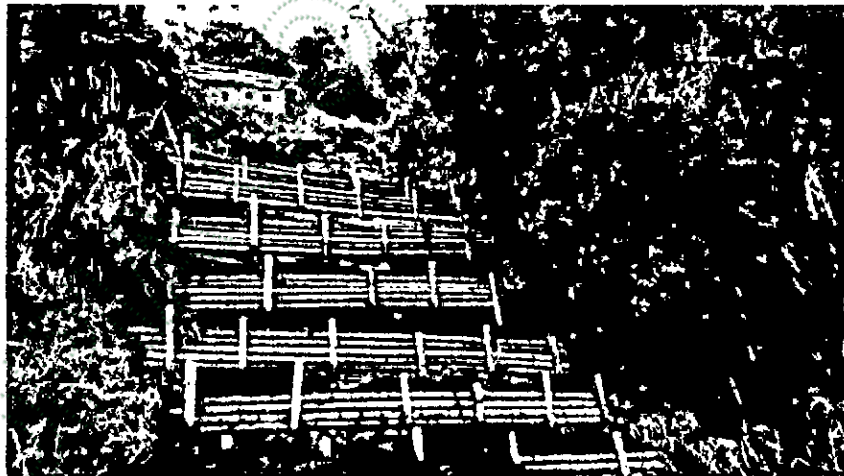

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado

CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero

CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Narino Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA


NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



JEISON ANDRES SOTO – BARRIO EL POMO – CEL: 313 7819506

26 M DE TRINCHO Y 20 M DE PERFILADA DE TALUD.

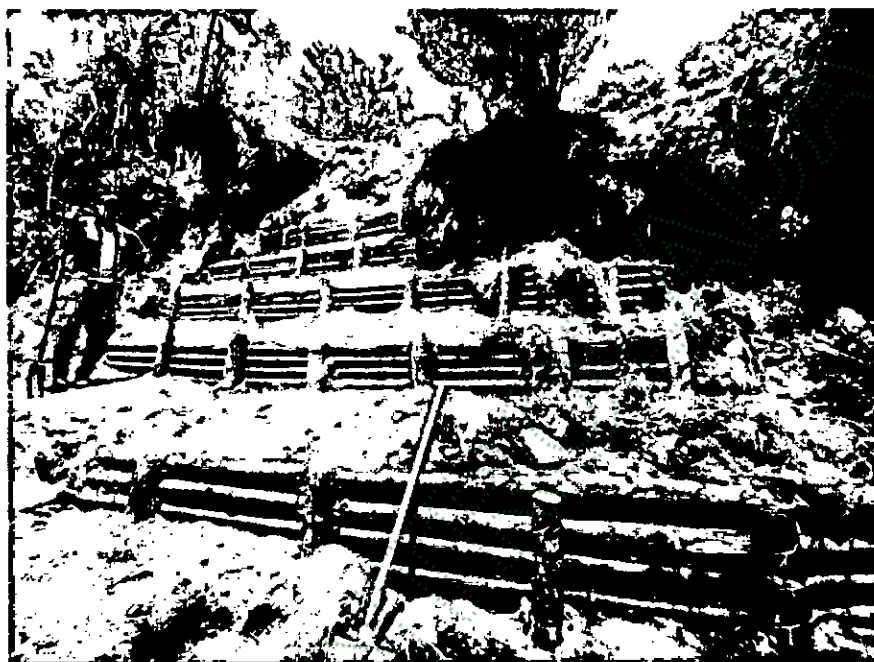

APLICACIÓN DE EMULSIÓN EN BREA Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA




TALUD AL FRENTE DE LA PISCINA AL BARRIO VILLANUEVA.

DOS MUROS 36 M3 DE GAVIÓN, 19 M DE TRINCHO Y 20 M DE PERFILADA DE TALUD.



ADECUACIÓN DEL LUGAR

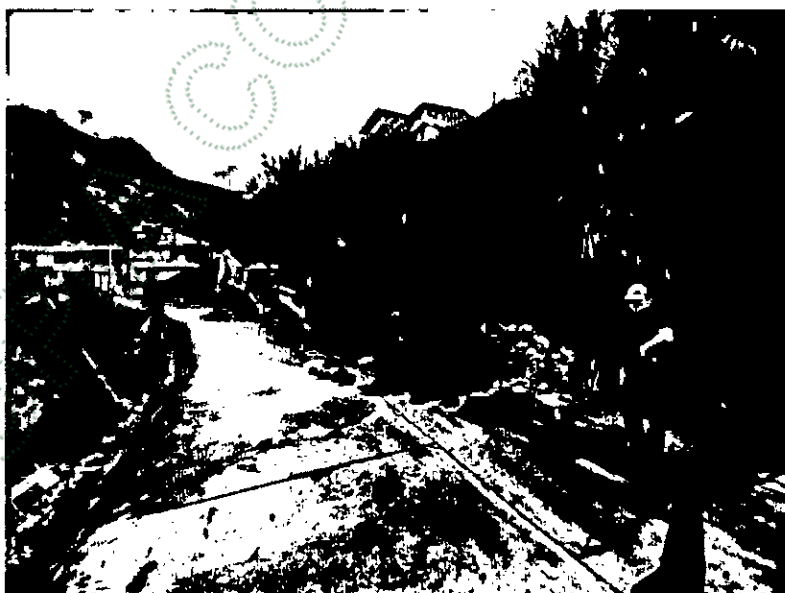

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co>Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



MURO DE 12 M3 DE GAVIÓN



Elaboró y Proyectó: Heber Morelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



MURO DE 24 M3 DE GAVIÓN Y 19 M DE TRINCHO

MARIA GIRALDO DE MARÍN – BARRIO EL POMO SALIDA A LA VEREDA GUAMITO – CEL: 3203092206

30 M DE TRINCHO Y 20 M DE PERFILADA DE TALUD.




Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado

CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero

CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA


NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



TALUD AL FRENTE DEL ASILO.

72 M DE TRINCHO Y 20 M2 DE PERFILADA DE TALUD

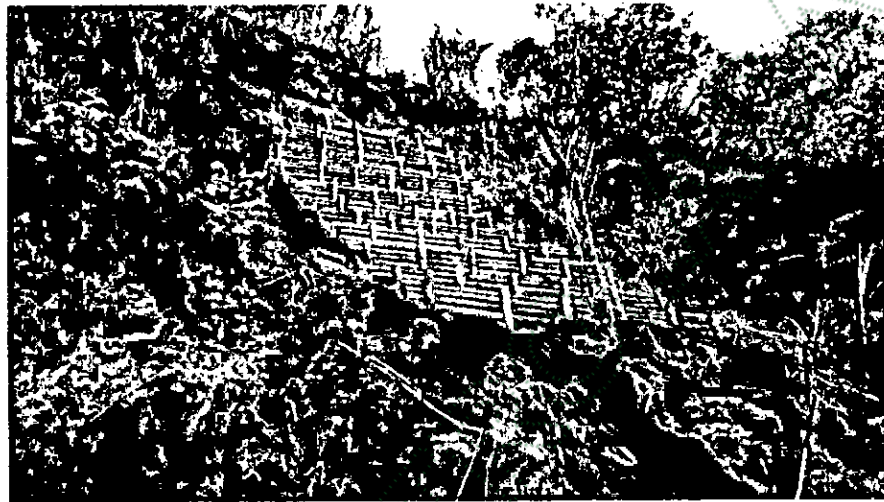

Elaboró y Proyectó: Heber Morelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle** 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA


NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



SECTOR ENTRE VEREDA MEDIA CUESTA Y RECREO - CEL: 310 5115517

54 M DE TRINCHO Y 20 M2 DE PERFILADA DE TALUD.

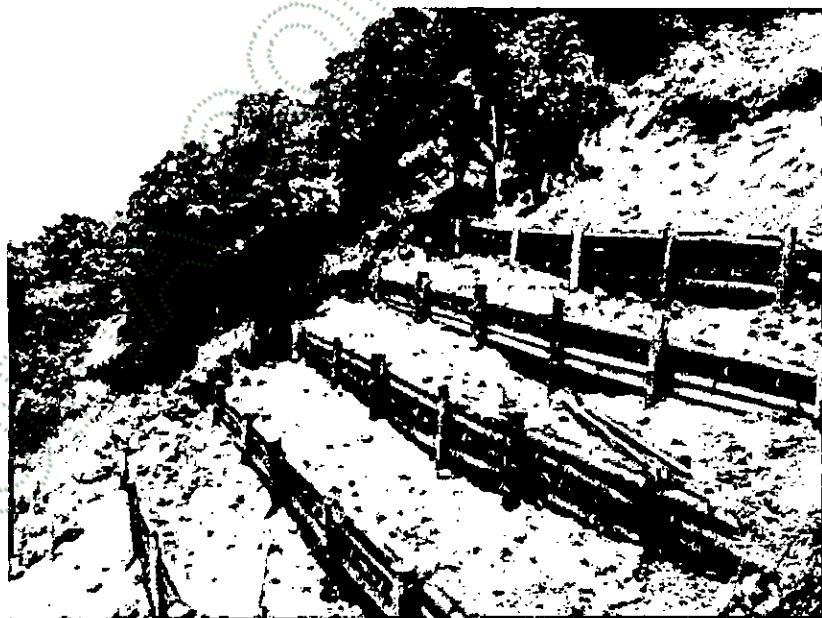

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado

CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero

CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA


NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



CANCHA DE FUTBOL – ZONA URBANA.

90 m de trincho y 20 m2 de perfilada de talud.

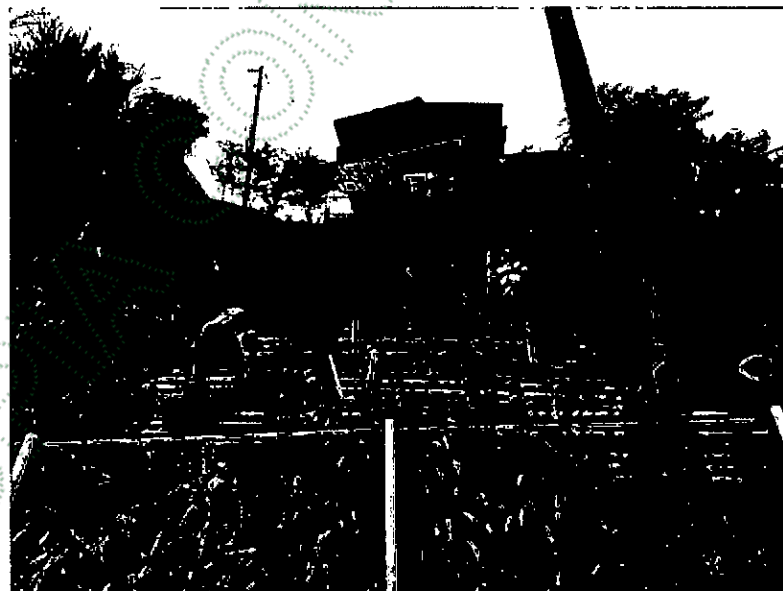

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado
CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co




MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9


DEPENDENCIA: ALCALDÍA



VALLA PUBLICITARIA

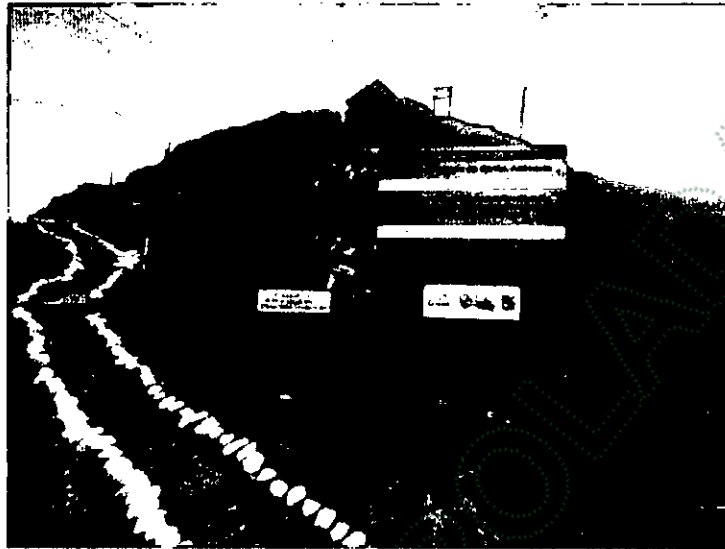

APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

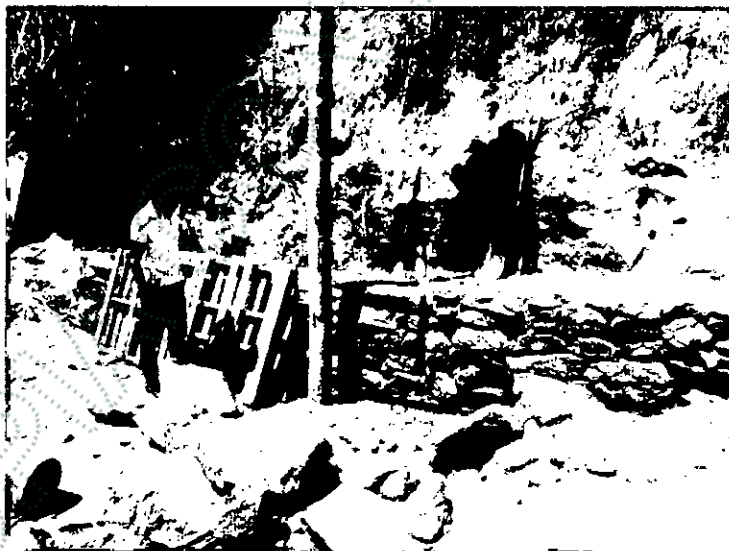

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado

CARGO: Técnico auxiliar

Revisó: Héctor David López Quintero

CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 **Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.**
<http://www.narino-antioquia.gov.co> **Email:** alcaldia@narino-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA**

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA

**4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL
Perfilada de talud	m2	169	\$ 4,618	\$ 780,442
Estructura en gavion 1x1x1 malla galvanizada triple torsion calibre 3mm numero 17	m3	54	\$ 603,507	\$ 32,589,378
Construcción de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización	ml	373	\$ 75,777	\$ 28,264,821
Apoyo técnico y administrativo	Mes	4	\$ 2,000,000.00	\$ 8,000,000
Valla Publicitaria	Valla	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000
total:				\$ 70,184,641

5. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El avance físico del proyecto es de 50.42% teniendo en cuenta el valor ejecutado al dieciséis (16) de septiembre de 2023.

6. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que a la fecha la presente corresponde a la primera acta de avance parcial, el avance financiero es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL APOORTE DEL CONVENIO		\$ 139.196.669
Valor Acta Nro. 1		\$ 70.184.641
TOTAL SIN EJECUTAR DEL CONTRATO		\$ 69.012.028

RESÚMEN FINANCIERO CONTRATO CONI-182-2023		
VALOR DEL CONVENIO	\$ 139.196.669	100.00%
VALOR ACTA N°1	\$ 70.184.641	50.42%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 69.012.028	49.58%

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179 Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co> Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA

NIT: 890982566-9

DEPENDENCIA: ALCALDÍA



RESUMEN TÉCNICO

1. Las obras se modifican en cantidades respetando los ítems en lo proyectado inicialmente. NO Fue necesario proyectar algunas obras extras.
2. Las obras adelantadas se ejecutaron de acuerdo con el presupuesto y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión.
3. Las herramientas y equipos utilizados fueron aprobadas por la supervisión.
4. La mano de obra calificada está siendo ejecutada por dos oficiales de obra los cuales cuentan con las respectivas prestaciones sociales.
5. La empresa contratista dispone de un residente de obra con una dedicación del 100 %.
6. El municipio de Nariño cuenta con el apoyo técnico y administrativo.
7. **Imprevistos presentados durante la ejecución de la obra:** No se presentaron imprevistos que pusieran en riesgo la ejecución de la obra

Para la cosntancia de lo anterior se firma el día veintidós (22) de septiembre de 2023.

HÉCTOR DAVID LÓPEZ QUINTERO
Seretario de planeación y desarrollo territorial.

Elaboró y Proyectó: Heber Mórelo Tirado	Revisó: Héctor David López Quintero
CARGO: Técnico auxiliar	CARGO: secretario de planeación y d.t

Tels: 868 00 179Calle 10 No.10-15 (Plaza Principal) Nariño Antioquia.
<http://www.narino-antioquia.gov.co>Email: alcaldia@narino-antioquia.gov.co
