
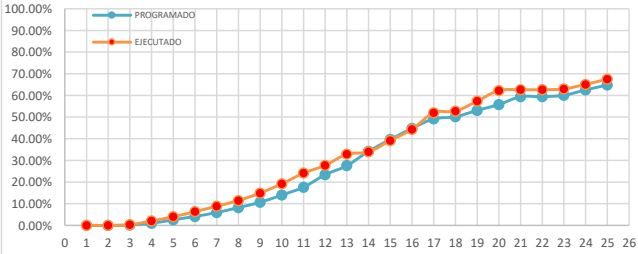
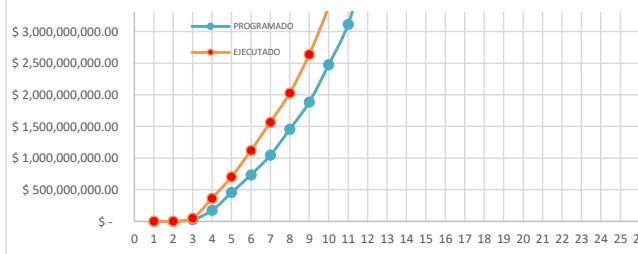


	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA		
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	COPEBA SAS	FECHA	04/03/2024	SEMANA No.	31	DEL	26-feb-24	AL	03-mar-24
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.								
LOCALIZACIÓN PROYECTO	VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No.:	815 DEL 2023				CONTRATO No.:	708 DEL 2023			
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS				PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS			
CONTRATISTA:	COPEBA SAS				CONTRATISTA:	CONSORCIO PASCA CNJ			
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023				FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023			
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	-				*FECHA DE SUSPENSIÓN:	-			
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-				*FECHA DE REINICIACIÓN:	-			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DEL 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DEL 2024			
PLAZO ACTUALIZADO:	242 días				PLAZO ACTUALIZADO:	242 días			
PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS				PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS			
VALOR INICIAL : \$	1,032,790,821				VALOR INICIAL : \$	17,678,836,940			
VALOR ADICION: \$	-				VALOR ADICION: \$	-			
VALOR ACTUALIZADO: \$	1,032,790,821				VALOR ACTUALIZADO: \$	17,678,836,940			
VALOR PAGADO: \$	-				VALOR PAGADO: \$	-			
VALOR POR PAGAR: \$	1,032,790,821				VALOR POR PAGAR: \$	17,678,836,940			
VALOR ANTICIPO: \$	-				VALOR ANTICIPO: \$	5,358,746,830			
SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO				SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.									
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
FRENTE DE OBRA No 04: PR 09+774 AL PR 10+240 : INSTALACION DE ARENA Y ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO PR 10+085 AL PR 10+120. FRENTE DE OBRA No 05: PR 10+260 AL PR 10+660 : ARMADO DE MALLAS PARA GAVION PR 10+520 AL PR 10+530 COSTADO IZQUIERDO. FRENTE DE OBRA No 07: PR 07+500 AL PR 08+487 (SAN MIGUEL): EXCAVACION, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO ACELERADO PR 07+922 AL PR 08+050 COSTADO DERECHO Y FUNDIDA DE CUNETA PR 08+164 AL PR 08+240 COSTADO IZQUIERDO. FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO): EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE PENDIENTE LONGITUDINAL E INSTALACION DE FRESADO DEL PR 08+135 AL PR 08+300, CARRIL IZQUIERDO Y DEL PR 08+135 AL PR 08+200 CARRIL DERECHO. DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO AREA AFECTADA EN EL BOX EXISTENTE. BACHEO EN 10 AREAS EN SENTIDO PASCA- FUSAGASUGA. ESPACIO PUBLICO LA AGUADITA: SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA, MEJORAMIENTO DE SUELO E INSTALACION DE BORDILLOS, FUNDIDA DE BERMA CUNETAS EN CONCRETO ACELERADO Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO POR EL COSTADO DERECHO Y POR EL COSTADO IZQUIERDO SE INICIARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOCELDA, RELLENO Y FUNDIDAD DE ANDEN ESTAMPADO. FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO AGUABONITA: SE REALIZO EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA Y RELLENO DE GEOCELDA E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y FUNDIDA DE BERMA CUNETA EN CONCRETO ACELERADO DEL PR 06+180 AL PR 06+240.									
3. CONTROL DE EJECUCIÓN									
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	10-ago-23	24-nov-23	106	21-sep-23		ejecución	-42	ejecución
2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-ago-23	01-nov-23	83	10-ago-23		ejecución	0	ejecución
NP 07	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIAMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	29-ago-23	11-nov-23	74	08-ago-23	11-oct-23	Fin	21	Fin
3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	22-ago-23	29-dic-23	129	22-ago-23	12-ene-24	Fin	0	-14
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	07-nov-23	29-dic-23	52	20-nov-23	12-feb-24	Fin	-13	-45
3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
NP 001	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	01-sep-23	18-ene-24	139	29-ago-23		ejecución		ejecución
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	01-ago-23	30-ago-23	29	08-ago-23		ejecución	-7	ejecución
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	09-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			0	24-nov-23		ejecución		ejecución
4.16	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	13-nov-23	24-nov-23	11	18-oct-23		ejecución	26	ejecución
4.23	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	09-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES								
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	06-nov-23	24-nov-23	18	21-sep-23		ejecución	46	ejecución
4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	22-nov-23	12-dic-23	20	18-sep-23		ejecución	65	ejecución
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	21-oct-23	08-nov-23	18	30-oct-23		ejecución	-9	ejecución

		FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34		
		GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0		
		INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA			
PERIODO DE INFORME SEMANAL											
		COPEBA SAS	FECHA	04/03/2024	SEMANA No.	31	DEL	26-feb-24	AL	03-mar-24	
NP 004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA			13-nov-23	24-nov-23	11	16-oct-23		ejecución	28	ejecución
NP 005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).			25-oct-23	13-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	7	ejecución
NP 008	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE			28-oct-23	16-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	10	ejecución
NP 009	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE			01-nov-23	20-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	14	ejecución
NP 010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			01-nov-23	12-ene-24	72	01-nov-23		ejecución	0	ejecución
NP 011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO TIPO III			01-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	06-dic-23	10	-26	39
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50			01-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	06-dic-23	10	-26	39
NP 013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR			15-dic-23	29-feb-24	76	15-dic-23		ejecución	0	ejecución
NP 014	GAVION			01-feb-24	29-feb-24	28	12-feb-24		ejecución	-11	ejecución
Plazo del proyecto: 242 días											
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica											
3.2. CONTROL DE PROGRAMACION											
AVANCE FISICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO							
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)								
Acumulado anterior	77.89%	75.93%	-1.97%								
Durante el periodo	2.39%	3.91%	1.53%								
Acumulado Actual	80.28%	79.84%	-0.44%								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO											
DURACIÓN (DÍAS)	DÍAS TRANSCURRI.	DÍAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DÍAS								
242	215.00	27	-1.07								
3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO											
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO							
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$ MILLONES)	ACUMULADO EJECUTADO (\$ MILLONES)	INDICADOR (%)								
Acumulado anterior	\$ 13,770,553,186	\$ 13,422,910,805	97%								
Durante el periodo	\$ 422,179,950	\$ 691,898,838	164%								
Acumulado Actual	\$ 14,192,733,136	\$ 14,114,809,643	99%								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO											
-1%											
AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTIPO				GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTIPO							
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$ MILLONES)	ACUMULADO EJECUTADO (\$ MILLONES)	INDICADOR (%)								
Acumulado anterior	\$ 3,936,746,830	\$ 3,936,746,830	100%								
Durante el periodo	\$ 474,000,000	\$ 474,000,000	100%								
Acumulado Actual	\$ 4,410,746,830	\$ 4,410,746,830	100%								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO											
0%											
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO											
Se realizó visita por parte del especialista Ambiental de la Interventoría y el Contratista a los sitios de acopio temporal de la obra y al Tramo 3 donde se construirán los gaviones evidenciando una posible intervención sobre la vegetación del área.											
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO											
El 28 de febrero de 2024, se realizó visita a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Fusagasugá con el fin de verificar los paz y salvos y cierres correspondientes por parte de la administración para adelantar el proceso de liquidación del contrato, así mismo, se indaga sobre la titularidad del lote en el sector la aguadita para socializar el procesos del espacio público es esta zona, luego se realizó acompañamiento a la parte social en la socialización de los espacios públicos donde la comunidad tiene dudas en el proceso de intervención. El 29 de febrero de 2024, se recibe visto bueno del informe social por parte de la supervisión del contrato del área social al informe de enero de 2024, y se asiste a comité integral para resolver las dificultades en relación a la intervención del espacio público.											
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO											

	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA	
PERIODO DE INFORME SEMANAL								
	COPEBA SAS	FECHA	04/03/2024	SEMANA No.	31	DEL	26-feb-24	AL 03-mar-24
El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0268 del 06/02/2024, radica el informe SST No 6 para revision de la Interventoria.								
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD								
Se realizan ensayos de control de calidad al concreto asfaltico e hidraulico tanto del mejoramiento vial como del espacio publico en Aguadita.								
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS								
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:								
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)								
El contratista solicita mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0276 del 09/012/2024 presentado a la Interventoria la prorroga del contrato por 30 dias calendario, hasta el 30 de marzo para la terminacion de las actividades contractuales, esta prorroga se dio hasta el 30/03/2024 por parte del ICCU, para culminar con el alcance contractual definido inicialmente..								
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL								
El contratista cuenta con 1 director de Obra, Un Ingeniero Residente y Un HSE para todo el contrato. En el Frente de Obra No 04: Del PR 09+774 al PR 10+240: Se tiene Un (01) Inspector de Obra, Un (01) Topógrafo, Dos (02) Controladores de tráfico, Dos (02) maestros de obra, Seis (06) Ayudantes de Obra. En el Frente de obra No 05: Del PR 10+260 al PR 10+660: Un (01) Inspector de Obra, Dos (02) maestros gavioneros, Cuatro (04) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Controladores de Trafico, Dos (02) Conductores de volqueta. En el Frente de Obra Tramo 7 (San Miguel): PR 07+500 al PR 08+487: Un (01) Inspector de obra, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra, en el Acopio de Fresado de San Miguel: Un (01) ayudante de obra prestando vigilancia y despachando fresado para Pasca. En el frente de obra de Pasca (Paso malo): Un (01) Topógrafo, Un (01) cadenero, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra, Dos (02) Auxiliares de trafico, Cuatro (04) Operadores de maquinaria, Una (01) Cuadrilla de asfalto, Un (01) Conductor de carrotaque, Dos (02) Conductores de volqueta. En el frente de obra de Espacio Público de Aguadita se tiene: Tres (03) cuadrillas (Oficial + 5 ayudantes), Un (01) Ingeniero residente, Un (01) Inspector de Obra, Un (01) Operador, Dos (02) controladores de tráfico, Un (01) Conductor de volqueta. En el espacio Público de Aguabonita: Se tiene Un (01) maestro de obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Auxiliares de tráfico. Para el contrato en general se tiene los siguientes equipos: Tres (03) Retrocargadores, Una (01) Excavadora sobre orugas, Tres (03) Volquetas de 14 M3, Una (01) Volqueta de 6 M3, Dos (02) Minicargador, Un (01) Vibro compactador autopropulsado. En el frente de Obra del Espacio Público sector Aguadita: Se tiene Tres (03) Oficiales y Quince (15) ayudantes. En general para todo el contrato cuenta con el siguiente personal: Un (01) director de Obra, Un (01) Residente de Obra, Un (01) HSE, Cuatro (04) Inspectores de Obra, Dos (02) Topógrafos, Un (01) Cadenero; Dos (02) maestros de obra, Cinco (05) Oficiales de Obra, Seis (06) Auxiliares para control de tráfico, Veintiún (21) Ayudante de Obra, Seis (06) (Operadores maquinaria), Tres (03) Conductores de volqueta.								
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
Lo ejecutado a la fecha el contratista de acuerdo a la reprogramacion entregada por el contratista muestra un acumulado programado de \$ 14,192,733.135,83 millones frente a \$ 14.114,809.643,19 aproximadamente de ejecutado. Corresponde a un 80.28 % programado para un 79,84 % ejecutado acumulado.								
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS								
Al contratista se le realizan observaciones en la ejecucion de las actividades diarias, la proximidad con la terminacion contractual esta conduciendo a ejecuciones presuradas con observaciones en terminados, y es asi como en el tramo 4 (articulado carril derecho), presento hundimientos y desplazamiento de adoquin..								
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)								
Se requiere realizar tramite ante la CAR, para solventar la dificultad para el inicio de los gaviones en tramo 3.								
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)								
Los sectores de trabajo se encuentran debidamente demarcados y el personal cuenta con EPPs.								
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)								
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)								
Se realiza verificación y avances del proyecto de cultura vial para su desarrolló y ejecución de presupuesto PAGA.								
9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA								
ACTIVIDAD				RESPONSABLE			FECHA PROGRAMADA	
Presentar informe por especialista Forestal ante la CAR				Contratista				
Presentar informe ante la DIAN por presunta invasion en predio de Tramo 5				Contratista				
Presentar balanceo del contrato				Contratista				
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES								
Se tienen aprobados los NP 001 -BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 EL NP 002 -ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M EL NP 003 - ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). EL NP 004 - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, EL NP 005 - GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN); EL NP 006 - LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO); EL NP 007 - PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA). NP 008 - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE; NP 009 - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE. NP 010 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO); NP 010 -MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO); NP 011 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III; NP 012 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50. NP 013 -CUNETAS DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR; NP 014 - GAVION.								

	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA		
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	COPEBA SAS	FECHA	04/03/2024	SEMANA No.	31	DEL	26-feb-24	AL	03-mar-24
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR									
Se esta evidenciando fallos en algunos de los trabajos realizados por el contratista (articulada Tramo 4), lo que genera reprocesos y preocupacion con el plazo de terminacion de las obras programadas.									
12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA									
 <p>26/02/24 08:02:17 CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via PR 08+208 a PR 08+240 LI CUNETA</p>			 <p>26 feb. 2024 9:04:05 a. m. ICCU 1708 CONSORCIO PASCA - CNJ</p>			 <p>2 mar 2024 10:28:36 a. m. CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS MEJORAMIENTO DE VIA TRAMO 4 San Miguel</p>			
Fundida de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San Miguel			Fundida de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San Miguel			Berma - cuneta fundida PR 08+008 al PR 08+050 costado izquierdo San Miguel			
 <p>26/02/24 11:42:45 CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via PR 10+517 GAVIONES</p>			 <p>28 feb 2024 11:49:43 a. m. Silvana Cundinamarca CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS MEJORAMIENTO DE VIA TRAMO 5</p>			 <p>29 feb 2024 12:49:36 p. m. CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via TRAMO 4 PR 10+517 GAVIONES</p>			
Formaleta y mallas gavion PR 10+520 al PR 10+530			Lleno de mallas para Gavion PR 10+520 al PR 10+530.			Gavion terminado en lleneo de mallas PR 10+520 al PR 10+550.			
 <p>26/02/24 09:43:22 CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via PR 06+180 a PR 06+200 LLENADO DE GEOSLDA ESPACIO PUBLICO AGUA BONITA</p>			 <p>28 feb 2024 8:11:32 a. m. CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via PR 06+177 a PR 06+195.5 NI CONCRETO INSTALADO ESPACIO PUBLICO AGUA BONITA</p>			 <p>1 mar 2024 5:00:26 p. m. CTO 815 DEL 2023 COPEBA SAS mejoramiento de via PR 02+990 a PR 10+08 CONCRETO INSTALADO ESPACIO PUBLICO AGUA BONITA</p>			
Instalacion de Bordillo, geocelda y lleno Espacio Publico Aguadita			Fundida de berma- cuneta costado derecho Espacio publico Agua Bonita			Fundida de Berma cuneta en espacio publico Aguadita			

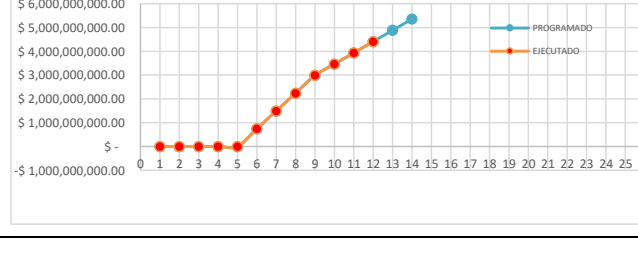

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
