



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

1 al 31 enero de 2024

Lista de chequeo Informe Mensual de Interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	1
	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		
Convenios de Obra No.	2851, 2940, 2735 y 2730 de 2023	Contratista:	JAC SAN ANTONIO, JAC CENTRO, JAC CACHAVITA Y JAC LA CRECIENTE.
Contrato de Interventoría	4341 de 2023	Interventoría:	HERBY LUNA CRUZ
Objeto Contrato de Obra: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
INFORME MENSUAL No. 1		MES O PERIODO: ENERO 01 AL 31 2024	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2-5.
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		8-9.
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10-13.
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3	INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA		15-17
3.1	Información general del contrato		15-17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		18-19
3.3	Seguimiento Items no previstos		No aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		19-20
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21-84
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	85-88
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	89-90
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	91-94
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	95-98
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	99-102
4.7	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	103-106
4.8	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	107-141
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		142-182
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	No aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	142-183
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	142-183
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		182
5.1	Información general del contrato		182
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		182-185
5.3	Informes especialistas y profesionales		199
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad		No aplica
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	186
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	187
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	188
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	189-194
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		200
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		196-199
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		201-229
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.			
Firma:			
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Interventor, Dirección Territorial			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024

Resumen mensual estado general del proyecto.

Convenio 2851.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEP-MVA-15-FR-2																																																																																							
				VERSIÓN	1																																																																																							
				PÁGINA	1 de 2																																																																																							
				FECHA	1/02/2024																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACA																																																																																								
CONTRATO DE OBRA N.º:	2851 DE 2023		PERIODO MES:	01 AL 31 DE ENERO DE 2024																																																																																								
OBJETO:	ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		PLAZO INICIAL:	4 meses																																																																																								
CONTRATISTA:	JAC SAN ANTONIO		FECHA DE INICIO:	24 de NOVIEMBRE de 2023																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4541 de 2023		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																									
INTERVENTOR:	HERREY LUNA CRUZ		FECHA DE REANUDACIÓN:	31/12/2023																																																																																								
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023																																																																																								
			PRÓRROGA	4 meses																																																																																								
			PLAZO ACUMULADO:	30/01/2024																																																																																								
			FECHA VENCIMIENTO FINAL:	30/01/2024																																																																																								
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO																																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PLACA HUELLA)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAVIMENTO</td><td>PLACA HUELLA</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td></td><td>139</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td></td><td>42</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	PAVIMENTO	PLACA HUELLA	ml			139	Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und			3	Mantenimiento	ALCANTARILLAS	ml			42	Otros (Especificar cuáles)			<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PLACA HUELLA)</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAVIMENTO</td><td>PLACA HUELLA</td><td>ml</td><td>0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>ml</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	CANTIDAD ACUMULADA	PAVIMENTO	PLACA HUELLA	ml	0	Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0	Mantenimiento	ALCANTARILLAS	ml	0	Otros (Especificar cuáles)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)																																																																																										
PAVIMENTO	PLACA HUELLA	ml																																																																																										
		139																																																																																										
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und																																																																																										
		3																																																																																										
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	ml																																																																																										
		42																																																																																										
Otros (Especificar cuáles)																																																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
PAVIMENTO	PLACA HUELLA	ml	0																																																																																									
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0																																																																																									
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	ml	0																																																																																									
Otros (Especificar cuáles)																																																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			AVANCE FINANCIERO																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 227.775.985,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 227.775.985,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 227.775.985,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 227.775.985,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 227.775.985,00			AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 227.775.985,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 227.775.985,00	\$ -	\$ 227.775.985,00	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 27.109.917,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 27.109.917,00</td><td>\$ 31.833.712,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 27.109.917,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 27.109.917,00</td><td>\$ 31.833.712,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 27.109.917,00	\$ 0,00	\$ 27.109.917,00	\$ 31.833.712,00	AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR EJECUTADO	\$ 27.109.917,00	\$ 0,00	\$ 27.109.917,00	\$ 31.833.712,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																									
OBRAS	\$ 227.775.985,00																																																																																											
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 227.775.985,00																																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 227.775.985,00	\$ -	\$ 227.775.985,00																																																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																								
OBRAS	\$ 27.109.917,00	\$ 0,00	\$ 27.109.917,00	\$ 31.833.712,00																																																																																								
AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ 27.109.917,00	\$ 0,00	\$ 27.109.917,00	\$ 31.833.712,00																																																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																												
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 4																																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 31.833.712,00			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3																																																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 14%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																																																																									
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13																																																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																												
Se realizó socialización de actividades constructivas a realizar teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y técnicos de la zona.																																																																																												
Firma: _____ Nombre: HERREY LUNA CRUZ Dirección de Interventoría: Matrícula Profesional No. 250342574 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																																												



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024

Convenio 2940.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEI-MN-IN-15-FR-2																																																																																							
		VERSION	1																																																																																							
		PAGINA	1 de 2																																																																																							
		FECHA	1/02/2024																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACA DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 2940 DE 2023		PLAZO INICIAL:	4 meses																																																																																							
OBJETO: ALIANZA ESPERUOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO:	17 de NOVIEMBRE de 2023																																																																																							
CONTRATISTA: JAC CENTRO		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
		FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4341 de 2023 INTERVENIENTOR: HERBY LUNA CRUZ		PRÓRROGA	4 meses																																																																																							
		FECHA VENCIMIENTO FINAL:	30/04/2024																																																																																							
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PLACA HUELLA)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAVIMENTO</td><td>PLACA HUELLA</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td></td><td>185</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TPO II</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td></td><td>28</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuates)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	PAVIMENTO	PLACA HUELLA	m ²			185	Estructuras	ALCANTARILLAS TPO II	und			2	Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m ²			28	Otros (Especificar cuates)			<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PLACA HUELLA)</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAVIMENTO</td><td>PLACA HUELLA</td><td>m²</td><td>0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TPO II</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m²</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuates)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	CANTIDAD ACUMULADA	PAVIMENTO	PLACA HUELLA	m ²	0	Estructuras	ALCANTARILLAS TPO II	und	0	Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m ²	0	Otros (Especificar cuates)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)																																																																																								
PAVIMENTO	PLACA HUELLA	m ²																																																																																								
		185																																																																																								
Estructuras	ALCANTARILLAS TPO II	und																																																																																								
		2																																																																																								
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m ²																																																																																								
		28																																																																																								
Otros (Especificar cuates)																																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PLACA HUELLA)	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																							
PAVIMENTO	PLACA HUELLA	m ²	0																																																																																							
Estructuras	ALCANTARILLAS TPO II	und	0																																																																																							
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m ²	0																																																																																							
Otros (Especificar cuates)																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 239.430.062,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 239.430.062,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 239.430.062,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 239.430.062,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 239.430.062,00			AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 239.430.062,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 239.430.062,00	\$ -	\$ 239.430.062,00	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 19.561.436,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 19.561.436,00</td><td>\$ 25.094.233,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 19.561.436,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 19.561.436,00</td><td>\$ 25.094.233,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 19.561.436,00	\$ 0,00	\$ 19.561.436,00	\$ 25.094.233,00	AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR EJECUTADO	\$ 19.561.436,00	\$ 0,00	\$ 19.561.436,00	\$ 25.094.233,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 239.430.062,00																																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 239.430.062,00																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 239.430.062,00	\$ -	\$ 239.430.062,00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 19.561.436,00	\$ 0,00	\$ 19.561.436,00	\$ 25.094.233,00																																																																																						
AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 19.561.436,00	\$ 0,00	\$ 19.561.436,00	\$ 25.094.233,00																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 4																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 25.094.233,00		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5																																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,48%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5																																																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14																																																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																										
Se realizó socialización de actividades constructivas a realizar teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y técnicos de la zona.																																																																																										
Firma: _____																																																																																										
Nombre: HERBY LUNA CRUZ																																																																																										
Director de Interventoría																																																																																										
Matrícula Profesional No. 2520242574 CND																																																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RNVAS																																																																																										
Copias: Interventoría, Dirección Territorial																																																																																										



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024


Convenio 2735

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEP-MVN-IS-FR-2																																																																																							
			VERSION 1																																																																																							
			PÁGINA 1 de 2																																																																																							
			FECHA 1/02/2024																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		PERIODO MES: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024																																																																																							
CONTRATO DE OBRA N°: 2735 DE 2023	PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE INICIO: 17 de NOVIEMBRE de 2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 4 meses 30/04/2024		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 226.147.762,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 226.147.762,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO:																																																																																							
OBJETO: AJUNTA ESPUEZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		CONTRATISTA: JAC CACHAVITA																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4341 de 2023		INTERVENIENTOR: HERBY LUNA CRUZ																																																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PAVIMENTO)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PAVIMENTO</td><td>FLEXIBLE</td><td>m</td></tr><tr><td></td><td>137</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m</td></tr><tr><td></td><td>24</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PAVIMENTO)	PAVIMENTO	FLEXIBLE	m		137	Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und		3	Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m		24	Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (PAVIMENTO)</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PAVIMENTO</td><td>FLEXIBLE</td><td>m</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PAVIMENTO)	CANTIDAD ACUMULADA	PAVIMENTO	FLEXIBLE	m	0				Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0				Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m	0				Otros (Especificar cuales)																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PAVIMENTO)																																																																																								
PAVIMENTO	FLEXIBLE	m																																																																																								
		137																																																																																								
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und																																																																																								
		3																																																																																								
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m																																																																																								
		24																																																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (PAVIMENTO)	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																							
PAVIMENTO	FLEXIBLE	m	0																																																																																							
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0																																																																																							
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m	0																																																																																							
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
AVANCE FINANCIERO		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 226.147.762,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 226.147.762,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 226.147.762,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 226.147.762,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 226.147.762,00			AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 226.147.762,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 226.147.762,00	\$ -	\$ 226.147.762,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 12.095.303,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 12.095.303,00</td><td>\$ 20.511.337,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 12.095.303,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 12.095.303,00</td><td>\$ 20.511.337,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 12.095.303,00	\$ 0,00	\$ 12.095.303,00	\$ 20.511.337,00	AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR EJECUTADO	\$ 12.095.303,00	\$ 0,00	\$ 12.095.303,00	\$ 20.511.337,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 226.147.762,00																																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 226.147.762,00																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 226.147.762,00	\$ -	\$ 226.147.762,00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 12.095.303,00	\$ 0,00	\$ 12.095.303,00	\$ 20.511.337,00																																																																																						
AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 12.095.303,00	\$ 0,00	\$ 12.095.303,00	\$ 20.511.337,00																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 20.511.337,00 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 9,07%		MANO DE OBRA CALIFICADA: 4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12																																																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																										
Se realizó socialización de actividades constructivas a realizar teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y técnicos de la zona.																																																																																										
Firma Nombre: HERBY LUNA CRUZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2520242574 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RIVAS. Copias: Interventoría, Dirección Técnica																																																																																										



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024

Convenio 2730

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEP/Min-R-15-FR-2																																																																																							
		VERSION	1																																																																																							
		PÁGINA	1 de 2																																																																																							
		FECHA	1/02/2024																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACA																																																																																							
		PERIODO MES:	01 AL 31 DE ENERO DE 2024																																																																																							
CONTRATO DE OBRA N°:	2730 DE 2023	PLAZO INICIAL:	4 meses																																																																																							
OBJETO:	ALIANZA ESPERUENZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	20 de NOVIEMBRE de 2023																																																																																							
		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
		FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023																																																																																							
CONTRATISTA:	JAC LA CRECIENTE	PRORROGA	4 meses																																																																																							
		PLAZO ACUMULADO:																																																																																								
		FECHA VENCIMIENTO FINAL:	30/04/2024																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4341 de 2023	INTERVENTOR:	HERIBY LUNA CRUZ																																																																																							
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (FLEXIBLE)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PAVIMENTO</td><td>FLEXIBLE</td><td>m</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (FLEXIBLE)	PAVIMENTO	FLEXIBLE	m			Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und			Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m	Otros (Especificar cuáles)			<table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD (FLEXIBLE)</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PAVIMENTO</td><td>FLEXIBLE</td><td>m</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>ALCANTARILLAS TIPO II</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>m</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (FLEXIBLE)	CANTIDAD ACUMULADA	PAVIMENTO	FLEXIBLE	m	0				Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0				Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m	0	Otros (Especificar cuáles)																																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (FLEXIBLE)																																																																																								
PAVIMENTO	FLEXIBLE	m																																																																																								
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und																																																																																								
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m																																																																																								
Otros (Especificar cuáles)																																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (FLEXIBLE)	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																							
PAVIMENTO	FLEXIBLE	m	0																																																																																							
Estructuras	ALCANTARILLAS TIPO II	und	0																																																																																							
Mantenimiento	ALCANTARILLAS	m	0																																																																																							
Otros (Especificar cuáles)																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 233.191.670,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 233.191.670,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 233.191.670,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 233.191.670,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 233.191.670,00			AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 233.191.670,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 233.191.670,00	\$ -	\$ 233.191.670,00	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 20.207.897,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 20.207.897,00</td><td>\$ 27.094.005,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 20.207.897,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 20.207.897,00</td><td>\$ 27.094.005,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 20.207.897,00	\$ 0,00	\$ 20.207.897,00	\$ 27.094.005,00	AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR EJECUTADO	\$ 20.207.897,00	\$ 0,00	\$ 20.207.897,00	\$ 27.094.005,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 233.191.670,00																																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 233.191.670,00																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
IMPLEMENTACIÓN TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 233.191.670,00	\$ -	\$ 233.191.670,00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 20.207.897,00	\$ 0,00	\$ 20.207.897,00	\$ 27.094.005,00																																																																																						
AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 20.207.897,00	\$ 0,00	\$ 20.207.897,00	\$ 27.094.005,00																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 4																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 27.094.005,00		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2																																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 11,62%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12																																																																																								
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																										
<div></div>																																																																																										
ESTADO INICIAL SECTOR VEREDA LA CRECIENTE		ESTADO INICIAL SECTOR LA CRECIENTE																																																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																										
Se realizó socialización de actividades constructivas a realizar teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y técnicos de la zona.																																																																																										
<div></div>																																																																																										
Firma: _____																																																																																										
Nombre: HERIBY LUNA CRUZ																																																																																										
Director de Interventoría																																																																																										
Matrícula Profesional No. 2520242514 CND																																																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del PIVAS.																																																																																										
Copio: Interventor, Dirección Territorial																																																																																										



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024

1 INTRODUCCION

Los convenios Solidarios # 2851, # 2940, # 2735 y # 2730 de 2023, celebrados entre el Instituto Nacional de vías con las JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, respectivamente, identificadas con número de NIT 900.157.977-1, 901.725.102-3, 900.158.059-8 y 901.315.436-9, respectivamente, que tiene como objeto, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, EL CENTRO y CACHAVITÁ DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” y “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DLA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Se impartió ordenes de inicio a los convenios con fechas 24, 17, 17 y 20 de noviembre de 2023 respectivamente.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-BOY-031- 2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **4341 de 2023**, entre el INVIAS y HERBY LUNA CRUZ la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Mediante invitación pública No. **IP-DT-BOY-031-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría con fecha 20 de noviembre de 2023.

El presente informe mensual de Interventoría N° 1 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 31 de en enero de 2024, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 1 al 31 enero de 2024

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Los proyectos a desarrollar se encuentra ubicados en la zona rural del Municipio de Santa Rosa de Viterbo del departamento de Boyacá, en la vereda Barrio **San Antonio** , teniendo como punto de referencia inicial el **PR0+000 (Latitud: 5,8670 y Longitud: -72,9812)** en la cruce Camino San Antonio – Santa Rosa de Viterbo y punto de referencia final **PR0+450 (Latitud: 5,8662 y Longitud: -72,9784)** ubicado en el Km0+450 en la vía de la vereda Gratamira que conecta al municipio de floresta Boyacá, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVIAS.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa de Viterbo del departamento de Boyacá, en la **vereda Centro**, teniendo como punto de referencia inicial el **PR0+000 (Latitud: 5,8649 y Longitud: -72,9750)** intersección de la vía Santa rosa-Floresta Boyacá y punto de referencia final **PR1+350 (Latitud: 5,8732 y Longitud: -72,9796)** ubicado en Km1+350 en cruce con camino de la escuela de policía Rafael reyes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVIAS.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa de Viterbo del departamento de Boyacá, en la **vereda Cachavita** , teniendo como punto de referencia inicial **el PR0+000 (Latitud: 5,8331 y Longitud: -72,9775)** Inicia en la escuela Cachavita – Santa Rosa de Viterbo y punto de referencia final **PR1+050 (Latitud: 5,8286 y Longitud: -72,9738)** ubicado en Km1+050 el cruce vía Santa Rosa-Nobsa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVIAS.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa de Viterbo del departamento de Boyacá, en la **vereda la Creciente**, teniendo como punto de referencia inicial el **PR0+000 (Latitud: 5,8193 y Longitud: -72,9714)** Curva límite con la vereda Cachavita y punto de referencia final **PR1+000 (Latitud: 5,8131 y Longitud: -72,9753)** ubicado en el Km1+000 en el sector los volcanes, curva "tienda donde Dani", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVIAS

El alcance de los proyectos consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 de enero 2024

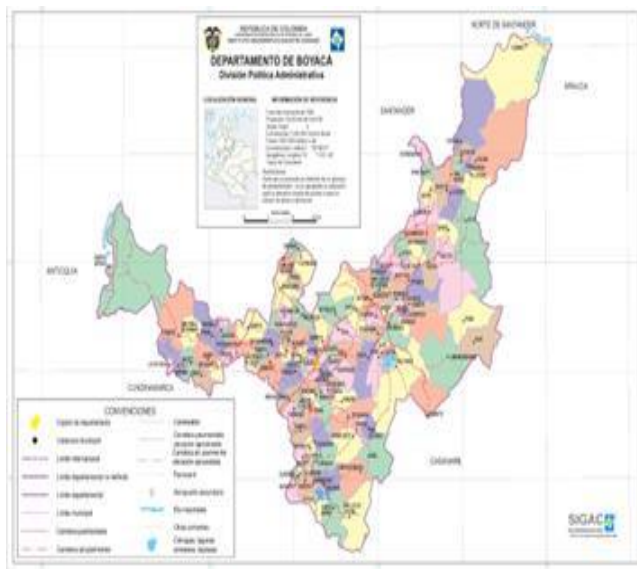
2.1 Localización y alcance

El municipio de **Santa Rosa de Viterbo** se encuentra localizado en la provincia de Neira del Departamento de Boyacá, dista **67** kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con **zonas mineras**, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **107** Km cuadrados.

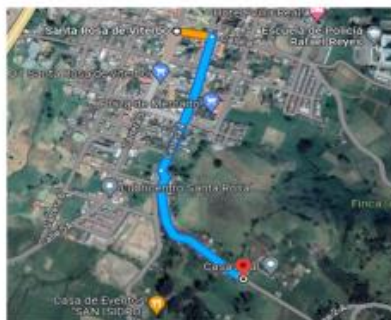
El Municipio de **Santa Rosa de Viterbo** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5° 52' 59"

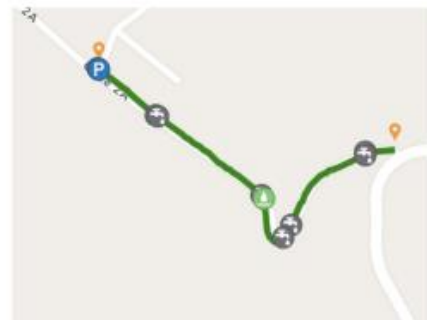
Longitud: 72° 58' 59"



JAC VEREDA SAN ANTONIO



Recorrido de Municipio a PR 0+000

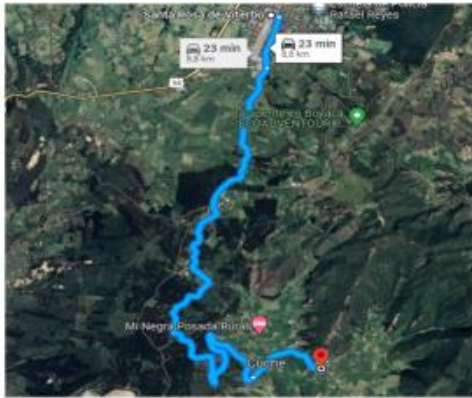


Tramo JAC Vereda Barrio San Antonio

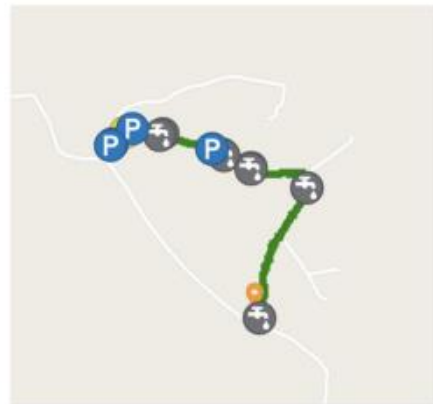


INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 de enero 2024

JAC VEREDA CACHAVITA



Recorrido de Municipio a PR 0+000

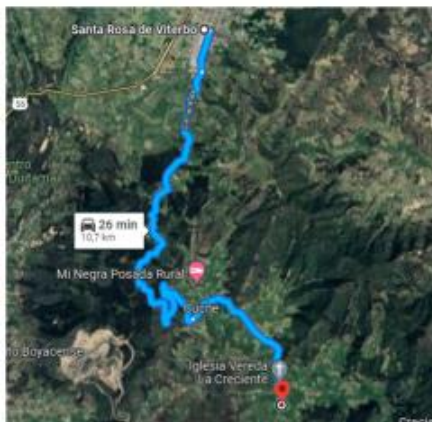


Tramo JAC Vereda Cachavita

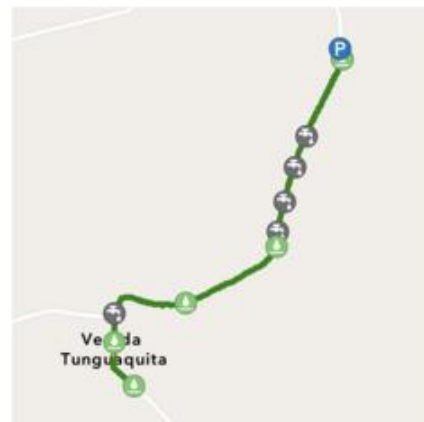
JAC VEREDA CENTRO



JAC VEREDA LA CRECIENTE



Recorrido de Municipio a PR 0+000



Tramo JAC Vereda La Creciente



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 de enero 2024

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Las veredas por beneficiarse se encuentran en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, dentro de los sectores priorizados para la atención de sitios críticos, se encuentran las vías terciarias del departamento de Boyacá realizando el mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. Teniendo en cuenta que, la vereda la creciente se encuentra a cargo de la gobernación y las veredas San Antonio, Centro y Cachavita se encuentran a cargo del municipio de Santa Rosa De Viterbo.

Municipio	Longitud (m)	Descripción Localización K0
Santa Rosa de Viterbo Vereda Centro	185	K1+350
Santa Rosa de Viterbo Vereda San Antonio	139	K0+450
Santa Rosa de Viterbo Vereda Cachavita	137	K1+050
Santa Rosa de Viterbo Vereda La Creciente	185	K1+000

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc.

El inventario depende de la "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir-



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 de enero 2024

Convenio 2851.

El tramo de vía se encuentra en la calle 2A, correspondiente a la vereda San Antonio, su estado inicial se encuentra en afirmado y capas de fresado en pavimento asfáltico intermitente, el cual presenta un gran deterioro en algunos puntos críticos de la misma, en especial en las zonas con curvas pronunciadas y de alta pendiente, las cunetas destinadas para el drenaje de la lluvia se encuentran cubiertas por vegetación y material de arrastre, por otro lado se encuentra una alcantarilla colmatada cubierta por vegetación, así mismo se relaciona un empalme con la vía aledaña Vía-Tobasía el cual se encuentra en desnivel con respecto al tramo de vía correspondiente a la vereda San Antonio.



Ilustración 2. Estado inicial de la vía. Vereda San Antonio.



Ilustración 3. Estado inicial de la vía. Vereda San Antonio.



Ilustración 4. Estado inicial de la vía. Vereda San Antonio.



Ilustración 5. Estado inicial de la vía. Vereda San Antonio.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 de enero 2024

Convenio 2940.

El tramo de vía correspondiente a la vereda Centro se empalma a la vía Santa Rosa de Viterbo-Tobasía, su estado inicial se encuentra en afirmado con un deterioro bastante pronunciado en dos puntos específicos (Ver ilustración 6 y 7) los cuales debido a su alta pendiente sufren daños por el flujo de vehículos y las constantes lluvias, por último no se encuentran alcantarillas a lo largo del tramo y no se encuentran motivos para realizar actividades de rosería y mantenimiento de alcantarillas y cunetas.



Ilustración 6. Estado inicial de la vía. Vereda Centro.



Ilustración 7. Estado inicial de la vía. Vereda Centro.



Ilustración 8. Estado inicial de la vía. Vereda Centro.



Ilustración 9. Estado inicial de la vía. Vereda Centro.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 de enero 2024

Convenio 2735.

El tramo de vía correspondiente a la vereda cachavita se encuentra en afirmado con una capa de fresado en pavimento asfáltico intermitente en sus inicios, las cunetas destinadas para el drenaje de la lluvia se encuentran cubiertas por vegetación y material de arrastre, se evidencian 2 alcantarillas las cuales se encuentran colmatadas, esta vía se empalma a la vía secundaria del valle de cuiche la cual se encuentra en pavimento asfáltico.



Ilustración 10. Estado inicial de la vía. Vereda Cachavita.



Ilustración 11. Estado inicial de la vía. Vereda Cachavita.

Convenio 2730.

El tramo de vía correspondiente a la vereda La Creciente se encuentra en afirmado, las cunetas destinadas para el drenaje de la lluvia se encuentran cubiertas por vegetación y material de arrastre, se evidencian 3 alcantarillas las cuales se encuentran colmatadas con material de arrastre, esta vía se empalma en su inicio y fin a la vía secundaria del valle de cuiche la cual se encuentra en pavimento asfáltico.



Ilustración 12. Estado inicial de la vía. Vereda La Creciente.



Ilustración 13. Estado inicial de la vía. Vereda La Creciente.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

2.4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las JAC.

El convenio 2851 de 2023 con la vereda San Antonio, es una vía terciaria la cual empalma a una vía secundaria vía Tobasía, consta de un presupuesto de 227'775.985, su meta física contractual se basa en la construcción de 139 metros lineales de placa huella, la construcción de 18 metros lineales de alcantarillas equivalente a 3 tramos de alcantarillas de 6 metros y su ejecución será bajo la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

El convenio 2940 de 2023 con la vereda Centro, es una vía terciaria la cual empalma a una vía secundaria vía Tobasía, consta de un presupuesto de 239'430.062, su meta física contractual se basa en la construcción de 185 metros lineales de placa huella, la construcción de 12 metros lineales de alcantarillas equivalente a 2 tramos de alcantarillas de 6 metros y su ejecución será bajo la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

El convenio 2735 de 2023 con la vereda Cachavita, es una vía terciaria la cual empalma a una vía secundaria del valle de cuche, consta de un presupuesto de 226'147.762, su meta física contractual se basa en la construcción de 137 metros lineales de pavimento flexible, la construcción de 18 metros lineales de alcantarillas equivalente a 3 tramos de alcantarillas de 6 metros y su ejecución será bajo la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

El convenio 2730 de 2023 con la vereda La Creciente, es una vía terciaria la cual empalma con una vía secundaria del valle de cuche, consta de un presupuesto de 232'191.670, su meta física contractual se basa en la construcción de 185 metros lineales de pavimento flexible la construcción de 6 metros lineales de alcantarillas equivalente a 1 tramo de alcantarilla y su ejecución será bajo la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.



**INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024**

3 INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 Información general de los Convenios solidarios

En la siguiente tabla se muestra la información general del convenio.

Tabla 1. Información general de los convenios solidarios

CONVENIO SOLIDARIO No.	2851 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
NIT	900.157.977-1
FECHA INICIACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$228.775.985) MONEDA CORRIENTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 228.775.985,00

CONVENIO SOLIDARIO No.	2940 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
NIT	901.725.102-3
FECHA INICIACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$240.430.062) MONEDA CORRIENTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 240.430.062,00

CONVENIO SOLIDARIO No.	2735 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
NIT	900.158.059-8
FECHA INICIACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$227.147.762) MONEDA CORRIENTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 227.147.762,00

CONVENIO SOLIDARIO No.	2730 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
NIT	901.315.436-9
FECHA INICIACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica



**INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024**

AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS (\$232.191.670) MONEDA CORRIENTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 232.191.670, 00

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes.

Convenio 2851 de 2023 Vereda San Antonio.

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra del convenio No. 2851 de 2023, correspondiente a los días comprendidos del lunes 01 de enero al miércoles 31 de enero del año 2024, por parte del residente de obra y contratista la JAC San Antonio se describen a continuación las actividades ejecutadas en el mes:

Se hizo estudio de tránsito promedio diario, de este análisis responde a la necesidad de comprender la dinámica del tráfico en esta localidad, buscando obtener datos precisos que respalden decisiones estratégicas para la optimización de la movilidad, realizar un diseño adecuado de estructura de pavimento capaz de soportar cargas móviles como estáticas del tráfico en un futuro.

Se ve la necesidad de realizar excavaciones mecánicas, para la conformación y adecuación de espacios para construcción de alcantarillas, construcción de placa huella y cunetas.

Luego de la conformación de la caja para la construcción de las alcantarillas, se funde piso en concreto de 3000 Psi para la colocación de la tubería y se realizó un adecuado relleno y compactación con arena y gravilla, se inició la construcción de los cabezotes, con la correcta colocación de acero de acuerdo con los planos y diseños estipulados según cartilla de obras menores.

Asimismo, se hizo excavación mecánica para la construcción de la placa huella con los anchos y profundidades especificados según diseños del pavimento.

Convenio 2940 de 2023 Vereda Centro

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra del convenio No. 2940 de 2023, correspondiente a los días comprendidos del lunes 01 de enero al miércoles 31 de enero del año 2024, por parte del residente de obra y contratista la JAC Centro se describen a continuación las actividades ejecutadas en el mes:

Se hizo estudio de tránsito promedio diario, de este análisis responde a la necesidad de comprender la dinámica del tráfico en esta localidad, buscando obtener datos precisos que respalden decisiones estratégicas para la optimización de la movilidad, realizar un diseño adecuado de estructura de pavimento capaz de soportar cargas móviles como estáticas del tráfico en un futuro.

Se ve la necesidad de realizar excavaciones mecánicas, para la conformación y adecuación de espacios para construcción de alcantarillas, construcción de placa huella y cunetas.

Luego de la conformación de la caja para la construcción de las alcantarillas, se funde piso en concreto de 3000 Psi para la colocación de la tubería y se realizó un adecuado relleno y compactación con arena y gravilla, se inició la construcción de los cabezotes, con la correcta colocación de acero de acuerdo con los planos y diseños estipulados según cartilla de obras menores.

Se adelantó levantamiento topográfico para toma de profundidades de excavación y/o conformación de caja. Se hizo excavación mecánica para la construcción de la placa huella con los anchos y



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

profundidades especificados según diseños del pavimento.

Convenio 2735 de 2023 vereda Cachavita

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra del convenio No. 2735 de 2023, correspondiente a los días comprendidos del lunes 01 de enero al miércoles 31 de enero del año 2024, por parte del residente de obra y contratista la JAC Cachavita se describen a continuación las actividades ejecutadas en el mes:

Se hizo estudio de tránsito promedio diario, de este análisis responde a la necesidad de comprender la dinámica del tráfico en esta localidad, buscando obtener datos precisos que respalden decisiones estratégicas para la optimización de la movilidad, realizar un diseño adecuado de estructura de pavimento capaz de soportar cargas móviles como estáticas del tráfico en un futuro.

Se realiza mantenimiento de cunetas en tierra de forma manual, trabajos de rocería para eliminar desechos vegetales, limpieza y mantenimiento de alcantarillas existentes en el tramo.

Se ve la necesidad de realizar excavaciones mecánicas, para la conformación y adecuación de espacios para construcción de alcantarillas, construcción de calzada y cunetas.

se funde piso en concreto de 3000 Psi para la colocación de la tubería de alcantarilla y se realizó un adecuado relleno y compactación con arena y gravilla, se inició la construcción de los cabezotes, con la correcta colocación de acero de acuerdo con los planos y diseños estipulados según cartilla de obras menores.

Se hizo trabajos de rocería y limpieza de cunetas en tierra existente, donde se removió material vegetal y material que obstruía el paso y evacuación adecuado del agua de escorrentía.

Se hizo excavación mecánica para nivelar el terreno, dado que no se necesitó de retirar el material existente, ya que presentaba suelo con CBR clasificado como bueno (S3) (MinTransporte, 2007, p.73) ya que está dentro de un rango entre 5% y 10% y aptos para la construcción de la estructura del pavimento sin necesidad de realizar mejora de la subrasante.

Convenio 2730 de 2023 vereda la Creciente

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra del convenio No. 2730 de 2023, correspondiente a los días comprendidos del lunes 01 de enero al miércoles 31 de enero del año 2024, por parte del residente de obra y contratista la JAC La creciente se describen a continuación las actividades ejecutadas en el mes:

Se hizo estudio de tránsito promedio diario, de este análisis responde a la necesidad de comprender la dinámica del tráfico en esta localidad, buscando obtener datos precisos que respalden decisiones estratégicas para la optimización de la movilidad, realizar un diseño adecuado de estructura de pavimento capaz de soportar cargas móviles como estáticas del tráfico en un futuro.

Se ve la necesidad de realizar excavaciones mecánicas, para la conformación y adecuación de espacios para construcción de alcantarillas, construcción de placa huella y cunetas.

se funde piso en concreto de 3000 Psi para la colocación de la tubería de alcantarilla y se realizó un adecuado relleno y compactación con arena y gravilla, se inició la construcción de los cabezotes, con la correcta colocación de acero de acuerdo con los planos y diseños estipulados según cartilla de obras menores.

Se hizo excavación mecánica para nivelar el terreno, dado que no se necesitó de retirar el material existente, ya que presentaba suelo con CBR clasificado como bueno (S3) (MinTransporte, 2007, p.73) ya que está dentro de un rango entre 5% y 10% y aptos para la construcción de la estructura del



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

pavimento sin necesidad de realizar mejora de la subrasante.

Se hizo trabajos de rocería y limpieza de cunetas en tierra existente, donde se removió material vegetal y material que obstruía el paso y evacuación adecuado del agua de escorrentía.

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

En este periodo no fue necesario adelantar nuevos precios.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Es importante resaltar las acciones a realizar para garantizar el avance de los proyectos anteriormente mencionados, en razón que una vez conformadas las veedurías ante la personería se adelantaron los respectivos comités operativos con las diferentes juntas de acción comunal para aprobación del personal, así como también la aprobación de las cotizaciones de estudios, diseños, proveedores e insumos.

Adicionalmente se ha hecho seguimiento en cuanto a la parte presupuestal de los 4 convenios de obra teniendo en cuenta los recursos girados de las cuentas por cada una de las JAC y los gastos realizados.

En consecuencia, el acompañamiento de la interventoría es de vital importancia teniendo en cuenta la etapa inicial de estudios y diseños, así como el inicio de obra, seguimiento constante a los procesos constructivos, temas presupuestales y demás factores relacionados a los convenios de obra y su debida ejecución.

Gestión Ambiental

Pendiente instrucción del INVIAS a llevar a cabo en este proyecto, última información, quedaron enviar unos formatos que apliquen al proyecto, al término del periodo no se recibieron. Sin embargo, la interventoría hizo seguimiento ambiental a los respectivos permisos ambientales de los materiales suministrados para los proyectos, asimismo se hizo gestión de los formatos según manual de interventoría vigentes, información registrada en el informe ambiental de Interventoría.

Gestión Social

Se socializó el proyecto con presencia de los Representantes legales de las cuatro JAC, INVIAS e Interventoría, se realizó actividades de seguimiento como se relaciona en el informe de gestión social adjunto al presente informe de interventoría.

SST

En el informe de SST se relaciona las HV del personal profesional y de obra, afiliaciones de los respectivos convenios.

Técnica

Durante el desarrollo de los proyectos se dio aprobación de los profesionales de los cuatro convenios así mismo, se aprobaron las contrataciones pertinentes con respecto a los estudios del proyecto de cada vereda.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

En cuanto a la construcción de las alcantarillas, durante este periodo se hizo actividades de excavación se da inicio con la instalación de la tubería de acuerdo con los diseños de cartilla de obras menores, además con el apoyo técnico del especialista hidráulico de la Interventoría, asesoría del profesional en visita de campo.

Está pendiente de recibir las licencias ambientales de las canteras, certificados de calidad de los materiales y herramientas a utilizar, así como, los certificados de calibración de los aparatos utilizados por los especialistas en los respectivos estudios.

En cuanto a los sistemas constructivos aplicables en los 4 convenios, se realizó un exhaustivo análisis de la cartilla de obras menores del INVIAS con el fin de identificar las estructuras de pavimento a instalar teniendo en cuenta los estudios previos realizados. Así mismo se analizó el sistema constructivo en cuanto a la instalación del alcantarillado de los 4 convenios, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en la cartilla de obras menores el INVIAS y sus respectivas normativas aplicables.



4.1 Informes Semanales. Semana 1. San Antonio

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

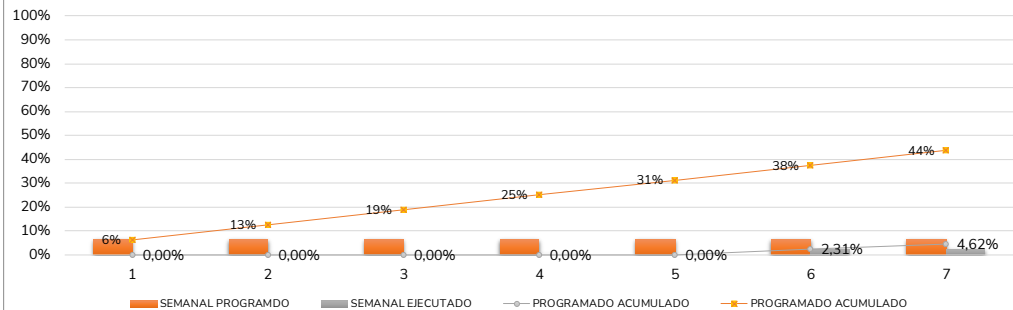


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2851	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO .		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.775.985,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	6	DE	16	FECHA DE REPORTE :	4/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	4,62%	% DE AVANCE SEMANAL :	2,31%		
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 6.489.664	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.261.625		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10	MUJERES EMPLEADAS :	2		

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0,45	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	6	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	139	0	0	0%
ALCANTARILLAS	m	18	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : 4/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO O ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%		
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 4,62% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

SUBTOTAL 2

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota :

Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
			(km)	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0.45	6	0	139	3	0	0	0	0	0



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA		0.450		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL	PARTICULAR								
		2013	AR								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS											
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$			-
							SUB-TOTAL	\$			-
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ml	42.00	\$ 59,092.00	\$		2,481,864.00	
							SUB-TOTAL	\$		2,481,864.00	
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCION PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$		68,163.00	
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	116.96	\$ 123,026.00	\$		14,389,121.00	
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	80.76	\$ 754,076.00	\$		60,899,178.00	
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$		17,666,973.00	
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	4,082.36	\$ 7,123.00	\$		29,078,650.00	
							SUB-TOTAL	\$		122,102,085.00	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$		2,120,971.00	
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$		1,239,791.00	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$		760,276.00	
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$		21,641,981.00	
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$		12,370,514.00	
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$		80,377.00	
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	M	18.00	\$ 748,831.00	\$		13,478,958.00	
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$		1,782,826.00	
							SUB-TOTAL	\$		53,475,694.00	
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT											
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$			-
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$			-
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$			-
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$			-
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$			-
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$			-
							SUB-TOTAL	\$			-
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES											
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$			-
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$			-
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$			-
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$			-
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$			-
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$			-
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$			-
							SUB-TOTAL	\$			-
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA										\$	178,059,643.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)										\$	5,295,653.00
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL										\$	1,000,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS										\$	44,420,689.00
VALOR ESTIMADO CONVENIO										\$	228,775,985.00

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

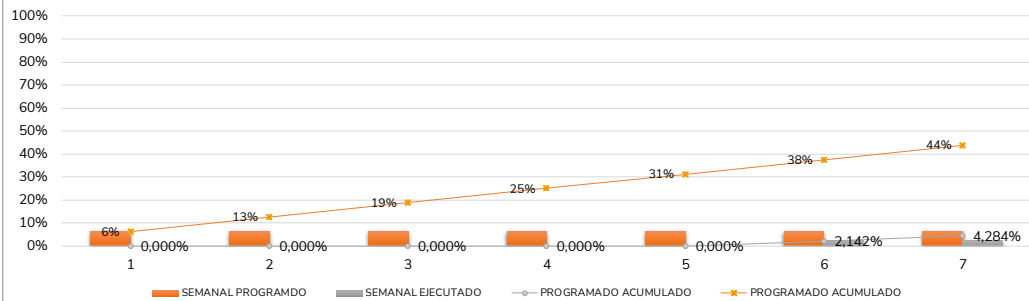


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2940	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	17/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 239.430.062,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	6	DE	16	FECHA DE REPORTE :	4/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	4,28%	% DE AVANCE SEMANAL :	2,14%		
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 10.257.377	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.128.689		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10	MUJERES EMPLEADAS :	2		

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	1,35	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	12	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	185,00	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : jueves, 4 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMDO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJEUTADO	ACUMULADO EJEUTADO
1	6%	6%	0,000%	0,000%
2	6%	13%	0,000%	0,000%
3	6%	19%	0,000%	0,000%
4	6%	25%	0,000%	0,000%
5	6%	31%	0,000%	0,000%
6	6%	38%	2,142%	2,142%
7	6%	44%	2,142%	4,284%
8	6%	50%		
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 2,142%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

SUBTOTAL	2
----------	---

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota : Responsable debera extenderlo a la duracion del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35	4	0	185.00	2	0	0	0	0	



AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35		BOYACÁ	29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO									
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO									
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE									
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	28.00	\$ 60,413.00	\$ 1,691,564.00	
SUB-TOTAL								\$ 1,691,564.00	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA									
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.41	\$ 16,932.00	\$ 91,602.00	
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	141.52	\$ 123,026.00	\$ 17,410,640.00	
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	107.23	\$ 754,076.00	\$ 80,859,569.00	
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34.60	\$ 448,694.00	\$ 15,524,812.00	
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5,312.04	\$ 7,139.00	\$ 37,922,654.00	
SUB-TOTAL								\$ 151,809,277.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS									
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.90	\$ 16,932.00	\$ 1,572,983.00	
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16.40	\$ 52,247.00	\$ 856,851.00	
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.90	\$ 543,054.00	\$ 488,749.00	
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	M3	19.10	\$ 754,076.00	\$ 14,402,852.00	
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.80	\$ 7,139.00	\$ 8,265,534.00	
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00	
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12.00	\$ 748,831.00	\$ 8,985,972.00	
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	50.90	\$ 23,366.00	\$ 1,189,329.00	
SUB-TOTAL								\$ 35,842,647.00	
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 189,343,488.00	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 5,640,750.00	
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL								\$ 1,000,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 44,445,824.00	
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 240,430,062.00	

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS					
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL							
TERRITORIAL		DT- BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2735		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO .					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 226.147.762,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
INTERVENTOR :		INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :		20/11/2023	
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		7		DE		16	
				FECHA DE REPORTE :		5/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		1,37%		% DE AVANCE SEMANAL :		1,37%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA		\$ 14.300.215,00		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 1.212,33	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		2		MUJERES EMPLEADAS :		0	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
		UM		TOTAL		EJECUTADO AVANCE SEMANA % AVANCE	
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA		km		1,05		0 0 0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m		24		24 6 25%	
ROCERIA		Ha		0,9		0,8 0,2 22%	
Mejoramiento							
PLACA HUELLA		m		137		0 0 0%	
ALCANTARILLAS		Und		3		0 0 0%	
BOX-CULVERT 1X1		Und		0		0 0 0%	
BOX-CULVERT 1X2		Und		0		0 0 0%	
MUROS EN GAVIONES		Und		0		0 0 0%	
CUNETAS		m		0		0 0 0%	
BATEA		m		0		0 0 0%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL		1		1 1 100%	
SUELOS		GLOBAL		1		1 1 100%	
TRANSITO		GLOBAL		1		1 1 100%	
HIDRAULICO		GLOBAL		1		1 1 100%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLI		ING. FREDY BASTIDAS MONROY		FECHA DE SEGUIMIENTO :		viernes 5 de enero de 2024	
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO O ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0,00%	0,00%
6	6%	38%	0,00%	0,00%
7	6%	44%	1,37%	1,37%
8	6%	50%		
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 1,37%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	2
Operario	0

SUBTOTAL 4

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 12

Nota :
*Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio*

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.050	3	0	137.00	3	0	0	0	0	0



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA													
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL			LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN		
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			1.050		BOYACÁ		29/06/2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO													
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN			UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR										
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm			ml	24.00	\$ 59,092.00	\$ 1,418,208.00			
										SUB-TOTAL		\$ 1,418,208.00	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA													
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar			M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C			M3	115.28	\$ 123,026.00	\$ 14,182,437.00			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ			M3	80.67	\$ 754,076.00	\$ 60,831,311.00			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)			M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)			KG	4,058.14	\$ 7,123.00	\$ 28,906,131.00			
										SUB-TOTAL		\$ 121,655,015.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS													
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar			M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco			M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ			M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ			M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa			KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo			M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior			M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación			M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00			
										SUB-TOTAL		\$ 53,475,694.00	
										SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA		\$ 176,548,917.00	
										PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ 5,204,199.00	
										APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL		\$ 1,000,000.00	
										GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 44,394,646.00	
										VALOR ESTIMADO CONVENIO		\$ 227,147,762.00	

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS		CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		INVIAS	
TERRITORIAL		DT-BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2730		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,					
FECHA DE ADJUDICACION :				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 233.191.670,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
INTERVENTOR :		INTERVENTORIA SOLIDARIA					
FECHA DE ADJUDICACION :		2/10/2023		FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491.337,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		7		DE		16	
				FECHA DE REPORTE :		4/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		6,861%		% DE AVANCE SEMANAL :		1,96%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA		11.026.831		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 4.576.658	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		14		MUJERES EMPLEADAS :		1	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE	
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENEDIA		m	0,45	0	0	0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	36	36	6	17%	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Ha	1	1	0.2	20%	
TRANSPORTE MATERIAL TIERRA		dia	3	3	3	100%	
ZANJA DE DRENAJE		m	50	50	50	100%	
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA		m	900	600	200	22%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
SUELOS		GLOBAL	1	1	1	100%	
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%	
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
		Und	0	0	0	0%	
			0	0	0	0%	
			0	0	0	0%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLE							
FECHA DE SEGUIMIENTO :							
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMDO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6,25%	6%	0,00%	0,00%
2	6,25%	13%	0,00%	0,00%
3	6,25%	19%	0,00%	0,00%
4	6,25%	25%	0,40%	0,40%
5	6,25%	31%	0,53%	0,93%
6	6,25%	38%	3,97%	4,90%
7	6,25%	44%	1,96%	6,86%
8	6,25%	50%		
9	6,25%	56%		
10	6,25%	63%		
11	6,25%	69%		
12	6,25%	75%		
13	6,25%	81%		
14	6,25%	88%		
15	6,25%	94%		
16	6,25%	100%		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	1
Operario Retroescavadora	1
Operario volqueta	1
SUBTOTAL	6

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

ACUMULADOS 100% 6,86%

EMPLEOS DIRECTOS 14

Nota : Responsable debera
extenderlo a la
duracion del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.000	1	0	185.00	1	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR		DIRECCIÓN		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA		0.450		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL	PARTICULAR								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS											
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -			
SUB-TOTAL								\$ -			
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de	ml	8.00	\$ 59,092.00	\$ 472,736.00			
SUB-TOTAL								\$ 472,736.00			
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCION PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.01	\$ 15,215.00	\$ 91,442.15			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	155.67	\$ 123,026.00	\$ 19,151,457.42			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	108.73	\$ 754,076.00	\$ 81,990,683.48			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa	M3	47.91	\$ 497,241.00	\$ 23,822,816.31			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	5,467.06	\$ 7,123.00	\$ 38,941,868.38			
SUB-TOTAL								\$ 163,998,267.74			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	\$ 15,215.00	\$ 707,497.50			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	\$ 50,398.00	\$ 413,263.60			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0.50	\$ 543,054.00	\$ 271,527.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa	M3	9.60	\$ 754,076.00	\$ 7,239,129.60			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	\$ 7,123.00	\$ 4,123,504.70			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21	M	6.00	\$ 748,831.00	\$ 4,492,986.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material	M3	25.40	\$ 23,366.00	\$ 593,496.40			
SUB-TOTAL								\$ 17,921,781.80			
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT											
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -			
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -			
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -			
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -			
SUB-TOTAL								\$ -			
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES											
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -			
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -			
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -			
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -			
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -			
SUB-TOTAL								\$ -			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 182,392,785.00			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 5,380,864.00			
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL								\$ 1,000,000.00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 44,418,021.00			
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 233,191,670.00			

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

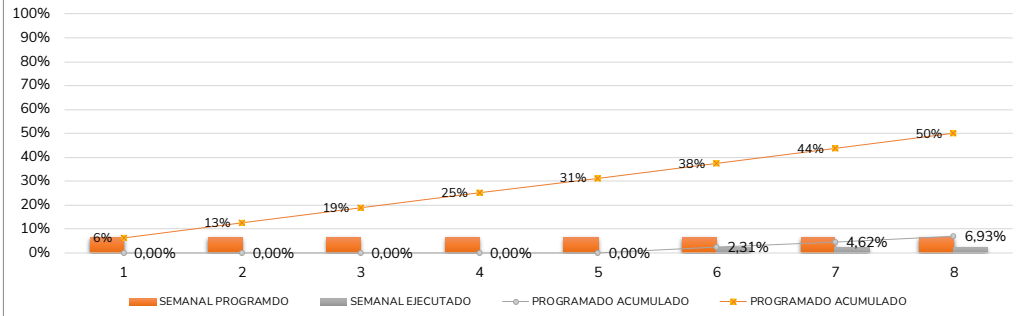


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2851	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.775.985,00	FECHA DE FIN :	31/12/2023
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	31/12/2023

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	8	DE	16	FECHA DE REPORTE :	12/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	6,93%	% DE AVANCE SEMANAL :	2,31%		
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 15.794.710	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.261.625		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10	MUJERES EMPLEADAS :	2		

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0,45	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	6	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	139	0	0	0%
ALCANTARILLAS	m	18	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : 12/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIVOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%	2,31%	6,93%
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 6,93% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

SUBTOTAL 2

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota :
Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
			(km)	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0.45	6	0	139	3	0	0	0	0	0



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN	FECHA ELABORACIÓN
BOYACA		SANTA ROSA DE		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA		0.450	BOYACÁ	29/06/2023
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		2013	AR					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ml	42.00	\$ 59,092.00	\$ 2,481,864.00
							SUB-TOTAL	\$ 2,481,864.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCION PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	116.96	\$ 123,026.00	\$ 14,389,121.00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	80.76	\$ 754,076.00	\$ 60,899,178.00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	4,082.36	\$ 7,123.00	\$ 29,078,650.00
							SUB-TOTAL	\$ 122,102,085.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00
							SUB-TOTAL	\$ 53,475,694.00
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT								
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES								
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 178,059,643.00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 5,295,653.00
							APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	\$ 1,000,000.00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,420,689.00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 228,775,985.00

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

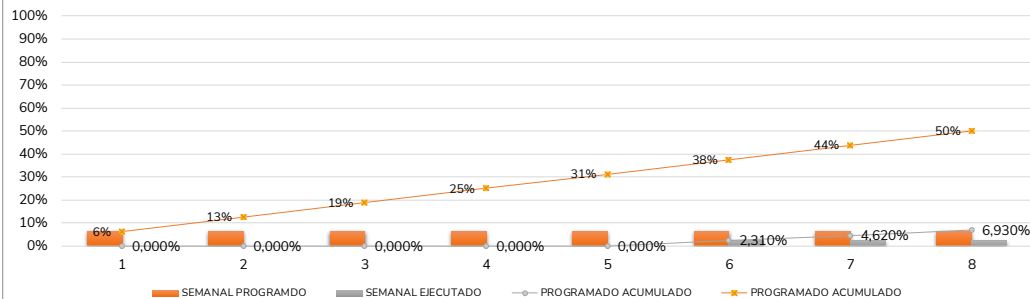


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2940	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	17/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 239.430.062,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	8	DE	16	FECHA DE REPORTE :	12/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	6,93%	% DE AVANCE SEMANAL :	2,31%		
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 16.592.503	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.530.834		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10	MUJERES EMPLEADAS :	2		

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	1,35	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	12	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	185,00	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : viernes, 12 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMDO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,000%	0,000%
2	6%	13%	0,000%	0,000%
3	6%	19%	0,000%	0,000%
4	6%	25%	0,000%	0,000%
5	6%	31%	0,000%	0,000%
6	6%	38%	2,310%	2,310%
7	6%	44%	2,310%	4,620%
8	6%	50%	2,310%	6,930%
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 6,930%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

0 SUBTOTAL 2

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota : Responsable debera extenderlo a la duracion del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35	4	0	185.00	2	0	0	0	0	



AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35	BOYACÁ	29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	28.00	\$ 60,413.00	\$ 1,691,564.00
SUB-TOTAL								\$ 1,691,564.00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.41	\$ 16,932.00	\$ 91,602.00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	141.52	\$ 123,026.00	\$ 17,410,640.00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	107.23	\$ 754,076.00	\$ 80,859,569.00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34.60	\$ 448,694.00	\$ 15,524,812.00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5,312.04	\$ 7,139.00	\$ 37,922,654.00
SUB-TOTAL								\$ 151,809,277.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.90	\$ 16,932.00	\$ 1,572,983.00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16.40	\$ 52,247.00	\$ 856,851.00
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.90	\$ 543,054.00	\$ 488,749.00
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	19.10	\$ 754,076.00	\$ 14,402,852.00
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.80	\$ 7,139.00	\$ 8,265,534.00
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12.00	\$ 748,831.00	\$ 8,985,972.00
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	50.90	\$ 23,366.00	\$ 1,189,329.00
SUB-TOTAL								\$ 35,842,647.00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 189,343,488.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 5,640,750.00
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL								\$ 1,000,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 44,445,824.00
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 240,430,062.00

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS					
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL							
TERRITORIAL		DT- BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2735		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 226.147.762,00		FECHA DE FIN :		30/704/2024	
INTERVENTOR :		INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :		20/11/2023	
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491.337,00		FECHA DE FIN :		30/704/2024	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		8		DE		16	
				FECHA DE REPORTE :		12/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		1.95%		% DE AVANCE SEMANAL :		0.57%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA		\$ 4.403.196,56		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 1.294.276,85	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		2		MUJERES EMPLEADAS :		0	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE	
		km	1,05	0	0	0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	24	24	6	25%	
ROCERÍA		Ha	0,9	0,8	0,2	22%	
Mejoramiento							
PLACA HUELLA		m	137	0	0	0%	
ALCANTARILLAS		Und	3	0	0	0%	
BOX-CULVERT 1X1		Und	0	0	0	0%	
BOX-CULVERT 1X2		Und	0	0	0	0%	
MUROS EN GAVIONES		Und	0	0	0	0%	
CUNETAS		m	0	0	0	0%	
BATEA		m	0	0	0	0%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
SUELOS		GLOBAL	1	1	1	100%	
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%	
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLI		ING. FREDY BASTIDAS MONROY		FECHA DE SEGUIMIENTO :		viernes, 12 de enero de 2024	
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0,00%	0,00%
6	6%	38%	0,00%	0,00%
7	6%	44%	1,375%	1,37%
8	6%	50%	0,57%	1,95%
9	6%	56%		
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 1,95%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	2
Operario	0

SUBTOTAL 4

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 12

Nota :
Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.050	3	0	137.00	3	0	0	0	0	0



AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.050		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24.00	\$ 59,092.00	\$ 1,418,208.00			
SUB-TOTAL								\$ 1,418,208.00			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	115.28	\$ 123,026.00	\$ 14,182,437.00			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80.67	\$ 754,076.00	\$ 60,831,311.00			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,058.14	\$ 7,123.00	\$ 28,906,131.00			
SUB-TOTAL								\$ 121,655,015.00			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00			
SUB-TOTAL								\$ 53,475,694.00			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 176,548,917.00			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 5,204,199.00			
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL								\$ 1,000,000.00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 44,394,646.00			
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 227,147,762.00			

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS					
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							
TERRITORIAL		DT- BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2730		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRESCIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 233.191.670,00		FECHA DE FIN :		31/12/2023	
INTERVENTOR :		INTERVENTORIA SOLIDARIA					
FECHA DE ADJUDICACION:		2/10/2023		FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491.337,00		FECHA DE FIN :		31/12/2023	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		8		DE		16	
				FECHA DE REPORTE :		11/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		9,612%		% DE AVANCE SEMANAL :		2,75%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA		17.434.521		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 6.407.690	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		15		MUJERES EMPLEADAS :		1	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE	
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENEDIA		m	0,45	0	0	0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	36	36	6	17%	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Ha	1	1	0,2	20%	
TRANSPORTE MATERIAL TIERRA		dia	3	3	3	100%	
ZANJA DE DRENAJE		m	50	50	50	100%	
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA		m	900	600	200	22%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
SUELOS		GLOBAL	1	1	1	100%	
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%	
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
Construccion Alcantarillas							
Excavaciones Varias sin Clasificar		M3	100	55	55	55%	
Concreto reforzado resistencia 14 MPa (F) -		M3	3	1	1	33%	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -		M3	19,2	0	0	0%	
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa		KG	1157,8	0	0	0%	
Tubería de 6 metros de 450 mm de diámetro		und	7	4	4	57%	
Relleno para Estructuras con material		M3	50	30	30	60%	
REMOCION DE ALCANTARILLAS		m	20	12	12	60%	
		Und	0	0	0	0%	
		m	0	0	0	0%	
			0	0	0	0%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLE		FECHA DE SEGUIMIENTO :					
		11/01/2024					
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMDO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6,25%	6%	0,00%	0,00%
2	6,25%	13%	0,00%	0,00%
3	6,25%	19%	0,00%	0,00%
4	6,25%	25%	0,40%	0,40%
5	6,25%	31%	0,53%	0,93%
6	6,25%	38%	3,97%	4,90%
7	6,25%	44%	1,96%	6,86%
8	6,25%	50%	2,75%	9,61%
9	6,25%	56%		
10	6,25%	63%		
11	6,25%	69%		
12	6,25%	75%		
13	6,25%	81%		
14	6,25%	88%		
15	6,25%	94%		
16	6,25%	100%		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	2
Operario Retroescavadora	1
Operario volqueta	1
SUBTOTAL	7

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidráulico	1
Especialista de geometría	1
Inspector técnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

ACUMULADOS 100% 3,97% 9,61%

Responsable deberá
extenderlo a la
duración del convenio

Nota :

EMPLEOS DIRECTOS 15

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.000	1	0	185.00	1	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR		DIRECCIÓN		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA		0.450		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL	PARTICULAR								
		2013	2013								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS											
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -			
							SUB-TOTAL	\$ -			
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de	ml	8.00	\$ 59,092.00	\$ 472,736.00			
							SUB-TOTAL	\$ 472,736.00			
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCION PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.01	\$ 15,215.00	\$ 91,442.15			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	155.67	\$ 123,026.00	\$ 19,151,457.42			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	108.73	\$ 754,076.00	\$ 81,990,683.48			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa	M3	47.91	\$ 497,241.00	\$ 23,822,816.31			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	5,467.06	\$ 7,123.00	\$ 38,941,868.38			
							SUB-TOTAL	\$ 163,998,267.74			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	\$ 15,215.00	\$ 707,497.50			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	\$ 50,398.00	\$ 413,263.60			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0.50	\$ 543,054.00	\$ 271,527.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa	M3	9.60	\$ 754,076.00	\$ 7,239,129.60			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	\$ 7,123.00	\$ 4,123,504.70			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21	M	6.00	\$ 748,831.00	\$ 4,492,986.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material	M3	25.40	\$ 23,366.00	\$ 593,496.40			
							SUB-TOTAL	\$ 17,921,781.80			
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT											
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -			
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -			
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -			
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -			
							SUB-TOTAL	\$ -			
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES											
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -			
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -			
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -			
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -			
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -			
							SUB-TOTAL	\$ -			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 182,392,785.00			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 5,380,864.00			
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL								\$ 1,000,000.00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 44,418,021.00			
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 233,191,670.00			

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIVOS DE LA PAZ TOTAL

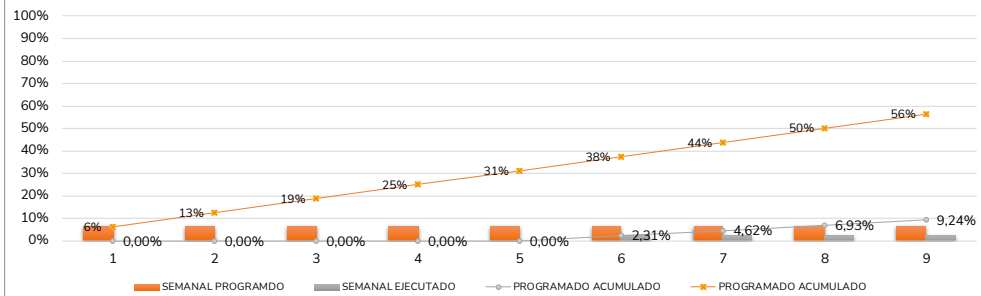


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2851	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.775.985,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	9	DE	16	FECHA DE REPORTE :	18/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	9,24%			% DE AVANCE SEMANAL :	2,31%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	<u>\$ 21.056.335,33</u>			VALOR EJECUCION SEMANAL :	<u>\$ 5.261.625</u>
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10			MUJERES EMPLEADAS :	2

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0,45	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	6	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	139	0	0	0%
ALCANTARILLAS	m	18	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : 18/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%	2,31%	6,93%
9	6%	56%	2,31%	9,24%
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 9,24% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

SUBTOTAL 2

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota :
Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0.45	6	0	139	3	0	0	0	0	0



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL			LONGITUD DEL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			0.450	BOYACÁ	29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42.00	\$ 59,092.00	\$ 2,481,864.00
							SUB-TOTAL	\$ 2,481,864.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCION PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	116.96	\$ 123,026.00	\$ 14,389,121.00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80.76	\$ 754,076.00	\$ 60,899,178.00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,082.36	\$ 7,123.00	\$ 29,078,650.00
							SUB-TOTAL	\$ 122,102,085.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00
							SUB-TOTAL	\$ 53,475,694.00
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT								
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES								
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA							\$	178,059,643.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)							\$	5,295,653.00
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL							\$	1,000,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS							\$	44,420,689.00
VALOR ESTIMADO CONVENIO							\$	228,775,985.00

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

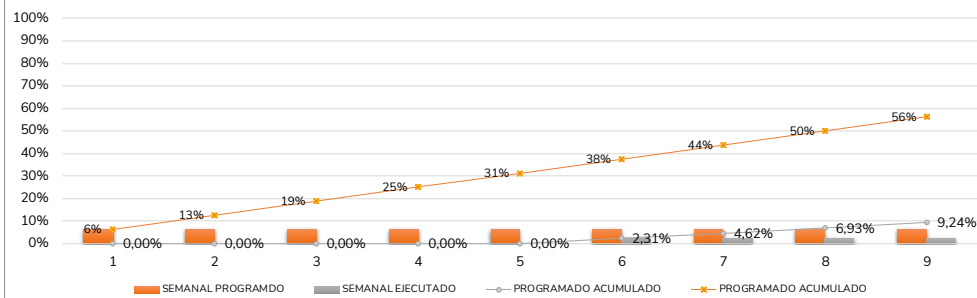


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2940	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	17/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 239.430.062,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	9	DE	16	FECHA DE REPORTE :	18/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	9,24%			% DE AVANCE SEMANAL :	2,31%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 22.128.506,47			VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.530.834
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	10			MUJERES EMPLEADAS :	2

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0,45	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	6	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	139	0	0	0%
ALCANTARILLAS	m	18	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : 18/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%	2,31%	6,93%
9	6%	56%	2,31%	9,24%
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 9,24% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	0
Operario	0

SUBTOTAL 2

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 10

Nota :
Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35	4	0	185.00	2	0	0	0	0	



													
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA													
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL			LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN		
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			1.35		BOYACÁ		29/06/2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO													
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN			UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR										
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm			ml	28.00	\$ 60,413.00	\$ 1,691,564.00			
										SUB-TOTAL		\$ 1,691,564.00	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA													
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar			M3	5.41	\$ 16,932.00	\$ 91,602.00			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C			M3	141.52	\$ 123,026.00	\$ 17,410,640.00			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ			M3	107.23	\$ 754,076.00	\$ 80,859,569.00			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)			M3	34.60	\$ 448,694.00	\$ 15,524,812.00			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)			KG	5,312.04	\$ 7,139.00	\$ 37,922,654.00			
										SUB-TOTAL		\$ 151,809,277.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS													
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar			M3	92.90	\$ 16,932.00	\$ 1,572,983.00			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco			M3	16.40	\$ 52,247.00	\$ 856,851.00			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ			M3	0.90	\$ 543,054.00	\$ 488,749.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ			M3	19.10	\$ 754,076.00	\$ 14,402,852.00			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa			KG	1157.80	\$ 7,139.00	\$ 8,265,534.00			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo			M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior			M	12.00	\$ 748,831.00	\$ 8,985,972.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación			M3	50.90	\$ 23,366.00	\$ 1,189,329.00			
										SUB-TOTAL		\$ 35,842,647.00	
										SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA		\$ 185,343,488.00	
										PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ 5,640,750.00	
										APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL		\$ 1,000,000.00	
										GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 44,445,824.00	
										VALOR ESTIMADO CONVENIO		\$ 240,430,062.00	

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

	FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS				
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL					
TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA		
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO		
CONVENIO SOLIDARIO :	2735	DE	2023		
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,				
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.147.762,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024		
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023				
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023		
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.147.762,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024		
AVANCE DEL PROYECTO					
SEMANA DE EJECUCION :	9	DE	16		
		FECHA DE REPORTE :	19/01/2024		
% DE AVANCE ACUMULADO :	2.50%	% DE AVANCE SEMANAL :	0.57%		
VALOR EJECUCION ACUMULADA	\$ 16.000.215,00	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 1.300.000,00		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	12	MUJERES EMPLEADAS :	0		
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO					
CONTROL DE METAS FISICAS					
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
	km	1,05	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	24	24	6	25%
ROCERÍA	Ha	0,9	0,8	0,2	22%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	137	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	3	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%
Estudios					
TOPOGRAFICO	GLOBAL	1	1	1	100%
SUELOS	GLOBAL	1	1	1	100%
TRANSITO	GLOBAL	1	1	1	100%
HIDRAULICO	GLOBAL	1	1	1	100%
PROBLEMAS O INCONVENIENTES					
DESCRIPCION :					
RESPONSABLI	ING. FREDY BASTIDAS MONROY	FECHA DE SEGUIMIENTO :	jueves 19 de enero de 2024		
REGISTRO FOTOGRAFICO					



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0,00%	0,00%
6	6%	38%	0,00%	0,00%
7	6%	44%	1,375%	1,37%
8	6%	50%	0,57%	1,95%
9	6%	56%	0,55%	2,50%
10	6%	63%		
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 2,50%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	2
Operario	0

SUBTOTAL 4

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 12

Nota: Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.050	3	0	137.00	3	0	0	0	0	0



AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.050		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24.00	\$ 59,092.00	\$ 1,418,208.00			
								SUB-TOTAL	\$ 1,418,208.00		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	115.28	\$ 123,026.00	\$ 14,182,437.00			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80.67	\$ 754,076.00	\$ 60,831,311.00			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,058.14	\$ 7,123.00	\$ 28,906,131.00			
								SUB-TOTAL	\$ 121,655,015.00		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00			
								SUB-TOTAL	\$ 53,475,694.00		
								SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 176,548,917.00		
								PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 5,204,199.00		
								APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	\$ 1,000,000.00		
								GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,394,646.00		
								VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 227,147,762.00		

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		INVIAS	
TERRITORIAL		DT-BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2730		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO .					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 233.191.670,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
INTERVENTOR :				INTERVENTORIA SOLIDARIA			
FECHA DE ADJUDICACION:		2/10/2023		FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491.337,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		9		DE		16	
				FECHA DE REPORTE :		18/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		12,233%		% DE AVANCE SEMANAL :		2,75%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA :		25.053.029		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 6.111.854	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		15		MUJERES EMPLEADAS :		1	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENIEDA		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE	
		m	0,45	0	0	0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	36	36	6	17%	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Ha	1	1	0,2	20%	
TRANSPORTE MATERIAL TIERRA		dia	3	3	3	100%	
ZANIA DE DRENAJE		m	50	50	50	100%	
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA		m	900	600	200	22%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
SUELOS		GLOBAL	1	1	1	100%	
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%	
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
Construccion Alcantarillas							
Excavaciones Varias sin Clasificar		M3	100	100	45	45%	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -		M3	3	2	1	33%	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -		M3	9	0	0	0%	
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa		KG	365,84	0	0	0%	
Tuberia de 6 metros de 450 mm de diametro		m	42	42	18	43%	
Relleno para Estructuras con material		M3	54	54	24	44%	
REMOCION DE ALCANTARILLAS		m	20	20	8	40%	
		Und	0	0	0	0%	
		m	0	0	0	0%	
			0	0	0	0%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLE		Hector Jimenez		FECHA DE SEGUIMIENTO :		18/01/2024	
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6,25%	6%	0,00%	0,00%
2	6,25%	13%	0,00%	0,00%
3	6,25%	19%	0,00%	0,00%
4	6,25%	25%	0,40%	0,40%
5	6,25%	31%	0,53%	0,93%
6	6,25%	38%	3,97%	4,90%
7	6,25%	44%	1,96%	6,86%
8	6,25%	50%	2,75%	9,61%
9	6,25%	56%	2,62%	12,23%
10	6,25%	63%		
11	6,25%	69%		
12	6,25%	75%		
13	6,25%	81%		
14	6,25%	88%		
15	6,25%	94%		
16	6,25%	100%		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	2
Operario Retroexcavadora	1
Operario volqueta	1
SUBTOTAL	7

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

ACUMULADOS 100% 3,97% 12,23%

Nota :

Responsable debera
externderlo a la
duracion del convenio

EMPLEOS DIRECTOS 15

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.000	1	0	185.00	1	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL		DIRECCIÓN		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		0.450		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS											
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -			
SUB-TOTAL							\$ -				
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ml	8.00	\$ 59,092.00	\$ 472,736.00			
SUB-TOTAL							\$ 472,736.00				
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCION PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.01	\$ 15,215.00	\$ 91,442.15			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	155.67	\$ 123,026.00	\$ 19,151,457.42			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	108.73	\$ 754,076.00	\$ 81,990,683.48			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	47.91	\$ 497,241.00	\$ 23,822,816.31			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2	KG	5,467.06	\$ 7,123.00	\$ 38,941,868.38			
SUB-TOTAL							\$ 163,998,267.74				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	\$ 15,215.00	\$ 707,497.50			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	\$ 50,398.00	\$ 413,263.60			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.50	\$ 543,054.00	\$ 271,527.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.60	\$ 754,076.00	\$ 7,239,129.60			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	\$ 7,123.00	\$ 4,123,504.70			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de	M	6.00	\$ 748,831.00	\$ 4,492,986.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material product	M3	25.40	\$ 23,366.00	\$ 593,496.40			
SUB-TOTAL							\$ 17,921,781.80				
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT											
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -			
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -			
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -			
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -			
SUB-TOTAL							\$ -				
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES											
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -			
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -			
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -			
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -			
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -			
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -			
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -			
SUB-TOTAL							\$ -				
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA							\$ 182,392,785.00				
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)							\$ 5,380,864.00				
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL							\$ 1,000,000.00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS							\$ 44,418,021.00				
VALOR ESTIMADO CONVENIO							\$ 233,191,670.00				

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS					
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL							
TERRITORIAL		DT- BOY		DEPARTAMENTO :		BOYACA	
				MUNICIPIO :		SANTA ROSA DE VITERBO	
CONVENIO SOLIDARIO :		2851		DE		2023	
CONTRATISTA :		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :			
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 227.775.985,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
INTERVENTOR :		INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023					
FECHA DE ADJUDICACION:				FECHA DE INICIO :		20/11/2023	
VALOR DEL CONVENIO :		\$ 88.491.337,00		FECHA DE FIN :		30/04/2024	
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION :		10		DE		16	
						FECHA DE REPORTE :	
						24/01/2024	
% DE AVANCE ACUMULADO :		13,98%		% DE AVANCE SEMANAL :		4,73%	
VALOR EJECUCION ACUMULADA		\$ 31.833.712,00		VALOR EJECUCION SEMANAL :		\$ 10.782.294	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		14		MUJERES EMPLEADAS :		2	
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
		UM		TOTAL		EJECUTADO AVANCE SEMANA % AVANCE	
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA		Und		0,45		0 0 0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m		6		0 0 0%	
ROCERÍA		Ha		0		0 0 0%	
Mejoramiento							
PLACA HUELLA		m		139		0 0 0%	
ALCANTARILLAS		m		18		0 0 0%	
BOX-CULVERT 1X1		Und		0		0 0 0%	
BOX-CULVERT 1X2		Und		0		0 0 0%	
MUROS EN GAVIONES		Und		0		0 0 0%	
CUNETAS		m		0		0 0 0%	
BATEA		m		0		0 0 0%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLE				FECHA DE SEGUIMIENTO :		24/01/2024	
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%	2,31%	6,93%
9	6%	56%	2,31%	9,24%
10	6%	63%	4,73%	13,98%
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 13,98% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	3
Operario	0

SUBTOTAL 6

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 14

Nota :
Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0.45	6	0	139	3	0	0	0	0	0



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL			LONGITUD DEL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			0.450	BOYACÁ	29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmante y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42.00	\$ 59,092.00	\$ 2,481,864.00
							SUB-TOTAL	\$ 2,481,864.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCION PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	116.96	\$ 123,026.00	\$ 14,389,121.00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80.76	\$ 754,076.00	\$ 60,899,178.00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,082.36	\$ 7,123.00	\$ 29,078,650.00
							SUB-TOTAL	\$ 122,102,085.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00
							SUB-TOTAL	\$ 53,475,694.00
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT								
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES								
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -
							SUB-TOTAL	\$ -
							SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$ 178,059,643.00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 5,295,653.00
							APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	\$ 1,000,000.00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,420,689.00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 228,775,985.00

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIVOS DE LA PAZ TOTAL

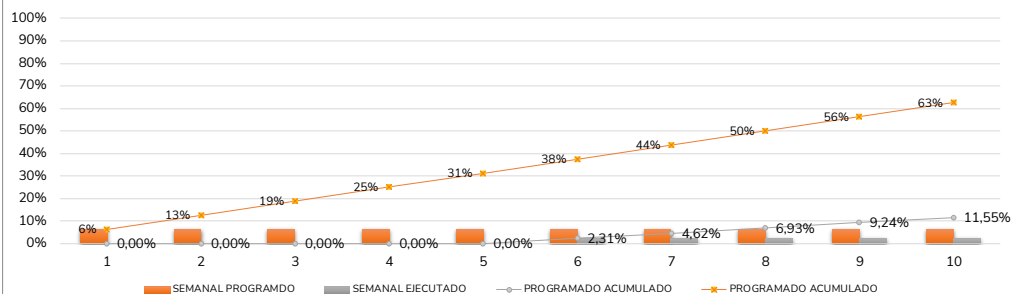


TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO
CONVENIO SOLIDARIO :	2940	DE	2023
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	17/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 239.430.062,00	FECHA DE FIN :	31/12/2023
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023		
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 88.491.337,00	FECHA DE FIN :	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	10	DE	16	FECHA DE REPORTE :	25/01/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	11,55%			% DE AVANCE SEMANAL :	2%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	27.654.172,16			VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.530.834
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	14			MUJERES EMPLEADAS :	2

AVANCE CONVENIO SOLIDARIO



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0,45	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	6	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	m	139	0	0	0%
ALCANTARILLAS	m	18	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	m	0	0	0	0%
BATEA	m	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :	
RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO : 24/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0	0,00%
6	6%	38%	2,31%	2,31%
7	6%	44%	2,31%	4,62%
8	6%	50%	2,31%	6,93%
9	6%	56%	2,31%	9,24%
10	6%	63%	1,24%	10,48%
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 10,48% 0

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	3
Operario	0

SUBTOTAL 6

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 14

Nota :

Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.35	4	0	185.00	2	0	0	0	0	



											
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.35		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	28.00	\$ 60,413.00	\$	1,691,564.00		
								SUB-TOTAL		\$ 1,691,564.00	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.41	\$ 16,932.00	\$	91,602.00		
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	141.52	\$ 123,026.00	\$	17,410,640.00		
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	107.23	\$ 754,076.00	\$	80,859,569.00		
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34.60	\$ 448,694.00	\$	15,524,812.00		
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5,312.04	\$ 7,139.00	\$	37,922,654.00		
								SUB-TOTAL		\$ 151,809,277.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92.90	\$ 16,932.00	\$	1,572,983.00		
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16.40	\$ 52,247.00	\$	856,851.00		
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.90	\$ 543,054.00	\$	488,749.00		
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19.10	\$ 754,076.00	\$	14,402,852.00		
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157.80	\$ 7,139.00	\$	8,265,534.00		
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$	80,377.00		
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12.00	\$ 748,831.00	\$	8,985,972.00		
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	50.90	\$ 23,366.00	\$	1,189,329.00		
								SUB-TOTAL		\$ 35,842,647.00	
								SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA		\$ 185,343,488.00	
								PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ 5,640,750.00	
								APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL		\$ 1,000,000.00	
								GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 44,445,824.00	
								VALOR ESTIMADO CONVENIO		\$ 240,430,062.00	



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

Semana 4. Cachavita.

		INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MEDIAN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO SECCIÓN PÁGINA																																																			
				FECHA	27/01/2024																																																		
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																							
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN SECTOR VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO																																																							
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA		SEMANA N°: 10 del 23/01/2024 al 27/01/2024 Último Informe Semanal SI																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: HERNAN ENRIQUE DOLCE MORENO																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALIAR ESPALDADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: (Indicar el tipo de obra, la cantidad de metros lineales de obra, el número de lotes, etc.)																																																							
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																							
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS EN SECTOR DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO																																																							
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			INTERVENIENTOR: JESSE LUNA CRUZ																																																				
INTEGRANTES: SANDRO ENRIQUE ESPINOSA MORENO			INTEGRANTES: JESSE LUNA CRUZ																																																				
CONVENIO N°: 2709 DE 2023			CONVENIO N°: 434 DE 2023																																																				
FECHA DE INICIO: Nov 17 de 2023			FECHA DE INICIO: Nov 20 de 2023																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 01 de 01 de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 01 de 01 de 2024																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/01 de 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/01 de 2024																																																				
VALOR INICIAL: \$ 226.147.702,00			VALOR INICIAL: \$ 88.451.327,00																																																				
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -																																																				
VALOR ACUMULADO: \$ 226.147.702,00			VALOR ACUMULADO: \$ 88.451.327,00																																																				
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -																																																				
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2024</th><th>2024</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACREDITADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACREDITADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ 226.147.702,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACREDITADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACREDITADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ 88.451.327,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2024	2024	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 226.147.702,00	\$ 226.147.702,00			ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 226.147.702,00			RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 226.147.702,00	\$ 226.147.702,00			ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 226.147.702,00			INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 88.451.327,00	\$ 88.451.327,00			ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 88.451.327,00			RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 88.451.327,00	\$ 88.451.327,00			ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 88.451.327,00				
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2024	2024																																																		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 226.147.702,00	\$ 226.147.702,00																																																				
	ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 226.147.702,00																																																				
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 226.147.702,00	\$ 226.147.702,00																																																				
	ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 226.147.702,00																																																				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 88.451.327,00	\$ 88.451.327,00																																																				
	ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 88.451.327,00																																																				
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 88.451.327,00	\$ 88.451.327,00																																																				
	ACREDITADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ 88.451.327,00																																																				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (V): \$ 226.147.702,00 14,53%																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (B): \$ 226.147.702,00 14,53%																																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 226.147.702,00 14,53%																																																							
OTRAS INVERSIÓN EJECUTADAS (B): \$ -																																																							
ESTUDIO Y DISEÑO, QUEMADO, PAVIMENTO, SOCIAL, AMBIENTAL Y OTRAS (B): \$ -																																																							
VALOR BÁSICO ESTUDIO Y DISEÑOS (B): \$ -																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA (B): \$ -																																																							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (B): \$ -																																																							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA (B): \$ -																																																							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA (B): \$ -																																																							
RADICAR FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																							
NÚMERO RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -																																																							
PERIODO FACTURADO: \$ -																																																							
VALOR FACTURADO: \$ -																																																							
No se aplica de no haberse facturado en el mes anterior informe al estado del proyecto.																																																							
Observaciones: A la fecha el contrato no ha facturado.																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>ANTICIPO</th><th>INDICADOR IC</th><th>ANTICIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Obligado SI</td><td>En el mes SI</td><td>Obligado SI</td></tr><tr><td>Anticipado SI</td><td>Anticipado SI</td><td>Anticipado SI</td></tr><tr><td>Saldo SI</td><td>Saldo SI</td><td>Saldo SI</td></tr></tbody></table>						ANTICIPO	INDICADOR IC	ANTICIPO	Obligado SI	En el mes SI	Obligado SI	Anticipado SI	Anticipado SI	Anticipado SI	Saldo SI	Saldo SI	Saldo SI																																						
ANTICIPO	INDICADOR IC	ANTICIPO																																																					
Obligado SI	En el mes SI	Obligado SI																																																					
Anticipado SI	Anticipado SI	Anticipado SI																																																					
Saldo SI	Saldo SI	Saldo SI																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																							
Meta Física Programada %: Avance o Meta Física %																																																							
Meta Física Ejecutada %: Avance o Meta Física %																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (B)</th><th>Avance físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>4</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</td><td>ML</td><td>137</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ 32.854.272,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 32.854.272,00</td><td>14,53%</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td><td>ML</td><td>88</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr><tr><td>Obras</td><td>UNE</td><td>1</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Epi</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr></tbody></table>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (B)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	%	Estudios y diseños	GL	4	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	137	2023	2024	Prog	\$ 32.854.272,00	\$ -	\$ 32.854.272,00	14,53%	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	88	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	Obras	UNE	1	2023	2024	Epi	\$ -	\$ -	\$ -	-
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (B)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	%																																														
Estudios y diseños	GL	4	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-																																														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	137	2023	2024	Prog	\$ 32.854.272,00	\$ -	\$ 32.854.272,00	14,53%																																														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	88	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-																																														
Obras	UNE	1	2023	2024	Epi	\$ -	\$ -	\$ -	-																																														
El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia, incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contractuales, constructivas y el avance físico mensual acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																							
FUENTES DE MATERIALES: FERRIS MINERO SI DISPONIBLE NO																																																							
LICENCIA AMBIENTAL SI NO																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL: SI NO N/A																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																							
ESTADO: Proceso de parte del contratista de obra																																																							
V. GESTIÓN SOCIAL																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INICIO																																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10,00																																																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10,00																																																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 10,00																																																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12																																																							
VI. GESTIÓN PRESIDIAL																																																							
TOTAL ESTANDO PRECISOS A ADQUIRIR: FECHAS PRECISAS A ADQUIRIR																																																							
VALORES APROBADOS: PRECISOS APROBADOS																																																							
VI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																							
No aplica para este proyecto																																																							
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
X. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XL. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
XLIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
L. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXXI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXVIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXIX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							
LXXXXXXXX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

	FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS					
ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL						
TERRITORIAL	DT- BOY	DEPARTAMENTO :	BOYACA			
		MUNICIPIO :	SANTA ROSA DE VITERBO			
CONVENIO SOLIDARIO :	2735	DE	2023			
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ,					
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :				
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.147.762,00	FECHA DE FIN :	31/12/2023			
INTERVENTOR :	INTERVENTORIA SOLIDARIA 4341 de 2023					
FECHA DE ADJUDICACION:		FECHA DE INICIO :	20/11/2023			
VALOR DEL CONVENIO :	\$ 227.147.762,00	FECHA DE FIN :	31/12/2023			
AVANCE DEL PROYECTO						
SEMANA DE EJECUCION :	9	DE	16			
		FECHA DE REPORTE :	25/01/2024			
% DE AVANCE ACUMULADO :	5,04%	% DE AVANCE SEMANAL :	2,54%			
VALOR EJECUCION ACUMULADA :	\$ 20.511.337,00	VALOR EJECUCION SEMANAL :	\$ 5.769.553,15			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	2	MUJERES EMPLEADAS :	0			
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO						
CONTROL DE METAS FISICAS						
		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA		km	1,05	0	0	0%
Mantenimiento rutinario						
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	24	24	6	25%
ROCERÍA		Ha	0,9	0,8	0,2	22%
Mejoramiento						
PLACA HUELLA		m	137	0	0	0%
ALCANTARILLAS		Und	3	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1		Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2		Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES		Und	0	0	0	0%
CUNETAS		m	0	0	0	0%
BATEA		m	0	0	0	0%
Estudios						
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%
SUELOS		GLOBAL	1	1	1	100%
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%
PROBLEMAS O INCONVENIENTES						
DESCRIPCION :						
RESPONSABLI	ING. FREDY BASTIDAS MONROY		FECHA DE SEGUIMIENTO :	jueves 25 de enero de 2024		
REGISTRO FOTOGRAFICO						



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS



ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6%	6%	0,00%	0,00%
2	6%	13%	0,00%	0,00%
3	6%	19%	0,00%	0,00%
4	6%	25%	0,00%	0,00%
5	6%	31%	0,00%	0,00%
6	6%	38%	0,00%	0,00%
7	6%	44%	1,375%	1,37%
8	6%	50%	0,57%	1,95%
9	6%	56%	0,55%	2,50%
10	6%	63%	2,54%	5,04%
11	6%	69%		
12	6%	75%		
13	6%	81%		
14	6%	88%		
15	6%	94%		
16	6%	100%		

ACUMULADOS 100% 5,04%

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	0
Ayudante	2
Operario	0

SUBTOTAL 4

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

EMPLEOS DIRECTOS 12

Nota: Responsable debera
extenderlo a la duracion
del convenio

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.050	3	0	137.00	3	0	0	0	0	0



AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN	
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.050		BOYACÁ		29/06/2023	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24.00	\$ 59,092.00	\$ 1,418,208.00			
								SUB-TOTAL	\$ 1,418,208.00		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4.48	\$ 15,215.00	\$ 68,163.00			
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	115.28	\$ 123,026.00	\$ 14,182,437.00			
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80.67	\$ 754,076.00	\$ 60,831,311.00			
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.53	\$ 497,241.00	\$ 17,666,973.00			
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,058.14	\$ 7,123.00	\$ 28,906,131.00			
								SUB-TOTAL	\$ 121,655,015.00		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	139.40	\$ 15,215.00	\$ 2,120,971.00			
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	24.60	\$ 50,398.00	\$ 1,239,791.00			
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1.40	\$ 543,054.00	\$ 760,276.00			
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	28.70	\$ 754,076.00	\$ 21,641,981.00			
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1736.70	\$ 7,123.00	\$ 12,370,514.00			
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00			
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	18.00	\$ 748,831.00	\$ 13,478,958.00			
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	76.30	\$ 23,366.00	\$ 1,782,826.00			
								SUB-TOTAL	\$ 53,475,694.00		
								SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 176,548,917.00		
								PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 5,204,199.00		
								APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	\$ 1,000,000.00		
								GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,394,646.00		
								VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 227,147,762.00		

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

COLOMBIA REPUBLICA DE LA VIDA		FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		INVIAS	
TERRITORIAL DT-BOY		DEPARTAMENTO : BOYACA		MUNICIPIO : SANTA ROSA DE VITERBO			
CONVENIO SOLIDARIO : 2730		DE 2023					
CONTRATISTA : JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO .							
FECHA DE ADJUDICACION : VALOR DEL CONVENIO : \$ 233.191.670,00		FECHA DE INICIO : 30/04/2024					
INTERVENTOR : 2/10/2023		INTERVENTORIA SOLIDARIA					
FECHA DE ADJUDICACION : VALOR DEL CONVENIO : \$ 88.491.337,00		FECHA DE INICIO : 30/04/2024					
AVANCE DEL PROYECTO							
SEMANA DE EJECUCION : 10		DE 16		FECHA DE REPORTE : 25/01/2024			
% DE AVANCE ACUMULADO : 13.340%		% DE AVANCE SEMANAL : 2.75%					
VALOR EJECUCION ACUMULADA : 27.094.005		VALOR EJECUCION SEMANAL : \$ 7.584.030					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS : 14		MUJERES EMPLEADAS : 1					
AVANCE CONVENIO SOLIDARIO							
CONTROL DE METAS FISICAS							
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENIEDA		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE	
		m	0.45	0	0	0%	
Mantenimiento rutinario							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m	36	36	0	0%	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Ha	1	1	0	0%	
TRANSPORTE MATERIAL TIERRA		dia	3	3	0	0%	
ZANIA DE DRENAJE		m	50	50	0	0%	
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA		m	900	900	0	0%	
Estudios							
TOPOGRAFICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
SUJELOS		GLOBAL	1	1	1	100%	
TRANSITO		GLOBAL	1	1	1	100%	
HIDRAULICO		GLOBAL	1	1	1	100%	
Construccion Alcantarillas							
Excavaciones Varias sin Clasificar		M3	110	110	10	9%	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -		M3	3	2.5	0.5	17%	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -		M3	9	0	0	0%	
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa		KG	365.84	61	61	17%	
Tuberia de 6 metros de 450 mm de diametro		m	42	42	0	0%	
Relleno para Estructuras con material		M3	60	60	6	10%	
REMOCION DE ALCANTARILLAS		m	36	36	16	44%	
		Und	0	0	0	0%	
		m	0	0	0	0%	
		0	0	0	0	0%	
PROBLEMAS O INCONVENIENTES							
DESCRIPCION :							
RESPONSABLE		FECHA DE SEGUIMIENTO :					
REGISTRO FOTOGRAFICO							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



DATOS A DILIGENCIAR

PROGRAMADO			ACUMULADO	
SEMANA	SEMANAL PROGRAMDO	PROGRAMADO ACUMULADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
1	6,25%	6%	0,00%	0,00%
2	6,25%	13%	0,00%	0,00%
3	6,25%	19%	0,00%	0,00%
4	6,25%	25%	0,40%	0,40%
5	6,25%	31%	0,53%	0,93%
6	6,25%	38%	3,97%	4,90%
7	6,25%	44%	1,96%	6,86%
8	6,25%	50%	2,75%	9,61%
9	6,25%	56%	2,62%	12,23%
10	6,25%	63%	1,11%	13,34%
11	6,25%	69%		
12	6,25%	75%		
13	6,25%	81%		
14	6,25%	88%		
15	6,25%	94%		
16	6,25%	100%		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
Contador	1
Maestro	1
Ayudante	2
Operario Motoniveladora	1
Operario volqueta	0
SUBTOTAL	6

PERSONAL INTERVENTOR	
CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Especialista de pavimentos	1
Especialista de geotecnia	1
Especialista de hidraulico	1
Especialista de geometria	1
Inspector tecnico	1
Inspector siso	1
SUBTOTAL	8

ACUMULADOS 100% 3,97% 13,34%

Responsable debera
extenderlo a la
duracion del convenio

Nota :

EMPLEOS DIRECTOS 14

ALCANCE DEL CONVENIO SOLIDARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO						BATEA
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)	
BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.000	1	0	185.00	1	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA										
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL		DIRECCIÓN		FECHA ELABORACIÓN
BOYACA		SANTA ROSA DE VITERBO		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		0.450		BOYACÁ		29/06/2023
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO										
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
		GENERAL 2013	PARTICULAR							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 181,362.00	\$ -		
SUB-TOTAL							\$ -			
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO										
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a	ml	8.00	\$ 59,092.00	\$ 472,736.00		
SUB-TOTAL							\$ 472,736.00			
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO										
CONSTRUCCION PLACA HUELLA										
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6.01	\$ 15,215.00	\$ 91,442.15		
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	155.67	\$ 123,026.00	\$ 19,151,457.42		
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	108.73	\$ 754,076.00	\$ 81,990,683.48		
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	47.91	\$ 497,241.00	\$ 23,822,816.31		
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2	KG	5,467.06	\$ 7,123.00	\$ 38,941,868.38		
SUB-TOTAL							\$ 163,998,267.74			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS										
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	\$ 15,215.00	\$ 707,497.50		
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	\$ 50,398.00	\$ 413,263.60		
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) -	M3	0.50	\$ 543,054.00	\$ 271,527.00		
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	9.60	\$ 754,076.00	\$ 7,239,129.60		
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	\$ 7,123.00	\$ 4,123,504.70		
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1.00	\$ 80,377.00	\$ 80,377.00		
14	661.30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de	M	6.00	\$ 748,831.00	\$ 4,492,986.00		
15	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material product	M3	25.40	\$ 23,366.00	\$ 593,496.40		
SUB-TOTAL							\$ 17,921,781.80			
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT										
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -		
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0.00	\$ 50,397.91	\$ -		
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0.00	\$ 80,376.65	\$ -		
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	0.00	\$ 754,076.47	\$ -		
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -		
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	0.00	\$ 7,123.48	\$ -		
SUB-TOTAL							\$ -			
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES										
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	0.00	\$ 15,215.08	\$ -		
23	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la	M2	0.00	\$ 8,811.56	\$ -		
24	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	0.00	\$ 229,693.66	\$ -		
25	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0.00	\$ 543,053.93	\$ -		
26	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3	0.00	\$ 58,875.48	\$ -		
30	673.2			Material Drenante	M3	0.00	\$ 74,651.86	\$ -		
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a	M3	0.00	\$ 41,813.96	\$ -		
SUB-TOTAL							\$ -			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA							\$ 182,392,785.00			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)							\$ 5,380,864.00			
APORTES DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL							\$ 1,000,000.00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS							\$ 44,418,021.00			
VALOR ESTIMADO CONVENIO							\$ 233,191,670.00			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.2 Maquinaria y equipos Contrato de Obra.

SAN ANTONIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP/MI-15-FR-4																												
			VERSIÓN 1																												
			PÁGINA 1																												
			FECHA 1/02/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																												
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO		PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ																													
CONTRATO No. 2851 DE 2023		CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4341 de 2023		INTERVENTORÍA: HERBY LUNA CRUZ																													
MAQUINARIA Y EQUIPO																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN																												
RETROEXCAVADORA	CASE 580L SERIE 2	6.88M	SAN ANTONIO																												
			SAN ANTONIO																												
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
TOTAL ACTIVO																															
TOTAL EN REPARACIÓN																															
TOTAL INACTIVO																															
DÍAS DEL MES																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																1	6	5		3									8	6	9
																1	6	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	9
RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																											
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38	15.83333																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		38	15.83333																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																															
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																															
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:																															
LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																															
NOTAS:																															
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																															
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.																															
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.																															
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																															
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																															
Firma		Firma																													
Nombre: GERMAN CAMILO PRACHCAN GRUALBA		Nombre: Martha Liliana Maníño Caro																													
Residente de Interventoría.		Residente de Obra.																													
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC		Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND																													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																															
Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024

CENTRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1
			FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA				
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO		PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS		
CONTRATO No. 2851 DE 2023		CONTRATISTA: JAC CENTRO		
CONTRATO INTERVENTORIA No. 4341 de 2023		INTERVENTORIA: HERBY LUNA CRUZ		
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RETROEXCAVADORA	CASE 580L SERIE 2	6.88M	CENTRO	
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	8M	CENTRO	
VIBROCOMPACTADOR		7 TON	CENTRO	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1 6 5 3 0 9 10 9 9 5 9 9 7.5
TOTAL ACTIVO				
TOTAL EN REPARACIÓN				
TOTAL INACTIVO				
RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		101,6	42,33333	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		101,6	42,33333	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R				
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:				
LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.				
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el Interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.				
Firma		Firma		
Nombre: GERMAN CAMILO PRACHCAN GRUALBA		Nombre: :Martha Liliana marño caro		
Residente de Interventoría.		Residente de Obra.		
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC		Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND		



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024

CACHAVITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1
			FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ	
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA				
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	enero		PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
CONTRATO No.	2735 DE 2023		CONTRATISTA:	JAC CACHAVITA
CONTRATO INTERVENTORIA No.	4341 de 2023		INTERVENTORÍA:	HERBY LUNA CRUZ
MAQUINARIA Y EQUIPO			DÍAS DEL MES	
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	8M	Cachavita	6 6
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			6 6	
TOTAL ACTIVO				
TOTAL EN REPARACIÓN				
TOTAL INACTIVO				
RESUMEN PERIODO / MES			CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	No.	%		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	26	10,83333		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	26	10,83333		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: En este periodo no se ejecutaron obras				
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.				
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.				
Firma		Firma		
Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUALBA		Nombre: FREDY YDANY BASTIDAS MONROY		
Residente de Interventoría.		Residente de Obra.		
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC		Matrícula Profesional No.: 01105- 0812		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024

LA CRECIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																															
			VERSIÓN	1																															
			PÁGINA	1																															
			FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																																
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	ENERO		PROYECTO:	"ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS																															
CONTRATO No.	2730 DE 2023		CONTRATISTA:	JAC LA CRECIENTE																															
CONTRATO INTERVENTORIA No.	4341 de 2023		INTERVENTORÍA:	HERBY LUNA CRUZ																															
MAQUINARIA Y EQUIPO			DÍAS DEL MES																																
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	8M	La Creciente									5	6																						
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	8M	La Creciente															6	6																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVO																																			
TOTAL EN REPARACIÓN																																			
TOTAL INACTIVO																																			
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%		CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																													
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			23	9,583333																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			23	9,583333																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																			
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: En este periodo no se ejecutaron obras																																			
LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																			
Firma: Nombre: GERMAN CAMILO PRACHCAN GRUALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC																																			
Firma: Nombre: Hector Jimenez Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 091037-0591169 CND																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor. Dirección Territorial.																																			



SAN ANTONIO

CENTRO

[illegible]

[illegible][illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

SAN ANTONIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPH-MNL-N-15-FR-8											
		VERSIÓN 1	PÁGINA 1 de 2											
		FECHA 1/02/2024 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ											
CONVENIO DE OBRA No:	2851 DE 2023		CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO											
MES INFORME MENSUAL:	ene-24		ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	4341 de 2023		INTERVENTOR: HERBEY LUNA CRUZ											
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	115523	Nación	Contrato Principal.	\$ 227.775.985,00								
TOTAL						\$ 227.775.985,00	\$ -							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:				\$ 227.775.985,00										
ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 0,00										
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA:				\$ 227.775.985,00										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
										\$ 227.775.985,00	\$ 227.775.985,00		SI NO	
1.	acta parcial	enero de 2024	\$ 27.109.917,69	\$ 0,00	\$ 27.109.917,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	115523	\$ 200.666.067,31	\$ 200.666.067,31			
TOTALES			\$ 27.109.917,69	\$ 0,00	\$ 27.109.917,69	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 200.666.067,31	\$ 200.666.067,31			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
OBRAS		\$ 27.109.917,69				\$ 27.109.917,69								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -		\$ -		\$ -								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN														
AJUSTES														
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -								
GESTIÓN PRELIMINAR (PREACTA)														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)														
VALOR TOTAL		\$ 27.109.917,69		\$ -		\$ 27.109.917,69								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA:														
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
NOTA 2:														
Firma														
Nombre:		Martha Liliana mariffo caro												
Matrícula Profesional No.:		25202-270143 CND												
Firma														
Nombre:		GERMAN CAMILO PRACHCAN GRUJALBA												
Matrícula Profesional No.:		041037-0679244 BYC												

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024

CENTRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEP/MI-15-FR-8			
											VERSION	1			
											PÁGINA	1 de 2			
											FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONVENIO DE OBRA No: 2940 DE 2023 CONTRATISTA: JAC CENTRO															
MES INFORME MENSUAL: ene-24 PROYECTO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4341 de 2023 INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
C-2402-0600-12-Q-2402041-02	115523	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	11	Nación	Contrato principal	\$ 239.430.062,00									
TOTAL							\$ 239.430.062,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 239.430.062,00 VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA: \$ 239.430.062,00															
ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA: \$ 0,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	acta parcial	ENERE de 2024	\$ 19.561.436,07	\$ 0,00	\$ 19.561.436,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	115523	\$ 219.868.625,93	\$ 219.868.625,93				
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -		\$ 219.868.625,93	\$ 219.868.625,93				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL												
OBRAS	\$ 19.561.436,07		\$ 19.561.436,07												
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -												
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN															
AJUSTES															
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -												
GESTION PREDIAL (PREACTA)															
GESTION SOCIAL (PREACTA)															
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)															
VALOR TOTAL	\$ 19.561.436,07	\$ -	\$ 19.561.436,07												
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA:															
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
NOTA 2:															
<div><div>Firma Nombre: Martha Liliana marino caro Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND</div><div>Firma Nombre: GERMAN CAMILO PRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.															

[illegible]



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPMI-R-15-FR-8											
				VERSIÓN 1											
				PÁGINA 1 de 2											
				FECHA 1/02/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: 		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ													
CONVENIO DE OBRA No.: 2730 DE 2023		CONTRATISTA: JAC LA CRECIENTE													
MES INFORME MENSUAL: ene-24		PROYECTO: ALIZAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4341 de 2023		INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ													
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
C-2402-0600-12-Q-2402041-02	115523	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 232.191.670,00									
TOTAL						\$ 232.191.670,00	\$ -								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 232.191.670,00		VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA:		\$ 232.191.670,00									
ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA:		\$ 0,00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
										\$ 232.191.670,00	\$ 232.191.670,00		SI	NO	
1	acta parcial	ENERO de 2024	\$ 20.207.897,23	\$ 0,00	\$ 20.207.897,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	115523	\$ 211.983.772,77	\$ 211.983.772,77				
TOTALES			\$ 20.207.897,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -		\$ 211.983.772,77	\$ 211.983.772,77				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben 0															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL									
OBRAS \$ 20.207.897,23						\$ 20.207.897,23									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES \$ -			\$ -			\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUIMINACIÓN															
AJUSTES															
ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ -			\$ -			\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)															
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)															
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)															
VALOR TOTAL \$ 20.207.897,23			\$ -			\$ -			20.207.897,23						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. NOTA 2:															
Firma: Nombre: HECTOR JIMENEZ Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 091037-0591169 CND															
Firma: Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC															
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.															



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.5 Estado General Del Tiempo.

San Antonio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-10																													
			VERSIÓN	1																													
			PÁGINA	1																													
			FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																														
CONVENIO DE OBRA No: 2851 DE 2023			CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO																														
			AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024			PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4341 de 2023			INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES: El tiempo se presento seco																																	
<div><div></div><div>Firma Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUALBA Residente de Interventoria. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: Martha Liliana maríño caro Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1

FECHA

31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

CONVENIO DE OBRA No:

2940 DE 2023

CONTRATISTA:

JAC CENTRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

31/01/2024

PROYECTO:

LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

4341 de 2023

INTERVENTOR:

HERBY LUNA CRUZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	
Lluvias moderadas																																0	
Lluvias intensas																																0	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

El tiempo se presentó seco



Firma

Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUALBA
Residente de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC



Firma

Nombre: :Martha Liliana mariño caro
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

Cachavita

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA		31/01/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONVENIO DE OBRA No: 2735 DE 2023 CONTRATISTA: JAC CACHAVITA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024 PROYECTO: DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4341 de 2023 INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El tiempo se presento seco

Firma	Firma
Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUALBA	Nombre: FREDY YOANY BASTIDAS MONROY
Residente de Interventoría.	Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC	Matrícula Profesional No.: 01105- 0812

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

La Creciente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-10																													
		VERSIÓN	1																													
		PÁGINA	1																													
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																														
CONVENIO DE OBRA No: 2730 DE 2023 CONTRATISTA: JAC LA CRECIENTE																																
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024		PROYECTO: LA PAZ TOTAL																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4341 de 2023		INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: El tiempo se presento seco .																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRIJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: Hector Jimenez Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 091037-0591169 CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio.

SAN ANTONIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1	
							FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ							DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		
CONVENIO DE OBRA No.: 2851 DE 2023							CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO		
							AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4341 DE 2023							INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1		CBR	INV E-148	VEREDA SAN ANTONIO	3 > 0%		10,75%	SI	CON ESTE RESULTADO SE PROCEDE A DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE PAVIENTO
							19,52	SI	
							43,76	SI	
OBSERVACIONES:									
En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
<div><div></div><div>Firma Nombre: :Martha Liliana marino caro Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: GERMAN CAMLO PIRACHCAN GRUALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div></div>									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									



UNIR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENEERO DE 2024									
PROYECTO: VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4341 DE 2023									
INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1		CBR	INV E-148	VEREDA SAN ANTONIO	3	> 0 %	14,47	SU	CON ESTE RESULTADO SE PROCEDE A DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE PAVIENTO
							10,14	SI	
							24,6	SI	
OBSERVACIONES:									
En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que lo soportan.									
<div>Firma Nombre: .Martha Liliana maríño caro Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 25202-70143 CND</div> <div>Firma Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div>									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. <small>Consignas: Interventor, Dirección Territorial</small>									



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1	
UNIDAD EJECUTORA: INVAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ									
CONVENIO DE OBRA No.: 2735 DE 2023 CONTRATISTA: JAC CACHAVITA									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4341 DE 2023 INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1		CBR	INV E-148	VEREDA CACHAVITA	1	> 0 %	8,84	SI	CON ESTE RESULTADO SE PROCEDE A DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
OBSERVACIONES:									
En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con emendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma	Firma								
NOMBRE:FREDY YOANY BASTIDAS MONROY	Nombre: GERMAN CAMILO PIrachcan GRUAlBA								
Residente de Obra.	Residente de Interventoria.								
MATRICULA Profesional No.: 01105- 0812	Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC								

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVias.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

LA CRECIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1	
							FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ									
CONVENIO DE OBRA No.: 2730 DE 2023 CONTRATISTA: JAC LA CRECIENTE									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PROYECTO: EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4341 DE 2023 INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1		CBR	INV E-148	VEREDA LA CRECIENTE	1	> 0 %	9,81	SI	CON ESTE RESULTADO SE PROCEDE A DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
OBSERVACIONES: En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
<div><div>Firma Nombre: HECTOR JIMENEZ Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 091037-0591169 CND</div><div> Firma Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC</div></div>									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.7 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. SAN ANTONIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPRMIG-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 de 2				
		FECHA	1/02/2024 (Día) (Mes) (Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ						
DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ						
CONTRATO DE OBRA No.	2861 DE 2023 (Indicar número y año)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "ALIANZA ESPLEUROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."							
CONTRATISTA:	JAC SAN ANTONIO						
FECHA DE INICIO:	20/11/2023 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL:	4 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024 (Indicar día, mes y año)						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4341 DE 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ						
1. PLAN DE CALIDAD							
PRESENTADO:	SI NO ...X.....	APROBADO:	SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN: ENERO				
OBSERVACIONES:							
2. AUDITORIAS DE CALIDAD							
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO	No. de AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:				
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO	No. de AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:				
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)							
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO FECHA DE APROBACIÓN:				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:					
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO						
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:					
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:					
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidos en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidos en el mes:					
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidos por el contrato:					
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidos en el contrato:					
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
NOTA: Siempre que alguna de las solicitudes de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma Nombre: Martha Liliana marño caro Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CND				Firma Nombre: GERMAN CAMILO PRACHCAN GRIMALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

CENTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP/IMG-N-15-PR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 de 2				
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		FECHA: 1/02/2024 (Día) (Mes) (Año)					
CONTRATO DE OBRA No. 2940 DE 2023 (Indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUIVAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATISTA: JAC CENTRO							
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024 (Indicar día, mes y año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4341 de 2023 (Indicar número y año)							
INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ							
1. PLAN DE CALIDAD							
PRESENTADO: SI NO ..X..... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN: ENERO							
OBSERVACIONES:							
2. AUDITORIAS DE CALIDAD							
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI NO No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PROXIMA AUDITORIA:							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)							
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:							
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:							
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto. El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto. Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes:	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
No aplica para este proyecto.							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma: Nombre: Martha Liliana marño caro Residente de Obra: Matrícula Profesional No.: 25202-270143 CHD				Firma: Nombre: GERMAN CARLO PRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría: Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAV. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024


CACHAVITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CODIGO MEP/MIS-01-15-FR-14					
		VERSION 1					
		PAGINA 1 de 2					
		FECHA 1/02/2024 (dia) (mes) (año)					
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA						
CONTRATO DE OBRA No. 2735 DE 2023 (indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: FAJANR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATISTA: JAC CACHAVITA							
FECHA DE INICIO: 2011/02/23 (indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL: 4 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 de 2023 (indicar número y año)							
INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ							
1. PLAN DE CALIDAD							
PRESENTADO: SI NO ...X..... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN: ENERO							
OBSERVACIONES:							
2. AUDITORIAS DE CALIDAD							
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO SI NO No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI NO No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)							
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:							
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:							
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto. El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:							
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:							
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:							
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:							
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto. Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1. Índice de gestión 1 =							
IG2. Índice de gestión 2 =							
IG3. Índice de gestión 3 =							
IG4. Índice de gestión 4 =							
IG5. Índice de gestión 5 =							
IG6. Índice de gestión 6 =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma Nombre: FREDY YOVANY BASTIDAS MONROY Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 01105-0812				Firma Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

LA CRECIENTE

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP/MIS-PN-15-FR-14		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	1 de 2		
				FECHA	1/02/2024 (dd) (mes) (año)		
UNIDAD EJECUTORA:		INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No.		2730 DE 2023 (indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: PAUNAR ESPEREROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITAL DE LA VEREDA BARRIO LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATISTA: JAC LA CRECIENTE							
FECHA DE INICIO:		20/1/2023 (indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: 4 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		4341 de 2023 (indicar número y año)					
INTERVENTOR:		HERBY LUNA CRUZ					
1. PLAN DE CALIDAD							
PRESENTADO: SI NOX..... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN: ENERO							
OBSERVACIONES:							
2. AUDITORIAS DE CALIDAD							
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:		SI NO		No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:		
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:		SI NO		No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:		
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)							
PRESENTADO: SI NO		APROBADO: SI NO		FECHA DE APROBACIÓN:			
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:					
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI N							
OBSERVACIONES: El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:					
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:					
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. de quejas y reclamos atendidas en el mes:					
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:					
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:					
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto. Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1. Índice de gestión 1 =							
IG2. Índice de gestión 2 =							
IG3. Índice de gestión 3 =							
IG4. Índice de gestión 4 =							
IG5. Índice de gestión 5 =							
IG6. Índice de gestión 6 =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES: No aplica para este proyecto.							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma:  Nombre: HECTOR JIMENEZ Residente de Obra. Matrícula Profesional No.: 091037-0591169 CND		Firma:  Nombre: GERMAN CAMILO PARRAGA GRUJALBA Residente de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC					



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

4.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. SAN ANTONIO

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CODIGO	MEP/MI-IV-15-FR-12																																																								
				VERSION	1																																																								
				PAGINA	1 DE 2																																																								
				FECHA	1 31 2023 (Día) (Mes) (Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA:		INVIAS TERRITORIAL BOYACA		DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA																																																									
CONVENIO DE OBRA No.		2851 de 2023		CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AJUSTAR ESPERANZAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																													
FECHA DE INICIO: 24/11/2023																																																													
PLAZO INICIAL: 4.0 MESES																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																													
VALOR INICIAL: \$ 227.775.985.00																																																													
VALOR ACUMULADO: \$ 227.775.985.00 (Incluye adiciones)																																																													
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 0.00																																																													
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 0.00																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 de 2023 INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="4">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 45.755.197.00</td><td>18</td><td>8</td><td>2023</td><td>18</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 11.438.799.25</td><td>18</td><td>8</td><td>2023</td><td>18</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 68.632.795.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Cumplimiento	20%	\$ 45.755.197.00	18	8	2023	18	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.438.799.25	18	8	2023	18	12	2026	Calidad de Estudios y Diseños									Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 68.632.795.50						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde	Hasta	Desde	Hasta																																																							
Cumplimiento	20%	\$ 45.755.197.00	18	8	2023	18	10	2024																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.438.799.25	18	8	2023	18	12	2026																																																					
Calidad de Estudios y Diseños																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 68.632.795.50																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281071																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Certificar o anexo certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																													
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="4">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>101.85%</td><td>\$ 232.000.000.00</td><td>18</td><td>8</td><td>2023</td><td>18</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	101.85%	\$ 232.000.000.00	18	8	2023	18	12	2023	Otros																																			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde	Hasta	Desde	Hasta																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	101.85%	\$ 232.000.000.00	18	8	2023	18	12	2023																																																					
Otros																																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068363 OTRAS PÓLIZAS No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Certificar o anexo certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																													
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.: PRORROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="4">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Cumplimiento									Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones									Calidad de Estudios y Diseños									Estabilidad y/o Calidad de Obra								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde	Hasta	Desde	Hasta																																																							
Cumplimiento																																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																													
Calidad de Estudios y Diseños																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: (Certificar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																													
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																													
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.: PRORROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="4">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)									Otros																																			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde	Hasta	Desde	Hasta																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																													
Otros																																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: (Certificar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																													
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																													
OBSERVACIONES:																																																													
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (llenar los campos que se requieran).																																																													
 Nombre: GERMAN CAMILO PERACHELAN GRUJALBA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 043037-0678244 BYC Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del ROPAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.																																																													

INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100281071	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71741661	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 18/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 18/12/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
						N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2851-2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.





8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. - DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMÉ POSESIÓN DE LA OBRA O CONTÍNUE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.



ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACRENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.



5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORIA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO



2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- 2.1** CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
- 2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
- 2.3** USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
- 2.4** EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.



1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

- (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
- (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100068363	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71741664	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 18/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 18/12/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN ANTONIO CON NIT 900.157.977-1

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 18/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2851-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

CENTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPMI-N-15-FR-12
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	1 2 2024 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ	
CONVENIO DE OBRA No.	2940 de 2023		CONTRATISTA: JAC CENTRO	
OBJETO DEL CONTRATO: ALIANZA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
FECHA DE INICIO:	17/11/2023			
PLAZO INICIAL:	4.0 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$ 239.430.062,00			
VALOR ACUMULADO:	\$ 239.430.062,00 (incluye adiciones)			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0,00			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4341 de 2023		INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
	20%	\$ 48.086.012,40	Desde	Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			25 8 2023	25 10 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 12.021.503,10	25 8 2023	25 12 2023
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 72.129.018,60	5 años, 0 meses, 0 días	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281947				
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:				
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extrac contractual (RCE)	96,90%	\$ 232.000.000,00	Desde	Hasta
Otros			25 8 2023	25 12 2023
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068594 OTRAS PÓLIZAS No.				
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA				
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES				
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.				
ADICIONAL No.: 1	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Cumplimiento	20%	\$ 48.086.012,40	Desde	Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			17 11 2023	17 1 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 12.021.503,10	17 11 2023	19 3 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 72.129.018,60	5 años, 0 meses, 0 días	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.				
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:				
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES				
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.				
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extrac contractual (RCE)			Desde	Hasta
Otros				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.				
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:				
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:				
OBSERVACIONES:				
NOTAS:				
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.				
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).				
Firma				
Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHAN GRUJALBA				
Residente de Interventoría.				
Matrícula Profesional No.: 041037-0679244 BYC				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.				
Copias: Interventor y Dirección Territorial.				

INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-106281847	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71744262	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/08/2023	24:00 Horas Del	25/12/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2940-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100281847 y endoso, 0 cuyo afianzado es:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO Asegurado o Beneficiario:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , expedida por la Compañía en 12/09/2023, no
expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los 12 días del mes SEPTIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2023.09.12 20:45:34 -05:00

Código de Seguridad: rVMRbi/oDwy/TOMinVcjxA==

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1.2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-0002

No. PÓLIZA	NB-100068594	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71744263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 25/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 25/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
					N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO					No. DOC. IDENTIDAD	901.725.102-3
DIRECCIÓN	VDA CENTRO					TELÉFONO	3114823984
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO					No. DOC. IDENTIDAD	901.725.102-3
DIRECCIÓN	VDA CENTRO					TELÉFONO	3114823984
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2940-2023 DEL 25/08/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	155.090,41
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2023

PRIMA BRUTA	\$ 155.090,41
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 155.090,41
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 30.417,18
TOTAL A PAGAR	\$ 190.507,59

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MINAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-10068594	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71744263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 25/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 25/12/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO CON NIT 901.725.102-3

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2940-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	18-100281847	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71868143	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 19/03/2025	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNTARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2908-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 960.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100281847** y endoso, **2** cuyo afianzado es:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO Asegurado o Beneficiario:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, expedida por la Compañía en **06/02/2024**, no
expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los **06** días del mes **FEBRERO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

CACHAVITA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEP/ING-IN-15-FR-12
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	1 DE 2
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		FECHA	1 2 2024
		(Sig)	(Sig)
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ
CONVENIO DE OBRA No.	2735 de 2023	CONTRATISTA:	JAC CACHAVITA
OBJETO DEL CONTRATO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. TOTAL			
FECHA DE INICIO:	17/11/2023		
PLAZO INICIAL:	4.0 MESES		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2023		
	(incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 226.147.762,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 226.147.762,00		
	(incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0.00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0.00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4341 de 2023	INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	\$ 45.429.552,40	Desde 4 8 2023 Hasta 4 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.357.388,10	Desde 4 8 2023 Hasta 4 12 2026
Calidad de Estudios y Diseños			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 68.144.329,80	5 años, 0 meses, 0 días
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 72372636			
Certificado de modificación o anexo No.: 0			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:			
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	102.59%	\$ 232.000.000,00	Desde 4 8 2023 Hasta 4 12 2023
Otros			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 72372641			
OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.:			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	\$ 45.429.552,40	Desde 17 11 2023 Hasta 17 1 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.357.388,10	Desde 17 11 2023 Hasta 19 3 2027
Calidad de Estudios y Diseños			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 68.144.329,80	19 3 2029
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.			
Certificado de modificación o anexo No.:			
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)			
Razón Social Compañía Aseguradora:			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:			
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Desde Hasta
Otros			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.			
OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.			
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)			
Razón Social Compañía Aseguradora:			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (resaltar las casillas que se requieran).			
Firma			
Nombre: GERMAN CARLO PRACHAN GRUJABA			
Residente de Interventoría			
Matrícula Profesional No. 041037-0679244 BYC			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Interventoría y Dirección Territorial			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO

COTIZACION SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. COTIZACIÓN	72372636	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	01/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas del 04/08/2023	24:00 Horas del 04/12/2028			

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2735 DE 2023 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA CON NIT 900.158.059-8

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (XXXXXXXXX) FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (XXXXXXXXXX), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA COTIZACIÓN \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/08/2023	24:00 Horas del 04/10/2024	45,429,552.40	159,439.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/08/2023	24:00 Horas del 04/12/2026	11,357,388.10	113,698.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 04/12/2023	24:00 Horas del 04/12/2028	68,144,328.60	1,023,285.00
TOTAL ASEGURADO			124,931,269.10	

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	No. DOC. IDENTIDAD	900.158.059-8
DIRECCIÓN	SALON COMUNAL ESCUELA VDA CACHAV	TELÉFONO	3108521707
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EM	TELÉFONO	3128817092
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EM	TELÉFONO	3128817092

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	\$	1,296,423.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	1,296,423.00
GASTOS EXP.		7,800.00
IVA		247,802.00
TOTAL COTIZACIÓN	\$	1,552,025.00



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
COTIZACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. COTIZACIÓN	72372641	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	01/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	04/08/2023	24:00 Horas del	04/12/2023		

OBJETO DE CONTRATO

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2735 DE 2023 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SNIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BÁSICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA CON NIT 900.158.059-8

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

ACLARACIONES: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES. LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA COTIZACIÓN \$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00	155,090.00
PATRONAL	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00	0.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00	0.00
TOTAL ASEGURADO			232,000,000.00	

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	900.158.059-8
DIRECCIÓN	SALON COMUNAL ESCUELA VDA CACHAV	TELÉFONO	3108521707
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	900.158.059-8
DIRECCIÓN	SALON COMUNAL ESCUELA VDA CACHA	TELÉFONO	3108521707
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañía	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	\$	155,090.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	155,090.00
GASTOS EXP.		5,000.00
IVA		30,417.00
TOTAL COTIZACIÓN	\$	190,508.00



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

COTIZACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE
/12/2023			/08/2023
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

CONDICIONES PARTICULARES

SOLIDARIO PRINCIPAL 2735 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100282629	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71847193	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	11/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 19/03/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPOSAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 18/08/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2735-2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100282629 y endoso, 2 cuyo afianzado es:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO Asegurado o
Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, expedida por
la Compañía en 11/01/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados
o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de
la Compañía.

BOGOTÁ a los 11 días del mes ENERO del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

LA CRECIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEP-MIG-IN-15-FR-12
		VERSIÓN 1
		PÁGINA 1 DE 2
		FECHA 1 2 2024 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ
CONVENIO DE OBRA No.	2780 de 2023	CONTRATISTA: JAC LA CRECIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: AJUNIR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	
PLAZO INICIAL:	4.0 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)	
VALOR INICIAL:	\$ 232.191.670,00	
VALOR ACUMULADO:	\$ 232.191.670,00 (incluye adicionales)	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0,00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4341 de 2023	INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 46.638.334,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.659.583,50
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 69.957.503,00
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BY-100037436 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	99,95%	\$ 232.000.000,00
Otros		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. BY-100004860 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.		
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 46.638.334,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 11.659.583,50
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 69.957.503,00
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.		
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		
OBSERVACIONES:		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).		
Firma: Nombre: GERMAN CAMILO PIRACHCAN GRUJALBA Residente de Interventoría, Matrícula Profesional No.: 541037-067024 BYC Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.		

INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100037436	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36157849	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 03/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 03/12/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
						N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 2730 DE 2023, DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

*NOTA 1: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS. A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO SEGUROS MUNDIAL. DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN CON EL PRESENTE CERTIFICADO, CONTINÚAN VIGENTES.

*NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT. 901.315.436-9. TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 2730 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN CON EL PRESENTE CERTIFICADO, CONTINÚAN VIGENTES.





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100037436** y endoso, **1** cuyo afianzado es:
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICI Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, expedida por la Compañía en **11/09/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **11** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01

01 al 31 enero de 2024



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	BY-100004860	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36157898	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 03/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 03/12/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AGOSTO DEL 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE ACLARA QUE LA POLIZA CUENTA CON LOS SUB AMPAROS SOLICITADOS POR EL DECRETO 1082

*****AMPAROS ADICIONALES RCE - DECRETO: 1082/2015****

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

3. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.

4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.

5. COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2.) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2.)

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2.) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTOTENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2023.09.05 18:03:01 -05:00

Código de Seguridad: Nz391gSGvI3AxzRTWJ3+8v==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-0081

No. PÓLIZA	BY-108037389	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36157608	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 05/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 07/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICI			No. DOC. IDENTIDAD	901.315.436-9		
DIRECCIÓN	VDA LA CRECIENTE			TELÉFONO	3185594188		
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS			No. DOC. IDENTIDAD	800.215.887-2		
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT			TELÉFONO	3770600		
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS			No. DOC. IDENTIDAD	800.215.887-2		
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT			TELÉFONO	3770600		

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2730 DE 2023, CUYO OBJETO ES

AUMAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL SERÁ REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/08/2023	24:00 Horas Del 07/10/2024	46.638.334,00	164.448,24
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/08/2023	24:00 Horas Del 07/12/2026	11.659.583,50	116.915,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 07/12/2023	24:00 Horas Del 07/12/2028	69.957.501,00	1.050.512,50
TOTAL ASEGURADO			\$ 128.255.418,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN		PRIMA BRUTA	\$	1.331.875,82
NUBIA PATRICIA PINTO RIANO		AGENTES	100,00		DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO							
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$	1.331.875,82
					GASTOS EXP.	\$	5.000,00
					IVA	\$	254.006,41
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/09/2023					TOTAL A PAGAR	\$	1.590.882,23

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 4712/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO




Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.09.05 18:05:54 -05:00

Código de Seguridad: ZH1/cgM4Cb4EC8FeB4qqag==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR00000027-0001

No. PÓLIZA	RY-100004847	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36157609	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 05/08/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 07/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICI			No. DOC. IDENTIDAD	901.315.436-9		
DIRECCIÓN	VDA LA CRECIENTE			TELÉFONO	3105594188		
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICI			No. DOC. IDENTIDAD	901.315.436-9		
DIRECCIÓN	VDA LA CRECIENTE			TELÉFONO	3105594188		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			No. DOC. IDENTIDAD			
DIRECCIÓN				TELÉFONO			

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 2730 DE 2023, CUYO OBJETO ES

AUMAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. SEGUN CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2730 DE 2023. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	157.632,88
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
NUBIA PATRICIA PINTO RIAÑO		AGENTES	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/09/2023			

PRIMA BRUTA	\$	157.632,88
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	157.632,88
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	30.900,25
TOTAL A PAGAR	\$	193.533,13

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 076 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADENAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIOLADO



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual.

- Actas de Comité de Obra.

Actas San Antonio

Acta 8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	18/01/24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. 8 (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: Invias Territorial Boyacá DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá			
CONTRATO DE OBRA No. 2851 de 2023 (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios de la paz total			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 de 2023 (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: Herby Luna Cruz			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Avance de obra Programa de obra Programa de Inversiones.			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION Avance de obra. se ha tenido avance en lo que respecta a construcción de alcantarillas lo cual se tiene programado terminar en el transcurso de la siguiente semana se iniciara conformación de sub-vasante en el transcurso de la siguiente semana.			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	95-01-24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. <u>9</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Inviar territorial Boy</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Boyarc'</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>2851 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC San Antonio</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>mejoramiento vial en el marco del programa caminar comunitario de la paz total</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>4841 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby Ina Cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Comite operativo: para autorizacion de cheques a girar Integrantes. Presidente JAC, Residente JAC e interventoria.			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN En el presente comite operativo se reunen la JAC de la vereda San Antonio y la Interventoria con el fin de aprobar los siguientes cheques. cheque n°1: concepto formaleta de alcantarilla. Por \$ 3,210,000			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27-01-24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Inviat territorial Zojacá DIRECCIÓN TERRITORIAL: Zojacá

CONTRATO DE OBRA No. _____
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC san antonio

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: _____

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Compras de materiales
manejo de presupuesto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

No se informa al veedor de los compras y cambios en presupuesto.
Informa que no va alcanzar el presupuesto inicial para lo planteado



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 11

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30-01-24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. <u>11</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Inviaterritoria Boyacá</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Boyacá</u>			
CONTRATO DE OBRA No. <u>2651 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC San Antonio</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>6741 de 2021</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby Luis Cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>Comite operativo, aprobacion de cheques para pago de nomina, adelanto pago sub-base, anticipo G y J, Retro alcantarillas</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>Se reunió la residente de obra, Presidente Junta, Residente de interventoria, para la aprobación de los siguientes cheques:</u> <u>cheque # 1 → se aprueba cheque por 6.000.000\$ concepto de adelanto sub-base.</u> <u>cheque # 2 → G y J anticipo, para cemento, vanilla, flejes etc por valor de 30'000.000\$</u> <u>cheque # 3. Retro alcantarillas a nombre de Keison Camilo Martinez Parra por concepto de 2'430.000 \$</u> <u>cheque # 4 pago nomina residente, contador, Ayudante maestro de obra por valor 3.485.300 \$</u>			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Entrega de carpeta plan
de compras

01-02-24

Contador, Residente
Dutra

Carpeta facturación

01-02-24

Residente

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

01-02-24
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Giliana Mariño	Residente	JAC	
German C Pirachican	Residente interventoría	H.L.C	
Ana Janeth Alvarez	Representante	J.A.C	



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Actas Centro
Acta 7

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN 1
		PÁGINA
FECHA		05/01/2023+ (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)		
ACTA DE REUNIÓN No. <u>7</u> (La numeración será consecutiva)		
UNIDAD EJECUTORA: <u>INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOYACÁ</u>		
CONTRATO DE OBRA No. <u>1940 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)		
CONTRATISTA: <u>JAC CENTRO</u>		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</u>		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>4341 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)		
INTERVENTOR: <u>HERBY LUNA CRUZ</u>		
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>Comité Operativo Para Autosización de Cheques a gisac</u> <u>Integrantes:</u> <u>Presidente Veeduría, Presidente JAC Centro, Contador, Residente JAC</u> <u>CENTRO, e INTERVENTORIA, y TESORERA JAC CENTRO.</u>		
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>En el presente comité operativo se reúnen, la veeduría, la JAC</u> <u>de la veeduría centro y la interventoría con el fin de aprobar</u> <u>los siguientes cheques;</u> <u>Cheque N°1: Póliza de responsabilidad civil. por un valor de</u> <u>\$ 190.500</u> <u>Cheque N°2: Póliza de garantías. por un valor de</u> <u>\$ 1'642.230</u> <u>Cheque N°3: Rotación y Señalización por un valor de: 2'181.200</u> <u>Cheque N°4: Concepto Hidráulico por un valor de: 1'200.000</u> <u>Cheque N°5: Estudio de Suelos Ingetest por un valor de: 811.450 \$</u> <u>Cheque N°6: Topografía RJ INGENIERIA SAS por un valor de:</u> <u>\$ 1'080.000</u>		



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Cheque N°7: Estudio de tránsito => 400.000 \$

Cheque N°8: Compra de Mezcladora por un valor de:
4'797.050

Cheque N°9: Gastos de representación y caja menor por un valor
de: \$ 700.000

Cheque N°10: Compra de 6 tubos de 36" por un valor de: 1'980.000

Cheque N°11: Compra de materiales GRT EMPRESAS DE ACERO por
un valor de: \$ 20'000.000

FIN



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	18-01-24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. <u>8</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Invias territorial Boyaca'</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Boyaca'</u>			
CONTRATO DE OBRA No. <u>2851 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAc centro</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios de la paz total</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>4341 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby luna cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>Avance de obra.</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>Avance de obra.</u> <u>se ha tenido un avance en lo que respecta a construcción de alcantarilla para lo cual se ha comprado grava, arena y cemento, se tiene contemplado la terminación de esta en el transcurso de la siguiente semana.</u> <u>se iniciara trabajos de conformación de sub-vasante la proxima semana</u>			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26-01-24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Inviros territorial Bogota DIRECCIÓN TERRITORIAL: Bogota

CONTRATO DE OBRA No. 2851 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: J.A.C centro

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Herby Luna Cruz

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Comite operativo: para aprovacion de cheques a girar, Integrantes: Residente JAC, Presidente JAC, Interventoria, contador J.A.C

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
En el presente comite operativo se reúnen la J.A.C de la vereda centro y la interven- toria con el fin de aprobar los siguientes cheques
cheque #1 6 y 7 ferreterias SA por 30'000.000 \$
cheque #2 retro de alcontarilla. yeison martinez Por 400.000 \$
cheque #3 volqueta - Adrian Cristoncho por 480.000 \$
cheque #4 Retriexcavadora placa-huella por 4'600.000 \$
cheque #5 segunda entrega topografia Por 810.000 \$



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024


cheque # 6 concepto por vibrocompactador por
927.500 \$

cheque # 7 saldo estudio de tránsito para Viviana
Katalina Pedraza por 200.000

_____ / _____ / _____



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	<div>(Día / Mes / Año)</div>
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
FECHA PROXIMA REUNION		01-08-24 (Día / Mes / Año)	
NOTAS:			
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.			
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Germán C. Pacheco	Residente Interventoría	H. L. C	
Eduardo Nino Chaparro	Presidente J.A.C.	Vereda Centro	
Liliana Marino C	Residente	JAC Centro	
Rosa Cortes	Tesorera	JAC Centro	
José Amaya A	Pre. Veeduría	Veeduría	
Maria fernanda g.	Encargada SST	JAC Centro	
Laurid E Mediano	Contador	JAC Centro	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Actas Cachavita
Acta 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNION	CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/01/24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNION No. <u>8</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>INVIAS TERRITORIAL BOY</u> DIRECCION TERRITORIAL: <u>Boyacá</u>			
CONTRATO DE OBRA No. <u>2735 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC CACHAVITA</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios de la paz total</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>434 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby Luna Cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNION			
<u>Avance de obra, Gestion Social.</u> <u>Plan de compras</u> <u>contabilidad del convenio</u> <u>Programa de obra y programa de inversiones</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION			
<u>Avance de obra, Gestion Social</u> <u>Se le brindo informacion a la persona encargada de la gestion social acerca del manejo de los formatos y organizacion de licencias ambientales.</u> <u>Plan de compras, se realizo la limpieza de las alcantarillas, se dio inicio a la construccion de 1 alcantarilla la cual esta proyectada terminar la proxima semana, se proyecta iniciar el pavimento a mediados de febrero</u> <u>Plan de compras.</u> <u>se ha realizado compra de elementos de seguridad ademas de materiales (gravilla, arena, recebo y tuberias)</u> <u>queda pendiente la compra de sub-base y asfalto</u>			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

se realizara la compra de algunos materiales como es 16,000,000 para sub-base a demás de varilla, vecibo, arena.

contabilidad del convenio.

Se pide los evidencias de pagos; compras de materiales, Pagos de nomina, seguridad social, dotacion, se comprometo entregar estos documentos el dia miercoles de la proxima semana.

Programa de obra y programa de inversiones se dio a conocer el manejo de formatos para Programa de obra e inversiones



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	
ACTA DE REUNIÓN		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
entrega de documentos de evidencia de pagos	24 / 01 / 24	contador

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Sandro Enaya Serrano	Representante legal	I.A.C. Cachanilla	[Firma]
Herby Luna Cruz	Director Interventoría	Herby Luna Cruz	[Firma]
GINA KATELINE CERON	GESTION SOCIAL	I.A.C. CACHANILLA	GINACERON
German Camilo Pirachica	Residente interventoría	Herby Luna	[Firma]
Claudio Milena Chaurra	E. Social	H.L.C	Claudia Chaurra

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	23-01-24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. <u>9</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Invias territorial Boyacá</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Boyacá</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>2713 y 2730 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC CACHAVITA</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>4341 de 2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby Luna Cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>Comite operativo para autorización de cheque a girar. Gestion Social</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>En el presente comite operativo se reúnen el presidente de la junta de cachavita y residente de interventoria, con el fin de aprobar los siguientes cheques.</u> <u>cheque #1 se aprueba el primer desembolso para sub-base 16'000.000 \$</u> <u>cheque #2 pago noming, planillas, compra de otros materiales y transporte. 20'000.000 \$</u>			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	
ACTA DE REUNIÓN		FECHA	29-01-24 (Día / Mes / Año)
ACTA DE REUNIÓN No. <u>10</u> (La numeración será consecutiva)			
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Inviás Territorial Bogacá</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Bogacá</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>2735-2730</u> de <u>2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC cachavita y JAC la creciente</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>4341</u> de <u>2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>Herby luna cruz</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
<u>Presupuesto a aprobar</u> <u>Gestión social.</u> <u>Programación maquinaria</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
<u>Realizar presupuesto para generar cheques</u> <u>Pago de nomina se realizaba en efectivo dado</u> <u>que algunos trabajadores no aceptan cheque.</u> <u>→ se debe tener una programación para agendar</u> <u>maquinaria.</u>			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Actas la creciente.
Acta 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2135 y 2130 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC CACHAVITA y JAC LA CRECIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LINA CRUZ

OBJETIVOS DE LA REUNION

Comité operativo para autorización de cheques a girar

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

En el presente comité operativo se reúnen los presidentes de las juntas de Cachavita y La Creciente, los respectivos presidentes de la veeduría y la interventoría con el fin de aprobar los siguientes cheques.

cheque #1: Se aprueba el primer desembolso para la vereda cachavita por un valor de: 11'722.300

cheque #1: Se aprueba el primer desembolso para la vereda la creciente por un valor de: 50'000.000



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓRGO	MEM-011-01-14-FR-2
		RESPA	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/01/24 Caso (Mes, Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN N°. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Inviás territorial Boyaca DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyaca

CONTRATO DE OBRA N°. 2730 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC U CRECIENTES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 4341 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Heriberto Luna Cruz

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avance de obra, Plan de compras (compra de materiales),
Contabilidad del convenio.
Programa de obra y Programa de Inversiones

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Avance de obra.
Se ha desarrollado un 12%. lo equivalente a 2 alcantarillas, lo cual se tiene programado terminar la primera semana de febrero, se tiene contemplado el inicio de la construcción de pavimento hasta el 15 de febrero.

Plan de compras.
hasta el momento se ha comprado 40 bultos de cemento de 42.5 kg y 10 bultos de cemento de 50 kg y 60 varillos de 3/8, queda pendiente los próximos compras base próxima semana y asfalto primera semana de febrero



CODIGO
VERSION
PAGINA
CHA

Contabilidad del convenio

la interventoria reitera el balance contable de los gastos realizados a la Fecha, balance adelantado por el contador del convenio que este con los soportes requeridos, como son; facturas, cuentas de cobro, RUT, cédulas de los proveedores y cotizaciones requeridas. Documentos requeridos impresos ordenados en carpeta Z y digital.

El ingeniero residente del convenio que entregara dichos documentos en el transcurso de la siguiente semana.

Programa de obra y Programa de Inversiones.

la interventoria reitera la entrega de estos documentos.

El residente del convenio manifiesta que hara entrega de estos documentos en el transcurso de la siguiente semana



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CAJON	MESES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
		PERSONA	7
		PÁGINA	
		FECHA	21 01 24 <small>(Verificar fecha)</small>
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN: 09 <small>(Indicar número de reunión)</small>			
ENTIDAD EJECUTORA: Junta de acción comunal		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Baygorri	
CONTRATO DE OBRA No. 2120 <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
CONTRATISTA: J.A.C. la creciente			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1611-2023 <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
INTERVENTOR: Herby Luna Cruz			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
• Socialización Fichas PQRS (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias) - Atención al usuario.			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
<ul style="list-style-type: none">- socialización de protocolo de atención al usuario.- Hablar de temas relacionados con la obra Impacto acuerdos.- Establecer compromisos para la utilización adecuada de Formatos de PQRS.- Acordar normas adecuadas para realizar los PQRS.			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEP/IN1-IL-14-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

• Recibir y atender los casos temas relacionados a la obra de cachavita como tambien la de la creciente.

Diariamente

Inspectoría SST. encargada de la gestión social.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

05.02.24
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jairo Aguillon	Pte Jsc.	Jsc la Creciente	Jairo Aguillon
Héctor Jiménez	Residente de Obra	Jsc la Creciente	Héctor Jiménez P.
Sandro E. Serrano R.	Presidente.	J.A.C. Cachavita	Sandro E. Serrano R.
Tudy Bastar	Ing. Residente	Cachavita	Tudy Bastar
German Camacho Priachan	Residente interventoria	Herby Luna Cruz	German Camacho Priachan
Claudia Milena Chavara	E. social	H.L.C.	Claudia Chavara



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

Acta 10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	
ACTA DE REUNIÓN		FECHA	29-01-24 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. 510 (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: Inviás Territorial Bogacá. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Bogacá			
CONTRATO DE OBRA No. 2735-2730 de 2023 (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: JAC cachavita y JAC la creciente.			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4741-de 2023 (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: Herby luno cruz			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
Presupuesto a aprobar Gestión social. Programación maquinaria			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
Realizar presupuesto para generar cheques Pago de nomina se realizaba en efectivo dado que algunos trabajadores no aceptan cheque. → se debe tener una programación para agendar maquinaria.			



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																																								
		VERSIÓN	1																																								
		PÁGINA																																									
		FECHA	(Día / Mes / Año)																																								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN																																											
<table border="1"><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plan de compras</td><td>01-02-24</td><td>Residente de obra</td></tr><tr><td>programación maquinaria</td><td>01-02-24</td><td>Residente de obra.</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	Plan de compras	01-02-24	Residente de obra	programación maquinaria	01-02-24	Residente de obra.																															
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES																																									
Plan de compras	01-02-24	Residente de obra																																									
programación maquinaria	01-02-24	Residente de obra.																																									
FECHA PRÓXIMA REUNION 02-02-24 (Día / Mes / Año)																																											
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																																											
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																																											
<table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jairo Aguillon</td><td>Pte Junta</td><td>JAC La creciente</td><td></td></tr><tr><td>Nelson Barrera</td><td>Vicepresidente</td><td>CACHO VITA</td><td></td></tr><tr><td>German Pirachican</td><td>Residente interventoria</td><td>H.L.C</td><td></td></tr><tr><td>Héctor Jiménez</td><td>Residente de Obra</td><td>JAC La Creciente</td><td>Héctor Jiménez P.</td></tr><tr><td>Sandro E. Serrano R.</td><td>Pte. Junta.</td><td>JAC Cachovita</td><td></td></tr><tr><td>Tuky Pastor M</td><td>Resident obra cachovita</td><td>JAC cachovita</td><td></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Jairo Aguillon	Pte Junta	JAC La creciente		Nelson Barrera	Vicepresidente	CACHO VITA		German Pirachican	Residente interventoria	H.L.C		Héctor Jiménez	Residente de Obra	JAC La Creciente	Héctor Jiménez P.	Sandro E. Serrano R.	Pte. Junta.	JAC Cachovita		Tuky Pastor M	Resident obra cachovita	JAC cachovita													
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																																								
Jairo Aguillon	Pte Junta	JAC La creciente																																									
Nelson Barrera	Vicepresidente	CACHO VITA																																									
German Pirachican	Residente interventoria	H.L.C																																									
Héctor Jiménez	Residente de Obra	JAC La Creciente	Héctor Jiménez P.																																								
Sandro E. Serrano R.	Pte. Junta.	JAC Cachovita																																									
Tuky Pastor M	Resident obra cachovita	JAC cachovita																																									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																											



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	4341 de 2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
FECHA INICIACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (88.491.337,00) M/CTE

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Con el objetivo de mantener una adecuada ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

Con el fin de realizar un recuento completo de las actividades ejecutadas correspondientes al periodo entre el 01 y el 31 de enero del año 2024, se explicarán las actividades realizadas durante el mes convenio por convenio:

Convenio 2851 Vereda Barrio San Antonio.

Durante el presente mes se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades ejecutadas por la junta de acción comunal de la vereda Barrio San Antonio, como se evidencia en las actas de comité de obra, tanto técnicos como operativos, con el fin de poner en marcha las obras a ejecutar, de tal forma que fue necesario realizar comités operativos junto con el presidente de la JAC y el presidente de la veeduría para darle aval a las cotizaciones y contratación de personal y habilitar los dineros correspondientes de acuerdo a los anexos técnicos y el acompañamiento de la interventoría.

Así mismo se realizó en repetidas ocasiones (Ver Actas de Reunión) recorridos en campo con los especialistas de suelos, transito, hidráulico y topográfico, con el fin de explicarles las actividades a



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

ejecutar de acuerdo a la necesidad vista en campo por la interventoría.

Además de ello, teniendo en cuenta los dineros sacados por la junta de acción comunal, con el fin de realizar el pago de las diferentes responsabilidades con los especialistas y proveedores se realizó un comité técnico en el cual se les explicó tanto al contador como al residente la manera en la que se deben entregar los balances presupuestales del dinero invertido en la obra y los comprobantes entregables que se deben dar para el pago a los acreedores.

Por otro lado, se realizó el respectivo acompañamiento de la interventoría respecto al plan de calidad de los materiales utilizados en obra, tales como, materiales granulares, aceros, cemento, tuberías a instalar y el respectivo proceso constructivo.

Con esta gestión se logró la contratación y obtención de los estudios de suelos, hidráulicos, de tránsito y topográficos correspondientes para iniciar con la construcción de la placa huella, así mismo, se logró la construcción de las alcantarillas presupuestadas en el contrato construyendo 12 metros lineales de alcantarilla de diámetro de 36", realizando el acompañamiento por parte de los inspectores y el residente de interventoría, en cuanto a sistema constructivo así como el cumplimiento técnico y normativo de las actividades ejecutadas, de acuerdo al concepto dado por los especialistas.

Convenio 2940 Vereda Centro.

Durante el presente mes se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades ejecutadas por la junta de acción comunal de la vereda Centro, como se evidencia en las actas de comité de obra, tanto técnicos como operativos, con el fin de poner en marcha las obras a ejecutar, de tal forma que fue necesario realizar comités operativos junto con el presidente de la JAC y el presidente de la veeduría para darle aval a las cotizaciones y contratación de personal y habilitar los dineros correspondientes de acuerdo a los anexos técnicos y el acompañamiento de la interventoría.

Así mismo se realizó en repetidas ocasiones (Ver Actas de Reunión) recorridos en campo con los especialistas de suelos, tránsito, hidráulico y topográfico, con el fin de explicarles las actividades a ejecutar de acuerdo a la necesidad vista en campo por la interventoría.

Además de ello, teniendo en cuenta los dineros sacados por la junta de acción comunal, con el fin de realizar el pago de las diferentes responsabilidades con los especialistas y proveedores se realizó un comité técnico en el cual se les explicó tanto al contador como al residente la manera en la que se deben entregar los balances presupuestales del dinero invertido en la obra y los comprobantes entregables que se deben dar para el pago a los acreedores.

Por otro lado, se realizó el respectivo acompañamiento de la interventoría respecto al plan de calidad de los materiales utilizados en obra, tales como, materiales granulares, aceros, cemento, tuberías a instalar y el respectivo proceso constructivo.

Con esta gestión se logró la contratación y obtención de los estudios de suelos, hidráulicos, de tránsito y topográficos correspondientes para iniciar con la construcción de la placa huella, así mismo, se logró la construcción de las alcantarillas presupuestadas en el contrato construyendo 8 metros lineales de alcantarilla de diámetro de 36", realizando el acompañamiento por parte de los inspectores y el residente de interventoría, en cuanto a sistema constructivo así como el cumplimiento técnico y normativo de las actividades ejecutadas, de acuerdo al concepto dado por los especialistas.

Convenio 2735 Vereda Cachavita.

Durante el presente mes se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades ejecutadas por la junta de acción comunal de la vereda Cachavita, como se evidencia en las actas de comité de obra, tanto técnicos como operativos, con el fin de poner en marcha las obras a ejecutar, de tal forma que fue necesario realizar comités operativos junto con el presidente de la JAC y el presidente de la veeduría para darle aval a las cotizaciones y contratación de personal y habilitar los dineros correspondientes de acuerdo a los anexos técnicos y el acompañamiento de la interventoría.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

Así mismo se realizó en repetidas ocasiones (Ver Actas de Reunión) recorridos en campo con los especialistas de suelos, tránsito, hidráulico y topográfico, con el fin de explicarles las actividades a ejecutar de acuerdo a la necesidad vista en campo por la interventoría.

Además de ello, teniendo en cuenta los dineros sacados por la junta de acción comunal, con el fin de realizar el pago de las diferentes responsabilidades con los especialistas y proveedores se realizó un comité técnico en el cual se les explicó tanto al contador como al residente la manera en la que se deben entregar los balances presupuestales del dinero invertido en la obra y los comprobantes entregables que se deben dar para el pago a los acreedores.

Por otro lado, se realizó el respectivo acompañamiento de la interventoría respecto al plan de calidad de los materiales utilizados en obra, tales como, materiales granulares, aceros, cemento, tuberías a instalar y el respectivo proceso constructivo.

Con esta gestión se logró la contratación y obtención de los estudios de suelos, hidráulicos, de tránsito y topográficos correspondientes para iniciar con la construcción del pavimento flexible, así mismo, se logró la construcción de las alcantarillas presupuestadas en el contrato construyendo 6 metros lineales de alcantarilla de diámetro de 16", a tubo doble de PVC, realizando el acompañamiento por parte de los inspectores y el residente de interventoría en cuanto a sistema constructivo, así como el cumplimiento técnico y normativo de las actividades ejecutadas, de acuerdo al concepto dado por los especialistas.

Convenio 2730 Vereda La Creciente.

Durante el presente mes se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades ejecutadas por la junta de acción comunal de la vereda La Creciente, como se evidencia en las actas de comité de obra, tanto técnicos como operativos, con el fin de poner en marcha las obras a ejecutar, de tal forma que fue necesario realizar comités operativos junto con el presidente de la JAC y el presidente de la veeduría para darle aval a las cotizaciones y contratación de personal y habilitar los dineros correspondientes de acuerdo a los anexos técnicos y el acompañamiento de la interventoría.

Así mismo se realizó en repetidas ocasiones (Ver Actas de Reunión) recorridos en campo con los especialistas de suelos, tránsito, hidráulico y topográfico, con el fin de explicarles las actividades a ejecutar de acuerdo a la necesidad vista en campo por la interventoría.

Además de ello, teniendo en cuenta los dineros sacados por la junta de acción comunal, con el fin de realizar el pago de las diferentes responsabilidades con los especialistas y proveedores se realizó un comité técnico en el cual se les explicó tanto al contador como al residente la manera en la que se deben entregar los balances presupuestales del dinero invertido en la obra y los comprobantes entregables que se deben dar para el pago a los acreedores.

Por otro lado, se realizó el respectivo acompañamiento de la interventoría respecto al plan de calidad de los materiales utilizados en obra, tales como, materiales granulares, aceros, cemento, tuberías a instalar y el respectivo proceso constructivo.

Con esta gestión se logró la contratación y obtención de los estudios de suelos, hidráulicos, de tránsito y topográficos correspondientes para iniciar con la construcción del pavimento flexible, así mismo, se logró la construcción de las alcantarillas presupuestadas en el contrato construyendo 36 metros lineales de alcantarilla de diámetro de 18" a doble tubo el primer tramo de 12 ml a doble tubo de 18" y el segundo con una longitud de 6 metros lineales con un diámetro de 18" a doble tubo esto con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas dadas en la cartilla de obras menores del INVIAS, realizando el acompañamiento por parte de los inspectores y el residente de interventoría, en cuanto a sistema constructivo así como el cumplimiento técnico y normativo de las actividades ejecutadas, de acuerdo al concepto dado por los especialistas.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La interventoría ha llevado un control y supervisión diario de las actividades ejecutadas por cada convenio, en la parte de obra de calidad, la parte social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
- la fecha de corte del presente informe el estado de la obra se encuentra activo y en ejecución; las JAC (SAN ANTONIO, CENTRO, CACHAVITA Y LA CRECIENTE) se encuentra al día con los pagos de la seguridad social del personal de obra y administrativo, el estado de las pólizas del Contrato se encuentra vigentes y actualizadas.
- Se recomienda a los residentes de obra realizar toma de muestras de para ensayos de laboratorio (resistencia de materiales, densidad)
- Por parte de la JAC san Antonio queda pendiente las pólizas actualizadas, dado a que ha tenido inconvenientes con el envío de estas por parte de la aseguradora.



	CIUDAD INVIÁS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																					
						CÓDIGO MEP-MNL-IN-LS-FR-S																																
						VERSIÓN 1																																
						PÁGINA 1																																
FECHA 1/02/2024 (Día / Mes / Año)																																						
UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																																						
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																																						
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		ENERO DE 2024		PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																
CONTRATO INTERVENTORIA No.		4341 DE 2023		INTERVENTORIÁ:		HERBY LUNA CRUZ																																
CONVENIO DE OBRA No.		2851		CONTRATISTA:		JAC SAN ANTONIO																																
CONVENIO DE OBRA No.		2940		CONTRATISTA:		JAC CENTRO																																
CONVENIO DE OBRA No.		2735		CONTRATISTA:		JAC CACHAVITA																																
CONVENIO DE OBRA No.		2730		CONTRATISTA:		JAC LA CRESCIENTE																																
EQUIPOS Y VEHICULOS	DESCRIPCION	ENERO																														FEBRERO						
MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ 150 -2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1	2	3	4	5				
MOTOCICLETA	YAMAHA XC1100	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
MOTOCICLETA	YAMAHA XIZT 250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
MOTOCICLETA	YAMAHA YZF 155	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I																																						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: El proyecto aunque en ese periodo aun se encuentra en etapa de estudios y diseños, se tuvo necesidad del transporte del residente, especialistas y director al sitio de obras, seguimiento y control de topografía, estudio de suelos, visita a proveedores como mezcla de concreto, fuentes de materiales, botadero, en fin... y otros aspectos importantes requeridos de investigar y revisar que se requieren preliminarmente para inicio de obras.																																						
(Relacionar equipo de topografia, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindrada y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																						
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																						
Se terminan las obras objeto del contrato de obra																																						
NOTAS: 1. Se entiende por “Activo” el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por “Inactivo” el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y “en reparación” el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																						
<div style="float:left; width:45%;"> Nombre: HERBY LUNA CRUZ Director de Interventoría Matrícula Profesional NO 2520242574 CND</div> <div style="float:right; width:45%; text-align:right;"> Nombre:HERNÁN ERIQUE DULCE MORENO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ</div> <div style="clear:both;"></div>																																						

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

[illegible]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

6.3. informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEP/INI-IN-15-FR-9									
		VERSIÓN 1										
		PÁGINA										
		FECHA 1/02/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4341 de 2023		INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ										
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024		PROYECTO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".										
CONVENIO SOLIDARIO No: 2851 de 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO										
CONVENIO SOLIDARIO No: 2940 de 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE VITERBO										
CONVENIO SOLIDARIO No: 2735 de 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHAVITA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO										
CONVENIO SOLIDARIO No: 2730 de 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRESCIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO										
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	1266523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 88.491.337,00	\$ 88.491.337,00					
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	4341-01-2023	\$ 27.925.442	\$ 27.925.442,00					
TOTAL							\$ 116.416.779,00					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:				\$ 116.416.779,00								
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	20-30 NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1266523	\$ 116.416.779,00	\$ 116.416.779,00		
2	DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1266523	\$ 116.416.779,00	\$ 116.416.779,00		
3	ENERO DE 2024	\$ 33.628.500,00	\$ 6.389.415,00	\$ 40.017.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1266523	\$ 76.398.864,00	\$ 76.398.864,00		
TOTALES		\$ 33.628.500,00	\$ 6.389.415,00	\$ 40.017.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 76.398.864,00	\$ 76.398.864,00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
Acta de costos No. 1		\$ -		\$ -		\$ -						
Acta de costos No. 2		\$ -		\$ -		\$ -						
Acta de costos No. 3		\$ 40.017.915,00		\$ -		\$ 40.017.915,00						
Acta de costos No. 4		\$ -		\$ -		\$ -						
Acta de costos No. 5		\$ -		\$ -		\$ -						
VALOR TOTAL		\$ 40.017.915,00		\$ -		\$ 40.017.915,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma												
Nombre: HERBY LUNA CRUZ												
Director de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND.												
Firma												
Nombre: HERMAN ENRIQUE DULCE MORENO												
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Matrícula Profesional No.: 52002-47079 NPN												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

 #¿NOMBRE?	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA	1																																																			
		FECHA	1/02/2024 (Día / Mes / Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4341 de 2023	INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".																																																						
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 88.491.337,00 VALOR ACUMULADO: \$ 88.491.337,00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 8.849.133,70</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 26.547.401,10</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>10%</td><td>\$ 26.547.401,10</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td></tr></tbody></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 8.849.133,70	20	11	2023	31	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 26.547.401,10	20	11	2023	30	4	2027	Calidad del servicio	10%	\$ 26.547.401,10	20	11	2023	30	4	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 8.849.133,70	20	11	2023	31	10	2024																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 26.547.401,10	20	11	2023	30	4	2027																																														
Calidad del servicio	10%	\$ 26.547.401,10	20	11	2023	30	4	2025																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101186507 Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																						
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 11.641.677,90</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 34.925.033,70</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>10%</td><td>\$ 34.925.033,70</td><td>20</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td></tr></tbody></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 11.641.677,90	20	11	2023	31	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 34.925.033,70	20	11	2023	30	4	2027	Calidad del servicio	10%	\$ 34.925.033,70	20	11	2023	30	4	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 11.641.677,90	20	11	2023	31	10	2024																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 34.925.033,70	20	11	2023	30	4	2027																																														
Calidad del servicio	10%	\$ 34.925.033,70	20	11	2023	30	4	2025																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																						
OBSERVACIONES:																																																						
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																						
Firma Nombre: HERBY LUNA CRUZ Representante Legal - Interventoría Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND		Firma Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Matrícula Profesional No.: 52202-47079 NRR																																																				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																						



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COD.SUC 96	NO.PÓLIZA 96-44-101186507	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 12 2023	20 11 2023		00:00	05 01 2027		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY	IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 7056000
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 4341 DE 2023 CON FECHA DE APROBACIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2023	05/07/2024	\$8,849,133.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2023	05/01/2025	\$26,547,401.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2023	05/01/2027	\$26,547,401.10	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****302,566.00	\$ *****8,000.00	\$ *****59,007.00	\$ *****369,573.00	\$ *****61,943,935.90	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



[Handwritten Signature]

96-44-101186507

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF040931B

1



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA				COD.SUC 96		NO.POLIZA 96-44-101186507		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO					
26 12 2023			20 11 2023			00:00	05 01 2027			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY								IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343	
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3123282602	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-50						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7056000	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186507

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B.- Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF040931B

2



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COD.SUC 96	NO.PÓLIZA 96-44-101186507	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 12 2023	15 11 2023		00:00	31 12 2026		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY	IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4341 DE 2023 CON FECHA DE APROBACION 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO CON FECH 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4341 DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (302,566.00)	\$ ***** (8,000.00)	\$ **** (59,007.00)	\$ ***** (369,573.00)	\$ ***** (61,943,935.90)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



[Firma manuscrita]

96-44-101186507

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF040931B

1



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA						SUCURSAL BUCARAMANGA						COD.SUC 96		NO.POLIZA 96-44-101186507		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
26 12 2023			15 11 2023			00:00	31 12 2026			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY								IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343			
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3123282602	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2			
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO. 26-50						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 7056000	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186507

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B.- Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF040931B



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA		COD.SUC 96	NO.POLIZA 96-44-101186507	ANEXO 5																				
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 02 2024		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 11 2023		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 04 2027	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA																				
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																											
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY						IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343																					
DIRECCIÓN: CL 19 B01 B 45				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3123282002																					
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS						IDENTIFICACIÓN NT: 806.215.807-2																					
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-00				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7056000																					
ADICIONAL:																											
OBJETO DEL SEGURO																											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:																											
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACTIVACIÓN DE OFERTA No. 4341 DE 2023 CON FECHA DE APROBACIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																											
AMPAROS																											
RIESGO: INTERVENTORIA																											
<table><thead><tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG/ACTUAL</th><th>SUMA ASEG/ANTERIOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>20/11/2023</td><td>31/10/2024</td><td>\$11,641,677.90</td><td>\$11,641,677.90</td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>20/11/2023</td><td>30/04/2025</td><td>\$34,925,033.70</td><td>\$34,925,033.70</td></tr><tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>20/11/2023</td><td>30/04/2027</td><td>\$34,925,033.70</td><td>\$34,925,033.70</td></tr></tbody></table>								AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2023	31/10/2024	\$11,641,677.90	\$11,641,677.90	CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2023	30/04/2025	\$34,925,033.70	\$34,925,033.70	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2023	30/04/2027	\$34,925,033.70	\$34,925,033.70
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																							
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2023	31/10/2024	\$11,641,677.90	\$11,641,677.90																							
CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2023	30/04/2025	\$34,925,033.70	\$34,925,033.70																							
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2023	30/04/2027	\$34,925,033.70	\$34,925,033.70																							
ACLARACIONES																											
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL CONTRATO ADICIONAL NUMERO 4341-01-2023 DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$ 27.925.442,00 Y POR LO TANTO SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.																											
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.																											
<table><thead><tr><th>VALOR PRIMA NETA</th><th>GASTOS EXPEDICIÓN</th><th>IVA</th><th>TOTAL A PAGAR</th><th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th><th>PLAN DE PAGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>\$ *****0.00</td><td>\$ *****0.00</td><td>\$ *****0.00</td><td>\$ *****0.00</td><td>\$ *****51,491,745.30</td><td>CONTADO</td></tr></tbody></table>								VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****51,491,745.30	CONTADO								
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO																						
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****51,491,745.30	CONTADO																						
<table><thead><tr><th colspan="3">INTERMEDIARIO</th><th colspan="3">DISTRIBUCION COASEGURO</th></tr><tr><th>NOMBRE</th><th>CLAVE</th><th>% DE PART</th><th>NOMBRE COMPAÑIA</th><th>% PART</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ</td><td>40932</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO			NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO	MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40932	100.00					
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO																								
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO																						
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40932	100.00																									
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																											
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6378486 - BUCARAMANGA																											
 FIRMA AUTORIZADA: José Luis Rinde - Vicepresidente de Planes				 FIRMA TOMADOR																							
OPICINA PRINCIPAL: CALLE 53 NO 19-16 TELEFONO: 661-2186977, 661-6019330																											
DLP408018 1																											



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

 NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015													
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA						SUCURSAL BUCARAMANGA				COD.SUC 96		NO.PÓLIZA 96-44-101106507		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
16 02 2024			20 11 2023			00:00		30 04 2027			23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA		
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LUNA CRUZ, HERBY										IDENTIFICACIÓN CC: 4.197.343					
DIRECCIÓN: CL 19 B01 B 45										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3123262602			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO															
ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2					
DIRECCIÓN: CARRETERA 59 NO.26-60										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 70560000			
ADICIONAL:															
TEXTO ACLARATORIO															
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.															
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN															
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6376406 - BUCARAMANGA															
															
96-44-101106507															
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas															
FIRMA TOMADOR															
DLF0408318															



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

VEREDA SAN ANTONIO





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

VEREDA CENTRO.





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

CACHAVITA





INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

LA CRECIENTE

5.3 Informes Especialistas Y Profesionales.



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01 01 al 31 enero de 2024

Dichos informes se anexan al siguiente documento.

8. ANEXOS.

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA						
FECHA DE ENVÍO	NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO RADICADO	FECHA DE RADICACIÓN	:	QUIÉN LO DIRIGE:	DIRIGIDO A:
01/01/2024	HLC-SRV-026-2023			ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS: HERNAN DULCE ERIKA ESTUPIÑAN CAMILO CASERES
10/01/2024	HLC-SRV-027-2023			ALCANCE CAMBIO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS: HERNAN DULCE ERIKA ESTUPIÑAN CAMILO CASERES
16/01/2024	HLC-SRV-028-2023			SOLUCITUD TIPOLOGIA DE PAVIMENTO	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS: HERNAN DULCE ERIKA ESTUPIÑAN CAMILO CASERES

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
FECHA RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	NUMERO CONSECUTIVO	ASUNTO:	QUIEN REMITE	QUIEN FIRMA	DIRIGIDO A:
03/01/2024			RESPUESTA RADICADO 2023E-VUVRAZ-035416	INVIAS	ERIKA LIZETH ESTUPIÑAN BAEZ	ERIKA LIZETH ESTUPIÑAN BAEZ
17/01/2024			RESPUESTA OFICIOS SRV-025-2023 Y SRV-027-2023	INVIAS	ERIKA LIZETH ESTUPIÑAN BAEZ	ERIKA LIZETH ESTUPIÑAN BAEZ



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

8.2 Copia de la bitácora del mes correspondiente.
SANA NTONIO

Convenio Solidario

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE UTERIBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE UTERIBO

INTERVENTOR

ING HERBY LUNA

NICA



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

02-01-2024 Clima: Soleado toda la jornada
Personal: Maestro; Residente de Obra
Herramienta: Menor
Actividades: Estudio de Suelos

Luisferndi
Residente Interventoria

[Signature]
Residente de Obra

03-01-2024 Clima: Soleado toda la jornada
Personal: Maestro; Residente de Obra
Herramienta: Menor
Actividades: Levantamiento topografico

Luisferndi
Residente Interventoria

[Signature]
Residente de Obra

04-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro, Residente
Herramienta: Menor
Actividades: Estudio Hidraulico

Luisferndi
Residente Int

[Signature]
Residente de Obra

05-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro, Residente
Herramienta: Menor
Actividades: levantamiento topografico

Luisferndi
Residente Interventoria

[Signature]
Residente de Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

26-01-2024	Clima: Soleado todo el día Personal: Maestro y Residente Herramienta: menor Actividad: Compra de Grava y Arena
	<div><div><u>Luisferndu</u> Residente Interventoria</div><div><u>[Signature]</u> Residente de Obra</div></div>
28-01-2024	Clima: Soleado todo el día Personal: Maestro y Residente Herramienta: Menor Actividad: Descargue de 12 tubos de concreto de 36"
	<div><div><u>Luisferndu</u> Residente Interventoria</div><div><u>[Signature]</u> Residente de Obra</div></div>
7-01-2024	Clima: Soleado todo el día Personal: Maestro y Residente 2 Ayudantes Herramienta: Menor Actividad: Se inicia excavación para alcantarilla Material: 7mts Arena lavada 7mts Grava 7 horas Retroexcavadora 10 viajes de volqueta
	<div><div><u>Luisferndu</u> Residente Interventoria</div><div><u>[Signature]</u> Residente Obra</div></div>
1-01-2024	Clima: Soleado todo el día Personal: Maestro 2 ayudantes Residente Herramienta Menor Actividad: Se realiza solado de alcantarilla y Se inicia excavación para alcantarilla



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

5

Material: 14mts Recibo Alcantarillas
Barra 1/2 60
Barra 3/8 100
Cemento gris 200und
Disco de corte 5 und
Retro 6 horas
10 viajes Volquetas

Luisferndu
Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra

19-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro 3 Ayudantes Residente
Herramienta: Menor Pulidora
Actividad: Instalación de tubos de alcantarilla
Solado alcantarilla 2
8 horas Retroexcavadora

Luisferndu
Residente Interventoria

[Signature]
Residente de Obra

20-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro Residente 3 Ayudantes
Herramientas: Menor
Actividades: Instalación de tubos alcantarilla 2
Atrique y relleno alcantarilla 2
6 horas Retroexcavadora

Luisferndu
Residente Interventoria


[Signature]
Residente Obra




INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024


6


2-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente, 3 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Amare de Acero de Pocetas
Alcantarillas


Residente Interventoria



Residente Obra


3-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente 3 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Solado Pocetas alcantarilla amare
de acero, Excavación de aletas
y muro de alcantarillas 1


Residente Interventoria


Residente Obra

4-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente 3 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Solado para muro y aletas y
Excavación de aletas y muro de
alcantarilla 2.


Residente Interventoria


Residente Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

25-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro Residente 3 Ayudantes
Herramienta Menor
Actividades: Amarre de acero de muro y
aletas para alcantarillas
Material: 14mts Arena lavado
14mts Grava

Luisferndi

Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra

26-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro Residente 3 Ayudantes
Herramienta Menor
Actividades: Amarre de acero de muro y aletas
para alcantarillas

Luisferndi

Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra

29-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro Residente 3 Ayudantes
Herramienta Menor
Actividades: Formaletea poceta de alcantarilla
y se funde se inicia armar
formaleta para muro y aletas
Se inicia excavación para placa
huella

Luisferndi

Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

8

0-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal Maestro Resident 3 Ayudantes
Herramienta menor
Actividades: Se continúa excavación para
placa huella se funde muros
y aletas para alcantarilla
Material 7mts Arena lavado
7mts Grava

Luiz Fernando
Residente Interventora

[Signature]
Residente Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

CENTRO

CONVENIO SOLIDARIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE UTERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE UTERBO.

INTERVENTOR

ING. HERBY LUNA



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

3

02-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro, Residente de obra
Herramienta: Menor
Actividades: Estudio de Suelos

Luizfandi *ful*
Residente Interventoria Residente de Obra

03-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada.
Personal: Maestro ; Residente de obra
Herramienta: Menor
Actividades: Levantamiento topografico

Luizfandi *ful*
Residente Interventoria Residente de Obra

04-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro, Residente de obra
Herramienta: Menor
Actividades: Estudio Hidraulico

Luizfandi *ful*
Residente Interventoria Residente de Obra

05-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro, Residente de obra
Herramienta: Menor
Actividades: Compra de material

Luizfandi *ful*
Residente Interventoria Residente de Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

06-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro Residente de Obra
Herramienta: Menor
Actividades: Búsqueda de maquinaria

Luisferndu Residente Interventoria
[Signature] Residente de Obra

16-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro Residente de Obra
Herramienta: Menor
Actividades: Descargue de tubería en concreto;
inicio de excavación de Alcantarilla
Material: 6 tubos de Concreto de 36"
7mts Arena lavada
7mts Grava
6 horas de Retroexcavadora
13 viajes de Volqueta

Luisferndu Residente Interventoria
[Signature] Residente de Obra

17-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro Residente de Obra 3 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Perfilada de excavación de
alcantarilla
Material: 14mts recebo atraque tubería
Alambre Negro
Barra 1/2" 30und
Barra 3/8" 50und
Cemento gris 100bultos



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

5

Retroexcavadora 2 horas

Volquetas 2 viajes

Luisfendini

Residente Interventoria

[Signature]

Residente de Obra

18-01-2024 Clima: Soleado todo el día

Personal: Maestro, Residente 3 Ayudantes

Herramientas: Menor Pulidora

Actividades: Solado para tubería

Material: 14mts recebo Relleno Alcantarilla

Luisfendini

Residente Interventoria

[Signature]

Residente de Obra

19-01-2024 Clima: Soleado todo el día

Personal: Maestro; Residente 3 Ayudantes

Herramientas Menor; Rana

Actividades Instalación tubería relleno
de tramo con atraque de la
tubería

2 horas de retroexcavadora

Luisfendini

Residente Interventoria

[Signature]

Residente de Obra

20-01-2024 Clima: Soleado todo el día

Personal: Maestro; Residente 3 Ayudantes

Herramientas: Menor; Rana

Actividades: Compactación de relleno con rana

Luisfendini

Residente Interventoria

[Signature]

Residente de Obra NKA



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

6

22-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro; Residente de Obra, 3 Ayudantes
Herramienta: Menor; Pulidora
Actividades: Amarre de acero para poceta de
alcantarilla.
Perfilamiento de entrada vía
Material: 28mts Recebo Placa Huella

Luisferndi

Residente Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

23-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro; Residente de Obra; 3 Ayudantes
Herramienta: Menor; Pulidora
Actividades: Amarre de acero poceta muro y
aletas alcantarilla; Perfilamiento
de cajón placa - huella

Luisferndi

Residente Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

24-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente de Obra; 3 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Se compacta con vibro el terreno
natural siguiendo indicaciones de
interventoría se extiende recebo
en relleno para placa huella.
Se realiza replanteo de niveles
de topografía y se



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

7

Para alcantarilla
Material: 28mts de recebo para placa huella

Tuifindaí

Residente Interventoría

[Signature]

Residente de Obra.

25-01-2024 Clima: Soleado todo el día

Personal: Maestro; Residente 3 Ayudantes

Herramienta: Menor

Actividades: Se continúa compactando el recebo con vibro en la zona de primer tramo de Placa Huella; Se inicia replanteo y excavación en el segundo tramo; Se formaletea alcantarilla muro y poceta

Tuifindaí

Residente Interventoría

[Signature]

Residente Obra

26-01-2024 Clima: Soleado todo el día

Personal: Maestro; Residente 4 Ayudantes

Herramienta: Menor

Actividades: Se realiza fundida de poceta de alcantarilla y armado de muro y aletas de continua con excavación en segundo tramo.

Material): 7mts Arena lavada Alcantarilla
7mts Grava Alcantarilla
28mts Recebo Placa Huella

Tuifindaí

Residente Interventoría

[Signature]

Residente Obra



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

8

27-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente 4 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Fundida de muro y aletas
alcantarilla, desencofra poceta y
se realiza curado de concreto

[Signature]

Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra

29-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente 4 Ayudantes
Herramienta: Menor
Actividades: Se desencofra Alcantarilla se
continúa con excavación del
tramo 2 y compactación de
material.

[Signature]

Residente Interventoria

[Signature]
Residente Obra

2 30-01-2024 Clima: Soleado todo el día
Personal: Maestro, Residente 4 Ayudantes
Herramienta: menor
Actividades: Se continúa con excavación para
tramo 2 y compactación de material
llegan 14mts de recebo para
compactación de tramo 2.









[Signature]

[Signature]



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

CACHAVITA

6-enero-2024	clima: : Soleado maquinaria: herramienta menor personal: Ing Residente de obra, Ing Residente Interventoria, 2 Ayudantes materiales: — 0 — Actividades: Recena y desmonte.	 Ing Residente de obra	 Ing Residente Interventoria
9-enero-2024	clima: Soleado maquinaria: herramienta menor personal : Ing Residente obra, Ing Residente Interventoria, 2 ayudantes materiales : — 0 — Actividades: Limpieza de Alcantarillas y cunetas,	 Ing Residente obra	 Ing Residente Interventoria
10-enero-2024	clima: Soleado maquinaria: herramienta menor personal : Ing Residente obra, Ing Residente Interventoria, 2 ayudantes materiales: — 0 — Actividades: Limpieza de Alcantarillas y cunetas en tierra.	 Ing Residente obra	 Ing Residente Interventoria
11-enero-2024	clima: Soleado maquinaria: herramienta menor personal: Ing Residente obra, Ing Residente Interventoria 2 Ayudantes materiales: — 0 — Actividades: Limpieza de Alcantarillas y cunetas en tierra.	 Ing Residente de obra	 Ing Residente Interventoria



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

12 enero 2024 clima: : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente obra, Ing Residente interventoria, 2 ayudantes
materiales : — 0 —
Actividades: Limpieza de Alcantarilla, y cunetas en tierra.

~~Ing Residente de obra~~ ~~Ing Residente interventoria~~

13 enero 2024 clima: : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente de obra, Ing Residente interventoria, 2 ayudantes
materiales : — 0 —
Actividades: Limpieza de cunetas en tierra

~~Ing Residente de obra~~ ~~Ing Residente Interventoria~~

15 enero 2024 clima : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente obra, Ing Residente interventoria y 2 ayudantes
materiales : — 0 —
Actividades: Recorrido y desmonte de zonas verdes y cunetas.

~~Ing Residente obra~~ ~~Ing Residente interventoria~~

16 enero 2024 clima: Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente de obra, Ing Residente d Interventoria, 2 ayudantes
materiales : — 0 —
Actividades: Recorrido y desmonte de zonas boscosas y cunetas.

~~Ing Residente de obra~~ ~~Ing Residente d interventoria~~



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

17 enero 2024 clima : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente de obra, Ing Residente interventoria y 2 ayudantes
materiales: — o —
Actividades: Limpieza de Alcantarilla, Rocera y Limpieza de zonas boscosas.
~~Ing Residente de obra~~ *Trigueros*
Ing Residente de interventoria

18 enero - 2024 clima : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente de obra, Ing Residente interventoria, 2 ayudantes
materiales: — o —
Actividades: Limpieza de conector en tierra y Alcantarilla Rocera y Limpieza de zonas no boscosas
~~Ing Residente de obra~~ *Trigueros*
Ing Residente de interventoria

19 enero 2024 clima: : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal : Ing Residente obra, Ing Residente interventoria y 2 ayudantes
materiales: — o —
Actividades: Limpieza de conector en tierra, Limpieza y Rocera de zonas boscosas.
~~Ing Residente de obra~~ *Trigueros*
Ing Residente de interventoria

20 enero 2024 clima : Soleado
maquinaria : herramienta menor
personal : Ing Residente obra, Ing Residente interventoria, 2 ayudantes
Actividades : Limpieza de conector en tierra y Rocera. Reunión con Ing Residente interventoria y visita a obra.
~~Ing Residente de obra~~ *Trigueros*
Ing Residente de interventoria



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

22 enero 2024 clima: Soleado

maquinaria: Retroexcavadora, y herramienta menor

personal: Ing Residente obra, Ing Residente de Interventoria, 2 ayudantes y operador Ret

materiales: grava, Arena, Recibo y material de armado

Actividades: Replanteo de excavacion para alcantarilla, excavacion mecanica de Alcantarilla, transporte de material de excavacion.

Ing Residente de obra

Ing Residente de Interventoria

23 enero 2024 clima: Soleado

maquinaria: Retroexcavadora, Volquete y herramienta menor

personal: Ing Residente obra, Ing Residente interventoria, 2 ayudantes, operador de Retroexcavadora y conductor Volquete

materiales: grava, arena, Agua, Alambres, tubería novafort 16", material de Afirmado.

Actividades: excavacion mecanica, Replanteo de excavacion, Reparacion tubería de Riego usochiramecha, conformacion de capa de Afirmado

Ing Residente de obra

Ing Residente de Interventoria

24 enero de 2024 clima: Soleado

maquinaria: Retroexcavadora, Volquete y herramienta menor, Rana

personal: Ing Residente de obra, Ing Residente de Interventoria, 2 ayudantes, operador de Retroexcavadora

materiales: grava, arena, Agua, cemento, material de Afirmado, tubería 16" novafort.

Actividades: fabricacion de concreto de 2000psi para Solado, ~~para~~ instalacion y nivelacion de concreto de 2000 psi solado tubería, instalacion de tubería 16" doble, instalacion de zanca en grava 3/4, Relleno con materia de Afirmado.

Ing Residente de Interventoria



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

25 enero 2024 clima: Soleado

maquinaria: herramienta menor, Rana compactadora

personal: ing Residente obra, ing Residente interventoria, 2 ayudantes.

material: material de afirmado

Actividad: compactación de material de Afirmado y Retiro de escombros de excavación.

~~ing Residente obra~~

~~ing Residente interventoria~~

26 enero 2024 clima: Soleado

maquinaria: herramienta menor, Rana compactadora

personal: ing Residente, ing Residente interventoria, 2 ayudantes.

material: material de Afirmado

Actividad: compactación de material de Afirmado

~~ing Residente de obra~~

~~ing Residente de Interventoria~~

27 enero 2024 clima: Soleado

maquinaria: herramienta menor, Rana compactadora

personal: ing Residente de obra, ing Interventoria y 2 ayudantes

material: material de Afirmado

Actividad: compactación de material de afirmado y curados en zonas comunes.

~~ing Residente de obra~~

~~ing Residente interventoria~~



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

29 enero 2024 clima: : Soleado
maquinaria: herramienta menor
personal: ing Residente de obra, ing Resident Interventor maestro 2 ayudantes
materiales: piedra filtro, arena, grava y cemento.
Actividades: curuteo.

~~ing Residente de obra~~

~~ing Residente de Intervent~~

30 enero 2024: clima: Soleado
maquinaria: Motoniveladora, herramienta menor.
persona: ing Residente de obra, ing Resident Interventora, 1 maestro,
2 ayudantes.
materiales: — ○ —

Actividades: inicio de conformación de vía, Replanteo de terracería
para encofe y descale Alcantarillas, Excavación en
material común para curuteo.

~~ing Residente de obra~~

~~ing Residente interventor~~

31 enero 2024 clima
maquinaria
personal: ing Residente obra, ing Residente interventora, maestro, 2 ayudantes, operador
motoniveladora.

materiales: — ○ —

Actividades: conformación y perfilado de vía, curuteo y terracería
vía.

~~ing Residente de obra~~

~~ing Residente interventor~~



LA CRECIENTE

1

CONVENIO SOLIDARIO 2930-2023

UNIR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA
CRECIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE VITERBO

INTERVENTOR

INGENIERO HERBY LUNA



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

3

02-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, Ingeniero Residente
Herramienta menor Guadaña
Actividades: Rocería, Visita de Campo Ingeniero
Sanitario (concepto hidráulico).

Luzmila
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

03-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor, Guadaña
Actividades: Limpieza de Alcantarillas, Rocería

Luzmila
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

04-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor, Guadaña
Actividades: Limpieza de Alcantarillas, Rocería

Luzmila
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

05-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor, Guadaña
Actividades: Rocería, Limpieza de Alcantarillas

Luzmila
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

06-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada



4

Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor, Guadaña
Actividades: Puceria, Zanjas de drenaje

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

04-01-2024

Clima: Soleado toda la Jornada

Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente, Operario Retroexcavadora, Operario Volqueta (6m³)

Maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta (6m³)

Actividades: Se realiza acopio de Agregados (2 Viajes Grava, 1 Arena y 1 Recibo) y Cemento 50 bultos.

* Demolición Alcantarilla Longitud 12 m; tubería 24"

* Excavación Alcantarilla #1 Longitud 12 m Encole y Descote.

* Replanteo y Nivelación Alcantarilla #1 Longitud 12 m.

* Se funda al Solado Alcantarilla #1 Longitud 12 m

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

10-01-2024

Clima: Soleado toda la Jornada

Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente Operario Retroexcavadora, Operario Volqueta (6m³)

Maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta (6m³), Rana

Actividades: Acopio de 4 tubos PVC corrugado 18" de 6m de longitud Cada uno, y 5 Viajes de Recibo.

* Se Instalan los 4 tubos 18" (a doble tubo)

* Se realiza el atrague de la tubería en grava a tubo lleno.

* Se rellena con recibo y se realiza su respectiva



5

Computación

* Se traslada material proveniente de la excavación

Tuzjuli

Residente interventoria

Héctor Jiménez P.

Residente Contratista

11-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Topografía, Estacionamiento Abs cada 20m
Limpieza Cuneta en tierra

Tuzjuli

Residente interventoria

Héctor Jiménez P.

Residente Contratista

12-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Limpieza Cuneta en tierra
* Rocería

Tuzjuli

Residente interventoria

Héctor Jiménez P.

Residente Contratista

13-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Recepción tubería; 3 tubos PVC Corrugado 6m longitud cada uno, 18"
* Limpieza Cunetas en tierra y Rocería

Tuzjuli

Residente interventoria

Héctor Jiménez P.

Residente Contratista



6

15-01-2024 Clima = Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente de Obra, Operario Volqueta
Herramienta menor: Roto martillo, motosierra
Actividades: Demolición Cabezal y Cortar Raíz
x Acopio de Agregados (3 Viajes grava, 1 Arena y 2 Recibo)
x Roceria

Tungurahua
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

16-01-2024 Clima = Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente Operario Retroexcavadora, Operario Volqueta
Maquinaria: Retroexcavadora, Volquete, Rana (Compactador)
Herramienta menor
Actividades: Acopio de Agregados (1 Viaje Recibo y 1 de Piedra)
x Se realiza excavación Alcantarilla #2 Longitud 8.50m
x Se estabiliza suelo con piedra
x Demolición Alcantarilla 24" Lg=8m

Tungurahua
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

17-01-2024 Clima = Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente Operario Retroexcavadora, Operario Volqueta
Maquinaria: Retroexcavadora, Volquete, Rana (Compactador)
Herramienta menor
Actividades: Se funda Suelo Alcantarilla #2 Lg=8.50m
x Se instala tubería 18" 450mm
x Se Atraca a tubo lleno en triturado (Gravilla)
x Se rellena con Recibo y Se realiza su Compactación



- * Se transporta el material proveniente de la excavación Escombros o lugar de Relleno.
- * Se recepciona 60 Varillas $\frac{3}{8}$ (Acero).

Hugo
Residente de Interventoría

Héctor Jiménez P.
Residente de Contratista

18-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 1 Ayudante, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Zanjeros de Drenaje
* Evacuación de agua constante Alcantarilla #1 Lg=12m
* Limpieza de Cuneta en tierra

Hugo
Residente interventoría

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

19-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 1 Ayudante, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Drenaje y Desvío de Agua proveniente
de needederos
* Zanjeros de drenaje
* Rocería

Hugo
Residente interventoría

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

20-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 1 Ayudante, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades: Reunión técnica, avance de Obra
Interventoria (Ingeniero Herby Luna)
* Replanteo Encoleta



8

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

22-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 1 Ayudante, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades = Replanteo Desecho Alc #1 Lg = 12m
* Solado Encoche Alc #1
* Solado Desecho Alc #1

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

23-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro Obra, 1 Ayudante, Ingeniero Residente
Operario Motorizadora; Maquinaria = Motorizadora
Actividades = Conformación Calzada
* figurado Encoche Alc #1

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

24-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal = Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Operario Volqueta
Actividades = Acopiado Agregados (1 Vía de Arena)
* figurado Desecho Alc #1

Trujillo
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

25-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal = Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente



Maquinaria = Mezcladora Capacidad 1 bulto
Actividades = Se funde Piso en Concreto 3000 Psi
Alcantarilla #1 Encole
Luis Quintanilla
Residente Interventoria
Héctor Jiménez P.
Residente de Contratista

26-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal = Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Maquinaria = Mezcladora Capacidad 1 bulto
Actividades = Se funde piso en Concreto 3000 Psi
Alc #1 Descole

Luis Quintanilla
Residente Interventoria
Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

29-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal = Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramienta menor
Actividades = Se funde Solado encole Alc #2
* Reunión de Compras

Luis Quintanilla
Residente Interventoria
Héctor Jiménez P.
Residente Contratista

30-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal = Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero Residente
Herramientas menor
Actividades = Se funde solado Descole Alc #2
* Roceria
* Mantenimiento Concretos en tierra
* Zanjas de drenaje

Luis Quintanilla
Residente Interventoria
Héctor Jiménez P.
Residente Contratista



INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01
01 al 31 enero de 2024

10

31-01-2024 Clima: Soleado toda la Jornada
Personal: Maestro de Obra, 2 Ayudantes, Ingeniero
Residente
Herramienta menor
Actividades = Roceria
* Mantenimiento de Cunetas en tierra

Residente
Residente interventoria

Héctor Jiménez P.
Residente Contratista
