



**CONTRATO DE OBRA No. 0423 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA “CAM” Y SOFOR
INGENIEROS SAS**

INFORME NO.4 CONTRATO 0423 DE 2023

**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA
CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE
RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE
LAS SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORESTALECIMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA”**

SOFOR INGENIEROS SAS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA



MARZO 2024

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	--	---

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
2.1 Localización geográfica.	3
2.2 Información General del Contrato.....	3
3. OBJETIVO DEL INFORME.....	4
4. ALCANCE DEL INFORME.....	4
5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES	4
5.1 Relación y estado de pólizas de garantías	4
6. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	5
6.1 Vehículos.	5
6.2 Equipo y herramientas.....	5
6.3 Personal del contrato	6
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 4 DE OBRA DEL PROYECTO	7
7.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML).....	7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	11
8.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML).....	11
9. CONCLUSIONES.....	33

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	--	---

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento, al contrato 0423 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM” y SOFOR INGENIEROS SAS. el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, la empresa SOFOR INGENIEROS SAS, se permite presentar el Informe No. 4 en el cual se describen las actividades realizadas bajo el periodo de tiempo del 01 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024.

Es importante resaltar la disponibilidad de las personas de la comunidad (propietarios) para la verificación de los tramos a aislar durante el proceso constructivo del aislamiento, además de visita diagnóstica de un predio.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización geográfica.

El proyecto se llevará a cabo en el Departamento del Huila abarcando los Municipios de Neiva, La Plata, Paicol, Isnos, Pital, Elías, Aipe Baraya, Rivera, Iquira, Santa María, Acevedo, Palestina y Pitalito.

2.2 Información General del Contrato

GENERALIDADES	
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

	INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423	
---	--	---

NÚMERO DEL CONTRATO	0423 DEL 2023
VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.505.964.466 MCTE)
CONTRATISTA	SOFOR INGENIEROS SAS
PLAZO	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2023

3. OBJETIVO DEL INFORME

Informar a la CAM sobre las actividades desarrolladas bajo el marco del contrato 0423 de 2023 por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS, para el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 correspondiente al mes 4 de obra.

4. ALCANCE DEL INFORME

Este informe tiene como alcance presentar a la CAM las actividades de instalación de aislamientos tales como ahoyado, hincado, templado y grapado de alambre además de terminación de aislamientos; además de una visita diagnóstica por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS bajo el marco del contrato 0423 de 2023 ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero 2024.

5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Las actas elaboradas en la ejecución del contrato con corte a 29 de febrero del año 2024 se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE	FECHA
Acta de comité No. 8	14/02/2024

Se anexa en el informe

5.1 Relación y estado de pólizas de garantías

De acuerdo al contrato de obra pública 0423 de 2023 en su clausula décima, el contratista SOFOR INGENIEROS SAS presentó y cargo al SECOP II las Pólizas de seguro de cumplimiento No. I-100027135 y de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. I-100006239 expedidas por la compañía Seguros Mundial, las cuales fueron cargadas en la plataforma del SECOP II y posteriormente aprobadas y se relacionan en la siguiente imagen:

 SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9	INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423	 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA <i>¡Cuida tu naturaleza!</i>
--	--	---

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	150.596.446,60 COP	8/09/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	301.192.893,20 COP	8/09/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	348.000.000,00 COP	8/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Imagen 1. Pólizas contractuales

6. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

A continuación, se relaciona la maquinaria, vehículos y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades y de la visita diagnósticas adelantada en el contrato el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

6.1 Vehículos.

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el cuarto mes de ejecución en el desarrollo de las actividades, utilizó los vehículos relacionados a continuación para adelantar el proyecto en mención:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA	Chevrolet vitará	2004	VDC 466

6.2 Equipo y herramientas

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el periodo del presente informe, utilizó las siguientes herramientas, con el fin de realizar adelantar las actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPO
1	Gafas de seguridad
2	Guantes
3	Palines
4	Martillo

	INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423	
---	--	---

5.	Pinzas para templado
----	----------------------

6.3 Personal del contrato

Para el desarrollo de las actividades en el cuarto mes de ejecución y según el objeto contractual SOFOR INGENIEROS SAS, contó con el personal idóneo por su experiencia, compromiso y cumplimiento. A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo participe en la ejecución de este tercer mes de actividades referente al contrato 0423 de 2023, además se envían todos los soportes de seguridad social.

No.	Nombre y Apellidos	C.C.	CARGO
1	ANDRÉS FELIPE SAAVEDRA	2236682	Coordinador del proyecto
2	RAMIRO DEVIA GALINDO	93359578	Ingeniero de Campo
3	NICOLÁS STEVEN CARDOZO BARRETO	1110582681	Ingeniero de campo
4	FERNEY DANILO CASTRO GALINDO	1083817582	Técnico de campo
5	ARIEL ALBEIRO ARIAS SANCHEZ	93382899	Ayudante de campo
6	ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1032363465	Ingeniera del proyecto
7	OSCAR HERVEY ARIAS	5996146	Trabajador de campo
8	JHON URIEL MURILLO	93393748	Trabajador de campo
9	JACID CARDOZO	93371376	Trabajador de campo

Se anexan los documentos de todo el personal mencionado

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 4 DE OBRA DEL PROYECTO

7.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

Con el fin de eliminar o evitar tensionantes ambientales los cuales afecten el entorno para la protección de cuencas hidrográficas u otros ecosistemas presentes en el proyecto se viene realizando la construcción de aislamiento o cercos protectores. Las características técnicas del aislamiento son las siguientes:

- Estantillos: De madera plástica, con un diámetro de 9 cm x 9 cm y una longitud mínima de 2,20 metros además de postes de madera de las mismas dimensiones como madrina y pie de amigo (cada 30 metros), esto con el fin de tener un mejor templado y grapado del aislamiento protector.
- Hincado: Los estantillos deben ser enterrados en un hueco de 40 cm x 40 cm x 40 cm y está depositando en cada hueco algún tipo de agregado o material encontrado en la zona del hueco con el fin de tener una buena fijación, a una distancia de 3.0 m cada poste y cada 30 metros se está ubicando un pie de amigo o cuando las condiciones topográficas o de dirección lo exijan, cada estantillo se está hincando a una profundidad de 50 cm completamente firme.
- Alambre: Se está utilizando calibre 14 nacional facturado legalmente, se están instalando 4 hilos de alambre a una distancia de 40 cm medidos a partir de la superficie del suelo.
- Grapado y templado: Cada hilo de alambre está siendo templado y grapado a los respectivos estantillos.

	INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423	
---	--	---

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades realizadas en el periodo de tiempo correspondiente al mes de febrero, además de las justificaciones del traslado de metros de aislamiento en algunos predios.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS ADEMÁS DE JUSTIFICACIONES				
MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CANTIDAD DE ML A EJECUTAR EN CADA PREDIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y JUSTIFICACIONES
NEIVA	BUENAVISTA	SAN MIGUEL	2124	Se ejecutaron actividades correspondientes a 1000 ml de aislamiento
AIPE	SAN ISIDRO	GRANIZO	200	Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos
		INDIAL	200	Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos
		GUACHARACAS	200	Se ejecutaron actividades correspondientes a 100 ml de aislamiento
		HOSPITAL	200	Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos
		GUAMITOS	378	Se ejecutaron actividades correspondientes a 200 ml de aislamiento
LA PLATA	SAN ANDRÉS	HUMEDAL SAN ANDRÉS	2000	Se ejecutaron las actividades correspondientes a 1000 ml de aislamiento para tener un porcentaje de ejecución del 100%
PAICOL	SANTA INÉS	HUMEDAL SANTA INÉS	500	Se ejecuto la totalidad del aislamiento

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	--	---

	ALTO SAN MIGUEL	HUMEDAL SAN ANTONIO	800	Se ejecutaron las actividades correspondientes a 500 ml de aislamiento para tener un porcentaje de ejecución del 100%
	ALTO DE SAN MIGUEL	RNSC LOS POMOS	400	Se ejecuto la totalidad del aislamiento
	EL CARMEN	RNSC EL PEDREGAL	1000	Se ejecutaron actividades correspondientes a 750 ml de aislamiento
		RNSC LOTE RURAL	200	Se ejecuto la totalidad del aislamiento (200 ml), adicionando el traslado de 108 metros lineales del predio RNSC VERSALLES predio el cual pertenece a la misma vereda, siendo propiedad del mismos usuario y protección de la misma reserva.
		RNSC VERSALLES	400	Se realizó la ejecución de todas las actividades de aislamiento realizando verificación del metraje con interventoría realizando 292 metros totales. En esta zona de la reserva no se presentaba viabilidad para la ejecución de todo el metraje contractual, debido a que no se presentaba el espacio para realizar la totalidad del aislamiento debido a las condiciones del terreno las cuales impedían la ejecución del mismo. Se realizó el traslado del metraje faltante correspondiente a 108 metros lineales al predio RNSC VERSALLES, el cual presento viabilidad ya que se encuentran en la misma vereda, el propietario es el mismo, y además se mantiene la necesidad de protección total de la reserva, cumpliendo con esto el alcance del proyecto.
	LA LAJA	RNSC CERRITOS	600	Se realizó visita diagnóstica al predio

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	--	---

BARAYA	ESPINALOZA	CHUNCHE 1	212	Se ejecuto la totalidad del aislamiento (200 ml) y debido a que no se presentaba el espacio para la ejecución de todo el metraje. Se realizó el traslado del metraje faltante (12 ml) al predio CHUNCHE 2, el cual presento viabilidad ya que se encuentran en la misma vereda, el propietario es el mismo, y además se mantiene la necesidad de protección de la reserva.
		CHUNCHE 2	160	Se ejecuto la totalidad del aislamiento (160 ml), adicionando el traslado de 12 metros lineales del predio CHUNCHE 1 predio el cual pertenece a la misma vereda, siendo propiedad del mismos usuario y protección de la reserva.
PITALITO	EL CEDRO	RNSC EL CEDRO	2000	Se ejecutaron las actividades correspondientes a 500 ml de aislamiento para tener un porcentaje de ejecución del 100%
	CHARGUAYACO	RNSC EL RECREO	800	Se ejecutaron labores de ahoyado e hincado en el predio
ISNOS	BELLA VISTA	HUMEDAL LA HUMATA	500	Se ejecuto la totalidad del aislamiento

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

8.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

MUNICIPIO DE NEIVA

VEREDA BUENAVISTA PREDIO SAN MIGUEL (2.124 ML)

	
Foto 1. Transporte mayor	Foto 2. Descargue de los insumos para la ejecución
	
Foto 3. Labores de limpia	Foto 4. Transporte menor de insumos
	
Foto 5. Materiales en el sitio del proyecto	Foto 6. Labores de ahoyado

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---



Foto 7. Labores de hincado de postes



Foto 8. Labores de templado y grapado de alambre



Foto 9. Labores de templado y grapado de aislamiento



Foto 10. Aislamiento finalizado



Foto 11. Aislamiento finalizado



Foto 12. Tramo finalizado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

MUNICIPIO DE AIPE

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO EL GRANIZO (200 ML)



Foto 13. Transporte mayor

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO EL INDIAL (200 ML)



Foto 14. Transporte mayor de insumos

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO GUACHARACAS (200 ML)



Foto 15. Transporte de insumos



Foto 16. Labores de ahoyado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 17. Labores de hincado



Foto 18. Labores de templado y grapado



Foto 19. Labores de templado y grapado



Foto 20. Tramo finalizado

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO HOSPITAL (200 ML)



Foto 21. Transporte mayor



Foto 22. Transporte menor de insumos

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO GUAMITOS (378 ML)

 <p>Foto 23. Transporte mayor</p>	 <p>Foto 24. Descargue del material para el aislamiento</p>
 <p>Foto 25. Labores de ahoyado 50 cm</p>	 <p>Foto 26. Labores de hincado</p>
 <p>Foto 27. Tramo con 4 líneas de alambre</p>	 <p>Foto 28. Labores de templado y grapado</p>

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

MUNICIPIO LA PLATA

VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS (2000 ML)



Foto 29. Labores de hincado



Foto 30. Hincado de postes



Foto 31. Riego del alambre



Foto 32. Labores de templado y grapado



Foto 33. Labores de templado y grapado

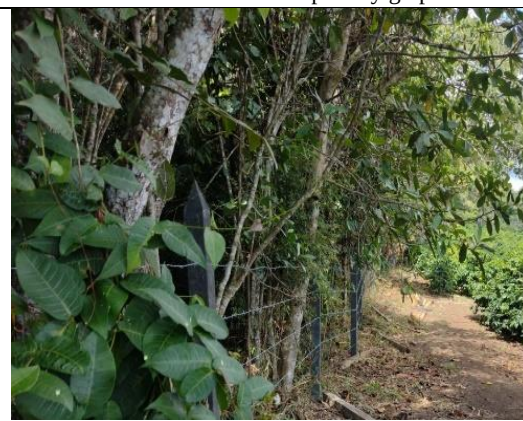


Foto 34. Aislamiento finalizado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 35. Aislamiento finalizado



Foto 36. Madrina y pie de amigo



Foto 37. Aislamiento finalizado

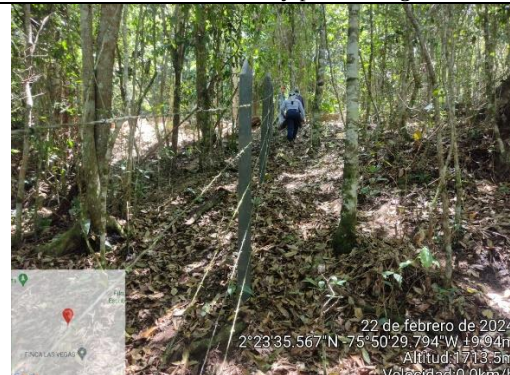


Foto 38. Aislamiento finalizado

MUNICIPIO DE PAICOL

VEREDA SANTA INÉS HUMEDAL SANTA INÉS (500 ML)



Foto 39. Labores de hincado de postes



Foto 40. Hincado de postería

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---



Foto 41. Madrina y pie de amigo en poste de madera



Foto 42. Labores de hincado



Foto 43. Línea con postes hincados



Foto 44. Hincado de postes



Foto 45. Templado y grapado de alambre



Foto 46. Aislamiento terminado

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO (800 ML)



Foto 47. Labores de hincado



Foto 48. Hincado de postes



Foto 49. Labores de templado y grapado



Foto 50. Grapado de alambre



Foto 51. Aislamiento finalizado



Foto 52. Aislamiento terminado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 53. Aislamiento terminado



Foto 54. Cerco en alambre de púa

 VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO RNSC LOS POMOS (400 ML)



Foto 55. Labores de limpia



Foto 56. Ahoyado con 50 cm



Foto 57. Labores de ahoyado



Foto 58. Ahoyado para postes

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 59. Hincado de postes



Foto 60. Hincado de postes

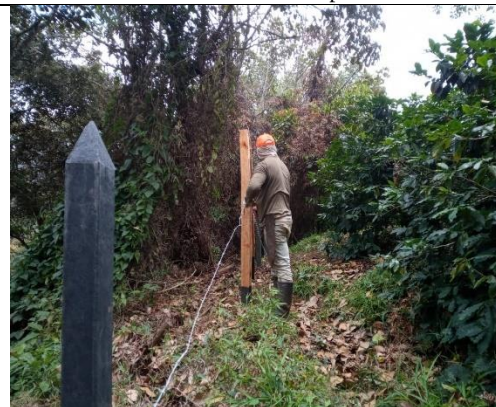


Foto 61. Tendido de alambre de púa



Foto 62. Templado y grapado de alambre



Foto 63. Aislamiento con sus 4 líneas de alambre



Foto 64. Aislamiento terminado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC PEDREGAL (1000 ML)



Foto 65. Labores de ahoyado



Foto 66. Ahoyado de 50 cm



Foto 67. Línea con hincado de postes



Foto 68. Hincado de postes



Foto 69. Labores de templado y grapado



Foto 70. Alambre grapado

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC LOTE RURAL (200 ML)

 <p align="center">Foto 71. Hoyos de 50 cm</p>	 <p align="center">Foto 72. Labores de ahoyado</p>
 <p align="center">Foto 73. Hoyos para hincado de postes</p>	 <p align="center">Foto 74. Hincado de postes</p>
 <p align="center">Foto 75. Labores de templado y grapado</p>	 <p align="center">Foto 76. Verificación del aislamiento</p>

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	--	---

VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC VERSALLES (400 ML)



Foto 77. Verificación de metraje con interventoría



Foto 78. Verificación del metraje

VEREDA LA LAJA PREDIO RNSC CERRITOS (600 ML)



Foto 79. Visita diagnóstica



Foto 80. Visita predio RNSC Cerritos

MUNICIPIO DE BARAYA

VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 1 (212 ML)



Foto 81. Labores de ahoyado



Foto 82. Labores de hincado



Foto 83. Línea para hincado de postes



Foto 84. Labores de hincado



Foto 85. Labores de templado y grapado



Foto 86. Labores de grapado de alambre



Foto 87. Templado y grapado de alambre



Foto 88. Aislamiento terminado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 2 (160 ML)



Foto 89. Ahoyado de 50 cm de profundidad



Foto 90. Labores de ahoyado



Foto 91. Ahoyado para postes



Foto 92. Labores de hincado

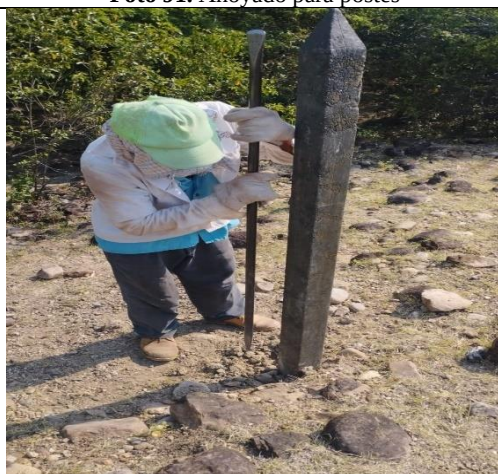


Foto 93. Labores de hincado de postes



Foto 94. Línea de hincado de postes

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 95. Labores de templado de alambre



Foto 96. Templado y grapado de alambre



Foto 97. Aislamiento de postes



Foto 98. Labores de templado y grapado

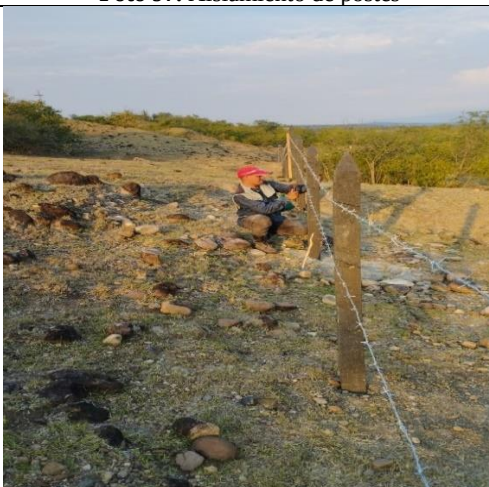


Foto 99. Templado y grapado de alambre de púa



Foto 100. Aislamiento terminado con 4 líneas de alambre

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	---	---

MUNICIPIO DE PITALITO

VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO (2000 ML)



Foto 101. Transporte de postes



Foto 102. Transporte de insumos



Foto 103. Labores de ahoyado



Foto 104. Hincado de postes



Foto 105. Hincado de postes



Foto 106. Labores de hincado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---



Foto 107. Labores de ahoyado



Foto 108. Postes hincados



Foto 109. Labores de regado de alambre



Foto 110. Templado y grapado de alambre



Foto 111. Aislamiento finalizado



Foto 112. Aislamiento finalizado

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS NIT 800082101-9</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
--	---	---

VEREDA CHARGUAYACO PREDIO RNSC EL RECREO (800 ML)



Foto 113. Limpia para la línea del aislamiento



Foto 114. Transporte menor de insumos



Foto 115. Labores de ahoyado



Foto 116. Apretado de postes



Foto 117. Labores de hincado de postes



Foto 118. Postes hincados

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

MUNICIPIO DE ISNOS

VEREDA BELLA VISTA PREDIO HUMEDAL LA HUMATA (500 ML)



Foto 119. Ahoyado de 50 cm de profundidad



Foto 120. Labores de ahoyado



Foto 121. Postes Hincados



Foto 122. Madrina y pie de amigo hincados



Foto 123. Labores de hincado de postes



Foto 124. Hincado de postes

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---



Foto 125. Tendido y grapado de alambre



Foto 126. Labores de grapado



Foto 127. Aislamiento finalizado



Foto 128. Aislamiento finalizado



Foto 129. Aislamiento finalizado



Foto 130. Cerco terminado

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO No. 0423</p>	
---	--	---

9. CONCLUSIONES

- Se han adelantado actividades satisfactoriamente y se realizó la ejecución total de algunos aislamientos levantando actas de entrega a satisfacción por parte de los propietarios.

ACTA No.8

CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM
KATHERINE ARENAS (KA) - Profesional SGA CAM
LESLYE MUÑOZ (LM) - Profesional SGA CAM
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría
GEMBER CARDOZO CRUZ (GC) - RL Contratista de Obra
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra
ARIEL ALBEIRO ARIAS (AA) - Técnico campo Contratista de Obra

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto
Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

CQ inicia informando sobre los puntos a tratar conforme a lo que se ha ejecutado a la fecha y a las situaciones que se han presentado durante el desarrollo de las actividades, con el fin dar trámite a lo que haya lugar, tales como: 1) Actividad de siembra en el Resguardo Huila Río Negro en el municipio de Iquira, 2) Acta de aprobación de la Gobernación por el cambio de predios, 3) Mano de obra para las actividades en el municipio de Neiva, 4) Aprovechamiento forestal.

CQ manifiesta que con respecto al punto 1, las especificaciones del contrato son claras en cuanto a las áreas de siembra y que el aislamiento establecido para esta actividad debe corresponder a la protección de las áreas nuevas o intervenidas; sin embargo, con la situación presentada de no tener la precisión del espacio suficiente para culminar la siembra de las 6 Ha y el manejo que le ha dado la comunidad del Resguardo a las áreas de reforestación y utilización para cultivos, solicita a KA apoyo para mediar con la comunidad, con el fin de garantizar la totalidad de la siembra. Una vez solucionado el tema de disponibilidad de áreas se revisará lo correspondiente al aislamiento.

KA inicia presentando a LM, quien será de ahora en adelante la Supervisora del convenio existente entre la CAM y la Gobernación del Huila, aclarando que KA seguirá como apoyo al mismo; con respecto a lo informado por el CQ, manifiesta que establecerá comunicación con el Consejero de la comunidad, para dar pronta solución y que el contratista pueda culminar la siembra, ya que es conocido por la Entidad que el Resguardo si cuenta con el espacio necesario para ejecutarla.

GC manifiesta que como contratista está en la disposición de ejecutar la totalidad de la actividad en el Resguardo; además, en brindar los soportes que garanticen su correcta ejecución y conforme a los acuerdos establecidos entre la comunidad y la Entidad.

En complemento a lo manifestado por GC, IC informa que la comunidad puede garantizar mediante acta las condiciones encontradas en el predio, las cuales obligaban a darle manejo a la ubicación y distribución tanto del material vegetal como del aislamiento requerido.

Con respecto al punto 2, CQ solicita a KA y LM información sobre el estado en que se encuentra el trámite ante la Gobernación para la aprobación de los predios que requirieron cambio (Acevedo, Santa María, El Pital, Paicol y Elías).

KA informa que se reunieron con la Gobernación para definir el acta de aprobación para cada cambio establecido; además, que se encuentran en los últimos trámites para generar los certificados de tradición y libertad de los predios adquiridos para el municipio de Santa María y conforme a eso realizar la distribución de las 24 ha en dichos predios. A más tardar el día 20 de febrero de los corrientes, se estaría firmando el acta para proceder con el trámite respectivo ante la CAM. Para el caso de Elías, teniendo en cuenta que en el comité anterior se manifestó la decisión de no ejecutar la actividad de los 200 ml de aislamiento, por no existir un predio público donde se pudiera ejecutar la inversión que corresponde a humedales, informa que la Alcaldía quedó de confirmar si en un predio que fue adquirido por ellos existe un humedal y conforme a esto la próxima semana se determinaría si se va a ejecutar o no dicho aislamiento.

En cuanto al tema de la mano de obra en el municipio de Neiva, CQ solicita al contratista dar solución a la situación presentada con la comunidad de la zona en mención, en atención que el no inicio de las actividades ha generado que en las últimas semanas se incremente el porcentaje de atraso.

IC manifiesta que la contratación se ha visto afectada debido a que no se ha podido llegar a un acuerdo con Asojuntas para dar inicio a las actividades en el municipio de Neiva; sin embargo, en los últimos días el presidente de la Asociación manifestó que se apartan de la contratación y que esta la realicen directamente con los propietarios y con los presidentes de las juntas de acción comunal; por lo cual, se iniciaron los acercamientos, logrando establecer la contratación para iniciar trabajos en la vereda San Miguel predio Buenavista. Adicionalmente, en la vereda Tuquilla no se ha concertado el inicio de las actividades por peticiones sobre cambios de especificación de los postes por parte del presidente y por la situación de seguridad y orden público que dificulta el acceso.

JC aclara que en los predios que se presenten condiciones que dificulten la ejecución las actividades y que pongan en riesgo la seguridad del personal involucrado, se debe presentar la correspondiente justificación, para gestionar los posibles cambios de predios o no realización de la actividad, y poder responder a posibles cambios en el contrato.

ACTA No.8
CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Como último punto de los temas CQ reitera al contratista de obra la oportuna entrega y gestión de los permisos de aprovechamiento forestal; a lo que IC informa que realizarán la entrega de los documentos correspondientes, resaltando que a la fecha no se han realizado cortes in situ, ya que el material se está adquiriendo de una planta ubicada en el municipio de La Plata, que cuenta con la documentación solicitada.

Conforme a las condiciones manifestadas en la presente reunión, las cuales han incidido negativamente en la programación, solicita al contratista conforme a las definiciones y soluciones aquí planteadas, una reprogramación de las actividades que incluya la utilización y distribución de mano de obra y materiales en los sitios faltantes, el cual garantice la culminación de las mismas en el plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega Acta de modificación Convenio Gobernación	KA - LM	20/02/2024
Resultado conversación Consejero y comunidad Iquira	KA - LM	20/02/2024
Reprogramación de obra	Contratista de obra	19/02/2024
Permisos de aprovechamiento forestal	Contratista de obra	19/02/2024

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA					POR DEFINIR	☒
	DÍA		MES	AÑO		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	432770626		9462594565	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCO POPULAR	\$4,042,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						\$15,286,000	\$2,445,900			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$372,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: NIVEL 3 (10 Afiliados)						\$15,286,000	\$2,445,900			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$372,500		\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)						\$15,286,000	\$2,445,900			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$372,500		\$0	\$0
1	CC	93382899	ARIAS ARIEL	231001	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS037	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
2	CC	5996146	ARIAS OSCAR	230301	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS005	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
3	CC	93374732	CARDOZO GEMBER	25-14	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS005	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
4	CC	93371376	CARDOZO JACID	230301	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS037	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
5	CC	1110582681	CARDOZO NICOLAS	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF50	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$39,000	30	\$0	\$0
6	CC	1083917582	CASTRO FERNEY	230301	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS041	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
7	CC	93359578	DEVIA RAMIRO	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF50	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$39,000	30	\$0	\$0
8	CC	93393748	MURILLO JOHN	25-14	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS005	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
9	CC	28555791	ROJAS ISABEL	230201	30	\$1,498,000	\$239,700	EPS037	30	\$1,498,000	\$60,000	CCF50	30	\$1,498,000	\$60,000	14-23	30	\$1,498,000	\$36,500	30	\$0	\$0
10	CC	2236682	SAAVEDRA ANDRES	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF50	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$39,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(10)						\$15,286,000	\$2,445,900			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$612,000			\$15,286,000	\$372,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	432770626	9462594565	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCO POPULAR	0	\$4,042,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$2,445,900	\$0	\$0	\$2,445,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$239,700	\$0	\$0	\$239,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$735,400	\$0	\$0	\$735,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,231,100	\$0	\$0	\$1,231,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$239,700	\$0	\$0	\$239,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$372,500	\$0	\$0	\$372,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	\$372,500	\$0	\$0	\$372,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$612,000	\$0	\$0	\$612,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$612,000	\$0	\$0	\$612,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$612,000	\$0	\$0	\$612,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$372,000	\$0	\$0	\$372,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
TOTAL				10	\$4,042,400	\$0	\$0	\$4,042,400	



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: ^{11 02 2024} DD/MM/YYYY

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)



Entrega Parcial



Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devis Galindo	Nombre:	Luisa Irma Ramos Silva
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	26515832
Contratista:	Sofar ing. SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Resguardo indígena Nasa Paez Huila
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda: Caloto Municipio: IQUIRA

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Implementación de 3 has de procesos de restauración activa (siembra de individuos y aislamiento preventivo).



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 11 de Febrero de 20 24

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Luisa Lima Ramo S. CC 26 515.832

No. B. Diego Gutierrez
Inspector Interventoría



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)



Entrega Parcial



Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia	Nombre:	Alejandro Perez R.
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	1003800841
Contratista:	Sofor Ingenieros S de RL	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Pedio donde se realiza la entrega:	Buena vista Vda San Miguel
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio = Neiva

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalacion de 1000 metros lineales hasta la fecha



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	Diodor Alejandro Perez R.

Yo Bo
Inspector Intercombin



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia B.	Nombre:	Cesar Trujillo Cordero
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12'283 927
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Humedal laguna San Andres
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Andres Laplata Huila

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: En la presente acta se reciben 1000ml para un total de la Instalación de 2000 metros lineales de aislamiento en cerco con alambre de púa.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia Golindo	Nombre:	Cesar Trujillo Cedeno

Yo Bo =
Inspector Interventoria



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Jorge E. Ramós
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	1004085116
Contratista:	Sofo Ing. SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Santa Inés Uda Santa Inés.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Parícut N.

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 500 metros lineales de aislamiento con cerco protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	502 86 24mos
Nombre:	Ramiro Devia	Nombre:	502 86 24mos 1004 085 116

Nº 30 Diego Gutierrez
Inspector - Interventoría



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Romero Deva Galdino	Nombre:	Jamir Silva
Número de identificación:	93359573	Número de identificación:	4.920.134
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	San Antonio Uda Alto San Miguel
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Municipio de Paicol

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

En la presente acta se reciben 500 ml para un total de la Instalación de 800 metros lineales de aislamiento con cerco protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Romero Devia Gielindo	Nombre:	Jamit Silva Ceron C.C. 4'920 734

VoB

Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 27/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia B	Nombre:	Javier Cuellar Muñoz
Número de identificación:	93359.578.	Número de identificación:	4920.437. Paicol
Contratista:	Sofo Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio = Los Pinos vda = Alto de San Miguel
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio = Paicol = Huila

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 400 ML de cerco en
Alambre de puer y postes plásticos



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 27 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Romiro Devia G.	Nombre:	Javier Cuellar Murillo 4920437 paicé

Voz Diego Gutierrez R.
Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)



Entrega Parcial



Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia C	Nombre:	Miller Tobre Vargaz.
Número de identificación:	93359.578	Número de identificación:	4919605.
Contratista:	Sofo Ingenieros S.A.S.	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo.	Predio donde se realiza la entrega:	Predio: El Pedregal Vda: El Carmen
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Municipio = Paicol.

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Se realiza la instalación parcial de 750 metros lineales de aislamiento con cerco protector de 1000 metros lineales contractuales.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN



F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia.	Nombre:	MILLER Pobrev

VB Diego Gutierrez
Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 26/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Mirley Chilito Z
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	1079508366
Contratista:	Sojos Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio = Lote Rural Vda = El cammen
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio = Paicol = Huila

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector.



 	<p align="center">ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN</p> <p align="center">F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---


5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 26 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Mirley Chilito Z. cc. 1079508366


Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 26/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Misley Chilito Z
Número de identificación:	93.359.578	Número de identificación:	1079508.366
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnicos de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio: Lote Rural. Vereda: El Carmen
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Pácora Huila.

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 108 metros lineales de aislamiento con cerco protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN



F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 26 de 02 de 2029

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Mirley chilto z. 1079.508.366

VoB. 
Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 28/07/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Mirley Chilito Z
Número de identificación:	933 59 578	Número de identificación:	1079.508.366
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnicos de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio = Versalles Vereda = El Carmen
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Monicorio de Palco Huila

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 292 metros lineales de aislamiento en cerco protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 02 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia Golindo	Nombre:	Mirley Chilto 1079.508 366.

V.B.
Inspector Interventor



ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita:	Febrero 21	Municipio:	Paico	Vereda:	La Cumbre
INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre del Beneficiario y/o propietario:				Cedula o Nit:	
Max Duque Pedorno				4919672	
Dirección:		Teléfono:		Correo electrónico:	
		3144781668			
INFORMACIÓN DEL PREDIO					
Nombre del Predio:		Área Total del Predio:		Coord: X: Y:	
Cerritos					
Asistencia Técnica	Ambiental:	Social:	Productiva:	Otro:	
Tipo de beneficio	(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)				
Objetivo de la Visita: Visita para el diagnóstico del predio Cerritos en la vereda La Cumbre municipio de Paico Huila, en el marco del contrato 0423.					
DESARROLLO DE LA VISITA					
(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)					
Se Realizó visita al predio con el fin de constatar donde se realizaría el aislamiento el cual se realizaría en dos sitios protegiendo una reserva forestal y un nacimiento. Con el fin de construir 600 ml de cerco.					
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:					
Se acordó realizar las actividades directamente por el propietario.					

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.



ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Max Dugue Perdomo.	Nombre de quién realiza la visita: Ramiro Deviza Galindo.
Firma de quién recibe la visita: Max Dugu Perdomo	Firma de quién realiza la visita: Ramiro Deviza Galindo



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: 29/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Lilia Silva Rivera
Número de identificación:	93.359578	Número de identificación:	26.459.865. de Baraya.
Contratista:	Sofoingé, SAS.	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo.	Predio donde se realiza la entrega:	chunche 1 Vda. Espinalbata
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Baraya Huila.

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento en cerco protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Lilia Silva Rivera. ce 26459865 de Bortia

VoBo
Inspector Interventor

  <p><i>¡Cuida tu naturaleza!</i></p>	<p align="center">ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN</p> <p align="center">F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

1. Fecha de entrega: 29/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G	Nombre:	Lilia Silva Rivera
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	26.459.865.
Contratista:	Sofor Ingenieros SA	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnicos de campo	Predio donde se realiza la entrega:	chunche 2. Nda = Espinalota.
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Barraza Huila.

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 160 metros lineales de aislamiento en cerco protector


 	<p align="center">ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN</p> <p align="center">F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---


5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 20 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devora	Nombre:	Lilia Silva Rivera


 Vob Diego Gutierrez
 Inspector Interventor

 	<p align="center">ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN</p> <p align="center">F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

1. Fecha de entrega: 29/02/2024

2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total


3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Lilia Silva Rivera
Número de identificación:	93359.578	Número de identificación:	26.459.865.
Contratista:	Sofor Ingenieros S.A.S.	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio = Chunche 2 - Vda = Espinaloza
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio = Baraya Huila

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 12 metros lineales de aislamiento en cerco Protector.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia	Nombre:	Lilia Silva Rivera

Inspector Interventor



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: **29-02-2024**
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Fernery Danilo Castro	Nombre:	Miller Dario Rodriguez
Número de identificación:	1083917592	Número de identificación:	12.121.916
Contratista:	Sofox Ingenieros SAS	Correo electrónico:	reverdecercalaboyano@gmail.com
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Reserva Natural El Cedro
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio - Pitulito Vereda - El Cedro

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: En la presente acta se reciben 500ml para un total del Aislamiento de 2.000 metros lineales



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN


F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 02 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Miltra Daros Rodríguez

VoBo: 
Inspector Interventora





ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. Fecha de entrega: DD/MM/YYYY 09/02/2024
2. Tipo de novedad: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐

Entrega Parcial

☒

Entrega Total

3. Datos de los responsables de la entrega y recepción:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferny Danilo Castro	Nombre:	Edilberto Ojeda
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	12-171.068
Contratista:	SoFor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Homedal la Umata
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Isnos Vereda Bella Vista

4. Descripción de la obra

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Aislamiento de 500 metros lineales.



ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN

F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

- A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
- B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
- C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
- D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 9 de 2 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	<i>Fernan Danilo C.</i>	Firma:	<i>Edilberto Ojeda</i>
Nombre:	<i>Fernan Danilo Castro.</i>	Nombre:	<i>Edilberto Ojeda</i>

VoBo Interventoria
