



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

ACTA DE COBRO N° 04

**PERIODO: DEL 26 DE ENERO DEL 2024 AL 26 DE
FEBRERO DE 2024**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
RAMA JUDICIAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

1. OFICIO DE RADICACION

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Bogotá D.C, 20 de marzo de 2024

TOTALL-112-RJ-059

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

Arq. Daniel Merchán

División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co

Tel: 310 852 5132

Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”.

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 04

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y trámite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 03 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
 1. Plan de Calidad
 2. PGAS
 3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,

Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

2. LISTA DE CHEQUEO

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTAL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	4

LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS				
	CORTE DE INTERVENTORIA 4	CUMPLE	NO APLICA	Pg o Archivo
1*	Oficio de radicación Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	CUMPLE		
2*	Formato Lista de chequeo. Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	CUMPLE		
3*	Balance Financiero del Contrato de Interventoría. Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	CUMPLE		
4*	Cumplido técnico contrato de Interventoría. Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplimiento será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		N/A	
5*	Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	CUMPLE		
6*	Acta parcial de pago de Interventoría	CUMPLE		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra \$ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría \$ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	Acta de entrega y recibo final de obra Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		N/A	
8*	Factura de Venta Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, deberá cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	CUMPLE		
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de Documento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	Anexos a la factura Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	CUMPLE		
10*	Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	CUMPLE		
a	Para Empresa: Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	CUMPLE		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTAL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	4

LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS				
CORTE DE INTERVENTORIA 4		CUMPLE	NO APLICA	Pg o Archivo
b	Para personas naturales: liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	Planillas de pago Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	CUMPLE		
12*	Personal en condición de discapacidad Certificado del personal en condición de discapacidad		N/A	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	CUMPLE		
14	Informe de Interventoría. Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	CUMPLE		
15	Certificación entrada a almacén Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

: 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

CONSULTOR INTERVENTORIA

: TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL

: \$222.158.720,00

ADICIONAL EN VALOR No. 1

: \$111.079.360,00

VALOR TOTAL

: \$333.238.080,00

FECHA DE INICIO

: 26-oct-23

ADICIÓN EN PLAZO No. 1

: Cincuenta y cinco (55) días calendario

ADICIÓN EN PLAZO No. 2

: Sesenta (60) días calendario

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

: 24-abr-24

PERIODO DEL CORTE

: 26 ENERO DE 2024 - 26 FEBRERO DE 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO	0%	0%	100%	SALDO POR EJECUTAR
				ANTICIPO AMORTIZADO 0%	VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR	VALOR FACTURAS A PAGAR	
ANTICIPO (Fact. No.)					\$0,00	\$0,00	\$333.238.080,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No. 9)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	\$16.807.550,46	\$0,00	\$0,00	\$16.807.550,46	\$316.430.529,54
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No.)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	\$22.372.203,87	\$0,00	\$0,00	\$22.372.203,87	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No.)	28 diciembre - 26 enero 2024	OBRA	\$34.023.212,80	\$0,00	\$0,00	\$34.023.212,80	\$260.035.112,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)	26 enero 2024 - 26 febrero 2024	OBRA	\$30.708.152,82	\$0,00	\$0,00	\$30.708.152,82	\$229.326.960,05
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$229.326.960,05
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$229.326.960,05
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$229.326.960,05
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$229.326.960,05
TOTALES			\$103.911.119,95		\$0,00	\$103.911.119,95	\$229.326.960,05
SALDO POR EJECUTAR			\$229.326.960,05				

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	FECHA	VALOR PAGADO		VALOR CORTE POR PAGAR	SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR
ANTICIPO (Fact. No.)	OBRA		\$0,00		\$0,00	\$333.238.080,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No. 9)	OBRA	18/01/2024	\$16.807.550,46		\$0,00	\$316.430.529,54
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No.)	OBRA	8/02/2024	\$22.372.203,87		\$0,00	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No.)	OBRA		\$0,00		\$34.023.212,80	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)	OBRA		\$0,00		\$30.708.152,82	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00		\$0,00	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00		\$0,00	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00		\$0,00	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00		\$0,00	\$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº ____ (Fact. No.)			\$0,00		\$0,00	\$294.058.325,67
TOTALES			\$39.179.754,33		\$64.731.365,62	\$294.058.325,67
SALDO POR PAGAR			\$294.058.325,67			
VALOR A LIBERAR			\$0,00			


FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

DANIEL MERCHAN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcio125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcio125interventoria@gmail.com

 <p>CONSORCIO LOCATIVO</p>	<p>Contrato de Obra 088 de 2023 Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial</p>
---	---

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°4

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJ "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024 No.4		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5															
ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.															
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2	1,00	\$ 4.522,00	\$ 4.522,00	-	-1,00	\$ 4.522,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.2	Cerramiento provisional en polsombra. Incluye puertas y accesorios	ML	1,00	\$ 19.137,00	\$ 19.137,00	-	-1,00	\$ 19.137,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.3	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - Teja de zinc h=2,15m. (Incluye	ML	1,00	\$ 143.744,00	\$ 143.744,00	-	-1,00	\$ 143.744,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.4	Cerramiento provisional h=2,14 M. Tipo Aceso o similar. (Incluye puertas y	ML	1,00	\$ 60.994,00	\$ 60.994,00	-	-1,00	\$ 60.994,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon	M2	1,00	\$ 13.171,00	\$ 13.171,00	-	-1,00	\$ 13.171,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 38.943,00	\$ 38.943,00	-	-1,00	\$ 38.943,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.121,00	\$ 14.121,00	-	-1,00	\$ 14.121,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.956,00	\$ 12.956,00	+	8,00	\$ 103.648,00	\$ 0,00	9,00	\$ 116.604,00	9,00	\$ 116.604,00		
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 16.392,00	\$ 16.392,00	-	-1,00	\$ 16.392,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.10	Desmonte de tanque elevado. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 91.901,00	\$ 91.901,00	-	-1,00	\$ 91.901,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	\$ 15.954,00	\$ 15.954,00	-	-1,00	\$ 15.954,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	\$ 18.314,00	\$ 18.314,00	+	2,00	\$ 36.628,00	\$ 0,00	3,00	\$ 54.942,00	3,00	\$ 54.942,00		
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes,	M2	1,00	\$ 13.380,00	\$ 13.380,00	-	-1,00	\$ 13.380,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 10.934,00	\$ 10.934,00	-	-1,00	\$ 10.934,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 8.090,00	\$ 8.090,00	+	13,00	\$ 105.170,00	\$ 0,00	14,00	\$ 113.260,00	14,00	\$ 113.260,00		
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 14.438,00	\$ 14.438,00	-	-1,00	\$ 14.438,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 21.828,00	\$ 21.828,00	-	-1,00	\$ 21.828,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML	1,00	\$ 3.686,00	\$ 3.686,00	+	46,12	\$ 169.998,32	\$ 0,00	47,12	\$ 173.684,32	47,12	\$ 173.684,32		
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	\$ 6.103,00	\$ 6.103,00	+	7,16	\$ 43.697,48	\$ 0,00	8,16	\$ 49.800,48	8,16	\$ 49.800,48		
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 10.997,00	\$ 10.997,00	+	11,00	\$ 120.967,00	\$ 0,00	12,00	\$ 131.964,00	12,00	\$ 131.964,00		
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta.	ML	1,00	\$ 2.749,00	\$ 2.749,00	+	15,00	\$ 41.235,00	\$ 0,00	16,00	\$ 43.984,00	16,00	\$ 43.984,00		
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN	1,00	\$ 105.138,00	\$ 105.138,00	-	-1,00	\$ 105.138,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN	1,00	\$ 14.145,00	\$ 14.145,00	-	-1,00	\$ 14.145,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML	1,00	\$ 19.537,00	\$ 19.537,00	-	-1,00	\$ 19.537,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.913,00	\$ 14.913,00	-	-1,00	\$ 14.913,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 289.093,00	\$ 289.093,00	-	-1,00	\$ 289.093,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML	1,00	\$ 30.082,00	\$ 30.082,00	-	-1,00	\$ 30.082,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML	1,00	\$ 188.831,00	\$ 188.831,00	-	-1,00	\$ 188.831,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 18.106,00	\$ 18.106,00	-	-1,00	\$ 18.106,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2	1,00	\$ 4.053,00	\$ 4.053,00	-	-1,00	\$ 4.053,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 37.009,00	\$ 37.009,00	-	-1,00	\$ 37.009,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML	1,00	\$ 8.173,00	\$ 8.173,00	-	-1,00	\$ 8.173,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 11.318,00	\$ 11.318,00	-	-1,00	\$ 11.318,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 11.601,00	\$ 11.601,00	-	-1,00	\$ 11.601,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJ "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024 No.4		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72. Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO						OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA						PRESENTE ACTA N°4					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
1.35	Demolición afinado de pisos e=+5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 5.669,00	\$ 5.669,00	-	-1,00	\$ 5.669,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00	+	84,29	\$ 893.474,00		\$ 0,00	85,29	\$ 904.074,00	85,29	\$ 904.074,00	85,29	\$ 904.074,00	
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 12.152,00	\$ 12.152,00	-	-1,00	\$ 12.152,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 12.703,00	\$ 12.703,00	-	-1,00	\$ 12.703,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.39	Demolición de adoquín. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	1,00	\$ 12.053,00	\$ 12.053,00	-	-1,00	\$ 12.053,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 5.513,00	\$ 5.513,00	+	44,35	\$ 244.501,55		\$ 0,00	45,35	\$ 250.014,55	45,35	\$ 250.014,55	45,35	\$ 250.014,55	
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	\$ 6.487,00	\$ 6.487,00	-	-1,00	\$ 6.487,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 19.241,00	\$ 19.241,00	-	-1,00	\$ 19.241,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 40.606,00	\$ 40.606,00	-	-1,00	\$ 40.606,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 72.398,00	\$ 72.398,00	-	-1,00	\$ 72.398,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	\$ 15.067,00	\$ 15.067,00	-	-1,00	\$ 15.067,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	\$ 14.170,00	\$ 14.170,00	+	42,73	\$ 605.484,10		\$ 0,00	43,73	\$ 619.654,10	43,73	\$ 619.654,10	43,73	\$ 619.654,10	
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 24.395,00	\$ 24.395,00	-	-1,00	\$ 24.395,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN	1,00	\$ 35.237,00	\$ 35.237,00	-	-1,00	\$ 35.237,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 59.197,00	\$ 59.197,00	-	-1,00	\$ 59.197,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML	1,00	\$ 23.322,00	\$ 23.322,00	-	-1,00	\$ 23.322,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición	M3	1,00	\$ 336.257,00	\$ 336.257,00	-	-1,00	\$ 336.257,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 54.128,00	\$ 54.128,00	-	-1,00	\$ 54.128,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 28.687,00	\$ 28.687,00	-	-1,00	\$ 28.687,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 29.343,00	\$ 29.343,00	-	-1,00	\$ 29.343,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 66.596,00	\$ 66.596,00	-	-1,00	\$ 66.596,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 23.443,00	\$ 23.443,00	-	-1,00	\$ 23.443,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 36.170,00	\$ 36.170,00	-	-1,00	\$ 36.170,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 30.862,00	\$ 30.862,00	-	-1,00	\$ 30.862,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 48.952,00	\$ 48.952,00	-	-1,00	\$ 48.952,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	\$ 82.887,00	\$ 82.887,00	-	-1,00	\$ 82.887,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	\$ 213.385,00	\$ 213.385,00	-	-1,00	\$ 213.385,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	\$ 129.405,00	\$ 129.405,00	-	-1,00	\$ 129.405,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN	1,00	\$ 14.475,00	\$ 14.475,00	-	-1,00	\$ 14.475,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrespo.	UN	1,00	\$ 234.377,00	\$ 234.377,00	-	-1,00	\$ 234.377,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 3.997,00	\$ 3.997,00	-	-1,00	\$ 3.997,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.219,00	\$ 12.219,00	-	-1,00	\$ 12.219,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	\$ 30.023,00	\$ 30.023,00	-	-1,00	\$ 30.023,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0.20 m. (Incluye trasiego, equipos	M3	1,00	\$ 68.696,00	\$ 68.696,00	-	-1,00	\$ 68.696,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego,	M2	1,00	\$ 96.509,00	\$ 96.509,00	-	-1,00	\$ 96.509,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 1 : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA								
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(÷/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)			
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	\$ 111.831,00	\$ 111.831,00	-	-1,00	\$ 111.831,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	\$ 116.987,00	\$ 116.987,00	-	-1,00	\$ 116.987,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	1,00	\$ 20.643,00	\$ 20.643,00	-	-1,00	\$ 20.643,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	1,00	\$ 15.407,00	\$ 15.407,00	-	-1,00	\$ 15.407,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.3	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	1,00	\$ 442.051,00	\$ 442.051,00	-	-1,00	\$ 442.051,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	\$ 721.408,00	\$ 721.408,00	-	-1,00	\$ 721.408,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	1,00	\$ 36.099,00	\$ 36.099,00	-	-1,00	\$ 36.099,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17,5MPa (2500 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	\$ 237.345,00	\$ 237.345,00	-	-1,00	\$ 237.345,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	\$ 685.272,00	\$ 685.272,00	-	-1,00	\$ 685.272,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3	1,00	\$ 721.903,00	\$ 721.903,00	-	-1,00	\$ 721.903,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	\$ 865.466,00	\$ 865.466,00	-	-1,00	\$ 865.466,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.10	Viga canal en concreto 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M3	1,00	\$ 931.749,00	\$ 931.749,00	-	-1,00	\$ 931.749,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.11	Viga cinta en concreto h=0,05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	\$ 46.083,00	\$ 46.083,00	-	-1,00	\$ 46.083,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.12	Viga cinta en concreto h=0,10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	\$ 46.032,00	\$ 46.032,00	-	-1,00	\$ 46.032,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 81.230,00	\$ 81.230,00	-	-1,00	\$ 81.230,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 95.266,00	\$ 95.266,00	-	-1,00	\$ 95.266,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 111.713,00	\$ 111.713,00	-	-1,00	\$ 111.713,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 186.508,00	\$ 186.508,00	-	-1,00	\$ 186.508,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 203.704,00	\$ 203.704,00	-	-1,00	\$ 203.704,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalosa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI.	M2	1,00	\$ 158.175,00	\$ 158.175,00	-	-1,00	\$ 158.175,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 49.703,00	\$ 49.703,00	-	-1,00	\$ 49.703,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	\$ 953.125,00	\$ 953.125,00	-	-1,00	\$ 953.125,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.	REFUERZOS Y ANCLAJES		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalación)	KG	1,00	\$ 3.677,00	\$ 3.677,00	-	-1,00	\$ 3.677,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalación)	KG	1,00	\$ 4.474,00	\$ 4.474,00	-	-1,00	\$ 4.474,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.3	Gratifi de acero de refuerzo. (Suministro e intalación)	KG	1,00	\$ 2.903,00	\$ 2.903,00	-	-1,00	\$ 2.903,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1,00	\$ 4.748,00	\$ 4.748,00	-	-1,00	\$ 4.748,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.5	Anclaje epóxico 1/2" Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 15.053,00	\$ 15.053,00	-	-1,00	\$ 15.053,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.6	Anclaje epóxico 3/8" Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 11.551,00	\$ 11.551,00	-	-1,00	\$ 11.551,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.7	Anclaje epóxico 3/4" Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 21.451,00	\$ 21.451,00	-	-1,00	\$ 21.451,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.8	Anclaje epóxico 5/8" Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 15.247,00	\$ 15.247,00	-	-1,00	\$ 15.247,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 31.613,00	\$ 31.613,00	-	-1,00	\$ 31.613,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.	MAMPOSTERIA		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 92.751,00	\$ 92.751,00	-	-1,00	\$ 92.751,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h=50cm. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 56.313,00	\$ 56.313,00	-	-1,00	\$ 56.313,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	\$ 43.848,00	\$ 43.848,00	-	-1,00	\$ 43.848,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.4	Muro en bloque No.4. h=50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	\$ 27.354,00	\$ 27.354,00	-	-1,00	\$ 27.354,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	\$ 46.480,00	\$ 46.480,00	-	-1,00	\$ 46.480,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			

<div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div>		<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div> <div>ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4PERIODO MES / AÑOfeb-24FECHA:26/02/2024</div>			
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT:901744095-0</div> <div>DIRECCIÓNCL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO313837687</div>		<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00</div>		<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días</div> <div>PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. :</div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. :</div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024</div>	
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div>		<div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>			


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
5.6	Muro en bloque No.5. h=50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	\$ 28.304,00	\$ 28.304,00	-	-1,00	\$ 28.304,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e	M2	1,00	\$ 131.339,00	\$ 131.339,00	-	-1,00	\$ 131.339,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 141.452,00	\$ 141.452,00	-	-1,00	\$ 141.452,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 42.207,00	\$ 42.207,00	-	-1,00	\$ 42.207,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 49.136,00	\$ 49.136,00	-	-1,00	\$ 49.136,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 68.983,00	\$ 68.983,00	-	-1,00	\$ 68.983,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 80.410,00	\$ 80.410,00	-	-1,00	\$ 80.410,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.13	Alfaja en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes requeridos)	ML	1,00	\$ 45.815,00	\$ 45.815,00	-	-1,00	\$ 45.815,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.14	Alfaja en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo,	ML	1,00	\$ 49.403,00	\$ 49.403,00	-	-1,00	\$ 49.403,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación,	UN	1,00	\$ 335.619,00	\$ 335.619,00	-	-1,00	\$ 335.619,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	1,00	\$ 316,00	\$ 316,00	-	-1,00	\$ 316,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería,	M2	1,00	\$ 86.845,00	\$ 86.845,00	+	7,06	\$ 613.125,70		\$ 0,00	8,06	\$ 699.970,70	8,06	\$ 699.970,70
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho=50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 56.445,00	\$ 56.445,00	-	-1,00	\$ 56.445,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1,00	\$ 48.003,00	\$ 48.003,00	-	-1,00	\$ 48.003,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería, malla, cinta papel, cinta metálica	M2	1,00	\$ 89.843,00	\$ 89.843,00	-	-1,00	\$ 89.843,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería, malla, cinta papel, cinta metálica	ML	1,00	\$ 67.096,00	\$ 67.096,00	-	-1,00	\$ 67.096,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería, malla, cinta papel, cinta	ML	1,00	\$ 80.220,00	\$ 80.220,00	-	-1,00	\$ 80.220,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 14.539,00	\$ 14.539,00	-	-1,00	\$ 14.539,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 33.808,00	\$ 33.808,00	+	86,33	\$ 2.918.644,64	87,33	\$ 2.952.452,64	0,00	\$ 0,00	87,33	\$ 2.952.452,64
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 17.758,00	\$ 17.758,00	-	-1,00	\$ 17.758,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 18.751,00	\$ 18.751,00	-	-1,00	\$ 18.751,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 25.035,00	\$ 25.035,00	-	-1,00	\$ 25.035,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 47.467,00	\$ 47.467,00	-	-1,00	\$ 47.467,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado, e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 65.462,00	\$ 65.462,00	-	-1,00	\$ 65.462,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 144.833,00	\$ 144.833,00	-	-1,00	\$ 144.833,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobado, e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 78.260,00	\$ 78.260,00	-	-1,00	\$ 78.260,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones, fundida, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 77.094,00	\$ 77.094,00	-	-1,00	\$ 77.094,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (líquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de	M2	1,00	\$ 41.962,00	\$ 41.962,00	-	-1,00	\$ 41.962,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 1 : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente y requeridos).	M2	1,00	\$ 77.301,00	\$ 77.301,00	-	-1,00	\$ 77.301,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.	PAÑETES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 23.665,00	\$ 23.665,00	-	-1,00	\$ 23.665,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 21.519,00	\$ 21.519,00	-	-1,00	\$ 21.519,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 27.895,00	\$ 27.895,00	-	-1,00	\$ 27.895,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 24.268,00	\$ 24.268,00	-	-1,00	\$ 24.268,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 14.824,00	\$ 14.824,00	-	-1,00	\$ 14.824,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 23.016,00	\$ 23.016,00	-	-1,00	\$ 23.016,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 17.072,00	\$ 17.072,00	-	-1,00	\$ 17.072,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.736,00	\$ 22.736,00	-	-1,00	\$ 22.736,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.651,00	\$ 22.651,00	-	-1,00	\$ 22.651,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.284,00	\$ 22.284,00	-	-1,00	\$ 22.284,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 21.198,00	\$ 21.198,00	-	-1,00	\$ 21.198,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.12	Impermeabilización de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2	1,00	\$ 22.656,00	\$ 22.656,00	-	-1,00	\$ 22.656,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 12.297,00	\$ 12.297,00	-	-1,00	\$ 12.297,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 15.819,00	\$ 15.819,00	-	-1,00	\$ 15.819,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 9.259,00	\$ 9.259,00	-	-1,00	\$ 9.259,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.	CIELO RASOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta, panel, pintura).	M2	1,00	\$ 85.805,00	\$ 85.805,00	-	-1,00	\$ 85.805,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta, panel, pintura)	M2	1,00	\$ 68.281,00	\$ 68.281,00	-	-1,00	\$ 68.281,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Houriter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, accesorios)	M2	1,00	\$ 80.151,00	\$ 80.151,00	-	-1,00	\$ 80.151,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 13.148,00	\$ 13.148,00	-	-1,00	\$ 13.148,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.5	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 53.557,00	\$ 53.557,00	-	-1,00	\$ 53.557,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilera, refuerzos, marco, tapa, requeridos)	UN	1,00	\$ 231.570,00	\$ 231.570,00	-	-1,00	\$ 231.570,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.	ESTUCCO Y PINTURA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 6.566,00	\$ 6.566,00	+	59,06	\$ 387.787,96		\$ 0,00	60,06	\$ 394.353,96	60,06	\$ 394.353,96	
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 10.648,00	\$ 10.648,00	-	-1,00	\$ 10.648,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 15.967,00	\$ 15.967,00	-	-1,00	\$ 15.967,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 15.209,00	\$ 15.209,00	+	112,58	\$ 1.712.229,22		\$ 0,00	113,58	\$ 1.727.438,22	113,58	\$ 1.727.438,22	
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 10.887,00	\$ 10.887,00	+	85,62	\$ 932.144,94		\$ 0,00	86,62	\$ 943.031,94	86,62	\$ 943.031,94	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 26.291,00	\$ 26.291,00	-	-1,00	\$ 26.291,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 18.160,00	\$ 18.160,00	-	-1,00	\$ 18.160,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 20.094,00	\$ 20.094,00	-	-1,00	\$ 20.094,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO	ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)		
10.9	Pintura esmalte lámina lisa. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 14.859,00	\$ 14.859,00	-	-1,00	\$ 14.859,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.447,00	\$ 8.447,00	-	-1,00	\$ 8.447,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina lisa. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 8.588,00	\$ 8.588,00	-	-1,00	\$ 8.588,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.402,00	\$ 8.402,00	-	-1,00	\$ 8.402,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.13	Pintura esmalte madera lisa. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 14.430,00	\$ 14.430,00	-	-1,00	\$ 14.430,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.512,00	\$ 8.512,00	-	-1,00	\$ 8.512,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye equipos, pintura de todos los elementos metálicos a la vista)	M2	1,00	\$ 20.409,00	\$ 20.409,00	-	-1,00	\$ 20.409,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. (Incluye equipos, pintura de todos los elementos metálicos a la vista)	ML	1,00	\$ 17.917,00	\$ 17.917,00	-	-1,00	\$ 17.917,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
10.17	Pintura de guardaesoba en esmalte negro.	ML	1,00	\$ 11.264,00	\$ 11.264,00	-	-1,00	\$ 11.264,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulido, cristalizado y brillado)	M2	1,00	\$ 112.056,00	\$ 112.056,00	-	-1,00	\$ 112.056,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulido, cristalizado y brillado)	M2	1,00	\$ 126.851,00	\$ 126.851,00	-	-1,00	\$ 126.851,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulido, cristalizado y brillado necesarios)	M2	1,00	\$ 195.687,00	\$ 195.687,00	-	-1,00	\$ 195.687,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.4	Pulido y brillado de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulido, bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado,	M2	1,00	\$ 20.733,00	\$ 20.733,00	-	-1,00	\$ 20.733,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado,	ML	1,00	\$ 43.663,00	\$ 43.663,00	-	-1,00	\$ 43.663,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos,	ML	1,00	\$ 46.157,00	\$ 46.157,00	-	-1,00	\$ 46.157,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.7	Guardaesoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 22.461,00	\$ 22.461,00	-	-1,00	\$ 22.461,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.8	Guardaesoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 98.137,00	\$ 98.137,00	-	-1,00	\$ 98.137,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.9	Gravilla lavada para bocapueras o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 28.395,00	\$ 28.395,00	-	-1,00	\$ 28.395,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 47.594,00	\$ 47.594,00	-	-1,00	\$ 47.594,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 70.916,00	\$ 70.916,00	-	-1,00	\$ 70.916,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33.8x33.8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 71.823,00	\$ 71.823,00	-	-1,00	\$ 71.823,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.13	Guardaesoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 19.231,00	\$ 19.231,00	-	-1,00	\$ 19.231,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2	1,00	\$ 97.561,00	\$ 97.561,00	-	-1,00	\$ 97.561,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.15	Guardaesoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 25.755,00	\$ 25.755,00	+	44,23	\$ 1.139.143,65	45,23	\$ 1.164.898,65	0,00	\$ 0,00	45,23	\$ 1.164.898,65		
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 109.502,00	\$ 109.502,00	-	-1,00	\$ 109.502,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2	1,00	\$ 133.911,00	\$ 133.911,00	-	-1,00	\$ 133.911,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno	M2	1,00	\$ 146.671,00	\$ 146.671,00	-	-1,00	\$ 146.671,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.19	Piso en madera liston mñ amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	\$ 81.907,00	\$ 81.907,00	-	-1,00	\$ 81.907,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.20	Piso en madera liston mñ guayacan. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	\$ 132.058,00	\$ 132.058,00	-	-1,00	\$ 132.058,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
11.21	Pulido y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y	M2	1,00	\$ 41.616,00	\$ 41.616,00	-	-1,00	\$ 41.616,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		



ETO

“Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”

26/02/2024

[illegible]

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0.80 m. (Suministro e	ML	1,00	\$ 67.484,00	\$ 67.484,00	-	-1,00	\$ 67.484,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e	M2	1,00	\$ 76.394,00	\$ 76.394,00	-	-1,00	\$ 76.394,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 41.114,00	\$ 41.114,00	-	-1,00	\$ 41.114,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 33.050,00	\$ 33.050,00	-	-1,00	\$ 33.050,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.22	Flanque en lámina galvanizada cal.18, (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 25.939,00	\$ 25.939,00	-	-1,00	\$ 25.939,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.23	Flanque en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 33.944,00	\$ 33.944,00	-	-1,00	\$ 33.944,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.24	Flanque en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 28.325,00	\$ 28.325,00	-	-1,00	\$ 28.325,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.25	Flanque en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 48.094,00	\$ 48.094,00	-	-1,00	\$ 48.094,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.26	Flanque en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 71.122,00	\$ 71.122,00	-	-1,00	\$ 71.122,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 63.159,00	\$ 63.159,00	-	-1,00	\$ 63.159,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.28	Gárgolas prefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos	UN	1,00	\$ 51.307,00	\$ 51.307,00	-	-1,00	\$ 51.307,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.	CARPINTERIA EN MADERA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (Incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de	UN	1,00	\$ 353.056,00	\$ 353.056,00	-	-1,00	\$ 353.056,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.2	Puerta en madera entambrada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 696.061,00	\$ 696.061,00	-	-1,00	\$ 696.061,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.3	Puerta en madera entambrada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 835.729,00	\$ 835.729,00	-	-1,00	\$ 835.729,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.4	Puerta en madera entambrada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 993.161,00	\$ 993.161,00	-	-1,00	\$ 993.161,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.5	Puerta en madera entambrada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e	UN	1,00	\$ 1.321.586,00	\$ 1.321.586,00	-	-1,00	\$ 1.321.586,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m.	ML	1,00	\$ 1.444.783,00	\$ 1.444.783,00	-	-1,00	\$ 1.444.783,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.7	Entrepiso en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e	ML	1,00	\$ 148.777,00	\$ 148.777,00	-	-1,00	\$ 148.777,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.	CARPINTERIA METÁLICA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.1	Puerta metálica entambrada en lámina CR cal.18. 0.80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	\$ 609.114,00	\$ 609.114,00	-	-1,00	\$ 609.114,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.2	Puerta metálica entambrada en lámina CR cal.18. 0.90x2,20 m. con acabado	UN	1,00	\$ 940.928,00	\$ 940.928,00	-	-1,00	\$ 940.928,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.3	Puerta metálica entambrada en lámina CR cal.18 1.00x2,10 m. acabado en	UN	1,00	\$ 949.032,00	\$ 949.032,00	-	-1,00	\$ 949.032,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1.00x2,10 m. con acabado en pintura	UN	1,00	\$ 1.247.332,00	\$ 1.247.332,00	-	-1,00	\$ 1.247.332,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 658.565,00	\$ 658.565,00	-	-1,00	\$ 658.565,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 729.125,00	\$ 729.125,00	-	-1,00	\$ 729.125,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 811.447,00	\$ 811.447,00	-	-1,00	\$ 811.447,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 987.848,00	\$ 987.848,00	-	-1,00	\$ 987.848,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 4.863.090,00	\$ 4.863.090,00	-	-1,00	\$ 4.863.090,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0.80x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	\$ 1.135.298,00	\$ 1.135.298,00	-	-1,00	\$ 1.135.298,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0.90x2,30 m.	UN	1,00	\$ 1.268.846,00	\$ 1.268.846,00	-	-1,00	\$ 1.268.846,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0.90x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	\$ 1.298.178,00	\$ 1.298.178,00	-	-1,00	\$ 1.298.178,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1.00x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	\$ 1.422.703,00	\$ 1.422.703,00	-	-1,00	\$ 1.422.703,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN	1,00	\$ 47.922,00	\$ 47.922,00	-	-1,00	\$ 47.922,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 382.740,00	\$ 382.740,00	-	-1,00	\$ 382.740,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 511.571,00	\$ 511.571,00	-	-1,00	\$ 511.571,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación.	M2	1,00	\$ 511.552,00	\$ 511.552,00	-	-1,00	\$ 511.552,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e	M2	1,00	\$ 572.058,00	\$ 572.058,00	-	-1,00	\$ 572.058,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 357.938,00	\$ 357.938,00	-	-1,00	\$ 357.938,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes,	M2	1,00	\$ 619.359,00	\$ 619.359,00	-	-1,00	\$ 619.359,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TÉLÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TÉLÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+) /)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco,	ML	1,00	\$ 153.461,00	\$ 153.461,00	-	-1,00	\$ 153.461,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura electrostática,	ml	1,00	\$ 39.461,00	\$ 39.461,00	-	-1,00	\$ 39.461,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2", (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 174.708,00	\$ 174.708,00	-	-1,00	\$ 174.708,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 264.036,00	\$ 264.036,00	-	-1,00	\$ 264.036,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable.	ML	1,00	\$ 354.638,00	\$ 354.638,00	-	-1,00	\$ 354.638,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", paralelos	ML	1,00	\$ 653.204,00	\$ 653.204,00	-	-1,00	\$ 653.204,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 67.991,00	\$ 67.991,00	-	-1,00	\$ 67.991,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 100.658,00	\$ 100.658,00	-	-1,00	\$ 100.658,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14	M2	1,00	\$ 68.517,00	\$ 68.517,00	-	-1,00	\$ 68.517,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 101.422,00	\$ 101.422,00	-	-1,00	\$ 101.422,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 92.932,00	\$ 92.932,00	-	-1,00	\$ 92.932,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcocha tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.196,00	\$ 74.196,00	-	-1,00	\$ 74.196,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 97.229,00	\$ 97.229,00	-	-1,00	\$ 97.229,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 255.594,00	\$ 255.594,00	-	-1,00	\$ 255.594,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e	UN	1,00	\$ 394.999,00	\$ 394.999,00	-	-1,00	\$ 394.999,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0,60x2,00 m.	UN	1,00	\$ 1.182.980,00	\$ 1.182.980,00	-	-1,00	\$ 1.182.980,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 1.384.208,00	\$ 1.384.208,00	-	-1,00	\$ 1.384.208,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro	UN	1,00	\$ 2.653.216,00	\$ 2.653.216,00	-	-1,00	\$ 2.653.216,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 3.419.634,00	\$ 3.419.634,00	-	-1,00	\$ 3.419.634,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural. (Suministro	M2	1,00	\$ 638.011,00	\$ 638.011,00	-	-1,00	\$ 638.011,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio.	M2	1,00	\$ 572.051,00	\$ 572.051,00	-	-1,00	\$ 572.051,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes,	M2	1,00	\$ 731.974,00	\$ 731.974,00	-	-1,00	\$ 731.974,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 110.729,00	\$ 110.729,00	-	-1,00	\$ 110.729,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 110.592,00	\$ 110.592,00	-	-1,00	\$ 110.592,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suministro e instalación.	M2	1,00	\$ 173.033,00	\$ 173.033,00	-	-1,00	\$ 173.033,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable.	M2	1,00	\$ 675.164,00	\$ 675.164,00	-	-1,00	\$ 675.164,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.17	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 57.773,00	\$ 57.773,00	-	-1,00	\$ 57.773,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1,00	\$ 59.800,00	\$ 59.800,00	-	-1,00	\$ 59.800,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1,00	\$ 29.589,00	\$ 29.589,00	-	-1,00	\$ 29.589,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1,00	\$ 47.492,00	\$ 47.492,00	-	-1,00	\$ 47.492,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 9.733,00	\$ 9.733,00	-	-1,00	\$ 9.733,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.5	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 565.137,00	\$ 565.137,00	-	-1,00	\$ 565.137,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.6	Sanitario de piso línea institucional con válvula antivandálica tipo push.	UN	1,00	\$ 833.913,00	\$ 833.913,00	-	-1,00	\$ 833.913,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 823.422,00	\$ 823.422,00	-	-1,00	\$ 823.422,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	1,00	\$ 1.063.970,00	\$ 1.063.970,00	-	-1,00	\$ 1.063.970,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.9	Lavamanos línea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 327.808,00	\$ 327.808,00	-	-1,00	\$ 327.808,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro	UN	1,00	\$ 541.473,00	\$ 541.473,00	-	-1,00	\$ 541.473,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 651.467,00	\$ 651.467,00	-	-1,00	\$ 651.467,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.12	Orinal tipo arecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e	UN	1,00	\$ 729.983,00	\$ 729.983,00	-	-1,00	\$ 729.983,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 292.750,00	\$ 292.750,00	-	-1,00	\$ 292.750,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.14	Grifería ducha. (Suministro e instalación. Incluye mezclador, regadera,	UN	1,00	\$ 72.549,00	\$ 72.549,00	-	-1,00	\$ 72.549,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e	UN	1,00	\$ 48.377,00	\$ 48.377,00	-	-1,00	\$ 48.377,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 25.166,00	\$ 25.166,00	-	-1,00	\$ 25.166,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 70.239,00	\$ 70.239,00	-	-1,00	\$ 70.239,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	\$ 202.891,00	\$ 202.891,00	-	-1,00	\$ 202.891,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	\$ 140.593,00	\$ 140.593,00	-	-1,00	\$ 140.593,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	\$ 140.600,00	\$ 140.600,00	-	-1,00	\$ 140.600,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable.	UN	1,00	\$ 785.075,00	\$ 785.075,00	-	-1,00	\$ 785.075,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable.	UN	1,00	\$ 155.503,00	\$ 155.503,00	-	-1,00	\$ 155.503,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	\$ 523.997,00	\$ 523.997,00	-	-1,00	\$ 523.997,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	\$ 433.411,00	\$ 433.411,00	-	-1,00	\$ 433.411,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.25	Rejilla metálica con soso 3x2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 16.101,00	\$ 16.101,00	-	-1,00	\$ 16.101,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.26	Rejilla metálica con soso 3x3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 32.238,00	\$ 32.238,00	-	-1,00	\$ 32.238,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 43.327,00	\$ 43.327,00	-	-1,00	\$ 43.327,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e	UN	1,00	\$ 340.967,00	\$ 340.967,00	-	-1,00	\$ 340.967,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.29	Grifería kit vpálvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 219.030,00	\$ 219.030,00	-	-1,00	\$ 219.030,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.	INSTALACIONES HIDRAULICAS		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 414.916,00	\$ 414.916,00	-	-1,00	\$ 414.916,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, ríiples,	UN	1,00	\$ 768.866,00	\$ 768.866,00	-	-1,00	\$ 768.866,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.926,00	\$ 2.926,00	-	-1,00	\$ 2.926,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 4.365,00	\$ 4.365,00	-	-1,00	\$ 4.365,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 6.744,00	\$ 6.744,00	-	-1,00	\$ 6.744,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1 1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 7.969,00	\$ 7.969,00	-	-1,00	\$ 7.969,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 10.688,00	\$ 10.688,00	-	-1,00	\$ 10.688,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 14.855,00	\$ 14.855,00	-	-1,00	\$ 14.855,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 32.381,00	\$ 32.381,00	-	-1,00	\$ 32.381,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 3.945,00	\$ 3.945,00	-	-1,00	\$ 3.945,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 5.449,00	\$ 5.449,00	-	-1,00	\$ 5.449,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 14.412,00	\$ 14.412,00	-	-1,00	\$ 14.412,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 26.858,00	\$ 26.858,00	-	-1,00	\$ 26.858,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 33.740,00	\$ 33.740,00	-	-1,00	\$ 33.740,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.300,00	\$ 74.300,00	-	-1,00	\$ 74.300,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 119.297,00	\$ 119.297,00	-	-1,00	\$ 119.297,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.17	Red PVC-P RDE-13.5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 18.883,00	\$ 18.883,00	-	-1,00	\$ 18.883,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 22.450,00	\$ 22.450,00	-	-1,00	\$ 22.450,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 25.215,00	\$ 25.215,00	-	-1,00	\$ 25.215,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1 1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 23.568,00	\$ 23.568,00	-	-1,00	\$ 23.568,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 14.392,00	\$ 14.392,00	-	-1,00	\$ 14.392,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 19.917,00	\$ 19.917,00	-	-1,00	\$ 19.917,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 34.049,00	\$ 34.049,00	-	-1,00	\$ 34.049,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 36.223,00	\$ 36.223,00	-	-1,00	\$ 36.223,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 44.503,00	\$ 44.503,00	-	-1,00	\$ 44.503,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.26	Tubería HG 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 55.733,00	\$ 55.733,00	-	-1,00	\$ 55.733,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 63.519,00	\$ 63.519,00	-	-1,00	\$ 63.519,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 89.556,00	\$ 89.556,00	-	-1,00	\$ 89.556,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 124.188,00	\$ 124.188,00	-	-1,00	\$ 124.188,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 159.866,00	\$ 159.866,00	-	-1,00	\$ 159.866,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	\$ 37.481,00	\$ 37.481,00	-	-1,00	\$ 37.481,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	\$ 47.636,00	\$ 47.636,00	-	-1,00	\$ 47.636,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con flujo/metro/válvula antivandálica.	UN	1,00	\$ 51.130,00	\$ 51.130,00	-	-1,00	\$ 51.130,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con flujo/metro/válvula antivandálica.	UN	1,00	\$ 53.824,00	\$ 53.824,00	-	-1,00	\$ 53.824,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería	UN	1,00	\$ 36.412,00	\$ 36.412,00	-	-1,00	\$ 36.412,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	\$ 39.983,00	\$ 39.983,00	-	-1,00	\$ 39.983,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	\$ 38.254,00	\$ 38.254,00	-	-1,00	\$ 38.254,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 40.622,00	\$ 40.622,00	-	-1,00	\$ 40.622,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 7.303,00	\$ 7.303,00	-	-1,00	\$ 7.303,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 13.392,00	\$ 13.392,00	-	-1,00	\$ 13.392,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 22.724,00	\$ 22.724,00	-	-1,00	\$ 22.724,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 50.397,00	\$ 50.397,00	-	-1,00	\$ 50.397,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 55.591,00	\$ 55.591,00	-	-1,00	\$ 55.591,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 80.351,00	\$ 80.351,00	-	-1,00	\$ 80.351,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 121.856,00	\$ 121.856,00	-	-1,00	\$ 121.856,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 137.729,00	\$ 137.729,00	-	-1,00	\$ 137.729,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 53.638,00	\$ 53.638,00	-	-1,00	\$ 53.638,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 70.938,00	\$ 70.938,00	-	-1,00	\$ 70.938,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 105.084,00	\$ 105.084,00	-	-1,00	\$ 105.084,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 454.751,00	\$ 454.751,00	-	-1,00	\$ 454.751,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.51	Tanque de reserva 1000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas.	UN	1,00	\$ 1.000.416,00	\$ 1.000.416,00	-	-1,00	\$ 1.000.416,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.52	Tanque de reserva 2000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas.	UN	1,00	\$ 978.265,00	\$ 978.265,00	-	-1,00	\$ 978.265,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto.	UN	1,00	\$ 469.640,00	\$ 469.640,00	-	-1,00	\$ 469.640,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.	INSTALACIONES SANITARIAS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	\$ 249.126,00	\$ 249.126,00	-	-1,00	\$ 249.126,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	\$ 494.687,00	\$ 494.687,00	-	-1,00	\$ 494.687,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	\$ 31.714,00	\$ 31.714,00	-	-1,00	\$ 31.714,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	\$ 50.008,00	\$ 50.008,00	-	-1,00	\$ 50.008,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	\$ 63.163,00	\$ 63.163,00	-	-1,00	\$ 63.163,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	\$ 103.338,00	\$ 103.338,00	-	-1,00	\$ 103.338,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ML	1,00	\$ 135.295,00	\$ 135.295,00	-	-1,00	\$ 135.295,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ml	1,00	\$ 70.433,00	\$ 70.433,00	-	-1,00	\$ 70.433,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 12.067,00	\$ 12.067,00	-	-1,00	\$ 12.067,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 18.775,00	\$ 18.775,00	-	-1,00	\$ 18.775,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 81.455,00	\$ 81.455,00	-	-1,00	\$ 81.455,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 76.794,00	\$ 76.794,00	-	-1,00	\$ 76.794,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	1,00	\$ 57.886,00	\$ 57.886,00	-	-1,00	\$ 57.886,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	1,00	\$ 77.408,00	\$ 77.408,00	-	-1,00	\$ 77.408,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	\$ 94.453,00	\$ 94.453,00	-	-1,00	\$ 94.453,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJ "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA									
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL					
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)				
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	1,00	\$ 84.417,00	\$ 84.417,00	-	-1,00	\$ 84.417,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	1,00	\$ 84.447,00	\$ 84.447,00	-	-1,00	\$ 84.447,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	1,00	\$ 73.140,00	\$ 73.140,00	-	-1,00	\$ 73.140,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 75.575,00	\$ 75.575,00	-	-1,00	\$ 75.575,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 65.987,00	\$ 65.987,00	-	-1,00	\$ 65.987,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 71.456,00	\$ 71.456,00	-	-1,00	\$ 71.456,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 85.906,00	\$ 85.906,00	-	-1,00	\$ 85.906,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 20.639,00	\$ 20.639,00	-	-1,00	\$ 20.639,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 18.388,00	\$ 18.388,00	-	-1,00	\$ 18.388,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 29.248,00	\$ 29.248,00	-	-1,00	\$ 29.248,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 69.405,00	\$ 69.405,00	-	-1,00	\$ 69.405,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 12.592,00	\$ 12.592,00	-	-1,00	\$ 12.592,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 10.339,00	\$ 10.339,00	-	-1,00	\$ 10.339,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 19.388,00	\$ 19.388,00	-	-1,00	\$ 19.388,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 19.388,00	\$ 19.388,00	-	-1,00	\$ 19.388,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 24.558,00	\$ 24.558,00	-	-1,00	\$ 24.558,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 3.053,00	\$ 3.053,00	+	59,00	\$ 180.127,00	60,00	\$ 183.180,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 183.180,00				
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 5.604,00	\$ 5.604,00	-	-1,00	\$ 5.604,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 4.334,00	\$ 4.334,00	-	-1,00	\$ 4.334,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.4	Cable desnudo de Cu No. 2. Interconexión equipotencial en terreno. (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios necesarios)	ML	1,00	\$ 47.316,00	\$ 47.316,00	-	-1,00	\$ 47.316,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 16.833,00	\$ 16.833,00	-	-1,00	\$ 16.833,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 17.646,00	\$ 17.646,00	-	-1,00	\$ 17.646,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 432.647,00	\$ 432.647,00	-	-1,00	\$ 432.647,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 504.034,00	\$ 504.034,00	-	-1,00	\$ 504.034,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 606.758,00	\$ 606.758,00	-	-1,00	\$ 606.758,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.10	Tablero eléctrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	\$ 714.490,00	\$ 714.490,00	-	-1,00	\$ 714.490,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.11	Tablero eléctrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	\$ 787.745,00	\$ 787.745,00	-	-1,00	\$ 787.745,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.12	Tablero eléctrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	\$ 804.661,00	\$ 804.661,00	-	-1,00	\$ 804.661,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e	UN	1,00	\$ 16.100,00	\$ 16.100,00	-	-1,00	\$ 16.100,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 30.688,00	\$ 30.688,00	-	-1,00	\$ 30.688,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 51.499,00	\$ 51.499,00	-	-1,00	\$ 51.499,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.930,00	\$ 74.930,00	-	-1,00	\$ 74.930,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 44.537,00	\$ 44.537,00	-	-1,00	\$ 44.537,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.18	Breaker enchufable de 3x30A/20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 48.674,00	\$ 48.674,00	-	-1,00	\$ 48.674,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 113.810,00	\$ 113.810,00	-	-1,00	\$ 113.810,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 199.573,00	\$ 199.573,00	-	-1,00	\$ 199.573,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 215.331,00	\$ 215.331,00	-	-1,00	\$ 215.331,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	\$ 12.355,00	\$ 12.355,00	-	-1,00	\$ 12.355,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	\$ 18.345,00	\$ 18.345,00	-	-1,00	\$ 18.345,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				

<div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div>			<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETORealizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div> <div>ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA</div> <div>PERIODO MES / AÑOfeb-24</div> <div>FECHA:26/02/2024</div>		
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT:901744095-0</div> <div>DIRECCIÓNCL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO313837687</div>			<div>VR. INICIAL OBRA</div> <div>\$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. 1</div> <div>\$ 1.154.367.257,00</div> <div>VR. ADICIONAL No.</div> <div>\$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL</div> <div>\$ 3.494.367.257,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00</div> <div>\$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _</div> <div>\$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION</div> <div>\$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO</div> <div>\$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR</div> <div>\$ 0,00</div>		
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div>			<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO</div> <div>26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL</div> <div>31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1</div> <div>55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2</div> <div>60 días</div> <div>PLAZO TOTAL</div> <div>5 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No.</div> <div></div> <div>FECHA REINICIACIÓN No.</div> <div></div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL</div> <div>24/04/2024</div>		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión.	ML	1,00	\$ 21.074,00	\$ 21.074,00	-	-1,00	\$ 21.074,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión.	ML	1,00	\$ 25.735,00	\$ 25.735,00	-	-1,00	\$ 25.735,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.26	Tubería EMT 1-1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión.	ML	1,00	\$ 30.942,00	\$ 30.942,00	-	-1,00	\$ 30.942,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión.	ML	1,00	\$ 33.734,00	\$ 33.734,00	-	-1,00	\$ 33.734,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.28	Tubería de 1/2". conduit de PVC. (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	\$ 8.539,00	\$ 8.539,00	-	-1,00	\$ 8.539,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.29	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	\$ 10.542,00	\$ 10.542,00	-	-1,00	\$ 10.542,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de	ML	1,00	\$ 11.611,00	\$ 11.611,00	-	-1,00	\$ 11.611,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 17.642,00	\$ 17.642,00	-	-1,00	\$ 17.642,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.32	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 20.363,00	\$ 20.363,00	-	-1,00	\$ 20.363,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.33	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	\$ 18.264,00	\$ 18.264,00	-	-1,00	\$ 18.264,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.34	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	\$ 141.470,00	\$ 141.470,00	-	-1,00	\$ 141.470,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 12.963,00	\$ 12.963,00	-	-1,00	\$ 12.963,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 53.507,00	\$ 53.507,00	-	-1,00	\$ 53.507,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 47.457,00	\$ 47.457,00	-	-1,00	\$ 47.457,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 65.668,00	\$ 65.668,00	-	-1,00	\$ 65.668,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 51.738,00	\$ 51.738,00	-	-1,00	\$ 51.738,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.40	Varilla de cobre 5/8" X 2.4 m con conector. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 120.037,00	\$ 120.037,00	-	-1,00	\$ 120.037,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.41	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper weld 5/8" X 2.44m. (Suministro	UN	1,00	\$ 425.311,00	\$ 425.311,00	-	-1,00	\$ 425.311,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	\$ 96.439,00	\$ 96.439,00	-	-1,00	\$ 96.439,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.43	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 58.363,00	\$ 58.363,00	-	-1,00	\$ 58.363,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	\$ 102.138,00	\$ 102.138,00	-	-1,00	\$ 102.138,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	\$ 98.173,00	\$ 98.173,00	-	-1,00	\$ 98.173,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 160.047,00	\$ 160.047,00	-	-1,00	\$ 160.047,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	\$ 96.817,00	\$ 96.817,00	-	-1,00	\$ 96.817,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.48	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	\$ 291.419,00	\$ 291.419,00	-	-1,00	\$ 291.419,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.49	Salidas botón timbre. PVC (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	\$ 116.813,00	\$ 116.813,00	-	-1,00	\$ 116.813,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.50	Salida toma monofásica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 62.770,00	\$ 62.770,00	-	-1,00	\$ 62.770,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.51	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	\$ 97.692,00	\$ 97.692,00	-	-1,00	\$ 97.692,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	\$ 95.313,00	\$ 95.313,00	-	-1,00	\$ 95.313,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 79.470,00	\$ 79.470,00	-	-1,00	\$ 79.470,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 82.723,00	\$ 82.723,00	-	-1,00	\$ 82.723,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN	1,00	\$ 98.631,00	\$ 98.631,00	-	-1,00	\$ 98.631,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.56	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 61.762,00	\$ 61.762,00	-	-1,00	\$ 61.762,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.57	Salida de toma monofásica doble Regulada empotrada en muro. (Suministro e	UN	1,00	\$ 97.533,00	\$ 97.533,00	-	-1,00	\$ 97.533,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.58	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 129.308,00	\$ 129.308,00	-	-1,00	\$ 129.308,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 71.478,00	\$ 71.478,00	-	-1,00	\$ 71.478,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	\$ 141.896,00	\$ 141.896,00	+	17,00	\$ 2.412.232,00		0,00	18,00	\$ 2.554.128,00	18,00	\$ 2.554.128,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	\$ 77.518,00	\$ 77.518,00	-	-1,00	\$ 77.518,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	\$ 102.647,00	\$ 102.647,00	-	-1,00	\$ 102.647,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	\$ 310.863,00	\$ 310.863,00	-	-1,00	\$ 310.863,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	\$ 104.033,00	\$ 104.033,00	-	-1,00	\$ 104.033,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	\$ 111.951,00	\$ 111.951,00	-	-1,00	\$ 111.951,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24	FECHA: 26/02/2024
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 66.303,00	\$ 66.303,00	-	-1,00	\$ 66.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambiar. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 61.246,00	\$ 61.246,00	-	-1,00	\$ 61.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambiar.	UN	1,00	\$ 27.648,00	\$ 27.648,00	-	-1,00	\$ 27.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambiar.	UN	1,00	\$ 48.073,00	\$ 48.073,00	-	-1,00	\$ 48.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambiar. (Suministro	UN	1,00	\$ 87.049,00	\$ 87.049,00	-	-1,00	\$ 87.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.71	Salida de microfono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambiar. (Suministro e	UN	1,00	\$ 60.280,00	\$ 60.280,00	-	-1,00	\$ 60.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 59.183,00	\$ 59.183,00	-	-1,00	\$ 59.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería,	UN	1,00	\$ 78.456,00	\$ 78.456,00	-	-1,00	\$ 78.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.74	Salda bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN	1,00	\$ 190.609,00	\$ 190.609,00	-	-1,00	\$ 190.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	1,00	\$ 35.039,00	\$ 35.039,00	-	-1,00	\$ 35.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	\$ 149.408,00	\$ 149.408,00	-	-1,00	\$ 149.408,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5.4W).	UN	1,00	\$ 216.990,00	\$ 216.990,00	-	-1,00	\$ 216.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad mín. 20.000 horas.	UN	1,00	\$ 175.289,00	\$ 175.289,00	-	-1,00	\$ 175.289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	\$ 230.079,00	\$ 230.079,00	-	-1,00	\$ 230.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija	UN	1,00	\$ 184.438,00	\$ 184.438,00	-	-1,00	\$ 184.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad	UN	1,00	\$ 28.131,00	\$ 28.131,00	-	-1,00	\$ 28.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000	UN	1,00	\$ 84.016,00	\$ 84.016,00	-	-1,00	\$ 84.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado	UN	1,00	\$ 122.471,00	\$ 122.471,00	-	-1,00	\$ 122.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas.	UN	1,00	\$ 104.045,00	\$ 104.045,00	-	-1,00	\$ 104.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad mín 20.000 horas. (Suministro e	UN	1,00	\$ 91.551,00	\$ 91.551,00	-	-1,00	\$ 91.551,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,00	\$ 283.399,00	\$ 283.399,00	+	17,00	\$ 4.817.783,00	18,00	\$ 5.101.182,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 5.101.182,00
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas.	UN	1,00	\$ 68.245,00	\$ 68.245,00	-	-1,00	\$ 68.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*1200mm cool white 6000k, 100-240V	UN	1,00	\$ 49.415,00	\$ 49.415,00	-	-1,00	\$ 49.415,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	\$ 23.173,00	\$ 23.173,00	-	-1,00	\$ 23.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	\$ 130.984,00	\$ 130.984,00	-	-1,00	\$ 130.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 132.344,00	\$ 132.344,00	-	-1,00	\$ 132.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e	UN	1,00	\$ 133.707,00	\$ 133.707,00	-	-1,00	\$ 133.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 201.889,00	\$ 201.889,00	-	-1,00	\$ 201.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero.	UN	1,00	\$ 550.749,00	\$ 550.749,00	-	-1,00	\$ 550.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	\$ 2.520.919,00	\$ 2.520.919,00	-	-1,00	\$ 2.520.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.96	Tapas Ciegas. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 3.620,00	\$ 3.620,00	-	-1,00	\$ 3.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 490.548,00	\$ 490.548,00	-	-1,00	\$ 490.548,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.	CABLEADO ESTRUCTURADO		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente.	ml	1,00	\$ 70.263,00	\$ 70.263,00	-	-1,00	\$ 70.263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	\$ 125.524,00	\$ 125.524,00	-	-1,00	\$ 125.524,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimento con tapa, de 20x8 cm. en	ML	1,00	\$ 139.908,00	\$ 139.908,00	-	-1,00	\$ 139.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimento con tapa, de	ML	1,00	\$ 151.670,00	\$ 151.670,00	-	-1,00	\$ 151.670,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	\$ 141.954,00	\$ 141.954,00	-	-1,00	\$ 141.954,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	\$ 24.420,00	\$ 24.420,00	-	-1,00	\$ 24.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	\$ 48.093,00	\$ 48.093,00	-	-1,00	\$ 48.093,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	\$ 73.018,00	\$ 73.018,00	-	-1,00	\$ 73.018,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.9	Canaleta Metálica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	\$ 50.662,00	\$ 50.662,00	-	-1,00	\$ 50.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN	1,00	\$ 6.957,00	\$ 6.957,00	-	-1,00	\$ 6.957,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



ETO

“Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

EECHA:

26/02/2024

NIT: 901744095-0

TELÉFONO 313837687

VR. TOTAL	:	\$ 3.494.367.257,00
-----------	---	---------------------

SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00
---------------------	---	---------

El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA CIVIL

Pág. 16 de 33

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
	UTIIDAD	5%		\$ 5.436.601,85				\$ 4.414.433,53		\$ 580.416,16		\$ 441.752,15		\$ 1.022.168,32
	IVA (Sobre utilidad)	19%		\$ 1.032.954,35				\$ 838.742,37		\$ 110.279,07		\$ 83.932,91		\$ 194.211,98
A.	TOTAL OBRA			\$ 136.948.000,60				\$ 111.199.580,68		\$ 14.620.683,18		\$ 11.127.736,73		\$ 25.748.419,92
B.	NO PREVISTOS													
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		\$ 58.138,79							\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación.	ML		\$ 15.200,00		+	210,00	\$ 3.192.000,00	210,00	\$ 3.192.000,00	\$ 0,00		210,00	\$ 3.192.000,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2", (Suministro e instalación. Incluye	UN		\$ 101.647,00		+	3,00	\$ 304.941,00	3,00	\$ 304.941,00	\$ 0,00		3,00	\$ 304.941,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canalleta, (Suministro e instalación. Incluye	UN		\$ 97.327,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado, (Suministro e instalación. Incluye	UN		\$ 106.099,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		\$ 96.500,00		+	87,33	\$ 8.427.345,00	87,33	\$ 8.427.345,00	\$ 0,00		87,33	\$ 8.427.345,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS			\$ 0,00				\$ 11.924.286,00		\$ 11.924.286,00	\$ 0,00			\$ 11.924.286,00
	ADMINISTRACIÓN	17%		\$ 0,00				\$ 2.027.128,62		\$ 2.027.128,62	\$ 0,00			\$ 2.027.128,62
	IMPREVISTOS	3%		\$ 3.261.961,11				\$ 357.728,58		\$ 357.728,58	\$ 0,00			\$ 357.728,58
	UTIIDAD	5%		\$ 0,00				\$ 596.214,30		\$ 596.214,30	\$ 0,00			\$ 596.214,30
	IVA (Sobre utilidad)	19%		\$ 0,00				\$ 113.280,72		\$ 113.280,72	\$ 0,00			\$ 113.280,72
B	TOTAL NO PREVISTOS			\$ 0,00				\$ 15.018.638,22		\$ 15.018.638,22	\$ 0,00			\$ 15.018.638,22
C. MOBILIARIO														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN													
1	OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES													
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e	UN	1,00	\$ 1.234.710,00	\$ 1.234.710,00	-	-1,00	\$ 1.234.710,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e	UN	1,00	\$ 1.274.371,00	\$ 1.274.371,00	-	-1,00	\$ 1.274.371,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3	EXTENSIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN	1,00	\$ 958.093,00	\$ 958.093,00	-	-1,00	\$ 958.093,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
M1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN	1,00	\$ 1.072.970,00	\$ 1.072.970,00	-	-1,00	\$ 1.072.970,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	\$ 863.818,00	\$ 863.818,00	-	-1,00	\$ 863.818,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	\$ 841.791,00	\$ 841.791,00	-	-1,00	\$ 841.791,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	1,00	\$ 571.617,00	\$ 571.617,00	-	-1,00	\$ 571.617,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	\$ 376.330,00	\$ 376.330,00	-	-1,00	\$ 376.330,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	\$ 215.869,00	\$ 215.869,00	-	-1,00	\$ 215.869,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS, asiento espaldar inyectados en plástico,	UN	1,00	\$ 515.549,00	\$ 515.549,00	-	-1,00	\$ 515.549,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS s, asiento espaldar inyectados en plástico,	UN	1,00	\$ 712.191,00	\$ 712.191,00	-	-1,00	\$ 712.191,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLICO, tipo pesado para resistir	UN	1,00	\$ 1.041.121,00	\$ 1.041.121,00	-	-1,00	\$ 1.041.121,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA, de 2 puertas de 0,90m	UN	1,00	\$ 891.382,00	\$ 891.382,00	-	-1,00	\$ 891.382,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (	UN	1,00	\$ 1.383.339,00	\$ 1.383.339,00	-	-1,00	\$ 1.383.339,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en tablex enchapado en formica, compuesta por dos (2)	UN	1,00	\$ 2.070.962,00	\$ 2.070.962,00	-	-1,00	\$ 2.070.962,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de 4mm +	M2	1,00	\$ 452.990,00	\$ 452.990,00	-	-1,00	\$ 452.990,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 1 : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
M1.17	DIVISION PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2	1,00	\$ 664.586,00	\$ 664.586,00	-	-1,00	\$ 664.586,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura	M2	1,00	\$ 848.192,00	\$ 848.192,00	-	-1,00	\$ 848.192,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50m	UN	1,00	\$ 467.415,00	\$ 467.415,00	-	-1,00	\$ 467.415,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa	UN	1,00	\$ 555.688,00	\$ 555.688,00	-	-1,00	\$ 555.688,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de	UN	1,00	\$ 2.493.065,00	\$ 2.493.065,00	-	-1,00	\$ 2.493.065,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta	UN	1,00	\$ 870.060,00	\$ 870.060,00	-	-1,00	\$ 870.060,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalación de estantería fija fabricada en	UN	1,00	\$ 457.222,00	\$ 457.222,00	-	-1,00	\$ 457.222,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	\$ 4.405.126,00	\$ 4.405.126,00	-	-1,00	\$ 4.405.126,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 1.044.053,00	\$ 1.044.053,00	-	-1,00	\$ 1.044.053,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVIL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 1.503.385,00	\$ 1.503.385,00	-	-1,00	\$ 1.503.385,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 498.537,00	\$ 498.537,00	-	-1,00	\$ 498.537,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 413.948,00	\$ 413.948,00	-	-1,00	\$ 413.948,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.29	CORTINA. Suministro e instalación de Blackout color blanco: con un 70% de	M2	1,00	\$ 185.117,00	\$ 185.117,00	-	-1,00	\$ 185.117,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	\$ 4.010.911,00	\$ 4.010.911,00	-	-1,00	\$ 4.010.911,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2	1,00	\$ 273.539,00	\$ 273.539,00	-	-1,00	\$ 273.539,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauración de biblioteca despacho	M2	1,00	\$ 300.362,00	\$ 300.362,00	-	-1,00	\$ 300.362,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauración de antepecho	ML	1,00	\$ 120.005,00	\$ 120.005,00	-	-1,00	\$ 120.005,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauración de cenefa corniza en madera	ML	1,00	\$ 91.925,00	\$ 91.925,00	-	-1,00	\$ 91.925,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauración de puerta y marco en	UN	1,00	\$ 726.456,00	\$ 726.456,00	-	-1,00	\$ 726.456,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauración de puerta y marco en madera acceso a	UN	1,00	\$ 649.620,00	\$ 649.620,00	-	-1,00	\$ 649.620,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauración de muro	M2	1,00	\$ 32.534,00	\$ 32.534,00	-	-1,00	\$ 32.534,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauración de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	\$ 264.039,00	\$ 264.039,00	-	-1,00	\$ 264.039,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauración de	UN	1,00	\$ 3.337.510,00	\$ 3.337.510,00	-	-1,00	\$ 3.337.510,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauración de mueble auxiliar a	UN	1,00	\$ 1.327.180,00	\$ 1.327.180,00	-	-1,00	\$ 1.327.180,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauración de mesa de juntas	UN	1,00	\$ 1.718.350,00	\$ 1.718.350,00	-	-1,00	\$ 1.718.350,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauración de mesa auxiliar baja superficie lisa.	UN	1,00	\$ 586.753,00	\$ 586.753,00	-	-1,00	\$ 586.753,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauración de mesa auxiliar baja	UN	1,00	\$ 782.338,00	\$ 782.338,00	-	-1,00	\$ 782.338,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
M2.14	SILLA INTERLOCUTORA. LIVIANA TIPO 1. Restauración de silla interlocutora.	UN	1,00	\$ 1.606.587,00	\$ 1.606.587,00	-	-1,00	\$ 1.606.587,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauración de silla interlocutora.	UN	1,00	\$ 2.347.014,00	\$ 2.347.014,00	-	-1,00	\$ 2.347.014,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauración de	UN	1,00	\$ 5.567.173,00	\$ 5.567.173,00	-	-1,00	\$ 5.567.173,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauración de sofa 2	UN	1,00	\$ 9.164.530,00	\$ 9.164.530,00	-	-1,00	\$ 9.164.530,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.	OTROS					-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de ++	UN	1,00	\$ 12.090.817,00	\$ 12.090.817,00	-	-1,00	\$ 12.090.817,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v,	UN	1,00	\$ 12.090.817,00	\$ 12.090.817,00	-	-1,00	\$ 12.090.817,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	\$ 4.141.263,00	\$ 4.141.263,00	-	-1,00	\$ 4.141.263,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.4	Señal luminosa, Iluminadora.	UN	1,00	\$ 577.420,00	\$ 577.420,00	-	-1,00	\$ 577.420,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	\$ 441.425,00	\$ 441.425,00	-	-1,00	\$ 441.425,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					\$ 91.132.065,00		\$ 91.132.065,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
IVA (Sobre utilidad)				19%	\$ 17.315.092,35		\$ 17.315.092,35		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
C.	TOTAL MOBILIARIO			\$ 108.447.157,35			\$ 108.447.157,35		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		
			PERIODO MES / AÑO		feb-24
			FECHA:		26/02/2024
			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		
			FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 1 : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA									
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL					
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)				
	TOTAL PISO 5			\$ 245.395.157,95			\$	204.628.099,82		\$ 29.639.321,40		\$ 11.127.736,73		\$ 40.767.058,13				
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6																	
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES																	
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		\$ 4.522,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.2	Cerramiento provisional en polsombra. Incluye puertas y accesorios	ML		\$ 19.137,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.956,00	\$ 0,00	+	3,90	\$ 50.528,40	3,90	\$ 50.528,40	0,00	\$ 0,00	3,90	\$ 50.528,40				
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 8.090,00	\$ 0,00	+	25,00	\$ 202.250,00		\$ 0,00	25,00	\$ 202.250,00	25,00	\$ 202.250,00				
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		\$ 3.686,00	\$ 0,00	+	66,39	\$ 244.713,54		\$ 0,00	66,39	\$ 244.713,54	66,39	\$ 244.713,54				
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		\$ 6.103,00	\$ 0,00	+	14,25	\$ 86.967,75		\$ 0,00	14,25	\$ 86.967,75	14,25	\$ 86.967,75				
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 10.997,00	\$ 0,00	+	15,00	\$ 164.955,00	15,00	\$ 164.955,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 164.955,00				
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a mt de tubería o canaleta.	ML		\$ 2.749,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		\$ 105.138,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		\$ 14.145,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		\$ 19.537,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 14.913,00	\$ 0,00	+	10,24	\$ 152.709,12		\$ 0,00	10,24	\$ 152.709,12	10,24	\$ 152.709,12				
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 289.093,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		\$ 30.082,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		\$ 188.831,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		\$ 18.106,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2		\$ 4.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		\$ 37.009,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		\$ 8.173,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 11.318,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 11.601,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.35	Demolición afinado de pisos e=+5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 5.669,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.600,00	\$ 0,00	+	8,19	\$ 86.814,00	8,19	\$ 86.814,00	0,00	\$ 0,00	8,19	\$ 86.814,00				
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		\$ 12.152,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 12.703,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.39	Demolición de adoquín. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		\$ 12.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.41	Demolición de medacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		\$ 6.487,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 19.241,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		\$ 40.606,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		\$ 72.398,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		\$ 15.067,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		\$ 14.170,00	\$ 0,00	+	36,87	\$ 522.447,90		\$ 0,00	36,87	\$ 522.447,90	36,87	\$ 522.447,90				
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO																	
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescoaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera,	M2		\$ 86.845,00	\$ 0,00	+	21,87	\$ 1.899.300,15		\$ 0,00	21,87	\$ 1.899.300,15	21,87	\$ 1.899.300,15				
9.	CIELO RASOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, arcosqños)	M2		\$ 80.151,00	\$ 0,00	+	107,27	\$ 8.597.797,77	33,39	\$ 2.676.241,89	73,88	\$ 5.921.555,88	107,27	\$ 8.597.797,77				

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA :	\$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
	VR. ADICIONAL No. 1 :	\$ 1.154.367.257,00	
	VR. ADICIONAL No. :	\$ 0,00	
	VR. TOTAL :	\$ 3.494.367.257,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO	ANTICIPO \$ 0,00 :	\$ 0,00	
	AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ :	\$ 0,00	
	SALDO ANTERIOR AMORTIZACION :	\$ 0,00	
	TOTAL AMORTIZADO :	\$ 0,00	
	SALDO POR LEGALIZAR :	\$ 0,00	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
10.	ESTUCO Y PINTURA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 6.566,00	\$ 0,00	+	17,60	\$ 115.561,60		\$ 0,00	17,60	\$ 115.561,60	17,60	\$ 115.561,60	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00	\$ 0,00	+	97,45	\$ 1.482.117,05		\$ 0,00	97,45	\$ 1.482.117,05	97,45	\$ 1.482.117,05	
11.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2		\$ 97.561,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11.15	Guardaescooba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		\$ 25.755,00	\$ 0,00	+	16,38	\$ 421.866,90	16,38	\$ 421.866,90	0,00	\$ 0,00	16,38	\$ 421.866,90	
14.	CARPINTERIA METÁLICA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		\$ 47.922,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
19.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 0,00										
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		\$ 3.053,00	\$ 0,00	+	120,00	\$ 366.360,00	120,00	\$ 366.360,00	0,00	\$ 0,00	120,00	\$ 366.360,00	
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		\$ 21.074,00	\$ 0,00	+	40,34	\$ 850.125,16		\$ 0,00	40,34	\$ 850.125,16	40,34	\$ 850.125,16	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		\$ 141.896,00	\$ 0,00	+	28,00	\$ 3.973.088,00		\$ 0,00	28,00	\$ 3.973.088,00	28,00	\$ 3.973.088,00	
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000K, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		\$ 283.399,00	\$ 0,00	+	28,00	\$ 7.935.172,00	28,00	\$ 7.935.172,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 7.935.172,00	
20.	CABLEADO ESTRUCTURADO				\$ 0,00										
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		\$ 141.954,00	\$ 0,00	+	19,57	\$ 2.778.039,78		\$ 0,00	19,57	\$ 2.778.039,78	19,57	\$ 2.778.039,78	
20.9	Canaleta Metálica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		\$ 50.662,00	\$ 0,00	+	37,44	\$ 1.896.785,28		\$ 0,00	37,44	\$ 1.896.785,28	37,44	\$ 1.896.785,28	
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN		\$ 739.585,00	\$ 0,00	+	1,00	\$ 739.585,00	1,00	\$ 739.585,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 739.585,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		\$ 7.609,00	\$ 0,00	+	1.225,00	\$ 9.321.025,00	968,10	\$ 7.366.272,90	256,90	\$ 1.954.752,10	1.225,00	\$ 9.321.025,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		\$ 44.806,00	\$ 0,00	+	26,00	\$ 1.164.956,00	26,00	\$ 1.164.956,00	0,00	\$ 0,00	26,00	\$ 1.164.956,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rop. (Suministro e instalación)	UN		\$ 44.806,00	\$ 0,00	+	8,00	\$ 358.448,00	8,00	\$ 358.448,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 358.448,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		\$ 14.008,00	\$ 0,00	+	24,00	\$ 336.192,00	24,00	\$ 336.192,00	0,00	\$ 0,00	24,00	\$ 336.192,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		\$ 15.153,00	\$ 0,00	+	8,00	\$ 121.224,00	8,00	\$ 121.224,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 121.224,00	
22.	ASEO Y VARIOS														
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		\$ 2.922,00	\$ 0,00	+	108,78	\$ 317.855,16	108,78	\$ 317.855,16	0,00	\$ 0,00	108,78	\$ 317.855,16	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA								\$ 44.186.884,56		\$ 22.106.471,25		\$ 22.080.413,31		\$ 44.186.884,56	
ADMINISTRACIÓN								\$ 7.511.770,38		\$ 3.758.100,11		\$ 3.753.670,26		\$ 7.511.770,38	
IMPREVISTOS								\$ 1.325.606,54		\$ 663.194,14		\$ 662.412,41		\$ 1.325.606,54	
UTILIDAD								\$ 2.209.344,23		\$ 1.105.323,56		\$ 1.104.020,67		\$ 2.209.344,23	
IVA (Sobre utilidad)								\$ 419.775,40		\$ 210.011,48		\$ 209.763,93		\$ 419.775,40	
A.	TOTAL OBRA							\$ 55.653.381,10		\$ 27.843.100,54		\$ 27.810.280,57		\$ 55.653.381,10	

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO</div>			
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24	FECHA: 26/02/2024
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00		LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP -17	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte, purga red secundaria, suministro e instalación aspersor	UN		\$ 123.414,84		+	9,00	\$ 1.110.733,56		\$ 0,00	9,00	\$ 1.110.733,56	9,00	\$ 1.110.733,56
NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación	ML		\$ 15.500,00		+	19,57	\$ 303.335,00		\$ 0,00	19,57	\$ 303.335,00	19,57	\$ 303.335,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		\$ 15.200,00		+	280,00	\$ 4.256.000,00	166,73	\$ 2.534.296,00	113,27	\$ 1.721.704,00	280,00	\$ 4.256.000,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		\$ 107.414,00		+	4,00	\$ 429.656,00		\$ 0,00	4,00	\$ 429.656,00	4,00	\$ 429.656,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m).	UN		\$ 101.647,00		+	2,00	\$ 203.294,00	2,00	\$ 203.294,00		\$ 0,00	2,00	\$ 203.294,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		\$ 97.327,00		+	26,00	\$ 2.530.502,00	12,00	\$ 1.167.924,00	14,00	\$ 1.362.578,00	26,00	\$ 2.530.502,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		\$ 124.808,00		+	2,00	\$ 249.616,00	2,00	\$ 249.616,00		\$ 0,00	2,00	\$ 249.616,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		\$ 106.099,00		+	23,00	\$ 2.440.277,00	9,00	\$ 954.891,00	14,00	\$ 1.485.386,00	23,00	\$ 2.440.277,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							\$ 11.523.413,56		\$ 5.110.021,00		\$ 6.413.392,56		\$ 11.523.413,56
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 1.958.980,31		\$ 868.703,57		\$ 1.090.276,74		\$ 1.958.980,31
	IMPREVISTOS	3%						\$ 345.702,41		\$ 153.300,63		\$ 192.401,79		\$ 345.702,42
	UTILIDAD	5%						\$ 576.170,68		\$ 255.501,05		\$ 320.669,63		\$ 576.170,68
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 109.472,43		\$ 48.545,20		\$ 60.927,23		\$ 109.472,43
B.	TOTAL NO PREVISTOS							\$ 14.513.739,38		\$ 6.436.071,45		\$ 8.077.667,94		\$ 14.513.739,39
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6 A+B+C							\$ 70.167.120,48		\$ 34.279.171,99		\$ 35.887.948,51		\$ 70.167.120,49
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7													
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.2	Cerramiento provisional en poltsombra. Incluye puertas y accesorios	ML		\$ 19.137,00	\$ 0,00	+	28,00	\$ 535.836,00	15,00	\$ 287.055,00	13,00	\$ 248.781,00	28,00	\$ 535.836,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.956,00	\$ 0,00	+	24,03	\$ 311.332,68	24,03	\$ 311.332,68	0,00	\$ 0,00	24,03	\$ 311.332,68
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		\$ 15.954,00	\$ 0,00	+	16,00	\$ 255.264,00		\$ 0,00	16,00	\$ 255.264,00	16,00	\$ 255.264,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		\$ 18.314,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes,	M2		\$ 13.380,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.934,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 8.090,00	\$ 0,00	+	103,00	\$ 833.270,00	19,00	\$ 153.710,00	84,00	\$ 679.560,00	103,00	\$ 833.270,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 14.438,00	\$ 0,00	+	3,23	\$ 46.634,74		\$ 0,00	3,23	\$ 46.634,74	3,23	\$ 46.634,74
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 21.828,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		\$ 3.686,00	\$ 0,00	+	100,00	\$ 368.600,00	100,00	\$ 368.600,00	0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 368.600,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		\$ 6.103,00	\$ 0,00	+	137,59	\$ 839.711,77	25,00	\$ 152.575,00	112,59	\$ 687.136,77	137,59	\$ 839.711,77

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024 No.4	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72. Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024	
		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 10.997,00	\$ 0,00	+	157,00	\$ 1.726.529,00	85,00	\$ 934.745,00	72,00	\$ 791.784,00	157,00	\$ 1.726.529,00	
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a m de tubería o canaleta.	ML		\$ 2.749,00	\$ 0,00	+	5.760,00	\$ 15.834.240,00		\$ 0,00	5.760,00	\$ 15.834.240,00	5.760,00	\$ 15.834.240,00	
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		\$ 105.138,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		\$ 14.145,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		\$ 19.537,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 14.913,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 289.093,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		\$ 30.082,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		\$ 188.831,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		\$ 18.106,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2		\$ 4.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		\$ 37.009,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		\$ 8.173,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 11.318,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 11.601,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.35	Demolición afinado de psos e=+5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 5.669,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.600,00	\$ 0,00	+	496,15	\$ 5.259.190,00	16,77	\$ 177.762,00	479,38	\$ 5.081.428,00	496,15	\$ 5.259.190,00	
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		\$ 12.152,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 12.703,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.39	Demolición de adoquín. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		\$ 12.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	+	182,21	\$ 1.004.523,73	14,86	\$ 81.923,18	167,35	\$ 922.600,55	182,21	\$ 1.004.523,73	
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposi	ML		\$ 6.487,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 19.241,00	\$ 0,00	+	59,34	\$ 1.141.760,94		\$ 0,00	59,34	\$ 1.141.760,94	59,34	\$ 1.141.760,94	
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposi	M2		\$ 40.606,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposi	M2		\$ 72.398,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructu	M2		\$ 15.067,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		\$ 14.170,00	\$ 0,00	+	51,42	\$ 728.621,40		\$ 0,00	51,42	\$ 728.621,40	51,42	\$ 728.621,40	
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 24.395,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposi	UN		\$ 35.237,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2		\$ 59.197,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposi	ML		\$ 23.322,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposi	M3		\$ 336.257,00	\$ 0,00	+	1,00	\$ 336.257,00		\$ 0,00	1,00	\$ 336.257,00	1,00	\$ 336.257,00	
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 54.128,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 28.687,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 29.343,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 66.596,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA						
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 23.443,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 36.170,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 30.862,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 48.952,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2		\$ 82.887,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3		\$ 213.385,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML		\$ 129.405,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN		\$ 14.475,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN		\$ 234.377,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 3.997,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.219,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.	PAÑETES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML		\$ 12.297,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA								\$ 29.221.771,26		\$ 2.467.702,86		\$ 26.754.068,40		\$ 29.221.771,26	
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 4.967.701,11		\$ 419.509,49		\$ 4.548.191,63		\$ 4.967.701,11	
	IMPREVISTOS	3%						\$ 876.653,14		\$ 74.031,09		\$ 802.622,05		\$ 876.653,14	
	UTILIDAD	5%						\$ 1.461.088,56		\$ 123.385,14		\$ 1.337.703,42		\$ 1.461.088,56	
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 277.606,83		\$ 23.443,18		\$ 254.163,65		\$ 277.606,83	
A.	TOTAL OBRA							\$ 36.804.820,90		\$ 3.108.071,75		\$ 33.696.749,15		\$ 36.804.820,90	
B. NO PREVISTOS															
NO PREVISTOS															
NP.- 1	Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble)	un		\$ 58.007,93		+	391,47	\$ 22.708.364,36		24,03	\$ 1.393.930,56	367,44	\$ 21.314.433,80	391,47	\$ 22.708.364,36
NP.- 2	Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo	un		\$ 74.953,07		+	41,00	\$ 3.073.075,87		41,00	\$ 3.073.075,87		\$ 0,00	41,00	\$ 3.073.075,87
NP.-53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		\$ 96.500,00		+	167,00	\$ 16.115.500,00		167,00	\$ 16.115.500,00		\$ 0,00	167,00	\$ 16.115.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO NP								\$ 41.896.940,23		\$ 20.582.506,43		\$ 21.314.433,80		\$ 41.896.940,23	
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 7.122.479,84		\$ 3.499.026,09		\$ 3.623.453,75		\$ 7.122.479,84	
	IMPREVISTOS	3%						\$ 1.256.908,21		\$ 617.475,19		\$ 639.433,01		\$ 1.256.908,21	
	UTILIDAD	5%						\$ 2.094.847,01		\$ 1.029.125,32		\$ 1.065.721,69		\$ 2.094.847,01	
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 398.020,93		\$ 195.533,81		\$ 202.487,12		\$ 398.020,93	
B.	TOTAL NO PREVISTOS							\$ 52.769.196,22		\$ 25.923.666,85		\$ 26.845.529,37		\$ 52.769.196,22	
	TOTAL EDIFICIO BOLSA PISO 7 A+B									\$ 29.031.738,60		\$ 60.542.278,52		\$ 89.574.017,12	

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
	EDIFICIO CALLE 18													
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		\$ 4.522,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	M2		\$ 13.171,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 38.943,00	\$ 0,00	+	1,00	\$ 38.943,00		\$ 0,00	1,00	\$ 38.943,00	1,00	\$ 38.943,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.956,00	\$ 0,00	+	50,20	\$ 650.391,20		\$ 0,00	50,20	\$ 650.391,20	50,20	\$ 650.391,20
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 16.392,00	\$ 0,00	+	4,00	\$ 65.568,00		\$ 0,00	4,00	\$ 65.568,00	4,00	\$ 65.568,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		\$ 15.954,00	\$ 0,00	+	10,00	\$ 159.540,00		\$ 0,00	10,00	\$ 159.540,00	10,00	\$ 159.540,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2		\$ 13.380,00	\$ 0,00	+	17,97	\$ 240.438,60		\$ 0,00	17,97	\$ 240.438,60	17,97	\$ 240.438,60
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 8.090,00	\$ 0,00	+	204,00	\$ 1.650.360,00	40,00	\$ 323.600,00	164,00	\$ 1.326.760,00	204,00	\$ 1.650.360,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 14.438,00	\$ 0,00	+	3,34	\$ 48.222,92		\$ 0,00	3,34	\$ 48.222,92	3,34	\$ 48.222,92
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de desechos y disposición final)	ML		\$ 3.686,00	\$ 0,00	+	308,69	\$ 1.137.831,34	50,00	\$ 184.300,00	258,69	\$ 953.531,34	308,69	\$ 1.137.831,34
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		\$ 6.103,00	\$ 0,00	+	85,22	\$ 520.097,66	20,00	\$ 122.060,00	65,22	\$ 398.037,66	85,22	\$ 520.097,66
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 10.997,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 2.749,00	\$ 0,00	+	550,85	\$ 1.514.286,65		\$ 0,00	550,85	\$ 1.514.286,65	550,85	\$ 1.514.286,65
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego y disposición final)	UN		\$ 105.138,00	\$ 0,00	+	6,00	\$ 630.828,00	6,00	\$ 630.828,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 630.828,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de desechos y disposición final)	UN		\$ 14.145,00	\$ 0,00	+	4,00	\$ 56.580,00		\$ 0,00	4,00	\$ 56.580,00	4,00	\$ 56.580,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 14.913,00	\$ 0,00	+	718,40	\$ 10.713.499,20		\$ 0,00	718,40	\$ 10.713.499,20	718,40	\$ 10.713.499,20
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		\$ 30.082,00	\$ 0,00	+	49,10	\$ 1.477.026,20		\$ 0,00	49,10	\$ 1.477.026,20	49,10	\$ 1.477.026,20
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		\$ 4.053,00	\$ 0,00	+	289,51	\$ 1.173.384,03	6,02	\$ 24.399,06	283,49	\$ 1.148.984,97	289,51	\$ 1.173.384,03
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	+	177,05	\$ 976.076,65		\$ 0,00	177,05	\$ 976.076,65	177,05	\$ 976.076,65
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 19.241,00	\$ 0,00	+	192,72	\$ 3.708.125,52		\$ 0,00	192,72	\$ 3.708.125,52	192,72	\$ 3.708.125,52
1.46	Desmolción de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, trasiego y disposición final)	M2		\$ 14.170,00	\$ 0,00	+	188,25	\$ 2.667.502,50		\$ 0,00	188,25	\$ 2.667.502,50	188,25	\$ 2.667.502,50
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 24.395,00	\$ 0,00	+	33,74	\$ 823.087,30		\$ 0,00	33,74	\$ 823.087,30	33,74	\$ 823.087,30
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML		\$ 23.322,00	\$ 0,00	+	3,28	\$ 76.496,16		\$ 0,00	3,28	\$ 76.496,16	3,28	\$ 76.496,16
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 28.687,00	\$ 0,00	+	10,80	\$ 309.819,60		\$ 0,00	10,80	\$ 309.819,60	10,80	\$ 309.819,60
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.219,00	\$ 0,00	+	25,71	\$ 314.150,49	25,71	\$ 314.150,49	0,00	\$ 0,00	25,71	\$ 314.150,49

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO									
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
										CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
6.	CONSTRUCCIÓN LIMIANA EN SECO				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		\$ 89.843,00	\$ 0,00	+	516,44	\$ 46.398.518,92	45,25	\$ 4.065.395,75	471,19	\$ 42.333.123,17	516,44	\$ 46.398.518,92	
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano.	ML		\$ 67.096,00	\$ 0,00	+	33,80	\$ 2.267.844,80		\$ 0,00	33,80	\$ 2.267.844,80	33,80	\$ 2.267.844,80	
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo	M2		\$ 80.220,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.7	Frescaca de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		\$ 14.539,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendienteado requeridos)	M2		\$ 33.808,00	\$ 0,00	+	62,93	\$ 2.127.537,44	41,96	\$ 1.418.583,68	20,97	\$ 708.953,76	62,93	\$ 2.127.537,44	
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendienteado requeridos)	M2		\$ 25.035,00	\$ 0,00	+	283,49	\$ 7.097.172,15		\$ 0,00	283,49	\$ 7.097.172,15	283,49	\$ 7.097.172,15	
8.	PAÑETES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		\$ 9.259,00	\$ 0,00	+	19,94	\$ 184.624,46		\$ 0,00	19,94	\$ 184.624,46	19,94	\$ 184.624,46	
9.	CIELO RASOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura)	M2		\$ 85.805,00	\$ 0,00	+	519,28	\$ 44.556.820,40		\$ 0,00	519,28	\$ 44.556.820,40	519,28	\$ 44.556.820,40	
10.	ESTUCO Y PINTURA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 6.566,00	\$ 0,00	+	730,87	\$ 4.798.892,42		\$ 0,00	730,87	\$ 4.798.892,42	730,87	\$ 4.798.892,42	
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 10.648,00	\$ 0,00	+	297,29	\$ 3.165.543,92		\$ 0,00	297,29	\$ 3.165.543,92	297,29	\$ 3.165.543,92	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00	\$ 0,00	+	1.969,14	\$ 29.948.650,26		\$ 0,00	1.969,14	\$ 29.948.650,26	1.969,14	\$ 29.948.650,26	
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 10.887,00	\$ 0,00	+	671,00	\$ 7.305.177,00		\$ 0,00	671,00	\$ 7.305.177,00	671,00	\$ 7.305.177,00	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		\$ 8.447,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno	M2		\$ 146.671,00	\$ 0,00	+	382,06	\$ 56.037.122,26	46,87	\$ 6.874.469,77	335,19	\$ 49.162.652,49	382,06	\$ 56.037.122,26	
11.22	Guardaesoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		\$ 20.556,00	\$ 0,00	+	191,46	\$ 3.935.651,76	138,91	\$ 2.855.433,96	52,55	\$ 1.080.217,80	191,46	\$ 3.935.651,76	
11.33	Meda caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		\$ 51.291,00	\$ 0,00	+	117,96	\$ 6.050.286,36		\$ 0,00	117,96	\$ 6.050.286,36	117,96	\$ 6.050.286,36	
12.	CUBIERTA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2		\$ 62.059,00	\$ 0,00	+	398,85	\$ 24.752.232,15	31,45	\$ 1.951.755,55	367,40	\$ 22.800.476,60	398,85	\$ 24.752.232,15	
14.	CARPINTERIA METÁLICA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		\$ 47.922,00	\$ 0,00	+	76,00	\$ 3.642.072,00	39,00	\$ 1.868.958,00	37,00	\$ 1.773.114,00	76,00	\$ 3.642.072,00	



LETO

“Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”

26/02/2024

El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO : 26/10/2023

\$ 0,00

PLAZO INICIAL	31/12/2023
---------------	------------

494.367.257,00

PLAZO INICIAL	:	01/12/2019
ADICIONAL EN PLAZO N° 1	:	55 días

\$ 0.00

ADICIONAL EN PLAZO NÚM. 1	:	55 días
ADICIONAL EN PLAZO NÚM. 2	:	33 días

\$ 0.00

ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
--------------------------	---	---------

\$ 0.00

PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
-------------	---	-------------------

\$ 0,00
\$ 0,00

FECHA SUSPENSIÓN No. :

\$ 0,00

FECHA REINICIACIÓN No. :

\$ 0,00

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
			CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
+	600,00	\$ 1.831.800,00	600,00	\$ 1.831.800,00	0,00	\$ 0,00	600,00	\$ 1.831.800,00
+	20,00	\$ 613.760,00	20,00	\$ 613.760,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 613.760,00
-	0,00	\$ 0,00	-28,00	\$ 6.442.212,00	28,00	\$ 6.442.212,00	0,00	\$ 0,00
+	88,00	\$ 24.939.112,00	88,00	\$ 24.939.112,00	0,00	\$ 0,00	88,00	\$ 24.939.112,00
+	42,00	\$ 5.962.068,00	42,00	\$ 5.962.068,00	0,00	\$ 0,00	42,00	\$ 5.962.068,00
+	71,37	\$ 5.211.294,66	71,37	\$ 5.211.294,66	0,00	\$ 0,00	71,37	\$ 5.211.294,66
+	1.830,00	\$ 13.924.470,00	1.830,00	\$ 13.924.470,00	0,00	\$ 0,00	1.830,00	\$ 13.924.470,00
				\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
+	36,00	\$ 3.118.104,00	36,00	\$ 3.118.104,00	0,00	\$ 0,00	36,00	\$ 3.118.104,00
	\$ 326.821.009,98			\$ 69.792.330,92		\$ 257.028.679,06		\$ 326.821.009,98
	\$ 55.559.571,70			\$ 11.864.696,26		\$ 43.694.875,44		\$ 55.559.571,70
	\$ 9.804.630,30			\$ 2.093.769,93		\$ 7.710.860,37		\$ 9.804.630,30
	\$ 16.341.050,50			\$ 3.489.616,55		\$ 12.851.433,95		\$ 16.341.050,50
	\$ 3.104.799,59			\$ 663.027,14		\$ 2.441.772,45		\$ 3.104.799,59
-	0,00	\$ 411.631.062,07		\$ 87.903.440,79	0,00	\$ 323.727.621,28	0,00	\$ 411.631.062,07
-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
+	147,39	\$ 1.002.252,00		\$ 0,00	147,39	\$ 1.002.252,00	147,39	\$ 1.002.252,00
+	15,76	\$ 129.090,16		\$ 0,00	15,76	\$ 129.090,16	15,76	\$ 129.090,16
+	56,11	\$ 430.767,13	41,97	\$ 322.211,66	14,14	\$ 108.555,47	56,11	\$ 430.767,13
+	16,85	\$ 761.704,25		\$ 0,00	16,85	\$ 761.704,25	16,85	\$ 761.704,25
-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
+	1,00	\$ 144.596,10		\$ 0,00	1,00	\$ 144.596,10	1,00	\$ 144.596,10
+	1.000,00	\$ 15.200.000,00	1.000,00	\$ 15.200.000,00		\$ 0,00	1.000,00	\$ 15.200.000,00
+	3,00	\$ 304.941,00	3,00	\$ 304.941,00		\$ 0,00	3,00	\$ 304.941,00
+	7,00	\$ 873.656,00	7,00	\$ 873.656,00		\$ 0,00	7,00	\$ 873.656,00
+	76,00	\$ 8.428.020,00	76,00	\$ 8.428.020,00		\$ 0,00	76,00	\$ 8.428.020,00
	\$ 27.275.026,64			\$ 25.128.828,66		\$ 2.146.197,98		\$ 27.275.026,64

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4		PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA :	\$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
	VR. ADICIONAL No. 1 :	\$ 1.154.367.257,00	
	VR. ADICIONAL No. :	\$ 0,00	
	VR. TOTAL :	\$ 3.494.367.257,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO	ANTICIPO \$ 0,00 :	\$ 0,00	
	AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ :	\$ 0,00	
	SALDO ANTERIOR AMORTIZACION :	\$ 0,00	
	TOTAL AMORTIZADO :	\$ 0,00	
	SALDO POR LEGALIZAR :	\$ 0,00	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 4.636.754,53		\$ 4.271.900,87		\$ 364.853,66		\$ 4.636.754,53
	IMPREVISTOS	3%						\$ 818.250,80		\$ 753.864,86		\$ 64.385,94		\$ 818.250,80
	UTILIDAD	5%						\$ 1.363.751,33		\$ 1.256.441,43		\$ 107.309,90		\$ 1.363.751,33
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 259.112,75		\$ 238.723,87		\$ 20.388,88		\$ 259.112,75
B.	TOTAL NO PREVISTOS DELCOP				\$ 0,00	-	0,00	\$ 34.352.896,05		\$ 31.649.759,70	0,00	\$ 2.703.136,35	0,00	\$ 34.352.896,05
	TOTAL DELCOP A+B							\$ 445.983.958,12		\$ 119.553.200,50		\$ 326.430.757,63		\$ 445.983.958,12
ICIO	PALACIO DE JUSTICIA													
	SECRETARIA SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2													
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.600,00	\$ 0,00	+	143,94	\$ 1.525.764,00		\$ 0,00	143,94	\$ 1.525.764,00	143,94	\$ 1.525.764,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	+	31,27	\$ 172.391,51		\$ 0,00	31,27	\$ 172.391,51	31,27	\$ 172.391,51
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS					-	0,00	\$ 0,00						
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendentado requeridos)	M2		\$ 33.808,00	\$ 0,00	+	143,94	\$ 4.866.323,52		\$ 0,00	143,94	\$ 4.866.323,52	143,94	\$ 4.866.323,52
8.	PAÑETES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		\$ 9.259,00	\$ 0,00	+	4,69	\$ 43.424,71		\$ 0,00	4,69	\$ 43.424,71	4,69	\$ 43.424,71
10.	ESTUCCO Y PINTURA					-	0,00	\$ 0,00						
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 6.566,00	\$ 0,00	+	76,51	\$ 502.364,66		\$ 0,00	76,51	\$ 502.364,66	76,51	\$ 502.364,66
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00		+	300,48	\$ 4.570.000,32		\$ 0,00	300,48	\$ 4.570.000,32	300,48	\$ 4.570.000,32
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 10.887,00	\$ 0,00	+	118,12	\$ 1.285.972,44		\$ 0,00	118,12	\$ 1.285.972,44	118,12	\$ 1.285.972,44
11.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		\$ 146.671,00	\$ 0,00	+	143,94	\$ 21.111.823,74		\$ 0,00	143,94	\$ 21.111.823,74	143,94	\$ 21.111.823,74
11.22	Guardaesoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 20.556,00	\$ 20.556,00	+	52,55	\$ 1.080.217,80		\$ 0,00	52,55	\$ 1.080.217,80	52,55	\$ 1.080.217,80
22.	ASEO Y VARIOS					-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		\$ 2.922,00	\$ 0,00	+	143,94	\$ 420.592,68		\$ 0,00	143,94	\$ 420.592,68	143,94	\$ 420.592,68
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 0,00			\$ 35.578.875,38		\$ 0,00		\$ 35.578.875,38		\$ 35.578.875,38
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 6.048.408,81		\$ 0,00		\$ 6.048.408,81		\$ 6.048.408,81
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 1.067.366,26		\$ 0,00		\$ 1.067.366,26		\$ 1.067.366,26
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 1.778.943,77		\$ 0,00		\$ 1.778.943,77		\$ 1.778.943,77
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 337.999,32		\$ 0,00		\$ 337.999,32		\$ 337.999,32
A.	TOTAL OBRA CIVIL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2				\$ 0,00			\$ 44.811.593,54		\$ 0,00	0,00	\$ 44.811.593,54	0,00	\$ 44.811.593,54
	TOTAL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2 A							\$ 44.811.593,54		\$ 0,00		\$ 44.811.593,54		\$ 44.811.593,54

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024		
			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)		
	SALA PLENA CORTE SUPREMA															
22.	ASEO Y VARIOS					-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		\$ 2.922,00	\$ 0,00	+	200,00	\$ 584.400,00		\$ 0,00	200,00	\$ 584.400,00	200,00	\$ 584.400,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			\$ 2.922,00				\$ 584.400,00		\$ 0,00		\$ 584.400,00		\$ 584.400,00		
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 99.348,00		\$ 0,00		\$ 99.348,00		\$ 99.348,00		
	IMPREVISTOS	3%						\$ 17.532,00		\$ 0,00		\$ 17.532,00		\$ 17.532,00		
	UTILIDAD	5%						\$ 29.220,00		\$ 0,00		\$ 29.220,00		\$ 29.220,00		
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 5.551,80		\$ 0,00		\$ 5.551,80		\$ 5.551,80		
A.	TOTAL OBRA S.P. CORTE SUPREMA							\$ 736.051,80		\$ 0,00		\$ 736.051,80		\$ 736.051,80		
NP	NO PREVISTOS															
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		\$ 1.971.000,00		+	18,00	\$ 35.478.000,00		\$ 0,00	18,00	\$ 35.478.000,00	18,00	\$ 35.478.000,00		
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		\$ 480.000,00		+	181,27	\$ 87.009.600,00		\$ 0,00	181,27	\$ 87.009.600,00	181,27	\$ 87.009.600,00		
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		+	48,42	\$ 11.862.900,00		\$ 0,00	48,42	\$ 11.862.900,00	48,42	\$ 11.862.900,00		
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		+	59,28	\$ 14.523.600,00		\$ 0,00	59,28	\$ 14.523.600,00	59,28	\$ 14.523.600,00		
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		\$ 2.241.000,00		+	10,00	\$ 22.410.000,00		\$ 0,00	10,00	\$ 22.410.000,00	10,00	\$ 22.410.000,00		
	TOTAL C. DIRECTO N.P. OBRA S.P. CORTE SUPREMA				\$ 0,00			\$ 171.284.100,00		\$ 0,00		\$ 171.284.100,00		\$ 171.284.100,00		
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 29.118.297,00		\$ 0,00		\$ 29.118.297,00		\$ 29.118.297,00		
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 5.138.523,00		\$ 0,00		\$ 5.138.523,00		\$ 5.138.523,00		
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 8.564.205,00		\$ 0,00		\$ 8.564.205,00		\$ 8.564.205,00		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 1.627.198,95		\$ 0,00		\$ 1.627.198,95		\$ 1.627.198,95		
B.	TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE SUPREMA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 215.732.323,95		\$ 0,00	0,00	\$ 215.732.323,95	0,00	\$ 215.732.323,95		
	TOTAL SALA PLENA CORTE SUPREMA A+B							\$ 216.468.375,75		\$ 0,00		\$ 216.468.375,75		\$ 216.468.375,75		
SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO																
10.	ESTUCCO Y PINTURA															
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
22.	ASEO Y VARIOS					-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		\$ 2.922,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P. CONSEJO DE ESTADO				\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".			
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4 <div>PERIODO MES / AÑO<div>feb-24</div>FECHA:<div>26/02/2024</div></div>			
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA	:	\$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024
	VR. ADICIONAL No. 1	:	\$ 1.154.367.257,00	
	VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	
	VR. TOTAL	:	\$ 3.494.367.257,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO	ANTICIPO \$ 0,00	:	\$ 0,00	
	AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____	:	\$ 0,00	
	SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	\$ 0,00	
	TOTAL AMORTIZADO	:	\$ 0,00	
	SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA									
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(÷-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL					
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)				
	UTIIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
A.	TOTALOBRA S.P. CONSEJO DE ESTADO				\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
B	NO PREVISTOS																	
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		\$ 1.971.000,00		+	14,00	\$ 27.594.000,00	8,00	\$ 15.768.000,00	6,00	\$ 11.826.000,00	14,00	\$ 27.594.000,00				
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		\$ 480.000,00		+	101,52	\$ 48.729.600,00	38,07	\$ 18.273.600,00	63,45	\$ 30.456.000,00	101,52	\$ 48.729.600,00				
NP -23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		+	43,01	\$ 10.537.450,00	26,88	\$ 6.585.600,00	16,13	\$ 3.951.850,00	43,01	\$ 10.537.450,00				
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		+	48,00	\$ 11.760.000,00	30,00	\$ 7.350.000,00	18,00	\$ 4.410.000,00	48,00	\$ 11.760.000,00				
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		\$ 2.241.000,00		+	6,00	\$ 13.446.000,00	6,00	\$ 13.446.000,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 13.446.000,00				
NP -26	Restauración cenefa en madera	ML		\$ 61.000,00		+	48,00	\$ 2.928.000,00	6,00	\$ 366.000,00	42,00	\$ 2.562.000,00	48,00	\$ 2.928.000,00				
NP -27	Mantenimiento ventana Balcón	M2		\$ 180.000,00		+	10,00	\$ 1.800.000,00	10,00	\$ 1.800.000,00		\$ 0,00	10,00	\$ 1.800.000,00				
NP -28	Restauración piso en madera	M2		\$ 116.000,00		+	60,00	\$ 6.960.000,00		\$ 0,00	60,00	\$ 6.960.000,00	60,00	\$ 6.960.000,00				
NP -29	Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa	ML		\$ 102.500,00		+	30,00	\$ 3.075.000,00	30,00	\$ 3.075.000,00		\$ 0,00	30,00	\$ 3.075.000,00				
NP -30	Mantenimiento de cielo raso en madera	M2		\$ 61.800,00		+	100,00	\$ 6.180.000,00	100,00	\$ 6.180.000,00		\$ 0,00	100,00	\$ 6.180.000,00				
B.	TOTAL COSTO DIRECTO NP CONSEJO DE ESTADO				\$ 0,00			\$ 133.010.050,00		\$ 72.844.200,00		\$ 60.165.850,00		\$ 133.010.050,00				
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 22.611.708,50		\$ 12.383.514,00		\$ 10.228.194,50		\$ 22.611.708,50				
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 3.990.301,50		\$ 2.185.326,00		\$ 1.804.975,50		\$ 3.990.301,50				
	UTIIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 6.650.502,50		\$ 3.642.210,00		\$ 3.008.292,50		\$ 6.650.502,50				
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 1.263.595,48		\$ 692.019,90		\$ 571.575,58		\$ 1.263.595,48				
B.	TOTALN.P. SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO				\$ 0,00	-	0,00	\$ 167.526.157,98		\$ 91.747.269,90	0,00	\$ 75.778.888,08	0,00	\$ 167.526.157,98				
	TOTAL SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO A+B							167.526.158		\$ 91.747.269,90		\$ 75.778.888,08		\$ 167.526.157,98				
SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL																		
10.	ESTUCO Y PINTURA																	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
22.	ASEO Y VARIOS					-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		\$ 2.922,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
A.	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CORTE CONSTITUCIONAL				\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
	UTIIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00				
A.	TOTALOBRA S.P. CORTE CONSTITUCIONAL				\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJ "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO	
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24 FECHA: 26/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
NP	NO PREVISTOS													
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		\$ 1.971.000,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		\$ 480.000,00		+	5,36	\$ 2.572.800,00	5,36	\$ 2.572.800,00		\$ 0,00	5,36	\$ 2.572.800,00
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		\$ 245.000,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		\$ 2.241.000,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		\$ 61.000,00		-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP - 33	Restauración tarima (2,40 rx 1,22 mt)	un		\$ 1.185.104,00		+	1,00	\$ 1.185.104,00	1,00	\$ 1.185.104,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.185.104,00
B.	TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL				\$ 0,00			\$ 3.757.904,00		\$ 3.757.904,00		\$ 0,00		\$ 3.757.904,00
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 638.843,68		\$ 638.843,68		\$ 0,00		\$ 638.843,68
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 112.737,12		\$ 112.737,12		\$ 0,00		\$ 112.737,12
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 187.895,20		\$ 187.895,20		\$ 0,00		\$ 187.895,20
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 35.700,09		\$ 35.700,09		\$ 0,00		\$ 35.700,09
B.	TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL				\$ 0,00	-	0,00	\$ 4.733.080,09		\$ 4.733.080,09	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.733.080,09
	TOTAL SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL A+B							\$ 4.733.080,09		\$ 4.733.080,09		\$ 0,00		\$ 4.733.080,09
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
NO PREVISTOS														
NP -32	Restauración sillas	UN		\$ 717.300,00		+	4,00	\$ 2.869.200,00	4,00	\$ 2.869.200,00		\$ 0,00	4,00	\$ 2.869.200,00
B.	TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL				\$ 0,00			\$ 2.869.200,00		\$ 2.869.200,00		\$ 0,00		\$ 2.869.200,00
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 487.764,00		\$ 487.764,00		\$ 0,00		\$ 487.764,00
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 86.076,00		\$ 86.076,00		\$ 0,00		\$ 86.076,00
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 143.460,00		\$ 143.460,00		\$ 0,00		\$ 143.460,00
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 27.257,40		\$ 27.257,40		\$ 0,00		\$ 27.257,40
B.	TOTAL N.P. S.P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 3.613.757,40		\$ 3.613.757,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.613.757,40
	TOTAL S. P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA A+B							3.613.757,40		3.613.757,40		0,00		3.613.757,40

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial". ETO		
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4	PERIODO MES / AÑO feb-24	FECHA: 26/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
ASCENSORES DE PALACIO														
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		\$ 89.843,00	\$ 0,00	+	5,76	\$ 517.495,68	5,76	\$ 517.495,68		\$ 0,00	5,76	\$ 517.495,68
14.	CARPINTERIA METALICA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		\$ 47.922,00	\$ 0,00	+	16,00	\$ 766.752,00	16,00	\$ 766.752,00		\$ 0,00	16,00	\$ 766.752,00
19	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		\$ 141.896,00	\$ 0,00	+	17,00	\$ 2.412.232,00	17,00	\$ 2.412.232,00		\$ 0,00	17,00	\$ 2.412.232,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		\$ 283.399,00	\$ 0,00	+	17,00	\$ 4.817.783,00	17,00	\$ 4.817.783,00		\$ 0,00	17,00	\$ 4.817.783,00
A.	COSTO DIRECTO ASCENSORES				\$ 0,00			\$ 8.514.262,68		\$ 8.514.262,68		\$ 0,00		\$ 8.514.262,68
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 1.447.424,66		\$ 1.447.424,66		\$ 0,00		\$ 1.447.424,66
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 255.427,88		\$ 255.427,88		\$ 0,00		\$ 255.427,88
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 425.713,13		\$ 425.713,13		\$ 0,00		\$ 425.713,13
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 80.885,50		\$ 80.885,50		\$ 0,00		\$ 80.885,50
A.	TOTAL ASCENSORES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 10.723.713,85		\$ 10.723.713,85		\$ 0,00	0,00	\$ 10.723.713,85
	NO PREVISTOS													
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m).	UN		\$ 101.647,00		+	1,00	\$ 101.647,00	1,00	\$ 101.647,00		\$ 0,00	1,00	\$ 101.647,00
B.	TOTAL COSTO DIRECTO NP ASCENSORES				\$ 0,00			\$ 101.647,00		\$ 101.647,00		\$ 0,00		\$ 101.647,00
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00			\$ 17.279,99		\$ 17.279,99		\$ 0,00		\$ 17.279,99
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00			\$ 3.049,41		\$ 3.049,41		\$ 0,00		\$ 3.049,41
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00			\$ 5.082,35		\$ 5.082,35		\$ 0,00		\$ 5.082,35
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00			\$ 965,65		\$ 965,65		\$ 0,00		\$ 965,65
B.	TOTAL N.P. ASCENSORES				\$ 0,00	-	0,00	\$ 128.024,40		\$ 128.024,40		\$ 0,00	0,00	\$ 128.024,40
	TOTAL ASCENSORES							10.851.738		10.851.738,24		0,00		10.851.738,24



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023
OBJETO "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.4PERIODO MES / AÑOfeb-24FECHA:26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00
VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00
VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00
VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00

ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. : \$ 0,00
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00
TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00
SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente
FECHA INICIO : 26/10/2023
PLAZO INICIAL : 31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días
PLAZO TOTAL : 5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No. :
FECHA REINICIACIÓN No. :
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/04/2024

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					
\$ 0,00					
A. I. U. 25%					
ADMINISTRACIÓN 17% \$ 0,00					
IMPREVISTOS 3% \$ 0,00					
UTILIDAD 5% \$ 0,00					
IVA 19% \$ 0,00					
A. TOTAL OBRA CIVIL \$ 0,00					

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°4	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
			CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD VALOR (\$)	CANTIDAD VR. EJECUTADO (\$)
		\$ 356.618.533,21		\$ 114.489.091,00		\$ 465.350.570,21
		\$ 60.625.150,65		\$ 19.463.145,47		\$ 79.109.596,94
		\$ 10.698.556,00		\$ 3.434.672,73		\$ 13.960.517,11
		\$ 17.830.926,66		\$ 5.724.454,55		\$ 23.267.528,51
		\$ 3.387.876,07		\$ 1.087.646,36		\$ 4.420.830,42
		\$ 449.161.042,58		\$ 144.199.010,11		\$ 586.109.043,18

TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS

A. I. U. 25%

ADMINISTRACIÓN 17% \$ 0,00

IMPREVISTOS 3% \$ 0,00

UTILIDAD 5% \$ 0,00

IVA 19% \$ 0,00

B. TOTAL OBRAS NO PREVISTAS \$ 0,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO \$ 0,00

IVA 19% \$ 0,00

C. TOTAL MOBILIARIO \$ 0,00

VALOR TOTAL \$ 0,00

\$ 849.101.698,90

\$ 323.449.278,11

\$ 771.047.578,76

\$ 1.094.496.856,88


VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

\$ 323.449.278,11

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$ 323.449.278,11 SON: TRESCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOSCON ONCE CENTAVOS



FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA



JHONY FERNEY DÍAZ DAZA
Representante Legal
CONSORCIO LOCATIVO
CONTRATISTA

CODIGO: F-000-000

Versión: 00
COPIA CONTROLADA

Pág. 32 de 33

IESUMEN ACTA N°1 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO DELCOP	SECRETARIA P2	S.P.C.S. JUSTICIA	S.P. C. ESTADO	S.P.C. CONSTITUCIONAL	S.P.C.S. JUDICATURA	ASCENSORES	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 11.608.323,29	\$ 22.106.471,25	\$ 2.467.702,86	\$ 69.792.330,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8.514.262,68	\$ 114.489.091,00
ADMINISTRACION 17%	\$ 1.973.414,96	\$ 3.758.100,11	\$ 419.509,49	\$ 11.864.696,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 1.447.424,66	\$ 19.463.145,47
IMPREVISTOS 3%	\$ 348.249,70	\$ 663.194,14	\$ 74.031,09	\$ 2.093.769,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 255.427,88	\$ 3.434.672,73
UTILIDAD 5%	\$ 580.416,16	\$ 1.105.323,56	\$ 123.385,14	\$ 3.489.616,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 425.713,13	\$ 5.724.454,55
IVA 19%	\$ 110.279,07	\$ 210.011,48	\$ 23.443,18	\$ 663.027,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 80.885,50	\$ 1.087.646,36
TOTAL	\$ 14.620.683,18	\$ 27.843.100,54	\$ 3.108.071,75	\$ 87.903.440,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.723.713,85	\$ 144.199.010,11
COSTO DIRECTO N.P	\$ 11.924.286,00	\$ 5.110.021,00	\$ 20.582.506,43	\$ 25.128.828,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.844.200,00	\$ 3.757.904,00	\$ 2.869.200,00	\$ 101.647,00	\$ 142.318.593,09
ADMINISTRACION 17%	\$ 2.027.128,62	\$ 868.703,57	\$ 3.499.026,09	\$ 4.271.900,87		\$ 0,00	\$ 12.383.514,00	\$ 638.843,68	\$ 487.764,00	\$ 17.279,99	\$ 24.194.160,83
IMPREVISTOS 3%	\$ 357.728,58	\$ 153.300,63	\$ 617.475,19	\$ 753.864,86		\$ 0,00	\$ 2.185.326,00	\$ 112.737,12	\$ 86.076,00	\$ 3.049,41	\$ 4.269.557,79
UTILIDAD 5%	\$ 596.214,30	\$ 255.501,05	\$ 1.029.125,32	\$ 1.256.441,43		\$ 0,00	\$ 3.642.210,00	\$ 187.895,20	\$ 143.460,00	\$ 5.082,35	\$ 7.115.929,65
IVA 19%	\$ 113.280,72	\$ 48.545,20	\$ 195.533,81	\$ 238.723,87		\$ 0,00	\$ 692.019,90	\$ 35.700,09	\$ 27.257,40	\$ 965,65	\$ 1.352.026,63
TOTAL	\$ 15.018.638,22	\$ 6.436.071,45	\$ 25.923.666,85	\$ 31.649.759,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.747.269,90	\$ 4.733.080,09	\$ 3.613.757,40	\$ 128.024,40	\$ 179.250.268,00
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00					\$ 0,00
IVA 19%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00								\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.941,00		\$ 0,00					\$ 304.941,00
IVA 19%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00								\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.941,00
	\$ 29.639.321,40	\$ 34.279.171,99	\$ 29.031.738,60	\$ 119.553.200,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.747.269,90	\$ 4.733.080,09	\$ 3.613.757,40	\$ 10.851.738,24	\$ 323.448.278,11



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
PRORROGA 2 : Hasta el 24 de abril de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 24 de abril de 2024.
PERIODO DE CORTE : 26 de enero de 2024 – 26 febrero de 2024

Valor Contrato de Obra	\$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	\$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

ACTA No. 01 de Obra	\$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	\$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	\$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	\$ 22.372.203,87
ACTA No. 03 de Obra	\$ 358.366.837,83
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.	\$ 34.023.212,80
ACTA No. 04 de Obra	\$ 323.449.278,11
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA.	\$ 30.708.152,82

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	\$ 222.158.720,00	
Valor adiciones	\$ 111.079.360,00	
Valor total del Contrato	\$ 333.238.080,00	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		\$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		\$ 22.372.203,87
Acta Parcial No. 03 Interventoría		\$ 34.023.212,80
Acta Parcial No. 04 Interventoría		\$ 30.708.152,82
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		\$ 103.911.119,96
SALDO POR EJECUTAR		\$ 229.326.960,04

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FERNANDO JIMENEZ POLO', is written over a horizontal line.

FERNANDO JIMÉNEZ POLO

Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

8. FACTURA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 68

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 17:13
Expedición	04/04/2024, 17:13
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE ENERO 2024 AL 26 FEBRERO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	30,708,152.82

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta millones setecientos ocho mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 30,708,152.82

Observaciones:

CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#\$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

Total Bruto	25,805,170.44
IVA 19%	4,902,982.38
Total a Pagar	30,708,152.82

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764062620423 aprobado en 20231226 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL CUIFE: d082f87585b23a9b3de53dbc86f0e177cff012aaecaf48f3e8cfb6f6f5386b1620e38b874be5ecf99046be84460e981c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9. RUT

CONSORCIO TI 125


TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 0 3 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico

LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 0 0 4 6 2 5

45. Teléfono 2

3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 7 1 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 0 3 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2, 0 6, 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2, 0 8, 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 3 5 6 5 4 5 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 1 2, 3 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 2 0 3 5 1

9

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 4 2 1 7 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido POLO	106. Primer nombre FERNANDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 6 9 8 9 8 7 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BELTRAN	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre MIYER
107. Otros nombres FABIO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 6 2 0 3 5 1

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

TOTAL INC SAS BIC

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 47 A # 93 41

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79553539 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización TOTAL INC SAS BIC

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 2 - 1 2 - 2 9 / 1 3 : 1 3 : 2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
TOTALL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com




CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal .

TOTALL INC SAS BIC



OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836

T.P. 122845-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122845-T

OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 92101836

RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD DELITO DE COLOMBIA

FECHA 30/11/2006

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

132929



191122

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqg.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.101.836**

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS
OLGA LUCIA

NOMBRES

Olga Lucia Lopez Garcia

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1972**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F D B B 3 7 5 0 9 1 0 B 3 4 6 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	\$27,161,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																									\$90,580,000	\$14,666,800			\$90,580,000	\$3,551,200			\$90,580,000	\$3,551,200			\$90,580,000	\$5,368,800			\$0	\$0			\$27,138,000
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (5 Afiliados)																									\$14,400,000	\$2,358,000			\$14,400,000	\$504,000			\$14,400,000	\$504,000			\$14,400,000	\$66,000			\$0	\$0			\$3,432,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																									\$14,400,000	\$2,358,000			\$14,400,000	\$504,000			\$14,400,000	\$504,000			\$14,400,000	\$66,000			\$0	\$0			\$3,432,000
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900				
2	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER																	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900				
3	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA									X								25-14	10	\$1,800,000	\$306,000	EPS005	10	\$1,800,000	\$0	CCF22	10	\$1,800,000	\$0	14-25	10	\$1,800,000	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$306,000				
4	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA																	25-14	20	\$3,600,000	\$612,000	EPS005	20	\$3,600,000	\$144,000	CCF22	20	\$3,600,000	\$144,000	14-25	20	\$3,600,000	0.522%	\$18,800	20	\$0	\$0	Si	\$918,800				
5	CC	1032455696	PUERTO BURBANO SAUL ANDRES																	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	0.522%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$980,900				
6	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500				

Centro de Trabajo: RUESTO 5 TARIFA 6.960 (26 Afiliados)																\$76,180,000	\$12,308,800			\$76,180,000	\$3,047,200			\$76,180,000	\$3,047,200			\$76,180,000		\$5,302,800		\$0	\$0		\$23,706,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)																\$76,180,000	\$12,308,800			\$76,180,000	\$3,047,200			\$76,180,000	\$3,047,200			\$76,180,000		\$5,302,800		\$0	\$0		\$23,706,000
7	CC	1015423618	BAQUERO CORREDOR CRISTIAN CAMILO											23030 1	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS008	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF22	30	\$2,700,000	\$108,000	14-25	30	\$2,700,000	6.960%	\$188,000	30	\$0	\$0	Si	\$836,000
8	CC	27602678	BECERRA BARRIOS CARLA MARIA											23020 1	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS010	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-25	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900
9	CC	1069898787	BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO											23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
10	CC	1014218889	CASTILLO RAMIREZ LAURA CATALINA											23020 1	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
11	CC	1033778496	CORREA BELLIDO LUDWIG											23030 1	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
12	CC	80844754	CORTES PERDOMO FREDDY ALEXANDER	X										23020 1	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
13	CC	77013726	DIAZ MARTINEZ EOBALDO JOSE											23030 1	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	6.960%	\$278,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,238,400
14	CC	22618946	DIAZ CHARRIS MERLIN PAOLA	X										23030 1	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300
15	CC	1090403332	DUARTE DIAZ EDISON RICARDO											23030 1	30	\$4,580,000	\$732,800	EPS005	30	\$4,580,000	\$183,200	CCF22	30	\$4,580,000	\$183,200	14-25	30	\$4,580,000	6.960%	\$318,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,418,000
16	CC	22521379	DURANGO TIRADO PAULA TATIANA											23020 1	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-25	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900
17	CC	52227017	ESPINOSA VIRGUEZ MARIA PIEDAD											25-14	30	\$5,150,000	\$824,000	EPS005	30	\$5,150,000	\$206,000	CCF22	30	\$5,150,000	\$206,000	14-25	30	\$5,150,000	6.960%	\$358,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,594,500
18	CC	1075236242	GUANARITA DIAZ KATHERINE											23020 1	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-25	30	\$2,600,000	6.960%	\$181,000	30	\$0	\$0	Si	\$805,000
19	CC	79658715	GUZMAN ORJUELA WILSON ANTONIO											23030 1	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS037	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-25	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900
20	CC	17345352	LOPEZ FORERO EFRAIN RICARDO											23030 1	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
21	CC	1103948825	MACARENO MERCADO MAURICIO MIGUEL											23030 1	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
22	CC	1192746178	MARULANDA FONSECA ANA VICTORIA											23030 1	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
23	CC	1075252894	MONROY PASCUAS BRAYAN FELIPE											23020 1	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300
24	CC	79955903	MORALES RIVERA JUAN CARLOS				X							25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
25	CC	1120574429	OSPINA LOPEZ MARILYN											23030 1	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
26	CC	1006997716	PERDOMO CAMPAÑA KEVIN DARIO	X										23030 1	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
27	CC	3759678	REDONDO PEÑA ALEXIS											23020 1	30	\$5,150,000	\$824,000	EPS008	30	\$5,150,000	\$206,000	CCF22	30	\$5,150,000	\$206,000	14-25	30	\$5,150,000	6.960%	\$358,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,594,500
28	CC	79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO											25-14	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS017	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF22	30	\$2,700,000	\$108,000	14-25	30	\$2,700,000	6.960%	\$188,000	30	\$0	\$0	Si	\$836,000
29	CC	79553539	SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO											25-14	30	\$12,000,000	\$2,040,000	EPS005	30	\$12,000,000	\$480,000	CCF22	30	\$12,000,000	\$480,000	14-25	30	\$12,000,000	6.960%	\$835,200	30	\$0	\$0	Si	\$3,835,200
30	CC	1004278785	SALAZAR CAPARROSO VALENTINA	X										23030 1	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
31	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS											23030 1	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
32	CC	1130607369	SOLARTE ROSERO DUBER STIVEN											23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
Total Afiliados(31)																\$90,580,000	\$14,666,800			\$90,580,000	\$3,551,200			\$90,580,000	\$3,551,200			\$90,580,000	\$5,368,800		\$0	\$0		\$27,138,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA		1	\$27,161,900
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					31	\$14,666,800	\$12,800	\$0		\$14,679,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$200	\$0		\$208,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$4,854,000	\$4,300	\$0		\$4,858,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	16	\$6,364,800	\$5,500	\$0		\$6,370,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$3,240,000	\$2,800	\$0		\$3,242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					31	\$5,368,800	\$4,600	\$0		\$5,373,400
COLMENA		14-25	800,226,175	3	31	\$5,368,800	\$4,600	\$0		\$5,373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					31	\$3,551,200	\$3,100	\$0		\$3,554,300
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	31	\$3,551,200	\$3,100	\$0		\$3,554,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					31	\$3,551,200	\$3,400	\$0		\$3,554,600
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$378,000	\$400	\$0		\$378,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	4	\$384,000	\$400	\$0		\$384,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$328,000	\$300	\$0		\$328,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	7	\$596,000	\$600	\$0		\$596,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$60,000	\$100	\$0		\$60,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	12	\$1,805,200	\$1,600	\$0		\$1,806,800
TOTAL					31	\$27,138,000	\$23,900	\$0		\$27,161,900



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	478973324	9463607272	I	2024/03/18	2024/02/27	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,602,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,700	\$0	\$0	\$62,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$62,700	\$0	\$0	\$62,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000	
TOTAL				1	\$3,602,700	\$0	\$0	\$3,602,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	\$604,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes												
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,665,000		\$603,200		\$0	\$0			\$603,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$6,865,000		\$477,900		\$0	\$0			\$477,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$6,865,000		\$477,900		\$0	\$0			\$477,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500														
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500														
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO							X											0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$4,265,000	6.960%	\$296,900	0	\$0	\$0	No	\$296,900														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,800,000		\$125,300		\$0	\$0			\$125,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,800,000		\$125,300		\$0	\$0			\$125,300
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	0	\$0	\$0	No	\$125,300														
Total Afiliados(4)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,665,000		\$603,200		\$0	\$0			\$603,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	\$604,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$603,200	\$1,100	\$0	\$604,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$603,200	\$1,100	\$0	\$604,300
TOTAL				4	\$603,200	\$1,100	\$0	\$604,300



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821
FECHA RADICADO:	16/02/2024 , 24/01/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTAL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos



Bogotá D.C, Febrero 29 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de febrero de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, febrero 29 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de febrero de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, febrero 29 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de febrero de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5


“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

14. INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

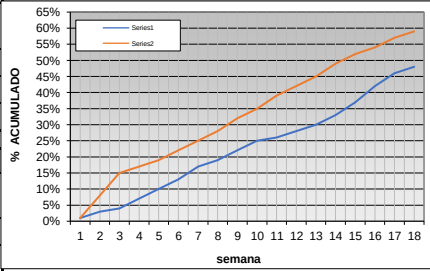Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administraci3n Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACI3N GENERAL																																																																																												
INFORME MENSUAL No. 4 Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dıas																																																																																												
LOCALIZACI3N DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogot4 D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandıa", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogot4, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023																																																																																										
2. INFORMACI3N CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORıA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="2">TOTAL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="2">CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICI3N 1:</td><td>\$</td><td>111.079.360,00</td><td>VALOR ADICI3N 1:</td><td>\$</td><td>1.154.367.257,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICI3N 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICI3N 2:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>333.238.080,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>3.494.367.257,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">66 dıas</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">66 dıas</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2">121 dıas</td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2">121 dıas</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSI3N:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE SUSPENSI3N:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACI3N:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE REINICIACI3N:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACI3N:</td><td colspan="2">26 DE OCTUBRE DE 2023</td><td>FECHA DE INICIACI3N:</td><td colspan="2">26 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACI3N:</td><td colspan="2">31 DE DICIEMBRE 2023</td><td>FECHA DE TERMINACI3N:</td><td colspan="2">24 DE FEBRERO DE 2024</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>109.521.471,25 32,87%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>1.148.452.911,14 32,87%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>223.716.608,75 67,13%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>2.345.914.345,86 67,13%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORıA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOTAL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO		CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023		VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00	VALOR INICIAL:	\$	2.340.000.000,00	VALOR ADICI3N 1:	\$	111.079.360,00	VALOR ADICI3N 1:	\$	1.154.367.257,00	VALOR ADICI3N 2:	\$	-	VALOR ADICI3N 2:	\$	-	VALOR ACTUALIZADO:	\$	333.238.080,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	3.494.367.257,00	PLAZO INICIAL:	66 dıas		PLAZO INICIAL:	66 dıas		PLAZO ACTUALIZADO:	121 dıas		PLAZO ACTUALIZADO:	121 dıas		FECHA DE SUSPENSI3N:			FECHA DE SUSPENSI3N:			FECHA DE REINICIACI3N:			FECHA DE REINICIACI3N:			FECHA DE INICIACI3N:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACI3N:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE TERMINACI3N:	31 DE DICIEMBRE 2023		FECHA DE TERMINACI3N:	24 DE FEBRERO DE 2024		VALOR EJECUTADO:	\$	109.521.471,25 32,87%	VALOR EJECUTADO:	\$	1.148.452.911,14 32,87%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	223.716.608,75 67,13%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	2.345.914.345,86 67,13%
CONTRATO DE INTERVENTORıA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOTAL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																								
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																								
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00	VALOR INICIAL:	\$	2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICI3N 1:	\$	111.079.360,00	VALOR ADICI3N 1:	\$	1.154.367.257,00																																																																																							
VALOR ADICI3N 2:	\$	-	VALOR ADICI3N 2:	\$	-																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	333.238.080,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	3.494.367.257,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:	66 dıas		PLAZO INICIAL:	66 dıas																																																																																								
PLAZO ACTUALIZADO:	121 dıas		PLAZO ACTUALIZADO:	121 dıas																																																																																								
FECHA DE SUSPENSI3N:			FECHA DE SUSPENSI3N:																																																																																									
FECHA DE REINICIACI3N:			FECHA DE REINICIACI3N:																																																																																									
FECHA DE INICIACI3N:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACI3N:	26 DE OCTUBRE DE 2023																																																																																								
FECHA DE TERMINACI3N:	31 DE DICIEMBRE 2023		FECHA DE TERMINACI3N:	24 DE FEBRERO DE 2024																																																																																								
VALOR EJECUTADO:	\$	109.521.471,25 32,87%	VALOR EJECUTADO:	\$	1.148.452.911,14 32,87%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	223.716.608,75 67,13%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	2.345.914.345,86 67,13%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS P3BLICOS																																																																																												
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCI3N DEL ESTADO	FECHA DE APROBACI3N Y/O CONEXI3N																																																																																										
ADICI3N PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 2	24/02/2024																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACI3N																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FıSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA</th><th>% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>33,00%</td><td>49,00%</td><td>16,00%</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>15,00%</td><td>10,00%</td><td>-5,00%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>48,00%</td><td>59,00%</td><td>11,00%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Total Contractual</th><th>Transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>181</td><td>123</td><td>58</td><td>20</td></tr></table>			AVANCE FıSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	33,00%	49,00%	16,00%	Durante el periodo	15,00%	10,00%	-5,00%	Acumulado Actual	48,00%	59,00%	11,00%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	181	123	58	20																																																										
AVANCE FıSICO DEL CONTRATO																																																																																												
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado anterior	33,00%	49,00%	16,00%																																																																																									
Durante el periodo	15,00%	10,00%	-5,00%																																																																																									
Acumulado Actual	48,00%	59,00%	11,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																									
181	123	58	20																																																																																									
																																																																																												

Informe Ejecutivo Mensual		Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administraci3n Judicial Unidad Administrativa		 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
INFORME MENSUAL No. 4		Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:		N/A	
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIA DE CONSTRUCCION No		N/A	
		FECHA DE EXPEDICION		26/11/2023	
		No. DE RADICACION			
		VIGENCIA			
ACTIVIDADES EJECUTADAS					
Se evidencio que se realiza la instalaci3n de la red electrica para el alumbrado de lamparas en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de cielo raso en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza el lijado y pintura del cielo raso el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza el lijado y pintura en los muros de mamposteria y Superboards en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla estabonada en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza la instalaci3n de tuberia electrica en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza la media caña en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de imprimante asfaltico en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza la instalaci3n del manto de impermeabilizaci3n en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de la red electrica para la iluminaci3n en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza el desmonte de la tuberia electrica en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de tuberia electrica en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se reorganiza los tableros electricos en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de estructura metalica para cielo raso en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de guardaesquinas en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencio que se realiza el desmonte de mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de las puertas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifica que se entrega la muestra de los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifica que se realiza la instalaci3n de cableado electrico y cable UTP para iluminaci3n en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencio que se realiza la restauraci3n de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza el desmonte de zocalo en la sala plena del consejo de estado.					
Se evidencio que se realiza el desmonte de cornisa en la sala plena del consejo de estado.					
Se evidencio que se realiza el desmonte de listones de fijaciones en la sala plena del consejo de estado.					
Se evidencio que se realiza la instalaci3n de piso laminado SPC en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla estabonada en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza la instalaci3n de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalaci3n de manto en la terraza en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18					
Se evidencio que se realiza el desmonte de la tuberia electrica en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18					

Informe Ejecutivo Mensual		Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa			
1. INFORMACIÓN GENERAL					
INFORME MENSUAL No. 4		Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024		PERIODO: 6 meses y 1 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:		N/A	
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIA DE CONSTRUCCION No		N/A	
		FECHA DE EXPEDICION		26/11/2023	
		No. DE RADICACION			
		VIGENCIA			
Se evidencia que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza el resane de los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 8 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza la regata en el piso en la sala plena del consejo de estado.					
Se evidencia que se realiza la instalación de tubería para red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de lámparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de red eléctrica para lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación del guardaescocha en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la nivelación de piso con mortero en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la aplicación de pintura en los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de puertas de aluminio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 8 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de puestos de trabajos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el desmonte de canalera en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.					
Se evidencia que se realiza la fundida de las regatas para la tubería de red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la demolición del piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación del guardaescocha en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se evidencia que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18					
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 8 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de canalera para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de lámparas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el cerramiento en lona en el Sotano del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.					
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.					


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
1. INFORMACIÓN GENERAL		
<div>INFORME MENSUAL No. <u>4</u> Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días</div>		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA
REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div></div>		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
1. INFORMACIÓN GENERAL		
<div>INFORME MENSUAL No. <u>4</u> Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días</div>		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
		
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		

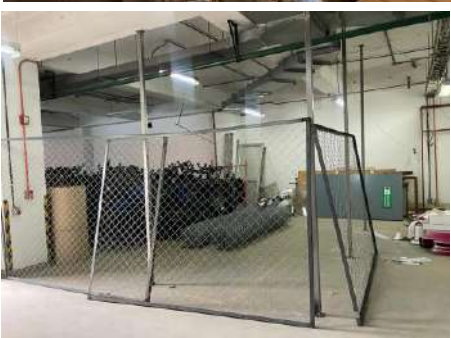Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. 4	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
		
		
		
		



Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. 4	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
		
		
		


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
		
		
		
		


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		
		


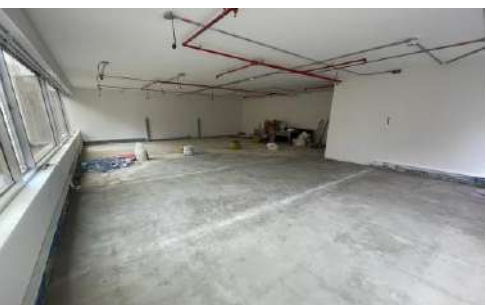
Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
<div></div>		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. <u>4</u>	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
		
		
		
		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	
1. INFORMACIÓN GENERAL		
INFORME MENSUAL No. 4	Del 26 de enero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días	Al 26 de febrero de 2024
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023
<div></div>		

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa			
1. INFORMACIÓN GENERAL				
INFORME MENSUAL No. 4 Del 26 de enero de 2024 Al 26 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA			
4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)				
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)		GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO		
MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN (\$)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA (\$)	INDICADOR (%)	
1	\$ 200.000.613	\$ 177.034.096	5,07%	
2	\$ 415.024.749	\$ 412.680.741	11,81%	
3	\$ 639.924.485	\$ 771.047.579	22,07%	
4	\$ 1.298.478.093	\$ 1.148.452.911	32,87%	
	\$ 2.093.537.188	-		
	\$ 3.243.151.260	-		
VALOR TOTAL	\$ -	\$ 1.148.452.911,14	32,87%	
5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES	
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X			
TIENE RECLAMACIONES		X		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X			
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA				
INTERVENTORIA		SUPERVISION		
 FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORIA		 DANIEL MERCHAN CEPEDA Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN		

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26-ENE AL 26-FEB 2024



“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”

26/02/2024

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: GES-FO-015 Versión:2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021</p>
--	---	--

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de enero al 26 de febrero de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 26 de febrero de 2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de enero al 26 de febrero de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de febrero 2024	INFORME No.	4
---------------	--------------------	--------------------	---

PERIODO No.	1	DEL:	26 de enero 2024	AL:	26 de febrero de 2024
--------------------	---	-------------	------------------	------------	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL 2024
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	121 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	120 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : \$ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR: \$ 1.154.367.257,00

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL 2024
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	121 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	120 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : \$ 222.158.720,00
VALOR ADICIONES:	CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA VALOR: \$ 111.079.360

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 15, del 29 de enero al 04 de febrero de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza la instalación de la red eléctrica para el alumbrado de lámparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza el lijado y pintura del cielo raso el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el lijado y pintura en los muros de mampostería y Superboards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18

Se evidencio que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la media caña en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de imprimante asfáltico en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación del manto de impermeabilización en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de la red eléctrica para la iluminación en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables eléctricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se reorganiza los tableros eléctricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la nivelación de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de guarda escobas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza el desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: GES-FO-015 Versión:2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021</p>
--	---	--

Se evidencio que se realiza el desmonte de mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el desmonte de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el desmonte de las puertas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se entrega la muestra de los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado eléctrico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP para iluminación en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Se verifico que se realiza el desmonte de zócalo en la sala plena del consejo de estado.

Se evidencio que se realiza el desmonte de cornisa en la sala plena del consejo de estado.

Se evidencio que se realiza el desmonte de listones de fijaciones en la sala plena del consejo de estado.

No. 16, del 05 de febrero al 11 de febrero de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de manto en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables eléctricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el resane de los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el desmonte de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: GES-FO-015 Versión:2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021</p>
--	---	--

Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza la demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la demolición de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa. Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Se verifica que se realiza la regata en piso en la sala plena del consejo de estado.

Se evidencio que se realiza la instalación de tubería para red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.

No. 17, del 12 de febrero al 18 de febrero de 2024

ACTIVIDADES

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de lámparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de red eléctrica para lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación del guarda escoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la nivelación de piso con mortero en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: GES-FO-015 Versión:2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021</p>
--	---	--

Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la aplicación de pintura en los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el desmonte de puertas de aluminio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de puestos de trabajos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa. Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.

Se evidencio que se realiza la fundida de las regatas para la tubería de red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: GES-FO-015 Versión:2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021</p>
--	---	--

No. 18, del 19 de febrero al 25 de febrero de 2024

ACTIVIDADES

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la demolición del piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación del guarda escoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de lámparas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se realiza el cerramiento en lona en el Sótano del edificio de la Bolsa.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del cuarto (4) mes, del proyecto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL”, según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES ENERO - FEBRERO 2024	
No.15	del 29 de enero de 2024 al 04 de febrero de 2024
No.16	del 05 de febrero de 2024 al 11 de febrero de 2024
No.17	del 12 de febrero de 2024 al 18 de febrero de 2024
No.18	del 19 de febrero de 2024 al 25 de febrero de 2024

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 26 de febrero de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo a Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	80
Maestro de Obra	Robinson Villamil Rojas	Técnico	Mano de obra calificada/activo	100

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Inspector de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Juan Sebastián Torres Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 4.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	\$ 177.034.095,76
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	\$ 235.646.645,17
Corte de obra No 3	26 enero 2024	\$ 358.366.837,82
Corte de obra No 4	26 febrero 2024	\$ 323.449.278,11
TOTAL A CANCELAR		\$ 323.449.278,11

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 24/08/2024	\$351.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 24/02/2027	\$351.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 1 día.	\$585.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 1 día.	\$585.000.000,00	23/02/204	26/02/2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 24/04/2024	\$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 24/04/2024	\$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 24/04/2024	\$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 24/04/2024	\$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 24/04/2024	\$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 24/08/2024	\$ 44.431.744	29/01/2024	05/02/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 24/02/2027	\$ 22.215.872	29/01/2024	05/02/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	24/02/2024 – 24/02/2029	\$ 44.431.744	29/01/2024	05/02/2024

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
30/01/2024	Avance de obra	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	Presencial	8:30 am	10:15 am
15/02/2024	Avance de ejecución	ALMACÉN CALLE 18	Presencial	8:00 am	12:15 pm

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2024 al 26 de febrero de 2024.

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	29/01/2024	TOTAL-112-CL-020	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	29/01/2024	TOTAL-112-CL-021	Solicitud de NPs y documentación para prorroga.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
3	31/01/2024	TOTAL-112-RJ-040	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
4	1/02/2024	TOTAL-112-CL-022	ATRASO EJECUCION CRONOGRAMA DE OBRA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
5	5/02/2024	TOTAL-112-RJ-041	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
6	6/02/2024	TOTAL-112-RJ-042	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
7	9/02/2024	TOTAL-112-RJ-043	Ingreso de personal contratista y vehículos	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
8	12/02/2024	TOTAL-112-CL-023	NUEVO LLAMADO DE ATENCION Y REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
9	15/02/2024	TOTAL-112-RJ-044	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
10	15/02/2024	TOTAL-112-RJ-045	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
11	20/02/2024	TOTAL-112-RJ-046	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
12	21/02/2024	TOTAL-112-RJ-046	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
13	21/02/2024	TOTAL-112-RJ-047	Entrega Hojas de Vida de Interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
14	22/02/2024	TOTAL-112-RJ-047	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
15	22/02/2024	TOTAL-112-RJ-048	Entrega Hojas de Vida de Interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS BIC	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

12.2 RECIBIDA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/01/2024	CONLOCATIVO-CE-085	Solicitud prórroga y adición contratos de obra N° 088-2023, Documentos anexos	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
2	29/01/2024	CONLOCATIVO-CE-081	Solicitud autorización de ingreso de vehículo, notificación inicio de actividades de mobiliario edificio bolsa.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
3	30/01/2024	CONLOCATIVO-CE-082	Solicitud autorización de ingreso de personal del 31 de enero al 29 de febrero de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
4	31/01/2024	CONLOCATIVO-CE-083	SOLICITUD PROGRAMACION INSPECCION ASCENSORES EDIFICIO ANEXO	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
5	1/02/2024	CONLOCATIVO-CE-084	Solicitud autorización de ingreso de personal fin de semana 03 y 04 de febrero de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
6	1/02/2024	44	Contratos 088 y 112-2023. Trabajos fin de semana	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
7	2/02/2024	CONLOCATIVO-CE-087	Solicitud autorización de ingreso de personal edificio Palacio de Justicia.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
8	4/02/2024	CONLOCATIVO-CE-088	Solicitud autorización de ingreso de personal edificio Palacio de Justicia.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
9	5/02/2024	47	Contratos 088 y 112-2023. Observaciones a ACTA de NPs No. 2	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
10	6/02/2024	CONLOCATIVO-CE-089	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE PAGOS FACTURAS FELC1 Y FELC3.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
11	7/02/2024	CONLOCATIVO-CE-090	Solicitud autorización de ingreso de personal edificio bolsa.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
12	7/02/2024	CONLOCATIVO-CE-091	Solicitud autorización de ingreso de personal edificio bolsa.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic


	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--



13	7/02/2024	48	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud adecuación piso 7 Bolsa.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
14	8/02/2024	CONLOCATIVO-CE-092	Solicitud autorización de ingreso de personal.	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
15	9/02/2024	CONLOCATIVO-CE-093	Entrega diseño eléctrico y de iluminación edificio Bolsa de Bogotá	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
16	13/02/2024	CONLOCATIVO-CE-095	Solicitud gestión de permisos de ingreso del personal CONLOCATIVO-	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
17	13/02/2024	50	Contratos 088 y 112-2023. Evaluar avance de obra.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
18	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-096	Solicitud autorización de ingreso de personal y vehiculos	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
19	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-096	Solicitud selección switch a instalar	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
20	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-097	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE PAGOS FACTURAS FELC1 Y FELC3.	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
21	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-098	RESPUESTA COMUNICADO No. TOTALL-112-CL-023.	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
22	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-098	Solicitud autorización de ingreso de personal y motocicleta	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
23	14/02/2024	CONLOCATIVO-CE-099	Entrega de informe mensual de avance N°3 y ejecutivo N°3	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
24	15/02/2024	CONLOCATIVO-CE-100	Solicitud autorización de ingreso de personal y vehículo	Jhong Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--



25	19/02/2024	CONLOCATIVO-CE-100	Entrega acta entrega mobiliario almacén N1	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bto
26	19/02/2024	CONLOCATIVO-CE-102	Presentación de opciones de switches	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bto
27	20/02/2024	CONLOCATIVO-CE-105	Agendamiento operadores de ascensores para intervención.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bto
28	21/02/2024	CONLOCATIVO-CE-104	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bto
29	22/02/2024	CONLOCATIVO-CE-106	Entrega de diseños eléctricos calle 18 pisos 1 y 3.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bto
30	23/02/2024	CONLOCATIVO-CE-107	Entrega pólizas ajustadas con otrosí No. 2.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bto
31	26/02/2024	CONLOCATIVO-CE-108	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bto

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO


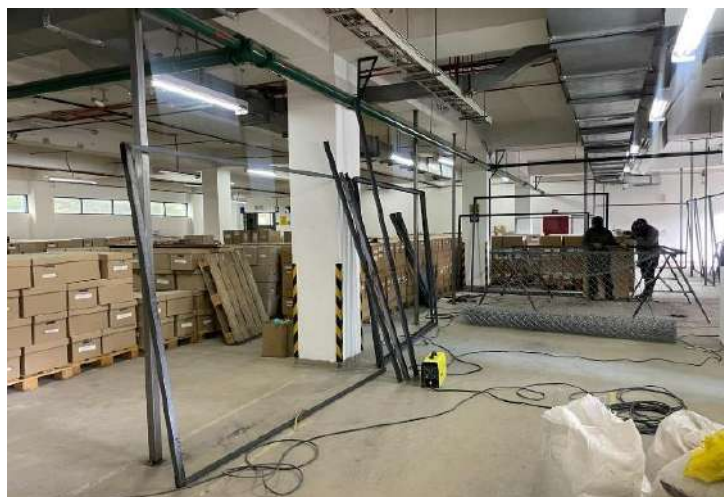


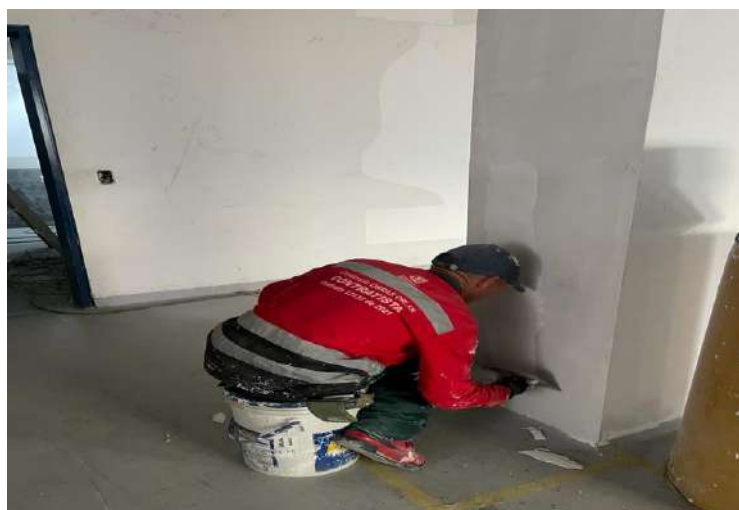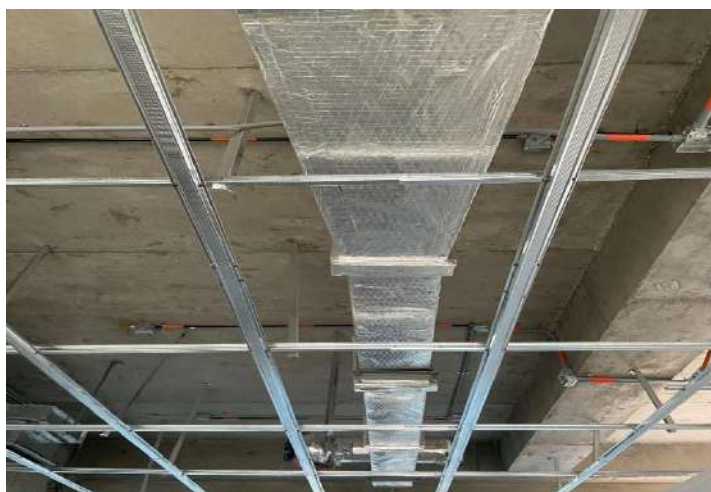





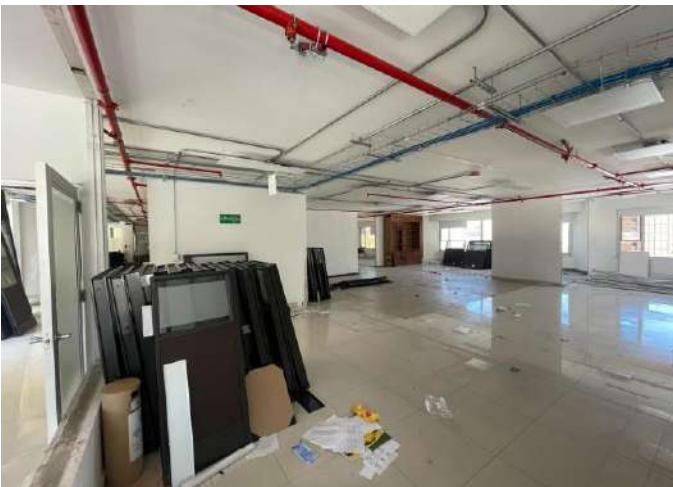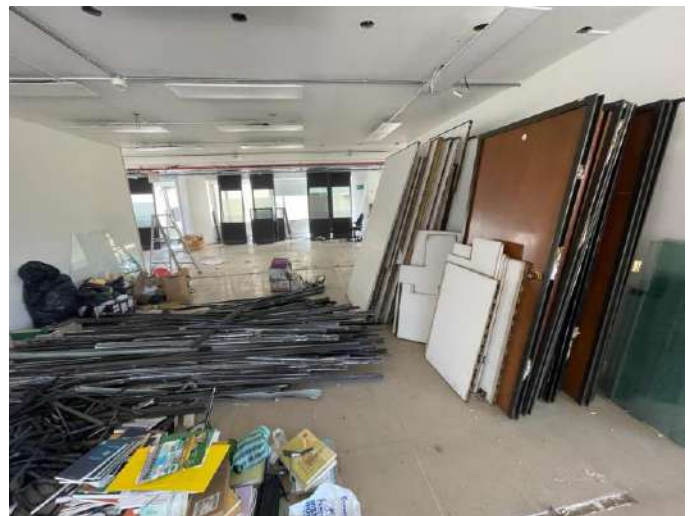




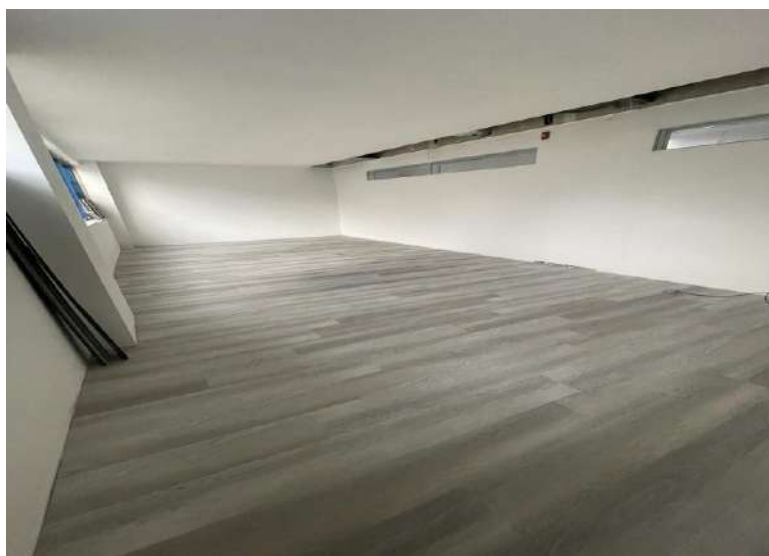
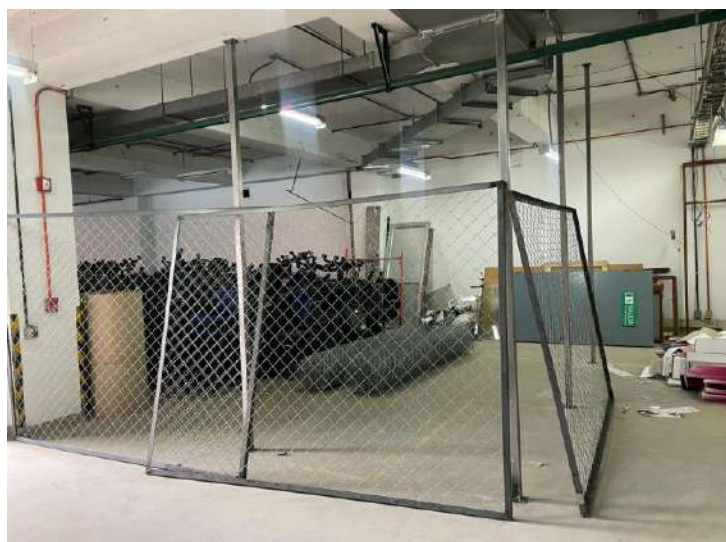


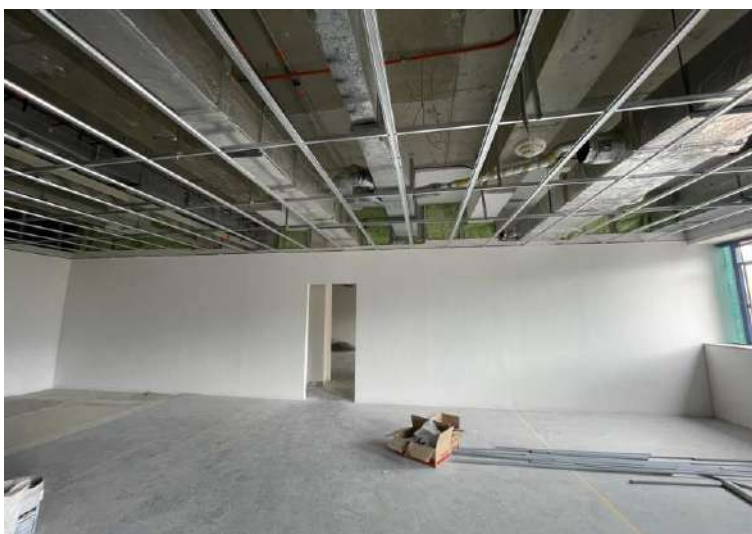

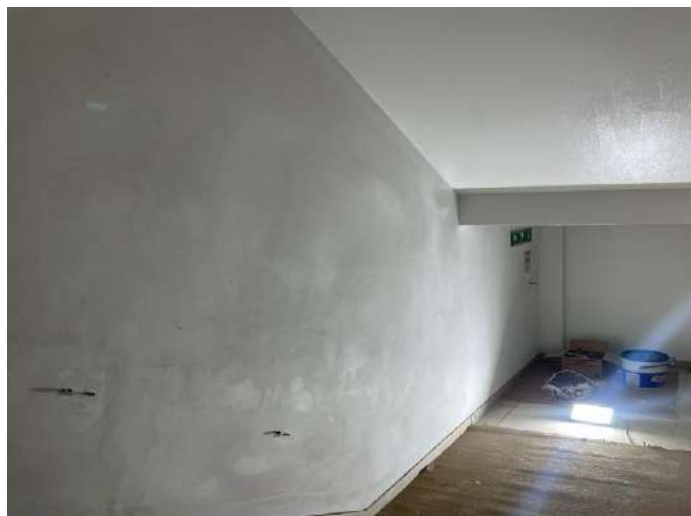



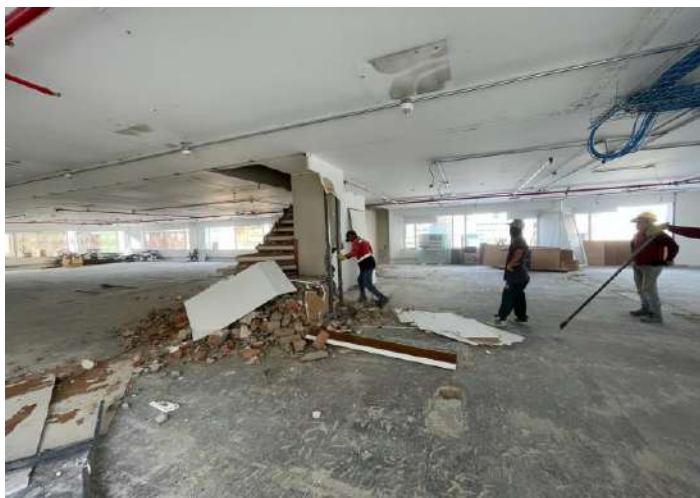





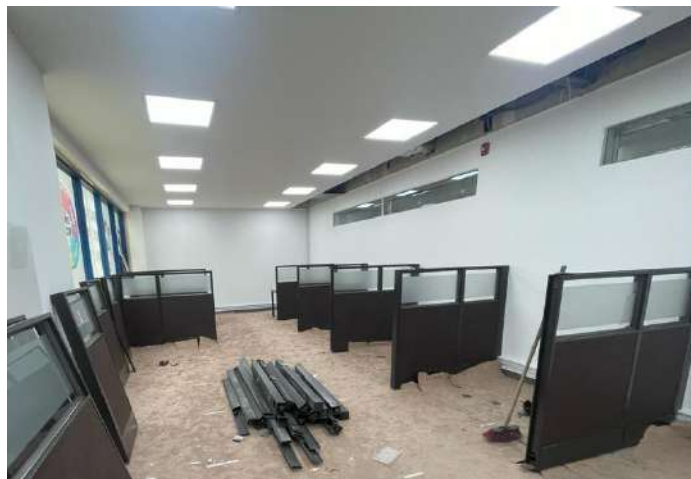
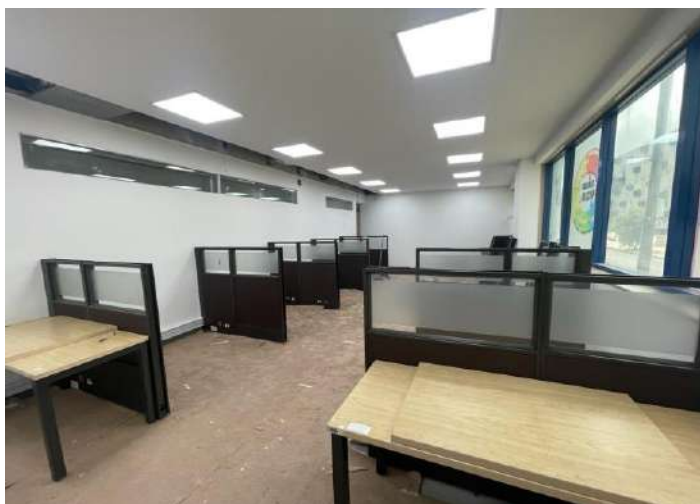





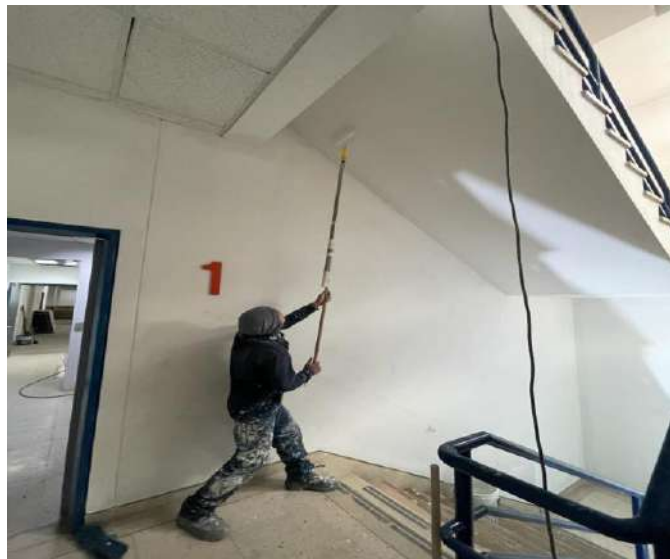


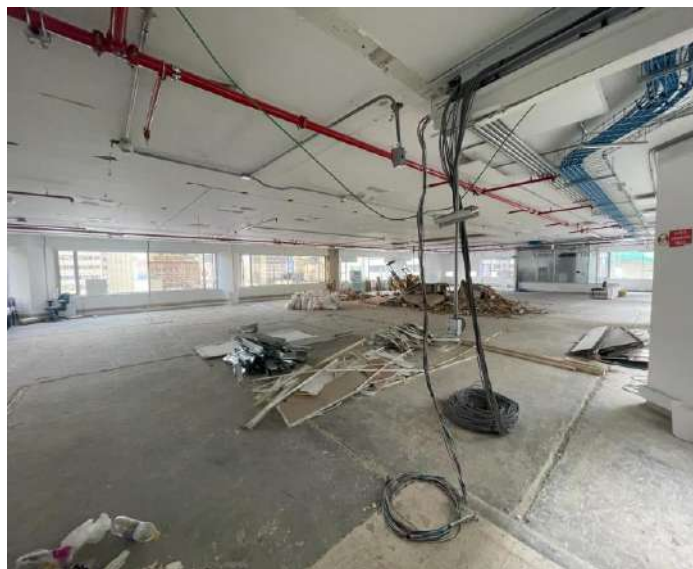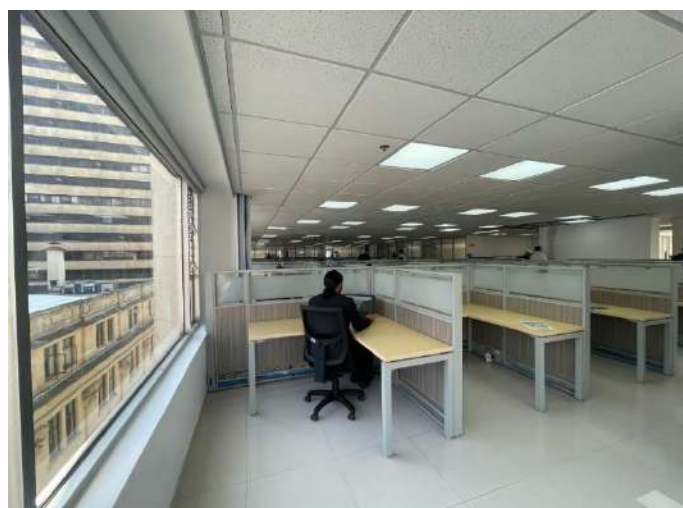

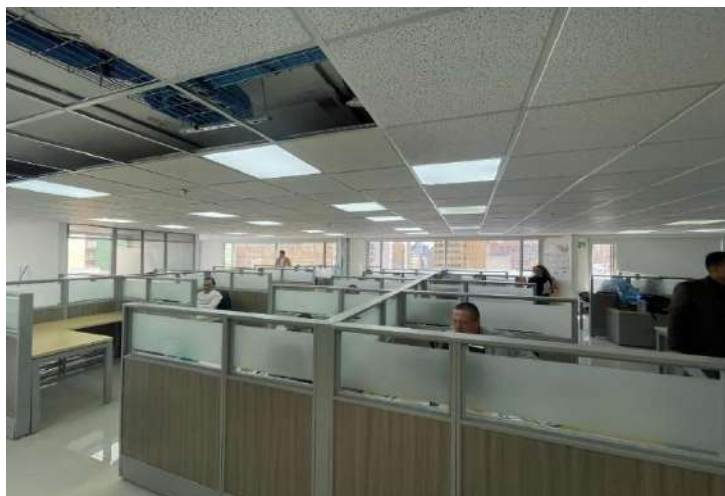


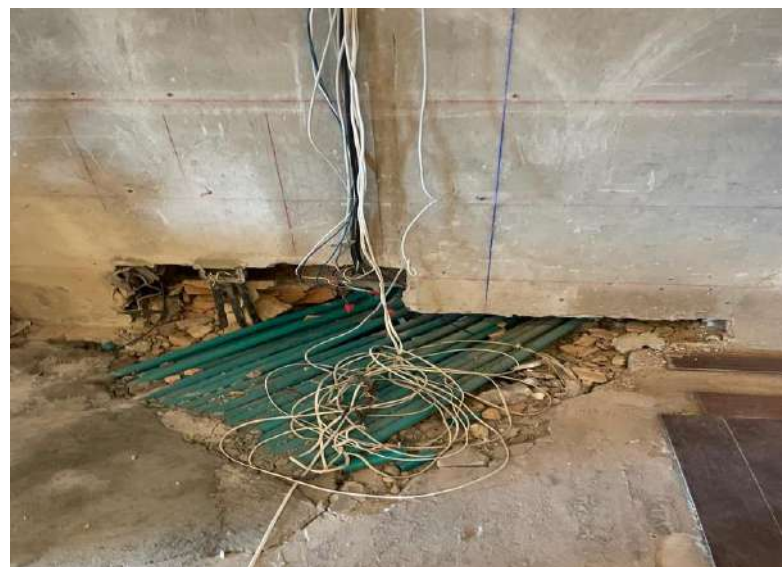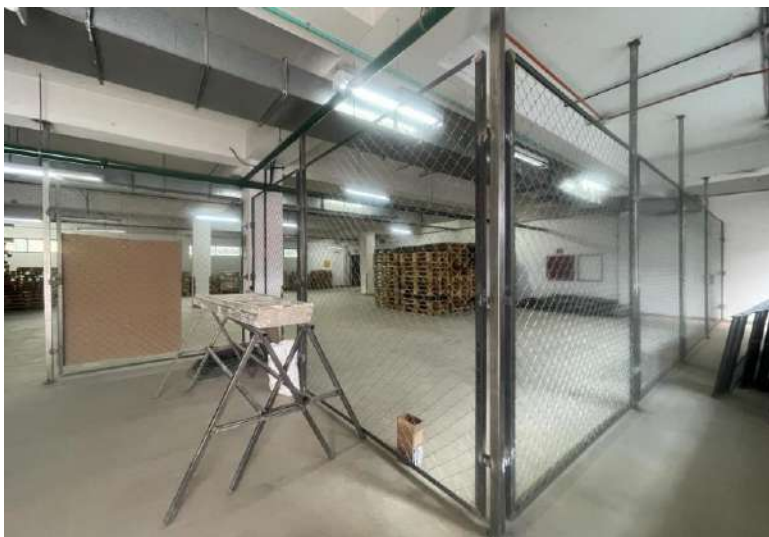

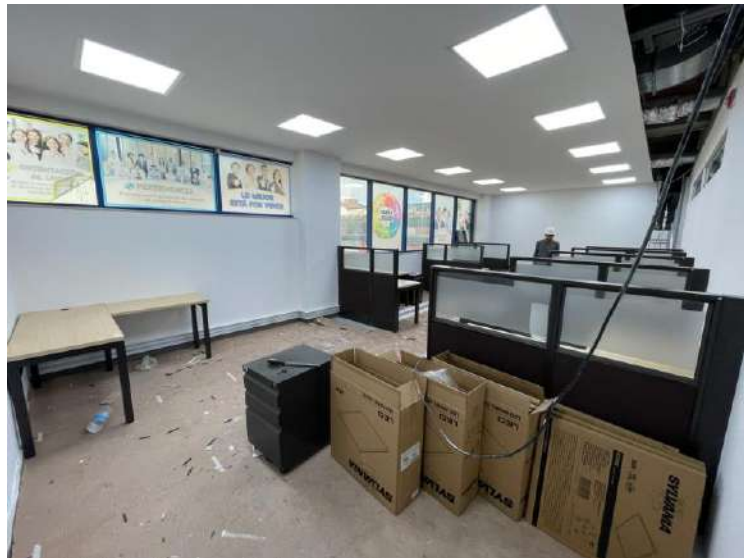

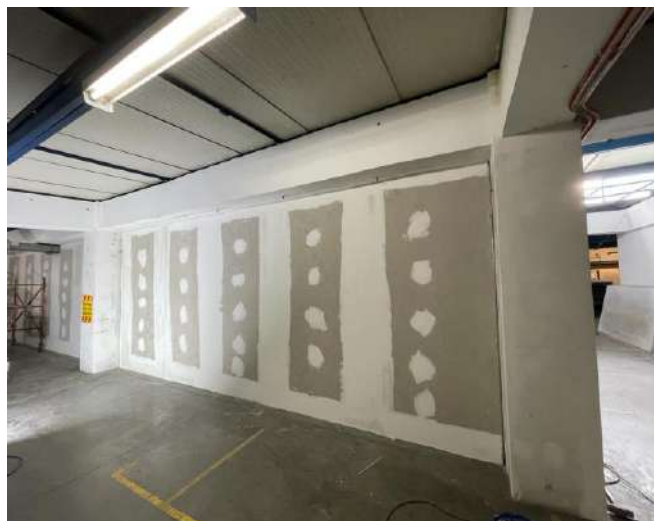



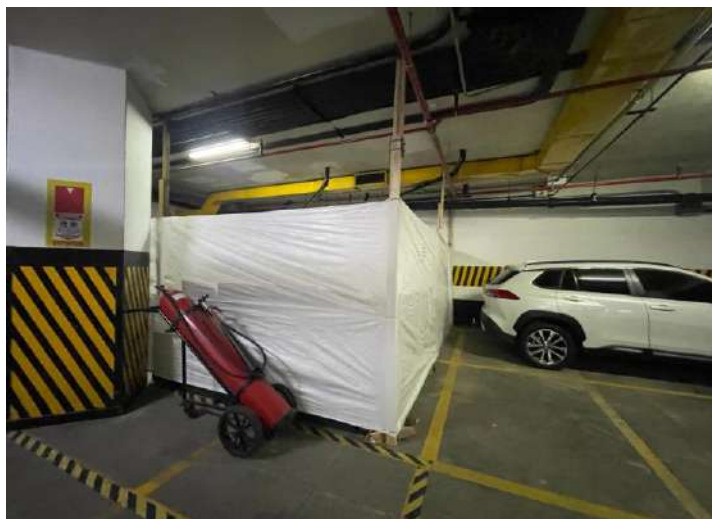



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: GES-FO-015
Versión:2
Fecha de aprobación:
26-Feb-2021

14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.

FERNANDO JIMENEZ POLO

Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

ANEXOS:

1	ANEXO 1	Informes Semanales de Interventoría
2	ANEXO 2	Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
3	ANEXO 3	Control Aportes Legales y Seguridad Social
4	ANEXO 4	Comités del Periodo
5	ANEXO 5	Informes de Especialistas
6	ANEXO 6	Acreditación Paz y Salvo Parafiscales



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: GES-FO-015
Versión:2
Fecha de aprobación:
26-Feb-2021

ANEXO 1 Informes Semanales de Interventoría



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: GES-FO-015
Versión:2
Fecha de aprobación:
26-Feb-2021

ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría

ANEXO 3 Control Aportes Legales y Seguridad Social

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

ANEXO 4 Comités de Seguimiento



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: GES-FO-015
Versión:2
Fecha de aprobación:
26-Feb-2021

ANEXO 5 Informes de los Especialistas

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Admsintrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
---------------------------	---	--

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 15	Del 29 de enero de 2024	Al 4 de febrero de 2024
PERIODO: 6 meses y 1 días		
OBJETO		
Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00	VALOR INICIAL:	\$	2.340.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:		
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	2.340.000.000,00
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	55 días		PLAZO ACTUALIZADO:	55 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024	
VALOR EJECUTADO:	\$	78.132.517,00 35,17%	VALOR EJECUTADO:	\$	822.970.573,03 35,17%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	144.026.203,00 64,83%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	1.517.029.426,97 64,83%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	89,00%	49,00%	-40,00%
Ejecutado Presente Semana	2,00%	3,00%	1,00%
Acumulado Actual	91,00%	52,00%	-39,00%


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
121		101	20,00	-47,19

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

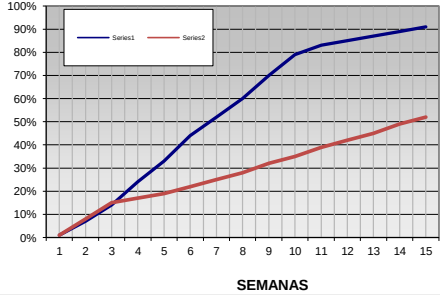

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		Almacén Calle 18	
Se evidencio que se realiza la instalación de la red eléctrica para el alumbrado de lamparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	80	Se evidencio que se realiza la instalación de la red electrica para el alumbrado de lamparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	80
Se verifico que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	70	Se verifico que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	70
Se verifico que se realiza el lijado y pintura del cielo raso el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	40	Se verifico que se realiza el lijado y pintura del cielo raso el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	40
Se evidencio que se realiza el lijado y pintura en los muros de mamposteria y Superboards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50	Se evidencio que se realiza el lijado y pintura en los muros de mamposteria y Superboards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	30	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	30
Se evidencio que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50	Se evidencio que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se realiza la media caña en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la media caña en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de imprimante asfaltico en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación de imprimante asfaltico en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se evidencio que se realiza la instalación del manto de impermeabilización en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación del manto de impermeabilización en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de la red electrica para la iluminación en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se verifico que se realiza la instalación de la red electrica para la iluminación en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en Drywall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se verifico que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se reorganiza los tableros electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se reorganiza los tableros electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metalica para cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	80	Se verifico que se realiza la instalación de estructura metalica para cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	80

Se verifico que se realiza la nivelación de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	70	Se verifico que se realiza la nivelación de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	70
Se verifico que se realiza la instalación de guardaescobas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación de guardaescobas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
BOLSA		BOLSA	
Se verifico que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se verifico que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50
Se evidencio que se realiza el desmonte de mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70	Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70
Se verifico que se realiza el desmonte de las puertas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el desmonte de las puertas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70	Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70
Se verifica que se entrega la muestra de los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70	Se verifica que se entrega la muestra de los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70
Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP para iluminación en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP para iluminación en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50
PALACIO		PALACIO	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	30	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	30
Se verifico que se realiza el desmonte de zocalo en la sala plena del consejo de estado.	100	Se verifico que se realiza el desmonte de zocalo en la sala plena del consejo de estado.	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de cornisa en la sala plena del consejo de estado.	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de cornisa en la sala plena del consejo de estado.	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de listones de fijaciones en la sala plena del consejo de estado.	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de listones de fijaciones en la sala plena del consejo de estado.	100

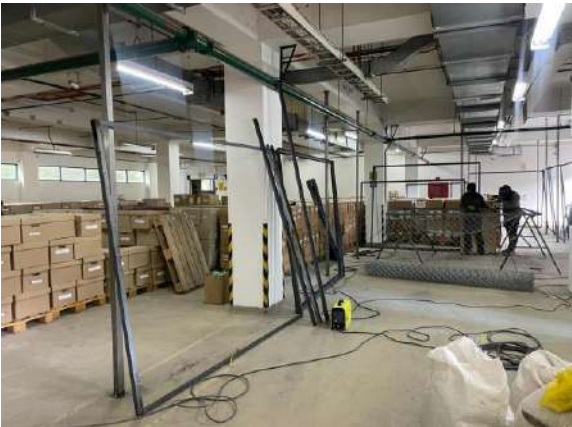INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
<p>Instalación de la red electrica para el alumbrado de lamparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de cielo raso en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	
<p>Lijado y pintura del cielo raso el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Lijado y pintura en los muros de mampostería y Superboards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	

Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de tubería eléctrica en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Media caña en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de imprimante asfáltico en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación del manto de impermeabilización en la terraza exterior en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de la red eléctrica para la iluminación en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18

Desmante de la tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Desmonte de muro en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Reorganiza los tableros electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de estructura metalica para cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Nivelación de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de guardaescobas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Desmonte de cableado eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de las puertas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Muestra de los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Desmonte de cableado eléctrico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de cableado eléctrico y cable UTP para iluminación en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.



Desmonte de zocalo en la sala plena del consejo de estado.



Desmonte de cornisa en la sala plena del consejo de estado.



Desmonte de listones de fijaciones en la sala plena del consejo de estado.

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 16

Del 5 de febrero de 2024

Al 11 de febrero de 2024

PERIODO: 6 meses y 1 días

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO		
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023		
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$	2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:			
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	2.340.000.000,00	
PLAZO INICIAL:		66 días		PLAZO INICIAL:		66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:		55 días		PLAZO ACTUALIZADO:		55 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024		
VALOR EJECUTADO:	\$	83.062.066,00	37,39%	VALOR EJECUTADO:	\$	874.893.567,31	37,39%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	139.096.654,00	62,61%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	1.465.106.432,69	62,61%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	91,00%	52,00%	-39,00%
Ejecutado Presente Semana	3,00%	2,00%	-1,00%
Acumulado Actual	94,00%	54,00%	-40,00%



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
121		108	13,00	-48,40

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

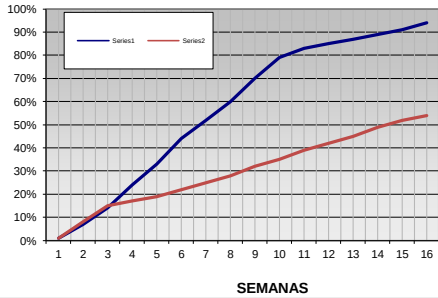

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		Almacén Calle 18	
Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	40	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	40
Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de manto en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación de manto en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza el desmonte de la tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se desmontan los cables UTP y cables electricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	30	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	30
Se evidencio que se realiza el resane de los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza el resane de los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18	100
BOLSA		BOLSA	
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50
Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	80	Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	80
Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50
Se verifico que se realiza la demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza la demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza la demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza la demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60

Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60	Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60
Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60	Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60
Se verifica que se realiza la demolición de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se verifica que se realiza la demolición de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza la recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza la recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
PALACIO		PALACIO	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	40	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	40
Se verifica que se realiza la regata en piso en la sala plena del consejo de estado.	100	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	100
Se evidencio que se realiza la instalación de tubería para red electrica en la sala plena del consejo de estado.	100	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	100

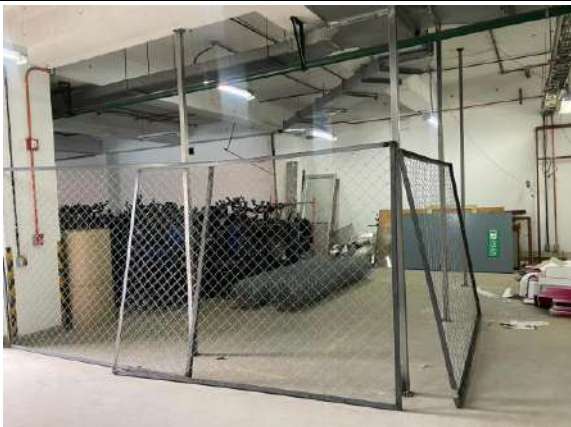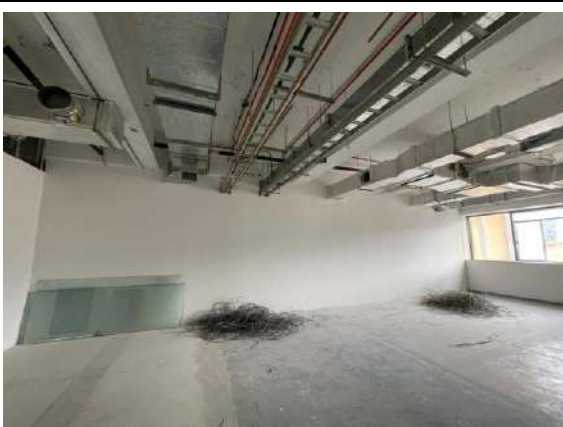INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
<p>Instalación de piso laminado SPC en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	
<p>Instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de manto en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18</p>
	

Desmonte de la tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Desmonte de los cables UTP y cables eléctricos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación de lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18

Resane de los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18



Recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa

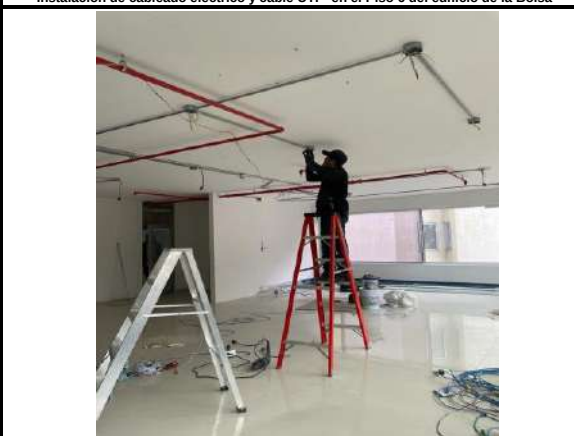

Instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Demolición de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa




Restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.



Regata en piso en la sala plena del consejo de estado.






Instalación de tubería para red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.

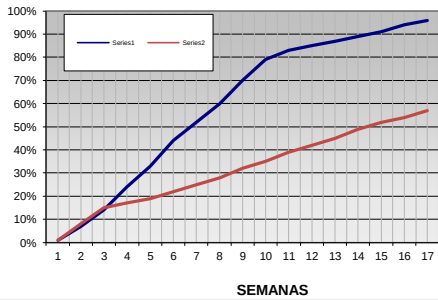Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Admsintrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
INFORME SEMANAL No. 17 Del 12 de febrero de 2024 Al 18 de febrero de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 días																																																																																												
OBJETO Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial																																																																																												
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td>088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td></td><td></td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td></td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td></td><td>66 días</td><td></td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>66 días</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td><td>55 días</td><td></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>55 días</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td><td></td><td></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td><td></td><td></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td></td><td>26 de octubre de 2023</td><td></td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td></td><td>24 de febrero de 2024</td><td></td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>24 de febrero de 2024</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>87.991.616,00</td><td>39,61%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ 926.816.561,58 39,61%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>134.167.104,00</td><td>60,39%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 1.413.183.438,42 60,39%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00	PLAZO INICIAL:		66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	PLAZO ACTUALIZADO:		55 días		PLAZO ACTUALIZADO:	55 días	FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:		26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:		24 de febrero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024	VALOR EJECUTADO:	\$	87.991.616,00	39,61%	VALOR EJECUTADO:	\$ 926.816.561,58 39,61%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	134.167.104,00	60,39%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.413.183.438,42 60,39%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																							
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																							
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:																																																																																								
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:		66 días		PLAZO INICIAL:	66 días																																																																																							
PLAZO ACTUALIZADO:		55 días		PLAZO ACTUALIZADO:	55 días																																																																																							
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																								
FECHA DE INICIACIÓN:		26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023																																																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:		24 de febrero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de febrero de 2024																																																																																							
VALOR EJECUTADO:	\$	87.991.616,00	39,61%	VALOR EJECUTADO:	\$ 926.816.561,58 39,61%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	134.167.104,00	60,39%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.413.183.438,42 60,39%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																												
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																																				
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																										
N/A	N/A	N/A																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>%PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado Semana Anterior</td><td>94,00%</td><td>54,00%</td><td>-40,00%</td></tr><tr><td>Ejecutado Presente Semana</td><td>2,00%</td><td>3,00%</td><td>1,00%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>96,00%</td><td>57,00%</td><td>-39,00%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total</th><th>Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>121</td><td></td><td>115</td><td>6,00</td><td>-47,19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><p>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</p></div>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA	Acumulado Semana Anterior	94,00%	54,00%	-40,00%	Ejecutado Presente Semana	2,00%	3,00%	1,00%	Acumulado Actual	96,00%	57,00%	-39,00%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	121		115	6,00	-47,19																																																							
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																												
	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado Semana Anterior	94,00%	54,00%	-40,00%																																																																																									
Ejecutado Presente Semana	2,00%	3,00%	1,00%																																																																																									
Acumulado Actual	96,00%	57,00%	-39,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																								
121		115	6,00	-47,19																																																																																								

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		Almacén Calle 18	
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50	Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	50
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	70	Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	70
Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza la instalación de red electrica para lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se evidencio que se realiza la instalación de red electrica para lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se verifico que se realiza la instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se evidencio que se realiza la nivelación de piso con mortero en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la nivelación de piso con mortero en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se verifico que se realiza la instalación de tubería electrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	50
Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80	Se evidencio que se realiza el retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza la aplicación de pintura en los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la aplicación de pintura en los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18	100
BOLSA		BOLSA	
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50

Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza el desmonte de puertas de aluminio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	80	Se evidencio que se realiza el desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	80
Se verifico que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se evidencio que se realiza el traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70	Se verifico que se realiza la demolición de muros de mampostería y Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza el instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70	Se evidencio que se realiza la demolición de la escalera en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza la demolición de muros de Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60
Se evidencio que se realiza el desmonte de puestos de trabajos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	60	Se evidencio que se realiza el instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60
Se evidencio que se realiza el desmonte de canaleta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60
Se verifica que se realiza el desmonte de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	60	Se evidencio que se realiza el instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	60
Se evidencia que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70
Se evidencio que se realiza el instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70	Se evidencio que se realiza el instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70
Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
PALACIO		PALACIO	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	50	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	50
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	50	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	50
Se evidencio que se realiza la fundida de las regatas para la tubería de red electrica en la sala plena del consejo de estado.	100	Se evidencio que se realiza la fundida de las regatas para la tubería de red electrica en la sala plena del consejo de estado.	100

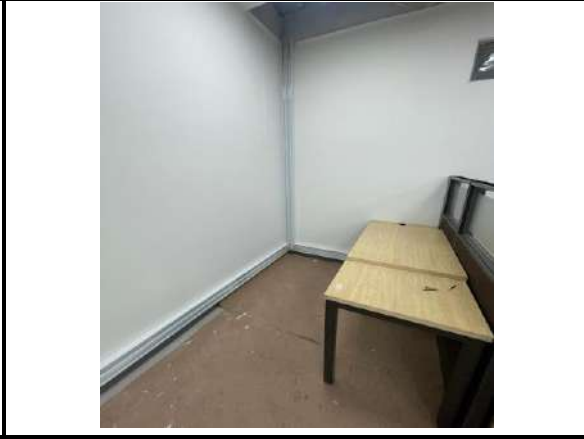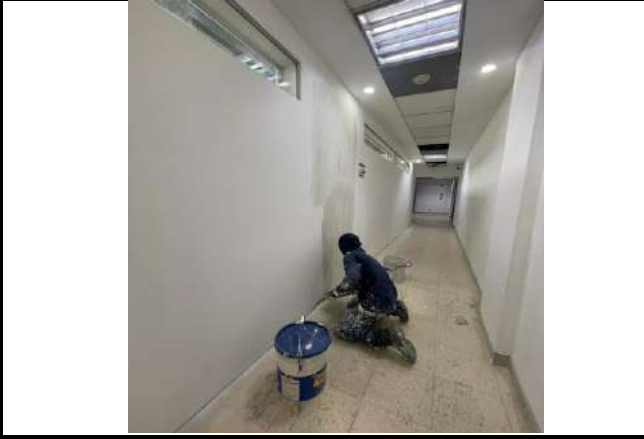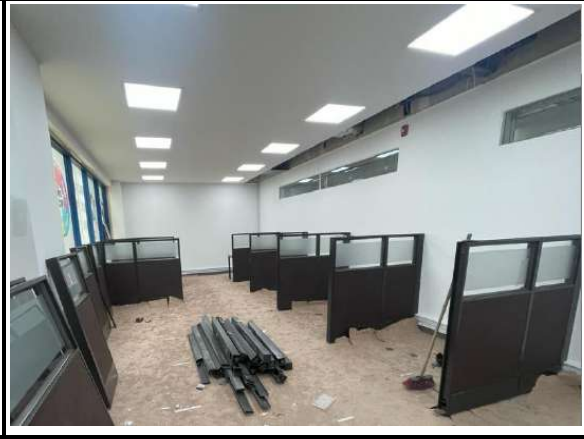INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
<p>Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	
<p>Aplicación lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de lámparas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	

Instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de pintura bituminosa en la terraza en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación de lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de red eléctrica para lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Nivelación de piso con mortero en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18

Instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Retiro de mobiliario en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación de pintura en los muros en el pasillo de escalera entre los pisos 1 al 4 del edificio Almacén Calle 18




Recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Traslado del mobiliario y divisiones de oficina en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de puertas de aluminio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

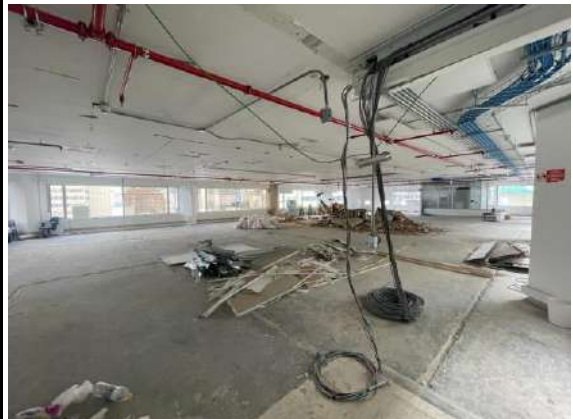

Desmonte de cableado electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Demolición de muros de Drywall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Demolición de muros de Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Desmonte de puestos de trabajos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de canaleta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Desmonte de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

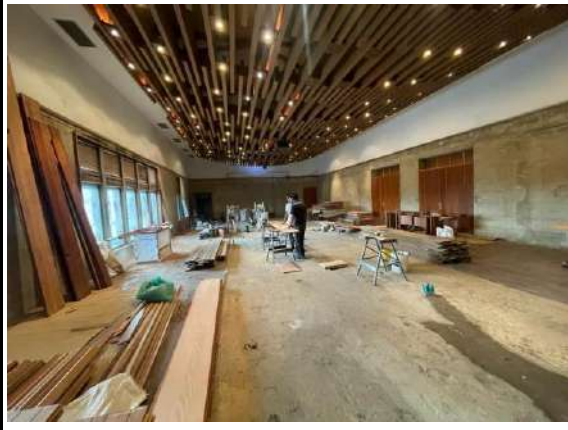

Restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.



Instalación de tubería para red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.



Fundida de las regatas para la tubería de red eléctrica en la sala plena del consejo de estado.

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
---------------------------	--	--

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 18	Del 19 de febrero de 2024	Al 25 de febrero de 2024
PERIODO: 6 meses y 1 días		
OBJETO		
Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO		
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023		
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$	2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	\$	111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	\$	1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	333.238.080,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días			PLAZO INICIAL:	66 días		
PLAZO ACTUALIZADO:	115 días			PLAZO ACTUALIZADO:	115 días		
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		
VALOR EJECUTADO:	\$	109.521.471,00	32,87%	VALOR EJECUTADO:	\$	1.148.452.911,14	32,87%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	223.716.609,00	67,13%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	2.345.914.345,86	67,13%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	46,00%	57,00%	11,00%
Ejecutado Presente Semana	2,00%	2,00%	0,00%
Acumulado Actual	48,00%	59,00%	11,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181		122	59,00	19,91

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

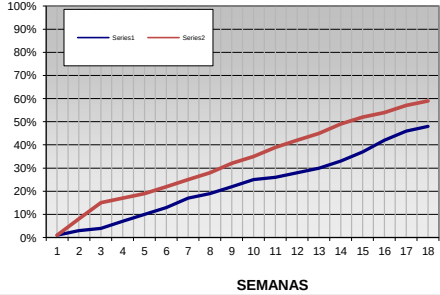

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		Almacén Calle 18	
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	80	Se verifico que se realiza la instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	80
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se evidencio que se realiza la demolición del piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la demolición del piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	100
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	60
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	70	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	70
Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se evidencio que se realiza la instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100	Se verifico que se realiza la instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	100
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	80
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	60
BOLSA		BOLSA	
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70	Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	70
Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50	Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	50
Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70	Se verifica que se realiza la instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	70
Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	80	Se evidencio que se realiza la instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	80
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	90	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	90

Se verifica que se realiza la instalación de lámparas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifica que se realiza la instalación de lámparas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se verifica que se realiza la nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	80	Se verifica que se realiza la instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	80
Se evidencia que se realiza el cerramiento en lona en el Sotano del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza el cerramiento en lona en el Sotano del edificio de la Bolsa	100
PALACIO		PALACIO	
Se evidencia que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	60	Se evidencia que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.	60
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	30	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	30

INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
<p>Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de canaleta para red electrica y cable UTP en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>
	
<p>Instalación de divisiones y puestos de trabajos en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</p>	<p>Instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18</p>
	

Instalación de placas de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Demolición del piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de piso laminado SPC en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación del guardaescoba en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18





Aplicación lijado y pintura en los muros de super boards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de cableado eléctrico y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta para red eléctrica y cable UTP en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de mobiliario en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Instalación de lamparas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Nivelación del piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de cableado electrico y cable UTP en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

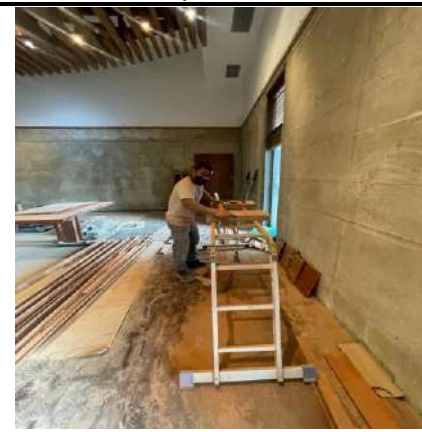

Cerramiento en lona en el Sotano del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.



Restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.

Delcop: 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes. 2 Electricos
2 Ornamentadores 1 impermeabilizador.

1 Res. Obra 1 Res. Inventaria 1 Res. SST.

[Signature]

[Signature]
Inventaria

viernes 1/2/24 Se Continúa con la actividad de restauración de la Capintaria en Modern en la Sala del Consejo de Estado. realizando actividades nocturnas y diurnas. En el Edificio Bolsa. Piso 6 se Continúa con el cableado eléctrico para la iluminación. Piso 7 se Continúa con el desmonte de cable UDP y eléctrico. desmonte de Canolera y de lamparas. desmonte divisiones de oficina y demás elementos de Mobiliario. Edificio Delcop. Se Continúa con la impermeabilización de la terraza piso 1. Se Continúa con la ornamentación para la Malla Estabanada. Se Continúa con la actividad de Estuco y pintura oficina 1 Bodega zona de carga. piso 1. en piso 1 y 3 Se Continúa con las actividades electricas. iluminación y reorganización de tableros electricos. Se realiza mudación de piso. en oficina 1 piso 3.

"personas"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales. 4 Ayudantes.

Bolsa piso 6 y 7: 2 Electricos.

Bolsa Piso 7: 2 Ayudantes en desmontes.

Delcop: 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes. 2 Electricos.

2 Ornamentadores 1 impermeabilizador.

1 Res. Obra. 1 Res. Inventaria. 1 Res. SST.

[Signature]

[Signature]
Inventaria

viernes 2/2/24 En Consejo de Estado Se Continúa con la actividad de restauración de toda la Capintaria en Modern. En el Edificio Bolsa piso 7 se realiza orden de los elementos desmontados por fumazo se realiza desmonte de puertas y techados en Aluminio. En piso 6 se Continúa con la instalación de la red de Aluminio e iluminación. en Delcop

Piso. 1 Se Continúa con la Construcción de los muros para el Comedor en Mota Estacionada. Se Continúa con el Grcio. en muros de oficina 1 Bodega zona de descarga. en piso 3 Se Continúa con las actividades Electricas armado de tuberos. y instalacion de Grcio por cielo raso del Hall En Palacio Consejo de Estado, Delcop. y Bolsa se realizan actividades hasta los 21:00 horas. El personal ingresa a las 15:00 horas por que no tenia ingreso por seguridad. del Edificio. Como. Se envia desde el 31 de Enero.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 4 Ayudantes.

Bolsa piso 6 y 7: 2 Electricos 2 Ayudantes

Delcop: 1 Maestro. 2 Oficiales 1 Ayudante. 2 Electricos.
1 Improbabilizadora

1 Rs. Obro. 1 Rs. Interventoria 1 Rs. SST.

Chapman

Interventoria

Sabado 3/02/24 En la Sala del Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Muestra. Zoclos, Laminas, Mesas y bases en General. En el Edificio Bolsa. Piso 7 Se inicia con la demolición de Panelonazo. Piso 6 Se Continúa con las actividades Electricas. En Delcop. piso 1 Se Continúa con la actividad. de Grcio. en muros y prima oficina 1 Zona de Bodega. En piso 3. Se Continúa con el resque de muros y bodega Escoba. Se Continúan las Actividades Electricas desmonte tubería alcatrán y desmonte de cableado Electrico. para de Servicio. Se realizan actividades hasta las 17:00 horas. Se Continúa actividad. de Ornamentación. para Comedor.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales. 4 Ayudantes.

Bolsa piso 7: 1 Maestro 2 Oficiales 2 Ayudantes.

Bolsa piso 6: 2 Electricos.

Delcop: 2 Electricos. 1 Ayudante.

1 Es. Obra. 1 Res. Intranquila 1 Res. SST.

Chapman

Intelectual

Viernes 4/02/74 En el Edificio Bolsa Se Continúa con la demolición del portón y Empacado de Escombros. en horas. actividad. en el piso 7 de 7 am. a 22:30 pm. En el piso 6 se continúan las actividades eléctricas. En sala del Consejo de Estado se realizan actividades de Orden y Aseo.

"personal"

Bolsa Piso 7 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes

Bolsa Piso 6 2 Electricistas.

Consejo de Estado 1 Maestro. 3 Oficiales 4 Ayudantes

1 Res. Obra. 1 Res. Intranquila. 1 SST.

Lunes 5/02/74 Se Continúa con la Restauración de la Carpintería en Madera del Consejo de Estado. rocalo, Alfombras, bases y Piso. En General. En Bolsa Piso 7 Se Continúa con la demolición del piso en parcelación. En jornada nocturna. en jornada diurna. Se Continúa con la recolección de Escombros. En Piso 6 de Bolsa Se Continúa con actividades eléctricas. Cableado y Cableado eléctrico. para la iluminación. En Delcop Se inicia con la instalación de piso SPC en Oficina de Bodega piso 1. En piso 3 Delcop Se Continúa con actividades eléctricas y de Estuco y pintura en General. Se Continúa en Piso 1 con la actividad de Ornamentación para Cerro de la Cruz. en Madera. Se construyen muros en SuperBoard. de Almacén y Bodega. Se termina de instalar manta de impermeabilización.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 4 Ayudantes.

Bolsa piso 7. 1 Maestro. 2 Oficiales. 2 Ayudantes.

Bolsa Piso 6: 2 Electricistas.

Delcop: 1 Maestro. 2 Ayudantes.

Delcop: 3 Ornamentadores.

1 Res. Obra. 1 Res. Interventora. 1 SST.

Cajupol/24

Interventora

Martes 6/02/24 En sala del Consejo de Estado Se Continúa con la Restauración de la Carpintería en madera. En Delcop. Se inicia con la instalación de la pintura Brummosu color gris. traza piso 2. en piso 1 se Continúa con la Ornamentación para el cerramiento en alba en Piso 3 delcop Se Continúa con actividad eléctrica instalación. Red de iluminación en oficinas piso 1 se Continúa con la instalación de piso SPC. En Bolsa piso 5 se instala la Red de iluminación en Piso 6 Bolsa Se Continúa con el alumbrado de la red normal y regulada e iluminación. En Bolsa piso 2 Se realiza limpieza y demolición de piso en porcelanato actividad sucia y vacuina.

"Personas"

Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Madera. 1 Maestra. 3 Oficiales y Ayudantes.

Delcop: 2 Electricos 1 Maestra 1 Oficial. 2 Ayudantes.
2 Ornamentadores 1 pintor impermeabilización.

Bolsa piso 6 y 5 3 Electricos.

Bolsa piso 71 2 Oficiales 1 Ayudante.

1 Res. Obra 1 Res. Interventora 1 SST

Cajupol/24

Interventora

Miércoles 7/02/24 En Sala del Consejo de Estado. Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Madera. se realiza Orden y aseo. En Delcop. piso 1 Se Continúa con la instalación del piso laminado SPC. Se Continúa con la construcción de los marcos en Madera para el cerramiento de Bodega. En piso 3 de Delcop. Se Continúa con las actividades eléctricas y de Gas. y pintura donde

acabado a muros existentes se resanan los grandes eslabos y se realiza resane de muros laminando hoy con esto actividad de resanes en Mortero. En la terraza de la portera se retira el Alfaro y se procede a realizar la Nivelación. Con Mortero para darle desnivel hacia los sifones. Se realiza cono de tapas para salidas de ventilación y Lona de la azotea. En Bolsa piso 5 se termina con el cableado de iluminación. Bolsa piso 7 se continua con demolición de paraceloso y Empacado de escombros. Se continua pintura Bimbrinosa

"Personal"

Sala Consejo de Estado. 1 Maestro. 3 Oficiales y Ayudantes.

Delcop: 1 Maestro. 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Electricos.

2 Ornamentadores. 1 Pintor impermeabilización

1 instalados piso laminado.

Bolsa piso 5: 2 Electricos

Bolsa piso 7: 2 Oficiales 1 Ayudante.

Carpintero

Ludwig
Interventor

Jueves 8/02/24. En sala del Consejo de Estado se continua con la restauración de la Carpintería en madera. En Bolsa Piso 5 y 6 Se continua con las actividades electricas para dar servicio a los puestos de trabajo. En Bolsa Piso 7 se realiza orden y uso de las demoliciones dando por terminada esta actividad. en un 80%. En Delcop. Piso 1. Se inicia instalación en piso 3 del SPC terminando piso 1 al medio día. en piso 3 Delcop se continua con instalación de pintura en muros. y se inicia con el resane del punto fijo (Escaleras) del 1 al 4 Piso. Se realiza el traslado de las divisiones a media altura de Bolsa a delcop Se termina con el Alisado de la terraza portera. 2. Se continua con la instalación de la pintura Bimbrinosa.

"Persona"

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales y Ayudantes

Delcop: 1 Maestro. 1 Oficial. 2 Ayudantes 2 Electricos.

2 Ornamentadores. 1 Pintor impermeabilización. 1 instalador piso laminado.

Bolsa piso 5 y 6: 2 Electricos.

Bolsa piso 7: 2 oficiales 1 Ayudante.

1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 SST.

Chapuz/24

Interventoria

Vincom 9/2/24 En sala del Consejo de Estado se continua con la Restauración de la carpintería en Madera En Bolsa piso 7 se realiza desmonte de lamparas y cableado VTP y Electrico. Se realiza traslado de divisiones a media altura para Delcop. Se continua en Bolsa piso 5 y 6 con las actividades Electricas alambrado e instalacion de Conalita en Delcop se continua con la pintura del pintura figu. (escaleras) del piso 1 al 4. en piso 3 de Delcop se termina con la instalacion de SPC en Oficina de provisionales. en piso 1 de Delcop se continua con la Ornamentacion para el Cerro Mirante en Malla. Se instala manto en la terraza portera 2

"Personal"

Sala Consejo Estado: 1 Maestro. 3 oficiales 4 Ayudantes

Bolsa piso 5, 6 y 7: 3 Electricos.

Bolsa Piso 7: 1 Electrico.

Delcop: 1 Maestro. 3 oficiales 3 Ayudantes. 2 Electricos.

1 impermeabilizador. 2 Ornamentadores. 1 instalador. SPC.

1 Res. Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. SST

Chapuz/24

Interventoria

Sabado 10/2/24. En sala del Consejo de Estado se continua con la Restauracion de la carpinteria en Madera. Bolsa piso 5 y 6 se continua con las actividades Electricas alambrado puestos de trabajo y instalacion de Conalita Bolsa piso 5 se realiza de-demolicion

del piso en porcelanato. Dejando los Escombros arrojados en el
 sótano En piso 7 se realiza demolición de muros en Mangosera
 demolición de Escalera y Muros en Dreywall. En Delcop piso 1
 Se Continúa con la Ornamentación para el Corramiento en
 Malla Estalborada. Se Continúa con el yeso y pintura del
 punto fijo del piso 1 al 4. Se inicia pintura Bituminosa en la
 Fianza. Se inicia construcción muros en Super Bodega en piso 4.
 Delcop.

"personal"

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 4 Ayudantes

Bolsa piso 5 y 6: 2 Electricos.

Bolsa piso 5 y 7 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes.

Delcop: 1 oficial 1 Ayudante. 2 Electricos. Impermeabilizador.
 2 Ornamentadores.

1 Res. Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. SST

Chapman

Interventoria

Lunes 12/02/24. En Sala del Consejo de Estado se inicia limpieza de áreas de trabajo
 y se Continúa con la Restauración de la Carpintería en Madera.
 Bolsa piso 5 y 6 Se Continúa con las actividades electricas.
 alambrado e instalación canaliza e iluminación. Piso 7 Bolsa se
 realiza recolección de escombros y puntado de divisiones
 a media altura para Delcop. En Delcop piso 1 Se Continúa
 con la construcción de Módulos para Corramiento en Bodega.
 Se instala Canaliza en oficina director, oficina educacion
 y oficina Bodega. Se termina la pintura Bituminosa en las
 fianzas impermeabilizadas. Se Continúa con la pintura del punto fijo
 (Escaleras) del piso 1 al 4. La Entidad inicia trabajo de los
 elementos del piso 4 al sótano. En piso 3 Se Continúa con
 pintura y fijado de muros. Se inicia instalación de muros para
 lamparas.

"personal"

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 4 Ayudantes.

Bolsa piso 6 y 6 2 Electricos.

Bolsa piso 7: 1 Oficial. 1 Ayudante
 Delcop: 1 Muestrero. 2 Oficiales 1 Ayudante. 3 Electricos.
 1 impermeabilizador. 2 Ornamentadores
 1 Res. Obra 1 Res. Inventaria 1 Res. SST

Chaplin

Interventoria

Mar 13/02/24 En Sala del Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en madera. En Bolsa piso 5 y 6 Se Continúa con las actividades Electricas para iluminacion y puestos de trabajo. Piso 7 Se Continúa con demolición de muros en Drywall y demonte de puertas en aluminio y fachados en vidrio. En Delcop piso 1 Se Continúa con la construcción del Comedor en Bodega Se Continúa con la instalación de Alambres para lamparas y pintura en Piso 1, 3 y Escaleras. Se instala Guardo Escriba en Oficina directores. oficina directores y oficina Bodega piso 1.

"personal"

Sala Consejo Estado: 1 Muestrero. 3 Oficiales 4 Ayudantes.
 Bolsa. Piso 5 y 6 2 Electricos.
 Bolsa Piso 7 2 Electricos 1 Ayudante.
 Delcop: 1 Muestrero. 2 Oficiales 2 Ayudantes. 2 Electricos.
 1 impermeabilizador. 2 Ornamentadores. 1
 instalador Guardo Escriba.
 1 Residente Obra 1 Res. Inventaria 1 Res. SST

Chaplin

Interventoria

Abril 14/02/24 En Sala Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en madera. En Bolsa Piso 5 y 6 Se Continúa con las actividades Electricas para iluminacion y cableado de puestos de trabajo y Concheta. Piso 5 Bolsa se inicia con Alisado en concreto para nivelacion de piso en

Delcop piso 1 Se continua con la Ornamentacion para la construcción del Ceramiento en malla. Estalborado. Se termina de instalar muros y lamparas en oficina director y oficina Almacen. Se inicia instalacion de divisiones a media altura en oficina Almacen. Se realiza demolicion de piso en oficina piso 3 Delcop. Se termina de instalar Granda Escoba en Oficinas. piso 4 se inicia con el armado de muros en Super Board.

"Personal"

Sala Consejo Estado: 1 Maestro 3 Oficiales y Ayudantes.

Bolsa Piso 5 y 6: 2 Electricos.

Bolsa Piso 7: 2 Electricos.

Calle 18 Almacen: 1 Maestro 2 Oficiales. 2 Ayudantes.

2 Electricos 2 Ornamentadores 1 Instalador.

Granda Escoba.

1 Res. Obra 1 Res. Tokunronu 1 Res. SST

[Signature]
Intendencia

[Signature]

15/02/24 En Sala Consejo de Estado Se continua con la Restauración de la Carpinteria en Madera. En Bolsa piso 6 y 5 continua con las Actividades Electricas. Para iluminacion y cableado de puntos de trabajo y Puertales. Piso 5 Se termina con el Alisado de piso para nivelar area. Delcop piso 1 Se termina. Con la instalacion de lamparas y Armado de puntos de trabajo. En piso 3 se realiza nivelacion de piso con Mortero. Se continua con lijado y pintura de muros. piso 4 se continua con los muros en Super Board.

"Personal"

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales y Ayudantes.

Bolsa Piso 5 y 6 2 Electricos

Calle 18 Almacen: 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes.

2 Electricos 2 Ornamentadores 2 Electricos.

1 Res. Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. SST.

Chapelle

Interventoria

Vuernes 16/02/24 En Sala del Consejo de Estado Se Continúa con la Restauración de la Carpintería en madera. En Balsa piso 5 Se Continúa con el alumbrado e instalación de Conduletas. En piso 6 Se realiza plan de contingencia para realizar actividades fortuitas se suspende actividades por parte de los funcionarios a las 11:00 horas iniciamos a realizar la demolición del muro en drywall y demolición de las tubetas en procedimiento de desmontar los 5 puntos de trabajo que estaban en el muro. y se inicia con la instalación del procedimiento la parte eléctrica realiza desmonte de la Conduleta y desalumbrado de la misma. se trabaja hasta la 3:30 am En Delcoy Se continúa con el armado de puntos de trabajo en piso 2 oficina almacén. Se continúa con el alumbrado e instalación Bandera porta cable para las oficinas del piso 1.

"personas"

Sala Consejo Estado: 1 Maestro 3 Ayudantes 3 Oficiales
Balsa Piso 6 y 5: 3 Electricos. 1 Maestro e Ayudantes.
Delcoy: 1 Maestro. 1 Ayudante. 2 Electricos. 1 Oficial pintura.
1 Res. Obra. 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

Chapelle

Interventoria

Sabado 17/02/24 En sala del Consejo de Estado Se Continúa con la Restauración de la Carpintería en madera En Balsa piso 5 Se Continúa con el alumbrado de la red de iluminación. En Balsa piso 6 se continúa con la contingencia para terminar con las actividades fortuitas. Se realiza la instalación de la Bodega y armado de la sala de puntos de trabajo. Se realiza arance de muros y se inician actividades eléctricas alumbrado de red para puntos de trabajo se arman puntos de trabajo se realiza

Corrección de la red de datos al RAC. En Detop. calle 18 se
 Continúa con los actividades Electricas en piso 1 y 3 Se continúan
 con los acabados en pintura de muros. Piso 4 Se continúan con el
 arreglo de muros en Super Brawl.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Ayudantes. 3 Oficiales.

Bolsa piso 5: 2 Electricos.

Bolsa piso 6: 1 Maestro. 2 Ayudantes 1 Oficial 3 Electricos.

Calle 18 Detop: 1 Oficial. 1 Ayudante 3 Electricos.

1 Rs. Obra 1 Rs. Indiferencia. 1 SST.

Chaplin/DZ

Interventoria

Domingo 18/02/24 En sala Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de
 la Carpintería en madera. Bolsa piso 6 se continúa con el arreglo
 de muebles y puestos de trabajo. Divisiones Madera obra Se continúa
 con el alambrado de la red para los puestos de trabajo. Se instala
 la red de datos y voz realizando pruebas con Equipo Especializado.
 Se realiza ase de obra se forman de Instalador. cable rojo
 en fibra mineral. Se instalan lamparas.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Ayudantes 3 Oficiales

Bolsa piso 6: 1 Maestro 2 Ayudantes 3 Electricos.

1 Rs. SST 1 Rs. Obra

Chaplin/DZ

Interventoria

Lunes 19/02/24 En sala plena Consejo de Estado Se Continúa con la restauración
 de la Carpintería en madera. En Bolsa piso 6 Se instalan muebles
 y tapas de Camolita Se instalan pasos en puestos de trabajo
 Se deja Conectividad. En los 5 puestos de trabajo antiguos.
 y Se realiza la recomendación para que el ing. en sistemas
 de la Entidad. active los demás 15 puestos de trabajo. Se instalan
 puestos de impresoras. En Bolsa piso 5 se realiza demolición en

Desmontaje y recolección de Escombros En Calle 18 almorzar.
 piso 1 Se realiza limpieza de Garganta en pasillos de trabajo.
 piso 3 se continúa con armado pasillos de trabajo pintura y
 Gesso. Se retiran elementos desmontados En piso 3 se
 continúa con el armado de los pasillos de trabajo de la
 oficina de proveedores. En piso 4 se continúa con el armado
 de muros en Super Board.

"personal"

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 6: 2 Ayudantes 3 Electricos

Bolsa piso 5: 1 Ayudante 1 oficial.

Calle 18 Orlap: 1 Oficial. 1 Maestro. 1 Ayudante 3 Electricos.

Chapco/DZ. Interventoria

Mañana 20/02/24 En sala del Consejo de Estado se continúa con la restauración de
 la Madera. En Calle 18 piso 4 Orlap se inicia con el traslado
 de los muros y pintura de vigas y columnas. En piso 3 se
 continúa con la instalación de piso spe y guarda Esbozo. Se
 continúa con la instalación de la red de iluminación y cable utp
 por recomendación del Arq. Daniel se realiza construcción de un
 muro divisorio en el piso 2 se realiza demolición de piso pvc
 En Bolsa piso 5 se realiza nivelación de piso con mortero.
 En Bolsa piso 6 se continúa con las actividades electricas.
 colocando tomas y tapas de canalota. Piso 7 retiro de Escombros.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 5: 1 Oficial. 1 Ayudante.

Bolsa piso 6: 1 Ayudante 2 Electricos

Bolsa piso 7: 1 Oficial. 1 Ayudante.

Calle 18: 2 Ayudantes. 1 Maestro. 3 Electricos.

Chapco/DZ. Interventoria

Marzo 21/02/24 Sola Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Maestra. Zoclos terminados tachados en digno y pintura. Mesas en digno y latunamento. En el Edificio Bolsa Piso 7 Se Continúa con el Retiro de Escombros. piso 6 terminando remates Electricos, conchetas roquetes instalados. Montaje puertas de tubos Hall principal. piso 5 se termina con el alisado de piso. En el sótano se realiza instalación de Cerámica en lona Solicitado por el Arq. Daniel. En calle 18 del cop se termina con la Construcción del muro. en el piso 2. en Piso 3 y 1 Se Continúa con las acomodaciones Electricas Piso 4 Se Continúa con la Construcción de muros en Super Board.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa Piso 5: 1 Oficial. 1 Ayudante

Bolsa Piso 6: 1 Ayudante. 2 Electricos.

Bolsa Piso 7: 1 Oficial. 1 Ayudante.

El 18 del cop: 2 Ayudantes 1 Maestro. 3 Electricos. 1 Res. obra 1 Res. Intex. 1 SSI.

Compu/DT

Intex
Generación

junio 22/02/24 En la Sola del Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Maestra Zoclos, tachados cambio de Maestra de Anclaje, acabado a mesas y pisos. de Maestra. En el Edificio Bolsa Piso 7 Se Continúa con retiro. de Escombros Piso 6 se termina de tuper Concheta nueva y instalación de roquetes. Piso 5 Se realiza Cableado Electrico en concheta. En calle 18 se realiza tratamiento de juntas en muros piso 2 y se realiza Garrio. en la Can. por dentro. de la oficina. en piso 3 y 1 se Continúa con las Acomodaciones Electricas cableado electrico cableado red. datos e instalacion. tomas en pasos de tubos. Piso 3 y 1 Se Continúan las acomodaciones de pintura.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes

Piso 5, 6 y 7 Bolsa: 2 Electricos 2 Ayudantes
 Calle 18 del cop: 1 Maestro 3 Ayudantes 1 Oficial
 1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

[Signature]
 Interventoria

Viernes 23/02/24 En sala Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en madera. En Bolsa piso 7 Se Continúa con el retiro de Escombros, Bolsa piso 5 Se Continúa con Actividades Electricas instalacion red. Electrica y de datos en canalata. en Calle 18 del cop. Se Continúa con la construcción de muros en Super Board, ductuminato de juntas, masillado y pintura. en piso 4 En Piso 3 y 7 Se Continúa con los acabados en pintura. instalacion de red Electrica y cableado UTP Se realiza asseo al area de Bodega del piso 3.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Ayudantes 3 Oficiales
 Piso 5 y 7 Bolsa: 2 Electricos 2 Ayudantes.
 Calle 18 del cop: 1 Maestro 3 Ayudantes 1 Oficial
 1 Res. Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. SST.

[Signature]
 Interventoria

Sabado 24/02/24 En sala plena Consejo. Estado. Se Continúa con la restauración de la Carpintería en Madera. En Bolsa piso 7 Se Continúa con el retiro de Escombros, Bolsa piso 5 Se Continúa. en Actividades Electricas. Bolsa piso 7 Se inicia con la organización del Rack para establecer Esquema de Conexión Electrica y de datos en Calle 18 del cop. piso 4 Se Continúa con la construcción de los muros en Super Board, ductuminato de juntas, masillado y pintura. En piso 3 Se Continúa con las actividades electricas cableado Electrico de voz y datos

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Ayudantes 3 Oficiales

Piso 5 y 7 Balsa: 2 Electricos 2 Ayudantes.

Calle 18 del cop: 1 Maestro. 2 Ayudantes 1 Oficial.

1 Rta. Obra 1 Rta. Intercomuna 1 Rta. SST.

Cajup/WZ.

Interventoria

domingos 02/02/24 En calle 18 del cop se continuan con la construccion de muros en super Board, totalmente de juntas, masillado y pintura

"personal"

1 Maestro. 2 Ayudantes 1 Oficial.

1 Rta. Obra.

Cajup/WZ.

Interventoria

lunes 26/02/24. En el Edificio de polucion se realiza la construccion de muros en super Board para tapar ventanas en los Ascensores, se instalan bombillos para mayor iluminacion en los pozos de los Ascensores. En el Consejo de Estado se continuan con la restauracion de la maquina, y se instala en el Ascensor. La red para la iluminacion del pozo del Ascensor En Balsa piso 5 y 7 se continuan las Actividades Electricas en el Rta. en piso 7 se continua con el retiro de Escanberos. en calle 18 del cop se continuan con la construccion de los muros en super Board, masillado y pintura piso 4. en piso 3 se continua con el Cableado Electrico, y instalacion de puentes en puestos de trabajo. En piso 2 se realiza demolicion de piso y Abstrado en mortero.

Cajup/WZ.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Piso 5 y 7 Balsa: 2 Electricos 2 Ayudantes

Calle 18 del cop: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial. 1 Rta. Obra 1 Rta. SST.

Interventoria

Marzo 27/02/24 En el Consejo de Estado Se Continúa con la restauración de la Carpintería en madera. En Bolsa piso 5 y 7 Se Continúa con la Organización del Racc Cables eléctricos y el ducto. En calle 18 piso 4 Se Continúa con la construcción de los muros en super Board, masillado y pintura. En piso 2 se continúa con el alisado de piso en mortero. En piso 3 Se Continúa en pintura y acabados se continúa con el cableado del VSP al Cuarto eléctrico y puesta de paros eléctricos en Oficinas. Se Continúa con el Cementado en malla de la Bodega del piso 1.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes

Bolsa piso 5 y 7: 2 Electricos 2 Ayudantes

Calle 18 Detop: 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes. 1 Ornamentador

1 Res. Obra 1 Res. Interventoría 1 Res. SST.

Chapco/24

Interventoría

Marzo 28/02/24 En el Edificio. se instala malla para no se pueda instalar chiveron el Super Board y que el Foso del Ascensor se encierren lleno de agua se le solicita a la Entidad. realizar actividades necesarias para poder así nosotros poder impermeabilizar y realizar los trabajos solicitados por la entidad. En la sala del Consejo se Continúa con la restauración de la Carpintería en Madera. Bolsa piso 5 y 7 Se Continúa con la Organización del Racc, En Calle 18 Detop se Continúa con el Masillado, lijado, pintura y construcción de muros en super Board del piso 4. En Bodega piso 1 Se Continúa con el Cementado relleno construcción de puertas corredizas.

"Personal"

Edificio. : 1 Oficial. 2 Ayudantes 1 Res Obra

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Ayudantes 3 Oficiales

Bolsa piso 5 y 7: 2 Electricos.

Detop. Calle 18: 1 Ornamentador 1 Maestro. 3 Ayudantes

2 Oficinas 1 Res. Obra 1 Res. Interventora 1 SST

Chapman

Interventora

Viernes 24/02/24 En Consejo de Estado se Continúa con la restauración de la Capilla en Mañana. Bolsa piso 5 Se instalan lamparas y se dejan con la protección para evitar el polvo, se recibe 395 cajas de parcelanero. En su respectivo paquete y Boquilla, En piso 7 Se Continúa con el retiro de Escombros se disminuye división de oficina anterior y se demuestran el parcelanero. Calle 18 Odeop. piso 4 Se Continúa con la construcción de los muros en super Board, se Continúa con el ligulo. y pintura de los mismos piso 3 Se Continúa con los Acabados en pintura y Actividades Electricas. Se inicia con la instalación de los lumineros de Daywell para cielo raso en oficina cobro Coactivo. Se instala iluminación en Hall principal piso 3 y se Continúa con la Documentación para el Censamiento.

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes.

Calle 18 Odeop: 1 Maestro. 1 Ornamentador 1 Oficio. 3 Ayudantes.

1 Res. Obra 1 Res. Interventora 1 Res SST

Chapman

Interventora

Viernes 01/03/24 En el día de hoy el personal de Obra ingresa a laborar a las 11:45am debido a que la entidad no recibió el permiso solicitado el 26 de febrero. dejando al personal sin poder entrar al Edificio Bolsa, Edificio Calle 18 y gobierno. en el resto del día solo se realizó actividad de Ornamentación en piso 1 Bodega Calle 18, pintura y Esmero de muros en piso 4. En Bolsa pisos 5 y 6 Se Continúa con el organización del Rack y en piso 7 se retira Escombros En calle 18 también. Se hizo un viaje de 15mts de Escombros.
