



LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACIÓN DE LA
SUSPENSIÓN -REINICIO

Código: F - 262

Versión: 001

Fecha: Septiembre de

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

Fecha: 29/04/2024

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN -
REINICIO

CODIGO FORMATO

CASILLA DE
VERIFICACIÓN
SI / NO / N/A

SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio
(Descripción detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)

SI

INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio

SI

REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V"B" interventoría aplica para prorroga y
reinicio)

N/A

FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V"B" interventoría) Porcentajes y costos planeados.

N/A

INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión -
Reinicio

N/A

ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoría, Director Operativo de Ejecución
y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)

CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS (SIGA).
Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y
cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en
cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.

N/A

MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica
la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta será
perfeccionada mediante el acta de comité.

N/A

UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente trámite:

ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)

Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoría deberá asegurarse que la
ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la
interventoría deberá comunicar

ENTREGA DOCUMENTACIÓN AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantía Única de cumplimiento y
Responsabilidad Civil Extracontractual)

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR. SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL
SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y
CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE OBRA
M.P.

Firma

Nombre:
APOYO A LA
SUPERVISIÓN
M.P.

Firma

Nombre:
RESPONSABLE
DEL ARCHIVO

Firma

Nombre:
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P.

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA
SUPERVISOR

M.P.

V"B"

Nombre:
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN

M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo
de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

FECHA : AGOSTO DE 2023

ADICIÓN ☐

SOLICITUD DE:

PRORROGA ☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO N°:	100-103-13-09-00001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	1 MES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	01/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$)	\$ 36.389.830,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$)

N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 36.389.830,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

	DIAS	1	MESES
--	------	---	-------



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

FECHA : AGOSTO DE 2023

ADICIÓN ☐

SOLICITUD DE:

PRORROGA ☒

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

30/04/2024

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de

N/A

PRORROGA ☒ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO

MES

DIAS

10

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el día Veintinueve (29) del mes de Abril de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 86,55% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (\$)	\$ 36.389.830,00
Valor facturado (\$)	\$ 0,00
Valor facturado reajustes (\$)	\$ 0,00
Valor anticipo amortizado (\$)	\$ 0,00
Valor anticipo por amortizar (\$)	\$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

Las razón principal que motiva la solicitud de la prórroga, es el clima ya que ha generado un leve retraso en la ejecución de las obras, han sido días de fuertes lluvias y no ha sido posible trabajar o adelantar labores en dichos días, lo que genera la necesidad de solicitar una prórroga de diez (10) días.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.

Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adición y prórroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TÉCNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACIÓN FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

Una vez revisada y corroborada la justificación del contratista que lo motiva a solicitar la presente prórroga, la supervisión viabiliza la solicitud de prórroga por el periodo de Diez (10) días contados a partir de la fecha de terminación del contratado de obra.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 36.389.830,00

PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL

11

DIAS

MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

10/05/2024

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto López -Meta , a los Veintinueve (29) días del mes de Abril del año 2024.

Nombre del Contratista : UT CEMENTERIOS 2024
Representante Legal Contratista: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Firma

Nombre del supervisor Asignado: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Firma

Villavicencio Meta, 29 de Abril de 2024.

Señores:

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.

ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ.

Secretaria de Infraestructura.

Supervisora.

REF.: Contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024, CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.

ASUNTO: Solicitud Prorroga.

Cordial Saludo,

En mi condición de contratista del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024, de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el tramite de prorroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se requiere un tiempo adicional para dar finalización eficiente y eficaz al objeto contractual, ya que actualmente se cuenta con una ejecución del 86,55% del contrato, faltando por ejecutar un 13,45%, pero en vista de las fuertes lluvias que se han presentado durante el mes de Abril, nos vemos en la obligación de solicitar la presente prorroga.

El termino por el cual se solicita la prorroga del contrato es de Diez (10) días.

Agradecemos su colaboración,



ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.

CC. 1.121.865.059 de Villavicencio.

Representante Legal.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

INFORME DE OBRA PRORROGA No. 1.

CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024

OBJETO:

"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
LOPEZ - META"



CONTRATISTA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

SUPERVISION:

ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria De Infraestructura.

Puerto López – Meta

29 de Abril de 2024.

1. INTRODUCCION

El Municipio de Puerto López Meta, mediante CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024, adjudico a la UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, identificada con Nit. 901.811.916-1, representado legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META**", el 18 de Marzo de 2024 y dando inicio el 01 de Abril de 2024.

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 36.389.830,00)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar; lo anterior teniendo en cuenta la oferta económica presentada por la UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por la UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, desde la fecha de inicio 1 de Abril de 2024 hasta la fecha del presente informe es decir 29 de Abril de 2024.

Las actividades aquí descritas fueron ejecutadas satisfactoriamente, y aprobadas por la Supervisión.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Dar a conocer a la supervisión y al Municipio de Puerto López, el avance logrado hasta la fecha del presente informe del CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024.

Mediante este informe también se busca constatar el cumplimiento y las condiciones establecidas para la ejecución de las obras y evidenciar el logro de los objetivos y las obligaciones establecidas en el Contrato.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Presentar tablas de cantidades ejecutadas, obra ejecutada desde el 1 de diciembre hasta la fecha del presente informe
- ✓ Relacionar registro fotográfico para soportar las actividades descritas como ejecutadas en el tiempo transcurrido.
- ✓ Presentar un informe con un avance del 86,55% ejecutado.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del “CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META”, se pretende realizar tres actividades principales, las cuales son la construcción de un muro perimetral, veinticuatro bóvedas y la demolición y reconstrucción del sendero peatonal cuyo tramo abarca desde la puerta de entrada hasta la capilla, y doblando a la derecha.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

4.1. IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO.


- ❖ **Nombre del municipio:** Puerto López.
- ❖ **Nit:** 892.099.325-0
- ❖ **Código DANE:** 50573
- ❖ **Fecha de Fundación:** 1 de mayo 1935
- ❖ **Departamento:** Meta
- ❖ **Población:** 33.440 habitantes
- ❖ **Extensión total:** 6.740 Km²
- ❖ **Extensión área urbana:** 9.5 Km²
- ❖ **Extensión área rural:** 6730.5 Km²
- ❖ **Altitud:** 365 Msnm
- ❖ **Temperatura Promedio:** 26.5 °C
- ❖ **Limites:** al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martín, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.

4.2 GEOGRAFIA.

Puerto López es un Municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

Históricamente el municipio de Puerto López perteneció al globo general de la hacienda YACUANA (adjudicada por el Estado colombiano a los Convers, mediante resolución No. 50 del 11 de agosto de 1896), dividida en 6 fundaciones, correspondiendo la denominada Banderas al área actual del municipio.

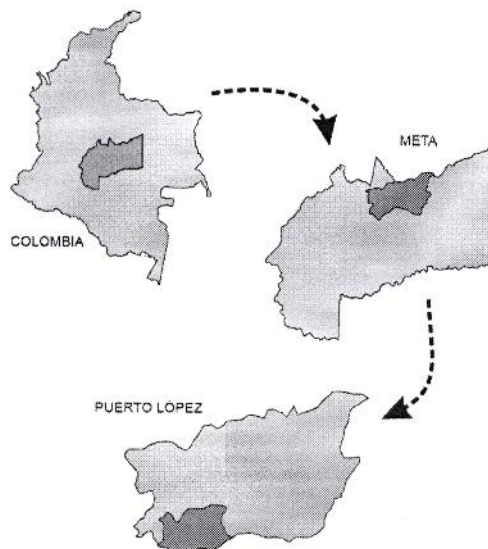

4.3. UBICACIÓN EJECUCION DE LA OBRA

LUGAR	AVENIDA	CARRERA
CEMENTERIO CENTRAL DE PTO LOPEZ	AVENIDA 14	CARRERA 9



5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. INFORMACION GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024.

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 Nit.: 901.811.916-1 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
SUPERVISION	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	100-103-13-09-00001-2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 36.389.830,00)
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE ABRIL DE 2024

5.2. CONDICIONES CONTRATADAS.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024, las condiciones contractuales son las siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	\$ 3.754,73	\$ 67.135,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	\$ 8.831,61	\$ 157.909,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	\$ 604.816,44	\$ 90.722,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	\$ 969.060,92	\$ 1.376.067,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	\$ 62.183,02	\$ 225.724,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	\$ 1.342.043,29	\$ 1.207.839,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	\$ 8.629,76	\$ 3.464.935,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	\$ 53.733,97	\$ 3.109.585,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	\$ 789.895,18	\$ 987.369,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	\$ 1.118.389,28	\$ 4.305.799,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	\$ 9.286,62	\$ 1.407.294,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	\$ 34.927,40	\$ 1.048.171,00

INFORME DE OBRA PRORROGA No. 1.
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	\$ 42.936,22	\$ 3.888.733,00
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	\$ 14.129,34	\$ 794.210,00
COSTO SUBTOTAL					\$ 22.131.492,00
2	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	\$ 19.493,79	\$ 428.863,00
2,2	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	\$ 7.209,82	\$ 158.616,00
2,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,12	\$ 337.201,33	\$ 40.464,00
2,4	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	15,38	\$ 54.269,15	\$ 834.660,00
2,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,00	\$ 34.927,40	\$ 209.564,00
2,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,67	\$ 42.936,22	\$ 629.874,00
2,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,64	\$ 1.118.389,28	\$ 715.769,00
2,8	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	16,62	\$ 9.286,62	\$ 154.344,00
2,9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	\$ 2.218.727,61	\$ 44.375,00
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	32,30	\$ 27.090,69	\$ 875.029,00
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,67	\$ 14.129,34	\$ 221.407,00
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	22,00	\$ 43.097,89	\$ 948.154,00
2,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	\$ 1.309.091,15	\$ 104.727,00
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	32,58	\$ 8.629,76	\$ 281.158,00

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

		COSTO SUBTOTAL	\$ 5.647.004,00
			\$ 27.778.496,00
ADMINISTRACION	25%		\$ 6.944.624,00
IMPREVISTOS	1%		\$ 277.785,00
UTILIDAD	5%		\$ 1.388.925,00
TOTAL AIU	31%		\$ 8.611.334,00
		TOTAL COSTO CONTRATO DE OBRA	\$ 36.389.830,00

5.3. OBRA EJECUTADA

A continuación, se presenta cada una de las actividades ejecutadas desde el 1 de Abril hasta el 29 de Abril de 2024, donde se realiza solicitud de prórroga, con un porcentaje de ejecución de la obra de 86,55%.

CAPITULO 1. CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS

ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 11,88 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.2 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 11,88 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.




ITEM 1.3 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,15 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

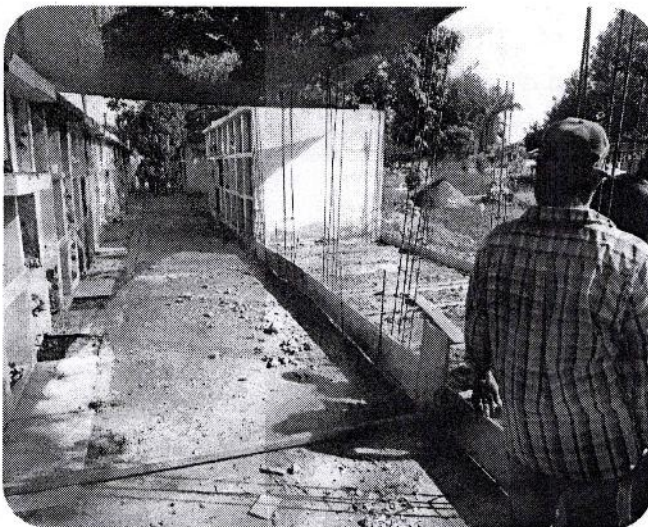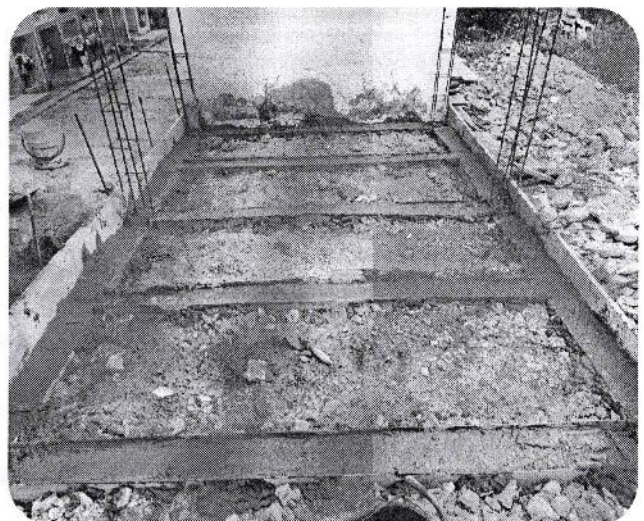


ITEM 1.4 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 1,42 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

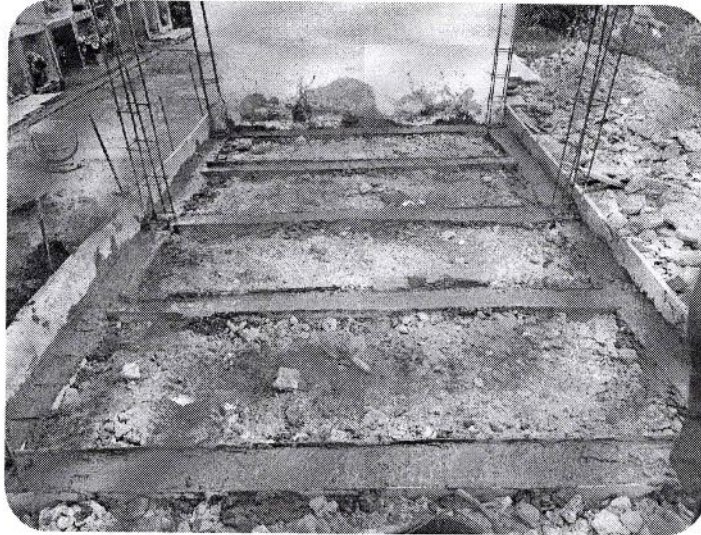


ITEM 1.5 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 3,63 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

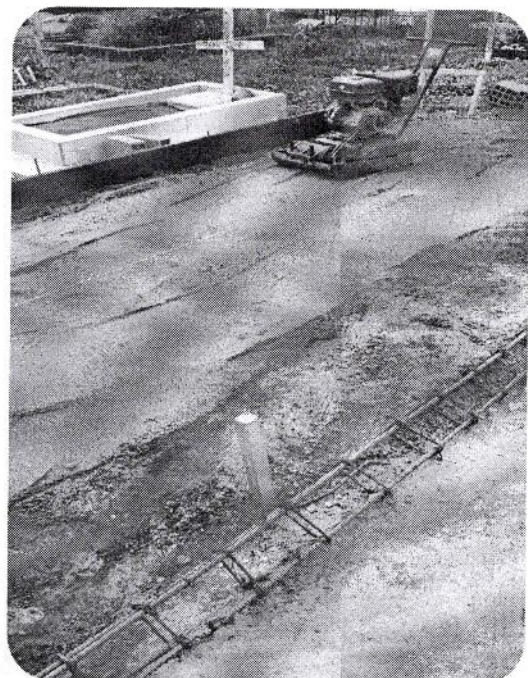


ITEM 1.6 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,90 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

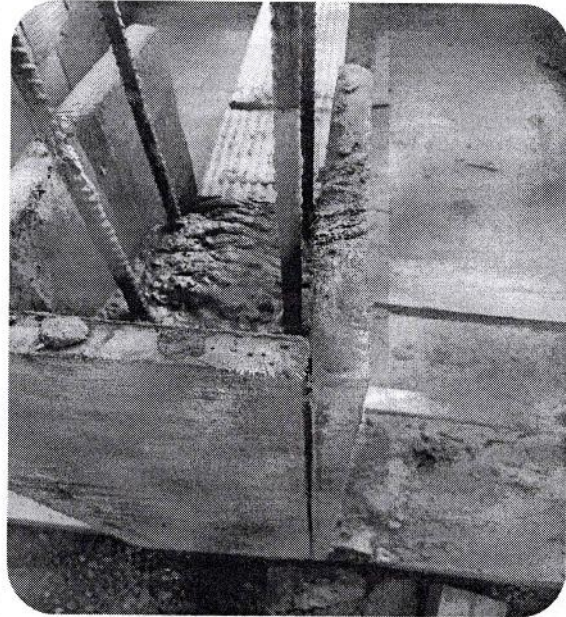



ITEM 1.7 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 151,54 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

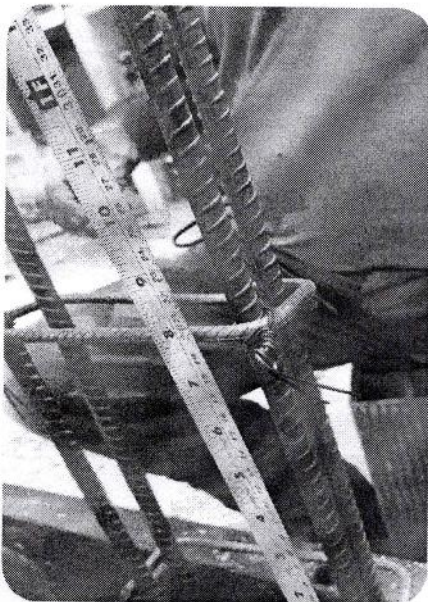

ITEM 1.8 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 57,87 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

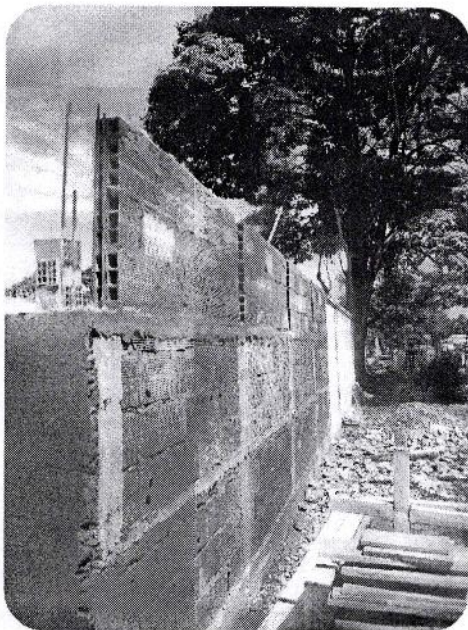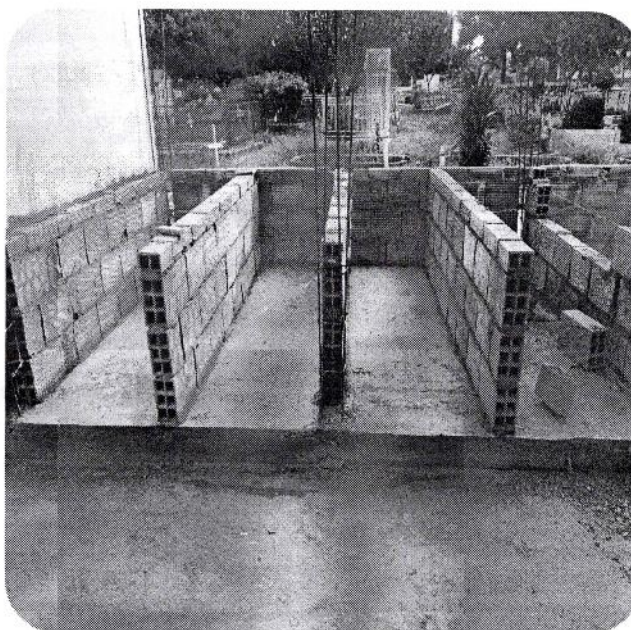



ITEM 1.9 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 1,25 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.10 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 68% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 2,60 M3, quedando pendiente ejecutar 1,25 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

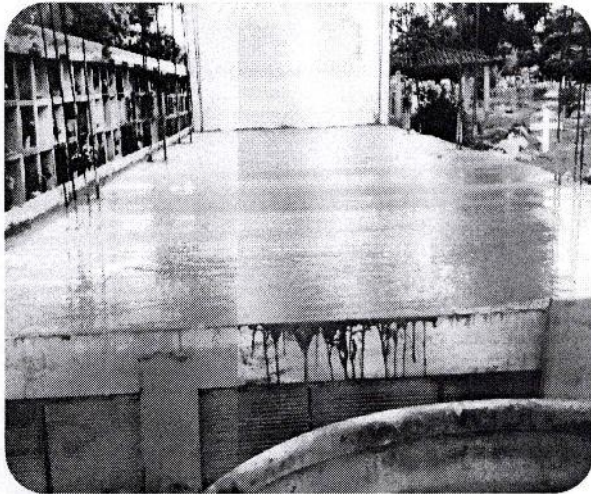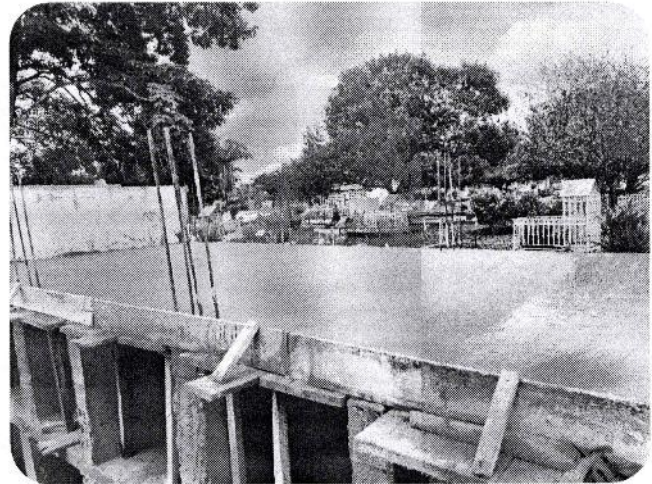


ITEM 1.11 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 151,54 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

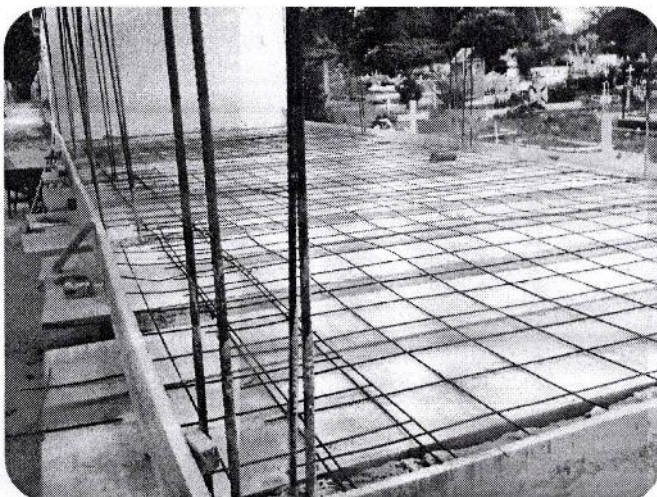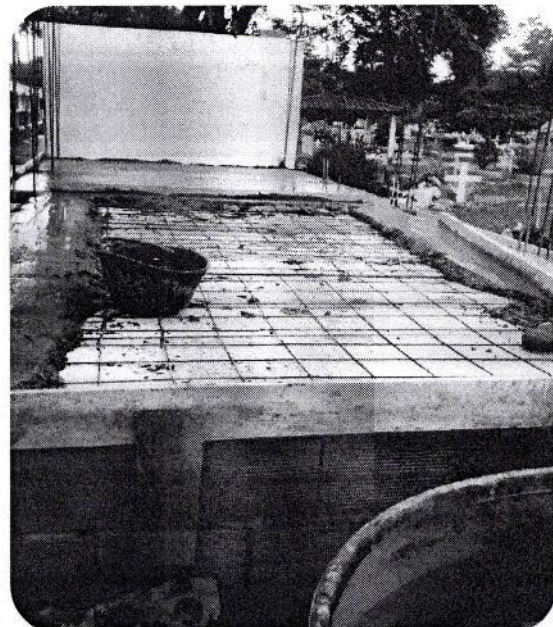

ITEM 1.12 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 30,01 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

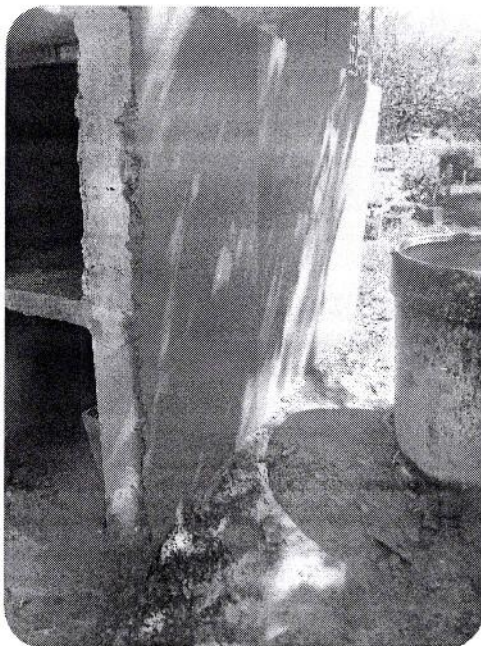

ITEM 1.13 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.


A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 90,57 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.



CAPITULO 2. CONSTRUCCION DE OSARIOS.

ITEM 2.1. DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 22,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

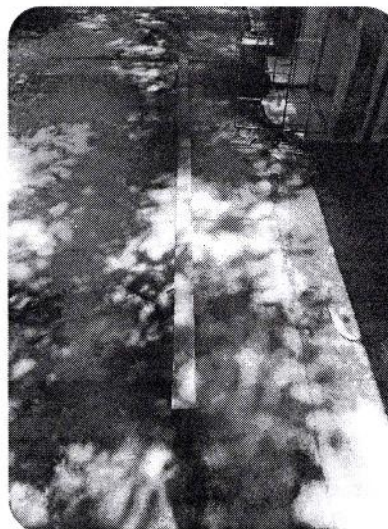


ITEM 2.2. DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 22,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





ITEM 2.3. DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,12 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

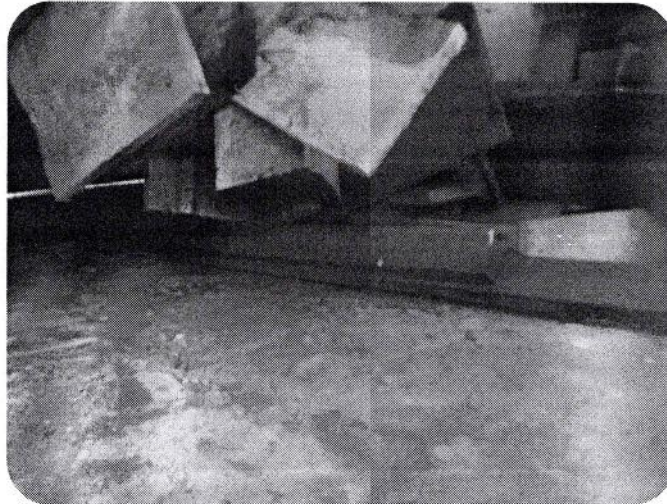


ITEM 2.4. MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 15,38 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

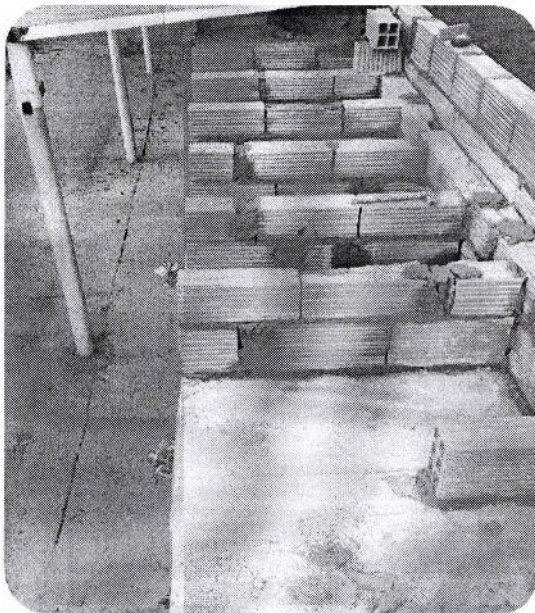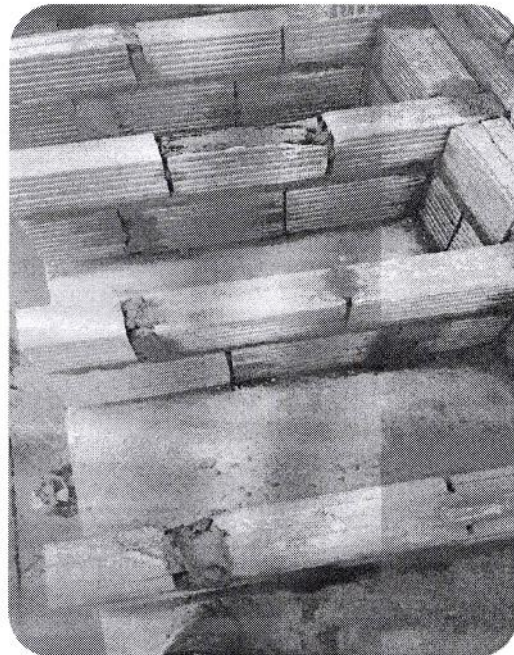



ITEM 2.6. PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 14,67 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

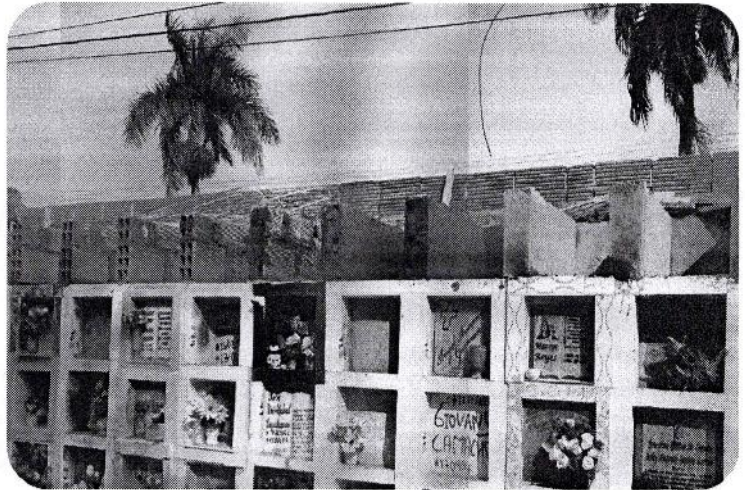

ITEM 2.7. PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN



A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,64 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

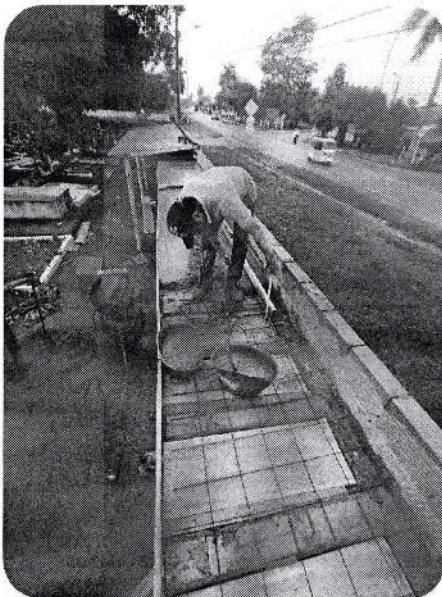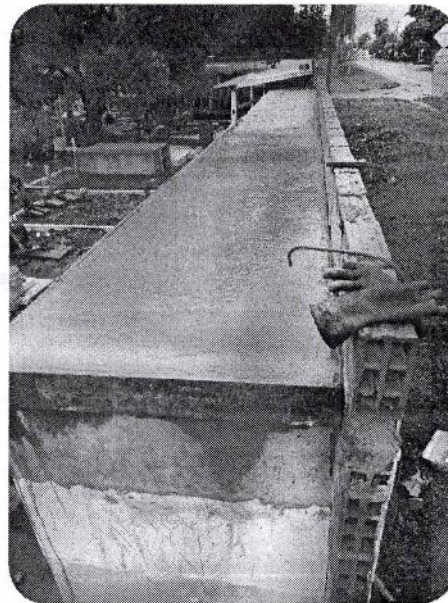

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

ITEM 2.8. MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 16,62 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

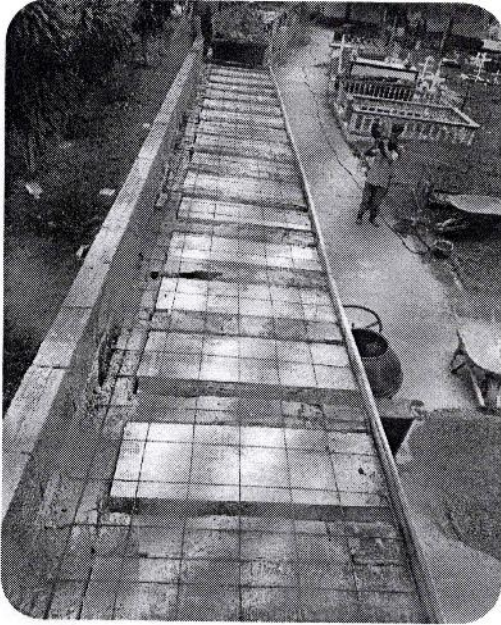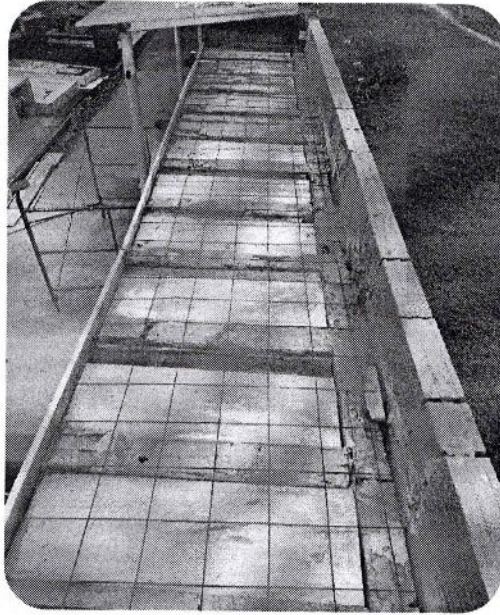


ITEM 2.9. PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,02 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades




ITEM 2.10. CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 32,30 MI, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

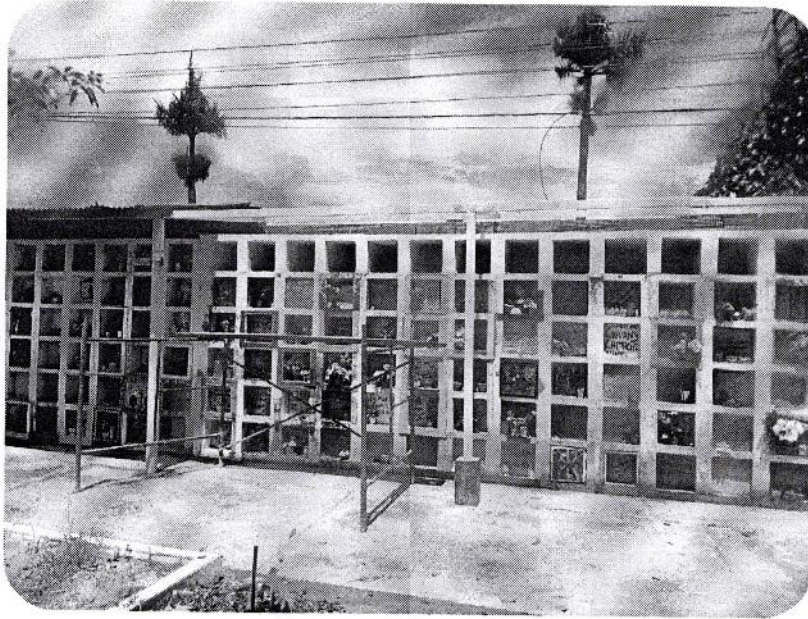

ITEM 2.11. PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 15,67 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades

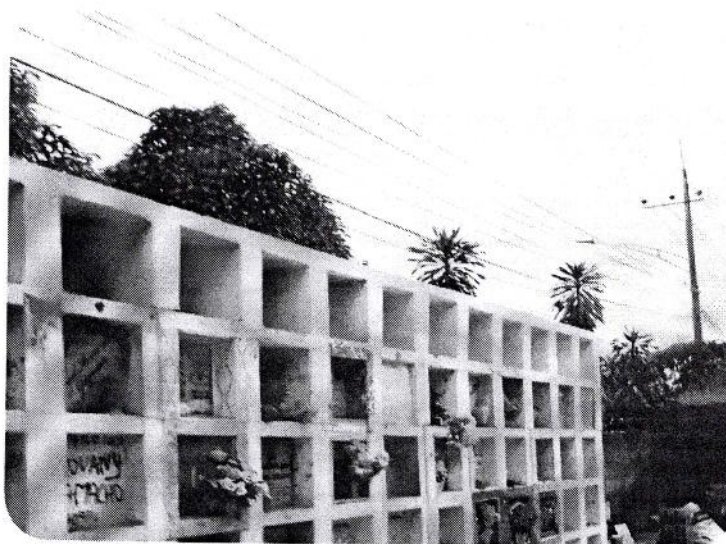

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

RESUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS									
N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	%	ACUMULADO		
1.00	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS								
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	\$ 3.754,73	17,88	\$ 67.134,57	100%			
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	\$ 8.831,61	17,88	\$ 157.909,19	100%			
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	\$ 604.816,44	0,15	\$ 90.722,47	100%			
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 969.060,92	1,42	\$ 1.376.066,51	100%			
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	\$ 62.183,02	3,63	\$ 225.724,36	100%			
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.342.043,29	0,90	\$ 1.207.838,96	100%			
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	\$ 8.629,76	401,51	\$ 3.464.934,94	100%			
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	\$ 53.733,97	57,87	\$ 3.109.584,84	100%			
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 789.895,18	1,25	\$ 987.368,98	100%			

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$	1.118.389,28	2,60	\$	2.907.812,13	68%
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2. 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	\$	9.286,62	151,54	\$	1.407.294,39	100%
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	34.927,40	30,01	\$	1.048.171,27	100%
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	42.936,22	90,57	\$	3.888.733,45	100%
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	\$	14.129,34	0,00	\$	-	0%
2.00	CONSTRUCCION OSARIOS							
2.01	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$	19.493,79	22,00	\$	428.863,38	100%
2.02	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$	7.209,82	22,00	\$	158.616,04	100%
2.03	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$	337.201,33	0,12	\$	40.464,16	100%
2.04	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	\$	54.269,15	15,38	\$	834.659,53	100%
2.05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	\$	34.927,40	0,00	\$	-	0%
2.06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	\$	42.936,22	14,67	\$	629.874,35	100%
2.07	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$	1.118.389,28	0,64	\$	715.769,14	100%
				SUBTOTAL		\$	19.939.296,05	90%

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

2.08	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	\$	9.286,62	16,62	\$	154.343,62	100%
2.09	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$	2.218.727,61	0,02	\$	44.374,55	100%
2.10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	\$	27.090,69	32,30	\$	875.029,29	100%
2.11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	\$	14.129,34	15,67	\$	21.406,76	100%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	\$	43.097,89	0,00	\$	-	0%
2.13	VÍGA ÁREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$	1.309.091,15	0,00	\$	-	0%
2.14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	\$	8.629,76	0,00	\$	-	0%
		SUBTOTAL				\$	4.103.400,81	73%
		COSTO DIRECTO				\$	24.042.696,87	
		ADMINISTRACION			25%	\$	6.010.674,22	
		IMPREVISTOS			1%	\$	240.426,97	
		UTILIDAD			5%	\$	1.202.134,84	
		AIU 31%				\$	7.453.236,03	
		COSTO TOTAL				\$	31.495.932,90	86,55%
		COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO				\$	31.495.933,00	86,55%

6. BALANCE FINANCIERO.

El contratista a fecha 29 de Abril de 2024, tiene un avance de obra del 86,55%, el cual da avance financiero de Treinta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Treinta y tres pesos M/cte (\$ 31.495.933,00), quedando un 13,45% pendiente por ejecutar dentro del tiempo establecido del contrato, sin embargo a la fecha el contratista no ha realizado ninguna solicitud de pago parcial.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		%
ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	\$ 31.495.933,00	86,55%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.893.897,00	13,45%
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 36.389.830,00	100%

7. GARANTIAS DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se comprometió a construir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de un (01) día hábil siguiente a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los riesgos de; cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de obra y la responsabilidad civil extracontractual especificados y establecidos en el contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024.

GARANTIAS DEL CONTRATO			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	18/08/2024	\$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/03/2024	18/04/2027	\$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2024	30/04/2029	\$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29/11/2022	28/12/2022	\$ 260.000.000

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✚ Se recomienda al Municipio de Puerto López, revisar y estar al tanto del estado de estos equipamientos para garantizar la seguridad de los mismos.
- ✚ En el periodo transcurrido hasta la fecha, se ha ejecutado un 86,55% de las actividades contratadas, quedando así un 13,45% por ejecutar, por lo tanto, es necesario solicitar la presente prórroga para dar terminación al presente contrato, ya que las fuertes lluvias nos generó un leve retraso.
- ✚ Están pendiente por ejecutar en el tiempo de la presente solicitud de prórroga los ítems 1.14 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS de las Bovedas y el ítem 2.05 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN, ítem 2.12 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, ítem 2.13 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, ítem 2.14 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE de los osarios.

Atentamente;



ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.

C.G. 1.121.865.059 de Villavicencio.

Representante Legal.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

INFORME N° 01

PERIODO DEL 01-04-2024 AL 29-04-2024

FECHA DE PRESETANCION: 29-04-2024

INFORME DE PRORROGA

INFORMACIÓN BÁSICA				
TIPO DE CONTRATO :	OBRA			
CONTRATO N° :	100-103-13-09-00001-2024			
OBJETO CONTRATO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 36.389.830,00)			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	01-04-2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	N/A			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	N/A			
CORREO ELECTRONICO:	N/A			
SUPERVISOR ASIGNADO:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Secretaria de Infraestructura.			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	N/A			
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° XX:	N/A			
TIEMPO:	N/A	Meses	N/A	Días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A			
SUSPENSIÓN N° XX:	N/A			
TIEMPO:	N/A	Meses	N/A	Días
AMPLIACION N° XX A SUSPENSIÓN N° XX:	N/A	Meses	N/A	Días

NIT: 892099325-0

Código Postal 502001

Calle 6 No. 4 – 40

Teléfonos 645 0412 – 645 1867

Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

TIEMPO:				
REINICIO N° XX:	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	N/A			
MODIFICACIÓN N°XX:	N/A			
VALOR MODIFICADO:	N/A			
FECHA ADICIONAL N° XX:	N/A			
VALOR ADICIONAL :	N/A			
VALOR ACTUALIZADO :	N/A			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	N/A			

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Puerto López Meta	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	Centro
COORDENADAS:	Avenida 14 Carrera 9		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO





**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO
LOCALIZA CION Y REPLANTE O CONVENCIO NAL OBRA ARQUITEC TÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRA FICA.	10 0%	\$ 67.134,57	100 %	\$ 67.134,57	100 %	\$ 67.134,57	10 0%	\$ 67.134,57
DESCAPOT E MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	10 0%	\$157.909,19	100 %	\$157.909,19	100 %	\$157.909,19	10 0%	\$157.909,19
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRET O 13.8 MPa (2000 PSI)	10 0%	\$90.722,47	100 %	\$90.722,47	100 %	\$90.722,47	10 0%	\$90.722,47
VIGA EN CONCRET O 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.	10 0%	1.376.066,51	100 %	1.376.066,51	100 %	1.376.066,51	10 0%	1.376.066,51

NIT: 892099325-0

Código Postal 502001

Calle 6 No. 4 – 40

Teléfonos 645 0412 – 645 1867

Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

SUMINISTR O Y CONSTRU CCIÓN								
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESA R TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTR O, EXTENDID O, NIVELACIÓ N, HUMEDECI MIENTO Y COMPACT ACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	10 0%	225.724,36	100 %	225.724,36	100 %	225.724,36	10 0%	225.724,36
COLUMNA EN CONCRET O 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTR O Y CONSTRU CCIÓN	10 0%	1.207.838,96	100 %	1.207.838,96	100 %	1.207.838,96	10 0%	1.207.838,96
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)	10 0%	3.464.934,94	100 %	3.464.934,94	100 %	3.464.934,94	10 0%	3.464.934,94

NIT: 892099325-0

Código Postal 502001

Calle 6 No. 4 – 40

Teléfonos 645 0412 – 645 1867

Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co
