

**INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA N° 3335 DE 2023**

OBJETO CONTRATO DE OBRA

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

PERIODO: DEL 10 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3586 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCION PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

INTERVENTOR

HAEEM Ingeniería & Consultoría SAS
NIT 900553674-5

REPRESENTANTE LEGAL

ANGÉLICA MARÍA PATIÑO ECHAVARRIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe técnico elaborado por la interventoría con el fin de reportar el seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas, técnicas y financieras ejecutadas por el contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS.

Este informe contiene el avance de ejecución de las actividades tanto en estudios y diseños del canal quebrada la cañada como de la obra a realizar, según lo contemplado en el contrato cuyo objeto es la **“OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”**.

En el desarrollo de este informe se encontrará el avance y descripción de las actividades ejecutadas de acuerdo con el cronograma y presupuesto, el cual tiene como finalidad el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de obra N°3335 durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 31 de marzo del 2024, con el fin de establecer la correcta ejecución y funcionalidad de este, y establecer los debidos ajustes.

2. OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

Realizar seguimiento al avance de las actividades administrativas, técnicas y financieras ejecutadas de acuerdo con el cronograma y presupuesto, del contrato de obra N°3335, con el fin de establecer su debida ejecución en condiciones de integralidad y funcionalidad en cumplimiento de la normatividad vigente.

3. FUNCIONES

FUNCIONES TECNICAS:

- Realizar el seguimiento al avance físico – financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión.
- Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas. Se elabora acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo y se reconoce al contratista de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas.
- Asesorar y suministrar la información técnica – financiera y en general al contratista.
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitiendo concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitiéndolas al supervisor, para su trámite.

Dirección: Av. 5BIS #9-26 Casa B28 Callejas del Este A, Prados del Este
Tel: 3014000355 / 3017556073; haaem.sas@gmail.com; NIT. 900553674-5.

- Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal a su cargo.
- Velar por que el contratista de estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción de la obra.
- Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto.
- Exigir al constructor el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial (Decreto 472/2015 Resolución 2400 EPP, Resolución 1409/2012 Trabajo Seguro en Alturas etc.) y salud ocupacional (DECRETO 1295 DE 1994, LEY 1562 DE 2012) del personal a su cargo.
- Registro fotográfico de las obras intervenidas en el periodo.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

- Elaboración de Actas de Reunión técnica.
- Asistencia a las reuniones, en donde se trataron temas técnicos y entrega de Documentación de Legalización e inicio de obra.
- Realización de informe.
- Revisión de los documentos emitidos por el contratista como: Documentos para el control de avance de obra y otros.
- Revisión pre-acta y elaboración acta de recibo parcial No 3 de obra

4. LOCALIZACIÓN

El cauce de aguas de escorrentía, denominada Quebrada La Cañada (IGAC) se encuentra en la zona Occidental de la ciudad de Cúcuta, su cauce actual circula por áreas de uso residenciales, en la zona interna del Perímetro urbano; zona de actividad del suelo urbano tipo ZR-4 "Zona Residencial 4" creada según el acuerdo 089-2011, con inicio específicamente de su curso alto en el barrio el Desierto, y su curso principal en el barrio Palmeras, transitando el valle limitado por el cerro la victoria y el cerro de Antonia Santos, su cuerpo de agua mantiene especial cercanía con los barrios Antonia Santos, Belisario Betancur, Palmeras, los Olivos y las áreas de desarrollo urbanístico donde se proyecta la construcción de macroproyectos de vivienda de interés social, de los cuales ya se

encuentra en construcción La ciudadela de los Estoraques, San Fernando del Rodeo entre otros.

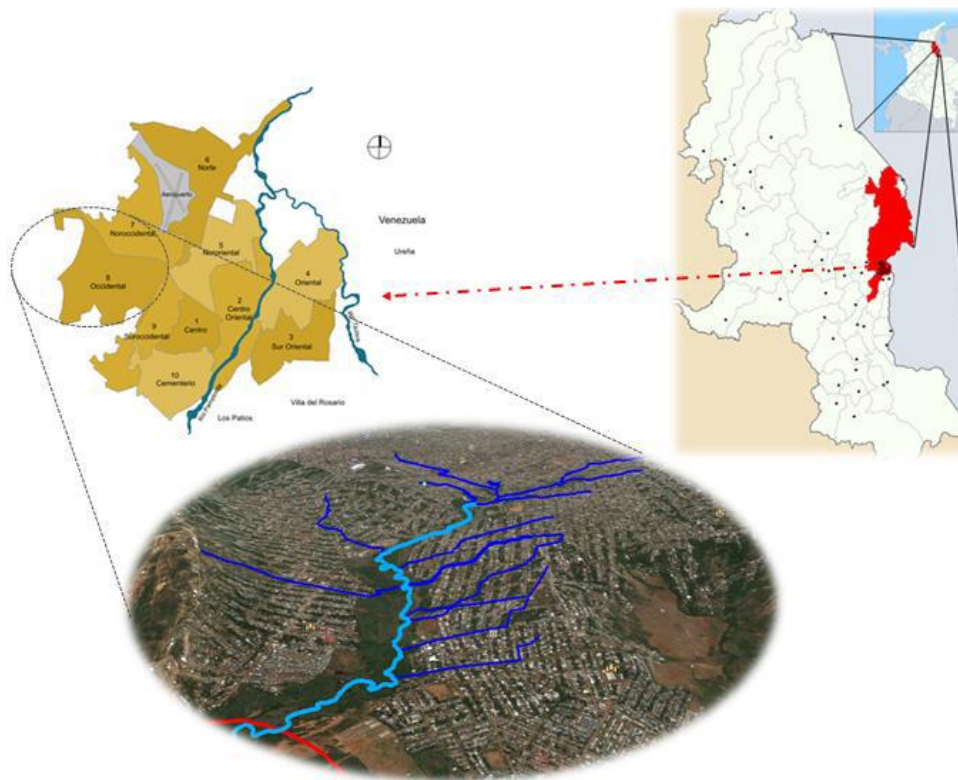


Figura No 1

5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA SIM-LP-001-2023
CONTRATO No.	3335 de 2023
FECHA DEL CONTRATO	01 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	“OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS. NIT 900562491-9
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA C.C. 88.226.824
INTERVENTORÍA	HAAEM INGENIERA & CONSULTORIAS SAS

Dirección: Av. 5BIS #9-26 Casa B28 Callejas del Este A, Prados del Este
Tel: 3014000355 / 3017556073; haaem.sas@gmail.com; NIT. 900553674-5.

REPRESENTANTE LEGAL	ANGÉLICA MARÍA PATIÑO ECHAVARRIA
VALOR DE CONTRATO INICIAL	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.729.699.839)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA MODIFICACIÓN N°1	07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA N°1	12/12/2023, SE PRORROGA EL CONTRATO POR EL TERMINO (16) DÍAS, A PARTIR DEL 15/12/2023.
FECHA SUSPENSIÓN N°1	27 DE DICIEMBRE DE 2023 (PLAZO 45 DIAS)
FECHA DE REINICIO N°1	10 DE FEBRERO DE 2024
FECHA PRORROGA N°2	15 DE FEBRERO DE 2024 (4 MESES ADICIONALES)
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DE 2024
PROYECTO – RUBRO	2020540010041 CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 4003020 alcantarillados optimizados
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 001816 del 11-04-2023 1.2.1.0.00.1 ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN INVERSIÓN: \$817.406.825 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INVERSIÓN: \$1.000.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 004143 del 01-08-2023 2.1.2.3.2.02.02.009.40 Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.1.0.00.1-ICLD - LIBRE ASIGNACION 2.1.2.3.2.02.02.009.40 Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CUANTIA	\$ 1.729.699.839,00

DATOS DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR O SUPERVISOR	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
DEPENDENCIA	SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
CARGO	SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
LOCALIDAD - DIRECCION	CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4 - Cúcuta Norte de Santander – COLOMBIA.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. JORGE ELIECER HERNANDEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 10 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	18,10%	18,10%

PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN	37,58%	37,58%
PORCENTAJE PROYECTADO	3,65%	3,65%

6. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

6.1. GARANTIAS

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	69352 Anexo 0	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	15/06/2024	\$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	09/08/2023	15/10/2023	\$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	15/12/2026	\$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 15-12-2023 // 15-12-2028		\$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	\$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	20308 Anexo 0	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/08/2023	15/12/2023	\$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	25 DE AGOSTO DE 2023		

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	69352 Anexo 1	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/09/2023	15/06/2024	\$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/09/2023	15/10/2023	\$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	11/09/2023	15/12/2026	\$172.969.983,90

ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 15-12-2023 // 15-12-2028		\$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	\$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	20308 Anexo 1	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11/09/2023	15/12/2023	\$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	69352 Anexo 4	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	01/07/2024	\$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	15/10/2023	\$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	31/12/2026	\$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 31/12/2023 // 31/12/2025		\$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	\$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	20308 Anexo 3	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/12/2023	31/12/2023	\$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	12 DE DICIEMBRE DE 2023		

POLIZA SEGÚN SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	69352 Anexo 4	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	01/08/2024	\$518.909.951,70

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	10/08/2023	\$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	10/02/2027	\$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 10/02/2024 al 10/02/2029		\$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	10/02/2024	10/02/2026	\$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	20308 Anexo 5	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	31/12/2023	10/02/2024	\$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	27 DE DICIEMBRE DE 2023		

POLIZA SEGÚN REINICIO Y PRORROGA No. 02

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	69352 Anexo 7	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	14/12/2024	\$ 518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	14/12/2024	\$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	14/06/2027	\$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 14/06/2024 al 14/06/2029		\$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2024	14/06/2026	\$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	20308 Anexo 6	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	31/12/2023	10/02/2024	\$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	10 DE FEBERERO DE 2024		

6.2. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CONTRATISTA

El contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, para el cumplimiento del objeto del contrato contó en el periodo con el siguiente equipo de profesionales:

Dirección: Av. 5BIS #9-26 Casa B28 Callejas del Este A, Prados del Este
 Tel: 3014000355 / 3017556073; haaem.sas@gmail.com; NIT. 900553674-5.

OBRA

- **DIRECTOR DE OBRA:** NELSON JAVIER CELY, Ingeniero civil.
- **RESIDENTE DE OBRA:** ALVARO RAMIREZ MORA, Ingeniero civil.
- **PROFESIONAL AMBIENTAL:** LAURA GARCIA, Ingeniera Ambiental.
- **PROFESIONAL SST:** FIDELINA MEDINA, Profesional SST.
- **PROFESIONAL SOCIAL:** DANIELA MATAMOROS CASTAÑEDA, Trabajadora Social.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presenta el seguimiento, verificación y control técnico, administrativo y financiero realizado por la interventoría HAAEM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS a la implementación del objeto del contrato No. 3335 de 2023 por parte del contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2024 y el 31 de marzo de 2024:

7.1 OBRA

Durante este periodo de obra se realizaron:

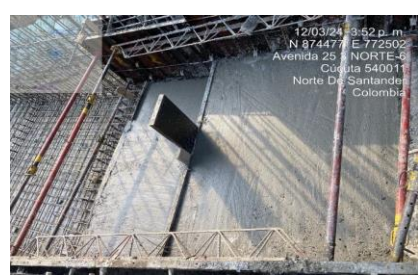
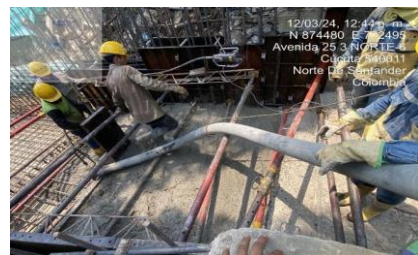
- Excavación manual en material común de la zona: Durante el periodo se realizaron 22,30 m3.
- Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso: Durante el periodo se realizaron 28,20 m3 y se proyectó 28,7989 m3 más para un total de 56,9989 m3.
- Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales: Durante el periodo se realizaron 18,77 m3 y se proyectó 20,48 m3 más para un total de 39,25 m3.
- Acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60: Durante el periodo se realizaron 9616,91 kg y se proyectó 1875,22 kg más para un total de 11492,13 kg.
- Excavación a máquina en material conglomerado: Durante el periodo se realizaron 89,48 m3.
- Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros: Durante el periodo se realizaron 192,55 m3 y se proyectó 14,17 m3 más para un total de 206,72 m3.
- Acarreo o trasiego mecánico interno para sobrantes de excavaciones y materiales pétreos: Durante el periodo se realizaron 40 m3

Se realizó una suspensión N°1 con fecha 27/12/24 por 45 días.

Se realizó un reinicio N°1 con fecha 10/02/24.

Se realizó una prórroga N°2 con fecha 15/02/24 hasta el 14/06/2024 (4 meses)

Durante este periodo se hizo seguimiento a las actividades contractuales de obra y los no previstos del modificatorio N°1, supervisando que estas se realizaran de manera óptima y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. A continuación, se anexa memoria de cálculo del periodo 10/02/24 - 31/03/24:

 <p>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA	VERSIÓN: 1.1 FECHA: 01/08/2022							
	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
Macroproceso	Proceso	Subproceso							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
SUBSECRETARÍA	SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	RECIBO PARCIAL No. 3 DE 3 FECHA 1/4/2024 <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso) (Consecutivo) (Escriba fecha del acta)</small>							
CONTRATO No. 3335 DE 2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>	Nº DE PROCESO SIM-LP-001-2023 <small>(Indique el No. SECCOP II)</small>								
OBJETO DEL CONTRATO									
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
CONTRATISTA DE OBRA SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS NIT 900562491-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3586 DE 2023 Nº DE PROCESO SIM-CMA-001-2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECCOP II)</small>									
OBJETO DEL CONTRATO									
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
INTERVENTOR HAAEM INGENIERÍA & CONSULTORIA SAS NIT 901605256-4 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>									
SUPERVISOR(A) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA CC 13.503.541 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el CC del Supervisor designado)</small>									
CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA									
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
2.2		Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	M3						
CANTIDADES APROBADAS									
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
1	de 28 Mpa para losas	Primera placa Canal Rectangular	2,05	3,70	0,35	M3	\$ 916.151,00	2,6548	\$ 2.432.151,87
2	de 28 Mpa para losas	Segunda placa Canal Rectangular	2,05	4,15	0,35	M3	\$ 916.151,00	2,9776	\$ 2.727.954,12
	de 28 Mpa para losas	Tercera placa Canal Rectangular	3,60	4,30	0,35	M3	\$ 916.151,00	5,4180	\$ 4.963.706,12
	terrado de 28 Mpa para	Cuarta placa Canal Rectangular	3,00	4,60	0,35	M3	\$ 916.151,00	4,8300	\$ 4.425.009,33
	terrado de 28 Mpa para	Continuación Cuarta placa Canal Rectangular	3,25	4,60	0,35	M3	\$ 916.151,00	5,23	\$ 4.793.760,11
	terrado de 28 Mpa para	Primera placa Canal Trapezoidal	1,10	5,00	0,40	M3	\$ 916.151,00	2,20	\$ 2.015.532,20
	terrado de 28 Mpa para	Segunda placa Canal Trapezoidal	1,10	6,15	0,40	M3	\$ 916.151,00	2,71	\$ 2.479.104,61
	terrado de 28 Mpa para	Tercera placa Canal Trapezoidal	0,60	6,65	0,40	M3	\$ 916.151,00	1,60	\$ 1.462.177,00
	terrado de 28 Mpa para	Cuarta placa Canal Trapezoidal	0,50	6,80	0,40	M3	\$ 916.151,00	1,36	\$ 1.245.965,36
	terrado de 28 Mpa para	Quinta placa Canal Trapezoidal	1,10	7,30	0,40	M3	\$ 916.151,00	3,21	\$ 2.940.677,03
	terrado de 28 Mpa para	Quinta placa Canal Trapezoidal	1,20	8,15	0,40	M3	\$ 916.151,00	3,91	\$ 3.583.982,71
	de 28 Mpa para losas de piso	Continuación de Quinta placa Transición Canal Trapezoidal	5,50	9,50	0,40	M3	\$ 916.151,00	20,90	\$ 19.147.555,90
	terrado de 28 Mpa para						\$ 916.151,00	0,00	\$ 0,00
	terrado de 28 Mpa para						\$ 916.151,00	0,00	\$ 0,00
CANTIDAD TOTAL 56.9989									
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.03									
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES									
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR									
\$ 52.219.576,00									
\$ 0,00									
\$ 52.219.576,00									
\$ 176.963.081,00									
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL									
REGISTRO FOTOGRÁFICO					PLANOISQUEMA UTILIZADO				
 <p>10/03/24, 6:14 p. m. N 874481 E 772520 Avenida 24A 1 NORTE-33 Cúcuta 540011 Norte de Santander Colombia</p>					 <p>12/03/24, 3:52 p. m. N 874477 E 772502 Avenida 25 NORTE-34 Cúcuta 540011 Norte de Santander Colombia</p>				
 <p>10/03/24, 6:14 p. m. N 874481 E 772520 Avenida 24A 1 NORTE-33 Cúcuta 540011 Norte de Santander Colombia</p>					 <p>12/03/24, 12:41 p. m. N 874480 E 772495 Avenida 26 NORTE-35 Cúcuta 540011 Norte de Santander Colombia</p>				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1						
			FECHA: 01/08/2022						
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
Macroproceso	Proceso		Subproceso						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
SUBSECRETARÍA SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RECIBO PARCIAL No. 3 DE 3 FECHA 1/4/2024 <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso)</small> <small>(Consecutivo)</small> <small>(Fecha)</small> <small>(Escriba fecha del acta)</small>									
CONTRATO No. 3335 DE 2023 Nº DE PROCESO SIM-LP-001-2023 <small>(Número de Contrato)</small> <small>(Año de suscripción)</small> <small>(Indique el No. SECOP II)</small>									
OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
CONTRATISTA DE OBRA SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS NIT 900562491-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3586 DE 2023 Nº DE PROCESO SIM-CMA-001-2023 <small>(Número de Contrato)</small> <small>(Año de suscripción)</small> <small>(Indique el No. SECOP II)</small>									
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
INTERVENTOR HAAEM INGENIERÍA & CONSULTORIA SAS NIT 901605256-4 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>									
SUPERVISOR(A) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA CC 13.503.541 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el CC del Supervisor designado)</small>									
CÁLCULO POR ITEM DE OBRA									
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
2.03		Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	M3						
CANTIDADES APROBADAS									
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
1.	de 28 Mpa para losas	losos primera grada a 0.9 ambos lados Rectangular	2.25	0.30	0.90	M3	\$ 989.510,00	1.11	\$ 1.095.388,00
2.	de 28 Mpa para losas	Segunda grada a 0.9 ambos lados Rectangular	1.45	0.30	0.90	M3	\$ 989.510,00	0.78	\$ 774.786,00
3.	de 28 Mpa para losas	losos segunda y tercera a 0.9 ambos lados Rectangular	3.94	0.30	0.90	M3	\$ 989.510,00	2.14	\$ 2.115.968,00
4.	de 28 Mpa para losos	Muros cuarta a 0.9 ambos lados Rectangular	1.11	0.30	0.90	M3	\$ 989.510,00	1.80	\$ 1.779.117,00
5.	de 28 Mpa para losos	Muros cuarta a 0.9 ambos lados Rectangular	3.15	0.30	0.90	M3	\$ 989.510,00	1.70	\$ 1.681.117,00
6.	de 28 Mpa para losos	Primera placa borde izquierdo Rectangular	2.05	0.30	1.20	M3	\$ 989.510,00	0.74	\$ 730.218,00
7.	de 28 Mpa para losos	Segunda placa borde izquierdo Rectangular	1.45	0.30	1.15	M3	\$ 989.510,00	0.77	\$ 759.400,00
8.	de 28 Mpa para losos	Tercera placa borde izquierdo Rectangular	3.80	0.30	2.05	M3	\$ 989.510,00	2.34	\$ 2.312.485,00
9.	de 28 Mpa para losos	Primera placa borde derecho Rectangular	2.70	0.30	1.15	M3	\$ 989.510,00	0.59	\$ 581.729,00
10.	de 28 Mpa para losos	Segunda placa borde derecho Rectangular	1.50	0.30	1.60	M3	\$ 989.510,00	0.72	\$ 712.447,00
11.	de 28 Mpa para losos	Tercera placa borde derecho Rectangular	3.90	0.30	2.00	M3	\$ 989.510,00	2.34	\$ 2.315.453,00
12.	de 28 Mpa para losos	Primera grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.40	M3	\$ 989.510,00	1.21	\$ 1.210.076,00
13.	de 28 Mpa para losos	Segunda grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.40	M3	\$ 989.510,00	1.21	\$ 1.210.076,00
14.	de 28 Mpa para losos	Tercera grada ambos lados Trapezoidal	0.60	0.40	1.40	M3	\$ 989.510,00	0.67	\$ 664.951,00
15.	de 28 Mpa para losos	Primera placa ambos lados Rectangular	7.00	0.30	2.05	M3	\$ 989.510,00	8.46	\$ 8.339.481,00
16.	de 28 Mpa para losos	Tercera grada ambos lados Trapezoidal	6.50	0.40	1.30	M3	\$ 989.510,00	6.52	\$ 6.434.145,00
17.	de 28 Mpa para losos	Cuarta grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.30	M3	\$ 989.510,00	1.14	\$ 1.131.999,00
18.	de 28 Mpa para losos	Quinta grada ambos lados Trapezoidal	1.20	0.40	1.30	M3	\$ 989.510,00	1.25	\$ 1.234.908,00
19.	de 28 Mpa para losos	Placa muro existente Canal Trapezoidal	2.50	0.30	1.60	M3	\$ 989.510,00	2.40	\$ 2.374.824,00
20.	de 28 Mpa para losos	ContinuaciónPrimera grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	0.80	M3	\$ 989.510,00	0.70	\$ 696.615,00
21.	de 28 Mpa para losos	Continuación Segunda grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.20	M3	\$ 989.510,00	1.06	\$ 1.044.923,00
22.	de 28 Mpa para losos	Continuación Tercera grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.20	M3	\$ 989.510,00	1.06	\$ 1.044.923,00
23.	de 28 Mpa para losos	Continuación Tercera grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.20	M3	\$ 989.510,00	1.06	\$ 1.044.923,00
24.	de 28 Mpa para losos	Continuación Cuarta grada ambos lados Trapezoidal	1.10	0.40	1.40	M3	\$ 989.510,00	1.23	\$ 1.219.076,00
25.	de 28 Mpa para losos	Continuación Quinta grada ambos lados Trapezoidal	1.20	0.40	1.80	M3	\$ 989.510,00	1.73	\$ 1.709.873,00
26.	de 28 Mpa para losos					M3	\$ 989.510,00	0.00	\$ 0.00
CANTIDAD TOTAL							39.25		
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.03								\$ 38.839.400,00	
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES								\$ 0.00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO								\$ 38.839.400,00	
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR								\$ 67.847.362,00	
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL									
REGISTRO FOTOGRAFICO					PLANOS/ESQUEMA UTILIZADO				
									
									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1				
			FECHA: 01/08/2022				
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				
Macroproceso	Proceso		Subproceso				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
SUBSECRETARÍA SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso)</small>		RECIBO PARCIAL No. 3 DE 3 FECHA 1/4/2024 <small>(Consecutivo) (Folio) (Escriba fecha del acto)</small>					
CONTRATO No. 3335 DE 2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>		N° DE PROCESO SIM-LP-001-2023 <small>(Indique el No. SECOP B)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO							
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA							
CONTRATISTA DE OBRA SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>		NIT 900562491-9 <small>(Escriba el NIT del contratista o Entidad)</small>					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3586 DE 2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>		N° DE PROCESO SIM-CMA-001-2023 <small>(Indique el No. SECOP B)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO							
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA							
INTERVENTOR HAAEM INGENIERÍA & CONSULTORÍA SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT 901605256-4 <small>(Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>					
SUPERVISOR(A) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA <small>(Escriba el nombre o razón social del supervisor)</small>		CC 13 503 541 <small>(Escriba el CC del Supervisor designado)</small>					
CÁLCULO POR ITEM DE OBRA							
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			
	2.5	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	kg				
CANTIDADES APROBADAS							
No.	CIV	UBICACIÓN	Cantidad KG	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
1	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 78" Gancho en U Canal Rectangular	2.051,280	kg	\$ 9.975,00	2.051,28	\$ 20.461.518,00
2	varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Gancho superior de la losa inferior Canal Rectangular	471,990	kg	\$ 9.975,00	471,99	\$ 4.708.100,25
3	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Baston ambos lados muro interno Canal Rectangular	675,43	kg	\$ 9.975,00	675,43	\$ 6.737.414,25
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Gancho longitudinal inferior y superior de Placa inferior Canal Rectangular	581,32	kg	\$ 9.975,00	581,32	\$ 5.798.667,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Flejes para las dos gradas del Canal Rectangular	123,85	kg	\$ 9.975,00	123,85	\$ 1.235.403,75
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Gancho longitudinal Placa inferior y muro de cara Tipo III Canal Rectangular	1.664,24	kg	\$ 9.975,00	1.664,24	\$ 16.600.794,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Empalme de muro existente Canal Rectangular	25,45	kg	\$ 9.975,00	25,45	\$ 253.863,75
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 78" Gancho en U Canal Trapezoidal desde Sección 1 hasta la 4	715,78	kg	\$ 9.975,00	715,78	\$ 7.139.905,50
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Gancho superior de la losa inferior Canal Trapezoidal desde Sección 1 hasta la 4	260,88	kg	\$ 9.975,00	260,88	\$ 2.602.278,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Baston ambos lados muro interno Canal Trapezoidal desde Sección 1 hasta la 4	235,13	kg	\$ 9.975,00	235,13	\$ 2.345.421,75
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" longitudinal inferior y superior de Placa inferior, incluyendo gradas Canal Rectangular (hasta la Sección 6)	1.855,00	kg	\$ 9.975,00	1.855,00	\$ 18.503.625,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Flejes para las cuatro gradas del Canal Trapezoidal	419,04	kg	\$ 9.975,00	419,04	\$ 4.179.924,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" longitudinal ambos lados muro Canal Trapezoidal desde Sección 1 hasta la 5	536,68	kg	\$ 9.975,00	536,68	\$ 5.353.383,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 78" Gancho en U Canal Trapezoidal Sección 5 y 6	766,58	kg	\$ 9.975,00	766,58	\$ 7.646.635,50
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Gancho superior de la losa inferior Canal Trapezoidal desde Sección 5 y 6	380,13	kg	\$ 9.975,00	380,13	\$ 3.791.796,75
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Baston ambos lados muro interno Canal Trapezoidal desde Sección 5 y 6	316,98	kg	\$ 9.975,00	316,98	\$ 3.161.875,50
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" longitudinal ambos lados muro Canal Trapezoidal desde Sección 6	279,36	kg	\$ 9.975,00	279,36	\$ 2.786.616,00
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	Acero refuerzo 5/8" Empalme de muro existente Canal Trapezoidal	133,01	kg	\$ 9.975,00	133,01	\$ 1.326.774,75
	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60			kg	\$ 9.975,00		\$ 0,00
							\$ 0,00
CANTIDAD TOTAL 41.492,390							
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No. 03 \$ 314.633.997,00							
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES \$ 0,00							
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO \$ 314.633.997,00							
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR \$ 3.960.279.579,00							
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL							
REGISTRO FOTOGRAFICO				PLANOS/ESQUEMA UTILIZADO			
							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1						
			FECHA: 01/08/2022						
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
Macroproceso	Proceso		Subproceso						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
SUBSECRETARÍA SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE		RECIBO PARCIAL No. 3 DE 3 FECHA 1/4/2024 <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso) (Consecutivo) (Total) (Escriba fecha del acta)</small>							
CONTRATO No. 3335 DE 2023 N° DE PROCESO SIM-LP-001-2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECCOP II)</small>									
OBJETO DEL CONTRATO									
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
CONTRATISTA DE OBRA SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT 900562491-9 <small>(Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3586 DE 2023 N° DE PROCESO SIM-CMA-001-2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECCOP II)</small>									
OBJETO DEL CONTRATO									
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA									
INTERVENTOR HAAEM INGENIERÍA & CONSULTORIA SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT 901605256-4 <small>(Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>							
SUPERVISOR(A) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		CC 13.503.541 <small>(Escriba el CC del Supervisor designado)</small>							
CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA									
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
	NP 03	Suministro e instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pilas y muros de contención canal - otros	M3						
CANTIDADES APROBADAS									
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
1.		Primera placa Rectangular	1,75	3,70	1,00	M3	\$ 775.656,00	6,48	\$ 5.022.372,60
2		Segunda placa Rectangular	0,40	3,80	0,70	M3	\$ 775.656,00	1,06	\$ 825.297,98
		Tercera placa	3,250	4,60	0,70	M3	\$ 775.656,00	10,47	\$ 8.117.240,04
		Segunda placa Rectangular	1,60	4,20	0,70	M3	\$ 775.656,00	4,70	\$ 3.648.685,82
		Tercera placa inicial	6,75	4,80	0,70	M3	\$ 775.656,00	22,68	\$ 17.591.878,08
		Primera placa Trapezoidal	0,75	6,90	0,70	M3	\$ 775.656,00	3,62	\$ 2.809.813,86
		Segunda placa Trapezoidal	1,10	5,95	0,70	M3	\$ 775.656,00	4,58	\$ 3.553.667,96
		Tercera placa Trapezoidal	1,10	6,50	0,70	M3	\$ 775.656,00	5,61	\$ 4.362.158,28
		Cuarta placa Trapezoidal	1,10	6,30	0,70	M3	\$ 775.656,00	4,85	\$ 3.762.707,26
		Quinta placa Trapezoidal	3,00	9,00	0,70	M3	\$ 775.656,00	18,90	\$ 14.659.898,40
		Continuación Quinta placa Trapezoidal	8,70	9,50	0,70	M3	\$ 775.656,00	57,86	\$ 44.875.577,88
		Continuación Quinta placa Trapezoidal	5,80	9,80	0,70	M3	\$ 775.656,00	39,79	\$ 30.861.800,93
		Sobre ancho Quinta placa Trapezoidal	10,80	0,90	0,70	M3	\$ 775.656,00	6,80	\$ 5.277.563,42
		Sobre ancho escalones pequeños	6,00	0,20	0,70	M3	\$ 775.656,00	0,84	\$ 651.551,04
		Bordes verticales primer escalon	1,00	1,20	0,80	M3	\$ 775.656,00	0,96	\$ 744.629,76
		Ciclópeo bajo placa existente canal Trapezoidal	11,00	1,00	0,40	M3	\$ 775.656,00	4,40	\$ 3.412.886,40
		Continuación quinta placa Trapezoidal	2,00	9,80	0,70	M3	\$ 775.656,00	13,72	\$ 10.642.000,32
CANTIDAD TOTAL								286,72	\$ 160.339.730,00
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No. 03									\$ 0,00
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES									\$ 0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									\$ 160.339.730,00
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR									\$ 228.713.806,00
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL									
REGISTRO FOTOGRÁFICO					PLANOS/ESQUEMA UTILIZADO				
 <p>16/03/24 3:57 p.m. N 874458 E 722195 m Avenida 25 - Cúcuta Norte De Santander Colombia</p>					 <p>16/03/24 3:47 p.m. N 874458 E 722195 m Avenida 25 - Cúcuta Norte De Santander Colombia</p>				
 <p>2/03/24 2:08 p.m. N 874458 E 722195 m Avenida 25 - Cúcuta Norte De Santander Colombia</p>					 <p>2/03/24 2:41 p.m. N 874458 E 722195 m Avenida 25 - Cúcuta Norte De Santander Colombia</p>				

Dirección: Av. 5BIS #9-26 Casa B28 Callejas del Este A, Prados del Este
 Tel: 3014000355 / 3017556073; haaem.sas@gmail.com; NIT. 900553674-5.

7.3 COMPONENTE AMBIENTAL

En el transcurso del periodo del presente informe se vigiló y constato que se cumpliera con los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de Obra, según el manual de seguimiento social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de infraestructura en San José de Cúcuta; lo anterior supervisando en campo las actividades y el personal del contratista. Se aprueba el presupuesto y avance en el componente ambiental hasta la fecha en un 68,47%. A continuación, se mencionan las actividades que realizó el contratista con respecto a este componente:

- El ingeniero contratista ambiental realizó la supervisión diaria en la obra verificando el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental plasmadas en el (PMAO).
- El contratista ha venido presentando los informes mensuales de avance de ejecución del proyecto según el manual de seguimiento social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de infraestructura en San José de Cúcuta.
- El contratista hasta la fecha ha presentado los formatos de: plan de acción ambiental, requerimientos ambientales preliminares, control de materiales, además presento los documentos requeridos del proveedor de materiales tales como licencia ambiental, título minero y certificación de compra con sus respectivas facturas.
- El profesional ambiental de obra estableció medidas de prevención y disminución sobre la disposición y generación de los residuos sólidos y RCD durante la ejecución de la obra.
- Se han realizado capacitaciones al personal que labora en las actividades del proyecto, sobre la importancia de depositar los residuos en los puntos ecológicos, según su los colores y los tipos de residuos a disponer.
- El profesional ambiental cuenta con los permisos y licencias ambientales y mineras suministrados por el proveedor de materiales de construcción.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA

VERSIÓN: 1.1

FECHA: 01/08/2022

APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Subproceso

Macroproceso

Proceso

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE **RECIBO PARCIAL No.** 3 **DE** 3 **FECHA** 1/4/2024
(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso) (Consecutivo) (Total) (Escriba fecha del acta)

CONTRATO No. 3335 DE 2023 N° DE PROCESO SIM-LP-001-2023
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)

OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CONTRATISTA DE OBRA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS <small>(escriba el nombre o razón social del interventor)</small>	NIT 900562491-9 <small>(escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>
----------------------------	--	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3586 DE 2023 N° DE PROCESO SIM-CMA-001-2023
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECP II)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

INTERVENTOR	HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS (escriba el nombre o razón social del interventor)	NIT	901605256-4 (escriba el NIT del Interventor o Entidad)
--------------------	---	------------	--

SUPERVISOR(A) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA CC. 13.503.541
(escriba el nombre o razón social del interventor) (escriba el CC del Supervisor designado)

CÁLCULO POR ITEM DE OBRA

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
		COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	

CANTIDADES APROBADAS

[illegible]

REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANO/ESQUEMA UTILIZADO

[illegible]

Dirección: Av. 5BIS #9-26 Casa B28 Callejas del Este A, Prados del Este

Tel: 3014000355 / 3017556073; haaem.sas@gmail.com; NIT. 900553674-5.

7.4 COMPONENTE SST

En el transcurso del periodo del presente informe se vigiló y constato que se cumpliera con los lineamientos establecidos en el manual de seguimiento social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de infraestructura en San José de Cúcuta; lo anterior supervisando en campo las actividades y el personal del contratista. Se aprueba el presupuesto y avanza en el componente SST hasta la fecha en un 79,02%. A continuación, se mencionan las actividades que realizó el contratista con respecto a este componente:

PROFESIONAL SST

Durante el período del 10 de febrero al 31 de marzo de 2024 ha existido acompañamiento por parte del personal SST tanto del contratista como la interventoría.

FORMATOS – PAPELERIA

Durante el período comprendido entre los meses de febrero a marzo de 2024 se han implementado diferentes formatos de acuerdo con la necesidad de las actividades y tareas a ejecutar.

BIOSEGURIDAD: GEL ANTIBACTERIAL 1000 MILILITROS Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN

Durante el período comprendido entre los meses de febrero a marzo de 2024 se adquirieron estos elementos, por protocolo se utiliza después de realizar cada labor al recolectar residuos sólidos o estar expuesto a aguas residuales que llegan por el canal de aguas lluvias.

OTROS: BAÑO PORTATIL, PUNTO DE HIDRATACIÓN

Se cuenta con un baño fijo el cual se ubica en una casa que funciona como oficina administrativa del proyecto, este predio se encuentra arrendado por la interventoría, además cuenta con el punto de hidratación.

 <p>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1 FECHA: 01/08/2022																		
	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Macroproceso		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE Proceso																		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA																					
SUBSECRETARIA <u>SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</u> RECIBO PARCIAL No. <u>3</u> DE <u>3</u> FECHA <u>1/4/2024</u> <small>(Escriba la subsecretaria a la que pertenece el proceso) (Consecutivo) (Total) (Escriba fecha del acta)</small>																					
CONTRATO No. <u>3335</u> DE <u>2023</u> N° DE PROCESO <u>SIM-LP-001-2023</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)</small>																					
OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA																					
CONTRATISTA DE OBRA <u>SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS</u> NIT <u>900562491-9</u> <small>(escriba el nombre o razón social del interventor) (escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA <u>3586</u> DE <u>2023</u> N° DE PROCESO <u>SIM-CMA-001-2023</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)</small>																					
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA																					
INTERVENTOR <u>HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS</u> NIT <u>901605256-4</u> <small>(escriba el nombre o razón social del interventor) (escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>																					
SUPERVISOR(A) <u>ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA</u> CC <u>13.503.541</u> <small>(escriba el nombre o razón social del interventor) (escriba el CC del Supervisor designado)</small>																					
CÁLCULO POR ITEM DE OBRA																					
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA															
		COMPONENTE SST			GLB																
CANTIDADES APROBADAS																					
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL												
						GLB	\$ 28.715.200,00	0,1702	\$ 4.886.000,00												
									\$ 0,00												
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.03									\$ 4.886.000,00												
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES									\$ 17.805.100,00												
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									\$ 22.691.100,00												
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR									\$ 6.024.100,00												
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL																					
REGISTRO FOTOGRAFICO					PLANO/ESQUEMA UTILIZADO																
DETALLE POR COTIZANTE																					
INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN		SALUD		RÉGIMEN LABORALES		CCF		PARAFISCALES	
No.	Tip.	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
1	CC	100001200	VELAZO CRISTO RONALD YESID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	CC	100000006	MORA MORA RENE	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CC	100041008	MEDINA AMARCO FIDELMAN	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CC	100002118	BARRERA CALDERON JEFFERSON STEVEN	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	CC	100010016	GONZALEZ GONZALEZ BENITO LUIS	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	CC	100010008	OSORIO ROMERO ANDRES	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CC	100010000	CAMACHO LAVEDE ALLEN HELUT	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	CC	100020010	ALBA GALLES ARLEY DAVID	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	CC	100011004	TORRES YERSON GILFARDA	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	CC	100010009	MOCILLO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CC	100000004	PACHECO MOCILLO LEONEL EDUARDO	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CC	114940012	VILLAMAR PANADA JOSE LEONARDO	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	CC	117001006	VARGAS GONZALEZ FERNAN ALFONSO	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	CC	80000000	RAMIREZ MEDRANO TULLIANA	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	CC	80040000	ANGELA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	CC	80001002	URON RAMIREZ ALFONSO	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	CC	80000004	RAMIREZ MORA ALVARO ALFONSO	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	CC	80011004	MORA RAMIREZ JHAY	1	0	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

La presente acta se cancelará hasta el veintidós coma veintiuno por ciento (22,21%) del valor del contrato, correspondiente al periodo del 11 de diciembre al 26 de diciembre de 2023 y el periodo del 10 de febrero y 31 de marzo de 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.729.699.839
VALOR DE ANTICIPO PAGADO	\$ 518.909.951,7
VALOR DEL ACTA PARCIAL 1	\$ 116.544.130,00
VALOR AMORTIZACION 30%	\$ 34.963.239,00
VALOR PAGADO DEL ACTA PARCIAL 1	\$ 81.580.891,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL 2	\$ 212.525.634,00
VALOR AMORTIZACION 30%	\$ 63.757.690,00
VALOR PAGADO DEL ACTA PARCIAL 2	\$ 148.767.944,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL 3	\$ 384.052.626,00
VALOR AMORTIZACION 30%	\$ 115.215.787,00
VALOR POR PAGAR DEL ACTA PARCIAL 3	\$ 268.836.838,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DEL CONTRATO	\$ 711.604.214,30

8. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS en desarrollo del objeto del Contrato No. 3335 DE 2023, realizó las siguientes actividades:

- ✓ En relación con el desarrollo de las actividades correspondientes a la parte administrativa, durante el periodo de diciembre y el del 10 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024, se tiene registro de correspondencia entregada y recibida entre SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS y LA INTERVENTORÍA
- ✓ El contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, ha realizado las actividades adelantadas en campo, como fueron: VER ANEXO INFORME DE OBRA
- ✓ El Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS realizó labores de seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el personal asignado
- ✓ El Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS asignó el personal con experiencia necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.
- ✓ El contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS entregó parcialmente los productos requeridos para dar cumplimiento al objeto del contrato.
- ✓ El contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS cumplió con las Pólizas de cumplimiento y responsabilidad, las cuales se encuentran actualizadas a la fecha.
- ✓ En cumplimiento de las especificaciones técnicas esta ha solicitado al Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS., la relación de las afiliaciones al sistema de seguridad social y sus debidos pagos del personal que conforma el equipo de trabajo, tal como se indica en el contrato 3335 de 2023.

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
		FEBRERO		
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	VARIAS	75746500	FEBRERO	\$ 388.900,00
PENSIÓN	PORVENIR - COLPENSIONES	75746500	FEBRERO	\$ 1.552.300,00
A.R.L	POSITIVA	75746500	FEBRERO	\$ 507.700,00

10. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

	SI	x	NA		NO	NA	
	RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ACTA PARCIAL No 3, FORMATO UNICO ACTA PARCIAL No 3, COMPONENTE SST, COMPONENTE AMBIENTAL, INFORME DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO.						

11. CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que el contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS. cumplió con los requisitos establecidos en el objeto del Contrato No. 3335 de 2023.

1. La interventoría realizó la revisión de la entrega parcial presentado por el contratista de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, ejecutado en el periodo del 10 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2024 y certifica que lo allí expuesto cumple con lo establecido en el Contrato No. 3335 de 2023 suscrito para el efecto.
2. Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS. ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 10 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2024.
3. La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS. realizó para el cumplimiento del objeto y fines del Contrato No. 3335 de 2023.

Revisada y aceptada por parte de la interventoría en representación de la Entidad Contratante, se procede a darle aprobación y será enviada al supervisor del contrato de la secretaria de infraestructura para su visto bueno; después de esto es procedente legalizar el Acta de Recibo Parcial No 3 y realizar el acta de pago correspondiente según Contrato 3335 de 2023 - **CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO:**

La secretaria de infraestructura cancelará el valor total de obras (incluidas los pagos globales para la gestión ambiental, sst, pmt), mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda.

Cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía del 10% de cada acta presentada, la cual se devolverá al contratista una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.

La secretaria de infraestructura entregará un anticipo del 30% del valor del contrato adjudicado. previa aprobación de la interventoría del plan de inversión del anticipo, el cual deberá tener como destinación específica la ejecución del presente contrato. el original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la unidad ejecutora para el trámite de autorización del desembolso.

El valor del anticipo deberá ser amortizado en las actas parciales de pago, y el mismo tendrá que estar amortizado en su totalidad al momento de suscribir el acta de terminación del contrato.

Vigilancia del Anticipo y Rendimientos Generados:

1.-Corresponde al Interventor y a INFRAESTRUCTURA a través o por medio de la Tesorería la revisión de la Administración realizada por parte de la compañía Fiduciaria del manejo del Anticipo, de conformidad con las normas que rigen la materia.

El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por consiguiente, el Interventor velará porque todo pago que afecte el anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el Programa de Inversión del Anticipo aprobado por la Entidad

Es entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo de la Fiducia o Patrimonio Autónomo. Los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autónomo deberán ser reportados y reintegrados a INFRAESTRUCTURA en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería; a más tardar dentro de los dos meses siguientes a su recaudo. El Interventor del Contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los rendimientos a la Tesorería de INFRAESTRUCTURA, en forma previa a la autorización del Acta de Liquidación del Contrato.

2.- El setenta por ciento (70%) restante se cancelara con la presentación de actas parciales amortizando el treinta (30%) del total de anticipo recibido, las actas serán según el avance de obra, y/o recibo final de obra dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la respectiva Acta o Actas de Pago, previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. (e) Acta de recibo parcial. (f) Informe Técnico de Obra. (g) Memorias de Calculo con Registro Fotográfico. (h) Factura. (si APLICA). (i) Planilla de seguridad social. (j) Registro en la Plataforma del Sistema de Información Geográfica SIG. (k) Balance presupuestal de los componentes y entregar facturas, evidencias fotográficas, seguridad social y nómina de los profesionales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los (06) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,



ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
R/L HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS
CONTRATISTA INTERVENTORÍA
