

**INFORME DE SUPERVISION**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE INFORME	12 de junio de 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Décima del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ACTIVIDAD DESARROLLADA	% contratado	% ejecutado
APORTE MUNICIPIO		
Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	100,0%	46,20%
APORTE ASOJUNTAS		
Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	100,0%	46,0%

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	3	PORCENTAJE DE EJECUCION	46,20%
---	---	-------------------------	--------

2. INDICADORES**INDICADOR DE PRODUCTO**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Vías mejoradas	No. Km	130	46,20%

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACION ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Incrementar el 10% de la red vial municipal en el cuatrienio	%	50%	HAB	25.410

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

¿Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente.

INFORME DE SUPERVISION


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE INFORME	12 de junio de 2024


4. OBSERVACIONES

Ninguna observación.

5. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe del Acta Parcial #2 del convenio en ejecución.
2. Anexo 2. Soporte de los pagos de seguridad social mes de mayo de 2024.


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura


KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA
Prof de Apoyo a ala Supervisión

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION

**MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



TAURAMENA

FECHA: 12 JUNIO DE 2024



REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION

FECHA: 12 JUNIO DE 2024

EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA - Prof Apoyo Sec Infraestructura
CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO No.007 DEL 13 DE MARZO DE 2024
CONTENIDO	
PRESENTACIÓN	
1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	
2. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES	
3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
4. INFORME FOTOGRAFICO	
5. GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)	
6. ANEXOS	
a. Pago de seguridad Social de los meses correspondientes	



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



692

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE				
CONVENIO SOLIDARIO No	007		FECHA DE CONVENIO	13 de marzo de 2024	
VALOR CONVENIO	\$ 331.055.656,00		APORTE MUNICIPIO	\$ 300.055.656	
APORTE JAC	\$ 31.000.000,00		VALOR ANTICIPO (0 %)	\$ 0	
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA		NIT.	900.002.220-8	
R/L	HENRY PAUL ALFONSO		C.C.	74.861.785 de Yopal	
PLAZO CONTRACTUAL	CINCO (5) MESES		No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA	N.A.	
PLAZO (DIAS)			PUBLICACION OFICIAL	N.A.	
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	255 del 01 de marzo de 2024		No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE INTERVENTORÍA	N.A		INTERVENTOR	N.A.	
ACTA DE INICIO	22 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACION	21 de agosto de 2024	

GARANTIAS FINALES

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA DE APROBACION	VEGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
BY-10004086 (anexo 1)	DE CUMPLIMIENTO	20-mar.-24	13-mar.-24	23-dic.-24	\$ 66.211.131,20
	BUEN MANEJO ANTICIPO		13-mar.-24	23-dic.-24	\$ 0,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13-mar.-24	23-ago.-27	\$ 16.552.782,80
BY-100005628 (anexo 1)	Responsabilidad civil extracontractual		13-mar.-24	23-ago.-24	\$ 260.000.000,00

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUT APOORTE MPIO
A	APOORTE MUNICIPIO									
1	Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	130,00	30,06	60,06	100,0%	46,20%	\$ 2.308.120,43	\$ 300.055.656,00	\$ 138.625.713,00
B	APOORTE ASOJUNTAS									
2	Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	UND	1,00	0,23	0,46	100,0%	46,00%	\$ 31.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ 14.260.000,00
VALOR CONVENIO SOLIDARIO					VALORES TOTALES				\$ 331.055.656,00	\$ 152.885.713,00
					VALOR APOORTE MUNICIPIO					\$ 138.625.713,00
					SALDO POR EJECUTAR APOORTE MUNICIPIO					\$ 161.429.943,00

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

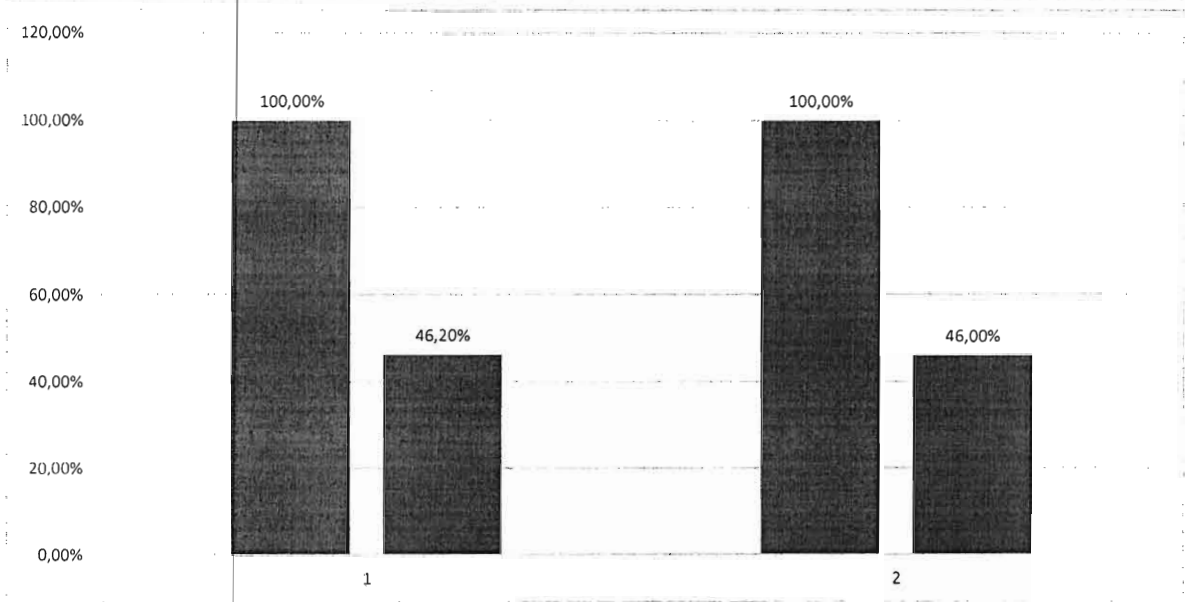
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
--

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
FEBRERO 2024	1					
	2					
	3					
	4					
MARZO 2024	1					
	2					
	3			Acta de Inicio	Revisión	
	4				Seguimiento	
ABRIL 2024	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO 2024	1				Seguimiento	
	2			Acta Parcial #1	Revisión	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO 2024	1				Seguimiento	
	2			Acta Parcial #2	Revisión	
	3					
	4					
JULIO 2024	1					
	2					
	3					
	4					

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



<p style="text-align: center;"><u>CANTIDADES CONTRATADAS VS CANTIDADES EJECUTADAS</u></p> <p>A APOORTE MUNICIPIO 1 Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)</p> <p>B APOORTE ASOJUNTAS 2 Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes</p>

ANEXO**INFORME DE SUPERVISION**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO**ESTADO INICIAL**
