



CONTRATO: “REALIZAR INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS CON ALCANCE DE DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II Y SECTOR LOS TOSE, VEREDA ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”.

INFORME SEMANAL No.8

FRENTE GUAYABALES

14 de diciembre – 21 de diciembre

ING. COORDINADOR

JUAN FELIPE AGUDELO PATIÑO

SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 21 DE 2023

CONTÁCTENOS
(311) 368 4817
(318) 742 9326
(350) 458 9221

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN CONTRATO DE CONSULTORÍA N°4182.010.26.1.549-2023				
OBJETO: REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA				CORTE: 8
CONTRATO DE CONSULTORÍA		CONTRATISTA: EESALAMANCA S.A.S – NIT. 900.440.665-1		
		DIRECTOR DE CONSULTORÍA: EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ		
GARANTÍAS				
AMPARO	No.	VIGENCIA	VALOR	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	45-44-101150880	DESDE: 29/08/2023 HASTA: 13/06/2024	\$ 12,699,519.60	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101150880	DESDE: 29/08/2023 HASTA: 13/12/2026	\$ 5,079,807.84	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	45-44-101150880	DESDE: 29/08/2023 HASTA: 13/06/2026	\$ 12,699,519.60	SEGUROS DEL ESTADO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS CON ALCANCE DE DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II Y SECTOR LOS TOSE, VEREDA ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATISTA: AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S - NIT. 901.262.497-9		
		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: GIOVANNY ZUÑIGA		
GARANTÍAS				
AMPARO	No.	VIGENCIA	VALOR	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101195699	DESDE: 05/10/2023 HASTA: 05/06/2024	\$ 7.210.600,80	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101195699	DESDE: 05/10/2023 HASTA: 05/12/2026	\$ 2.884.240,32	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101183932	DESDE: 05/10/2023 HASTA: 05/06/2024	\$ 7.210.610,80	SEGUROS DEL ESTADO
ENTIDAD CONTRATANTE:		SUPERVISOR: Francisco Javier Bonilla Hurtado APOYO A LA SUPERVISIÓN: Ing. David Mazuera		

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA		FORMA DE PAGO CONSULTORÍA:
% FÍSICO	56.41	%FÍSICO	93.00	<p>EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizara pagos parciales de acuerdo a la entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.</p> <p>ÚLTIMO PAGO: Equivalente al valor de los productos restantes del valor del contrato. A la entrega de los siguientes productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad previa suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. Para cada uno de los diseños el pago final se estima realizar de acuerdo con la siguiente entrega de productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ítem 1.1.4.2.2 Socialización del proyecto con comunidad beneficiada.
%FINANCIERO	0.0	%FINANCIERO	0.0	

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

% TIEMPO	93.33%	% TIEMPO	93.33%	<p>FORMA DE PAGO INTERVENTORÍA:</p> <p>La entidad realizara pagos parciales de acuerdo a la entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por parte de la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.</p> <p>ULTIMO PAGO: Equivalente al valor de los productos restantes del valor del contrato. A la entrega de los siguientes productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad previa suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. Para cada uno de los diseños el pago final se estima realizar de acuerdo con la siguiente entrega de productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ítem 1.1.9.2.2 Socialización del proyecto con comunidad beneficiada.
VIGENCIA				
CONSULTORÍA			INTERVENTORÍA	
PLAZO	Dos (2) meses		PLAZO	Dos (2) meses
VALOR	\$ 63.497.598		VALOR	\$ 36.053.004
FECHA DE INICIO	26/10/2023		FECHA DE INICIO	26/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2023		FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2023

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	


1. INFORME DE AVANCE		
Fecha	Actividades	1.1. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
Jueves 14 de diciembre	Descripción	Se inician las labores referentes al diseño hidrosanitario y al plan de manejo ambiental y continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos y del ortofotomosaico.
	Registro Fotográfico	N/A
Viernes 15 de diciembre	Actividades	1.2. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	N/A
Sábado 16 de diciembre	Actividades	1.3. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	
Domingo 17 de diciembre	Actividades	1.4. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	N/A
Lunes 18 de diciembre	Actividades	1.5. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	N/A
	Actividades	1.6. SE ADELANTAN ACTIVIDADES

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloYGutierrezIngenieria@gmail.com

Martes 19 de diciembre	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	N/A
Miércoles 20 de diciembre	Actividades	1.7. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
Jueves 21 de diciembre	Registro Fotográfico	N/A
	Actividades	1.8. SE ADELANTAN ACTIVIDADES
Jueves 21 de diciembre	Descripción	Continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, el estudio de suelos, diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental.
	Registro Fotográfico	N/A

2. COMPONENTE TÉCNICO

CURVA "S"

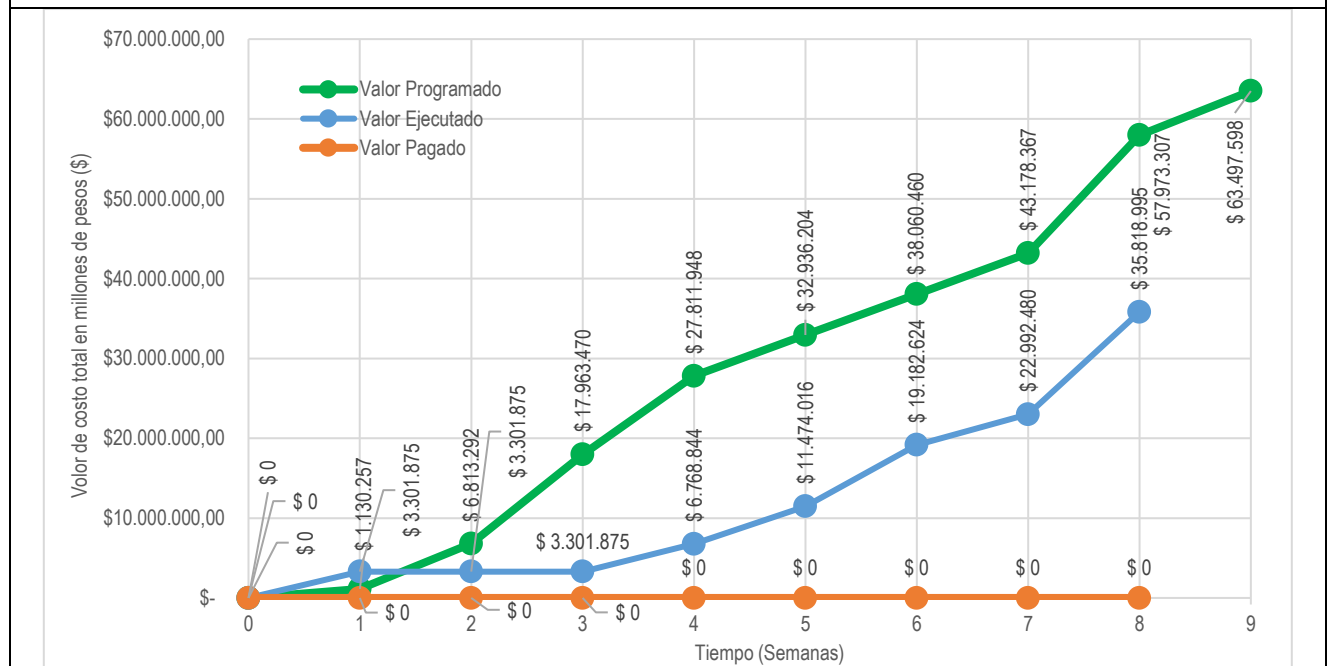

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

ANÁLISIS DE LA CURVA			
Teniendo en cuenta que a la fecha se inician las labores del diseño hidrosanitario y del plan de manejo ambiental, además continúan las actividades de oficina del levantamiento topográfico, levantamiento del censo poblacional, estudio de suelos y del ortofotomosaico, el desarrollo de la ejecución del contrato (línea azul) presenta un avance de actividades, el avance de la octava semana de ejecución del contrato se establece en el 56.41%.			
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA SPI:			
El índice de desempeño del cronograma SPI, presenta un valor de 0.62 este valor está por debajo de la unidad (1) lo cual indica que el proyecto presenta un atraso en función del cronograma.			
AVANCE E INDICADORES DE RENDIMIENTO			
AVANCE DEL PERÍODO: 20.20%		AVANCE ACUMULADO: 56.41%	
RETRASO: 3.10%		RETRASO ACUMULADO: 34.89%	
VALOR EJECUTADO DEL PERIODO: \$ 12.826.515.00		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 35.819.398.00	
3. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA PRÓXIMA SEMANA			
ACTIVIDAD			
Culminar las actividades de oficina referentes al levantamiento topográfico, levantamiento de censo poblacional, estudio de suelos y del ortofotomosaico, además, cabe resaltar que a la fecha nos encontramos a la espera de recibir el nuevo cronograma con el plan de contingencia por parte del contratista.			
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN			
	Nombre	Cargo del Proyecto	Firmas
Elaboró	Ing. Cindy Yohana Pérez Toro	Ing. Apoyo de Interventoría	
Aprobó	Ing. Juan Felipe Agudelo	Representante Legal Interventoría	

Se Anexa Cuadro de Seguimiento Semana No.8.

	CONTRATO No. 4182.010.26.1.549-2023	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.262.497-9 Santiago de Cali Teléfonos: 3187429326 3113684817 agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	GESTIÓN TÉCNICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

ANEXO No.1 CUADRO DE SEGUIMIENTO

agudeloygutierrezingenieria@gmail.com

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO NACIONAL			REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA												 AGUILEO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA					
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4182.010.26.1.521-2023 - UAESP SANTIAGO DE CALI PROGRAMA DE EJECUCION, CONTROL Y ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRACTUALES																				
No.	PRODUCTO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA		DUR.	CANTIDAD				UND	UNITARIO	VALOR		AVANCE		A. EVALUADO	ESTADO		
				INICIO	FIN		PROGRAMADA	ADICION No.1	CANT. TOTAL	EJECUTADA			PROGRAMADO	PARCIAL	PROGRAMADO	A. REAL				
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO																				
DURACION FASE I (DIAS)																				
1.1.4.1.1	F1	ALC	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georeferenciada cumpliendo IDESC. (ML)	26/10/2023	23/11/2023	28	2000	0	2000	1800	ML	\$ 1.900,00	\$ 3.800.000	\$ 3.420.000	100%	90,0%	-10,00%	90%		
1.1.4.1.2	F1	ALC	Construcción de Mojones	9/11/2023	23/11/2023	14	4	0	4	4	UND	\$ 502.491,07	\$ 2.009.924	\$ 2.009.924	100%	100,0%	0,00%	100%		
1.1.4.1.3	F1	ALC	Ortofotomosaico de área de influencia del proyecto. (15 HA)	9/11/2023	23/11/2023	14	1	0	1	1	GBL	\$ 3.092.191,20	\$ 3.092.191	\$ 2.319.143	100%	75,0%	-25,00%	75%		
1.1.4.1.4	F1	ALC	Levantamiento censo poblacional a beneficiar	2/11/2023	23/11/2023	21	1	0	1	1	GBL	\$ 5.570.908,30	\$ 5.570.908	\$ 5.585.270	100%	85,0%	-15,00%	85%		
1.1.4.1.5	F1	ALC	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde va a pasar la red, (Acueducto y/o Alcantarillado) por perforación (cada 800 m aproximadamente).	2/11/2023	23/11/2023	21	4	0	4	3	UND	\$ 1.316.615,79	\$ 5.267.263	\$ 3.950.447	100%	75,0%	-25,00%	75%		
1.1.4.1.6	F1	ALC	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde va a pasar la red, (Acueducto y/o Alcantarillado) por perforación (Zona de amenaza alta por donde va a pasar la red).	2/11/2023	23/11/2023	21	2	0	2	2	UND	\$ 1.316.615,79	\$ 2.633.632	\$ 1.975.224	100%	75,0%	-25,00%	75%		
1.1.4.1.7	F1	ALC	Diseño hidrosanitario del sistema o la estructura (evaluación de alternativas, prediseños, modelación hidráulica, diseños definitivos, planos, especificaciones de materiales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto, cumpliendo con las especificaciones y requisitos de EMCALI)	23/11/2023	25/12/2023	32	1	0	1	1	GBL	\$ 6.054.434,44	\$ 6.054.434	\$ 4.658.104	88%	70,0%	-17,50%	70%		
1.1.4.1.8	F1	ALC	Diseño estructural de unidades especiales y estructurales para el sistema y para el control de la amenaza (evaluación de alternativas, prediseños, modelación estructural, diseños definitivos, planos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)	23/11/2023	25/12/2023	32	1	0	1	0	GBL	\$ 6.253.995,00	\$ 6.253.996	\$ 0	88%	0,0%	-87,50%	0%		
1.1.4.1.9	F1	ALC	Diseño estructural de unidades especiales y estructurales para zonas de amenaza alta (Evaluación de alternativas, prediseños, modelación estructural, diseños definitivos, planos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) para las zonas de amenaza alta por donde va a pasar la red.	23/11/2023	25/12/2023	32	1	0	1	0	GBL	\$ 6.055.995,00	\$ 6.055.996	\$ 0	88%	0,0%	-87,50%	0%		
1.1.4.2.1	F1	COMP	Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra	7/12/2023	25/12/2023	18	1	0	1	1	GBL	\$ 4.855.649	\$ 4.858.649	\$ 3.401.054	78%	70,0%	-8%	70%		
1.1.4.2.2	F1	COMP	Socialización del proyecto con comunidad beneficiada	7/12/2023	25/12/2023	18	1	0	1	1	GBL	\$ 5.562.336	\$ 5.562.336	\$ 2.781.168	78%	50,0%	-28%	50%		
CIERRE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO																				
EVALUACION DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE ACTUAL																				
21-dic-23			FECHA DE EVALUACIÓN																	
26-oct-23			ACTA INICIO CONTRATO																	
93,33%			% DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN TIEMPO																	
VALOR CONTRACTUAL			\$ 53.359.326		AVANCE		AVANCE PROYECTADO DE ACTIVIDADES				AVANCE REAL DE ACTIVIDADES				RETRASO					
VALOR CONTRACTUAL IVA INCLUIDO			\$ 63.497.598				AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO		AVANCE DEL PERÍODO		AVANCE ACUMULADO		RETRASO DEL PERIODO		RETRASO ACUMULADO			
							23,30%		91,30%		20,20%		56,41%		3,10%		34,89%			
VALOR ADICIÓN			\$ -		INDICADORES		VARIACIONES				INDICADORES									
VALOR FINAL DEL CONTRATO			\$ 63.497.598				SV		El proyecto presenta un atraso del cronograma representado en un valor de:				SPI (Índice de desempeño del cronograma)		\$ 0,62	Valores por debajo de la unidad indican retraso		SPIc (Índice de avance de cronograma)	0,93	Valores por debajo de la unidad indican retraso
VALOR FINAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO			\$ 63.497.598				-\$		22.154.312											
VALOR EJECUTADO AL CORTE			\$ 12.826.515				NFTP		miércoles, 27 de diciembre de 2023				SDI (Índice de desviacion de programación)		1,00	Progreso del tiempo igual al proyectado		SPIe (Índice de rendimiento del cronograma)	0,00	Valores por encima de la unidad establecen buen desempeño del cronograma
VALOR ACUMULADO AL CORTE			\$ 35.819.398				Nueva fecha de terminación proyectada según el avance al corte													
