

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	INFORME SUPERVISIÓN/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

1. Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	13	12	2023	A	22	12	2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita						
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR						

2. Datos del contrato supervisado:

No. DE CONTRATO	223 DE 2023 ✓
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA ✓
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023 ✓
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA ✓
CONTRATISTA CC/ NIT	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCCION S.A,S Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS ✓ C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ" ✓
VALOR INICIAL	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$26.448.500,00) M/CTE. ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ✓
SUPERVISOR CC/NIT	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita ✓
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓
FECHA ACTA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓
ADICIÓN No. 1	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.200.200,00) M/CTE. ✓
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$39.648.700,00) M/CTE. ✓
PRORROGA No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
DEFINICIÓN N.	N/A

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA		INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 30/07/2021	Pág. 2 de 3

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

JOHN ALEXANDER FONSECA SOSA (TÉCNICO ELECTRICISTA)			
ÍTEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2023-12	2023-12-19	\$ 61.900
SALUD	2024-01	2023-12-19	\$15.500
RIESGOS PROFESIONALES	2023-12	2023-12-19	\$16.900
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2023-12	2023-12-19	\$15.500

HENNIE JULIE BERMUDEZ SABALLET (TÉCNICO O TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL)			
ÍTEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2023-12	2023-12-19	\$ 55.700
SALUD	2024-01	2023-12-19	\$14.000
RIESGOS PROFESIONALES	2023-12	2023-12-19	\$15.200
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2023-12	2023-12-19	\$14.000

2. CUMPLIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES

TOMADOR	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	N° PÓLIZA
OMEGA INGENIERIA & COSTRUCCION S.A,S	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2023	28/06/2024	39-46-101010033
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/12/2023	28/12/20226	
	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	11/12/2023	28/12/2023	39-54-101001692

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACIÓN		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
-----------------	-------	-----------------------------

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 3 de 3

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		\$ 26.448.500,00
VALOR ADICIONAL		\$ 13.200.200,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0.00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 0,00	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 35.582.300,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.066.400,00	
SUMAS IGUALES	\$ 39.648.700,00	\$ 39.648.700,00

6. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	Riesgos laborales	5

7. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO REQUIEREN PERMISOS O LICENCIAS

8. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.			

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	89,74%	89,74%

11. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
SE ANEXA FACTURA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SABANA DE CANTIDADES.			

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON EL INFORME ENTREGADO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

INFORME ACTA PARCIAL 1 .

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 223 DE 2023

OBJETO: "SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
MOTAVITA, BOYACÁ"


CONTRATISTA: OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S

R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS

Ingenieria & Construcción

SUPERVISOR: EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA.

SECRETARIO DE PLANEACIÓN.

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ”

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) Dias.

VALOR INICIAL: Veintiséis Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte. (\$ 26.448.500).

VALOR ADICIONAL: Trece Millones Doscientos Mil Doscientos pesos M/Cte. (\$ 13.200.200)

VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL: Treinta Y Cinco Millones Quinientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Pesos M/Cte. (\$ 35.582.300)

MATERIAL UTILIZADO

- Cortina led en 9 m de largo x 40 cm de caída.
- figuras navideñas en platina de 3/8" .
- cable de potencia para manguera led.
- Cable Duplex 2x14 Awg.
- Extensión lineal de 1000 leds
- Reflector led Rgb de 100 W
- Ojo fotocelda
- Manguera led x 100 mtrs.
- secuenciadores

PERSONAL DE TRABAJO.

Relación De Trabajadores			
N.o.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	John Fonseca	1.050.170.171	Técnico Electricista
2	John Francisco Rodríguez N.	1.056.928.378	Técnico Electricista
3	Carlos Yesid Torres B.	1.049.607.946	Ing. Residente
4	Junior Alexander Conrado R.	1.045.728.311	Técnico Electricista
5	José Hernández	4.081.618	Técnico Electricista
6	Hennie Julie Bermúdez	40.032.105	Inspector SST.
7	Robinson Espitia	7.128.243	Ayudante

LOCALIZACIÓN Y ESTADO INICIAL.

La obra se localiza en el casco urbano, del municipio de Motavita, y beneficia personas y comercio del municipio al incentivar las actividades turísticas nocturnas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS


LOCALIZACIÓN Y REPIANTEO: Se realizó visita a campo identificando los sitios donde

OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: 900 917 352-9

CUADRO DE CANTIDADES.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARRETE 100 M MANGUERA LED NAVIDEÑA	UNIDAD	2	750.000,00	1.500.000,00	4	3.000.000
2	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANGUERA LED EXISTENTE	UNIDAD	2	235.000,00	470.000,00	1	235.000
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS NAVIDEÑAS METALICAS MAYOR A 60CM DE ALTURA	UNIDAD	20	170.000,00	3.400.000,00	20	3.400.000
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SECUENCIADORES PARA MANGUERA	UNIDAD	15	21.000,00	315.000,00	5	105.000
5	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS METALICAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	UNIDAD	35	72.000,00	2.520.000,00	35	2.520.000
6	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AVISOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS EXISTENTES INCLUYE HICADA POSTE EN MADERA	UNIDAD	1	350.000,00	350.000,00	0	0
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFELECTOR LED DE 200 W COLORES	UNIDAD	4	330.000,00	1.320.000,00	0	0
8	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTENSION TIPO CORTINA LED 6M*30CM	UNIDAD	40	60.000,00	2.400.000,00	40	2.400.000
9	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EXTENSION LED * 18M	UNIDAD	40	85.000,00	3.400.000,00	40	3.400.000
10	FOTOCONTROL BASE INCLUIDA	UNIDAD	35	32.000,00	1.120.000,00	18	576.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX 2*12	UNIDAD	400	6.500,00	2.600.000,00	600	3.900.000
12	DESMONTE ALUMBRADO NAVIDEÑO	UNIDAD		950.000,00	950.000,00	0	0
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED CON FLASHER DE 9M*1M	UND	0	115.000,00	0,00	51	5.865.000
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION LED DE 100 METROS	UND	0	265.000,00	0,00	7	1.855.000
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 50 W	UND	0	115.000,00	0,00	1	115.000
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 100 W	UND	0	173.000,00	0,00	0	0
SUBTOTAL					20.345.000,00		27.371.000
AIU 30%					6.103.500,00		8.211.300
VALOR TOTAL (aproximado al peso)					26.448.500		35.582.300





CONTRATISTA: OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S

R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS.




CEL: 314-2119194

REGISTRO FOTOGRAFICO


SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

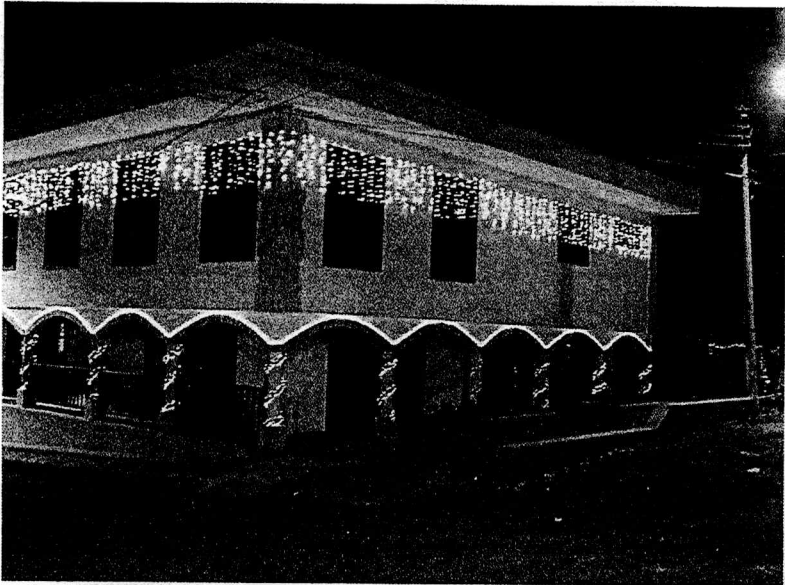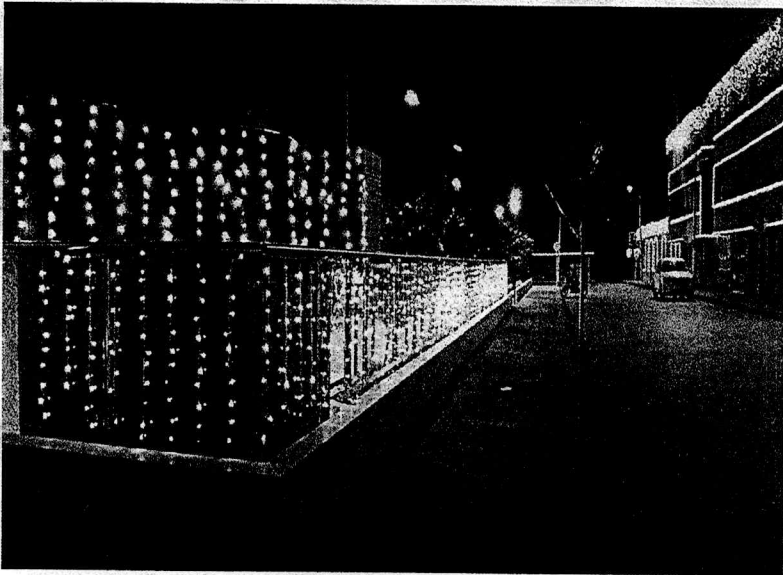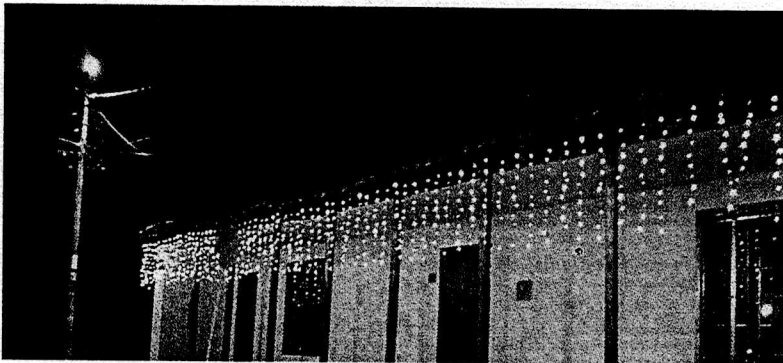




SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

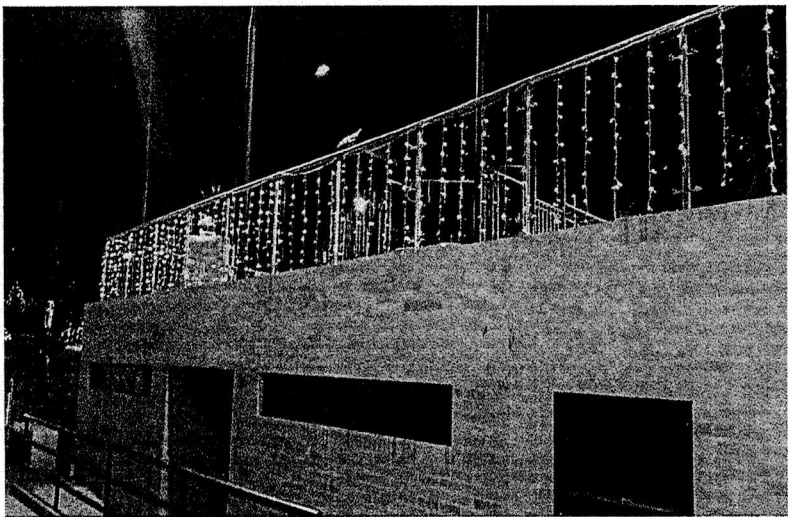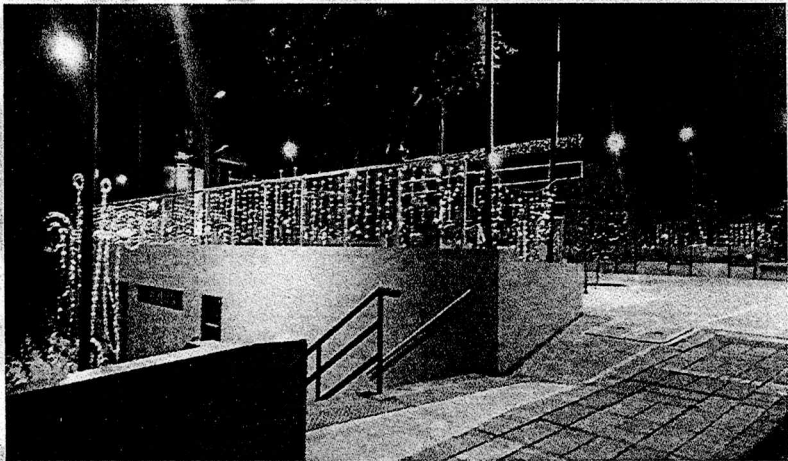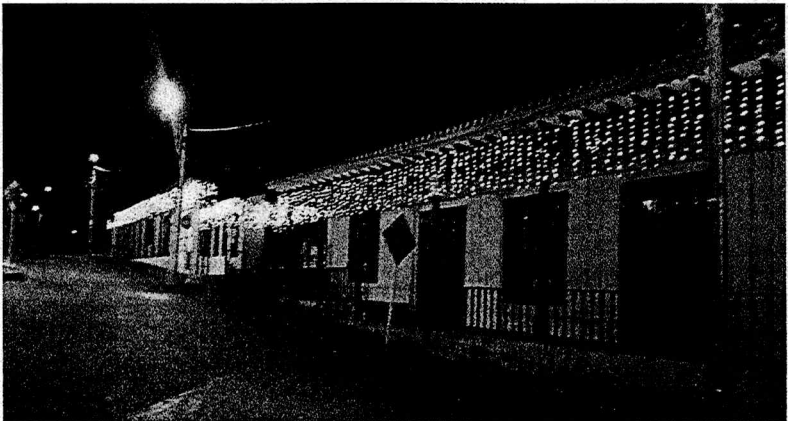



SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

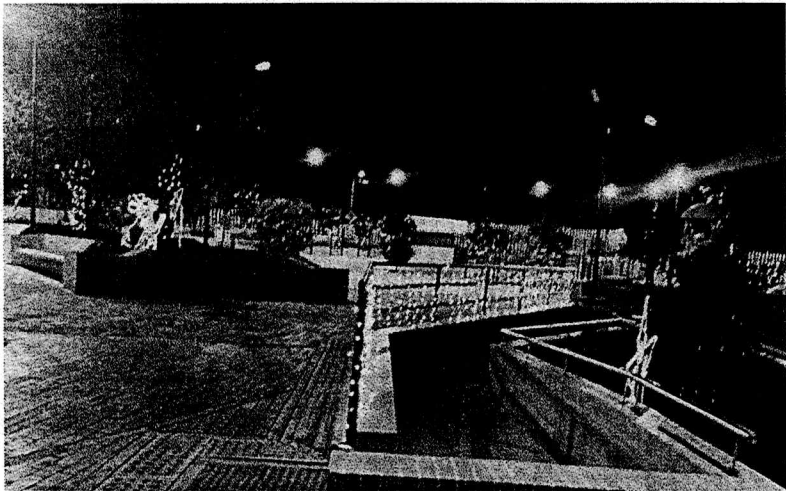

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

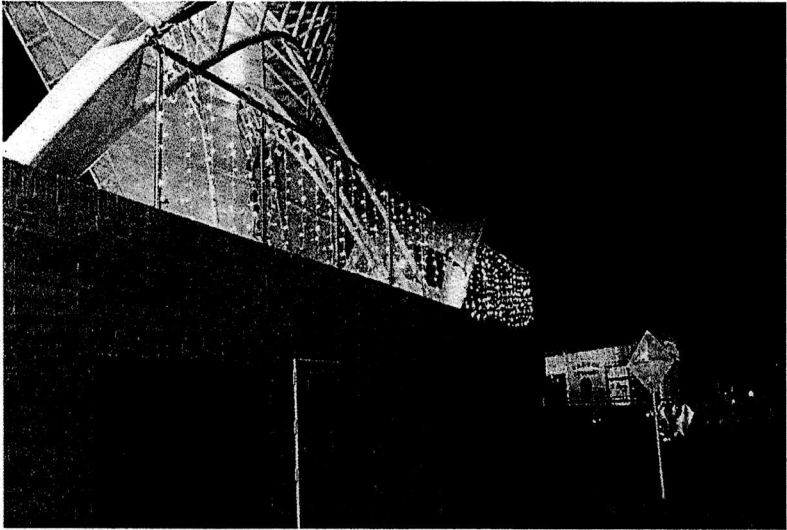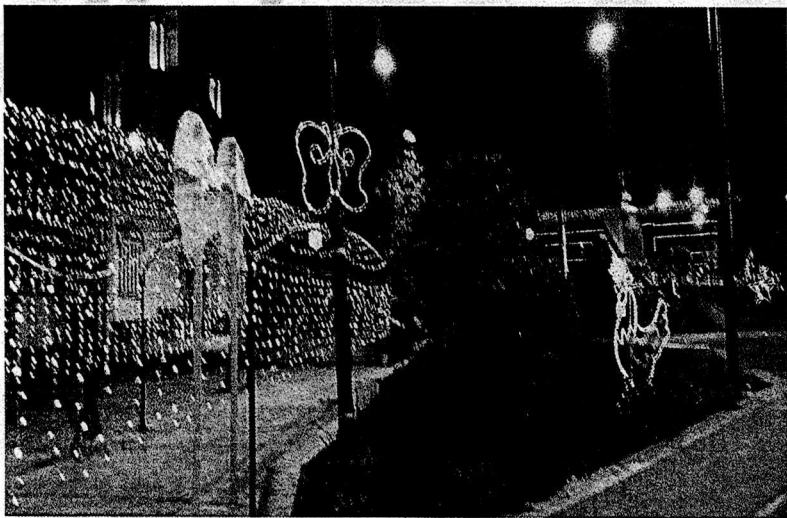




TUNELES EN EXTENSION Y CORTINA LED

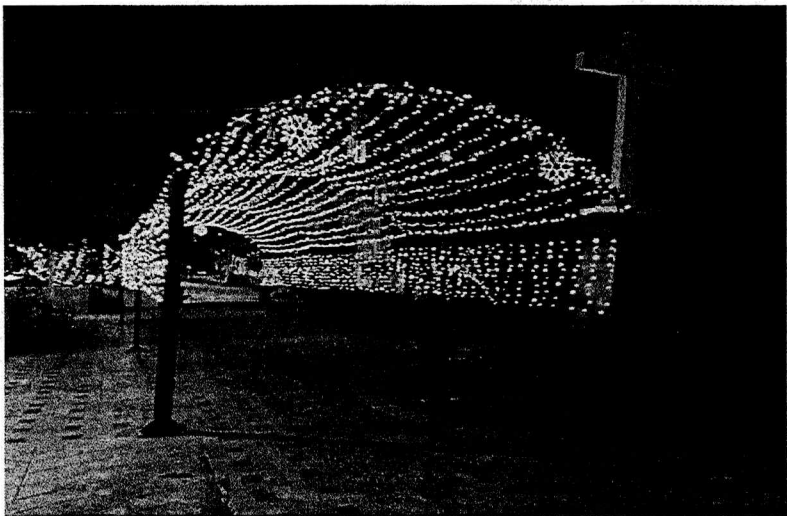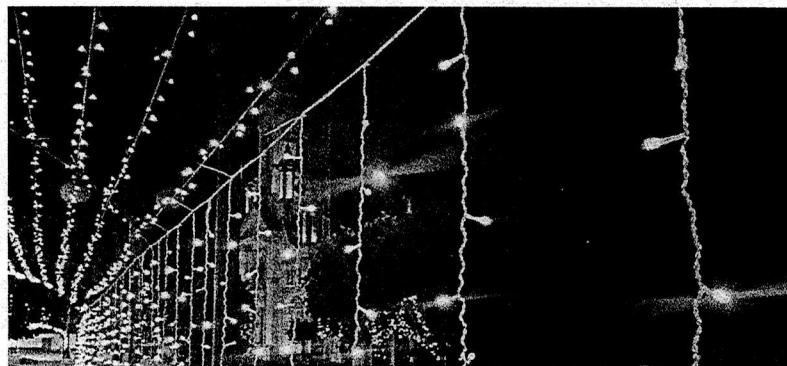




TUNELES EN EXTENSION Y CORTINA LED






DECORACION IGLESIA

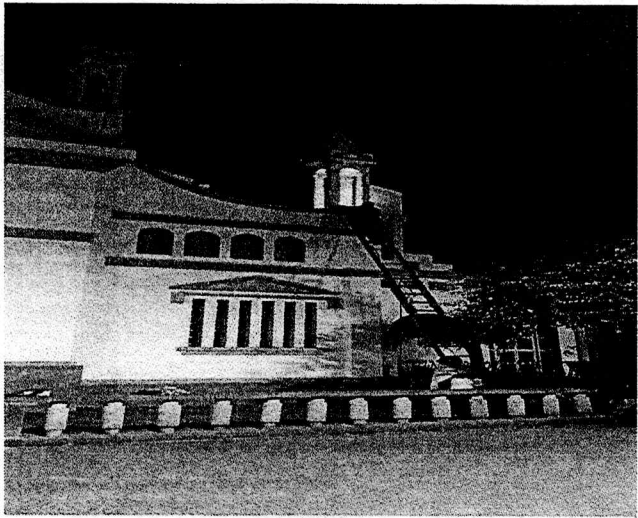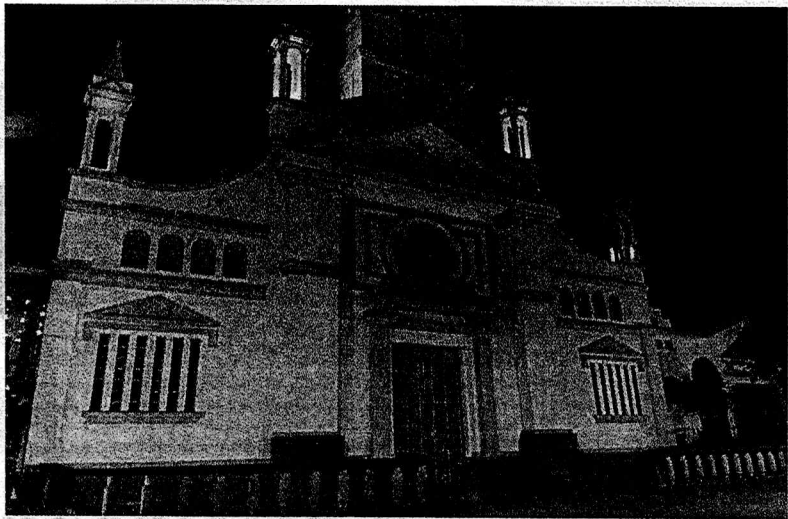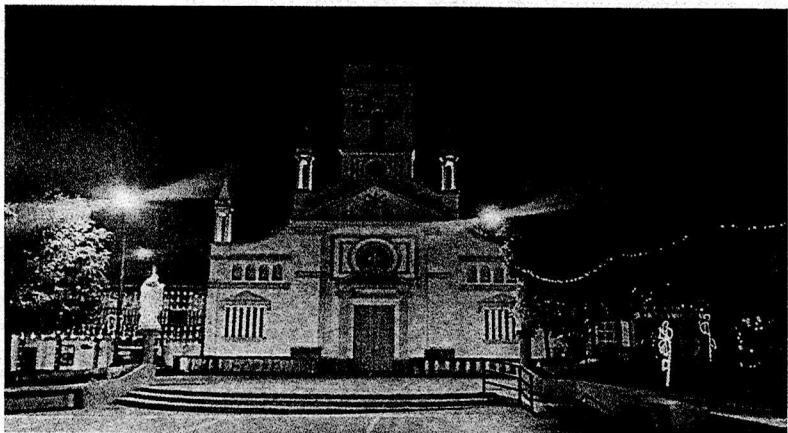




FIGURAS NAVIDEÑAS

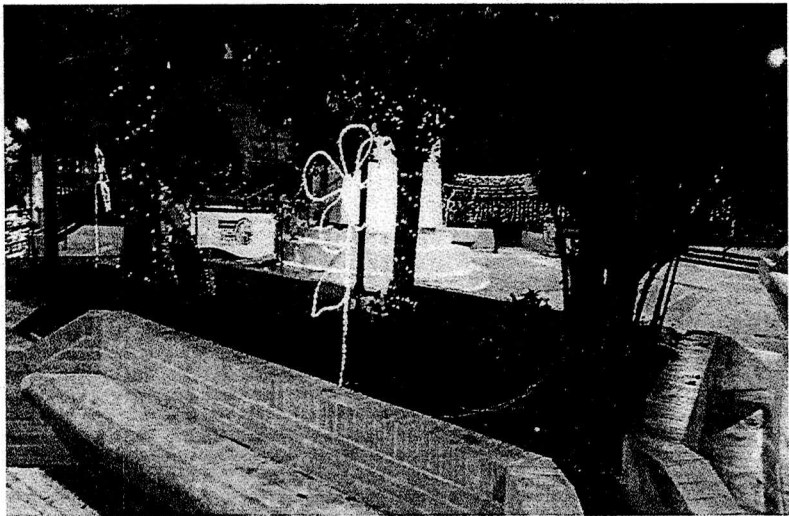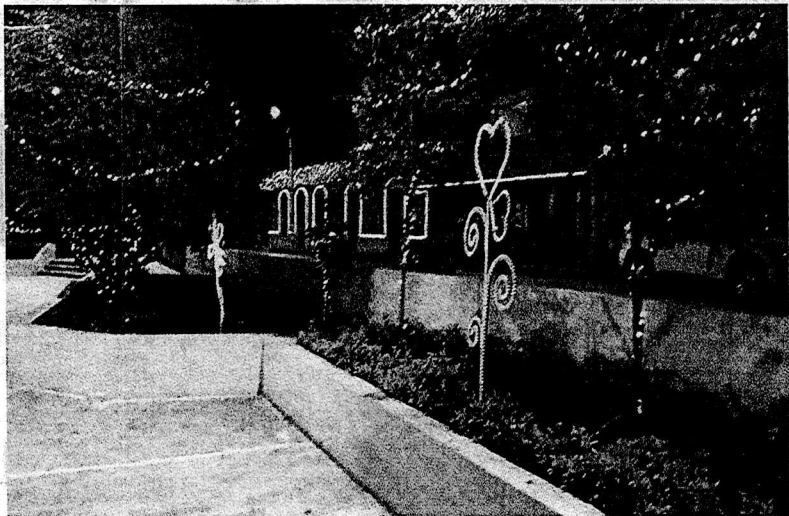




FIGURAS NAVIDEÑAS

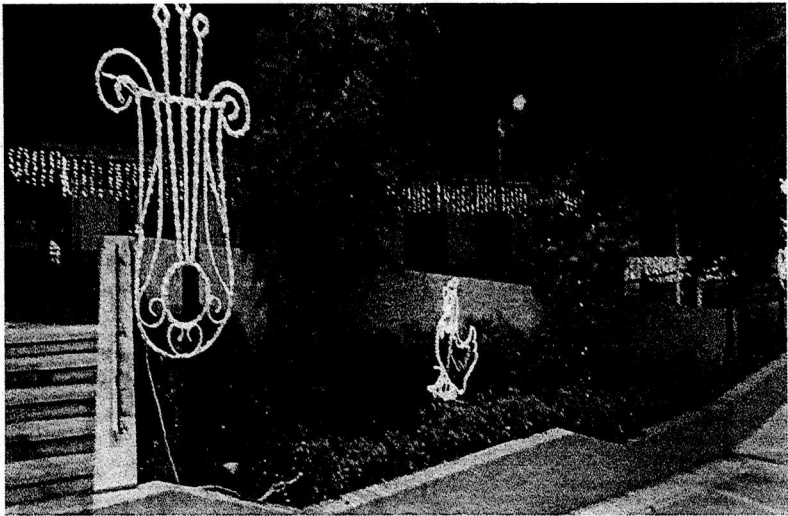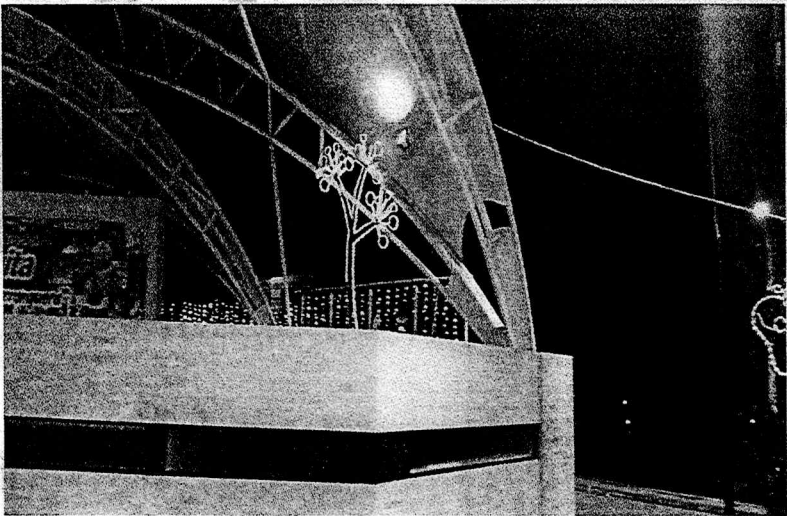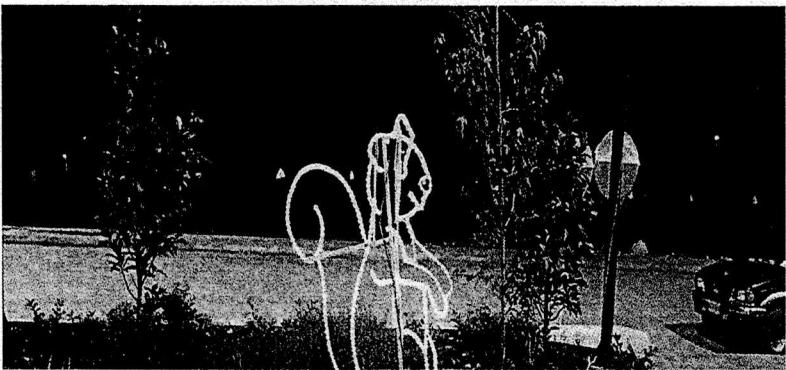




FIGURAS NAVIDEÑAS

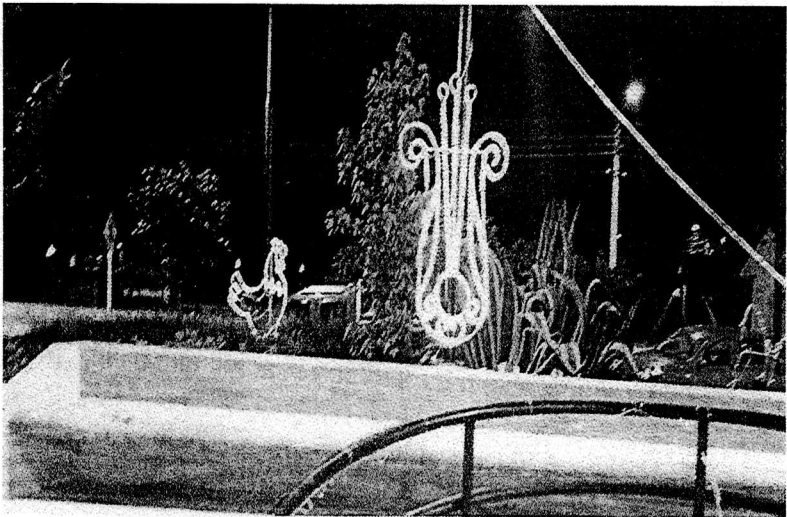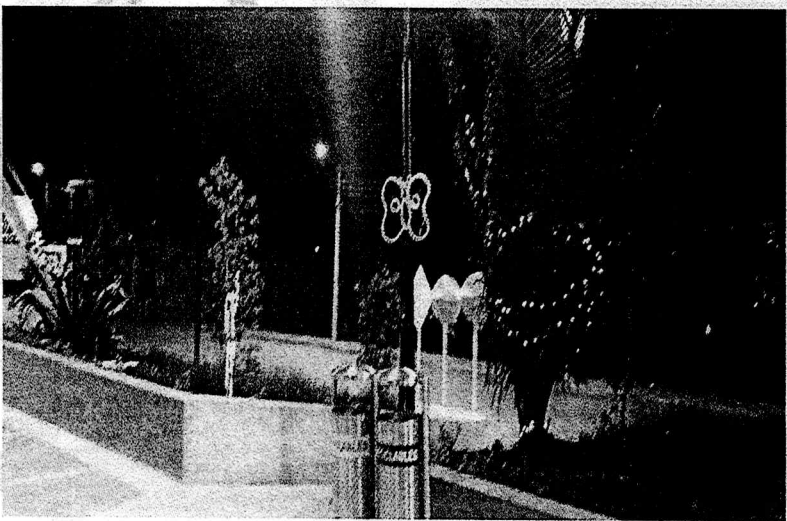




FIGURAS NAVIDEÑAS

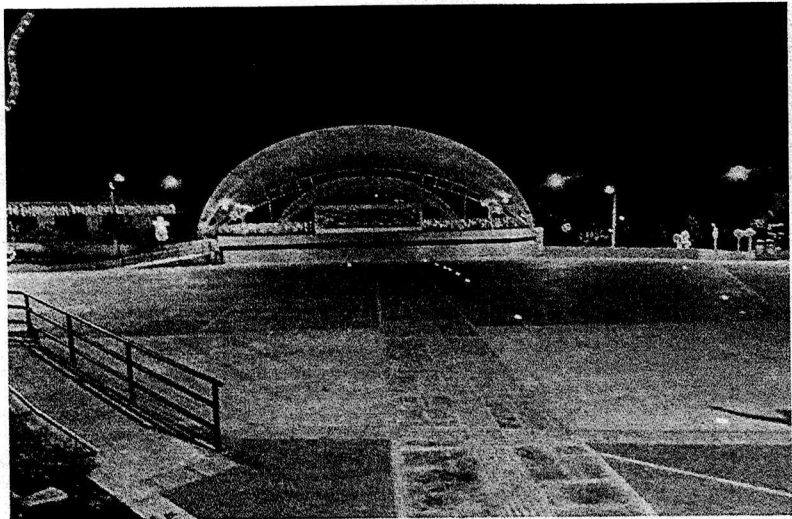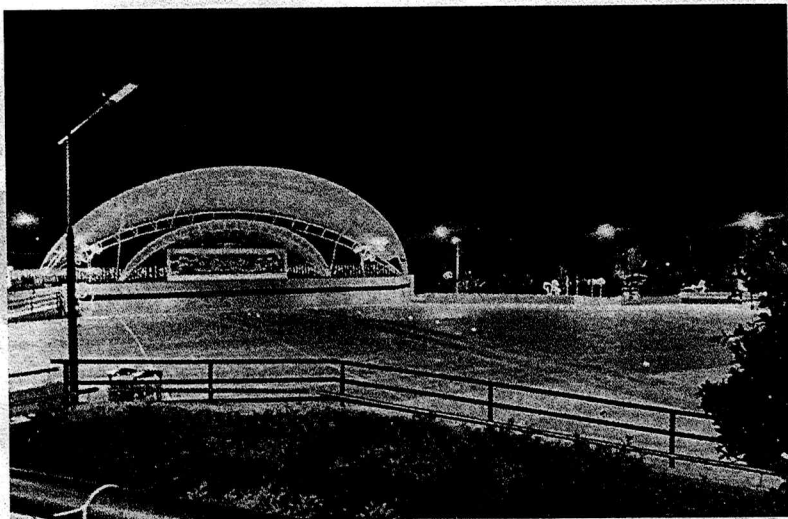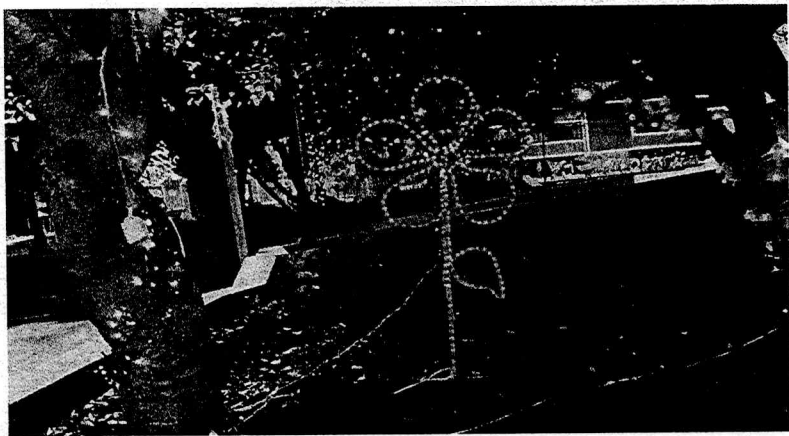

DECORACION SEÑORA DE LAS AGUAS Y PSEBRE.

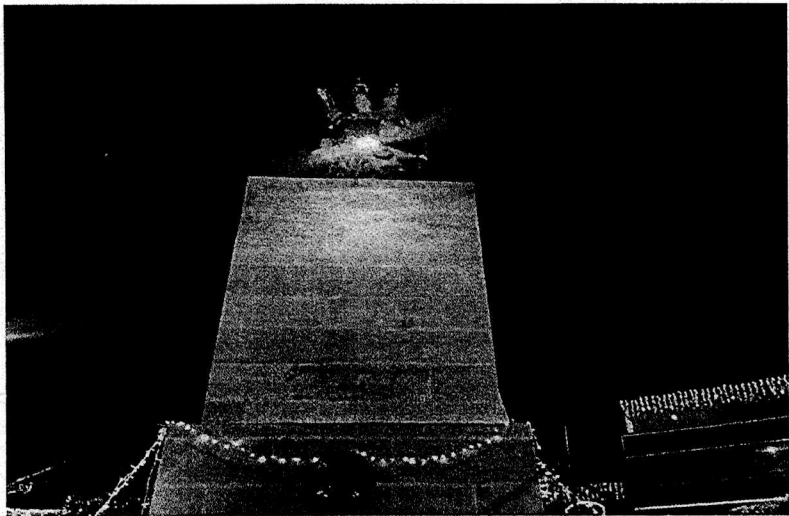

ARREGLO FIGURAS NAVIDEÑAS.

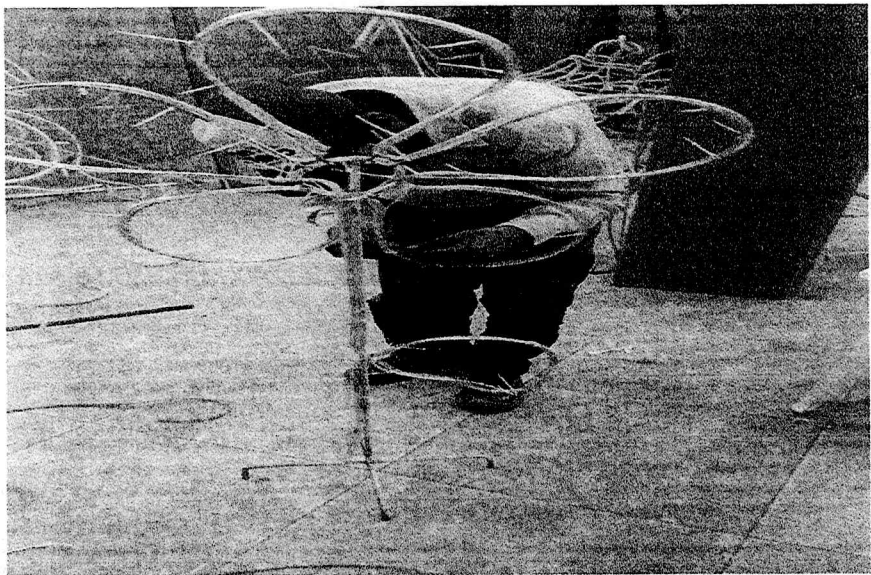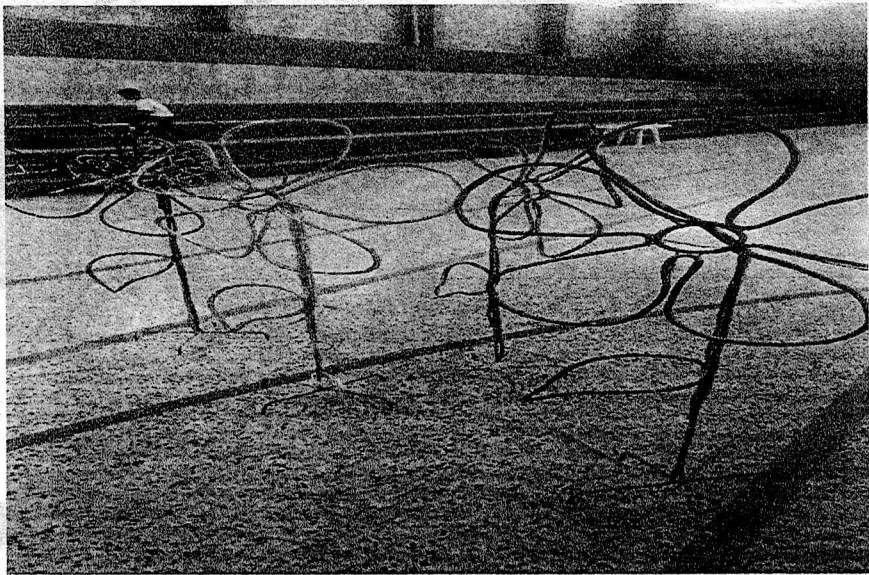

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 3

INFORME ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

1. Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23	12	2023	A	27	12	2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita						
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR						

2. Datos del contrato supervisado:

No. DE CONTRATO	223 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA
CONTRATISTA CC/ NIT	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCION S.A,S Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ"
VALOR INICIAL	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$26.448.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR CC/NIT	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN No. 1	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.200.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$39.648.700,00) M/CTE.
PRORROGA No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
DEFINICIÓN	N/A

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 3

INFORME ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

1. Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23	12	2023	A	27	12	2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita						
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR						

2. Datos del contrato supervisado:

No. DE CONTRATO	223 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA
CONTRATISTA CC/ NIT	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCION S.A,S Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ"
VALOR INICIAL	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$26.448.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR CC/NIT	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN No. 1	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.200.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$39.648.700,00) M/CTE.
PRORROGA No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
DEFINICIÓN	N/A

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-07	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 3

INFORME ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

1. Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23	12	2023	A	27	12	2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita						
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR						


2. Datos del contrato supervisado:

No. DE CONTRATO	223 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA
CONTRATISTA CC/ NIT	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCION S.A,S Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ"
VALOR INICIAL	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$26.448.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR CC/NIT	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN No. 1	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.200.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$39.648.700,00) M/CTE.
PRORROGA No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
DEFINICIÓN	N/A

INFORME FINAL.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 223 DE 2023

OBJETO: "SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE MOTAVITA, BOYACÁ"


CONTRATISTA: OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S

R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS

Ingenieria & Construcción

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ”

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) Dias.

VALOR INICIAL: Veintiséis Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte. (\$ 26.448.500).

VALOR ADICIONAL: Trece Millones Doscientos Mil Doscientos pesos M/Cte. (\$ 13.200.200)

VALOR EJECUTADO TOTAL: Treinta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil Pesos M/Cte. (\$ 39.648.700)

PERSONAL DE TRABAJO.

Relación De Trabajadores			
N.o.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	John Fonseca	1.050.170.171	Técnico Electricista
2	John Francisco Rodríguez N.	1.056.928.378	Técnico Electricista
3	Carlos Yesid Torres B.	1.049.607.946	Ing. Residente
4	Junior Alexander Conrado R.	1.045.728.311	Técnico Electricista
5	José Hernández	4.081.618	Técnico Electricista
6	Hennie Julie Bermúdez	40.032.105	Inspector SST.
7	Robinson Espitia	7.128.243	Ayudante

LOCALIZACIÓN Y ESTADO INICIAL.

La obra se localiza en el casco urbano, del municipio de Motavita, y beneficia personas y comercio del municipio al incentivar las actividades turísticas nocturnas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo la instalación de los ítems contratados de acuerdo a las instrucciones del supervisor, como se puede constatar en el registro fotográfico del presente informe.

DESMONTE DE LA ILUMINACION INSTALADA: Se realizó el desmonte del alumbrado instalado, el cual fue empacado de forma individual y por referencia , de igual manera se

CUADRO DE CANTIDADES.

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARRETE 100 M MANGUERA LED NAVIDEÑA	UNIDAD	750.000,00	4
2	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANGUERA LED EXISTENTE	UNIDAD	235.000,00	1
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS NAVIDEÑAS METALICAS MAYOR A 60CM DE ALTURA	UNIDAD	170.000,00	20
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SECUENCIADORES PARA MANGUERA	UNIDAD	21.000,00	5
5	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS METALICAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	UNIDAD	72.000,00	35
6	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AVISOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS EXISTENTES INCLUYE HICADA POSTE EN MADERA	UNIDAD	350.000,00	0
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR LED DE 200 W COLORES	UNIDAD	330.000,00	0
8	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTENSION TIPO CORTINA LED 6M*30CM	UNIDAD	60.000,00	40
9	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EXTENSION LED * 18M	UNIDAD	85.000,00	40
10	FOTOCONTROL BASE INCLUIDA	UNIIDAD	32.000,00	18
11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX 2*12	UNIDAD	6.500,00	600
12	DESMONTE ALUMBRADO NAVIDEÑO	UNIDAD	950.000,00	1
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED CON FLASHER DE 9M*1M	UND	115.000,00	51
NP2	SUMINSTRO E INSTALACION DE EXTENSION LED DE 100 METROS	UND	265.000,00	10
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 50 W	UND	115.000,00	4
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 100 W	UND	173.000,00	6
SUBTOTAL				
AIU 30%				
VALOR TOTAL (aproximado al peso)				



CONTRATISTA: OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S

R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS.





REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

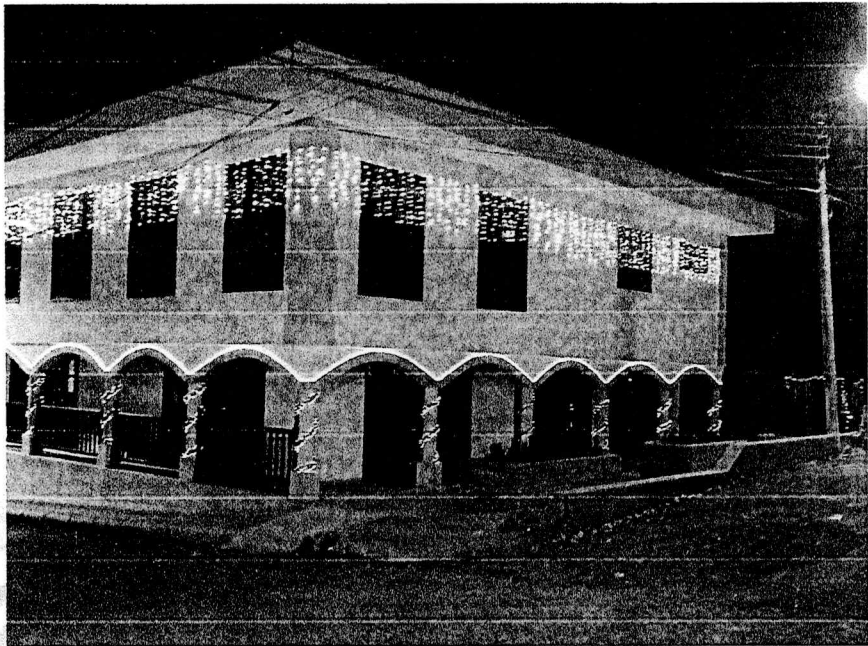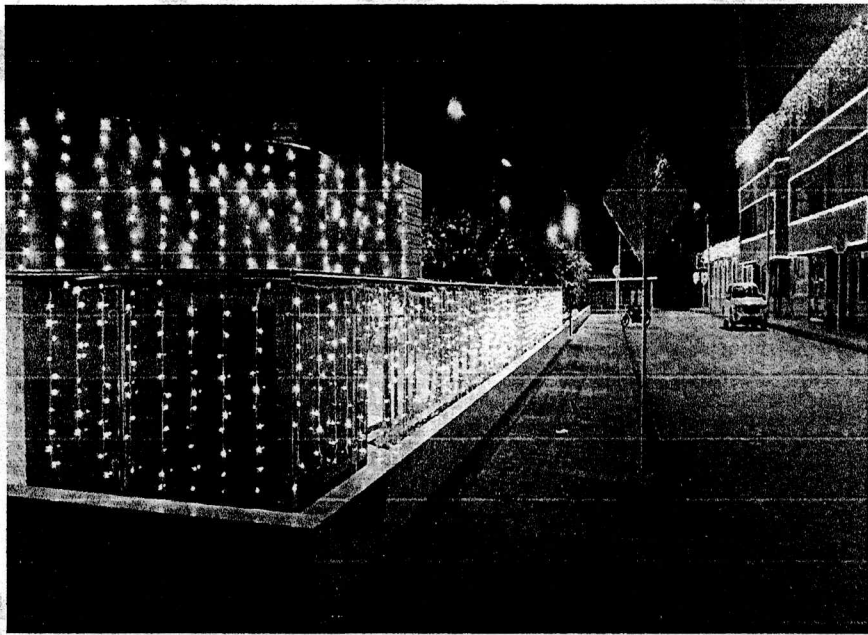



SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

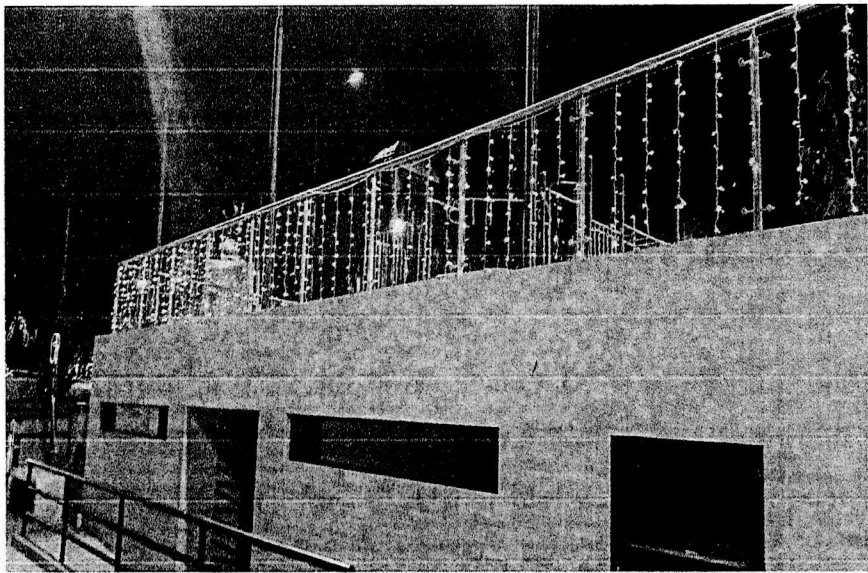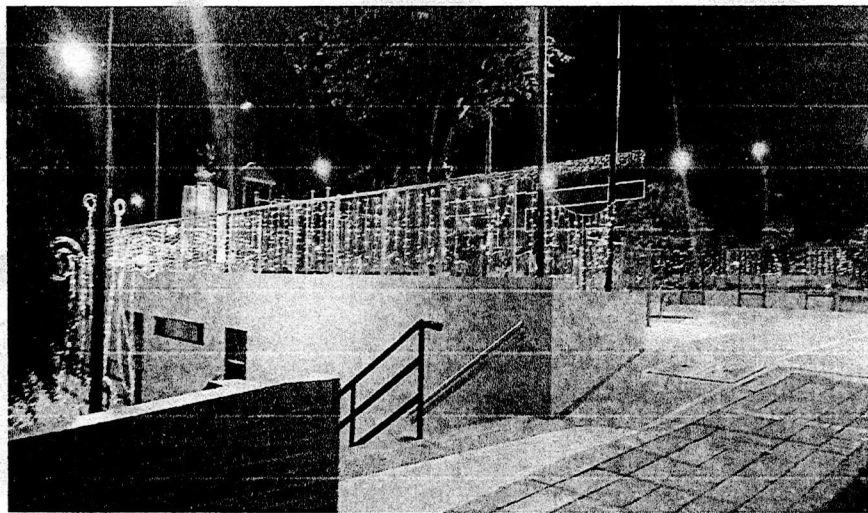




SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.




SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA LED.

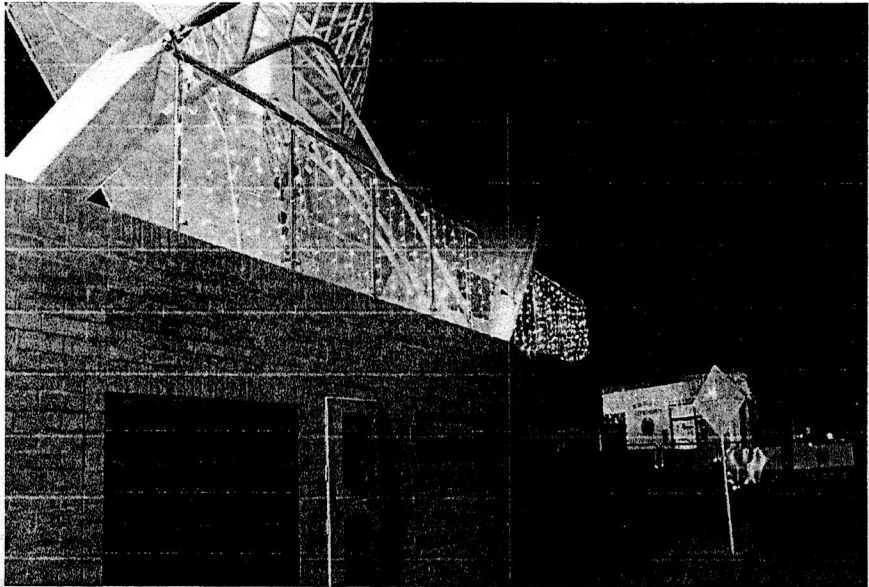




TUNELES EN EXTENSION Y CORTINA LED

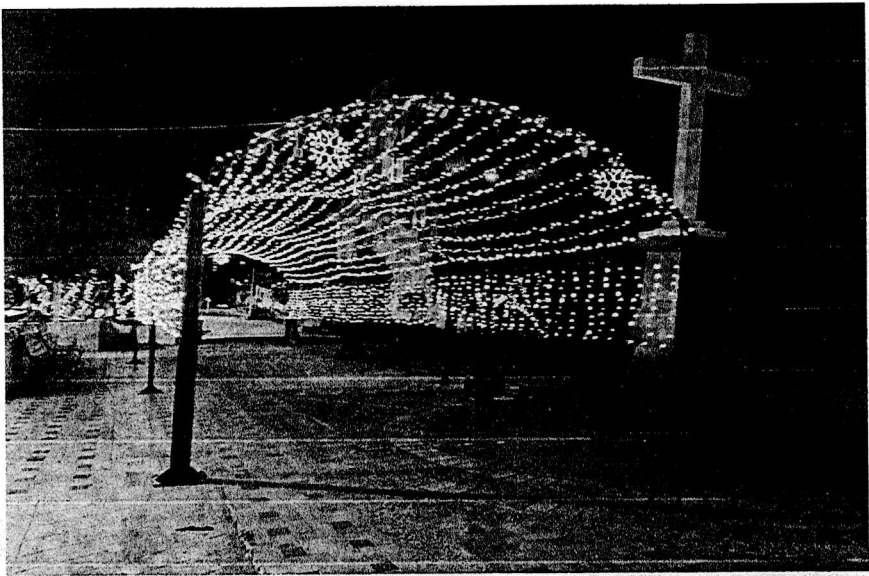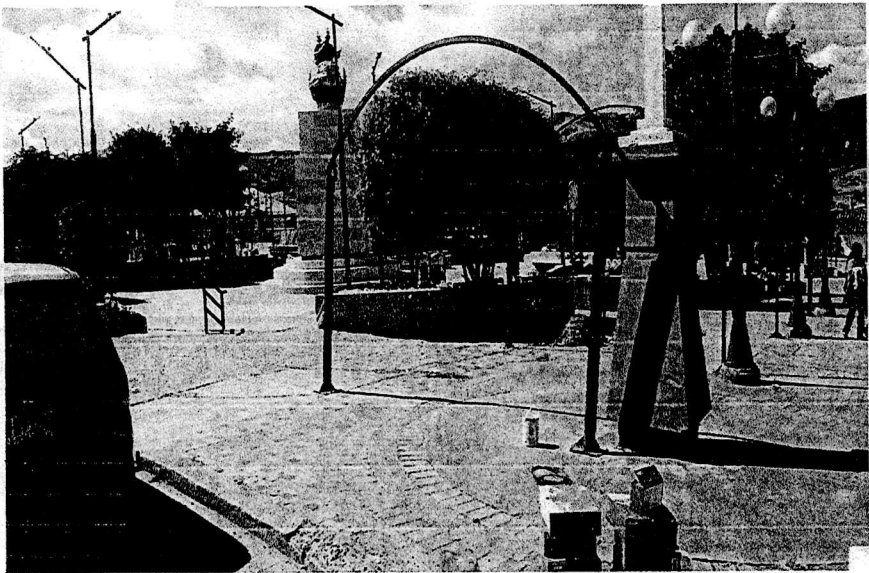



TUNELES EN EXTENSION Y CORTINA LED





DECORACION IGLESIA

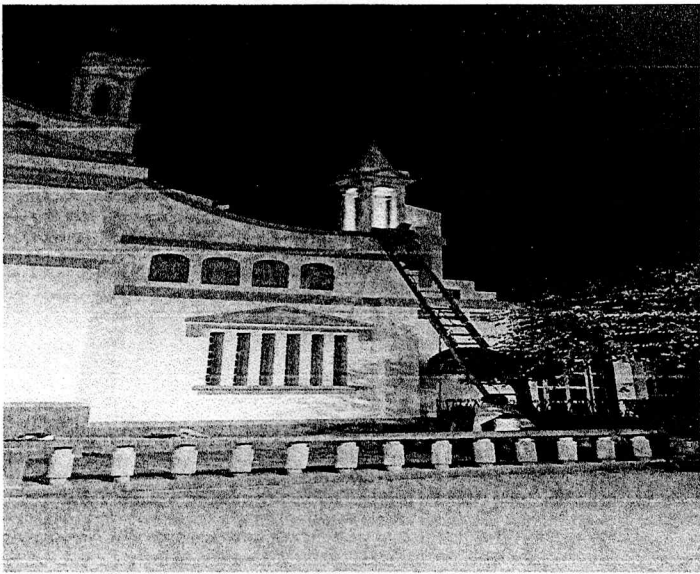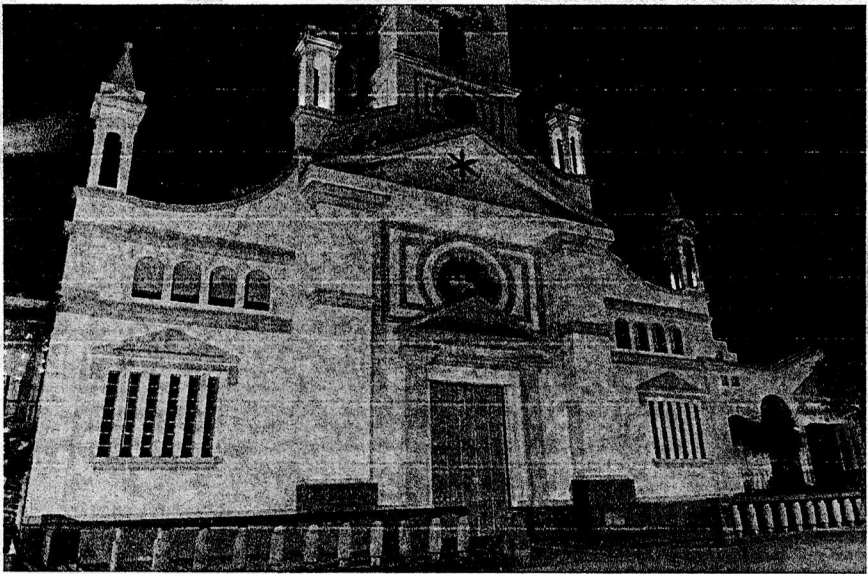


FIGURAS NAVIDEÑAS

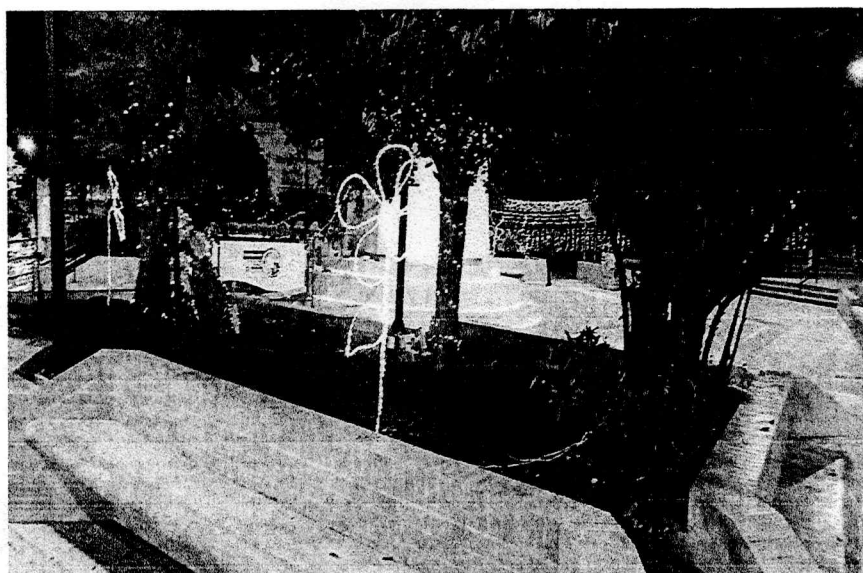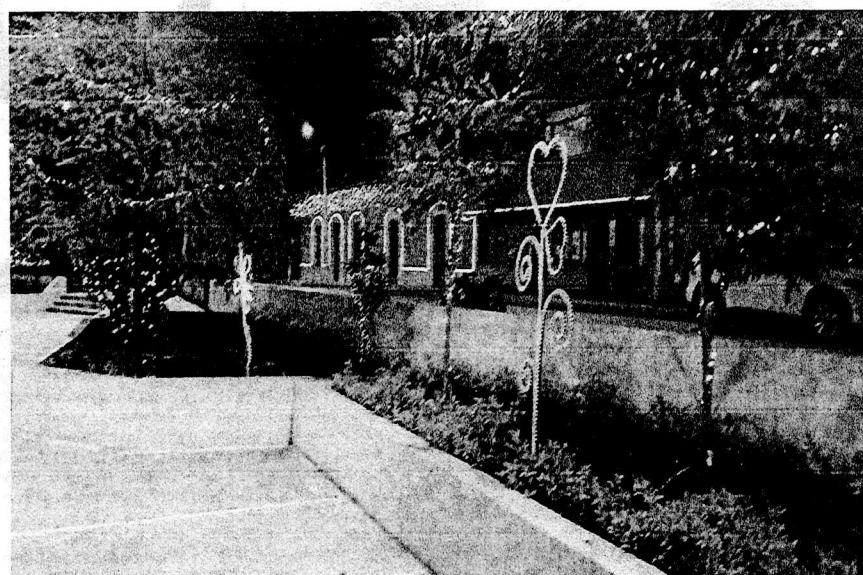




FIGURAS NAVIDEÑAS

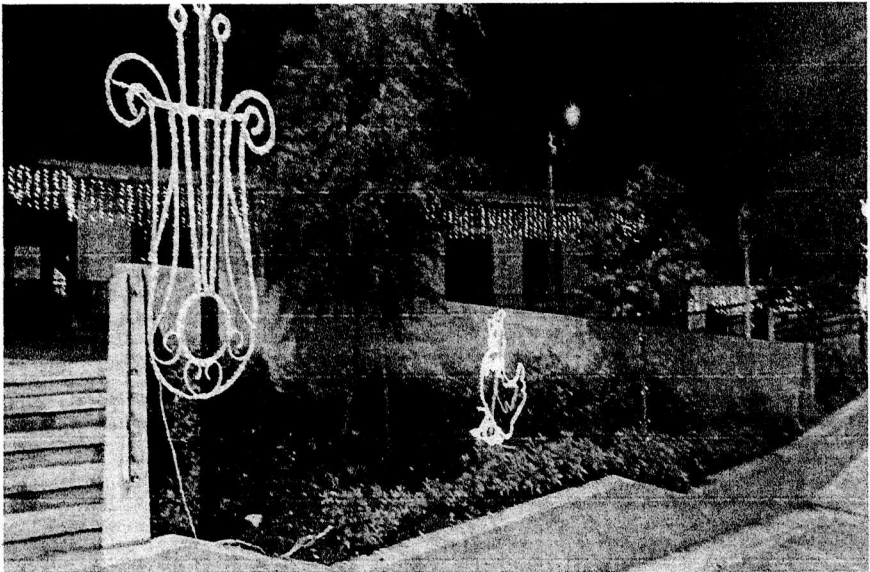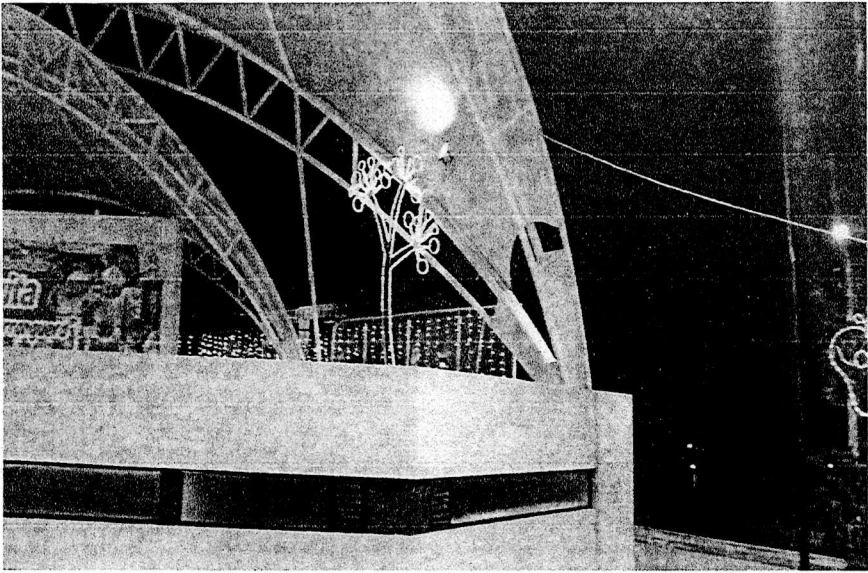




FIGURAS NAVIDEÑAS

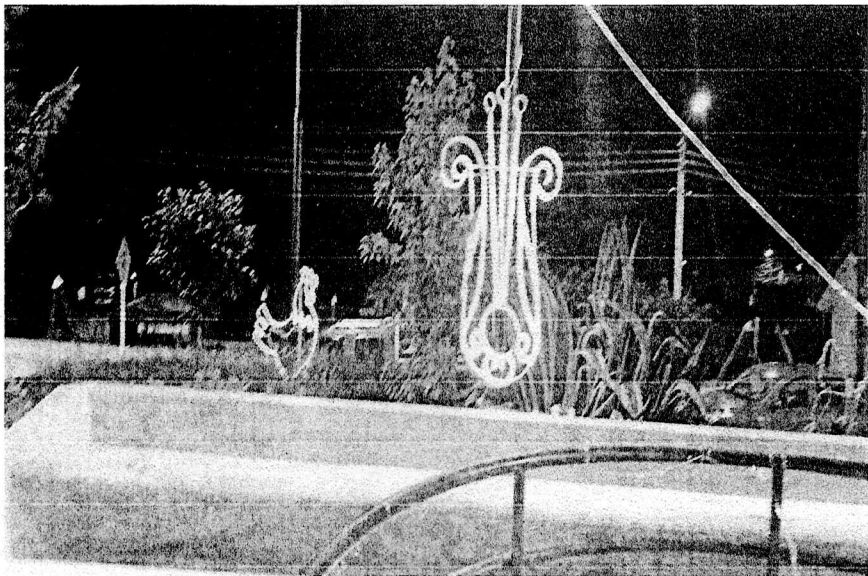

ARREGLO FIGURAS NAVIDEÑAS.

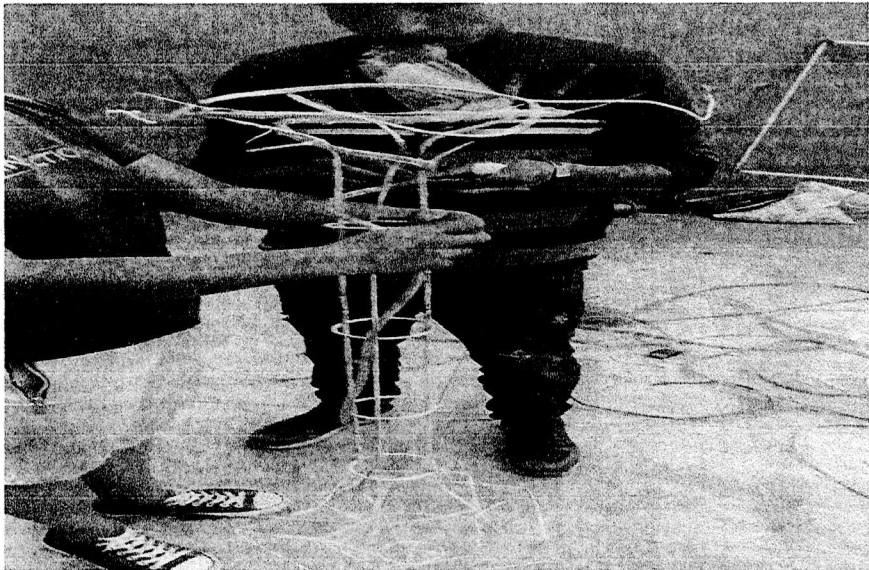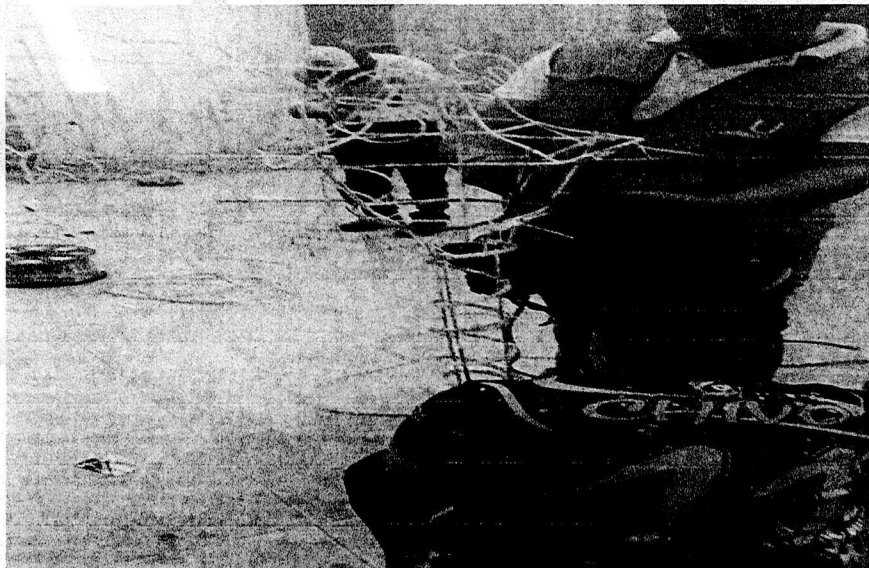

ARREGLO FIGURAS NAVIDEÑAS.

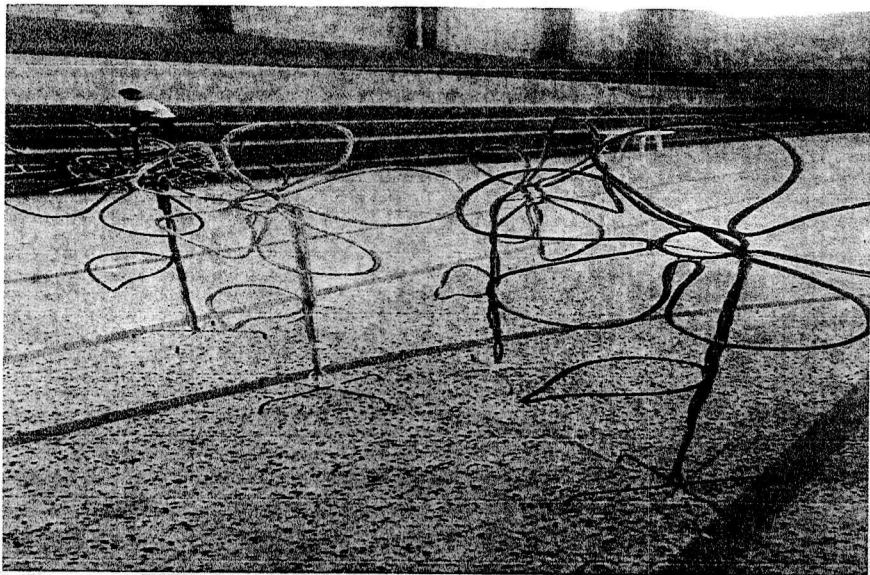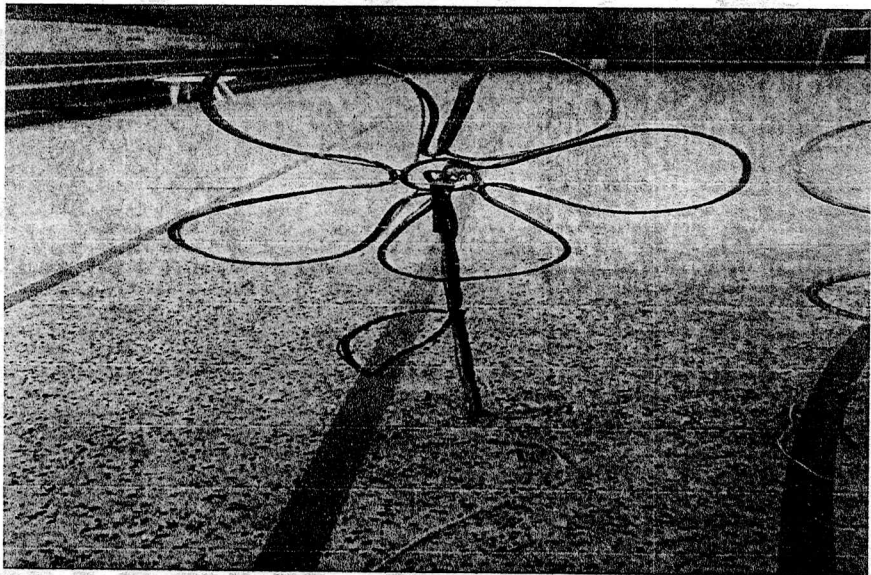

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM 9 DESMONTAJE


ITEM 1 Y 2 CARRETE 100 M MANGUERA LED NAVIDEÑA







ITEM 3 FIGURAS NAVIDEÑAS METALICAS MAYOR A 60CM DE ALTURA




ITEM 4 ACCESORIOS Y SECUENCIADORES PARA MANGUERA



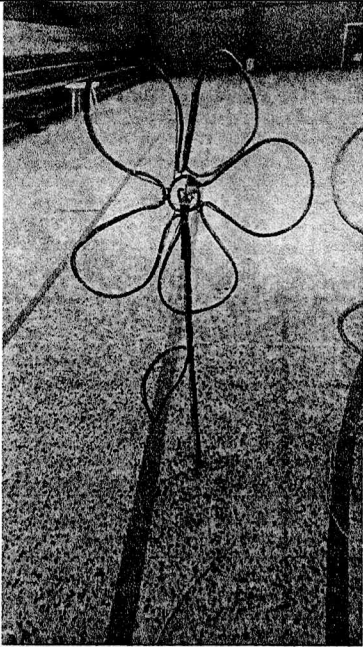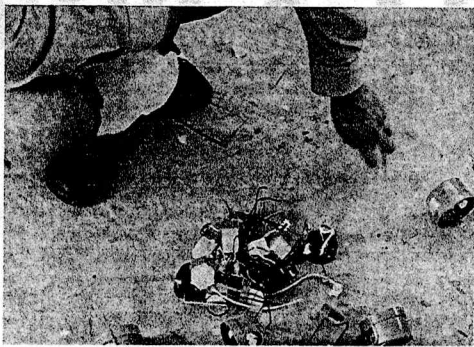ITEM 5 FIGURAS METALICAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	
	
ITEM 8 Y 9 EXTENSION Y CORTINA EXISTENTE	
	
ITEM 10. FOTOCONTROL BASE INCLUIDA	
	

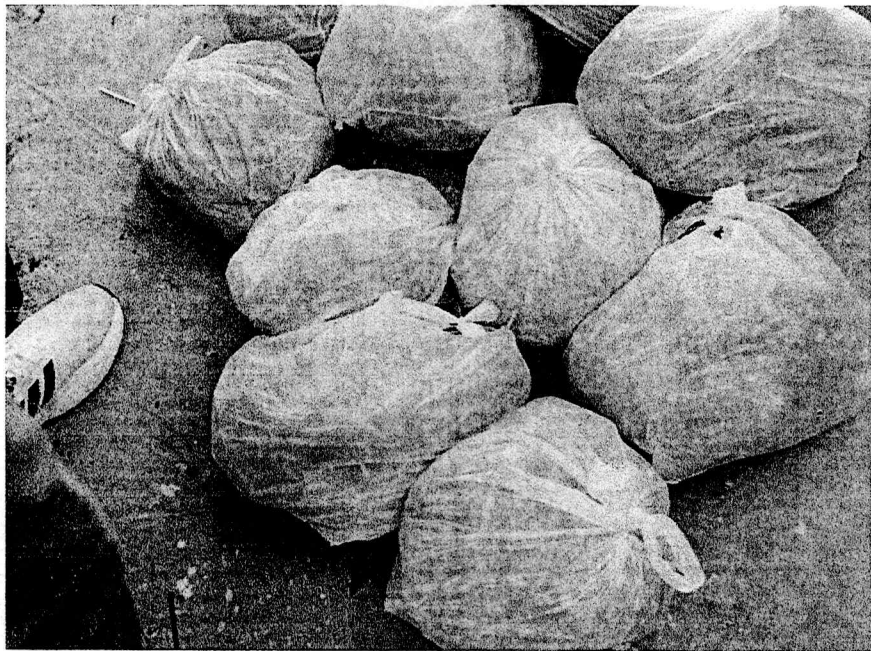

NP 3 REFLECTOR LED RGB DE 50 W

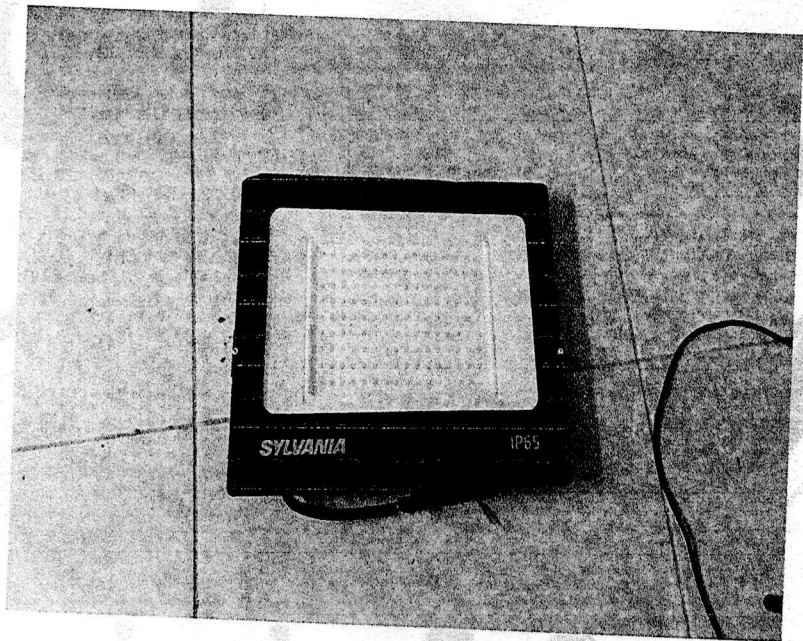

NP 4. REFLECTOR LED RGB DE 100 W



Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900917352	9	OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNUNGUA	TV 1 A VIS 70 10 SUAMOX	TUNJA-BOYACA	7402085	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
PenSIón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	347627075	9460494632	E	2024/01/15	2023/12/19	BANCOLOMBIA	0	\$1,262,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	ide	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vjp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días		IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: OFICINA OMEGA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0		\$284,500
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0		\$284,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0		\$284,500
1	CC	1002340065	RUBIO ANYI																	239201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	SI	\$284,500					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: TUNJA Y MUNICIPIOS CERCANOS (7 Afiliados)																									\$2,049,335	\$328,200			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$89,600			\$0	\$0	\$582,400
Centro de Trabajo: TUNJA Y MUNICIPIOS CERCANOS (7 Afiliados)																									\$2,049,335	\$328,200			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$89,600			\$0	\$0	\$582,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (7 Afiliados)																									\$2,049,335	\$328,200			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$82,300			\$2,049,335	\$89,600			\$0	\$0	\$582,400
2	CC	40032105	BERMUDEZ HENNIE	X	X															23100	9	\$348,000	\$55,700	EPS005	9	\$348,000	\$14,000	CCF10	9	\$348,000	\$14,000	14-11	9	\$348,000	4.350%	\$15,200	9	\$0	\$0	\$1	\$98,900		
3	CC	1050170171	FONSECA JOHN	X	X															23030	10	\$386,667	\$61,900	EPS017	10	\$386,667	\$15,500	CCF10	10	\$386,667	\$15,500	14-11	10	\$386,667	4.350%	\$16,900	10	\$0	\$0	\$1	\$109,800		
4	CC	4081618	HERNANDEZ JOSE		X															23100	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF10	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	4.350%	\$5,100	3	\$0	\$0	\$1	\$33,100		
5	CC	7174140	MONTAÑA ALEXIS	X	X															23030	4	\$154,667	\$24,800	EPS037	4	\$154,667	\$6,200	CCF10	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	4.350%	\$6,800	4	\$0	\$0	\$1	\$44,000		
6	CC	1049618955	RIVERA GERMAN	X	X															25-14	4	\$154,667	\$24,800	EPS005	4	\$154,667	\$6,200	CCF10	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	4.350%	\$6,800	4	\$0	\$0	\$1	\$44,000		
7	CC	1056928378	RODRIGUEZ JHON		X															23030	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF10	5	\$193,334	\$7,800	14-11	5	\$193,334	4.350%	\$8,500	5	\$0	\$0	\$1	\$55,100		
8	CC	1049607946	TORRES CARLOS	X	X															23030	18	\$696,000	\$111,400	EPS008	18	\$696,000	\$27,900	CCF10	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	4.350%	\$30,300	18	\$0	\$0	\$1	\$197,500		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sl	lge	une	vac	avp	vct	tr	vp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$88,900	\$0	\$0			\$395,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL RIESGO 5 (2 Afiliados)																							\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$88,900	\$0	\$0			\$395,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$88,900	\$0	\$0			\$395,300
9	CC	1045728311																		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200
10	CC	7128243		X																23030	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF10	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	6.960%	\$8,100	3	\$0	\$0	\$1	\$36,100
Total Afiliados(10)																							\$4,485,335	\$718,000			\$4,485,335	\$179,800			\$4,485,335	\$179,800			\$4,485,335	\$184,600	\$0	\$0			\$1,262,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900917352	9	OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNUNGUA	TV 1 A VIS 70 10 SUAMOX	TUNJA-BOYACA	7402085	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	347627075	9460494632	E	2024/01/15	2023/12/19	BANCOLOMBIA	0	\$1,262,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$718,000	\$0	\$0	\$718,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$74,300	\$0	\$0	\$74,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$433,300	\$0	\$0	\$433,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$179,800	\$0	\$0	\$179,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$179,800	\$0	\$0	\$179,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$179,800	\$0	\$0	\$179,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$23,400	\$0	\$0	\$23,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200	
TOTAL				10	\$1,262,200	\$0	\$0	\$1,262,200	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																												
Id.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slm	lge	lma	vac	avp	vct	trt	vp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																			
CURSUAL: RIESGO 5 (2 Afiliados)																									\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$88,900	\$0	\$0	\$395,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL RIESGO 5 (2 Afiliados)																									\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$88,900	\$0	\$0	\$395,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																									\$1,276,000	\$204,200			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$1,276,000	\$51,100			\$88,900	\$0	\$0	\$395,300
4	CC	1045728311	CONRADO JUNIOR																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$359,200																		
5	CC	7128243	ESPITIA ROBINSON	X																230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF10	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	6.960%	\$8,100	3	\$0	\$0	\$0	SI	\$36,100																		
Total Afiliados(5)																									\$2,668,000	\$427,000			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$2,668,000	\$106,900			\$0	\$0	\$0	\$745,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900917352	9	OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNUNGUA	TV 1 A VJS 70 10 SUAMOX	TUNJA-BOYACA	7402085	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	313923517	9459899287	E	2023/12/14	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$745,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$427,000	\$0	\$0	\$427,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$18,600	\$0	\$0	\$18,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$222,800	\$0	\$0	\$222,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$105,200	\$0	\$0	\$105,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$105,200	\$0	\$0	\$105,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$106,200	\$0	\$0	\$106,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$106,200	\$0	\$0	\$106,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$106,900	\$0	\$0	\$106,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				5	\$745,300	\$0	\$0	\$745,300	



ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESOS DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACIÓN
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

CONTRATO	223	diciembre 11, 2023	FECHA DE INICIACIÓN REAL
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA"		diciembre 13, 2023
			FECHA DE SUSPENSIÓN 1
			FECHA DE PRORROGA 1
CONTRATISTA	OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S		FECHA TERMINACIÓN SEGÚN
INTERVENTOR:	N/A		27 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL	\$ 26.448.500	% EJECUTADO	100,00%
VALOR ADICIONAL	\$ 13.200.200	% TIEMPO	100,00%
VALOR TOTAL	\$ 39.648.700		27 de diciembre de 2023

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUCIÓN			
No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	IPD	VR UNIT + IPD	V/TOTAL			PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA	
								Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARRETE 100 M MANGUERA LED NAVIDEÑA	UNIDAD	2	\$ 750.000	0%	0	1.500.000,00	4	3.000.000	0	\$ -	4	\$ 3.000.000
2	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANGUERA LED EXISTENTE	UNIDAD	2	\$ 235.000	0%	0	470.000,00	1	235.000	0	\$ -	1	\$ 235.000
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS NAVIDEÑAS METALICAS MAYOR A 60CM DE ALTURA	UNIDAD	20	\$ 170.000	0%	0	3.400.000,00	20	3.400.000	0	\$ -	20	\$ 3.400.000
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SECUENCIADORES PARA MANGUERA	UNIDAD	15	\$ 21.000	0%	0	315.000,00	5	105.000	0	\$ -	5	\$ 105.000
5	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIGURAS METALICAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	UNIDAD	35	\$ 72.000	0%	0	2.520.000,00	35	2.520.000	0	\$ -	35	\$ 2.520.000
6	REVISION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AVISOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS EXISTENTES INCLUYE HICADA POSTE EN MADERA	UNIDAD	1	\$ 350.000	0%	0	350.000,00	0	0	0	\$ -	0	\$ 0
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFELECTOR LED DE 200 W COLORES	UNIDAD	4	\$ 330.000	0%	0	1.320.000,00	0	0	0	\$ -	0	\$ 0
8	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTENSION TIPO CORTINA LED 6M*30CM	UNIDAD	40	\$ 60.000	0%	0	2.400.000,00	40	2.400.000	0	\$ -	40	\$ 2.400.000
9	REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EXTENSION LED * 18M	UNIDAD	40	\$ 85.000	0%	0	3.400.000,00	40	3.400.000	0	\$ -	40	\$ 3.400.000
10	FOTOCONTROL BASE INCLUIDA	UNIDAD	35	\$ 32.000	0%	0	1.120.000,00	18	576.000	0	\$ -	18	\$ 576.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX 2*12	UNIDAD	400	\$ 6.500	0%	0	2.600.000,00	600	3.900.000	0	\$ -	600	\$ 3.900.000
12	DESMONTE ALUMBRADO NAVIDEÑO	UNIDAD	1	\$ 950.000	0%	0	950.000,00	1	950.000	1	\$ 950.000	0	\$ 0

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 30/07/2021	Pág 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	223 DEL 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA
CONTRATISTA CC/ NIT	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCCION S.A. S. Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ"
VALOR	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$26.448.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR CC/NIT	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA Secretario de Infraestructura C.C. No. 4.043.328 de Motavita
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN No. 1	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.200.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$39.648.700,00) M/CTE.
PRORROGA No.	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el ingeniero **EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA** identificado con la C.C. No. 4.043.328 de Motavita, en su calidad de secretario de infraestructura y Supervisor del Contrato de la referencia y por la otra parte **OMEGA INGENIERIA & COSTRUCCION S.A,S**, registrada con Nit. 900.917.352-9, representada legalmente por el señor **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** identificado con C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja., en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente acta de recibo final de acuerdo al siguiente por menor:




	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 2 de 2

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		\$ 26.448.500,00
VALOR ADICIONAL No. 01		\$ 13.200.200,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 35.582.300,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$ 4.066.400,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	\$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 39.648.700,00	\$ 39.648.700,00


LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$4.066.400,00) M/CTE.

De igual manera se deja constancia:

1. Que, el contrato se ejecutó dentro del plazo estipulado.
2. Que el contratista cumplió con la realización de actividades establecidas dentro del contrato.
3. Que, se recibe a satisfacción la ejecución del contrato, quedando por formalizar el desmontaje y entrega de estos elementos a la administración municipal entrante, dicho desmonte debe realizarse en coordinación con las directrices del nuevo supervisor que designe la entidad, en el mes de enero, en el cual se considera que se termina la temporada decembrina.
4. En virtud de lo expuesto, se concluye proceder con la formalización del acta de recibo y terminación, de acuerdo a las consideraciones planteadas, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y garantizar la transparencia y legalidad en la gestión contractual del Estado colombiano.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2023.


EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA
Secretario de Infraestructura
Supervisor


OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 900.917.352-9
R/L: Carlos Yesid Torres Bustos
C.C. No. 1.049.607.946 De Tunja

