


PROPAV S.A.S
NIT 901.415.159-2

PROPAV S.A.S.
NIT: 901415159-2
DIRECCIÓN: TV 34 B SUR DG 31 E 9 P 3
TELÉFONO: (604) 3229966
EMAIL: PROPAVSAS@GMAIL.COM
ENVIGADO - ANTIOQUIA



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA N° P - 159

Cliente: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
Nit / C.C.: 900198194
Dirección: CR 21 21 37
Ciudad: RETIRO
Teléfono: 5410934
Fecha de generación: 12/07/2024
Fecha de vencimiento: 20/07/2024
Fecha y validación DIA: 12/07/2024 2:49:12p. m.
Orden de compra: ACTA PARCIAL No 02

IT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1000002	ACTA DE OBRA - ACTA No 02, CONTRATO DE OBRA 027 - 2024; OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA	Und	1,00	0%	\$ 32.985.383	\$ 32.985.383

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

VALOR SIN IVA	32.985.383
ADMINISTRACION	\$ 7.256.784,32
IMPREVISTOS	\$ 0,00
UTILIDAD	\$ 1.649.269
IVA	\$ 0
RETENCION	% \$ 0
TOTAL A PAGAR:	\$ 41.891.437

Centro de costo: 0235-PARCHEO EL RETIRO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA O CONSIGNAR A NOMBRE DE PROPAV S.A.S. EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA No 61100002129

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764062618495 del 26/12/2023 Hasta el 26/12/2024 del No
P 101 al No P 500

OBSERVACIONES: ACTA No 02, CONTRATO DE OBRA 027 - 2024; OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL
RETIRO, ANTIOQUIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador
declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Juan Felipe Arias Barrientos

FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Codigo CUFE: 2e91e5c23bd9b676725c329b221b44b3514056277d385d04235e1d77ef78929b6156c4bbe42fb7d513166ae9a9bc97c8



Medellín, julio 12 de 2024.

Señores


FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL RETIRO – FONDESER.

Ciudad

Mediante el presente oficio y en calidad de interventoría del contrato N° 028 de 2024 con objeto de "CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 022-2024" nos permitimos dar por aprobada el **ACTA 002** de ejecución parcial de obra del contratista **PROPAV S.A.S.** con un valor total de **COP \$41'891.437 (CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS)**, la cual ha sido debidamente revisada en todos los aspectos asociados al alcance del contrato de interventoría. Dicha acta se encuentra anexa junto con este oficio.

De antemano muchas gracias.

Cordialmente,



SANTIAGO CARDONA BALBIN

Representante legal

INVERSIONES Y ASESORÍAS BALBIN S.A.S.

NIT 901.072.065-5.

[illegible]

HOJA 1 DE										MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA											
ACTA No. 1 - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																					
FECHA		DD	10	MM	07	AAAA	2024	ACTA N°		02	FECHA ACTA		10/07/2024								
OBJETO DEL CONTRATO:										MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA											
ENTIDAD CONTRATANTE:										FONDESER											
CONTRATISTA:										PROPAV											
SUPERVISOR:																					
2.1		Excavación a maquina o manual de 0-2 m, en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye botada y disposición final de los materiales.																		m3	
ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN																					
																					
Localización		Ancho		Alto		Longitud		No. Elementos		cant. Total											
Retiro del viento		2.9		0.55		2.85		1		4.61											
Retiro del viento		0.73		0.55		2.85		1		0.57											
Retiro del viento		3.1		0.55		2.7		1		4.63											
Retiro del viento		1.95		0.55		1.92		1		2.06											
Retiro del viento		0.5		0.55		0.47		1		0.13											
Calle 17 # 24-13		3.4		0.55		3.47		1		6.49											
Calle 17 # 24-20		3.32		0.55		3.24		1		5.92											
Gra 25 # 17-24		4.3		0.25		2.02		1		2.17											
Gra 25 # 17-24		1.72		0.25		2.1		1		0.90											
Gra 25 # 17-24		2.26		0.25		2.61		1		1.49											
Gra 25 con calle 16		3		0.25		4		1		3.00											
Subtotal																				31.97	
Contratista:										Supervision:											
Firma:										Firma:											

[illegible]

MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA																																																																																						
ACTA No. 1 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																						
FECHA	DD	10	MM	07	AAAA	2024	ACTA N°	02	FECHA ACTA	10/07/2024																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																																						
FONDESER																																																																																						
CONTRATISTA: PROPAV																																																																																						
SUPERVISOR:																																																																																						
MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA																																																																																						
3.1	Suministro transporte y colocación de concreto normal para pavimento rígido MR 40, T maximo nominal 1". Según resistencia de diseño- flexion, incluye acelerante a tres dias, no incluye refuerzo									m3																																																																												
ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Localización</th> <th colspan="2">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No. Elementos</th> <th rowspan="2">cant. Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Longitud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retiro del viento</td> <td>2.9</td> <td>0.2</td> <td>2.85</td> <td>1</td> <td>1.68</td> </tr> <tr> <td>Retiro del viento</td> <td>0.73</td> <td>0.2</td> <td>2.85</td> <td>1</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>Retiro del viento</td> <td>3.1</td> <td>0.2</td> <td>2.7</td> <td>1</td> <td>1.68</td> </tr> <tr> <td>Retiro del viento</td> <td>1.95</td> <td>0.2</td> <td>1.92</td> <td>1</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>Retiro del viento</td> <td>0.5</td> <td>0.2</td> <td>0.47</td> <td>1</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Calle 17 # 24-13</td> <td>3.4</td> <td>0.2</td> <td>3.47</td> <td>1</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>Calle 17 # 24-20</td> <td>3.32</td> <td>0.2</td> <td>3.24</td> <td>1</td> <td>2.15</td> </tr> <tr> <td>Cra 25 # 17-24</td> <td>4.3</td> <td>0.2</td> <td>2.02</td> <td>1</td> <td>1.74</td> </tr> <tr> <td>Cra 25 # 17-24</td> <td>1.72</td> <td>0.2</td> <td>2.1</td> <td>1</td> <td>0.72</td> </tr> <tr> <td>Cra 25 # 17-24</td> <td>2.28</td> <td>0.2</td> <td>2.61</td> <td>1</td> <td>1.19</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Subtotal</td> <td>12.53</td> </tr> </tbody> </table>										Localización		Dimensiones		No. Elementos	cant. Total	Ancho	Alto	Longitud		Retiro del viento	2.9	0.2	2.85	1	1.68	Retiro del viento	0.73	0.2	2.85	1	0.21	Retiro del viento	3.1	0.2	2.7	1	1.68	Retiro del viento	1.95	0.2	1.92	1	0.75	Retiro del viento	0.5	0.2	0.47	1	0.05	Calle 17 # 24-13	3.4	0.2	3.47	1	2.56	Calle 17 # 24-20	3.32	0.2	3.24	1	2.15	Cra 25 # 17-24	4.3	0.2	2.02	1	1.74	Cra 25 # 17-24	1.72	0.2	2.1	1	0.72	Cra 25 # 17-24	2.28	0.2	2.61	1	1.19	Subtotal					12.53	
Localización		Dimensiones		No. Elementos	cant. Total																																																																																	
Ancho	Alto	Longitud																																																																																				
Retiro del viento	2.9	0.2	2.85	1	1.68																																																																																	
Retiro del viento	0.73	0.2	2.85	1	0.21																																																																																	
Retiro del viento	3.1	0.2	2.7	1	1.68																																																																																	
Retiro del viento	1.95	0.2	1.92	1	0.75																																																																																	
Retiro del viento	0.5	0.2	0.47	1	0.05																																																																																	
Calle 17 # 24-13	3.4	0.2	3.47	1	2.56																																																																																	
Calle 17 # 24-20	3.32	0.2	3.24	1	2.15																																																																																	
Cra 25 # 17-24	4.3	0.2	2.02	1	1.74																																																																																	
Cra 25 # 17-24	1.72	0.2	2.1	1	0.72																																																																																	
Cra 25 # 17-24	2.28	0.2	2.61	1	1.19																																																																																	
Subtotal					12.53																																																																																	
<div> <div> </div> <div> </div> </div>																																																																																						

HOJA 1 DE										MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA											
FECHA										ACTA No. 1 - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA											
DD		MM		AA		07		2024		ACTA N°		02		FECHA ACTA		10/07/2024					
OBJETO DEL CONTRATO:										MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA											
ENTIDAD CONTRATANTE:																					
CONTRATISTA:																					
SUPERVISOR:																					
4.1										Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa. Incluye engrasante y todo lo necesario para su correcta instalación											
ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN																					
																					
Localización										Dimensiones			m3								
Ancho										m2/kg			Longitud		No. Elementos		cant. Total				
Retiro del viento										2.9			1.32			2.85		1		11.06	
Retiro del viento										0.73			1.32			2.85		1		2.75	
Retiro del viento										3.1			1.32			2.7		1		11.12	
Retiro del viento										1.95			1.32			1.92		1		4.94	
Retiro del viento										0.6			1.32			0.47		1		0.31	
Calle 17 # 24-13										3.4			1.32			3.47		1		15.57	
Calle 17 # 24-20										3.32			1.32			3.24		1		14.20	
Cra 25 # 17-24										4.3			1.32			2.02		1		11.47	
Cra 25 # 17-24										1.72			1.32			2.1		1		4.77	
Cra 25 # 17-24										2.28			1.32			2.61		1		7.86	
Subtotal																		84.04			

Contratista: SEBASTIÁN REYES

Supervisión: Sebastián Reyes

Firma: Sebastián Reyes

CONTRATO 027 -2024



MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 -2024.

Información general del contrato

CONTRATANTE:	FONDESER
NIT:	900.198.194-5
CONTRATISTA:	PROPAV SAS
NIT O C.C:	901.455.159-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 -2024.
VALOR TOTAL CONTRATO:	Valor total del contrato: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M.L.V. (\$179.188.712) – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar.
CDP:	168 DEL 29 DE ABRIL DE 2024
CRP:	200 DEL 15 DE MAYO DE 2024
FECHA INICIO:	24 DE MAYO DE 2024
DURACION:	DOS (2) MESES
ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Actividades contratadas

Los ítems descritos a continuación son los ítems contractuales del presente contrato:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	DEMOLICIONES		
1.1	Demolición de pavimento rígido, de cualquier espesor y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final de escombros con su respectivo derecho de botadero. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la supervisión o la interventoría.	m3	39.85
1.2	Demolición de pavimento asfáltico mecánicamente, espesor variable. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3	20.51
1.3	Corte para junta de piso 5 mm, incluye tratamiento sello de juntas base poliuretano para exteriores	m	200.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA/LLENOS		
2.1	Excavación a máquina o manual de 0-2 m, en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye botada y disposición final de los materiales.	m3	92.49
2.2	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	92.49
3	PAVIMENTO		
3.1	Suministro transporte y colocación de concreto normal para pavimento rígido MR 40, T máximo nominal 1". Según resistencia de diseño- flexión, incluye acelerante a tres días, no incluye refuerzo	m3	23.08
3.2	Suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad. No incluye demoliciones, excavaciones, Subabase y base granular para bacheo que se pagaran en el ítem correspondiente.	m3	30.50
4	ACERO DE REFUERZO		
4.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa, incluye engrasante y todo lo necesario para su correcta instalación	kg	201.88

Desarrollo de las actividades

1. Delimitación de espacios y señalización de obra.

Para dar inicio a las actividades contractuales se procede con la señalización y delimitación del espacio a intervenir para prevenir cualquier tipo de accidente con los transeúntes, delimitación que se llevó a cabo con balizas y maletines plásticos, instalación de cinta peligro.

A continuación, el anexo de toda la muestra fotográfica donde se evidencian la ejecución de actividades



2. Corte y demolición de carpeta asfáltica y concreto hidráulico existente.

Se realiza corte, demolición, de la carpeta de concreto hidráulico, se hace el desbombe, acopio, cargue y botada de escombros.



3. Suministro y colocación Base granular para vía 25cm.

Se realiza el suministro y colocación de base granular con un espesor de 25 cm en los puntos intervenidos y se realiza el ensayo para determinar la densidad de la base granular.




4. Instalación de acero de refuerzo

Se hace la instalación de acero de refuerzo (malla electrosoldada D84).



5. Vaciado de concreto MR40.

Se hace la colocación, vibrado, fraguado y curado de las losas de concreto MR 40.

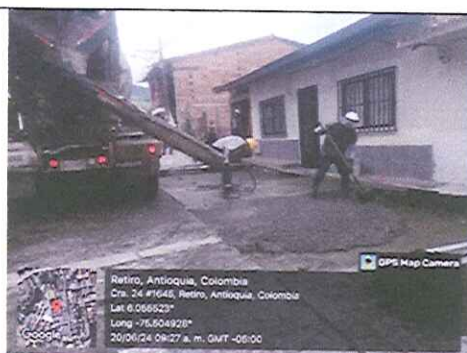

Corte de obra N°2

En la presente acta se realiza el cobro de ejecución de las siguientes actividades que serán facturadas al FONDESER.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No.02	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
1	DEMOLICIONES						
1.1	Demolición de pavimento rígido, de cualquier espesor y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adhéndo, de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final de escombros con su respectivo derecho de botadero. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la supervisión o la interventoría.	m3	39.85	\$ 242.378	9.658.763	14.93	\$ 3.618.703.54
1.2	Demolición de pavimento asfáltico mecánicamente, espesor variable. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3	20.51	\$ 227.958	4.675.419	0.00	\$ -
1.3	Corte para junta de piso 5 mm, incluye tratamiento sello de juntas base poliuretano para exteriores	m	200.00	\$ 33.389	6.677.800	0.00	\$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA/LLENOS						\$ -
2.1	Excavación a máquina o manual de 0-2 m, en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye botadero y disposición final de los materiales.	m3	92.49	\$ 89.967	8.228.551	31.07	\$ 2.844.272.72
2.2	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	92.49	\$ 307.902	28.477.889	28.97	\$ 8.919.931.43
3	PAVIMENTO						\$ -
3.1	Suministro transporte y colocación de concreto normal para pavimento rígido MR 40, T máximo nominal 1". Según resistencia de diseño- flexión, incluye acelerante a tres días, no incluye refuerzo	m3	23.08	\$ 1.346.976	31.088.215	12.53	\$ 16.877.614.02
3.2	Suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad. No incluye demoliciones, excavaciones, Subabase y base granular para bacheo que se pagaran en el ítem correspondiente.	m3	30.50	\$ 1.657.232	50.545.585	0.00	\$ -
4	ACERO DE REFUERZO				0		\$ -
4.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa, incluye engrasante y todo lo necesario para su correcta instalación	kg	201.88	\$ 8.625	1.741.252	84.04	\$ 724.861.54
	SUMIDERO	UNID	1.00	\$ 1.636.969			\$ -
	TOPELLANTAS	UNID	100.00	\$ 82.796			\$ -
					SUBTOTAL		\$ 32.985.383.26
COSTO DIRECTO							\$ 32.985.383
ADMINISTRACION (22%)							\$ 7.256.784
UTILIDAD (5%)							\$ 1.649.269
COSTO TOTAL					179.188.712		\$ 41.891.437

Pólizas

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas, las cuales fueron aprobadas por el municipio para dar inicio al convenio:

Póliza de cumplimiento

Nro.	Aseguradora	Amparos	Fecha de expedición	Vigencia desde	Vigencia hasta
1	Seguros mundial	Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	23-05-2024	15-05-2024	15-11-2024
2		Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		15-05-2024	15-07-2027
3		Estabilidad de obra		15-05-2022	15-05-2096

Póliza de Responsabilidad Civil

Nro.	Aseguradora	Amparos	Límite evento por	Límite vigencia por	Suma asegurada
1	Seguros mundial	Amparo básico, predios labores y operaciones	\$260'000.000	\$260'000.000	\$260'000.000
2		Patronal	\$260'000.000	\$260'000.000	\$260'000.000
3		Contratistas y subcontratistas	\$260'000.000	\$260'000.000	\$260'000.000
4		Vehículos Propios y no propios	\$260'000.000	\$260'000.000	\$260'000.000

Sergio Reyes

Sergio Reyes
Propav

Santiago Cardona

Santiago Cardona
Inversiones y asesorías Balbin

PROPAV S.A.S
NIT 901.415.159-2

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICO
GLADIS ELENA MOLINA SOTO
TP: 98270-T

CERTIFICO

**EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA
LEY 789 DE 2002**

Se da constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Para constancia se firma en la ciudad de Envigado, departamento de Antioquia a los 12 días del mes de julio año 2024.


GLADIS ELENA MOLINA SOTO TP
98270-7

Celular: 3003662669

Emial: gladiselenamolinasoto@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.138.970

MOLINA SOTO

APELLIDOS

GLADIS ELENA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1980

RIOSUCIO
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

11-AGO-1998 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-3106400-00838535-F-0042138970-20160702

0050337513A 1

2743977436

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98270 -T

GLADIS ELENA
MOLINA SOTO
C.C. 42138970
RESOLUCION INSCRIPCION 02 - FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE  107872



FIRMA DEL TITULAR 017647

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLADIS ELENA MOLINA SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42138970 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 98270-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-12, 10:08:08 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 71338939
Período Cotización: mayo de 2024 Período Servicio: junio de 2024

PAGADO 11/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROPAV SAS	Nombre Sucursal	OFICINA PROPAV	Código Sucursal	OFI01
Documento	N1901415159	Dirección	TV 34B SUR #31 E - 09 INT 301		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3229966		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MESA PEREZ SEBASTIAN	Identificación	CC 1037573592		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
			Subtipo Cotización	CO	CE	CA	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	
CC 61336339	SERGIO ANTONIO REYES GUEVARA	01	00																								\$ 337.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Unifamiliares (a Favor)	Incapacidades Saldo ASP	Subtotal Sin Intereses de Mora	Total Intereses de Mora	Total Final
\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 200.000	\$ 50.000	\$ 87.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.000	\$ 337.000

Medellín, 12 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PROPAV SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - CONSTRUCCION, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C91350639	REYES GUEVARA SERGIO ANTONIO	16/05/2024		7R818045	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1152454282	MORENO PATIÑO PAOLA ANDREA	28/05/2024		212163o2	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10375735922419445339

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2024 12:35:39 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.112.146.71, 192.230.104.4, 172.16.42.57



SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-11, 02:01:09 PM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Tipo Planilla:

Periodo Colización: mayo de 2024

Periodo Servicio: junio de 2024

Numéro Planilla: 71343183

PAGADO 11/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROPAV SAS	Nombre Sucursal	PAVIMENTOS	Código Sucursal	02
Documento	NI901415159	Dirección	TV 34B SUR #31 E - 09 INT 301		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3229966		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MESA PEREZ SEBASTIAN	Identificación	CC 1037573592		
Total Afiliados	1	ARL SURA			


II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales		Total			
			Subtipo Cotización	Tipo Cotización	ING	RRT P	TGE	TAL	TAP	CON	VST	SLN	LMA	VAP	VCT	IRP	DIA EPS	DIA AFP	DIA CCFF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA		Aporte RFP	ESM	Aporte Ministerio
Identificación	Apellidos y Nombres																																			
CD 112324232	PAOLA ANDREA MORENO PATRIO	51	00												0	0	0	0	4	\$ 52.000	\$ 52.000			\$ 0	6.950	\$ 1.330.000	\$ 30.500			\$ 325.000	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.500

III. TOTALES

IBIC Pensión	\$ 325.000	IBIC Salud	\$ 0	IBIC Riesgos	\$ 1.300.000	IBIC Cajas	\$ 325.000	Aportes Pensión	\$ 52.000	Aportes Salud	\$ 0	Aportes Riesgos	\$ 90.500	Aportes Cajas	\$ 13.000	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades Arp	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 155.500	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 155.500
--------------	------------	------------	------	--------------	--------------	------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------





PAGADO 11/06/2024



Medellín 12 de Julio del 2024

Señores:
PROPAV S.A.S

Asunto: CERTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD CONTRATO LABORAL

Respetados Señores.

Yo Henry Silgado Ricardo en calidad de Representante legal de HSR CONSTRUCTORES Y ACABADOS S.A.S para el MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022-2024".certifico que el personal relacionado a continuación , seguirán realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía, por lo que sedesvincula del contrato, pero continuará su vinculación laboral, por lo tanto, no se efectúa liquidación.

Así mismo, certifico que, hasta la fecha, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de cumplimiento en las obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) y cajas de compensación familiar.

Como constancia se firma a los, 12 día(s) del mes de julio de 2024.

Relación de los empleados

Nombre y Apellidos	Cedula	Cargo
Henry Salgado Ricardo	1005998901	Representante legal
Licit Yuranis Charrasqui Chaverra	1146441323	Auxiliar SST
Henry Sandoval	7539630	Ayudante
Cristian David Rengifo Arango	1038337501	Ayudante
Edgar López Martínez	1001637360	Ayudante
Hemerson Palma Cordoba	15491021	Ayudante

Henry Silgado Ricardo

1.005.989.901

Firma:

Representante Legal

Razón Social	HSR CONSTRUCTORES Y ACABADOS SAS		
Documento	NI901579149	Dirección	CR 49 #58 - 44
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2510677
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLÍN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	SILGA RICARDO HENRY	Identificación	CC 1005989901
Total Afiliados	7	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Paraiscales		Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldos Cuentas	INO	RET	TAE	TDE	TDT	TAL	VOR	CON	IOE	YAC	NAP	RCT	DMS EPS	DMS MR	Otras CCF	Administradora	IBC Pension	Aporta Pension	Administradora	IBC Salud	Aporta Salud	Tarifa	IBC Riesgo	Aporta Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporta Caja	Aporta SEVIA	Aporta INOP	ESLP	Aporta Ministerio	Total	
CC-101521295	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	01	00		X											0	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 130.000	\$ 20.800	EPFS3010 EPS SURA	\$ 130.000	\$ 5.200	6.960	\$ 130.000	\$ 9.100	(CCFSA) COMFAVA	\$ 130.000	\$ 5.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.300
CC-100589990	HENRY EL GUJO RICARDO	01	00													0	36	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	EPFO307 NAUVELEFS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6.960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCFSA) COMFAVA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC-103337501	CRISTIAN DAVID REVOLFO AMANDO	01	00													0	36	30	(230301) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	EPFO307 NAUVELEFS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6.960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCFSA) COMFAVA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC-116441323	LICIT TURANIS CHARRADUEL CHAVEZA LOPEZ	01	00													0	36	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	EPFS003 SALUD TOTAL EFS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6.960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCFSA) COMFAVA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC-1183251159	IYANN KELLER MENDOZA	01	00	X												0	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	EPFS040 SANJA SALUD	\$ 260.000	\$ 10.400	6.960	\$ 260.000	\$ 118.100	(CCFSA) COMFAVA	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.500
CC-15451021	HENERSON PALMA COREOGRA	01	00	X												-9	115	112	(230301) PORVENIR	\$ 520.000	\$ 83.200	EPBS1010 EPS SURA	\$ 520.000	\$ 20.800	6.960	\$ 520.000	\$ 38.200	(CCFSA) COMFAVA	\$ 520.000	\$ 20.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.000
CC-17536330	HENRY BANCIOVAL	01	00													0	36	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	ESFO07 ASOCIACIÓN MUTUAL SER	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6.960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCFSA) COMFAVA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500

III. TOTALES															TOTAL FINAL
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA
\$ 6.110.000	\$ 6.110.000	\$ 6.110.000	\$ 6.110.000	\$ 977.600	\$ 244.400	\$ 425.400	\$ 244.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.691.600	\$ 0
														\$ 1.691.600	\$ 0



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
NIT 901668611	6	CEO INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 DA 8 96-10
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Banco	
2024-06	76987749	9468875355	2024/07/04	2024/07/11	BANCOLOMBIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE					
EMPLEADO					
No.	Identificación	Nombre	Ingre	de	ta
NOVEDADES					
PENSION					
SALUD					
CCF					
RIESGOS					
PARAFISCALES					
Total Aportes					

SUCURSAL PRINCIPAL (13 Afiliados)												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (13 Afiliados)												
1	CC	1017220185	CANO LAURA									
2	CC	1007960992	DE HORTA RICHARD	X								
3	CC	79879612	ECHAVARRIA GUSTAVO	X								
4	CC	3513270	GARCIA DANAR									
5	CC	71600192	HINCAPIE DELIO									
6	CC	71703358	MONTOYA JHON	X								
7	CC	1128469991	SGORNO EDUAR									
8	CC	103940211	OSFINA BERNARDO	X								
9	CC	102209211	OSFINA DIEGO									
10	CC	1065648923	PASTRANA CAMILO									
11	CC	106378605	RAMOS WILMER	X								
12	CC	1015438700	VILLA EDUIN	X								
13	CC	1001249839	ZAPATA DAVID	X								
Total Afiliados (13)												

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$2,140,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$104,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,144,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$684,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,036,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$1,036,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$633,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	\$633,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$595,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$176,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$302,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$117,100
TOTAL				13	\$4,405,600

ITEM	Nombre de empresa o sub contratista	Nombre Completo	Documento de Identidad	Fecha Ingreso a obra	Fecha Retiro	Afiliación EPS	Afiliación AFP	Afiliación ARL	Afiliación CCF	Contrato	Salario	Cargo	Pago salvo	Liquidación	OBSERVACION
1	INDEPENDIENTE	Pablo Andrés Moreno Pardo	1.152.454.282	28/05/2023		Sura	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Coordinador SST			
2	PROPAV	Sergio Antonio Rojas Guerra	91.360.639	27/05/2024		Sura	Cooperación	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 3.300.000,00	Presidencia de Obra	OK		Continuidad Laboral
3	CAD INGENIEROS SAS	Diego Luis Ospina Garcia	1022092111	27/05/2024	12/05/2024	Sura	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 2.000.000,00	Coordinador Proyectos	OK		Continuidad Laboral
4	CAD INGENIEROS SAS	Laura Milena Cano Hincapié	1017230185	27/05/2024	12/05/2024	Nueva Eps	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 2.000.000,00	Ingeniera	OK		Continuidad Laboral
5	CAD INGENIEROS SAS	Daniel Obispo García Ochoa	9638270	27/05/2024	12/05/2024	Nueva Eps	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 2.000.000,00	Encargado	OK		Continuidad Laboral
6	CAD INGENIEROS SAS	Camilo Andrés Pastana Payares	1066566823	27/05/2024	12/05/2024	Salud Total	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.800.000,00	Resiliario	OK		Continuidad Laboral
7	CAD INGENIEROS SAS	David Ezequiel Zapata Atencio	79679612	27/05/2024	12/05/2024	Sura	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.800.000,00	Resiliario	OK		Continuidad Laboral
8	CAD INGENIEROS SAS	Guillermo Enrique Echavarría Niboyan	1001245839	27/05/2024	12/05/2024	Salud Total	Cooperación	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente	OK		Continuidad Laboral
9	CAD INGENIEROS SAS	Edwin Andrés Osorio	112940591	27/05/2024	12/05/2024	Nueva Eps	Cooperación	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Oficina Varas	OK		Continuidad Laboral
10	CAD INGENIEROS SAS	Richard Alexander de Hoyta Villa	1007990392	27/05/2024	12/05/2024	Sura	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente de Obra	OK		Continuidad Laboral
11	CAD INGENIEROS SAS	Werner Steven Paredo Echavarría	1063786005	27/05/2024	12/05/2024	Nueva Eps	Protección	Sura	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente	OK		Continuidad Laboral
12	HR	Herry Salgado Ricardo	102959901	12/05/2024		Nueva Eps	Cooperación	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Representante legal			
13	HR	Licet Yurana Charrasquel Chaverra	1145441133	12/05/2024		Salud Total	Protección	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	SST			
14	HR	Herry Sandoval	7539630	12/05/2024		Mueller	Protección	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente			
15	HR	Cristian David Rengifo Arango	1038337501	12/05/2024		Nueva Eps	Protección	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente			
16	HR	Edgar Lopez Martinez	1001837360	14/05/2024		Eps Sura	Protección	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente			
17	HR	Henserson Palma Corboba	15491021	20/05/2024		Eps Sura	Protección	Ava Copalita	Confianza	Ora Labor	\$ 1.300.000,00	Asistente			
