

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".
----------------	--

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,54%	96,39%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	\$ 2.389.542,95	\$ 30.547.486,11	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 31.691.551,11

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERAGROPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza aseo a la obra y se den dan por terminadas las actividades en esta sede.


IMAGENES AVANCE



Actividades finalizadas



Actividades finalizadas

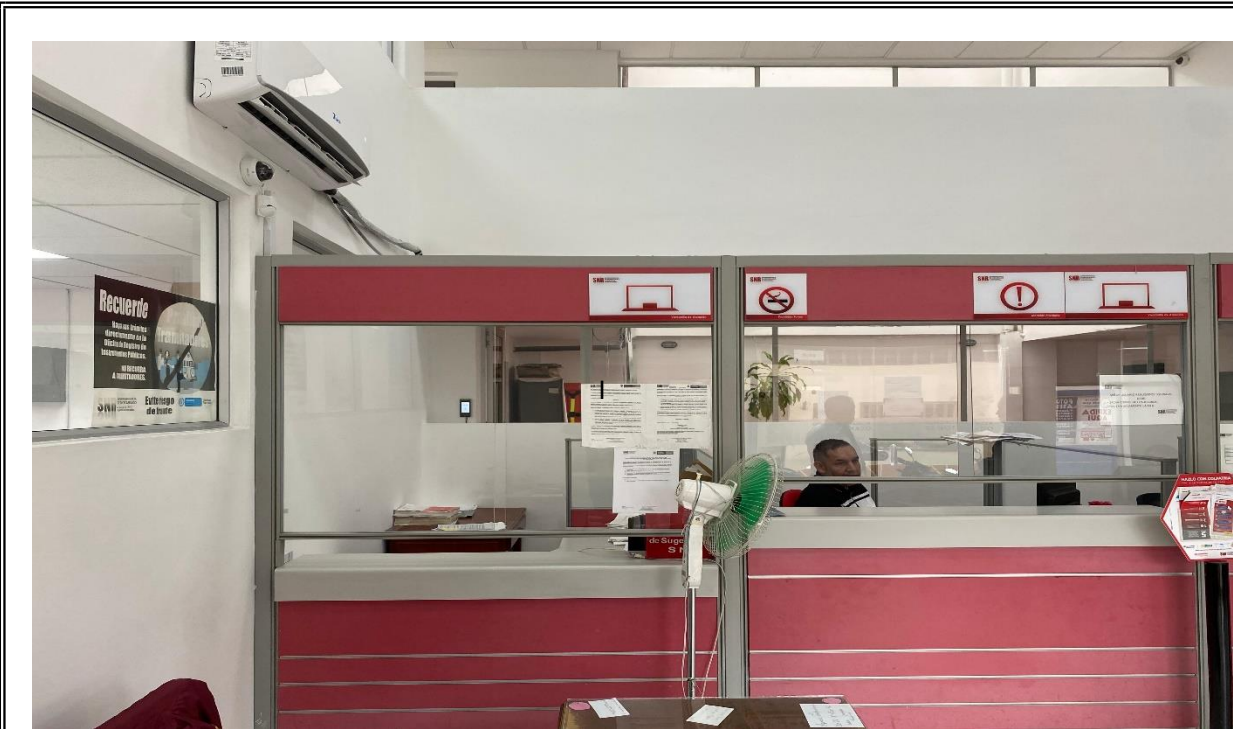

Actividades finalizadas



Actividades finalizadas



Actividades finalizadas



Actividades finalizadas

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma <u>OMAR ANDRES CAMPOS</u>
	Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.
	Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

INFORME SEMANAL

Semana Número: 12Del: 12 de febrero de 2024Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTROSEDE PACHOSUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

Obra programada (%)	SEMANAL10,23%	ACUMULADO93,28%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL0,00%	ACUMULADO93,12%
Valor básico de la Obra	\$ 7.195.450,68	\$ 65.610.130,95	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 65.497.592,13

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:

CONSORCIO SEDE MARSAP

Contrato No. 2391 de 2023

Valor Inicial: 600.182.493,03

Valor Actualizado: 600.182.493,03

Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024

Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023

Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024

Interventor:

CONSORCIO INTERAGRUPACIONES

Contrato No. 2528 de 2023

Valor Inicial: 106.896.795,60

Valor Actualizado: 106.896.795,60

Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024

Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023

Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA


IMAGEN OFICINA

AVANCE

Durante la semana de reporte, se terminan las actividades subsanadas por el contratista y se realiza aseo a la sede, se dan por terminadas las actividades

Comentario: Remate detalles de pintura zonas de circulación.

Comentario: Remate detalles de pintura Oficina Registrador.

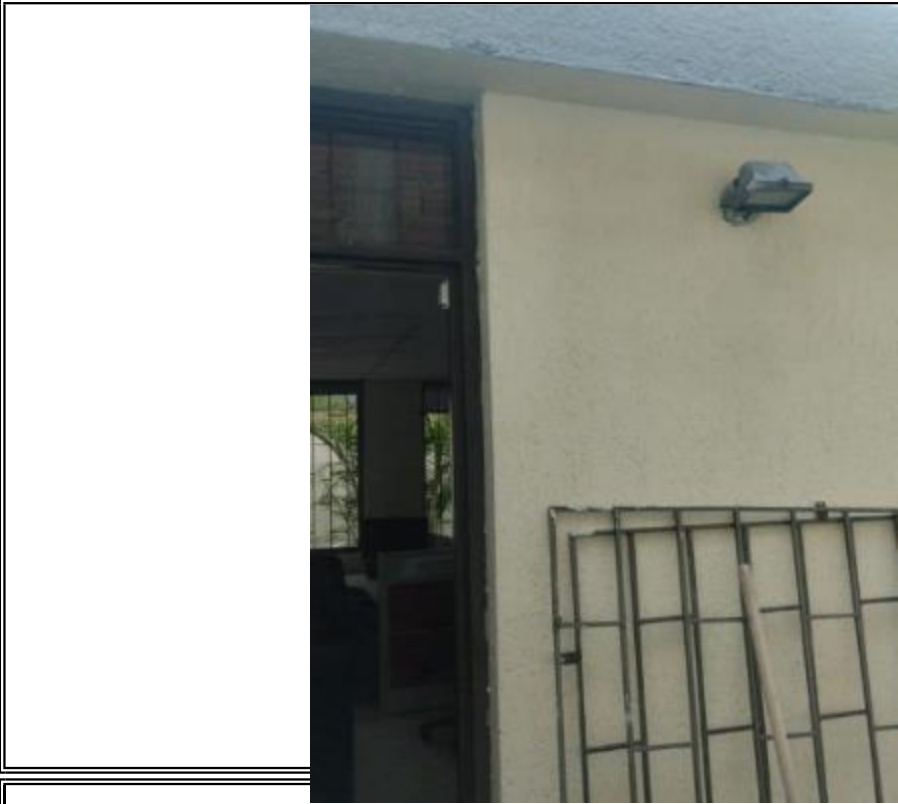

Comentario: Remate detalles de pintura zonas de circulación.




Comentario: Suministro e instalación de sanitarios. Aplicación de boquilla a aparatos sanitarios y enchape cerámico de piso.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro Oficinas Administrativas.



Comentario: Limpieza de canales de cubierta.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".</p>

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,04%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	95,57%
Valor básico de la Obra	\$ 1.998.993,32	\$ 28.394.791,42	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 27.136.902,16

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERAGROPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede.

Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanación de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en cielo rasos.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND



Comentario: Limpieza y desmanche de pisos en gres en Áreas: Administrativa.



Comentario: Impermeabilización de viga canal de cubierta.



Comentario: Impermeabilización de viga canal de cubierta.



Comentario: Impermeabilización de muros en ladrillo en Áreas: Oficinas Registrador.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma <u>OMAR ANDRES CAMPOS</u> Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GUADUAS SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".
---------	--

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,05%	69,86%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	\$ 9.305.415,89	\$ 53.948.245,15	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 77.223.368,38

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede.


IMAGENES AVANCE



Comentario: Remate de acabados y de enchape cerámico de piso y pared en Cuarto de Aseo, con observaciones subsanadas por parte del Contratista.



Comentario: Suministro e instalación mobiliario de madera en área de Cocina.

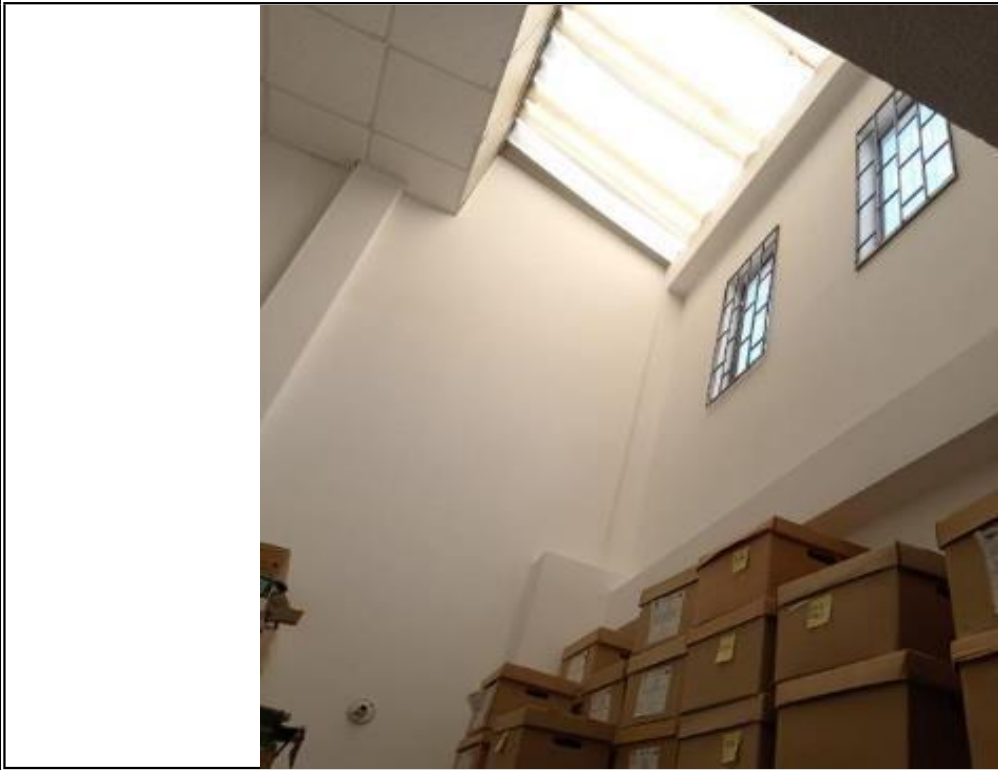

Comentario: Remate de acabados en Área de Bodega - Archivo, con observaciones subsanadas por parte del Contratista.



Comentario: Remates en cilelo raso de Cocina con observaciones subsanadas por parte del Contratista.



Comentario: Emboquillado enchape cerámico de pared en Área de Lavadero.



Comentario: Remates en cilelo raso de Pasillo con observaciones subsanadas por parte del Contratista.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUEQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".</p>

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,06%	89,41%	Obra Física Ejecutada (%)	1,99%	91,06%
Valor básico de la Obra	\$ 10.548.959,02	\$ 78.207.498,03	Valor básico de la Obra	\$ 1.740.665,71	\$ 79.650.763,57

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERAGROPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se culminan observaciones, se realiza aseo y se dan por terminadas las actividades en esta sede



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.

Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario:Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones. Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>

INFORME SEMANAL

Semana Número: 12

Del: 12 de febrero de 2024

Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE CÁCHIRA

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

Obra programada (%)	SEMANAL	0,06%	ACUMULADO	100,00%
Valor básico de la Obra	\$	17.547,99	\$	29.246.647,32

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SEDE MARSAP

Contrato No. 2391 de 2023

Valor Inicial: 600.182.493,03

Valor Actualizado: 600.182.493,03

Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024

Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023


Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024

 | | | | | | |---------------------------|---------|--------------|-----------|---------------| | Obra Física Ejecutada (%) | SEMANAL | 9,55% | ACUMULADO | 91,12% | | Valor básico de la Obra | \$ | 2.793.054,82 | \$ | 26.649.545,04 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: Interventor: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES Contrato No. 2528 de 2023 Valor Inicial: 106.896.795,60 Valor Actualizado: 106.896.795,60 Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023 Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024 Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023 Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024 || IMAGEN OFICINA | IMAGEN OFICINA |

AVANCE

Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable. Impermeabilización de viga canal de cubierta, se realiza aseo y se culminan las actividades en esta sede



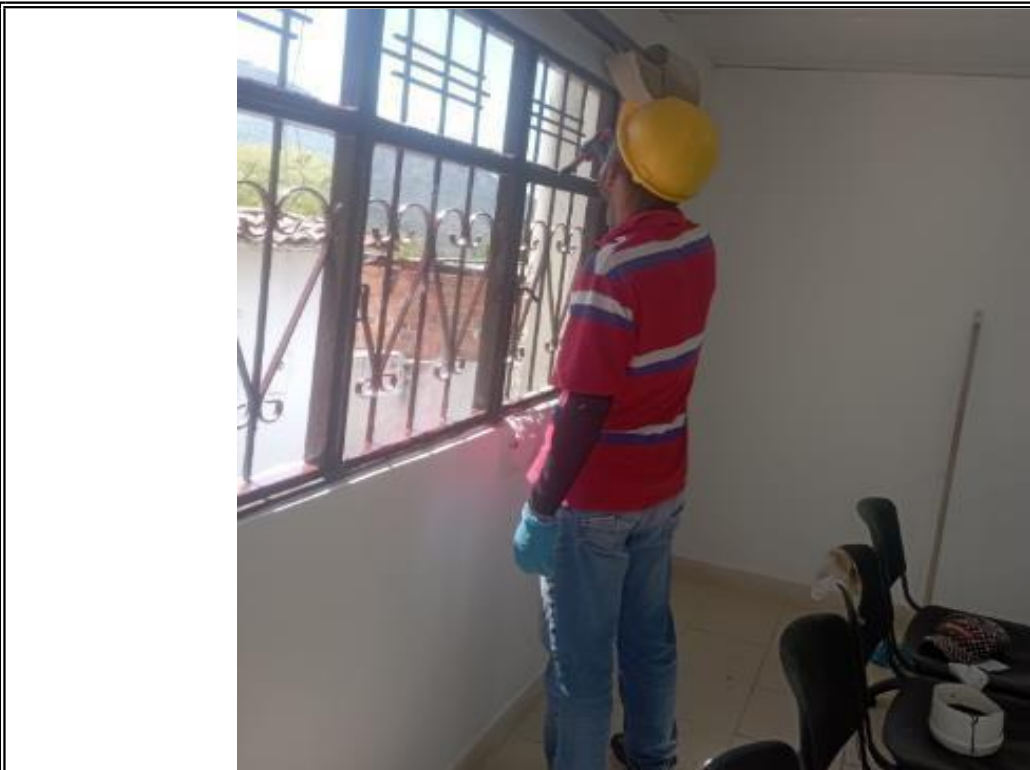

Comentario: Aplicación pintura esmalte marcos de ventanas área de atención al usuario.



Comentario: Resane, aplicación de estuco y pintura a superficies de fachada principal.



Comentario: Emboquillado enchape cerámico de piso sobre circulaciones.



Comentario: Preparación superficie de cubierta para aplicación de sistema impermeabilizante.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ESPINAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".</p>

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	28,32%	85,50%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	\$ 17.388.846,21	\$ 52.498.105,63	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 61.401.293,13

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA


AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en superficies de muros y cielos rasos de los baños, luego de la instalación de aparatos sanitarios y de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.

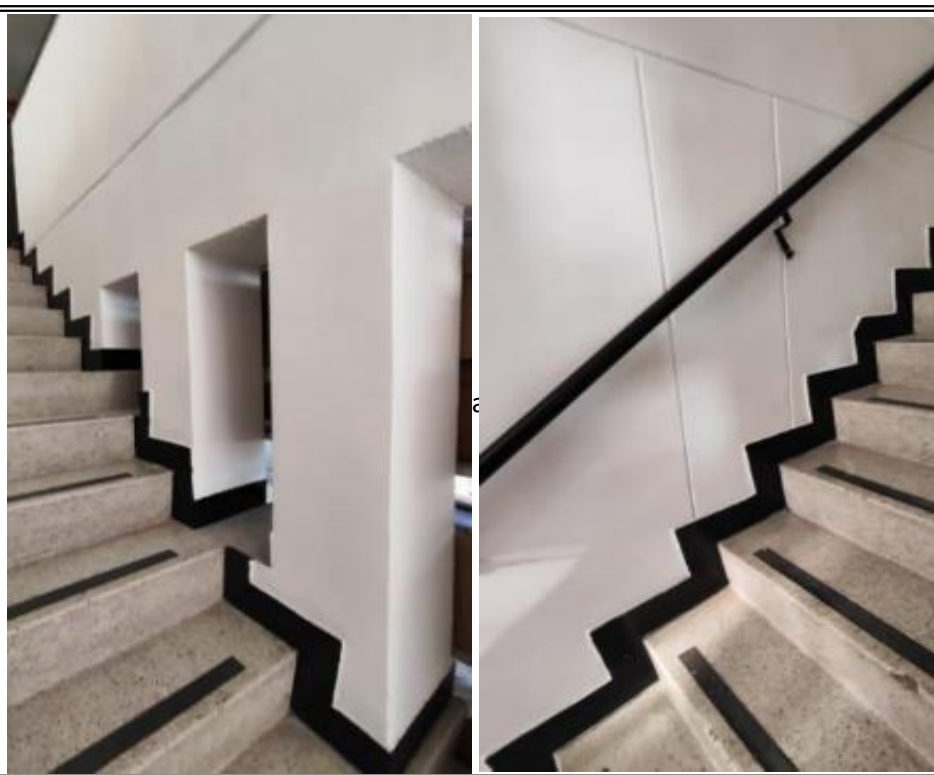

Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en áreas de escalera, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Interventoría verifica estado de instalación de luminarias en panel LED 60x60cm, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Suministro e instalación de aparatos sanitarios en Baños.



Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en áreas de Cocina, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Suministro e instalación de malla de protección (de palomas) para fachada principal.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

Semana Número: 12 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHAPARRAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".</p>

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,70%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	\$ 1.594.311,87	\$ 27.970.383,68	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 27.970.383,68

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF		
Contrato No.	2391 de 2023		
Valor Inicial:			600.182.493,03
Valor Actualizado:			600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024		

Interventor:	CONSORCIO INTERGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA**AVANCE**

Actividades Finalizadas en esta sede.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en circulaciones internas del Piso 1.



Comentario: Aplicación de acabados y pintura a superficies de cielo raso y paredes de la oficina del Registrador.




Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en Área de Atención al Público. Acopio provisional y retiro de material.



Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.



Comentario: Aseo General, desmanche de pisos en tablta cerámica de gres en área de escalera.

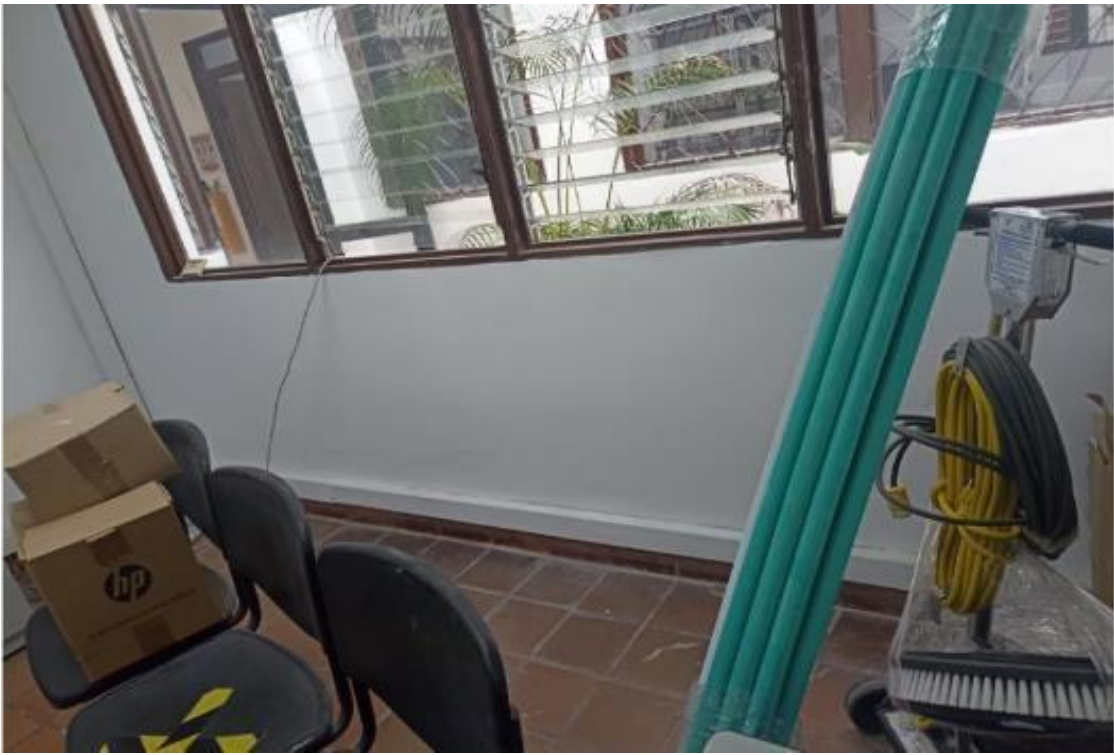

Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma <u>OMAR ANDRES CAMPOS</u>
	Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.
	Matrícula No.:A25012004-80055117 CND



Comentario: Instalación de cubierta faltante en sector Bodega.



Comentario: Emboquillado de enchape cerámico de piso e instalación de sifón de piso en Área de Cocina.




Comentario: Aplicación remates de acabados de fachada.



Comentario: Suministro e instalación flanche de cubierta en sector Bodega.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

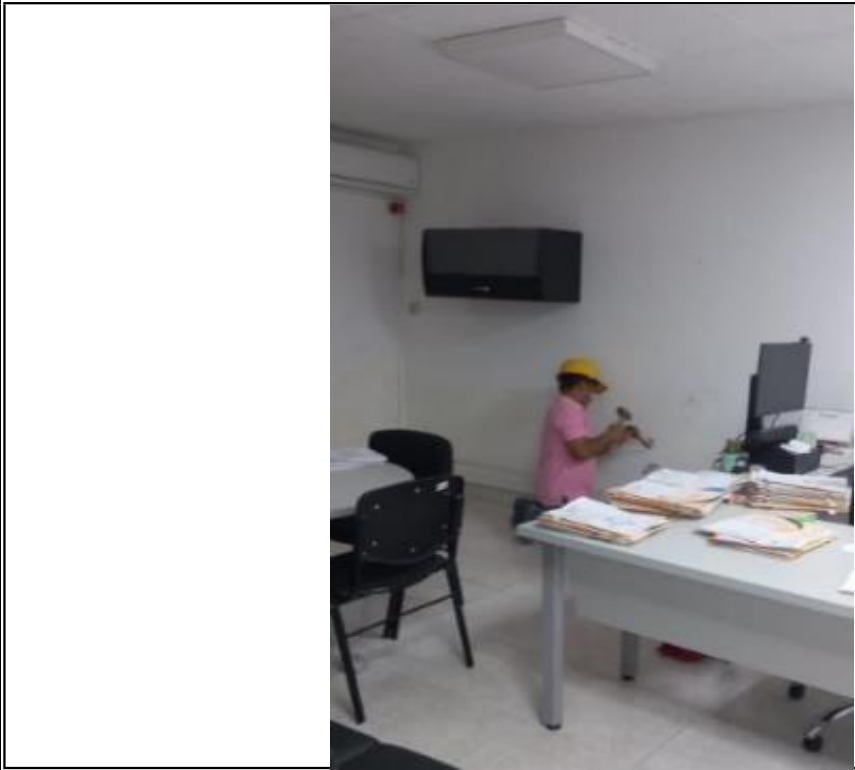

Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en Oficina del Registrador.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de pared en Patio Posterior.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en Cocina.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en área de Archivo.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>
