

INFORME MENSUAL No. 3

**ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
"CORPAMAG".**

**OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS
CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PERIODO: 1 DE MAYO DE 2024 HASTA 31 DE MAYO DE 2024

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	4
2.1	DESCRIPCION GENERAL	4
2.2	LOCALIZACIÓN	5
2.2.1	Localización Especifica del Proyecto	6
2.2.2	Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras	7
2.3	ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	10
2.4	CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO 2024	16
3	ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	17
3.1	CONTRATO DE OBRA	17
3.1.1	INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023 ..	17
4	ACTIVIDADES DE OBRA	17
4.1	ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO	17
4.1.1	INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO	20
4.1.2	INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO	20
4.1.3	PERSONAL DE OBRA	20
4.1.4	EQUIPO DE OBRA	21
4.1.5	ACTIVIDADES REALIZADAS	21
4.1.6	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION	22
4.1.7	BITÁCORA DE OBRA	23
4.1.8	CONTROL DE CALIDAD	23
4.1.9	CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO	24
4.1.10	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	24
4.1.11	CONTROL DE PERSONAL	24
4.2	ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	24
4.2.1	CONTROL DE PÓLIZAS	24
4.2.2	CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES	25
4.2.3	CORRESPONDENCIA	25
4.2.4	ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS	27
4.2.5	REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	27
4.3	ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL	27
4.4	ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO	28
4.4.1	ACTAS PARCIALES DE COBRO	28
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024.	17
Tabla 2. Informes Semanales.	20
Tabla 3. Personal mínimo requerido.	20
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.	21
Tabla 5. Relación Volquetas de Obra.	21
Tabla 6. Relación de Equipos de Topografía.	21
Tabla 7. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.	22
Tabla 8. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.	25
Tabla 9. Relación de correspondencia durante el periodo.	27
Tabla 10. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.	28

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.	6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.	7
Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.	9
Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.	9
Ilustración 5. Registro Topográfico - Rio Gaira. Fuente: Propia.	10
Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia.	13
Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.	14
Ilustración 8 Oferta económica correspondiente a los periodos 2023 y 2024.	16
Ilustración 9 Encuentro con la comunidad – Levantamiento de actas de vecindad. Fuente: Propia.	19
Ilustración 10. Socialización del proyecto, Rio Gaira – Auditorios de Centro recreativo de Coedumag. Fuente: Propia.	19

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en la las semanas del mes. Fuente: Propia.	22
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.	23
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.	23
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.	24
Gráfico 5. Avance Financiero de Ejecución Vs Programado Mensual. Fuente: Propia.	28

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**. El presente documento corresponde al informe mensual No. 3, este contiene la descripción de las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y 31 de mayo de 2024, en cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría. El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas. De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe, representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.

Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**.

El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.

Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud norte y 74° 12' 06" de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km², de los cuales 55.10 Km² pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km² a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



2.2.1 Localización Específica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir, serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para el año **2024** el río escogido fue el **RIO GAIRA**. El tramo de intervención va desde la desembocadura en el Rodadero hasta donde se tenga proyectado.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

RIO GAIRA

La degradación hidráulica y ambiental de este río, está asociada principalmente en la cuenca baja, donde se encuentra asentada la mayor parte de la población urbana; esto se ha generado por diferentes procesos históricos de desplazamiento y a su vez de invasión de manera no planificada en terrenos que generalmente no cuentan con condiciones físicas, ambientales, geográficas. Estas comunidades han invadido la cuenca de este importante afluente, año tras año ante situaciones ambientales relacionada con las épocas de inviernos torrenciales de la región son vulnerables a los procesos de inundación por los desbordamientos del río, ocasionándoles afectaciones en sus viviendas.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Sumado a eso, está la ausencia de cultura ambiental por parte de las poblaciones asentadas en la ronda hídrica del río, evidenciado en el manejo de las excretas y desechos arrojados permanentemente al cauce; situación que muestra claramente la falta de pertenencia de las comunidades asentadas en la cuenca del río, lo que además de contribuir a la pérdida de la capacidad hidráulica, contribuye al deterioro paisajístico de este sector de la ciudad y ocasiona que las comunidades aledañas a la zona tengan una percepción negativa de este afluente, por otra parte este cumulo de basuras y desechos impactan negativamente en el ecosistema marino.

Es preciso indicar que como consecuencia de factores meteorológicos como lo son grande precipitaciones o deshieles, el caudal de los ríos aumenta repentinamente produciendo desbordamientos e inundaciones, afectando a las poblaciones aledañas. Estas situaciones climáticas cuando los ríos aumentan su cauce y arrastran de aguas arriba gran cantidad de lodos que se alojan en las desembocaduras, ocasiona sedimentación de las cuencas bajas, en el caso del río Gaira estas cantidades de sedimento interrumpen la interconexión natural entre este afluente y el sistema marino, lo que ocasiona un detrimento en la fauna del ecosistema estuarino de este importante sector, evidenciándose en el detrimento de la actividad pesquera en estos ecosistemas y por ende afectando económicamente a la población dedicada a esta actividad.

Es por eso que la población ha percibido el río como un problema durante años, ya que este se encuentra asociado a procesos como las inundaciones que año tras año se sufren en la ciudad. El invierno y la deforestación en la parte media de la cuenca, es una de las causas importantes de las inundaciones, la ruptura de boquetes y bermas que permiten el paso del agua hacia áreas residenciales provocando la pérdida de los mismos y el direccionamiento del agua hacia las comunidades dejando como resultado pérdidas materiales del patrimonio de la población.

Debido a lo anterior, se presentan entonces cambios del uso del suelo en áreas de uso público, reduciendo las posibilidades de restauración ecológica y conservación, comprometiendo la viabilidad de objetivos de protección ligados a las comunidades ubicadas en la zona de intervención.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.


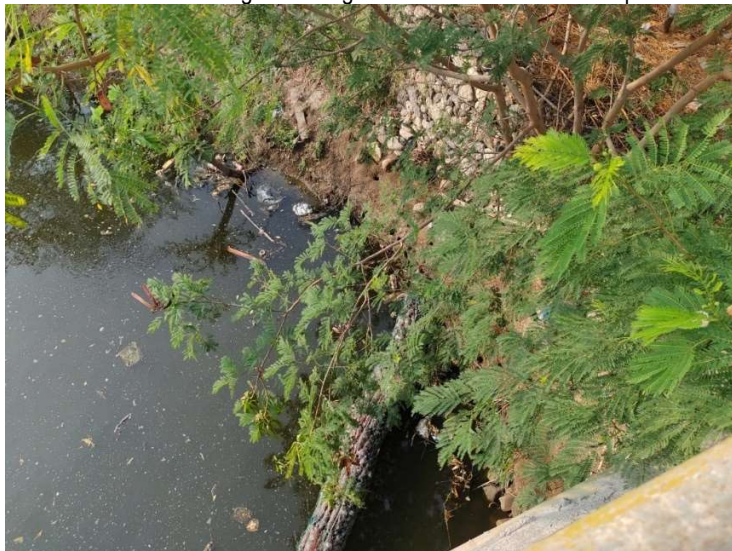


Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 5. Registro Topográfico - Rio Gaira. Fuente: Propia.

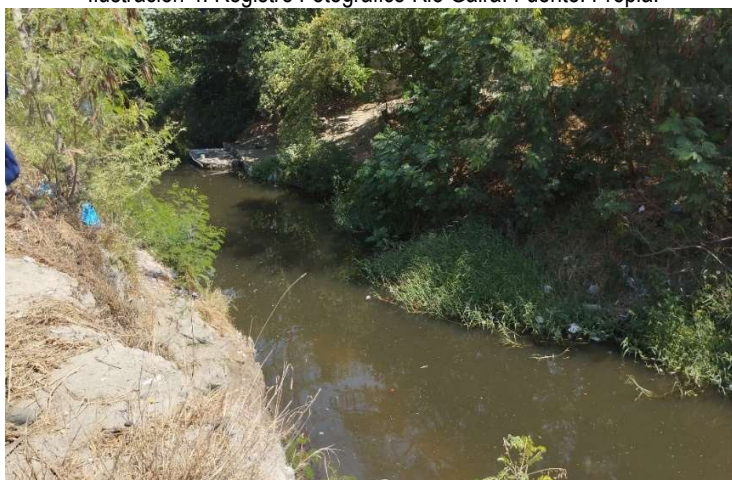

2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”** para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.15 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio.

Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.

Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención.

- **COMPONENTE TOPOGRÁFICO**

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y $e=10N$, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ± 0.80 m.

- **COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO**

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.

De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.
2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- **COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO**

Para estimar los caudales picos del Río Gaira, se generará modelo lluvia-escorrentía; que permita, con base en las características de cuenca y de las lluvias característica de diferentes períodos de retorno, estimar el caudal de pico de escorrentía para cada de estos períodos. Para tal efecto, se emplearán herramientas informáticas.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Río Gaira. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023


La cuenca cuenta con aproximadamente 10.875 hectáreas. La longitud del río Gaira es de 33,95 kilómetros y tiene un caudal promedio anual de 2,7 m³/s a la altura de la estación MINCA ubicada en el centro poblado del mismo nombre.

Los principales afluentes del río Gaira son: quebrada El Palmar, quebrada Las Mercedes, quebrada Agua Dulce, quebrada La Macanilla, entre otras. Sus principales centros poblados son Minca, Gaira y el Rodadero.

• COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

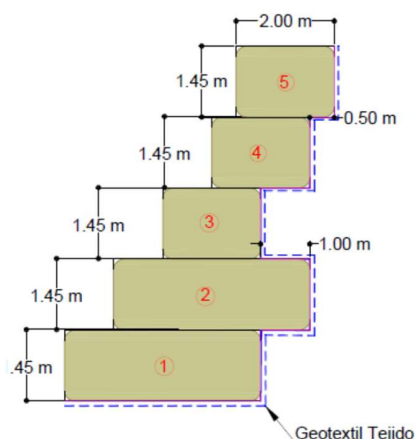

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.
- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,
- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el río, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.
- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.
- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

2.4 CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO 2024

Ilustración 8 Oferta económica correspondiente a los periodos 2023 y 2024.

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA NIT. 800.099.287-4				
FORMATO OFERTA ECONOMICA						
LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023 "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"						
AÑO 2023						
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 131,639,004.00
1.1	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	3.0	\$ 43,879,668.00	\$ 131,639,004.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 131,639,004.00
Aministración (23%)						\$ 30,276,971.00
Imprevistos (2%)						\$ 2,632,780.00
Utilidad (5%)						\$ 6,581,950.00
IVA (19%) sobre la Utilidad						\$ 1,250,571.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 40,742,272.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL						\$ 172,381,276.00
II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 169,284,398.00
3.1	P - 3.5	Estudios y Diseños de Parque Lineal en áreas disponibles de Ronda Hidrica.	Glb	1.00	\$ 169,284,398.00	\$ 169,284,398.00
IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA						\$ 32,164,035.62
VALOR TOTAL OBRA AÑO 2023						\$ 373,829,710.00
AÑO 2024						
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						\$ 29,672,424.00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	\$ 3,709,053.00	\$ 29,672,424.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 5,660,158,685.10
2.1	P - 2.1	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	67,732.23	\$ 15,543.18	\$ 1,052,774,242.69
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	67,732.23	\$ 40,034.60	\$ 2,711,632,735.16
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12.0	\$ 46,500,598.00	\$ 558,007,176.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6,000.0	\$ 151,008.00	\$ 906,048,000.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2,250.0	\$ 31,202.00	\$ 70,204,500.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7,031.25	\$ 43,292.00	\$ 304,396,875.00
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5,156.25	\$ 11,073.00	\$ 57,095,156.25
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 5,689,831,109.10
Aministración (23%)						\$ 1,308,661,155.00
Imprevistos (2%)						\$ 113,796,622.00
Utilidad (5%)						\$ 284,491,555.00
IVA (19%) sobre la Utilidad						\$ 54,053,395.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 1,761,002,727.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL						\$ 7,450,833,836.10
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 881,356,151.00
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	\$ 246,260,339.00	\$ 246,260,339.00
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	12.0	\$ 35,256,288.00	\$ 423,075,456.00
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Manzanares.	und	1.0	\$ 212,020,356.00	\$ 212,020,356.00
IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA						\$ 167,457,668.69
VALOR TOTAL OBRA AÑO 2024						\$ 8,499,647,656.00

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	CHESMAN HOBLET BARROS PIMENTA
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	2024
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	RIO GAIRA
VALOR DEL PERIODO:	\$ 8.873.477.366,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

Se realizaron actividades referentes a la recolección de datos para los ajustes a estudios y diseño. Se adelanto trabajo de campo, toma de muestras, recolección de datos y procesamiento de información de oficina. Estos informes tienen como propósito el ajuste a los estudios y diseños de proyecto para ajustar el balance del proyecto para su inicio en labores de obra.

Semana No. 7 (29/04/2024 - 5/05/2024)

1. Se continua con la gestión para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto.
2. El día 30 de abril se realizó un comité de interventoría y obra, donde se realizó una revisión del estado actual del proyecto en lo administrativo y obra.
3. Se continua con la socialización del proyecto a través de la recolecta de actas de vecindad.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Semana No. 8 (6/05/2024 - 12/05/2024)

1. Se continua con la gestión para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto.
2. Se continua con la socialización del proyecto a través de la recolecta de actas de vecindad.
3. El día 7 de mayo se realizó un comité virtual con el Supervisor Corpamag, Interventoría y obra, donde el tema central que se tiene es la implementación del componente de la sensibilización Ambiental.

Semana No. 9 (13/05/2024 - 19/05/2024)

1. Se continúa con la gestión para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto.
2. Se continúa con la recolección de actas de vecindad.

Semana No. 10 (20/05/2024 - 26/05/2024)

1. Se continúa con la gestión para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto.
2. Se continúa con la recolección de actas de vecindad.
3. El 22 de mayo se realizó un comité en las oficinas de la subdirección técnica de la entidad contratante donde se revisó, el estado actual de la obra, la verificación del alcance y la socialización general del proyecto.

Semana No. 11 (27/05/2024 - 2/06/2024)

1. Se continúa con la gestión para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto.
2. Se continúa con la recolección de actas de vecindad.
3. El 30 de mayo se realizó un comité entre obra e interventoría donde se tomaron en cuenta observaciones para la socialización.
4. El 31 de mayo se realizó la socialización del proyecto a la comunidad en general, entidades públicas y prestadores de servicio.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 9 Encuentro con la comunidad – Levantamiento de actas de vecindad. Fuente: Propia.



Ilustración 10. Socialización del proyecto, Rio Gaira – Auditorios de Centro recreativo de Cooedumag. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

En lo que sigue el periodo se ha estado realizando el trabajo del procesamiento de la información obtenida en campo para la realización de los entregables junto con el balance y los diseños.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 7	INFORME SEMANAL No.7 (29ABR-5MAY)
SEMANA 8	INFORME SEMANAL No.8 (6MAY-12MAY)
SEMANA 9	INFORME SEMANAL No.9 (13MAY-19MAY)
SEMANA 10	INFORME SEMANAL No.10 (20MAY-26MAY)
SEMANA 11	INFORME SEMANAL No.11 (27MAY-2JUN)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el **“Anexo No.1 Informes Semanales”** del presente Informe.

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo requerido para el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Residente de Obra	Mayra Alejandra Del Rio Coronell
Especialista Ambiental	Rosa Elvira Villamizar Sierra
Especialista Hidráulico	Danilo Gregorio Rodríguez Correa
Topógrafo	Angela María Fernández Fajardo
Trabajador Social	Andrés Felipe Giraldo Pérez
Profesional SST	Ana Milagro Marengo Caballero

Tabla 3. Personal mínimo requerido.

(Ver Anexo N.o.2 Personal de Obra)

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP
Excavadora	CATERPILLAR	320C-06	138HP
Excavadora	CATERPILLAR	320C-07	138HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

VOLQUETAS:

MARCA	PLACA	CAPACIDAD
CHEVROLET	SLE923	20Ton
KENWORTH	TVA708	15Ton
CHEVROLET	TVA536	15Ton
MACK	TVA460	19,9Ton
KENWORTH	TVD190	16,8Ton
INTERNATIONAL	UAP243	19Ton
FOTON	KNL544	15,5Ton
FOTON	KNL545	15,5Ton
FOTON	KNL546	15,5Ton
FOTON	KNL549	15,5Ton
FOTON	KNL550	15,5Ton
FOTON	KNL551	15,5Ton

Tabla 5. Relación Volquetas de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Estación Total	REF ES -105/PSLBG	TOPCON
Nivel Automatico	REF AP-281 PENTAX	PENTAX
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX
Estación Total	GTS-102N	TOPCON

Tabla 6. Relación de Equipos de Topografía.

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Hasta el momento no se han realizado actividades contractuales. Las labores que se tienen adelantadas son de carácter técnico y administrativo.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


Durante el periodo correspondiente al tercer mes, no se han iniciado trabajo de campo.

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMA DO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO O ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
3	29 DE ABRIL DE 2024	5 DE MAYO DE 2024	0.36	1.94	0	0	-1.94
4	6 DE MAYO DE 2024	12 DE MAYO DE 2024	1.17	3.11	0	0	-3.11
5	13 DE MAYO DE 2024	19 DE MAYO DE 2024	1.34	4.46	0	0	-4.46
6	20 DE MAYO DE 2024	26 DE MAYO DE 2024	1.93	6.39	0	0	-6.39
6	27 DE MAYO DE 2024	2 DE JUNIO DE 2024	2.05	8.44	0	0	-8.44

Tabla 7. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en la las semanas del mes. Fuente: Propia.

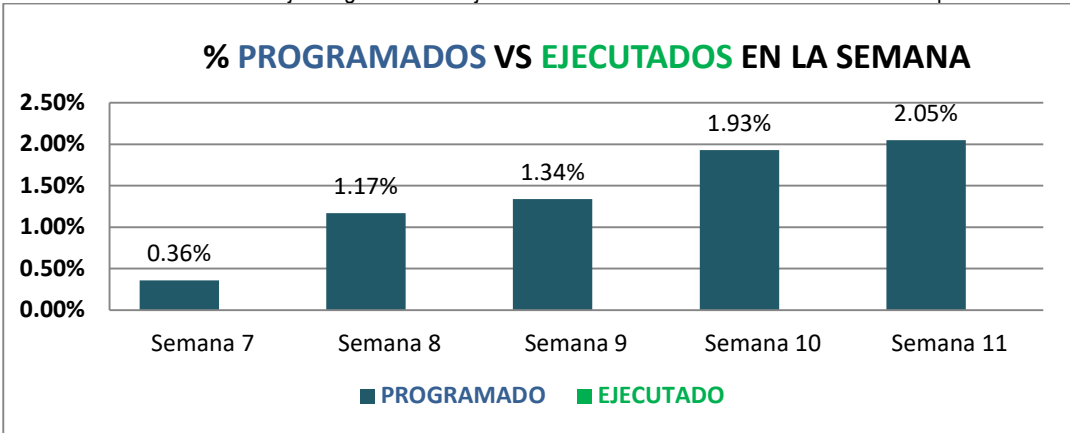

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.


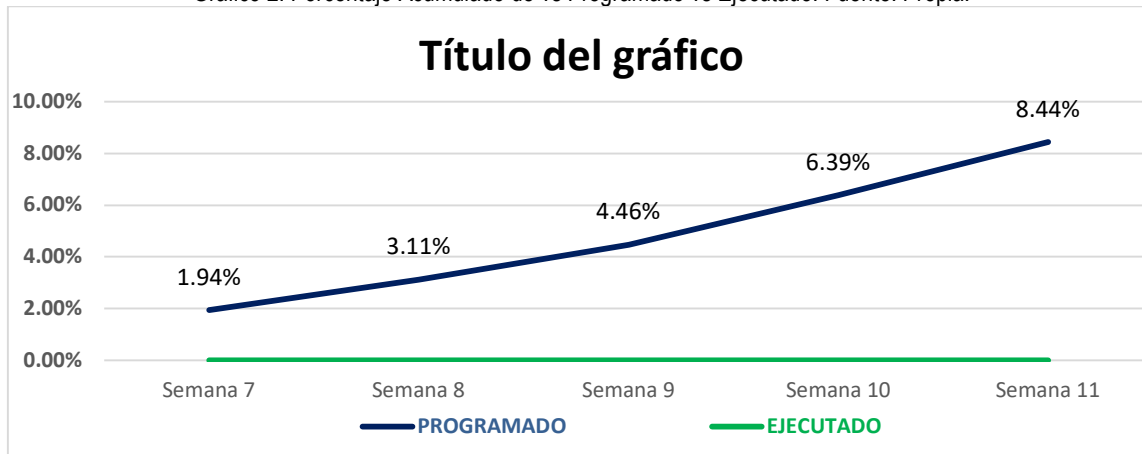


Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

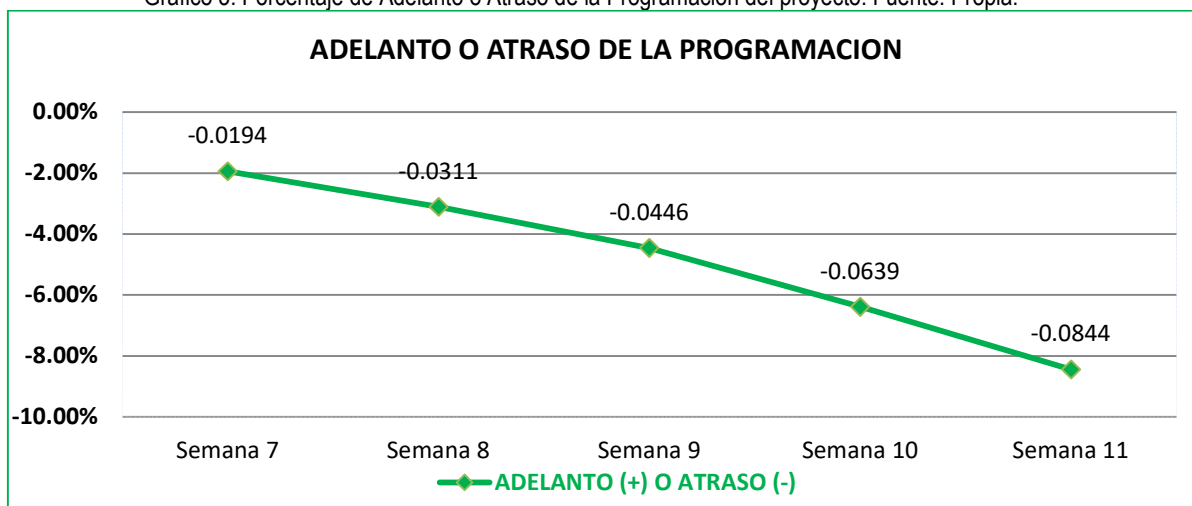

4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al tercer mes, no se han iniciado trabajo de campo, solo administrativas. La Bitácora se relaciona en el **“Anexo No.3 Bitácora de Obra”**.

4.1.8 CONTROL DE CALIDAD


Durante el periodo correspondiente al tercer mes no se han realizado pruebas de calidad para las actividades contractuales, debido a que no se han iniciado las labores de campo en el periodo.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.9 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024. Se relaciona la información registrada en el **“Anexo No.4 Estado General del Tiempo”**.

Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

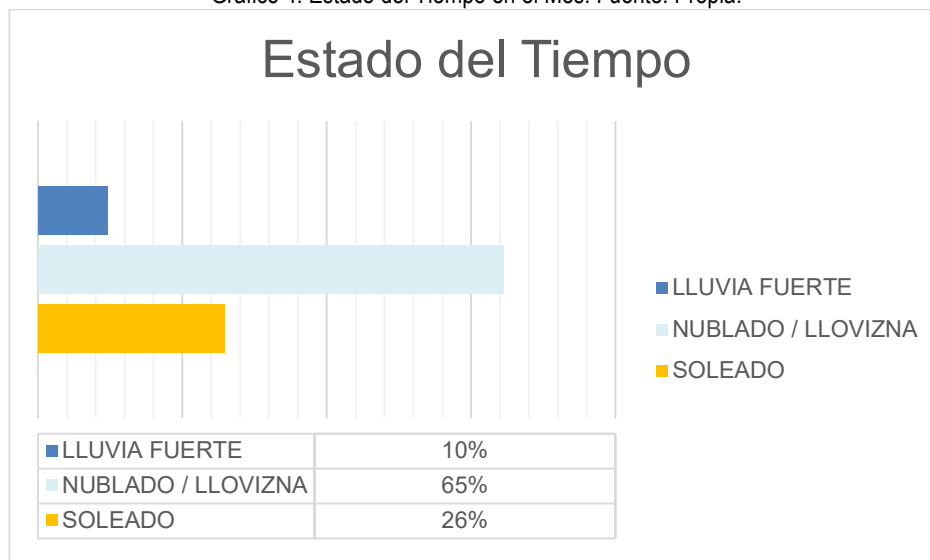

4.1.10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el **“Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra”**, adjunto en los anexos del presente informe, cabe resaltar que durante este periodo no se ejecutaron actividades en campo.

4.1.11 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el **“Anexo No.6 Seguridad social del personal”** adjunto en los anexos del presente informe.

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. DE POLIZA	CG-1051454		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO	19/03/2024	30/09/2025	\$ 887.347.736,60
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	13/03/2028	\$ 443.673.868,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2025	13/03/2027	\$ 175.177.646,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101050575		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
CONTRATISTA SUBCONTRATISTAS Y	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00

Tabla 8. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.6**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 1 DE MAYO DE 2024 HASTA 31 DE MAYO DE 2024			
FECHA	REFERENCIA	CONSECUTIVO	ASUNTO
2/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-013	Respuesta Oficio ISM-020-2024 - Revisión Cambio Hojas de Vida Especialista Ambiental
6/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-014	Respuesta Oficio ISM-015-2024 - Revisión Cambios Hojas de Vida Personal
22/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-015	Respuesta Oficio ISM-022-2024 – Solicitud Programa de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental
23/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-016	Respuesta Oficio ISM-028-2024 - Solicitud Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
23/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-017	Directorio de Actores
23/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-018	Lugar de Socialización del Proyecto
25/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-019	Planos de topografía y Diseño Rio Gaira
30/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-020	Invitación a socialización del proyecto que tiene por objeto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" – Ejecución Vigencia 2024
30/05/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-021	Invitación a socialización del proyecto que tiene por objeto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

			Y AMBIENTALES” – Ejecución Vigencia 2024
--	--	--	---

Tabla 9. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- **7 de mayo de 2024**, Se realizó un comité virtual con el supervisor de Corpamag, personal de Obra e Interventoría, donde se realiza a retroalimentación de cómo se va implementar tanto las medidas de manejo ambiental como las jornadas de sensibilización del componente ambiental.
- **23 de mayo de 2024**, Se realizó un comité de obra e interventoría y la subdirección técnica de la entidad. Se realizó una exposición del estado actual de obra y de la condición de los ajustes a estudios y diseños. Se dio la información del alcance del proyecto y se dio el aval para la organización de la socialización del proyecto.
- **30 de mayo de 2024**, Se realizó un comité de obra e interventoría. Se hizo un repaso de los pendientes y se verificó la información que se impartiría en la socialización del proyecto.
- **31 de mayo de 2024**, Se realizó la socialización del proyecto. Se invitó a la comunidad del proyecto, entes territoriales, prestadoras de servicio y fundaciones alrededor del río Gaira.


4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL

No se realizaron actividades de campo en el periodo referente al mes 3.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.4 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

Gráfico 5. Avance Financiero de Ejecución Vs Programado Mensual. Fuente: Propia.

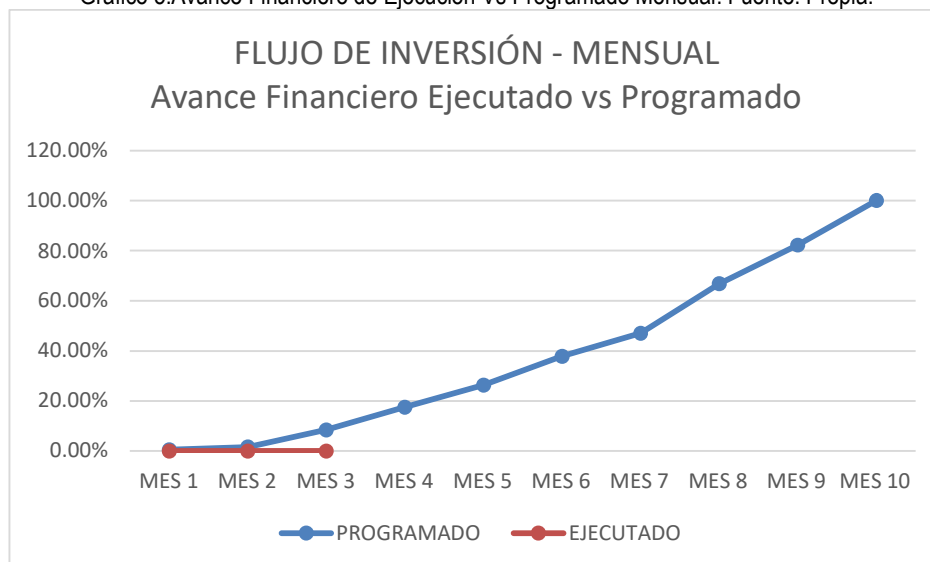

4.4.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO

No se ha realizado cobros para el periodo en cuestión.

4.4.1.1 Actas de Cobro de Contratista de Obra y cobros realizados

%	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	% AMORTIZACIÓN	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO	ESTADO


Tabla 10. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el tercer mes de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 1 de mayo del 2024 al 31 de mayo de 2024, en este, se continuó con actividades de ajustes a estudios y diseños, además de otras actividades administrativas que buscan un inicio de obra con todas las garantías de calidad que se requieran. Se continua con la recolectas de actas de vecindad y se realiza la socialización del proyecto dando inicio a la ejecución del proyecto para el próximo mes.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº3	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023


Responsable:




LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV

ANEXO No.1
INFORMES SEMANALES - MES 3


INFORME SEMANAL No.7
(29 DE ABR - 5 DE MAY)


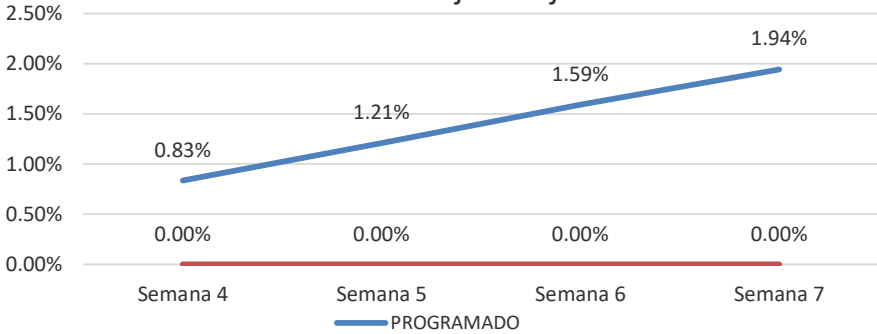
	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2																																
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023																																		
CONTRATO No: LP 006 DE 2023																																		
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																																		
CONTRATO No: CM 007 DE 2023																																		
Semana Número: 7 Del: 29 de abril de 2024 Al: 5 de mayo de 2024																																		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días																																		
Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz																																		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																																		
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023																																		
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td></tr><tr><td></td><td>0.36%</td><td>1.94%</td><td></td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 31,503,806.70</td><td>\$ 172,391,120.28</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO		0.36%	1.94%		0.00%	0.00%	Valor básico de la	\$ 31,503,806.70	\$ 172,391,120.28	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00														
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO																													
	0.36%	1.94%		0.00%	0.00%																													
Valor básico de la	\$ 31,503,806.70	\$ 172,391,120.28	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00																													
CONTRATO DE OBRA																																		
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 330,530,495.016</td><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 330,530,495.016</td><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 330,530,495.016	Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00	Valor Actualizado:	\$ 330,530,495.016	Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																															
Contrato No.	LP 006 DE 2023	Contrato No.	CM 007 DE 2023																															
Valor Inicial:	\$ 330,530,495.016	Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00																															
Valor Actualizado:	\$ 330,530,495.016	Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00																															
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																															
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																															
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																															
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																															
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)																																		
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00	Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00	Plazo Inicial:	Un (1) año	Plazo Inicial:	Un (1) año	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024				
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																															
Contrato No.	LP 006 DE 2023	Contrato No.	CM 007 DE 2023																															
Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00																															
Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00																															
Plazo Inicial:	Un (1) año	Plazo Inicial:	Un (1) año																															
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																															
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																															
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																		
<p>En la semana No.7 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.</p> <p>Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.</p> <p>Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.</p> <p>Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.</p> <p>El 30 de abril se realiza un comité entre interventoría y obra, teniendo como tema de discusión el estado actual de proyectos, y las actividades en ejecución.</p>																																		
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																		
<p>Se hará Seguimiento a la topobatimetría.</p> <p>Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.</p>																																		
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES																																		
<p>Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.</p>																																		
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																																		
<div><div><div>-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.</div><div>-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.</div></div><table><tr><td></td><td>%Programado</td><td>% Ejecutado</td></tr><tr><td>Avance semanal</td><td>0.36%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>1.94%</td><td>0.00%</td></tr></table></div> <div><div>Gráfica de Porcentaje de Ejecución</div></div>				%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	0.36%	0.00%	Avance Acumulado	1.94%	0.00%																							
	%Programado	% Ejecutado																																
Avance semanal	0.36%	0.00%																																
Avance Acumulado	1.94%	0.00%																																

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.</p>		<div><div>Firma</div><div>Nombre: Luis Fernando Ochoa</div><div>Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div> 
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



INFORME SEMANAL No.8
(13 DE MAY - 19 DE MAY)

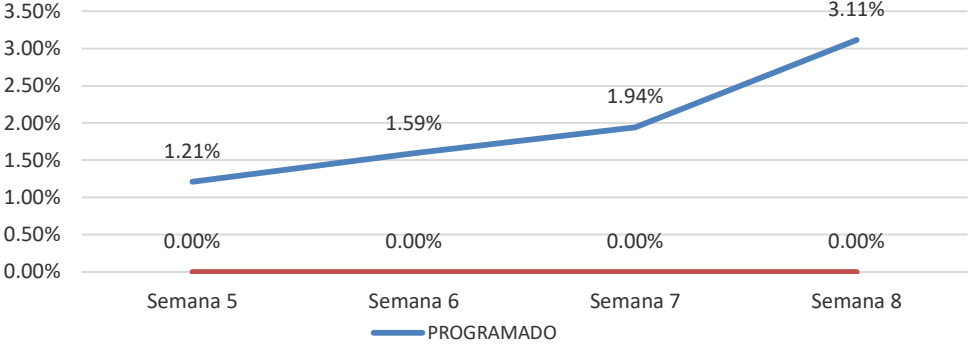	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2																																																						
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 CONTRATO No: LP 006 DE 2023																																																								
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S CONTRATO No: CM 007 DE 2023																																																								
Semana Número: 8 Del: 6 de mayo de 2024 Al: 12 de mayo de 2024																																																								
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55 Días																																																								
Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz																																																								
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																																																								
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023																																																								
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td></tr><tr><td>Obra programada (%)</td><td>1.17%</td><td>3.11%</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 103,996,320.48</td><td>\$ 276,387,440.76</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	1.17%	3.11%	Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%	Valor básico de la	\$ 103,996,320.48	\$ 276,387,440.76	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00																																				
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO																																																			
Obra programada (%)	1.17%	3.11%	Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%																																																			
Valor básico de la	\$ 103,996,320.48	\$ 276,387,440.76	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00																																																			
<table><tr><td colspan="3">CONTRATO DE OBRA</td><td colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>Contratista:</td><td colspan="2">CONSORCIO ICASM2023</td><td>Interventor:</td><td colspan="2">INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td colspan="2">LP 006 DE 2023</td><td>Contrato No.</td><td colspan="2">CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>330,530,495.016</td><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$</td><td>330,530,495.016</td><td>Valor Actualizado:</td><td>\$</td><td>23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td colspan="2">Ciento cuarenta y siete (147) meses</td><td>Plazo Inicial:</td><td colspan="2">Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td colspan="2">Ciento cuarenta y siete (147) meses</td><td>Plazo Actualizado:</td><td colspan="2">Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td colspan="2">19 de marzo 2024</td><td>Fecha de Iniciación:</td><td colspan="2">19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td colspan="2">19 de junio 2036</td><td>Fecha de Vencimiento:</td><td colspan="2">19 de junio 2036</td></tr></table>			CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023		Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S		Contrato No.	LP 006 DE 2023		Contrato No.	CM 007 DE 2023		Valor Inicial:	\$	330,530,495.016	Valor Inicial:	\$	23,163,036,792.00	Valor Actualizado:	\$	330,530,495.016	Valor Actualizado:	\$	23,163,036,792.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036		Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036	
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																					
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023		Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																																																				
Contrato No.	LP 006 DE 2023		Contrato No.	CM 007 DE 2023																																																				
Valor Inicial:	\$	330,530,495.016	Valor Inicial:	\$	23,163,036,792.00																																																			
Valor Actualizado:	\$	330,530,495.016	Valor Actualizado:	\$	23,163,036,792.00																																																			
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																																																				
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses		Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																																																				
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																																																				
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036		Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																																																				
<table><tr><td colspan="3">CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)</td><td colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)</td></tr><tr><td>Contratista:</td><td colspan="2">CONSORCIO ICASM2023</td><td>Interventor:</td><td colspan="2">INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td colspan="2">LP 006 DE 2023</td><td>Contrato No.</td><td colspan="2">CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>8,873,477,366.00</td><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>620,485,992.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$</td><td>8,873,477,366.00</td><td>Valor Actualizado:</td><td>\$</td><td>620,485,992.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td colspan="2">Un (1) año</td><td>Plazo Inicial:</td><td colspan="2">Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td colspan="2">19 de marzo 2024</td><td>Fecha de Iniciación:</td><td colspan="2">19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td colspan="2">31 de diciembre de 2024</td><td>Fecha de Vencimiento:</td><td colspan="2">31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)			CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023		Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S		Contrato No.	LP 006 DE 2023		Contrato No.	CM 007 DE 2023		Valor Inicial:	\$	8,873,477,366.00	Valor Inicial:	\$	620,485,992.00	Valor Actualizado:	\$	8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$	620,485,992.00	Plazo Inicial:	Un (1) año		Plazo Inicial:	Un (1) año		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024		Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024							
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)			CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)																																																					
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023		Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																																																				
Contrato No.	LP 006 DE 2023		Contrato No.	CM 007 DE 2023																																																				
Valor Inicial:	\$	8,873,477,366.00	Valor Inicial:	\$	620,485,992.00																																																			
Valor Actualizado:	\$	8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$	620,485,992.00																																																			
Plazo Inicial:	Un (1) año		Plazo Inicial:	Un (1) año																																																				
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024		Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																																																				
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024		Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																																																				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																								
<p>En la semana No.8 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.</p> <p>Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.</p> <p>Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.</p> <p>Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.</p> <p>El dia 7 mayo se realizo un comité virtual con el Supervisor de Corpamag, Interventoria y Obra. Se menciono la implementacion del componente ambiental.</p>																																																								
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																								
<p>Se hará Seguimiento a la topobatimetría.</p> <p>Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.</p>																																																								
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES																																																								
<p>Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.</p>																																																								
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																																																								
<div><div><div><div>-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.</div><div>-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.</div></div></div><div><table><tr><td></td><td>%Programado</td><td>% Ejecutado</td></tr><tr><td>Avance semanal</td><td>1.17%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>3.11%</td><td>0.00%</td></tr></table></div></div>				%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	1.17%	0.00%	Avance Acumulado	3.11%	0.00%																																													
	%Programado	% Ejecutado																																																						
Avance semanal	1.17%	0.00%																																																						
Avance Acumulado	3.11%	0.00%																																																						
<div><div>Gráfica de Porcentaje de Ejecución</div></div>																																																								

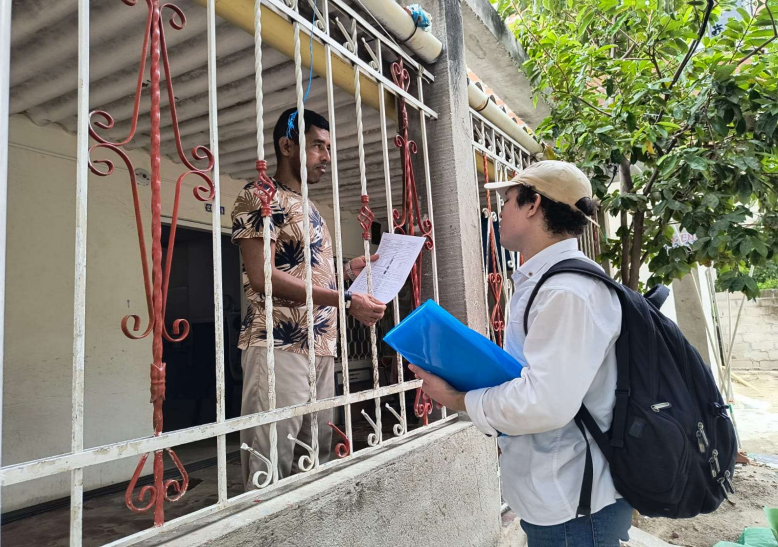	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.</p>		<div><div>Firma</div><div>Nombre: Luis Fernando Ochoa</div><div>Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div> 
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descripción:	Descripción:	
Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira	Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira	

INFORME SEMANAL No.9
(13 DE MAY - 19 DE MAY)



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023

CONTRATO No: LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No: CM 007 DE 2023

Semana Número: 9

Del: 13 de mayo de 2024

Al: 19 de mayo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

Obra programada (%)	SEMANAL 1.34%	ACUMULADO 4.46%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 0.00%	ACUMULADO 0.00%
Valor básico de la	\$ 119,252,677.84	\$ 395,640,118.60	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$ 330,530,495.016

Valor Actualizado:

\$ 330,530,495.016

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$ 23,163,036,792.00

Valor Actualizado:

\$ 23,163,036,792.00

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$ 8,873,477,366.00

Valor Actualizado:

\$ 8,873,477,366.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$ 620,485,992.00

Valor Actualizado:

\$ 620,485,992.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.9 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.

Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.

Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.

Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se hará Seguimiento a la topobatimetría.

Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.

Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.

Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.

-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.


	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	1.34%	0.00%
Avance Acumulado	4.46%	0.00%


Gráfica de Porcentaje de Ejecución

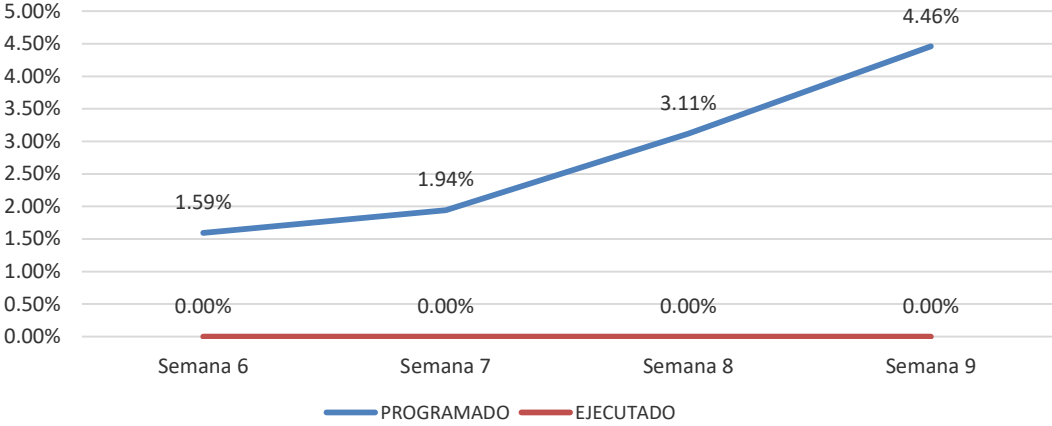

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.</p>		<div>Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div> 
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descripción: Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira	Descripción: Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira	

INFORME SEMANAL No.10
(20 DE MAY - 26 DE MAY)

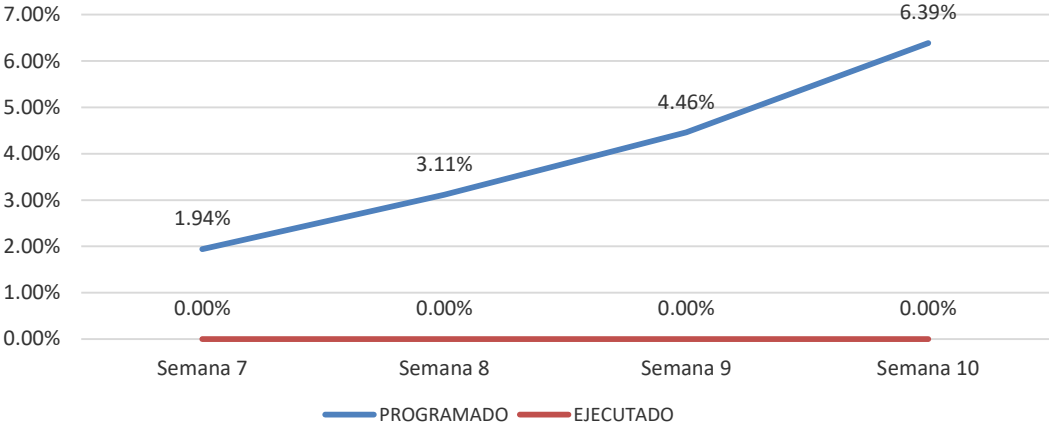	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2																								
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023																										
CONTRATO No: LP 006 DE 2023																										
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																										
CONTRATO No: CM 007 DE 2023																										
Semana Número: 10 Del: 20 de mayo de 2024 Al: 26 de mayo de 2024																										
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 69 Días																										
Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz																										
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																										
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023																										
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL</td><td>ACUMULADO</td></tr><tr><td></td><td>1.93%</td><td>6.39%</td><td></td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 171,471,546.47</td><td>\$ 567,111,665.06</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO		1.93%	6.39%		0.00%	0.00%	Valor básico de la	\$ 171,471,546.47	\$ 567,111,665.06	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00						
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO																					
	1.93%	6.39%		0.00%	0.00%																					
Valor básico de la	\$ 171,471,546.47	\$ 567,111,665.06	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 0.00	\$ 0.00																					
CONTRATO DE OBRA																										
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 330,530,495,016.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 330,530,495,016.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 330,530,495,016.00	Valor Actualizado:	\$ 330,530,495,016.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036								
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023																									
Contrato No.	LP 006 DE 2023																									
Valor Inicial:	\$ 330,530,495,016.00																									
Valor Actualizado:	\$ 330,530,495,016.00																									
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																									
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																									
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																									
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																									
CONTRATO DE INTERVENTORIA																										
<table><tr><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td></tr></table>			Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00	Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036								
Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																									
Contrato No.	CM 007 DE 2023																									
Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00																									
Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00																									
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																									
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																									
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																									
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																									
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)																										
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00	Plazo Inicial:	Un (1) año	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024										
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023																									
Contrato No.	LP 006 DE 2023																									
Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00																									
Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00																									
Plazo Inicial:	Un (1) año																									
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																									
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																									
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)																										
<table><tr><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00	Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00	Plazo Inicial:	Un (1) año	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024										
Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																									
Contrato No.	CM 007 DE 2023																									
Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00																									
Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00																									
Plazo Inicial:	Un (1) año																									
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																									
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																										
<p>En la semana No.10 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.</p> <p>Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.</p> <p>Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.</p> <p>Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.</p> <p>El 22 de mayo se realizo un comité en la oficina de la subdireccion de Corpamag donde se discuto el estado actual de la obra y la socializacion del proyecto.</p>																										
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																										
<p>Se hará Seguimiento a la topobatimetría.</p> <p>Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.</p> <p>Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.</p>																										
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES																										
<p>Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.</p>																										
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																										
<div><div><div><div>-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.</div><div>-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.</div></div></div><table><tr><td></td><td>%Programado</td><td>% Ejecutado</td></tr><tr><td>Avance semanal</td><td>1.93%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>6.39%</td><td>0.00%</td></tr></table></div> <div><div>Gráfica de Porcentaje de Ejecución</div><table><thead><tr><th>Semana</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Semana 7</td><td>1.94%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Semana 8</td><td>3.11%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Semana 9</td><td>4.46%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Semana 10</td><td>6.39%</td><td>0.00%</td></tr></tbody></table></div>				%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	1.93%	0.00%	Avance Acumulado	6.39%	0.00%	Semana	PROGRAMADO	EJECUTADO	Semana 7	1.94%	0.00%	Semana 8	3.11%	0.00%	Semana 9	4.46%	0.00%	Semana 10	6.39%	0.00%
	%Programado	% Ejecutado																								
Avance semanal	1.93%	0.00%																								
Avance Acumulado	6.39%	0.00%																								
Semana	PROGRAMADO	EJECUTADO																								
Semana 7	1.94%	0.00%																								
Semana 8	3.11%	0.00%																								
Semana 9	4.46%	0.00%																								
Semana 10	6.39%	0.00%																								

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.</p>		<div>Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div> 
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descripción: Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira		Descripción: Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira

INFORME SEMANAL No.11
(27 DE MAY - 2 DE JUN)



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO ICASM2023

CONTRATO No:

LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No:

CM 007 DE 2023

Semana Número: 11

Del: 27 de mayo de 2024

Al: 2 de junio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

76

Días

Supervisor Contrato:

Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

Obra programada (%)	SEMANAL	2.05%	ACUMULADO	8.44%
Valor básico de la		\$ 181,691,272.30		\$ 748,802,937.36

Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	0.00%	ACUMULADO	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:		\$ 0.00		\$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$

330,530,495,016.00

Valor Actualizado:

\$

330,530,495,016.00

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$

23,163,036,792.00

Valor Actualizado:

\$

23,163,036,792.00

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$

8,873,477,366.00

Valor Actualizado:

\$

8,873,477,366.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$

620,485,992.00

Valor Actualizado:

\$

620,485,992.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.11 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.

Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.

Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.

El 31 de mayo se realizo la socializacion del proyecto a la comunidad, las entidades publicas y prestadores de servicio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se hará Seguimiento a la topobatimetría.

Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.

Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.

Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.

Se realizara la movilizacion de la maquinaria

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.

-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	2.05%	0.00%
Avance Acumulado	8.44%	0.00%

Gráfica de Porcentaje de Ejecución

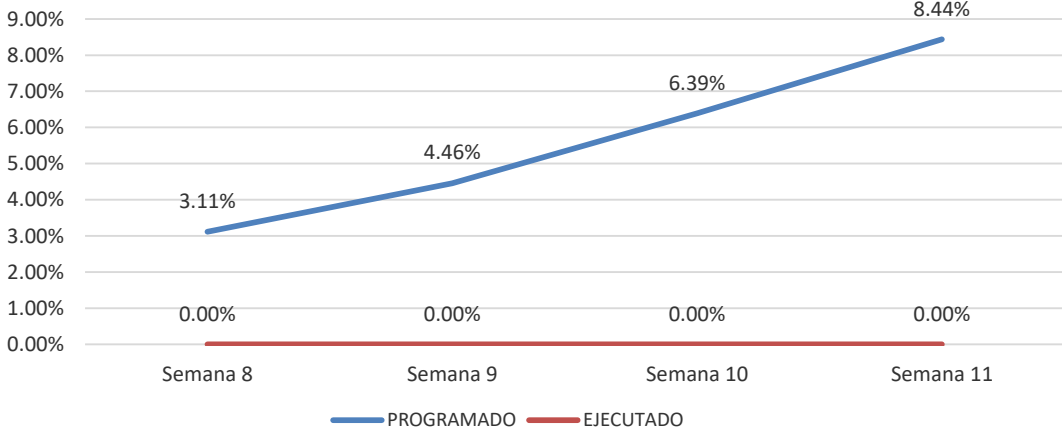

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ICASM2023. NIT: 901.782.970-2
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños.</p>		<div><div>Firma</div><div>Nombre: Luis Fernando Ochoa</div><div>Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div> 
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descripción: Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira	Descripción: Socializacion del proyecto - Auditorio de Coedumag	

	<div>ANEXO</div> <div>PERSONAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CONSORCIO ICASM2023.</div> <div>NIT: 901.782.970-2</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ENTIDAD EJECUTORA: <u>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MES DEL INFORME: <u>3</u>	CONTRATO DE OBRA No. <u>LP 006 DE 2023</u>	CONTRATISTA: <u>CONSORCIO ICASM2023</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROYECTO: <div>INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>CM 007 DE 2023</u> INTERVENTOR: <u>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE	CARGO	<div>may-24</div> <table><tr><td>M</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>V</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div>Firma</div> <div>Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL</div> <div>Residente de Obra</div> <div>T.P. 08202-320271 ATL</div>	<div>Firma</div> <div>Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula No.: 08202-181155 ATL</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Miércoles, 1 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

[Firma]

[Firma]

Jueves, 2 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

[Firma]

[Firma]

Viernes, 3 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

[Firma]

[Firma]

Sábado, 4 de mayo 2024: No se realizan actividades.

Domingo, 5 de mayo 2024: No se realizan actividades.

Semana No. 8 (6 de mayo de 2024 - 12 de mayo de 2024)

Lunes, 6 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves.

Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de veracidad, trámites administrativos de obra interventoría y CORADAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión Topográfica, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría. Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría, Equipo de Topografía.

Martes, 7 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves.

Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de veracidad, trámites administrativos de obra interventoría y CORADAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Se realizó un comité virtual en el que participaron el supervisor del contrato, Interventoría y Obra, se discutió la implementación del componente ambiental del proyecto. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Miércoles, 8 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones - leves.
Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Jueves, 9 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día con lluvias - húmedo, con precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Viernes, 10 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Sábado, 11 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. No se realizaron actividades.

Domingo, 12 de mayo 2024: No se realizaron actividades.

Semana No 9 (13 de mayo de 2024 - 19 de mayo de 2024)

Lunes, 13 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAB, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Martes, 14 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones leves.

Actividades: Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAB, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Miércoles, 15 de mayo 2024: Clima: se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamientos de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, Vehículo Obra e Interventoría.

Jueves, 16 de Mayo 2024: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, Vehículo Obra e Interventoría.

Viernes, 17 de Mayo 2024: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoria y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) profesional Social de Interventoría. **Equipos:** computador portátil Obra e Interventoría, vehículo Obra e Interventoría.

Sábado, 18 de Mayo 2024: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. No se realizan actividades.

Domingo, 19 de Mayo 2024: No se realizan actividades.

Semana No. 10. (20 de mayo de 2024 - 26 de mayo de 2024)

Lunes, 20 de mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoria y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra,

(1) residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador social. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría.
Equipo: Computador portátil Obra e Interventoría, Vehículo obra e Interventoría.

Martes, 21 de Mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra e interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil obra e Interventoría, vehículo obra e Interventoría.

Miércoles, 22 de mayo 2024: Clima: Se inició el día con lluvias - húmedo, con precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra e interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Se realizó comité para definición del alcance del proyecto en la vigencia 2023-2024 y programación de la socialización, participaron personal del contratista, interventoría, el supervisor del contrato y la Subdirectora técnica de CORPAMAG. **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra,

(1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil Obra e Interventoría, Vehículo obra e Interventoría.

Jueves, 23 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se redijo seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista ambiental de Interventoría, (1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** computador portátil Obra e Interventoría, Vehículo obra e Interventoría.

Viernes, 24 de mayo 2024: **Clima:** Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra de interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría,

(1) Profesional Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil obra e Interventoría, vehículo obra e Interventoría.

Sábado, 25 de mayo 2024: clima: Se inició el día con lluvias - humedad, con precipitaciones.
No se realizan actividades.

Domingo, 26 de Mayo 2024: No se realizan actividades.

Semana No. 11 (27 de mayo 2024 - 2 de Junio de 2024)


Lunes, 27 de Mayo 2024: clima: se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPARAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente: hidráulico y geotécnico.

Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador social, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador social de Interventoría.
Equipo: Computador portátil obra e Interventoría, Vehículo obra e Interventoría.

Martes, 28 de Mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoria y COMPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador social. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil obra e Interventoría, Vehículo obra e Interventoría.

Miércoles, 29 de Mayo 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoria y COMPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador social. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Profesional social de Interventoría. **Equipo:** Computador Portátil Obra e Interventoría; vehículo obra e interventoría.

Jueves, 30 de Mayo 2024: Clima: Se inicio el día nublado con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Se llevó a cabo el comité presencial entre el contratista de obra e interventoría, en la búsqueda de verificar el avance del contratista de obra referente a los Estudios y Diseños necesarios para desarrollar las actividades contempladas durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se elevaron recomendaciones por parte de la interventoría para la entrega de la información correspondiente. **Personal:** (1) Conductor (1) Coordinador de obra (1) Director de obra, (1) residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social. (1) Director de interventoría (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría (1) Especialista Hidráulico de Interventoría (1) Trabajador Social de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil / obra e Interventoría, vehículo obra e Interventoría.




Viernes, 31 de mayo 2024: Clima: Se inició el día Soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, trámites administrativos de obra interventoría y CORPAMAG, Se realizó seguimiento a los estudios y diseños en el componente hidráulico y geotécnico. Se realizó la socialización del proyecto en el cual asistieron la Comunidad, Fundaciones, representantes de entidades públicas y de la ciudadanía. **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Trabajador Social.

(1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría,
(1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de
Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría
(1) Profesional Social de Interventoría. Equipo: Computador
portátil obra e Interventoría, vehículo obra e Interventoría.

[Signature]

[Signature]



ANEXO - ESTADO GENERAL DEL TIEMPO



CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

FECHA 31 MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023 INFORME MENSUAL No. 3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	may-24																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Total
Seco	16	16	22	24	24	16	16	16	20	22	24	24	24	21	22	24	24	24	24	23	23	22	23	22	21	24	22	22	23	23	24		675
Nublado / Llovizna	8	8	2			8	8	8	2	2				3	2					1	2	1	1	2	2		2	2	1	1			66
Lluvia Fuerte									2													1			1								4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		745

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-320271 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL



ANEXO
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 3

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO	may-24																															
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EXCAVADORA R220LC-9S	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 1	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 2	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
EXCAVADORA - 320C-06	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
EXCAVADORA - 320D-07	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA SLE923	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA TVA460	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA TVA536	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA TVA708	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA TVD190	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA UAP243	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL544	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL545	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL546	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL549	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL550	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA KNL551	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
ESTACION TOTAL	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
GPS GNSS RTK	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
NIVEL DE PRECISIÓN	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.

Firma
Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL
Residente de Obra
T.P. 08202-320271 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO No.6
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL -
MES 3

DIRECTOR DE OBRA -
LUIS FERNANDO OCHOA
MARULANDA

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9468530295	702104686	E	2024-06-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30

Este certificado se expide el día 2024-06-28 a las 09:31.

RESIDENTE DE OBRA –
MAYRA ALEJANDRA DEL RIO
CORONELL

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL identificado(a) con CC 1143134321

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9468530295	702104686	E	2024-06-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468530295	702104686	E	2024-06-13	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30

Este certificado se expide el día 2024-06-28 a las 09:33.

ESPECIALISTA AMBIENTAL –
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA

Se certifica que ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA identificado(a) con CC 1082980516 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-05	2024-06	718154942	9468467423	E	2024-06-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,000,000						\$320,000										
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,000,000						\$10,500										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,000,000						\$80,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,000,000						\$80,000										

Este certificado se expide el día 2024-06-26 a las 05:35.

ESPECIALISTA HIDRAULICO –
DANILO GREGORIO RODRIGUEZ
CORREA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-29, 11:01:06 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA
CEDULA CIUDADANIA	CC 85474247
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063807838
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	739512726
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 382.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 208.000	\$ 3.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 162.500	\$ 2.300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 6.800	\$ 100
SubTotales:				\$ 377.300	\$ 5.400
Total a Pagar:					\$ 382.700



INGENIERO TOPOGRAFO –
ANGELA MARIA FERNANDEZ
FAJARDO

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	52934912	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO		CALL 157C NU 91 86 TOR 4 APT 914	3064561	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-05	2024-05	I	31/05/2024	77291891	\$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52934912	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO		CALL 157C NU 91 86 TOR 4 APT 914	3064561	AMAFEFA07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-05	2024-05	I	31/05/2024	77291891	\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52934912	FERNANDEZ FAJARDO ANGELA MARIA				59	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

TRABAJADOR SOCIAL –
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ

Se certifica que ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ identificado(a) con CC 1082968730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2024-05	2024-06	718190656	9468497850	E	2024-06-20														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización								
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,800,000					\$288,000								
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,800,000					\$125,300								
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,800,000					\$72,000								
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,800,000					\$72,000								

Este certificado se expide el día 2024-06-26 a las 05:37.

PROFESIONAL SST –
ANA MILAGRO MARENCO
CABALLERO

Se certifica que ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO identificado(a) con CC 1083009348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-05	2024-06	718154942	9468467423	E	2024-06-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,500,000					\$400,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,500,000					\$174,000											
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,500,000					\$100,000											
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,500,000					\$100,000											

Este certificado se expide el día 2024-06-26 a las 05:35.

GERENTE DE PROYECTO –
EUGENIO JOSE PRADA DAZA

PAGADO 12/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	Dirección	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6692364
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UAP	UAT	UOT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 225.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400	\$ 300	\$ 234.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!
