

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 11 de diciembre de 2023 Al: 17 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	6,00%		90,00%	Obra Física Ejecutada (%)	10,00%		90,00%
Valor básico de la Obra	\$ 19.667.503,46	\$	295.012.551,97	Valor básico de la Obra	57.363.551,77		295.012.551,97
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		Interventor:		GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S	
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		5 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Vencimiento:		20 DE DICIEMBRE DE 2023	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


Modulacion cubierta
aplicacion de manto asfaltico
finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso
instalacion de cubierta traslucida



Modulacion cubierta



aplicacion de manto asfaltico

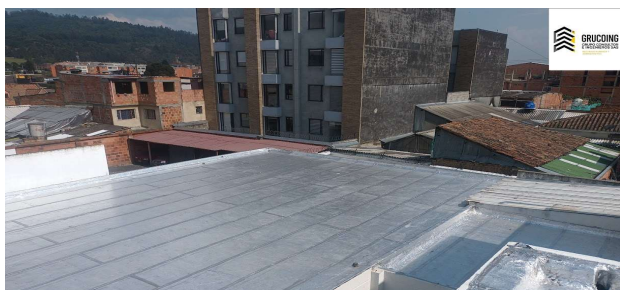




aplicacion de manto asfaltico




finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso

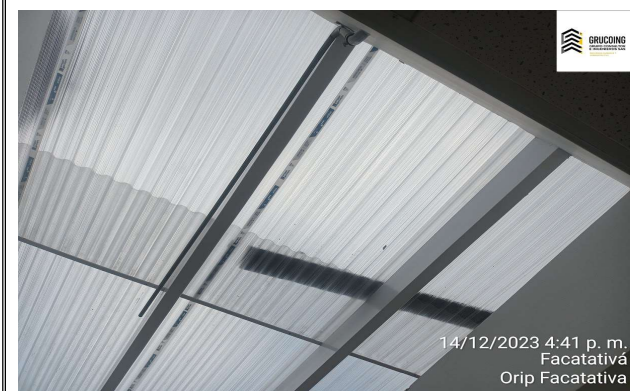

instalacion de cubierta traslucida



cubierta traslucida sin instalar

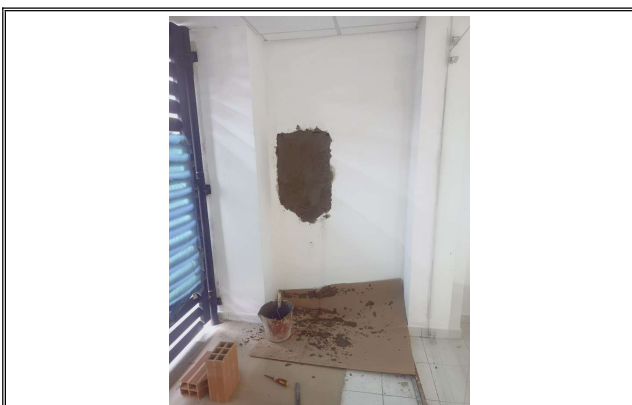

coloccion de pañete en nicho donde se encontraban contadores electricos



culminacion de cielo raso en area de atencion al publico

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	 Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matricula No.: A201020555
