

INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4014 DE 2023: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”.

PERIODO: 01 al 29 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4860 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, marzo de 2024

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
2.1	Localización	5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.	5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía.	5
2.4	Características Técnicas del Proyecto	6
3.	Información convenio solidario	7
3.1	Información General del convenio	7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	7
3.3	Seguimiento ítems no previstos N/A	7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.	7
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	8
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9
5.1	Información general del contrato	9
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor.	9
5.3	Informes especialistas	10
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	10
5.5	Información otros programas y aplicativo	10
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	11
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12
8.	ANEXOS	13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.	13
8.2.	Registro fotográfico	13
8.3.	Bitácora del mes correspondiente:	13

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

Por consiguiente, la aplicación de técnicas como la estabilización de vías terciarias mediante gaviones desempeña un papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de enero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, vereda La Esmeralda del municipio Playa de Belén.

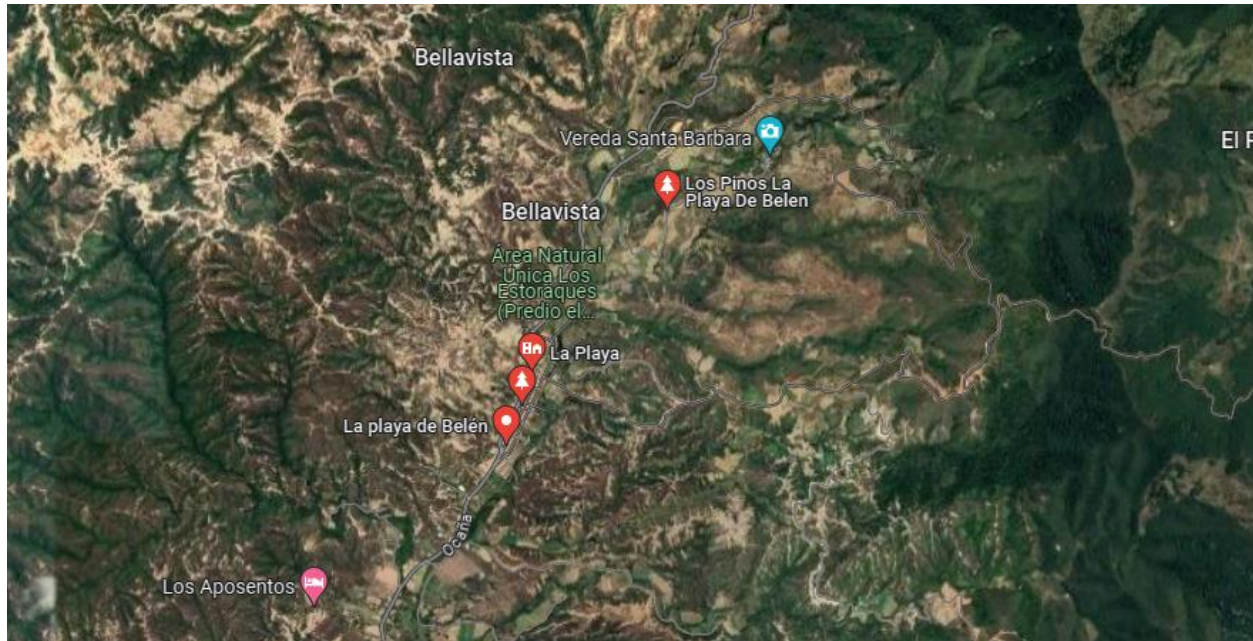


Figura: 1 Localización de la vereda La Esmeralda

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vereda La Esmeralda en el municipio de La Playa de Belén, departamento Norte de Santander. Esta es una vía terciaria destapada que requiere intervención y mantenimiento para el buen desplazamiento de sus habitantes y visitantes.



2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4014 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
FECHA DE INICIACIÓN	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0,5 MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 200.876.460,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 200.876.460,00)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero, se realizaron actividades de suministro, instalación y compactación de subbase granular Clase C para la construcción de la placa huella.

3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo del 01 al 29 de febrero, la interventoría ha realizado la verificación exhaustiva de la calidad de los materiales suministrados, así como supervisión de cerca al proceso de instalación y compactación para garantizar el cumplimiento de los estándares especificados. Además, la interventoría realizó informes detallados sobre el avance semanal de las actividades de obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 *Resumen Mensual Estado General del Proyecto*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 *Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 *Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.*
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 *Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 *Estado General del Tiempo*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 *Resumen Ensayos de Laboratorio*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 *Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 *Informes semanales*
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4860 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	1570 INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 94,818,000.00 incluido el IVA
ADICIÓN 1	\$ 21,182,000.00 incluido el IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 116.000.000,00 incluido el IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Brindar apoyo en la gestión documental del proyecto mediante sesiones de socialización para aclarar los criterios necesarios para iniciar la ejecución del convenio solidario.
- Asistir en la elaboración de informes semanales que ayuden a determinar el progreso del proyecto.
- Contribuir en la creación de cuentas de cobro y en la clarificación de información sobre la topografía del área a intervenir, así como en los ajustes correspondientes a los estudios y diseños. Se resolverán dudas y se establecerán plazos para entregas.
- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el contrato 4864 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

- 5.3 *Informes especialistas***
(No aplica).
- 5.4 *Informe del Programa Anual de Caja - PAC***
(No aplica).
- 5.5 *Información otros programas y aplicativo***
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 *Equipo Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 *Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 *Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 *Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de obra realizadas durante febrero de 2024 se llevaron a cabo de manera satisfactoria y eficiente. Este seguimiento ha garantizado el cumplimiento de los estándares de calidad, la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos. La correcta ejecución de las tareas, como la rocería, limpieza de cunetas, instalación de subbase granular y construcción de placa huella, refleja un compromiso con la excelencia en la gestión de infraestructura, lo que contribuye significativamente al desarrollo y bienestar de la comunidad.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																														
			VERSION																																														
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		PÁGINA																																														
			FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total																																																	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña																																																	
PERIODO MES: Febrero																																																	
CONVENIO No.: 4014 DE 2023																																																	
PLAZO INICIAL: 0.52 meses																																																	
FECHA DE INICIO: 15/12/2023																																																	
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023																																																	
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2023																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024																																																	
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES																																																	
VALOR INICIAL : \$ 200.876.460,00																																																	
VALOR ADICIONALES: \$ -																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 200.876.460,00																																																	
DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																	
DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4860 del 2023																																																	
INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS																																																	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																														
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	ml	120,00	Estructuras	Alcantarillas	und	1,00	Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	0	Estructuras	Alcantarillas	und	0	0	Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																														
Pavimentación	Mejoramiento	ml	120,00																																														
Estructuras	Alcantarillas	und	1,00																																														
Mantenimiento																																																	
Otros (Especificar cuales)																																																	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																													
Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	0																																													
Estructuras	Alcantarillas	und	0	0																																													
Mantenimiento																																																	
Otros (Especificar cuales)																																																	
AVANCE FINANCIERO																																																	
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																														
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149.913.892,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.497.417,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 45.465.151,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 199.876.460,00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 149.913.892,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.497.417,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.465.151,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199.876.460,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 17.909.664,00</td><td>\$ 17.909.664,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 10.000.000,00</td><td>\$ 10.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 27.909.664,00</td><td>\$ 27.909.664,00</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ 17.909.664,00	\$ 17.909.664,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	VALOR EJECUTADO	\$ 27.909.664,00	\$ 27.909.664,00																				
	VALOR																																																
OBRAS	\$ 149.913.892,00																																																
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.497.417,00																																																
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.465.151,00																																																
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199.876.460,00																																																
	VALOR	ACUMULADO																																															
OBRAS	\$ 17.909.664,00	\$ 17.909.664,00																																															
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00																																															
VALOR EJECUTADO	\$ 27.909.664,00	\$ 27.909.664,00																																															
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																	
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 17.909.664,00			MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 17.909.664,00			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2																																														
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																														
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4																																														
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																	
																																																	
Compactación de subbase granular			Compactación de subbase granular																																														



Foto 4

Compactación de subbase granular

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se presenta avance físico, ya que se están realizando ajustes a los diseños.

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2
Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5
Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

FECHA			12/03/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total	DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña
---	-------------------------------------

CONVENIO No: 4014 DE 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24	PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023	INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No se realiza reporte de Estado General del Tiempo ya que en este tiempo se realizaron actividades de ajuste a los diseños.
--

 Firma Nombre: Juan Manuel Gómez Peña Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS	 Firma Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							PAGINA		
							FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña									
CONVENIO No.: 4014 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
Aun no se han realizado Ensayo de laboratorio por parte del contratista ni de interventoría									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma					Firma				
Nombre: Juan Manuel Gómez Peña Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS					Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

Anexo 7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	12 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	Ocaña																																																					
CONVENIO No. 4014 DE 2023		CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																								
FECHA DE INICIO:	15/12/2023																																																							
PLAZO INICIAL:	0,52 meses																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																							
VALOR INICIAL:	\$ 200.876.460,00																																																							
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.876.460,00 (Incluye adiciones)																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4860 del 2023		INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20,00</td><td>\$ 40.175.292,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5,00</td><td>\$ 10.043.823,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30,00</td><td>\$ 60.262.938,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20,00	\$ 40.175.292,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	\$ 10.043.823,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	\$ 60.262.938,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>10</td><td>23</td><td>31</td><td>10</td><td>24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>10</td><td>23</td><td>31</td><td>12</td><td>26</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>23</td><td>31</td><td>12</td><td>28</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			21	10	23	31	10	24							21	10	23	31	12	26	31	12	23	31	12	28
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	20,00	\$ 40.175.292,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	\$ 10.043.823,00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	\$ 60.262.938,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
21	10	23	31	10	24																																																			
21	10	23	31	12	26																																																			
31	12	23	31	12	28																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100293090																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 71789898 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Patronal, Contratista, Subcontratista, Vehículos Propios y No propios</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Patronal, Contratista, Subcontratista, Vehículos Propios y No propios		\$ 232.000.000,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>10</td><td>23</td><td>31</td><td>12</td><td>23</td></tr><tr><td>21</td><td>10</td><td>23</td><td>31</td><td>12</td><td>23</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			21	10	23	31	12	23	21	10	23	31	12	23																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																																						
Patronal, Contratista, Subcontratista, Vehículos Propios y No propios		\$ 232.000.000,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
21	10	23	31	12	23																																																			
21	10	23	31	12	23																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100072201																																																								
OTRAS PÓLIZAS No.																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 7178999 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20,00	\$ 40.175.292,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	\$ 10.043.823,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	\$ 60.262.938,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	12	23	1	3	25
31	12	23	30	4	27
30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100293090

Certificado de modificación o anexo No.: 71852861
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00
Patronal, Contratista, Subcontratista, Vehiculos Propios y No propios		\$ 260.000.000,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	10	23	30	4	24
21	10	23	30	4	24

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100072201

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 71852864
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma 

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGINA					
				FECHA	9/02/2023 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen								
UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña		SEMANA No.: 4 del 2/02/2023 al 8/02/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elías Jaimes Fernandez		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):								
160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la construccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen								
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER			INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS					
			INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda					
CONVENIO No. 4014		VALOR INICIAL: \$ 199.876.460,00	CONTRATO No. 4860 del 2023		VALOR INICIAL: \$ 94.818.000,00			
FECHA DE INICIO: 15/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 15/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ 21.182.000,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199.876.460,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 116.000.000,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -			
					VALOR AMORTIZADO: \$ -			
					SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 149.913.892,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	%					
Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
				X				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:								
PERIODO FACTURADO:								
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones:								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %								
Meta Física Ejecutada %								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	Prog					
			Ejec					
			Prog					
			Ejec					
			Prog					
			Ejec					
			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción		Equipo Mínimo	Total Disponible					
Total								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n):								

IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	ZONAS DE DEPOSITO SI ____ NO ____ N/A ____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ N/A ____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ____ NO ____ N/A ____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI ____ NO ____ N/A ____
OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentación sobre la fuente de los materiales		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ____ NO ____ N/A ____
		VERTIMIENTOS: SI ____ NO ____ N/A ____
		EMISIONES: SI ____ NO ____ N/A ____
		OTROS (Especificar cual) SI ____ NO ____ N/A ____
		OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO: _____		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Se continúa con las solicitudes a la junta de acción comunal la entrega de la topografía, estudios y diseños, hoja de vida del personal (mano de obra calificada). Por parte de la supervisión del contrato se procede a activar el personal de la interventoría (director y residente de interventoría). Por medio de correo electrónico se envió la respectiva información solicitada para la elaboración y el diseño de la valla informativa para la junta.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Se espera la entrega de la documentación solicitada.		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
Ajustes a Estudios y diseños		Programado
Placa huella		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado
		Ejecutado
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Instructivo Valla informativa		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		FIRMA 
		NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.A. / AS70 INGENIERIA SAS
		Matrícula Profesional No.: 54302-11214NVS
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	

FECHA	16/02/2023
(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen		
UNIDAD EJECUTORA:	Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	Ocaña
		SEMANA No.:	5 del 9/02/2023 al 15/02/2023 Último Informe Semanal SI
		(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	Elias Jaimes Fernandez	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la construccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER				INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS			
				INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda			
CONVENIO No.	4014	VALOR INICIAL:	\$ 199.876.460,00	CONTRATO No.	4860 del 2023	VALOR INICIAL:	\$ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 199.876.460,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
						VALOR AMORTIZADO:	\$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.913.892,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
SI NO			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %	

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:	TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____	
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentación sobre la fuente de los materiales		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____	
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____	
		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: _____			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
En la semana se realizaron los respectivos estudios topograficos para dar empuzo a la ejecucion del convenio			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Se espera la ejecucion de la obra			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
Ajustes a Estudios y diseños	Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado		
Placa huella			
alcantarillas			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Estudio Topografico	Estudio Topografico		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA _____ NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R. / 3570 INGENIERIA SAS Matricula Profesional No.: 54302-11214NVS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	

FECHA	23/02/2023
(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 6 del 16/02/2023 al 22/02/2023 Último Informe Semanal Si ☒ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elías Jaimes Fernández GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la construccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER				INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS			
CONVENIO No. 4014				INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda			
FECHA DE INICIO: 15/12/2023		VALOR INICIAL: \$ 199.876.460,00		CONTRATO No. 4860 del 2023		VALOR INICIAL: \$ 94.818.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 15/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ 21.182.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199.876.460,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 116.000.000,00	
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -	
						VALOR AMORTIZADO: \$ -	
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.876.460	\$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.913.892,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	%	
		SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		☐	☒
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA:		\$ -	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					



MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____


TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____
_____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
_____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales		OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO: _____		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
En la semana se realizaron la revisionn de estudios de topografia y ajustes a los diseños. Igualmente estamos a espera de la consignación de los recursos a la junta de acción comunal para dar empiezo a la ejecución de la obra.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Se espera la consignación de los recursos para la ejecucion de la placa huella.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
Ajustes a Estudios y diseños		Programado
Placa huella		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado
		Programado
		Ejecutado
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Conformacion Veeduria Convenio Solidario		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		FIRMA 
		NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda B.A. / 3570 INGENIERIA SAS
		Matricula Profesional No.: 54302-11214NVS
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentación sobre la fuente de los materiales		
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
ZONAS DE DEPOSITO		SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL:		SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:		SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:		SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:		SI NO N/A
VERTIENTOS:		SI NO N/A
EMISIONES:		SI NO N/A
OTROS (Especificar cual)		SI NO N/A
OBSERVACIONES: se requerirá en la medida de ser necesario		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO:		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Se realiza instalación y compactación de Subbase Granular Clase C para construcción de placa huella.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Continuar con la construcción de placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
Ajustes a Estudios y diseños	Programado	100%
	Ejecutado	100%
Placa huella	Programado	
	Ejecutado	
alcantarillas	Programado	12%
	Ejecutado	7%
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Aplicación y compactación de subbase granular	Aplicación y compactación de subbase granular	Aplicación y compactación de subbase granular
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA
		NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS
		Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.		

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10
**Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-
FR-7**



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	12/03/2024
-------	------------

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	4860 del 2023	INTERVENIOR:	1570 INGENIERIA SAS
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belén

CONTRATO DE OBRA No.:	4014 DE 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER
-----------------------	--------------	--------------	---

NOMBRE ARL: ARL SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

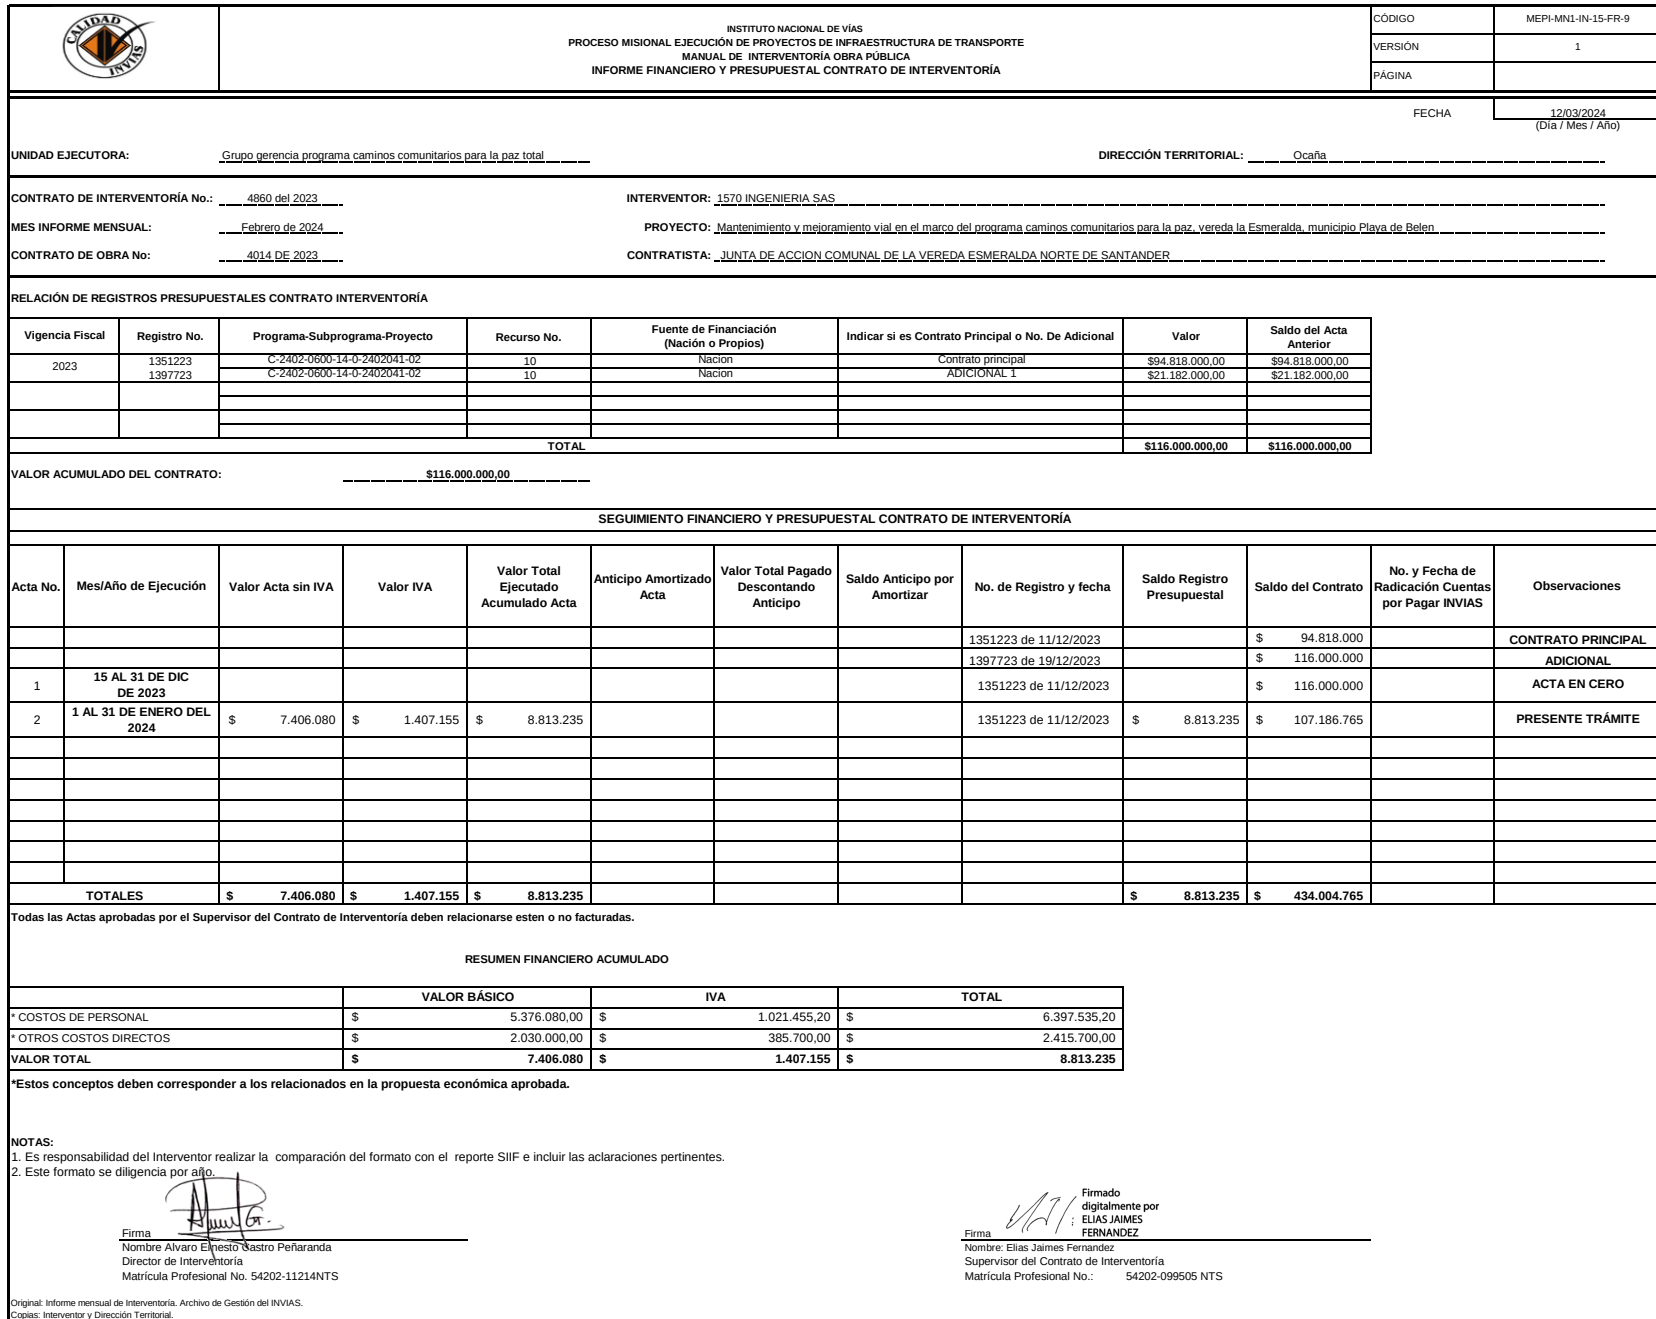
NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal profesionalmente educado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría "Alcanzar en el presente" formalizar la disposición contractual que los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soporte de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante a adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentar la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y los documentos soporte de novedades.
10. El Interventor debe trabajar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9



Anexo 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4860 del 2023		INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS																																																				
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 PLAZO INICIAL: 0,5 mes FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 94.818.000,00 VALOR ACUMULADO: \$ 116.000.000,00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>8%</td><td>\$ 9.481.800,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>16%</td><td>\$ 18.963.600,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>25%</td><td>\$ 28.445.400,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	8%	\$ 9.481.800,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16%	\$ 18.963.600,00	Calidad del servicio	25%	\$ 28.445.400,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>12</td><td>2023</td><td>30</td><td>6</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>6</td><td>12</td><td>2023</td><td>6</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			6	12	2023	30	6	2024							6	12	2023	31	12	2026	6	12	2023	6	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	8%	\$ 9.481.800,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16%	\$ 18.963.600,00																																																						
Calidad del servicio	25%	\$ 28.445.400,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
6	12	2023	30	6	2024																																																			
6	12	2023	31	12	2026																																																			
6	12	2023	6	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado SA Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.600.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.200.000,00
Calidad del servicio	30%	\$ 34.800.000,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
22	12	2023	30	9	2024
15	12	2023	31	3	2027
15	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876


Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

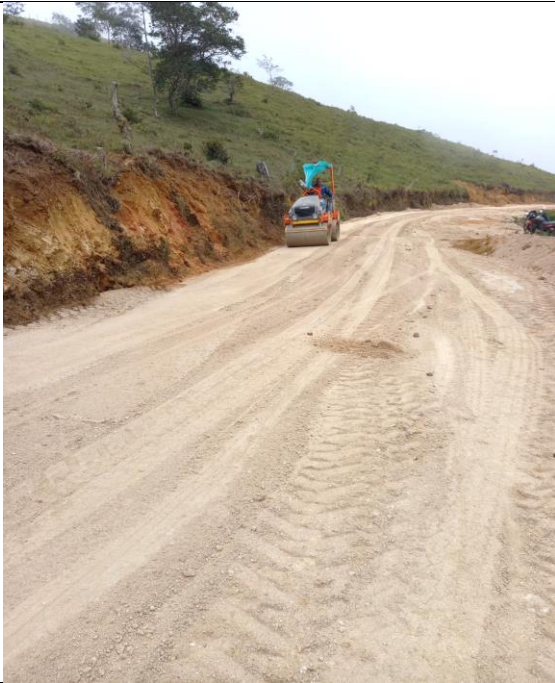
Firma  Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

**Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo
asunto, referencia, fecha de recibo.**

Anexo 14
Registro fotográfico



Instalación de subbase granular



Compactación de subbase granular



Compactación de subbase granular

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente
