

INFORME FINAL DE OBRA

(DEL 11-JUNIO-2023 AL 15-JUNIO-2023 Y DEL 23-NOVIEMBRE-2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)

CONTRATO 1071 DE 2023

OBJETO:

**“CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO
QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

DEL 11-JUNIO-2023 AL 15-JUNIO-2023 Y DEL 23-NOVIEMBRE-2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Avenida La Toma # 10 A - 46 Neiva - Huila - Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 Celular: 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	5
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
2.1. ACTIVIDADES DE OBRA	6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO	7
4. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL	8
5. ALCANCE DEL CONTRATO	9
6. INFORMACION DEL CONTRATO LEGAL Y FINANCIERO	10
6.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10
6.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA	10
6.3. SANCIONES Y ACCIONES LEGALES EN PROCESO	11
6.4. PLAZOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO	11
6.5. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS	12
7. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA E INTERVENTORIA	14
8. ACTIVIDADES EN EJECUCION	15
8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO	15
8.2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HASTA EL MOMENTO	19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Datos generales, fecha de suscripción, legalización, iniciación y terminación.....	7
Tabla 2: Metas físicas iniciales totales.	9
Tabla 3: Valor inicial y adiciones.	10
Tabla 4: Garantías	10
Tabla 5: Modificaciones	11
Tabla 6: Plazo del contrato, Etapa preliminar y etapa de construcción.....	11
Tabla 7: Plazos	11
Tabla 8: Relación de actas parciales.....	11
Tabla 9: Presupuesto aprobado para la obra.	12
Tabla 10: Presupuesto actualizado ejecutado en obra.	13
Tabla 11: Cuadro de actividades en ejecución de la obra hasta la fecha.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12: Valores y cantidades ejecutadas de la obra hasta la fecha.	19
Tabla 13: Valores programados vs ejecutados.....	20

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. ACTA DE INICIO

ANEXO 02. ACTA DE SUSPENSION No. 1

ANEXO 03. ACTA DE REINICIO No.1

ANEXO 02. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 03. MEMORIAS DE CALCULO

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que se adelantaron por parte del señor RAMIRO POLANIA FERNANDEZ quien actúa en función de representante legal de RAEJJA INGENIERIA S.A.S. que suscribió con el Departamento del Huila el contrato de obra No. 1071 DEL 2023 cuyo objeto es "CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

El presente informe parcial corresponde al periodo comprendido DEL 11-JUNIO-2023 AL 15-JUNIO-2023 Y DEL 23-NOVIEMBRE-2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, en el marco del contrato 1071 de 2023, se dan a conocer las actividades, cantidades ejecutadas, estado actual del contrato, seguimiento a la programación de obra, informe de actividades en general de todos los aspectos para lograr el desarrollo normal y eficiente del proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las vías VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, será objeto de intervención debido a que actualmente está expuesta a condiciones que han generado deterioro por el desgaste por uso, falta de mantenimiento periódico, entre otros. Esta situación, genera restricciones en el tránsito vehicular y peatonal, elevando el riesgo de accidentes, incrementando los tiempos de viaje y costos de transporte y limitando el crecimiento productivo y competitivo de la región, adicional a esto, de no tomar acciones que conlleven a la rehabilitación y mantenimiento de la vía, podría afectar la caída de la calzada y generar un daño mayor a las personas que diariamente se movilizan por la ruta.

Teniendo la situación mencionada anteriormente, este proyecto consiste en realizar la CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA conforme a la normatividad técnica vigente, para de esta manera conservar la vía, lo cual permitirá mitigar los inconvenientes presentados, darle mayor durabilidad a la vía lo cual a su vez, permitirá disminuir el tiempo y los costos en los desplazamientos para los usuarios de la vía y habitantes del sector.

2.1. ACTIVIDADES DE OBRA

El plazo máximo estipulado para la etapa de obra es de cuarenta y cinco (45) días; se inicia una vez se firma el acta de inicio, y se cuente con la totalidad de la aprobación de los requerimientos exigidos para iniciar la obra.

Para el contrato se cuenta con recursos por un valor **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800)** recursos con los cuales se garantiza el control y ejecución del contrato de obra, verificación de todos los procesos constructivos, el control de la inversión de los recursos y en general la supervisión de todo el proyecto de manera que se realice de forma adecuada y que se garantice la calidad y estabilidad de todas y cada una de los ítems ejecutados.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

INFORMACIÓN	CONTRATISTA DE OBRA	
No. DEL CONTRATO:	1071 del 2023	
OBJETO:	"CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	Nombre de la empresa ejecutor del contrato	Representante Legal
	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800)	
VALOR ANTICIPO	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 48.507.240)	
VALOR ADICIÓN	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800)	
ESTADO DEL CONTRATO:	En la fecha del presente informe el contrato de obra se encuentra en ejecución.	
FECHA DE INICIO:	09 de mayo de 2023	
PRÓRROGA No. 01:	N.A.	
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N.A.	
REINICIO DE CONTRATOS:	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23 de junio de 2023	

Tabla 1: Datos generales, fecha de suscripción, legalización, iniciación y terminación.

4. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

El Departamento del Huila está localizado al suroccidente del país entre los 3°55'12" y 1°30'04" de latitud norte (entre el nacimiento del Río Riachón, municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo), y los 74°25'24" y 76°35'16" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (entre el Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio de San Agustín.) (Gobernación del Huila, 2017)

Extensión y límites

El Huila, al norte limita con los departamentos de Cundinamarca y el Tolima al sur con los de Cauca y Caquetá, al oriente con los departamentos de Meta y Caquetá, y hacia el Occidente con los de Cauca y Tolima. (Gobernación del Huila, 2017)

Descripción de la población

El Departamento de Huila cuenta con una población aproximada de 1.211.163 habitantes, de los cuales 593,402 son hombres y 589.542 son mujeres. Su población acentuada en las caberas municipales asciende a 735.246, mientras que en la zona rural es de 475.917 habitantes. (DANE, 2005. Proyecciones a 2017).

El proyecto a desarrollar representa la mejor alternativa para mitigar las la posible pérdida de la calzada mediante la CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA VIA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, vía puente las Gutierrez - San Isidro - Quebrada Negra.

6. INFORMACION DEL CONTRATO LEGAL Y FINANCIERO

6.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800)
ADICION AL CONTRATO DE OBRA	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800)

Tabla 3: Valor inicial y adiciones.

6.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION	GARANTIAS		
	CONTRATO DE OBRA		
	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO No. 21-44-101410261	31/03/2023	15/11/2023	\$ 48.507.240,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2023	15/11/2023	\$ 32.338.160,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/03/2023	15/05/2026	\$ 32.338.160,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/05/2023	13/05/2028	\$ 32.338.160,00
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	31/03/2023	15/05/2023	\$ 232.000.000,0
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	31/03/2023	15/05/2023	\$ 232.000.000,0
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	31/03/2023	15/05/2023	\$ 232.000.000,0

Tabla 4: Garantías

6.3. SANCIONES Y ACCIONES LEGALES EN PROCESO

Durante los 33 días de ejecución en el que se han venido desarrollando actividades de obra, no se ha recibido sanción alguna y/o acciones legales que se encuentren en proceso a la fecha del presente informe.

6.4. PLAZOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES		
CONTRATO DE OBRA		
MODIFICATORIO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.

Tabla 5: Modificaciones

PLAZO DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco 45 días
Etapas y tiempos del contrato	Suspensión No. 1: 16 de junio de 2023
	Reinicio No. 1: 23 de noviembre de 2023

Tabla 6: Plazo del contrato, Etapa preliminar y etapa de construcción

OBRA	
DESCRIPCION	PLAZO
FECHA DE TERMINACION	30 de noviembre de 2023

Tabla 7: Plazos

RELACION DE ACTAS PARCIALES				
CONTRATO DE OBRA				
No	OBJETO	FECHA RADICACIÓN	VALOR BRUTO	OBSERVACIONES
1	Acta de cobro #1	15/06/2023	\$ 131.810.800	Fecha: 15 de Junio de 2023- PAGA
FINAL	CUENTA FINAL	18/12/2023	\$25.500.000	Fecha: 18 de Diciembre de 2023

Tabla 8: Relación de actas parciales

6.5. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

A continuación, se relaciona el presupuesto aprobado para la obra el cual cuenta con un valor inicial de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$161.690.800).

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CONSERVACION VIAL								
1,1				CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	KM	15	\$ 8.500.000,00	\$ 127.500.000,00
Subtotal								
ALCANTARILLAS EN CONCRETO								\$ 127.500.000,00
EXCAVACIÓN								
2,1				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE MANEJO DE AGUAS Y RETIRO DE MATERIAL ESTÉRIL	M3	88	\$ 41.000,00	\$ 3.608.000,00
CONCRETOS								
2,2				CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), PARA ALBERCA Y ESTRUCTURA DE SALIDA, INCLUYE FORMALETA	M3	15,6	\$ 1.020.000,00	\$ 15.912.000,00
2,3				CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA	M3	1,6	\$ 823.000,00	\$ 1.316.800,00
TUBERÍA D=36"								
2,4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)	ML	16	\$ 730.000,00	\$ 11.680.000,00
RELLENO								
2,5				RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	36	\$ 46.500,00	\$ 1.674.000,00
Subtotal								
								\$ 34.190.800,00
								SUBTOTAL OBRAS \$ 161.690.800,00

A continuación, se relaciona el presupuesto ejecutado de la obra el cual cuenta con un valor de CIENTO TREINTA UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$131.810.800).

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CONSERVACION VIAL								
1.1				CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	KM	15	\$ 8,500,000.00	\$ 127,500,000.00
Subtotal								\$ 127,500,000.00
ALCANTARILLAS EN CONCRETO								
EXCAVACIÓN								
2.1				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE MANEJO DE AGUAS Y RETIRO DE MATERIAL ESTÉRIL	M3	86	\$ 41,000.00	\$ 3,608,000.00
CONCRETOS								
2.2				CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), PARA ALBERCA Y ESTRUCTURA DE SALIDA, INCLUYE FORMALETA	M3	15.6	\$ 1,020,000.00	\$ 15,912,000.00
2.3				CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA	M3	1.6	\$ 825,000.00	\$ 1,318,800.00
TUBERÍA D=36"								
2.4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)	ML	10	\$ 730,000.00	\$ 7,300,000.00
RELLENO								
2.5				RELLENO EN RECEO COMPACTADO	M3	36	\$ 46,500.00	\$ 1,674,000.00
Subtotal								\$ 29,810,800.00
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 157,310,800.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		\$ 157,310,800.00

<p>NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.</p> <p>NOTA2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.</p> <p>NOTA 3: El A.L.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).</p>	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	24%
	IMPRESTO	B=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.L.U.	A.L.U. =	30%

Tabla 10: Presupuesto actualizado ejecutado en obra.

7. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

El contratista REALJA INGENIERIA S.A.S cuenta con el siguiente personal de obra para el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato:


- INGENIERO RESIDENTE

Se cuenta con el siguiente equipo para la correcta ejecución de las actividades:

- Motoniveladora Caterpillar 120g modelo 1989
- Pajarita Caterpillar 420e modelo 2008
- Vibrocompactador Dynapac modelo 2012
- Volqueta Dodge modelo 1973 (Capacidad 7m³)
- Volqueta Dodge modelo 1975 (Capacidad 7m³)
- Volqueta Ford modelo 1956 (Capacidad 7m³)
- Volqueta Ford modelo 1960 (Capacidad 7m³)
- Volqueta Chevrolet modelo 1988 (Capacidad 7m³)

8. ACTIVIDADES EN EJECUCION

8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

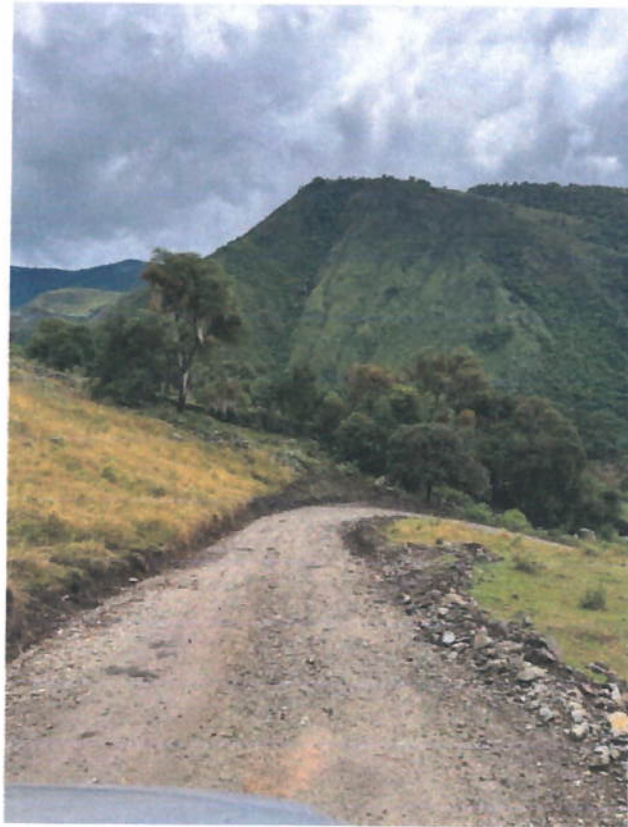



Avenida La Toma # 10 A - 46 Neiva - Huila - Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 Celular: 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com



Avenida La Toma # 10 A - 46 Neiva - Huila - Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 Celular: 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com



Avenida La Toma # 10 A - 46 Neiva - Huila - Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 Celular: 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com

8.2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HASTA EL MOMENTO

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO - TOTAL = 97.30%					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
1	CONSERVACION VIAL				
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	KM	15,0	15,0	100%
2	ALCANTARILLAS EN CONCRETO				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE MANEJO DE AGUAS Y RETIRO DE MATERIAL ESTERIL	M3	88,0	88,0	100%
2,2	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA ALBERCA Y ESTRUCTURA DE SALIDA, INCLUYE FORMALETA	M3	15,6	15,6	100%
2,3	CONCRETO NORMAL DE (140KG/CM2), PARA SOLADOS Y LIMPIEZA	M3	1,6	1,6	100%
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)	ML	16,0	10,0	62,5%
2,5	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	36,0	36,0	100%

Tabla 11: Valores y cantidades ejecutadas de la obra hasta la fecha.

Se ejecuto el mantenimiento de 15 Km de vía, distribuidos de la siguiente manera: 12 Km de vía en el ramal denominado puente la Gutiérrez- San Isidro y 3Km en el ramal denominada puente la Gutiérrez- Quebrada negra. Así mismo en cada uno de estos tramos se realizo una alcantarilla en concreto con tubería de 36" de 5 metros de longitud cada una.

El contrato fue ejecutado a cabalidad, quedando un saldo a favor del departamento, esto debido a que la cantidad de tubería contemplada para las alcantarillas no fueron necesarias, toda vez que se utilizaron 5 tubos por alcantarilla.

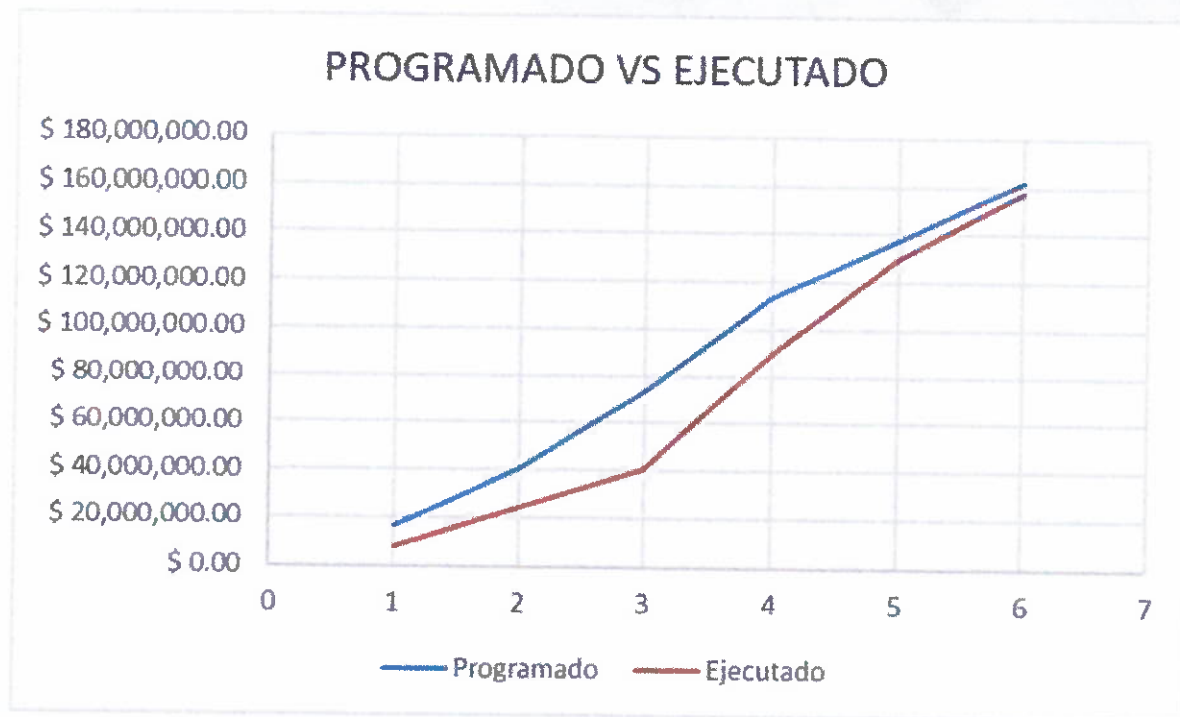



Tabla 12: Valores programados vs ejecutados.

Durante el presente periodo comprendido entre el 11 de junio de 2023 al 15 de junio y del 23 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de la misma vigencia, se logró ejecutar el 100% del avance físico y de las metas del contrato, sin embargo, quedo un recurso lo cual da como avance financiero el 97,3% aproximadamente de la totalidad del contrato. El contrato arriba descrito se logró culminar a satisfacción el día 30 de noviembre de 2023, cumpliendo satisfactoriamente con todo lo estipulado en las actividades propias del contrato.


RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
R.L. RAEJJA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

Revisó:



NELSON ARIAS VILLAREAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI.
SUPERVISOR

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.075.209.501**, y con Tarjeta Profesional **No. 288124 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **RAELJA INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT **No. 813.003.916 - 4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Neiva (Huila), a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023.



WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA
T.P. No. 288124 - T
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.209.501


NUMERO
BUITRAGO MURCIA
 APELLIDOS
WILMER ANTONIO
 NOMBRES


 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1985**
NEIVA
 (HUALA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
 ESTATURA **O+** **M**
 O.S. RH SEXO
27-FEB-2004 NEIVA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INGENIERO DUBARCHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 CLASEMIENTOS 0000 70 00 00



P-1900136-3012005-1-A-107020000-1-20040915 01310042000 02 190101780

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



288124-T

**WILMER ANTONIO
BUITRAGO MURCIA**
C.C. 1075209501

RES. INSCRIPCION 2571 DEL 13/10/2021

**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN**



ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310918

328551

Identificación Pública S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentra esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

99710089FF500626

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075209501 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 288124-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27012265
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-07-12

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante
				Empleado
				neiva
				8641497

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
12105775	POLANIA	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
RAMIRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 06		Año: 2023	Mes: 07	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES			Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
19			\$12.644.004		27012265	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO														Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cód	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres					Salario Básico
CC-1033689852	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	AGUIRRE ALONSO LUIS CARLOS					\$1.160.000
CC-1010229547	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	BARBOSA DIAZ DYLAN BRANDON					\$1.160.000
CC-1075286597	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	BERNEO SILVA GEOVANNY					\$1.160.000
CC-7144894	01	No	No	No	41	1	5452201	Fijo	BORRERO ARAGON CAMILO LEIVER					\$1.160.000
CC-79213874	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	BUTRAGO MUÑOZ OSCAR JULIAN					\$1.160.000
CC-1233489884	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	CARDENAS BUENO JAIME ALEXANDER					\$1.160.000
CC-1073692346	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	CASALLAS REMICIO LUIS FELIPE					\$1.160.000
CC-70465561	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	JIMENEZ JIMENEZ SIGIFREDO DE JESUS					\$1.160.000
CC-12137786	01	No	No	No	41	1	5452201	Fijo	JOVEN YUSTRES ALEXANDER					\$1.160.000
CC-1014308059	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	LOPEZ PANCHE MILLER STEVEN					\$1.160.000
CC-1075285374	01	No	No	No	41	1	5452201	Fijo	MONTEALEGRE SILVA JUAN FELIPE					\$1.160.000
CC-19279709	01	5	No	No	11	1	5452201	Fijo	MORENO PANCHI RAMON					\$1.160.000
CC-1030666332	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	MUÑOZ BARRERA JEAN CARLOS					\$1.160.000
CC-79530586	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	MUÑOZ VALENCIA RICARDO					\$1.160.000
CC-1075238943	01	No	No	No	41	1	5452201	Fijo	POLANIA BERNAL ELKIN RAMIRO					\$1.160.000
CC-19374808	01	5	No	No	11	1	5452201	Fijo	PRIETO LEAL LUIS ALCIDES					\$1.160.000
CC-795329049	01	No	No	No	11	1	5452201	Fijo	RODRIGUEZ ACOSTA OMAR FERNANDO					\$1.160.000
CC-19448354	01	No	No	No	25	754	5452201	Fijo	RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR					\$1.160.000
CC-1136883799	01	No	No	No	41	1	5452201	Fijo	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA					\$1.160.000

NOVEDADES													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D A S E P P P	T T T V S P	Fecha Nov Vsp	V S L T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 1033689852	X	2023-06-28											
CC - 1010229547	X	2023-06-13											
CC - 1075286597	X	2023-06-20											
CC - 7144894													
CC - 79213874													
CC - 1233489884	X	2023-06-28											
CC - 1073692346	X	2023-06-20											
CC - 70465561	X	2023-06-13											
CC - 12137786													
CC - 1014308059	X	2023-06-20	X	2023-06-21									

[illegible]

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1033689852	PORVENIR	3	\$116.000	0.1600000	\$18.600	\$0	\$0	\$18.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1010229547	PORVENIR	18	\$696.000	0.1600000	\$111.400	\$0	\$0	\$111.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1075286597	PROTECCION	11	\$425.334	0.1600000	\$68.100	\$0	\$0	\$68.100	\$0	\$0	\$0
CC - 7144894	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 79213874	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1233489884	PROTECCION	3	\$116.000	0.1600000	\$18.600	\$0	\$0	\$18.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1073692346	PROTECCION	2	\$77.334	0.1600000	\$12.400	\$0	\$0	\$12.400	\$0	\$0	\$0
CC - 70465561	PROTECCION	18	\$696.000	0.1600000	\$111.400	\$0	\$0	\$111.400	\$0	\$0	\$0
CC - 12137786	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1014308059	PORVENIR	2	\$77.334	0.1600000	\$12.400	\$0	\$0	\$12.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1075285374	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 19279709	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1030666332	PORVENIR	18	\$696.000	0.1600000	\$111.400	\$0	\$0	\$111.400	\$0	\$0	\$0
CC - 79530586	PORVENIR	18	\$696.000	0.1600000	\$111.400	\$0	\$0	\$111.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1075238943	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 19374808	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 79539049	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 19448354	PROTECCION	11	\$425.334	0.1600000	\$68.100	\$0	\$0	\$68.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1136883799	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor	EG	Núm Aut Lic	Valor	Lic	Días Cot as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1033689852	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0		0	\$0		3	\$116.000	10	0.0696000	\$8.100
CC - 1010229547	FAMISANAR	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0		0	\$0		18	\$696.000	10	0.0696000	\$48.500
CC - 1075286597	SANITAS	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0		0	\$0		11	\$425.334	10	0.0696000	\$29.700
CC - 7144894	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 79213874	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 1233489884	SANITAS	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0		0	\$0		3	\$116.000	10	0.0696000	\$8.100
CC - 107362346	FAMISANAR	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	\$0	0	\$0		0	\$0		2	\$77.334	10	0.0696000	\$5.400
CC - 70465561	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0		0	\$0		18	\$696.000	10	0.0696000	\$48.500
CC - 12137786	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 1014308059	EPS-S CAPITAL	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	\$0	0	\$0		0	\$0		2	\$77.334	10	0.0696000	\$5.400
CC - 1075285374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 19279709	SANITAS	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0		0	\$0		11	\$425.334	10	0.0696000	\$29.700
CC - 1030666332	EPS-S CAPITAL	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0		0	\$0		18	\$696.000	10	0.0696000	\$48.500
CC - 79530586	SALUD TOTAL	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0		0	\$0		18	\$696.000	10	0.0696000	\$48.500
CC - 1075238943	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 19374808	FAMISANAR	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	\$0	0	\$0		0	\$0		2	\$77.334	10	0.0696000	\$5.400
CC - 79539049	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800
CC - 19448354	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0		0	\$0		11	\$425.334	10	0.0696000	\$29.700
CC - 1136883799	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0		0	\$0		30	\$1.160.00 0	10	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAMISCALES

Identificación	CCF	Días Cot as CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1033689852	CAFAM	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010229547	CAFAM	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075286597	CAFAM	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7144894	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79213874	CAFAM	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1233489884	CAFAM	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1073692346	CAFAM	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-70465561	CAFAM	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12137786	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1014308059	CAFAM	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075285374	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-19279709	CAFAM	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030666332	CAFAM	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79530586	CAFAM	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075238943	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-19374808	CAFAM	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79539049	CAFAM	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-19448354	CAFAM	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1136883799	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										TOTAL PAGAR		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	6	\$550.800	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$3.200	\$0	\$0	\$554.000	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
COLFONDOS	3	\$556.800	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$3.200	\$0	\$0	\$560.000	
GOLPENSIONES	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$2.200	\$0	\$0	\$373.400	
PROTECCION	6	\$464.200	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$2.700	\$0	\$0	\$466.900	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S CAPITAL	2	\$31.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$31.00 0	5	\$200	\$0	\$31.20 0	\$0	0	\$0	\$0	\$31.20 0	\$0	\$0	\$31.20 0
SALUD TOTAL	1	\$27.90 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$27.90 0	5	\$200	\$0	\$28.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$28.10 0	\$0	\$0	\$28.10 0
EPS-S COOSALUD	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	5	\$300	\$0	\$46.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.70 0	\$0	\$0	\$46.70 0
NUOVA E.P.S. S.A.	4	\$96.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$96.10 0	5	\$600	\$0	\$96.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$96.70 0	\$0	\$0	\$96.70 0
EMISANAR	3	\$34.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$34.10 0	5	\$200	\$0	\$34.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$34.30 0	\$0	\$0	\$34.30 0
SANTAS	8	\$270.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$270.9 00	5	\$1.600	\$0	\$272.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$272.5 00	\$0	\$0	\$272.5 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIGUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	19	\$881.100	0	\$0	\$0	\$881.100	5	\$5.100	\$886.200	0	\$0	\$8.862	\$886.200

TOTAL APORTES PARA FISCAL					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$232.000	5	\$1.400	\$233.400
CAJAM	14	\$274.400	5	\$1.600	\$276.000
SENA	0	\$0	5	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	5	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	5	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	5	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$509.500
PENSIONES	4	\$1.954.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$886.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$509.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.859.400

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante
				Empleado

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
12105775	POLANIA	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
RAMIRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
6		\$5.374.667		28409966	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-7144894	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	BORRERO ARAGON CAMILO LEYER		\$1.160.000
CC-70465561	01	No	No	No	11	1	5429001	Fijo	JIMENEZ JIMENEZ SIGIFREDO DE JESUS		\$1.160.000
CC-12137786	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	JOVEN YUSTRES ALEXANDER		\$1.160.000
CC-1030666332	01	No	No	No	11	1	5429001	Fijo	MUÑOZ BARRERA JEAN CARLOS		\$1.160.000
CC-1075238943	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	POLANIA BERNAL ELKIN RAMIRO		\$1.160.000
CC-1136883799	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA		\$1.160.000

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R T	Fecha Ret	T T D A D E	T T V P	Fecha Nov	V V S T S L E T N	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Ige	Fecha Ige	Fecha Lma	Fecha Lma	Fecha V A C	Fecha V A C	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha I R P	Fecha I R P	Fecha I R P	Fecha I R P	Fecha I R P	Fecha I R P
CC - 7144894																							
CC - 70465561																							
CC - 12137786																							
CC - 1030666332																							
CC - 1075238943																							
CC - 1136883799																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret	
CC - 7144894	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	
CC - 70465561	PROTECCION	18	\$696.000	0.1600000	\$111.400	\$0	\$0	\$111.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 12137786	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	
CC - 1030666332	PORVENIR	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0	
CC - 1075238943	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	
CC - 1136883799	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7144894	SANITAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	10	0.06960000	\$80.800
CC - 70465561	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$696.000	0.04000000	\$27.900	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$696.000	10	0.06960000	\$48.500
CC - 12137786	SANITAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	10	0.06960000	\$80.800
CC - 1030666332	EPS-S CAPITAL	1	\$38.667	0.04000000	\$1.600	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$38.667	10	0.06960000	\$2.700
CC - 1075238943	SANITAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	10	0.06960000	\$80.800
CC - 1136883799	SANITAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	10	0.06960000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7144894	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-70465561	CAFAM	18	\$696.000	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12137786	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030666332	CAFAM	1	\$38.667	0.0400000	\$1.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075238943	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1136883799	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.000	\$0	\$0	\$186.600
PROTECCION	1	\$111.400	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$600	\$0	\$0	\$112.000
PORVENIR	2	\$191.800	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.000	\$0	\$0	\$192.800
COLFONDOS	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.900	\$0	\$0	\$373.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÓM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES COT UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES	RADICACION AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S CAPITAL	1	\$1.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.600	5	\$100	\$0	\$1.700	\$0	0	\$0	\$0	\$1.700	\$0	\$0	\$1.700
SANTITAS	4	\$185.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$185.600	5	\$1.000	\$0	\$186.600	\$0	0	\$0	\$0	\$186.600	\$0	\$0	\$186.600
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$27.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$27.900	5	\$200	\$0	\$28.100	\$0	0	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPatria	6	\$374.400	0	\$0	\$0	\$374.400	5	\$1.900	\$376.300	0	\$0	\$3.763	\$376.300

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES				INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		COMFAMILIAR DEL HUILA	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
CAFAM	4		\$185.600	5		\$1.000	\$186.600
	2		\$29.500	5		\$200	\$29.700
SENA	0		\$0	5		\$0	\$0
ICBF	0		\$0	5		\$0	\$0
ESAP	0		\$0	5		\$0	\$0
MinEdu	0		\$0	5		\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$216.400
PENSIONES	4	\$864.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$376.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$216.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.673.500



Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	Teléfono	(608) 8671300
Dirección	Carrera 4 Calle 8 esquina	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2023, 18:14
Expedición	29/12/2023, 18:15
Vencimiento	12/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Costo directo contrato de obra publica 1071 de 2023. Objeto: CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA,	1.00	17,850,000.00	0 %	17,850,000.00
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	6,120,000.00	0 %	6,120,000.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	255,000.00	0 %	255,000.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,275,000.00	0 %	1,275,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Veinticinco millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-12 por \$ 25,500,000.00

Total Bruto	25,500,000.00
Total a Pagar	25,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764043395041 aprobado en 20230126 prefijo RI desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4
CUFE: 20b0a60ab0d5cf86cfc167ea8ee0b14f6a55da6e5d9fc9260a1980e90e743fee5bc43bc89f30fdf561ca2ac0260d5437
