



SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

NIT. 900.389.180-2

Bogotá D.C, 07 de junio de 2023

SPLI-BOS-23-0630

Señores:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA No.508-2023- CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

ASUNTO: ALCANCE AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0623 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 8 V0 DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

Respetados señores,

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No 510-2023, nos permitimos remitir alcance al comunicado SPLI-BOS-23-0623 con asunto INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No 08 del periodo de tiempo comprendido entre el 01 mayo al 31 de mayo de 2024.

Lo anterior se remite con el fin de ser revisado y aprobado por parte de la supervisión designada por el FDLB, tal como lo establece el contrato de interventoría.

Agradecemos su atención y nos encontramos atentos a posibles comentarios

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL

Representante legal

Elaboró: JR

Anexo: 01 Carpetas (165 folios)

01 CD

ANEXO 1.
BITÁCORA DE OBRA

DESARROLLO LA PORTADA 07-299

La Portada. 07/299.

01-05-2024

Continúan con la lijada de baranda y estructuras de futbol y Basquetbol, tubería o parales de malla. Contra impacto. Retiro de mallas para Cambio.

lluvias en la tarde y noche. Jemelle.

02-05-2024

Continúan con la lijada de baranda estructura de futbol y Basquetbol, se lijan las tuberías de las mallas. Contra impacto.

personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la tarde. Jemelle.

03-05-2024

Continúan con lijada de parales de malla. Contra impacto.

personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la mañana. ateniendo las pinturas. Jemelle. Lijado

04-05-2024

se continua con la lijada de parales

de malla contra impacto, y estructuras.
de futbol y baloncesto.

Personal en obra: 1 Oficial 3 Ayudantes.

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana. *fernand*

07-05-2024.

Se Continúa con Arreglo de Mallas y pintura
en barandas y estructuras.

Personal en obra: 1 Oficial - 3 Ayudantes

Estado del tiempo: Lluvias intermitentes. *fernand*

08-05-2024

Se Continúa Con lijada de Mallas para
pintura, se inicia la excavacion para
pilotes. para la malla lateral.

Personal en obra: 1 Oficial 1 Ayudante,

Cordilla de City play.

Estado del tiempo: Lluvias en la tarde y noche. *fernand*

09-05-2024

Continúan Con la lijada de estructuras
y Pintura de anticorrosivo.

Personal en obra: 3 Ayudantes.

Estado del tiempo: Seco Lluvias en la
tarde. *fernand*

10-05-2024

Continúan Con excavaciones para fondos
pilotes de Ceramiento lateral.

Pintura de Estructuras, INSTALACION BALANCI,
Personal en obra 3 Ayudantes. *Peru*

Estado del tiempo lluvias en la tarde
y noche. *Peru*

11-05-2024

Continúan Con excavaciones para fondos
pilotes de Ceramiento lateral

Pintura de estructuras, MANTENIMIENTO BALANCI,
personal de obra 3 Ayudantes *Peru*

estado del tiempo: lluvias en la mañana.
Peru

13-05-2024.

DIA FESTIVO NO SE REALIZAN. ACTIVI-
DADES. *Peru*

14-05-2024.

REMATE ANDEN CONCRETO, CORTES DIA
TACIONES CONCRETO, CON LUBRICANTES DE
LA NOCHE ANTERIOR LAS EXCAVACIONES

SE LLENAN DE AGUA, SE RETIRA
ESTA AGUA Y EN TALLER SE AGUAMAN
ESTRUCTURAS PLOTTINES PARA MALLA
LATERAL

HUOIO EN LA TARDE Y TODA LA NOCHE
Polica

15-05-2024.

HUOIO NOCHES ANTERIORES, EN LA TARDE
CLIMA SECO *Polica*

16-05-2024:

CLIMA SECO EN CE DIA, EN LA TARDE
SE PLACENTAN HUOIO FUERTES A
LUNA, SE FUNDEN PLOTTINES PARA
INSTALACION MALLA. LA TELA CAMBIA
Polica

17-05-2024.

A SED GENERAL, EL DIA 16/05/2024.
SE RETIRA ESCOMBRO QUEDANDO EL
PARQUE LIMPIO, SE SOLICITA LA INTERVEN
TORIA. REVISAR TEMA DE PINTURA ANTERIO
RES VIGA Y BANCO Y PINTURA BANCO

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
ANTES DE LA ENTREGA DEL PAQUETE

[Signature]

20-05-2024

INSTALACION BARRANDA EN ZONA
DE JUEGO DIA 16/05

[Signature]

21-05-2024

CONTINUUM ACTIVIDADES INSTALACION
BARRANDA

[Signature]


22-05-2024

DE ACUERDO A LO COMUNICADO EN
COMITE ANTERIOR. (#35 MAYO 15/2024),
REVISANDO POR PARTE DEL COM.
TERRITARIA UBICACION JUEGO CASITA
INSTALADO (SEGUN IMPLANTACION
APROBADA X INTERVENTORIA) Y
LA INSTALACION DE JUEGO BALAN-
CIN. Adicional Instalado.
Aprobado tanto por interven-
toria como por la entidad.
(COMITE MAYO 8/2024), ESTE
JUEGO SE INSTALO EL DIA 9/05/2024

Actividad se debe seguir
teniendo se debía definir
la intervención de mal
al contratista para que
se realicen las actividades.

teniendo en cuenta la dis
ponibilidad del proveedor
con el personal, se define
nueva ubicación al igual
que los remates del piso en
caudal afectado
se adelanta actividad
ubicado en malla contra
impacto
según comité #36 (22-05-2006)
DISEÑO PISO GIMNASIO DE ACUA
DO AL REALIZADO POR QUE
JOLE MARIA CARBONEL 07-044.

[Signature]



ANOTACION DE INTERVENCIÓN.

En repetidas ocasiones se ha solicitado al contratista de obra el ajuste de la cancheta o andén concreto construido toda vez que esta presenta empizamientos y pendientes transversales de mucha de fuertes. Además se hizo llamada de atención por afectaciones físicas a plaza de la cancha en procesos de fundida de elementos en concreto.

[Signature]
24-05-2024

SE ABANDONA OBSERVACION DE INTERVENCIÓN

VENTORIA. SE adelantan actividades balnearia zona de juegos, instalación gimnasia, pinturas plus gimnasia. BIA. Tolado *Castillo*

ANOTACION DE INTERVENTORIA
Se le indica al Contratista de obra que debe acogerse a especificaciones 1000 y Distrito para la instalación de barandas en zona de juegos infantiles ya que se evidencia que la ahora es mas baja de lo que indican las especificaciones. Se solicita valular y ajustar de ser necesario. Se evidencia instalación de basquetables y llegada de materiales para pintura de piso en area de basquetables. *J. P.*

26/05/2024 - ANOTACION INTERVENTORIA.
Personal: Cuadrilla por trabajo y Tiquelante
Se evidencia ejecución de pintura de zona de basquetables. Se encuentra instalada

lindo la reciba. Se evidencia a un agente
llevando cerramiento contraimpacto se le dan
indicaciones a contratista de obra, con respecto
a la huella y limpieza de cerramiento contra
impacto. De evidencia que la base del
Lunetter no descansa sobre el piso por
lo que se le indica al contratista de
obra, que este se encuentra mal instala-
do. fin

27/05/2024

Personal: 4 ayudantes + 1 BOA + Cuadrilla de
— Pintura zona de bioseguridad

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

De evidencia que el diseño de pintura de
la zona de bioseguridad no corresponde al
definido según anotación. del día 25-05-2024
del contratista de obra. se le hace la consulta
al contratista de obra y este indica que
hablara con el personal encargado. Además
de encuentro con que el contratista de
obra esta desmontando el cerramiento

Permanente en una verde. Con respecto
al Corrimiento Contrainterno, de libe-
rreza y grado de estado que
Célula con nejos infantiles y se
encuentra pendiente en estado
Célula con buena habilitación. El Contratista
de obra médica que el día de hoy reali-
za demarcación en la cancha. Sin que se
mieran actividades se le degree voluta
proco. Constructiva. Toda vez que no se
ha realizado el sello de fisuras y la
demarcación existente. Presenta fisura-
ciones que se pueden calcan en la
nueva demarcación. Se le Soluto al
Contratista de obra descripción de las
actividades, personal designado y ficha
técnica de la platera a emplearse.

Los baranda de portada se instalo a la
altura existente. esta baranda existente
se adeco en sus extremos y pinto

y se le dio continuidad para hacer el perimetro
de la zona de juegos. /canelli.

28-05-2024

Se continuo con la pintura de los mallas
contra impacto, Costado de juegos infantiles,
Lijada de Malla y estructura Contra impacto
Costado de Biosaludables.

Se amliar con la interentona trator de Lijar
el piso de la cancha para borrar o retirar
la pintura de la demarcación existente
y poder demarcar la cancha.

Se termina la pintura de la zona de Bio-
Saludables con skate master.

Personal en obra: 3 Ayudantes de C y D.

3 Ayudantes de Contratista general.

Estado del tiempo lluvias en la tarde. //
/canelli.

29-05-2024

Continuamos con la pintura de mallas contra
impacto, Estructura de baloncesto, Estructura
de Micro futbol, pintura de piso de cancha
(Demarcación) instalación de Malla lateral

Religiosos en general, instalacion de Señales
personal en obra 2 oficiales 5 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco, lluvias en la
tarde. Jueves.

20-05-2024

Continuan con pinturas en mallo Contas
impacto, pintura de estructuras de bolon-
canto y microfútbol, Demarcacion en
la Cancha, instalacion de Señales
IDES-80 y escombros.

personal en obra: personal de City phy
2 ayudantes, 2 oficial y 3 Ayudantes
del Contratista.

Estado del tiempo: Seco Jueves
Nota: Se toman medidas en terreno dandonos
Cuenta que la Cancha no es totalmente
Rectangular, y la demarcacion está hecha
con la escuadra que hay en Cerda Arco.
por esta razón esta demarcacion quedo
torcida en Compaña del residente de
interventoria Se toman algunas decisiones
para poder mejorar su apariencia.

personal en obra 2 oficiales 5 Ayudantes
1 Caratilla de City play. ^{se mudó a}
DIA SGO Llegó en la tarde y
Noche. *[Signature]*

31-05-2024

SG CONTINUAN ACTIVIDADES DE
PINTURA MALLA, ESTRUCTURA DE.
PORTION, DEMARCACION, REMATE
PINTURA CERRAMIENTO LATERAL,
PINTURA DE BANCOS, INSTALAC. SOTAVES
DIA DISEÑO. *[Signature]*

01-05-2024

Continúan Con la lijada de baranda
y estructuras de futbol y Bas
quetbol, tuberías o parales de malla
Contra impacto. Retiro de mallas
para Cambio.
Lluvias en la tarde y noche fuerte.

02-05-2024

Continúan Con la lijado de baranda
estructura de futbol y Basquetbol, se
lijan las tuberías de las mallas
Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Lluvias en la tarde
fuerza v.

03-05-2024

Continúan Con lijado de parales de malla.
Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Lluvias en la mañana
atacando las pinturas. fuerte trabajo

06-05-2024

se continua Con la lijado de parales

DESARROLLO BOSA LINDA
(HILDEBRANDO OLARTE)
07-002

Bosa /mda 07/002.

encuentra en contacto con el piso y el material de base de la placa se ha encontrado a la intemperie y expuesta a las condiciones climáticas, generándose asentamientos diferenciales de material.

1-05-2024.

En la noche anterior se presentó lluvia permanente y el día de hoy reporte de lluvia día y noche, situación que afecta actividad de rellenos

2-05-2024

Por lluvia del día anterior se ven afectada actividad de rellenos compactación y toma densidades continua desmonte cerro miento.

De acuerdo revisión ítem para construcción cerro m.

27/5
LATERAL CON DILATORIA DE INTER
VENTORIA, NO EJECUTAR ACTIVI
DAD NO PREVISTA, REALIZAR
CERRAMIENTO DE ACUERDO
ITEM CONTRACTUAL APROBADO
POR ETAPA DE DIAGNOSTICO
SE PROCEDE A FABRICACION
CERRAMIENTO MALLA ESCARPO
NADA 2.50 MTS.

DIA SECO LUVIO INTERMITEN
TES, LUVIO NOCHE

3-05-2024

POR LA PRESENCIA LUVIO NOCHE
ANTERIOR NO SE PUEDE ENGE
CULAR OBRA EN SONDEROS
AFECTANDO ACTIVIDADES DE
COMPACTACION Y DENSIDAD
SE TERMINA DESMONTAJE CERRAMIENTO
LUVIO TARDE Y NOCHE

4-05-2024

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
EN SONDEROS INUNDADOS POR

11:00 AM NOCHE ANTERIOR, FE
HACE CARQUE CERRAMIENTO
DESMONTADO, HACIA GESTOR
APROBADO

5-05-2024.

SE PROGRAMA REALIZAR ACTIVI-
DAD LAS CUALES NO SE PUEDEN
EJECUTAR POR LLUVIA TODO EL
DIA Y LA NOCHE

6-05-2024.

POR LLUVIA NOCHE Y DIA
ANTERIOR LA ZONA DE
SENDERS SE ENCUENTRAN
INUNDADA, NO SE PUEDEN EJECUTAR
ACTIVIDADES DE COM-
PACTACION Y DENSIFICACION
A PESAR QUE EL DIA FUE
SOLARADO, LA ZONA SIGUE
SIENDO INUNDADA SE SACA
AGUA TODO EL DIA

07-05-2024

Se demuele la zona de biosolubles

49

por tema de lluvias se atazan las actividades de toma de densidades en la zona de placas. Continúan quitando Cimentado personal en obra 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Lluvias en la tarde y noche. Jermell

08-05-2024

Continúan las compactaciones saturadas de Agua por lluvias.
personal sacando Agua 2 personas
Estado del tiempo: Seco Jermell

09-05-2024

Continúan Con demolición de placa personal en obra 2 ayudantes.
Estado del tiempo: Seco y lluvias en la tarde Jermell

10-05-2024

Continúan Con demolición de Concreto personal en obra 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Jermell

11-05-2024

Continúan Con demolición de Concreto

39
y se saca Agua en la zona de gradas
personal en obra a Apique 3 Apolones.
Estado del tiempo: lluvias en la mayoría
ferril

14-05-2024.

lluvia noche anterior, tarde.
lluvia 3:15 pm y toda la noche
se afectan obras de rellenos
andeno, se verifica que se
termina la demolición placa
gimnasia, se retira agua zona
de andeno, se clarifica mate
rial granular

15-05-2024. lluvia noche ante-
rior, tarde clima seco se reti-
ra exceso de agua en zona
andeno.

16-05-2024. clima seco, lluvia
en la tarde se perfila terreno
para fundida placa conexión
canchales, se demuele exceso
muros en la viga existente para

AD

FUNDADA DE PLACAS PLANTE CANCHA
SE RETIRA CINTA EN ~~Planta~~
CONCRETO MURO EXISTENTE PARA
INSTALACION CERRAMIENTO, SE
SOLICITA A INTERVENTORIA
VISITA PARA REVISAR TRAMAS
DE MURO DE CERRAMIENTO QUE
SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
EN VISITA DE OBRA SE ENCON-
TRA QUE LA CAÑUELA EXISTENTE
QUE RECOGE AGUA LLUVIA
CANCHA MICROFUTBOL, SE EMPO-
ZA EL AGUA, A LAS RAMAS QUE
ESTA CAÑUELA Y NO FUNCIONA
MUYTO Y ACABADO NO LIGO
PARTE DEL MANTENIMIENTO Y
OBRAS APROBADAS AL CONTRA-
FISCA. SE ESTA REALIZANDO EL
RETIRO DE CERRAMIENTO MALLA OLA
BOHADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE
LINDA CON CONCRETO AL MURO EXIS-
TENTE, SE SOLICITA A INTERVENTORIA

41
REVISAR Y VERIFICAR GTA ACTIVIDAD.
QUE LO REENCUENTRA CONTEN-
PLADA DENTRO DE LA ACTIVIDAD
Y APO CONTRACTUAL *Quiter*
17-05-2024 CONTINUA RETIRO
MALLA. EMBEBIDA A COCCION
Y MODO CERRAMIENTO Y DEMO
LIZION DE CINTA SOBRE MODO.
PERFILADA ZONA VERDE
SOBRE LAS SENDAS ADOQUIA
18-05-2024 CONTINUA. *Quiter*
RETIRO CERRAMIENTO EN MALLA.
EMBEBIDO AL MODO *Quiter*

20-05-2024

MATERIAL EXISTENTE GIMNASIO
2041 (7.1)

SE REVISAN NIVELES Y COMPAC-
TACION PARA TOMA DE USI-
DADO ZONA GIMNASIO
SE TOMAN DENSIDADES
EN CANTON COCCION ANGOLA

B-400 PROCTOR 2032 W = 8.5

B-600 PROCTOR 2054 $h = 7.9$

RESULTADO DENSIDADES:

FONDADO GRADO #1: 101% OCC
" " #2: 98.4% Orient
" " #3: 97.8% NO-ORIENT

SENDERO CONEXION: 96.3%.

SE PROGRAMA CONCRETO 21/05/2024
DIA SECO *[Signature]*

21-05-2024.

SE DA COMPACTACION ZONA
BIODIVERSIBLE Y SE ALISTA
PARA CONCRETO

EL DIA DE HOY SE PROCEDE
A FUNDIR PLACAS ANDENOS.
CANCHA, CON EL ACOMPA
ÑAMIENTO DE INTERVENIENTOS.
DIA SOLEADO *[Signature]*

SE RETIRA COMO REPUSTANTE
AREO GENERAL. *[Signature]*

22-05-2024

DESCRIPCION Y NIVELACION
ZONA BIODIVERSIBLES, COMPAC
TACION PARA TUMA DENSIDADES.

PROCTOR 2041 (7.1) RESULTADO.
96.3.1.


RECORRIDO COMITE # 36 (22-01-2024)
INTELIGENTORIA REALIZA RE-
COMENDACIONES. FUNDIDAS
PLACA CONCRETO.

EN CUANTO A CONFINAMIENTO
SE CONSIDERO CONEXION CANCHA
A LA FERIA NO HABIA HDO
DEFINIDO NI POR CONTRATISTA
NI RECOMENDADO POR INTERU
POR PARTE DEL CONTRATISTA
SE PROPUISO REALIZARLO
IGUAL AL EXISTENTE EN TODO
EL PARQUE EN LOS SONDE-
ROS EXISTENTES EN ADOQUIN
DE ARCILLA (ACERACION)
EL DISEÑO DEL PARQUE TODA
ESTA EN CONFINAMIENTO DE
ESTE TIPO. LA UNICA ZONA
CONFINADA CON BORDILLO A-
GIMNASIS Y VIGA CONCRETO.

Zona de juego, el comité
 exige que las especifica-
 ciones IDRD se tienen que
 cumplir para todas las
 obras y que te tiene que
 instalar bordillo A-80 se
 revisará esta propuesta y
 otra más para presentarla
 interventora. De parte del
 contratista se ejecutará
 la propuesta aprobada
 pero si se deja claridad
 que durante el tiempo
 que te estas realizando ac-
 tividades en otros senderos
 y en el caso de las zonas
 visitadas de inspección x parte
 de la interventoría no te
 habrán tenido observaciones
 sobre el tema de confina-
 miento. De acuerdo a las
 instrucciones de comité.

46

DISÑO Y PISO gimnasios
DE ACUERDO ALYA GEGU.
hado Parque Jole Maria
Carbonell. 09-044.
DIA SOLGADO *[Signature]*

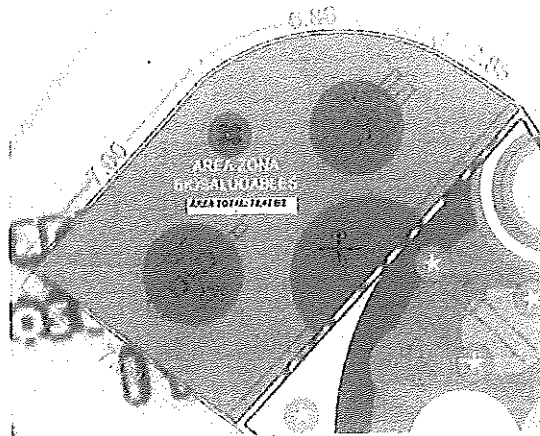

23-05-2024.

DE ACUERDO A LA PROPUESA PARA
CONTINAR SONDEAS CONEXION.
CANCHA Y. TENIENDO LA CARRERA
FOE EL CONTRATO LEGA QUE
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
DE PARQUES VECINALES Y DE
BOLILLO DEBEN CUMPLIR

49
Especificaciones IDRI, se instalara
Bordillo A-BO en ambos sentidos.

ANOTACION DE INTERVENCIÓN.

El día 22/05/2024 día en el cual
se estaba interviniendo el sendero
de conexión con la cancha desde
la entrada. El contratista presento
alternativa de confinamiento a la 7:30am
por ende no se había definido el mismo.
esta alternativa se exprese por whatsapp
sin justificación ni descripción.

24-05-2024.

En vista de los acuerdos a la
alternativa de dar cumpli-
miento a la especificaciones
técnicas. Instalación Bordillo
A-BO se da inicio actividad
de EXCAVACION DIA SOTAPO

ANOTACION DE INTERVENCIÓN
atendiendo solicitud de Contratista de
obra se valda mal estado en algunos.

partes del muro Perimetral del Parque,
y se solicita al Contratista presentar
metraje y alternativa de intervención
del muro. Se evidenciará actividad
de excavación para bordillos de
confinamiento de sendero que
conecta entrada con cancha de
micro fútbol

Personal: 2 ayudantes
25/05/2024

Personal: 2 ayudantes

ANOTACION DE INTERVENCIÓN.

Se evidencia ejecución de actividad
de excavación para instalación de bordillo
en sendero que conecta entrada
27/05/2024.

Personal: 2 ayudantes

ANOTACION DE INTERVENCIÓN.

Continúan actividades de excavación en
sendero que conecta entrada con la
cancha para instalación de bordillo
prefabricado - A-80.

28-05-2024

Se Continúa con la Parada de la placa en Concreto, Se Continúa con la excavación para instalación de bordillo A-80.

personal en obra 1 Oficial 1 Ayudante.
Estado del tiempo: Seco. J. M. S. L.

29-05-2024

Se hace excavación para instalación de bordillo A-80, INSTALACION JUEGO INFANTIL

Estado del tiempo: Seco. Lluvias en la tarde
J. M. S. L.

30-05-2024

Se hace excavación para instalación de bordillo A-80, INSTALACION JUEGO INFANTIL SE TERMINA
personal en obra 1 Oficial - 1 Ayudante. J. M. S. L.
HUBO TRABAJO Y NOCHE. J. M. S. L.

31-05-2024

SE REALIZA RETIRO DE ESCOMBRO
Y SE DA INICIO A LA INSTALACION
BORDILLO EL DIA DE AYER SE REALI-
ZARON CORTO PLACA DE CONCRETO
Y SE TERMINO INSTALACION.

50

JUEGO INFANTIL DIA FOLGADO
Proble

URBANIZACION EL REGALO
07-007

El regalo 07/007

Necesario emplear mas personal y maquina
el material. Se solicita al contratista de
la demolición de áreas donde empleo sepi
para calentar el asfalto, especialmente en
de los arcos de micro futbol. *Redo*

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

Se solicita al contratista de obra por
de terminación de actividades de limpieza
Sin embargo, el no refiere de la obra de
arresto de arco de micro futbol que
no afectado en proceso constructivo.

01-05-2024

DIA FERIADO: HUGO DIA Y
NOCHE. *Redo*

02-05-2024.

REPUESTA ANOTACIONES

INTERVENTORIA 30-04-2024

EL DIA 29-04-2024 VISITA

CON CONTRALORIA. DUBIE

CON EVIDENCIA PERSONAL

5 PERSONAS OBRAS, 1 CACHORI

MATERIAL BASE GRANULAR,
OPERARIO, 3 PERSONAS
CERCA MIENTOS, EN CUANTO
A ACTIVIDADES AFALTO COMO
SE HA MANIFESTADO EN COMITO
SE DEBE DAR OPERA A CONTI
NUAL ACTIVIDADES Y NO DEPECU
LAR, CON RESPECTO MARCOS
DE MITAD NO ENTENDEMOS X
QUE LA AMOTACION YA SE HA
COMUNICADO QUE SE VA A HACER
EN CUALQUIER LES RECORDAMOS
SE RETIRARAN, SE HARA MANTENI
MIENTO Y POSTERIOR INSTALACION
EN CUANTO NOTA FECHAS DE
TERMINACION LA AFIRMACION
NO ES VERDADERA PUEDO QUE
SIEMPRE SE HA INFORMADO
DE LA ACTIVIDAD Y SE HA CO
MUNICADO MEDIANTE OFICIO
DE PROGRAMACION DEPENDIEN
DO DE LA CONDICION.

CLIMATICA POR OTRA PARTE
A DIARIO Y DE FORMA CON-
TINUA LE ESTA DANDO INFOR-
MACION A INTERVISTORIA
DE LAS ACTIVIDADES EN EJE-
CUCION, OCARIFICACION, CAM-
BIO DE MATERIALE Y COMPACTA-
CION

DIA FECTO- HUBO EN LA NOCHE
INSTALACION BARRANDA *[Signature]*
[Signature]

4-05-2024:

POR LAS HUBO DIA ANTERIOR
LE SUSPENDEN OBRAS, NO
E POSIBLE COMPACTAR MA-
TERIAL SATURADO.

EL DIA 3-05-2024 SE TERMINA
BARRANDA *[Signature]*
[Signature]

5-05-2024

DIA FESTIVO- HUBO DIA Y
NOCHE *[Signature]*
[Signature]

6-05-2024:

POR LAS HUBO DE FIN DE


SEMANA. NO FUE POSIBLE.
TOMAR DENSIDADES PROGRAMAS-
DAS, SE ESCRIBIA MATERIAL
SE REEMPLAZA MATERIAL
SATURADO SE COMPACTA.
SE TIENEN PROGRAMADOS
DENSIDADES EL DIA DE MAÑANA
DEPENDIENDO DEL CLIMA
DE LA NOCHE
COMO NOTA GENERAL Y ACLA-
RATORIA, DE LAS ACTIVIDADES
QUE SE ESTAN EJECUTANDO
PROGRAMACION DE DENSIDA-
DES. CAMBIOS DE FECHAS POR
CONDICIONES CLIMATICAS SE
DA AVISO A LA INTERVENTORA.
ADENAS LAS ACTIVIDADES SE
HAN VISTO AFECTADAS POR
LLUVIA NO POR FALTA DE
EQUIPO, NI PERSONAL, NI
MATERIAL, COMO SE PUEDE VI-
DENCIAL EN REGISTROS FOTOGRAFICOS

DIA SOLEADO LOS DOS PUNTOS
 QUE DETERMINE ACTIVIDAD
 DE RELLENOS Y COMPACTACION
 SE DA AVISO INTERIOR
 DENSIDAD PROGRAMADA
 7-05-2024 18:30 AM *[Signature]*

7-05-2024

TOMA DENSIDAD B-600

2054
 PROCTOR.

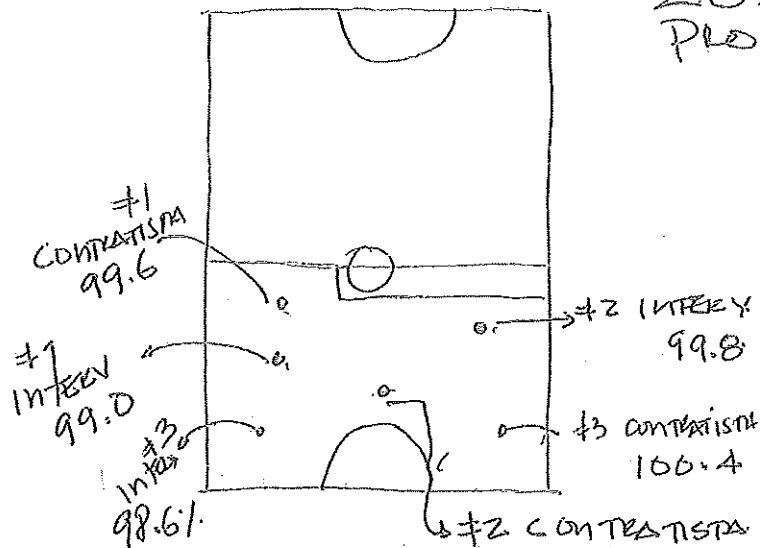

RESULTADOS DE ^{98.7}ACUERDO A
 ESPECIFICACION, SE PROCEDERA
 el dia de hoy A APLICAR IMPUL

mañana en la Cancha en horas de la tarde

personal en obra 1 boal, 5 trabajadores de Panobras, 1 oficial

Estado del tiempo: Seco *feanull.*

8-05-2024

Se inicia la instalación de Asfalto a la 1:30pm por tiras de 3,50 transversales en la Cancha. Se trabajan 15³ por la lluvia en horas de la tarde.

Personal en obra 5 Trabajadores de Panobras, 1 oficial, 1 boal.

Estado del tiempo: Lluvias en la tarde y noche. *feanull.*

9-05-2024

Lluvias fuertes en la mañana afectando la instalación del asfalto, se inicia a las 1:22 pm con la instalación de asfalto.

Personal en obra: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 boal.

Estado del tiempo lluvias intermitentes
en la tarde atrazando las actividades
jeannett

10-05-2024

Por la lluvia en el Sector: se atrasa
la actividad de instalación de Asfalto
en la Cancha, se hace aseo general
personal en obra: L boal

Estado del tiempo: Lluvias intermitentes
en el día y en la noche jeannett

11-05-2024

Lluvias en la mañana 9:30 a 1pm
personal en obra: L boal en aseo general
jeannett

hoy el asfalto se hizo en compañía de
la interventora con Supervisión y sugerencias
atendidos durante el proceso, también se
desmontaron los muros de micro para dar
un mejor acabado en las áreas de la cancha
donde se encuentran instalados. jeannett

21-05-2024.

CONTINUAR ACTIVIDADES MANTENI-
MIENTO DE MALLA; PÉNDIENTE
INSTALACION MARCA DE MICO
PARA EL MANTENIMIENTO.

DIA SOLEDAD *[Signature]*

22-05-2024.

SE SOLICITA INTERVENTORIA.
REVISION UJADA MALA. PARA
CONTINUAR ACTIVIDADES DE
PINTURA.

DIA SOLEDAD *[Signature]*

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

En días anteriores se le manifestó a
Contratista de obra, Jefe de su
resistente de obra y Directora de obra
que no se ha recibido la Subsanación
de observación realizada a asfalto
en arco colindante a vía toda vez
que se encontraron deficiencias
marcadas de la Intervención.

[Signature]

24-05-2024

Personal: Sin Personal

Clima: Soleado.

No se evidencia ejecución de actividades ni personal, se le indica al contratista de obra que aun no se libera actividad de trabajo de cerramiento contemporáneo.

27-05-2024

Se hacen trabajos de Aseo en general
Se tapan huecos de Seales de
pint, Cerramiento del parque. Se
hace limpieza de Sumideros
personal en obra: J Ay, donde.

28-05-2024

Se Continuar tapando huecos de
donde se Colocó la senda y
los polos, rollos de Cerramiento
perimetral.

El personal en obra J Ay, donde
Estado del trabajo y Aseo Junchu

29-05-2024.

Se hacen remotes en general

personal y ayudante

Estado del tiempo Seco y lluvias en la tarde

30-05-2024

Remotes en general incluyen colocar Conector
Sobre el altoparlante donde se instalan el p.m.t.
personal en obra y Ayudante.

DESARROLLO LA CONCEPCION
07-014

18 La Concepcion 07/019

Ver que se evidencia y ayudando, el
Caf es trasladado constantemente para
desarrollo de actividades en otros p
lo que ha limitado el avance en este
frente de obra en específico.

CON RESPECTO A LA MOTIVACIÓN ASISTE
RIOR. DE INTERVENTORIA DEBEN
tener en cuenta que LA ZONA
DE JUEGOS YA SE ENCUENTRA
EXCAVADA Y SE CAMBIA EL
PERSONAL POR EL OFICIAL POR
ZONA DE NIVELES Y COMPACTA
CION

1-05-2024

DIA FESTIVO LLUVIA PERMANENTE
DIA Y NOCHE

2-05-2024

POR LLUVIA NOCHE ANTERIOR
SE VEN AFECTADAS ACTIVIDADES
DE RELLENOS Y COMPACTACION
DENSIDAD Y CONCRETO PROGRA

MAÑO, EN EL DÍA SE REALIZA
ACTIVIDAD ESCARIFICACION Y
COMPACTACION ZONA DE JUEGOS.
INICIA CEREMONIA *Asistido familia*
BARANDA. DÍA SECO. NOCHE LLOVIÓ *Asistido familia*

3-05-2024

POR LO LLOVIÓ DÍA ANTERIOR SE
SUSPENDEN DENSIDADES Y COM-
PLETO PROGRAMADO; LLOVIÓ
TARDE Y NOCHE, SE ESCARIFI-
CA MATERIAL SATURADO Y
SE COMPACTA *Asistido familia*

4-05-2024

POR LLOVIÓ NOCHE ANTERIOR
NO SE EJECUTAN OBRAS DE COM-
PACTACION, SE RETIRA AGUA
TODA LA MAÑANA, ESCARIFICA
Y COMPACTA ZONA MÁS SATU-
RADO LLOVIÓ TARDE Y NOCHE *Asistido familia*

5-05-2024

PROGRAMA ACTIVIDADES DIA.

FESTIVO, NO SE PUEDEN EJE-
CUTAR TRABAJOS TODO EL DIA
Y NOCHE. *[Signature]*
6-05-2024.

AREA JUEGO SATURADA
POR LLUVIA DIA Y NOCHE.
ANTERIOR, OSCARIFICA,
REEMPLAZA MATERIAL
COMPACTACION DIA
SOLEADO *[Signature]*

SE PROGRAMAN OBRAS
7-05-2024, CONFIRMAN
DE ACUERDO AL CLIMA
NOCHE, SEGUN RESULTADO
SE PROGRAMA CONCRETO
PLACA 7-05-2024. *[Signature]*
8-05-2024.

ESCARIFICACION Y NIVELES
PARA NIVELAR Y DENSIDADES.
CLIMA SECO. HASTA 5:00 PM.
INICIAN LLUVIA *[Signature]*

9-05-2024.

lloviznas noche anterior y en
la mañana hasta 10:57 am
se inundó zona de juegos

[Signature]
Jennell.

10-05-2024

Se saca el agua en la zona de
juegos
personal: 1 ayudante

Estado del tiempo: lluvias en la
mañana: *[Signature]*
Jennell.

11-05-2024

Se continúa sacando agua de
fluvia en zona de juegos
personal en obra 1 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la
mañana *[Signature]*
Jennell.

14-05-2024.

por lo lluvioso noche anterior
y la tarde del día de hoy se

CON AFECTACIÓN LCO. ACTIVIDADES EN
ZONA DE JUEGOS NO SE PUEDE EN LA
ZONA ACTIVIDADES *Problema*

15-05-2024

LLUVIA NOCHE ANTERIOR, TARETA
CLIMA SECO. SE HACE AGUA
EMPONZADA, SE REALIZAN DETA-
QUE SUPERFICIALES PARA EVA-
CUAR EL AGUA Y LOGRAR ME-
JORAR HUMEDAD DEL TERRENO

16-05-2024 CLIMA SECO LO QUE
FACILITA ADE LANTAR ACTIVI-
DADES, SE OCUPA FILA ZONA

PAVIMENTADO SE HACE CAMBIO
DE MATERIAL GRANULAR *Problema*
17-05-2024

LLUVIA HAY EN LA NOCHE NO
AFECTA ACTIVIDADES, SE REALIZA
GRANIFICACIÓN, RELLENOS Y COM-
PACTACIÓN ZONA DE JUEGOS
CLIMA SECO *Problema*

18-05-2024


CLIMA SECO SE CONTINUA CON
COMPACTACION ZONA DE JUEGOS
PARA TMA DENTRADO 20-05-
2024 Y PROGRAMACION CONCRETO.

ACABACION: EL ADOBO ~~para~~
QUE SE DESMANTO SE ENCONTRABA
HUNDIDO EVIDENCIADO DE DIA
NOSTRO ~~para~~ SE SOLICITA VISITA

20-05-2024

INTERVENCIÓN PARA
DEFINIR DÍAS A DESMANTAR
ADQUISICIÓN

DIA SECO CONTINUA COMPACTACION
ZONA DE JUEGOS, PROPUESTA DISTRIBUCION GIMNASIO

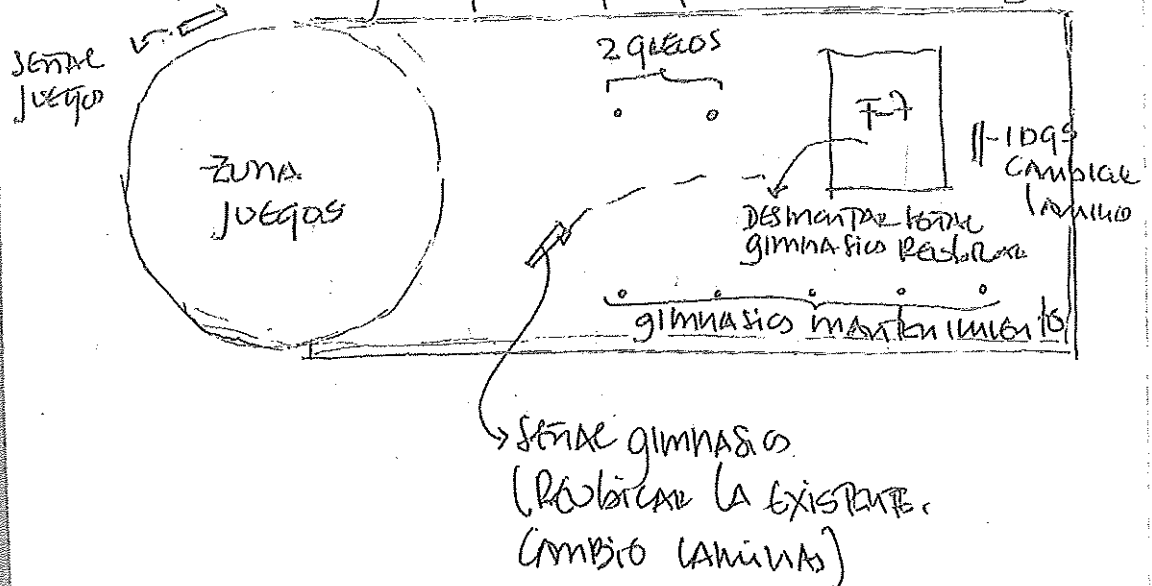

21-05-2024

DÍA SECO. NIVELADA Y COMPACTACIÓN
ZONA DE JUEGOS PARA TOMA DE
DENSIDADES *ok*

SOLICITUD SEGUN NOTA 18-05-
2024 TRAMO A DEMANTAR
ADOCUIN. *ok*

22-05-2024

CONTINUA OCALIFRADA
Y COMPACTACION ZONA
DE JUEGOS. PARA TOMA
DENSIDADES DEPENDIENDO
DE CONDICIONES CLIMATICAS
ESTO SE PROGRAMAR
PARA EL DÍA 23-05-2024
EN HORAS DE LA MAÑANA
SE REPORTARA LA HORA.

DEPENDIENDO DE LAS CONDICIO
NES CLIMATICAS DE LA NOCHE
DEL 22-05-2024 *ok*
24-05-2024.

CONTINUA. NIVELACION Y COMPACTA

CON ZONA DE JUEGOS PARA
PIRAR NIVELES Y TURNO DE ELABORADO
DIA SOLEADO.

ANOTACION INTERVENIENTE.
de oferta al contratista de obra final
para el empuje de bebidas. toda vez que
se encuentran aceros expuestos.
Personal: Topógrafo y Oficial.

27-05-2024

Se Continúa Con la Compactación de
la zona de juegos, e instalación de
Adoquín, Limpieza de Capas.
Personal en obra: Oficial. 1 Ayudante
Estado del tiempo Seco

28-05-2024

Se Continúa Con la Compactación
en la zona de juegos e instalación
de Adoquín.
Personal en obra: Oficial. 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco

29-05-2024

Se continúa con compactación del terreno de zona de juegos e instalación de Adoquin de arcilla.

personal en obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Estado del tiempo: lluvias en la tarde

30-05-2024

Se continúa con la compactación del terreno y la instalación del Adoquin personal en obra 1 Oficial 1 Ayudante
Estado del tiempo seco. *sema*

31-05-2024

DIA DE AYA LLUVIA TARDE Y NOCHE, SE TERMINAN LLEVATO DE ADOQUIN Y NIVELACION Y COMPACTACION BOTE GRANOLAR SE DEJA OBRAS PARA TIRAR DENSIDADES DIA SIGUIENTE

sema

URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA
07-015

Jimenez 07/015

6-05-2024.

DE ACUERDO COMPLETADO DE
COMITE LAS ACTIVIDADES PENDING
TES SE EJECUTARAN HOYACIA.

10-05-2024

7-05-2024

Continúan Con remates en general
personal. 1 Ayudante y 1 Oficial.
Estado del tiempo lluvias intermitentes.
Jennett.

08-05-2024

Remates de muros, y viga-s,
personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo lluvias en
la mañana: Jennett.

09-05-2024

Continúan Con remates.
personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo: lluvias en la
tarde. Jennett.

10-05-2024

Continuamos con remates del muro de la Virgen y viga de la zona de juegos.

personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: 2 lluvias en la mañana. Jeannette

11-05-2024

remate de muro y pintura de muro o viga de juegos
personal en obra 1 oficial
Estado del tiempo: lluvias en la mañana. Jeannette

15-05-2024.

Terminación. Remate pendiente.
Revisados y Avalados por Interventores
pendiente Acta Entrega y Recibo del
Pague a Interventoria. *[Signature]*

DESARROLLO PALESTINA
07-022

61 PALESTINA 07/022.

Se solicita confirmación de material
ya que se han presentado lluvias
y se evidencian afectaciones en el
muro en senderos y zona de balsa-
ludable. *[Signature]*

10 mayo 2024.

DIA FESTIVO NO SE EJECUTAN
ACTIVIDADES, SE REPORTAN
LLUVIAS EN EL DIA Y LA NOCHE
LO QUE AFECTA RELLENOS GR
NULARES. *[Signature]*

2-05-2024.

POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS
EL DIA ANTERIOR, SE VEN
AFECTADAS ACTIVIDADES
DE RELLENOS, POR ENCONTRARSE
EL MATERIAL SATURADO
NO SE PUEDE COMPACTAR.
NI TUMAR DENSIDAD DE MA-
TERIAL GRANULARO COMPAC-
TADO

40
REGISTRO HOJA DE INTERVENTORIA
30-04-2024, en obra se tiene
PERSONAL PARA ACTIVIDADES
de Rellenos y filtro, las activi-
dades se han visto afectadas
y suspendidas por la lluvia.
3-05-2024.

en el día se saca agua de
los Sándalos y hay tiempo
seco en la mañana lo que
permite compactar hasta
la 1:20 pm. también se
llenan excavaciones realiza-
das del filtro que modificó
la entidad en visita realizada.
CONTINUA COMPACTACION
lluvia noche *Problema*.

4-05-2024

por la lluvia noche anterior
se afectan Rellenos, no se
pueden tomar densidades
programadas, al inicio día.

que en el tiempo seco se com-
pacta material existente,
compactación de atraques,
construcción filtro *folia*
5-05-2024

Día festivo se programan
actividades de relleno, lo
cual no se pueden escuchar
por lluvia intermitentes
durante el día y fuerte en
la noche. *folia*


6-05-2024:

Día soleado. lo que permite
compactar zona con
material granular base
en senderos, sobre en
zona gimnasio. Después
de sacar agua en poza
da por lluvia noche an-
terior

A.M. no se escuchan activi-
dad en senderos.

Se Adelantan Actividades.
Filtro Francés, Inicia. Pisos
Cavado, Desmonte tramo.
de baranda para bajar al-
tura segun. Solicitos Interly.
Si en la noche no se plumban
lluvia se tomaran Densidades
el DIA 07-05-2024 *Colmen.*

07-05-2024 Se Continuo Con el
remate del Filtro frances. Rellenos
y Compactación en zona de Biosaludables,
Senderos peatonales, instalación de Pisos. Cacho
lluvia en horas de la tarde
personal en obra: 1 boal 1-Oficial, 2 Ayudantes
Se toman densidad en Senderos y zona de
biosaludables.

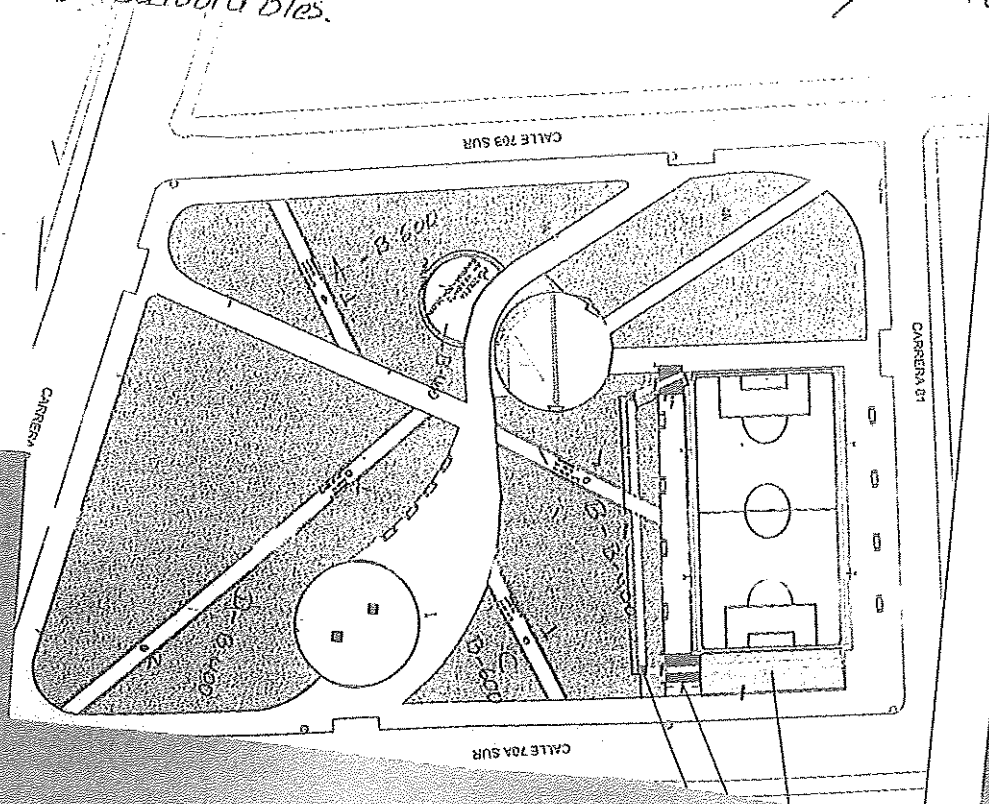

08-05-2024

Continuamos con Rellenos de Senderos peatonales y zona de biosaludables

Estado del tiempo: Seco en la mañana y lluvias en la tarde.

Personal en obra 1 boal, 1 oficial 2 Ayudantes

09-05-20

Continuamos con rellenos en senderos peatonales, zona de biosaludables.

personal en obra: 1 boal. 1 Ayudante 1 oficial.

Estado del tiempo: Lluvias en horas de la mañana hasta las 1pm.

Remed 1

10-05-2024

Continuamos con rellenos en senderos, zona de biosaludables.

personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes

3 de L y D. de pisos.

Estado del tiempo: Lluvias fuertes en horas de la noche anterior y en la mañana de hoy

atazándonos en los Senderos, ya que
se tomaron densidades y el agua
los dañó. Se mueva la buanda ^{completa} ~~completa~~
11-05-2023

Se compacta B-600 en zona de
biosolubles. y se reemplaza material
en sendero peatonal D. Continúan con
personal en obra para buchos
zona de fregos.

Estado del tiempo: llovizna el sábado
en la mañana, Jeanell.

14-05-2024.

LLUVIA NOCHE ANTERIOR, SE VEN
AFECTADAS OBRAS EN SENDERO Y
PLAZOLETA gimnasios, SE RETIRA.
AGUA EMPOZADA, EN LA TARDE
3:15 pm. INICIA LLUVIA NUEVA-
MENTE. LO QUE AFECTA LAS ACTI-
VIDADES DE RELLENO. EN EL
DÍA EN EL TIEMPO SECO SE
ADELANTEM ACTIVIDADES DE


pisos en caucho, instalación
de juego infantil, instalación
modulos de Barandera y
mantenimiento barandas.
noche se presento lluvia
toda la noche *Asien*

15-05-2024

se Retira Agua de los tenderos.
lluvia noche anterior.
en se dia se da compacta-
cion. Senderos subbater y
brazo Zona gimnasia. conti-
nua mantenimiento barandas
instalacion juego y pisos cau-
cho, PARETE CAYO DE INSPECCION
TRADE CLIMA SECO *Asien*

16-05-2024

CONTINUA MANTENIMIENTO TENDEROS
EN ADOBO, mantenimiento
malla, Demolicion Zona
gimnasia, instalac. pisos caucho
CLIMA SECO, revision cayo liberado para tapa

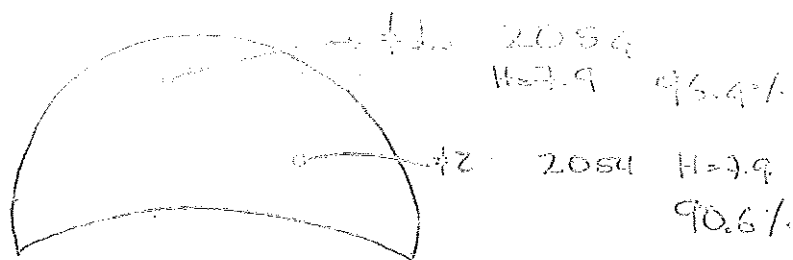


POR PARTE DE INTERVENTORA. SE LIEBA
 ANTI CORROSIÓN BARRANDA PARA
 CONTINUAR CON PINTURA, SE
 REVISAR TRANSMISIÓN. LIJADO MALLO.
 SE DEBE SACRIFICAR ZONA DE JOGOS
 PARA DEJAR 10 CMS. Y TUMAR
 DENSIDAD DE NUEVO ZONA DE GIRAR
 SUS COMPACTANDO ANTES.

Lluvia Fuerte 3:05 - 4:10 pm.
 17-05-2024

NOCHE ANTERIOR LLOVIÓ LIGERAS, NO SE
 AFECTAN ACTIVIDADES, SE CONTINUA
 INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO,
 DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE AND
 FOLIO, SE VA A DESMONTAR AND FOLIO
 LA MITAD DEL SENDERO CORTO EXISTENTE
 PARA REPONER EL QUE SE PIERDE EN RELVO

TALLERES. (Sequiere revisión con inspección
 PIA y GTE se instala nuevo).
 COMPACTACION ZONA DE GIMNASIO
 MANTENIMIENTO ZONA VERDES PERFE-
 CIONADA Y MANTENIM. ESTRUCTURA.
 BALONCERO

POR PARTE DE INTERVENTORA SE
 TURNAN DENTRADO ZONA D.E
 GIMNASIO B.O.E. GLANDER

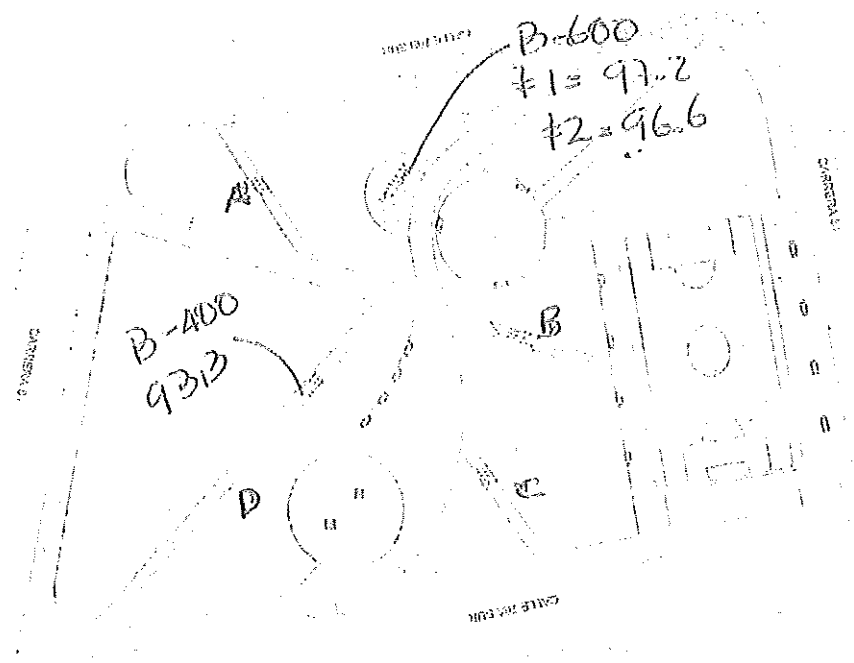

SENDERO (d) 9313. SE DEBE RECONSTRUIR

Y TORNAL DE NOVEDO OBREROS
SE REVIEN CON INTERVENTORIA ACTIVA
PARA CONCRETO ZONA DE GIMNASIOS
SE REALIZAN OBSERVACIONES INTERVEN
TORIA Y SE PROGRAMA CONCRETO DIA
18/05/2024.

DIA SOLEDADO

18-05-2024.

CONTINUAS ACTIVIDADES INSTALACION
PISOS EN CAUCHO, MANTENIMIENTO
BARANDA, INSTALACION MODULOS.
BARANDA. INSTALACION BARANDA,
MANTENIMIENTO MALLA CANCHA, FUNDIDA
PLACA. ZONA GIMNASIOS, CONCRETO
PROGRAMADO 10:00 AM. POR INCONVENIENTE
TRAFICO VIA QUE LLEVA PLANTA DE
CONCRETO ESTE SE RETARDO EN
SU DESPACHO HORA LLEGADA 1:25,
SE CONTINUA CON LA PROGRAMACION
DE FUNDIDA, SE TENTA
TODA LA LOGISTICA ORGANIZADA
DIA SOLEDADO

20-05-2024.

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

MANTENIMIENTO ADOSQUIN DE

ARCILLA PANDERO EXISTENTES.

MANTENIMIENTO MALLAS, GRUCAS

BALCON y microfútbol.

CORTO PLACA CONCRETO, PISO

EN CAUCHO, BARANDAS, INSTALACION

CON MODULOS Y PINTURAS

ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO

BARANDAS.

DIA SECO. *Quiche*

21-05-2024

ACTIVIDADES EN EJECUCION

ENPOZAMIENTOS CERRITA

A PLACAS MUELANTES Y

RECIBASE MANTENIMIENTO

MALLAS, ESTRUCTURAS DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO SENDERO EN

ADOSQUIN (SENDERO PRINCIPAL

POR PARTE DEL CONTRATISTA

SOLICITAMOS A LA INTERVENIENTE

RIA REVISAR ALCANCES EN
CUANTO AL AREA DE INTER-
VENCIÓN EN EL SENDERO
PRINCIPAL, SI SE DESMONTA
Y RECONSTRUYE LOS ORILLOS,
EN EL CENTRO QUESEA HUNDIDO
APROX. 2 CMS, LO QUE OCASIONA
EMPORIZAMIENTOS EN EPOCA DE
LLUVIA Y ESTABILIDAD DEL
ADOCADO QUE SE ESTA REVI-
ZANDO. MANTENIMIENTO
SOLICITAMOS INTERVENTORA
REVISAR EL TEMA EN SENDERO
PRINCIPAL
- COMPACTACION SENDERO
EN ADOCO
FUMIGACIÓN SENDERO
EXISTENTE CON MATAMALGA
DIA SIGUIENTE *Justo*
SE REALIZAN CORRECCIONES
EN PISO CAUCHO SOLICITADO
POR INTERVENTORA, SE INICIA

PINTURA ESTRUCTURAL BALANCEO
Y MICROFUTBOL *Prof. M. H.*
22-05-2024.

ACTIVIDADES EN EJECUCION:


REMATE PISO CAUCHO SOLICITADO
POR INSPECTOR INTELIGENTORIA.
EL DIA 21-05-2024. (RECORRIDO

COMITE DIA DE HOY DIRECTOR INTE-
LIGENTORIA. SOLICITA NO HACER
ESTOS REMATE Y PROTEGER
ZONAS DE CAUCHO SI SE VAN.
A. REALIZAR PINTURA Y SEQUE-
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA
QUE NO SE PRESENTE OTRA SITUA-
CION.

- SE ESTAN EJECUTANDO COLARCO
NO PISO PINTURA CANCHA.
PROCESO PINT ESTRUCTURA MICRO-
FUTBOL Y BALANCEO LA MAÑANA
SE ENCUENTRA LIJADA PARA
REVISION DE INTELIGENTORIA Y
CONTINUAR ACTIVIDADES.

Desmonte piso ADOQUIN.
SUPERVISOR Realiza obser-
vación que la tubería que
PASA POR EL SENDERO COMO
PENDIENTE AL FILTRO DEBERIA
haber sido en tubería no per-
forada y que el piso de la
Caja DEBERIA haber quedado
A Nivel DE TUBERIA, SE ACORDA
POR PARTE DEL CONTRATISTA EN
ACTIVIDADES SE EJECUTARON
DE ACUERDO A PROPUESTA
AVALADA, REVISTADO PENDIENTE
Y SUPERVISADO POR INTERVEN-
TORIA EN VISITA A OBRA.
EN LA TARDE LUGA VIAJE DE
ADOQUIN, SE TOMA DEN-
DAD SENDERO "A" BASE GRANULAR.
RESULTANDO 100.3%. SENDERO
OCCIDENTAL PROCTOR 2054 (47.9)
DE ACUERDO A COMITE ± 36
(22-05-2024) PINTURA PISO

GIMNASIO DISCOTY COLORES
 DE ACUERDO. A LA REALIZADO
 JOSE MARIA ARBANCE 07-044
 P.M.

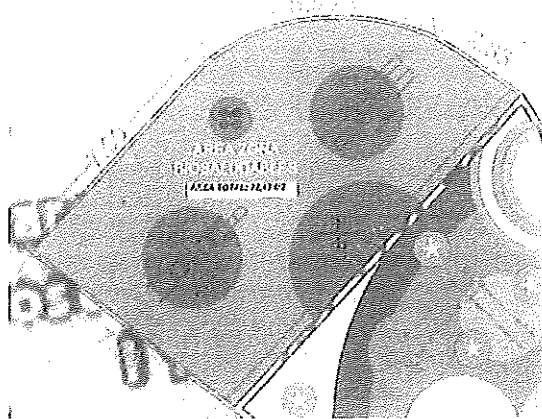

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
 Se evidencian actividades de arreglo de
 piso cancha en zona de juegos. Durante
 recorrido del Comité de Seguimiento
 Demanal No. 36, la Directora de recrea-
 ción hace llamado de atención por poco
 constructivo. Se encontró que al pintar
 los barandales posterior a la instalación a
 piso cancha este está dando manchas
 e indica que no se aceptara arreglos

fructuoso por estos motivos, por el contrario
de volver a presentarse de beber a
cambiar toda la frama de Caba. Se
encuentra que en cancha se han
desarrollado actividades de recrea-
ción de empadronados con recibase.
Sin embargo, se encuentra en cancha de
Cancha afortunadamente de construcción asfáltica
por lo que se solicita a Contratista de
obra realizar los ajustes respectivos.
Después de medio día, en frente de obra
quedan dos (2) agudantes que realizan
levantamiento de abogan en borde de
Sandra Panton y se hace traslado de
personal al parque 07-104 zona 18 por
actividades de fundida de placa
en zona de juegos infantiles.
23-05-2024.

Personal: 2 agudantes + 1 oficial + 1 Oca
+ cuadrilla de pintura en cancha.
Lima: Juleado
Protección de Interventoría

Por solicitud de Contraloría de obra,
en compañía con la veredera de
obra se iban a demarcar áreas
plantamiento y remodelación de
adeguado. Sin embargo, se expresa que
la anterioridad esta actividad se
había realizado y se encontró que
el sendero principal presentaba
afectaciones por ingreso de roedores
VOLQUETA y excavaciones en especie
de actividades de refugio y excavación
por lo tanto aparecieron áreas que
inicialmente no se habían efectuado
por lo tanto, se definió exponer situación
a directores. *[Signature]*

REPORTE NOTACIÓN INTERVENTORA
EN CUANTO AL APLORAMIENTO
DE EMULSIÓN ASFALTICA, ESTA RE
PLANTA POR LAS TEMPERATURAS
ALTO, POR EL GRUPO MATERIAL.
DERIVADO PETROLIO U.A. AL ALTO

Comportamiento
24/05/2024.

Respecto a notación interurbana
23-05-2024, se solicita a INTERU.
marcar tramos que aquí no están
no hayan sido afectados x
volqueteo o equipos de construc-
ción, en cambio a los RORMS
en piso en cauchos sin tener
soliztades (Aunque lo partocan
foquos de pintura y el día 22/05
2024 se estaban sustentando
ya se terminaron RORMS en andas
se da inicio instalación Adquiri-
sionero C, a continuación se
da comisión ALMA de para-
proveedor tequis, la certifica-
ción se está solicitando al
área ambiental.
Se programan densidades
sanciones 25/05/2024, se em-
vía a INTERU.

SONAMIO DE INVESTIGACION

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA				VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas			
No. Consecutivo del Certificado de Origen				47840			
FECHA	DD	MM	AAAA				
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Selecione una opción)				Titular Minero ☐ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐ Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐			
CODIGO EXPEDIENTE				DBE-111			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				FANNY ISABEL TEQUIA GONZALEZ			
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				NIT	CEDULA	CEDULA DE EXTRANJERIA	RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				39.662.669			
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN				CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN				SOACHA			
MINERAL EXPLOTADO				MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				METRO CUBICO			
UNIDAD DE MEDIDA							
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL				NIT	CEDULA	CEDULA DE EXTRANJERIA	RUT
TIPO DE IDENTIFICACION				COMERCIALIZADOR			
COMPRADOR (Selecione una opción)				CONSUMIDOR			
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD				10256426-1			
No. RUCOM				RUCOM-			

Si las condiciones climáticas lo permiten. Se realizarán actividades en fin de SONAMIO con el plan contingencia no se afec-
 pmt por que no habra tenail
 de maquinaria y vehículos pe-
 dos

FANNY ISABEL TEQUIA G.
Suministro y transporte de materiales para construcción
NIT. 39.662.669-9

SOACHA. (CUND), 29 DE MARZO DE 2024

**CANTERA CUEVA DEL ZORRO
CONTRATO DE CONCESIÓN DBE-111**

CERTIFICA QUE:

Suministramos materiales en el periodo comprendido del 1 al 29 de Marzo de 2024 para el contrato de obra FDLB-2023 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO" CONSORCIO PARQUES 2023 NIT.901 736 072-8 a nombre de NESTOR RAUL GARZON OTALVARO NIT. 10 256.426-1 así:

• B - 400	21.0M3
• B 600	45.0M3
• ARENA DE PEÑA	7.0M3

Atentamente,


FANNY I. TEQUIA G.
C.C.No 39.662.669 Soacha
RESOLUCIÓN CAR 1558 24 DE DICIEMBRE DE 2003
No. 02625



Cr 6 15 33 Brr San Luis - Soacha (CUND) Tel 7810041 Telefax 7814130
Email: Contacto@tequiayciz.com

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se evidencia ejecución de instalación de
Vanderos de adopción. Sin embargo, se encontró que

en obra se realizaba la zanjado de la arena con plomeros empotrados para protección de tuberías a boro. Colocando piedras en la arena. De solista empotrando para esta actividad. En la cancha se encuentra que realizaron movimiento de hundimientos. Sin embargo, en varios puntos intermedios se levanta el material. En la cancha se usó la rueda de / cerramiento. Contaminado, teniendo que en el lastajo que cubren con el flete se encuentran todos los barros con una altura de 1.88m queda faltante 0.62m de altura aproximadamente para finalizar la mitad inferior del cerramiento y proceder con anticorrosivo. Con respecto al cerramiento en el lastajo que cubren con zona verde del parque hace falta una pasada de lsa en los mismos 1.88m de altura que dando faltante 0.62m aproximadamente para finalizar lsa de la parte inferior del cerramiento.
Personal: Topical y 2 ayudantes + 1 DDA,

el medio día se instaló oficial para
actividades de fútbol en parque
Carbonell 07-109 zona 13. *R. D.*
25/05/2024.

ANOTACION INTERVENTORIA.

Se evidencian actividades de limpieza de
banco y continuación de instalación
de adequín. El contratista de obra inter-
pone: Zonando al proceso constructivo.

27/05/2024.

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

Se evidencia instalación de adequín en
senderos peatonales de Solista Cambio de Pisos
Puntuales que presentaban desportillamiento y
se le indica al Contratista de obra que
debe zonandear de forma adecuada la arena.
Personal: Tardante + Tardant + Tardant. *R. D.*

ANOTACION INTERVENTORIA.

Se evidencia que el Contratista de obra
interviene la cancha futbolera en hundimien-
tos. Sin embargo en partes específicas se evidencian

levantada y/o supuesta la rec. base.

Se Continúa Con instalación de adoquín.

Se Atiende las recomendaciones de la
Interventora, Con la arena.

Personal en obra. 1 Oficial, 1 ayudante
1 Boal.

28-05-2024.

Continuamos con instalación de adoquín
teniendo en cuenta las recomendaciones
que da la interventora, se instalan Señal-
le idgs-80.

Personal en obra 1 Oficial - 1 ayudante
1 boal.

Estado del tiempo: Seco

29-05-2024

Se Continúa Con la instalación de
senderos en adoquín de Arcilla

Se hace Compactación de base

en Sendero, A. se realiza Aseo en
General.

al en obra: 3 Ayudantes.
o del tiempo: Lluvias en la tarde
2024

continúa con instalación de Abogón
la en senderos peatonales, se
relleno y compactación en senderos
rles

al en obra: 1 oficial 1 Ayudante.
del tiempo: Seco
continúa con pintado
M-31. En la tarde y
se programó lluvia. Queda
2024

se compactación senderos
de granular, instalación
de y relleno de senderos.
o seco. Queda.

*DESARROLLO EL RINCÓN DE BOSA 07-
026*

Rincon Bosca 07/026.

10-05-2024

No se inicia instalación de piso
por lluvias todo el día.

personal en obra: 2 Ayudantes
↓ boal

Estado del tiempo: Lluvias noche
anterior y todo el día.

pernell-

11-05-2024

Se inicia con instalación de piso
en Caucho pero se suspende
por lluvias.

personal en obra ↓ boal 2 Ayudantes

Estado del tiempo: Lluvias en
la mañana. pernell.

14-15-16/05-2024.

CONTINUA INSTALACION DE PISO

EN CAUCHO. 14-05/2024 LLOVIÓ

NOCHE ANTERIOR. LLOVIÓ EN LA TARDE

TODA LA NOCHE. 15-05/2024. LLOVIÓ

NOCHE ANTERIOR. TARDE CLIMA SECO
