

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	DE-DEAJU-FR-017
		ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Versión	1
				Vigencia	14/11/2019
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA No.		057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/09/2019			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 87.801.922,88			
FORMA DE PAGO					
CORTE PARCIAL DE OBRA 1: hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago de aportes parafiscales, y se pagará con PAC NOVIEMBRE DEL 2019.					
EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final, y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificado por el departamento financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.					
CONTRATISTA					
INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.					
INTERVENTOR O SUPERVISOR					
PRINCIPAL: ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES					
SUPLENTE: T3. CORTES LARA JOSE LEONARDO					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		19 de Septiembre 2019			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		29 de Octubre del 2019			
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS					
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/10/2019			
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		Modificación de clausula 1 – actividades específicas del contrato, clausula 2 – forma de pago y apropiación presupuestal			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 87.801.922,88			
PLAZO DE EJECUCION		29 de Octubre del 2019			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/10/2019			
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		Modifiquese parcialmente el numeral 1 – INFORMACION GENERAL del contrato electrónico – Fecha de terminación del contrato, quedando para el 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 87.801.922,88			
PLAZO DE EJECUCION		29 de Noviembre del 2019			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		23/11/2019			
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		Modifiquese parcialmente la CLAUSULA 2 DEL ANEXO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELETRONICO –numeral 1 – INFORMACION GENERAL del contrato electrónico, en el sentido de adicionar el valor de \$8'706.162,00 valor final del contrato el cual quedaría por valor de \$ 94'508.084,88.			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 94'508.084,88			
PLAZO DE EJECUCION		28 de Noviembre del 2019			
3. SUSPENSIONES					
PRIMERA SUSPENSION					
FECHA DE SUSPENSION		NO APLICA			
FECHA DE REINICIO		NO APLICA			
En Aplay-Villavicencio, el día 31, del mes de enero del 2020, a las 10:00, se reunieron: el señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL y el señor Subteniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; la señora MACA FLORALBA, representante legal INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019, el cual se ejecuto de acuerdo con los requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidos a satisfacción por la supervisión, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 29 de Noviembre de 2019, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.					
4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS					
OBRA					
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL VALOR UNITARIO	EJECUTADO VALOR PARCIAL CANTIDAD
CANILES MODULO A					
PRELIMINARES					
1					
1,1	Desmonte de ventanas incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	2,00	\$ 7.350,00	\$ 14.760,00 2,00 \$
1,2	Desmonte de puertas metálica y marco existente incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	5,30	\$ 9.440,00	\$ 50.032,00 5,30 \$
1,3	Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	18,40	\$ 3.453,00	\$ 63.543,83 18,01 \$
1,4	Desmonte de puertas en malla estacionadas de caniles incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	8,00	\$ 9.564,00	\$ 76.512,00 8,00 \$
1,5	Desmonte de cubierta existente incluye estructura metálica existente, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	185,00	\$ 18.454,00	\$ 3.413.990,00 188,00 \$
					\$ 3.100.272,00 188,00 \$

1,6	Demolición y desmontaje de estructura en concreto para tanque aéreo, incluye retiro de material en sitio autorizado fuera de la Unidad, equipos y personal calificado	und	1,00	\$ 235.186,00	\$ 235.186,00	1,00	\$	235.186,00
2	CARPINTERIA EN ALUMINIO							
2,1	SIPS de ventanas en aluminio anodizada con arreglo incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	3,40	\$ 199.129,00	\$ 677.038,60	3,40	\$	677.038,60
2,2	SIPS puertas en Aluminio incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	5,30	\$ 129.239,00	\$ 684.986,70	3,40	\$	439.412,60
3	CIELO RASADO							
3,1	Suministro e instalación de Cieloraso en PVC de 9 mm color blanco brillante incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	15,00	\$ 57.983,00	\$ 869.745,00	11,54	\$	869.123,82
4	ACABADOS							
4,1	Suministro e instalación de cerámico de pared BOREAL PLANA ref. 755039831 o similar (incluye resano del panel existente y praguia en aluminio blanco en los filos) (En el baño a intervenir.)	m2	3,00	\$ 73.438,00	\$ 220.314,00	3,00	\$	220.314,00
4,2	Suministro e instalación de piso en cerámica VALDIVIA WENGUE ref. 997012771 o similar (En baños a intervenir.)	m2	14,00	\$ 89.203,00	\$ 1.304.842,00	12,95	\$	1.206.978,85
4,3	Esduco y pintura epóxica 3 manos (Incluye esduco, filos y dilataciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado) para muros internos de caniles	m2	110,00	\$ 35.616,00	\$ 3.917.780,00	111,60	\$	3.974.745,60
4,4	Alisado y mineralizado de Piso en Caniles para evitar bacterias y acumulación de plagas incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	54,00	\$ 47.447,00	\$ 2.562.138,00	54,00	\$	2.562.138,00
4,5	Granito pulido para lavadero existente incluye resanes, rejla, materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	1,40	\$ 118.019,00	\$ 165.521,65	2,19	\$	258.461,61
4,6	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	110,00	\$ 10.403,00	\$ 1.144.330,00	152,04	\$	1.581.672,12
4,7	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	54,00	\$ 10.403,00	\$ 561.782,00	41,40	\$	430.884,20
4,8	Mediacafía de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + grava) en sitio para las uniones entre los muros y pisos	ml	75,00	\$ 8.920,00	\$ 661.500,00	72,84	\$	640.684,80
5	APARATOS - ACCESORIOS -							
5,1	SIPS de lavamanos de porcelana de pared marca corona o similar incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 129.884,00	\$ 129.884,00	1,00	\$	129.884,00
5,2	SIPS Sanitario manantial blanco marca corona o similar incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 252.944,00	\$ 252.944,00	1,00	\$	252.944,00
5,3	SIPS de giferia lavamanos incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 260.300,00	\$ 260.300,00	1,00	\$	260.300,00
5,4	SIPS ducha cromada completa incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 199.646,00	\$ 199.646,00	1,00	\$	199.646,00
6	CARPINTERIA METALICA							
6,1	Suministro instalación y puesta en servicio de puertas en malla eslabonada con perfil circular de h=180 m, incluye pasador porta candado, bisagras, pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	8,64	\$ 224.115,00	\$ 1.936.363,60	11,97	\$	2.882.856,55

5.1	Muro en Bloque de arcilla No.5 E=0.15 mts (0.33X0.115X0.23) mts. Incluye pañete, resanes materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	1.00	\$ 56,523.00	\$ 56,523.00	1.76 \$	96,480.48
5.2	Muro en ladrillo estructural 0.15 mts incluye pañete, resanes materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	1.60	\$ 61,904.00	\$ 99,046.40	2.16 \$	133,712.64
5.3	Dintel en varilla incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	ml	6.85	\$ 27,064.00	\$ 185,388.40	0.00 \$	-
6	INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.1	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 7 tomacorrientes	gib	1.00	\$ 242,914.00	\$ 242,914.00	1.00 \$	242,914.00
6.2	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 1 luminaria	un	1.00	\$ 355,436.00	\$ 355,436.00	1.00 \$	355,436.00
6.3	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 2 luminarias	ml	1.00	\$ 394,698.00	\$ 394,698.00	1.00 \$	394,698.00
6.4	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 3-4 tomacorrientes A.A.	un	1.00	\$ 109,594.00	\$ 109,594.00	1.00 \$	109,594.00
6.5	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 5 ventiladores	un	1.00	\$ 125,874.00	\$ 125,874.00	1.00 \$	125,874.00
6.6	Suministro instalación y puesta en servicio circuito 6 reflector	ml	1.00	\$ 334,540.00	\$ 334,540.00	1.00 \$	334,540.00
6.7	Suministro instalación y puesta en servicio tablero 12 circuitos	un	2.00	\$ 378,119.00	\$ 756,238.00	1.00 \$	378,119.00
7	CIELORRASO						
7.1	Suministro e instalación de Cielorraso en PVC de 9 mm color blanco brillante incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	19.00	\$ 57,963.00	\$ 1,101,677.00	17.26 \$	1,001,946.24
8	ACABADOS						
8.1	Alistado de piso en concreto impermeabilizado de 3600 PSI e=0.05 mts (preparación de superficie)	m2	21.00	\$ 47,042.00	\$ 987,882.00	17.28 \$	812,885.76
8.2	Piso en baldosa cerámica de 0.45X0.45 mts. Ref; piedra sd desierstone de alfa o similar	m2	21.00	\$ 53,674.00	\$ 1,127,154.00	17.28 \$	927,486.72
8.3	Estuco y pintura epoxica 3 manos (incluye estuco, filos y dilataciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado) para muros internos	m2	15.00	\$ 35,616.00	\$ 534,240.00	32.60 \$	1,161,081.60
8.4	Mediacapa de 6 cm en granito pulido (montero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y pisos	ml	21.00	\$ 8,820.00	\$ 185,220.00	15.10 \$	133,162.00
8.5	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2		\$ 10,403.00	\$ -	64.21 \$	660,066.83
8.6	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2		\$ 10,403.00	\$ -	2.00 \$	20,806.00
1	CANILES MODULO B						
1.1	Desmonte de puertas y ventana en acero de caniles incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	6.00	\$ 10,346.00	\$ 62,070.00	6.00 \$	62,070.00
2	CARPINTERIA METALICA						
2.1	Suministro instalación y puesta en servicio de puertas en metal acabadas con perfil circular de 11-2.05 m y ventana en metal estabonada, incluye pesador para cerrado, bisagras, pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	12.00	\$ 224,115.00	\$ 2,689,380.00	12.00 \$	2,707,303.20
3	ACABADOS						
3.1	Estuco y pintura epoxica 3 manos (incluye estuco, filos y dilataciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado) para muros internos de caniles	m2	60.00	\$ 35,616.00	\$ 2,136,960.00	72.24 \$	2,572,898.64

3.2	Alisado y mineralizado de Piso en caniles para evitar bacterias y acumulación de plagas incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	28,00	\$ 47.447,00	\$ 1.328.516,00	23,82	\$ 1.130.187,54
3.3	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	16,00	\$ 10.403,00	\$ 166.448,00	31,32	\$ 325.821,96
3.4	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	10,00	\$ 10.403,00	\$ 104.030,00	10,40	\$ 108.191,20
3.5	Mediación de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sillo para las uniones entre los muros y pisos	ml	57,00	\$ 8.820,00	\$ 502.740,00	51,00	\$ 449.820,00
GERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANILES							
1	ACABADOS / CARPINTERIA						
1.1	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	185,00	\$ 10.403,00	\$ 1.924.555,00	148,20	\$ 1.541.724,60
1.2	Refuerzo interior, superior y laterales de malla con ángulo de 1" x 1/8" y tensionamiento de mallas a modulo x 3m en concreto del área de caniles incluye puerta principal. Incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	46,00	\$ 37.815,00	\$ 1.739.460,00	46,00	\$ 1.739.460,00
1.3	Pintura cerramiento en malla esabonada doble cara incluye anticorrosivo, esmalte, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	200,00	\$ 9.862,00	\$ 1.972.400,00	200,25	\$ 1.974.865,50
1.4	Resanes, cambio de bloques dañados, pañete y instalación de alajita incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	gib	1,00	\$ 1.870.219,00	\$ 1.870.219,00	1,00	\$ 1.870.219,00
1.5	Suministro e instalación de concertina incluye cambio de 3 redes de alambre de puas, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	ml	162,00	\$ 11.456,00	\$ 1.852.632,00	162,00	\$ 1.852.632,00
2	ASEO Y RETIRO						
2.1	Aseo y retiro de escombros general de la sección canina (incluye el retiro y cargo de material sobrante de la obra a sillo autorizado por ente ambiente o la unidad)	gib	1,00	\$ 979.488,00	\$ 979.488,00	1,00	\$ 979.488,00
ITEMS NO PREVISTOS							
CANILES MODULO A							
NP1	Remoción de acabado de muro incluye pañete, herramientas, mano de obra y personal calificado	m2	0,00	\$ 3.541,00	-	80,00	\$ 283.280,00
NP2	pañete interior, muros e= 15 mm, proporción 1:4, incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones*	m2	0,00	\$ 10.000,00	-	105,44	\$ 1.054.400,00
CANILES MODULO C - ADECUACION BODEGA							
NP1	Remoción de acabado de muro incluye hasta el pañete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado	m2	0,00	\$ 3.541,00	-	37,98	\$ 134.487,18
NP2	pañete interior, muros e= 15 mm, proporción 1:4, incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones*	m2	0,00	\$ 10.000,00	-	43,30	\$ 433.000,00
CANILES MODULO B							
NP1	Remoción de acabado de muro incluye hasta el pañete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado	m2	0,00	\$ 3.541,00	-	65,99	\$ 233.670,59
NP2	pañete interior, muros e= 15 mm, proporción 1:4, incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones*	m2	0,00	\$ 10.000,00	-	73,90	\$ 739.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS							
ADMINISTRACION				10%	\$ 72.593.570		\$ 78.136.435
IMPREVISTOS				5%	\$ 7.259.357		\$ 7.213.543
UTILIDADES				5%	\$ 3.629.678		\$ 3.906.772
IVA				19%	\$ 3.629.678		\$ 3.906.772
					\$ 689.639		\$ 742.287
				SUBTOTAL 1	\$ 87.801.922,87	SUBTOTAL 2	\$ 94.604.908,37
EQUIPOS							
				CONTRACTUAL		EJECUTADO	
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL

[illegible]

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$	37.501.922,86
VALOR ADICIONADO	\$	6.705.182,00
VALOR REDUCIDO	\$	3.276,51
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$	94.504.808,37


5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
Anticipo %	NÓ APLICA
Acta de recibo parcial 01	\$ 81,768,281.91
Acta de recibo final	\$ 12,738,546.48
VALOR TOTAL	\$ 94,504,808.37
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A FAVOR DE LA FAC	\$ 3,276.51

6. GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S	Cumplimiento del contrato	NB-100114731	29/08/2019	29/03/2020		\$ 37.803.234,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		29/08/2019	29/11/2022		\$ 9.450.808,50
	Estabilidad y calidad de la obra		29/11/2019	29/11/2024		\$ 47.254.042,50
	Amparo básico - predios, labores y operaciones	29/08/2019	29/11/2019	\$165'623.200		
	Contratista Y Subcontratistas	29/08/2019	29/11/2019	\$165'623.200		
	Patronal	29/09/2019	29/11/2019	\$165'623.200		
	Vehículos Propios Y No Propios	29/09/2019	29/11/2019	\$165'623.200		
	Póliza de responsabilidad extracontractual		29/09/2019	29/11/2019		\$165'623.200

Valor final del contrato:	\$	94 504 808
Plazo de ejecución final del contrato:		29 de Noviembre del 2019

La Supervisión en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes el Contratista INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S., cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 057-00-E-CA-COM-2-2019 GRUSE-2019

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA
El contratista INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S., manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 057-00-E-CAGOM-2-GRUPE-2019, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

<p>Reservante Legal Consultista Firma y postfirma</p> 	<p>Superintendente Principal Firma y postfirma</p> 	<p>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</p> 	<p>Ordenador del Gasto Firma y postfirma</p> <p>CE. RODRIGO VECINO</p>
---	--	---	--

FUERZA AEREA COLOMBIANA

INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA N° 057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019

**CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD
DEL CACOM-2".**

**CONTRATISTA
INGENIEROS CONSTRUCTORES FYR SAS**

**SUPERVISOR
ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES**

**FECHA DE INFORME
29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

INFORME FINAL

CONTRATO No.
CONTRATANTE:

057-00- E-CACOM-2-GRUSE-2019
FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATISTA:

INGENIEROS CONSTRUCTORES FYR
NIT. 822.002.991-5
R/L: FLOR ALBA MACA
CC: 30.711.140

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".
Hasta el 29 de octubre de 2019

PLAZO:

VALOR INICIAL: \$87.801.922,88

VALOR FINAL: \$94.508.084,88

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA DE FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES

LOCALIZACION:

La ejecución del contrato se encuentra ubicado en la vereda de Apiay del Municipio de Villavicencio = Meta.

Modulo A: SECCION CANINOS 8 MODULOS, DORMITORIOS Y BAÑO

TRAMO B: SECCION CANINOS 6 MODULOS

TRAMO C: SECCION CANINOS 6 MODULOS Y BODEGA

INFORMACION FINANCIERA

VALOR DE CONTRATO	\$87.801.922,88
ADICIONAL	\$6.706.162,00
VALOR ACTA RECIBO FINAL	\$ 94.508.084,88
PORCENTAJE DE AVANCE EN OBRA	100,00%
VALOR A COBRAR	\$ 12.736.546,46
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00

AVANCE DE OBRA:

Mediante el siguiente informe del contrato de obra, cuyo objeto es: "mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la sección canina en el grupo de seguridad del cacom-2". a la fecha se ha ejecutado en el 100,00% de ejecución de obra, incluido el valor adicional.

**LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL
INFORME No 2**

Nº	ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Nº ANEXO
1	LISTADO DE PERSONAL EN OBRA	X			ANEXO 1
2	PLANILLAS DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA	X			ANEXO 2
3	LISTADO DE PROVEEDORES DURANTE EL MES DEL INFORME	X			ANEXO 3
4	CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES Y FICHAS TÉCNICAS	X			ANEXO 4
5	CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN DEL PERSONAL	X			ANEXO 5
6	CONTROL SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN	X			ANEXO 6
7	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA	X			ANEXO 7
8	REGISTRO FOTOGRÁFICO	X			ANEXO 8

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA

	NOMBRE	CARGO	PROFESION	GENERAL	CONCLUSION
1.0	HARRISON HERNAN LUNA	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CUMPLE	CUMPLE
4.0	DIEGO GUZMAN	OFICIAL DE OBRA	BACHILLER	CUMPLE	CUMPLE
6.0	CARLOS LEON	OFICIAL DE OBRA	TECNICO EN. CONSTRUCCION	CUMPLE	CUMPLE

PLANILLAS DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA



CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 20/09/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI
 Nombre: INGENIEROS CONSTRUCTORES FARO S.A.
 Dirección: KRA 3 14-57
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Correo electrónico: dta@ingenierosfaros.com
 Teléfono: 3142736413
 Cédula Único: C 3071142
 Municipio: N.L.O
 Tarma: 6.960

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Nombre y Apellido del Usuario: FLORALEA TACA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Dependiente
1.4	2109-2019	C 8162514	GUZMAN CARDENAS DIEGO	S	6.5502	Dependiente

OBSERVACIONES

El bene segun ayuda con respecto a la carta a actividad económica de sus afiliados por favor dirigirse a la oficina de SOCOTRIA P.N.A. central o comunicarse por nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional: 01-8000-111-172 y en Bogotá al 332.7100.

Cord al saludo,

Diego Felipe Guzman Cardenas

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañia de Seguros S.A.

AD15030421177493736500289683F

Certificado Impreso el día 20/09/2019 a las 02:04 por el portal de empresa: Edepa

6.000.811 018000941541 #533

786 838 07 55 + (571) 743 01 06

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

DIEGO FELIPE
GUZMAN CARDENAS
 8018514
INGENIEROS CONSTRUCTORES FARO S.A.

Este código es personal e intransferible



POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): CARLOS JULIO LEON LADINO identificado con Cédula Ciudadanía No. 1032406913, de la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 21/09/2019 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de septiembre de 2019

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

LISTADO DE PROVEEDORES DURANTE LA OBRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRODUCTO	DIRECCION	TELEFONO	UBICACION
ELECTRICOS ESTEBAN	<ol style="list-style-type: none"> LUMINARIA INTEMPERIE TIPO APLIQUE CABLE #12 - 14 TOTALIZADOR ROSETA PLAFON LOZA CAJA OCTAGONAL BOMBILLO LED 12 W LUMINARIA HERMETICA 2X18W LED REFLECTOR LED 150W 	CL 36 #26-70 BARRIO SAN ISIDRO	3209195363	VILLAVICENCIO IO META


ANEXO 4

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES Y FICHAS TÉCNICAS

NUESTROS PRODUCTOS

STANDING SEAM SANDWICH

La cubierta standing seam doble de MIL ZONASSAS es una cubierta compuesta de dos láminas de acero galvanizado una inferior y otra externa con aislamiento térmico y acústico en diversos materiales y densidad de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto, estas cubiertas se fabrican a la medida exacta del proyecto.




Cubiertas herméticas sin traslapo longitudinal

Uniones grafadas para pendientes superiores a 5%

La línea de cubiertas standing seam tipo sandwich ofrece un sistema compuesto por sandejas de acero interconectadas mediante uniones grafadas y cups conitos de fijación que no perforan el material aislante intermedio tipo sandwich para conformar un panel con propiedades termoaústicas

Sistema de fijación que no perfora la cubierta





La cubierta standing seam se fabrica en acero de calibre 24 y 26 de calidad estructural de 1.15 y 2 pulgadas



MIL ZONASSAS

FICHA TÉCNICA

EL PESO VARIA SEGUN EL AISLAMIENTO				
ALTURA DEL PANEL PULGADAS	ALTO (MM)	CALIBRE	PESO MATERIA PREPINTANDO KG/M2	ANCHO EFFECTIVO KG/M2
15	38	26	860	300
15	38	24	114	300
2	50	26	960	500
2	50	24	1256	500
25	50	26	960	500
25	50	24	1256	500



FICHA TÉCNICA

TABLA DE CARGA	LUZ SIMPLE			LUZ CONTINUA		
	CAL 28	CAL 26	CAL 24	CAL 28	CAL 26	CAL 24
1500	58	81	111	98	138	203
1700	40	56	76	68	95	139
1900	29	40	54	48	68	100
2100	-	-	-	36	50	74
2300	-	-	-	27	38	56



REFERENCIA METRO LINEAL	GALVANIZADA (KG/UN)	PINTADA (KG/UN)
101 * mL - 28 (036MM)	338	334
101 * mL - 28 (046MM)	434	430
101 * mL - 34 (060MM)	568	574
101 * mL - 22 (075MM)	712	-

[illegible]

• LUMINARIA INTEMPERIE TIPO APLIQUE

	REFERENCIA :	4627		Certificados:	CE - RoHS
	Potencia nominal :	12w		Grado de IP:	IP65-Exterior
	Tensión Nominal:	85V-265V		Vida Estimada lámpara LED (Hr):	50.000
	Temperatura de Luz:	6000K		Medidas (mm):	192*95mm
	CRI-Índice Reproducción Cromática:	75		Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
	Clase Energética:	A+		Rango Temperatura (°C):	-30°C - +55 °C
	Luminosidad :	1060		Color de Emisión luz:	100000
	Tipo de LEDs:	SMD 2835		Tiempo de Encendido (s):	0.2s
	Ángulo de Apertura (°):	120°		Material de Construcción:	Aluminio
	Eficiencia Diodo LED (lm/W):	120 lm/W		Driver incluido:	SI
	Eficiencia luminosa (lm/W):	90 lm/W		Garantía años:	2


CARACTERISTICAS

Material terminación en aluminio y vidrio, construida con la mejor calidad, difusor de vidrio.

- Protección IP65 (intemperie), se debe tener en cuenta no es para el contacto directo con el agua.
- Sirve para colocar en techo o pared.
- Para colocar un bombillo con rosca E27.
- Porta bombillos es de material cerámico de calidad.
- Se pueden colocar bombillos ahorradores hasta 60w y apto para bombillos led.
- Sirve para evitar el robo común de los bombillos en lugares externos e internos.
- Medidas: largo 19 cm – ancho 10.6 cm – alto 9.5 cm
- Ideal para terrazas, escaleras, parqueaderos, lugares oscuros.

Color negro.

• CABLE CU NO 12 AWG THHN/THWN



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 06409

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y YUMBO	CABLE DE COBRE PARA ACOMETIDAS TRIFÁSICAS	MULTICONDUCTORES: 3X10 AWG + 1X12 AWG; 3X8 AWG + 1X10 AWG; 3X6 AWG + 1X8 AWG; 3X4 AWG + 1X6 AWG Y 3X2 AWG + 1X4 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. - CEITELSA

Calle 10 # 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi,
Yumbo, (Valle del Cauca), Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

CODENSA ET-112/2015 y la RESOLUCIÓN 98708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 07 / 03 / 2016
Última Actualización: 26 / 03 / 2019
Fecha de Vencimiento: 25 / 03 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 25 / 03 / 2020 y 25 / 03 / 2021



ISO 9001:2015
Certified


Firmado
Signed for
BOIAS 02045
Fecha:
22/03/20
11:38:09 -05:00

Juan Pablo Rojas Duque
Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certification
Certification CIDET Manager



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características de producto de acuerdo a los requisitos.
Las normas y versiones de los estándares aplicables son las vigentes en el momento de la certificación.
El presente certificado es válido para el producto especificado en el campo de denominación.
De 1992 hasta 2015, CIDET ha sido reconocido por el Comité Colombiano de Normas Técnicas (CCNT) como
Laboratorio Certificado de No. 85-11 AW, Oriente Plus 13, Tbl. + Etá 444 12 11, Ene 14774, 444 24 40



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06409

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07 / 03 / 2016

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26 / 03 / 2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 25 / 03 / 2022

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA CENTELSA Y VIAKON**

**FABRICADOS POR CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. -
CENTELSA, UBICADAS EN LA CALLE 10 # 38 - 43 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL
ACOPÍ, YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**

Tipo	Cable de cobre para acometidas trifásicas
Referencias	Multiconductores: 3x10 AWG + 1x12 AWG; 3x8 AWG + 1x10 AWG; 3x6 AWG + 1x8 AWG; 3x4 AWG + 1x6 AWG y 3x2 AWG + 1x4 AWG
Temperatura de operación	75°C
Conductor de fase	Cobre flexible
Aislamiento	PE
Voltaje	0,6 kV / 1 kV
Cubierta	PVC
Aplicación	Sistemas aéreos de distribución secundaria
Referencia	CODENSA ET-112/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
457145

• **TOTALIZADOR TRIFASICO 70 AMP**

No. de Certificado

2365



CILES S.A.S.
NIT. 800.212.240-3

CERTIFICACIÓN TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Interruptor automático de baja tensión marca CILES.

Referencia: Ver referencias específicas en anexo del certificado.

Documento normativo: Numeral 20.16.2 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013. Ministerio de Minas y Energía.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.



Anexo 5 (Este certificado de conformidad es un documento que contiene 5 folios donde se describen las características técnicas de los productos certificados. Este certificado puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, siempre que se mantenga la integridad del documento. Se puede consultar en: www.qcert.com.co

[Firma]
Gerente

Fecha Otorgamiento: 2018-10-03
Fecha Vencimiento: 2021-10-02

Este documento es exclusivo del titular.

Dirección: 7 Mila Las Palmas, Parque Tecnológico Manizales, Envigado - Colombia - Cúcuta - Caquetá - Cauca

Tel: +5741-424-80-82

La Calidad es
nuestro sello.
qcert.com.co

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 2365

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2018-10-03
FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-10-02

CILES S.A.S.

CALLE 17 N° 43F - 165, Medellín - Colombia

Página 2 de 5

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptor automático de baja tensión marca CILES
Reglamento	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Referencias/Items	351.36-63
Corriente nominal In (A)	20 A
Corriente de disparo I _{sn} (mA)	30, 100 Y 300 mA
Tensión nominal (Ui)	Hasta 240 V
Corriente de cortocircuito (Icc)	6 kA
Número de polos	2P Y 4P
Tipo AC	Se asegura un disparo por corriente sinusoidal alterna residual, si súbitamente se detecta un leve incremento
Temperatura de operación	-5°C ~ +40°C
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección contra choque eléctrico y aislamiento a nivel residencial e industrial

• ROSETA PLAFON LOZA



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación

Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 03865

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
PORTALÁMPARAS	PLAFÓN	LEGRAND: 639007 Y 639008 LEGRAND: 639008XX BTICINO: P22AN Y P22BN

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65 A 93 - 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RE DE (Numeral 20.23)

Fecha de Certificación: 09 / 08 / 2016

Última Actualización: 10 / 12 / 2016

Fecha de Vencimiento: 16 / 12 / 2019

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 17 / 11 / 2017 y 17 / 11 / 2018



[Signature]
Samira Luján Loaza Ríos
Representante Legal Superior
Código 1.666.849.951.010


CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y preguntas de esta certificación, pueden ser consultadas en la página: www.cidet.gov.co

Se otorga el presente certificado de conformidad a las características y requisitos de la especificación técnica: *[Technical Specification Reference]*

Bogotá, Carrera 46 No. 51-11 (Av. Oriental) Piso 13 Tel: (+57) 444 42 11 Fax: (+57) 444 0400



ISO 9001:2008/2012
by CIR-064



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO 03865

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09 / 08 / 2010

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 12 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 12 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
PORTALÁMPARAS**

**FABRICADAS POR LEGRAND COLOMBIA S.A.,
UBICADA EN LA CALLE 65 A 93 - 91, BOGOTÁ, COLOMBIA**


Tipo		Plafón	
Referencia	LEGRAND 639007 y 639008	LEGRAND 639008XX	STICNO P22AN y P27EN
Material fabricación		Bajo plástico	
Características eléctricas		127 V para bombillas hasta 150W,	
Díámetro total		133 mm	
Otras Características		Bosca E27, placa retolda graduable, sin tumbos yethers, colores blanco, verde y liso.	
Referencia		RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Número 20 29)	

Nota: El sujeto XX permite disponer de la opción de diferentes colores

Atentamente,

Sandra Lucia Loiza Rios
Representante Legal Suplente

• CAJA OCTAGONAL



SGS COLOMBIA S.A.S.
CTS-F490101

Número de Orden: 4200-17845
Certificado No 8264

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

CODELCA S.A.S
Calle 17A No 96C-19,
Bogotá, Colombia.

Certifica que los productos identificados como CAJAS PLÁSTICAS, fabricados y comercializados en Colombia, por CODELCA S.A.S., con referencias relacionadas en la página 2 del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 80708 del 30 de Agosto de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. CAPITULO 3 REQUISITOS DE PRODUCTOS Artículo 20.5 CAJAS Y CONDULETAS, 20.5.1 Requisitos de producto.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad del fabricante de acuerdo con el esquema 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados Obtenidos: CONFORME

Autorizado por :

Oficina Registrada:
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 16 A No 78-11 Piso 3,
Bogotá, Colombia

SGS COLOMBIA S.A.S.




Emisión : Fecha: Bogotá D.C., 25 de Enero de 2013.
Válido Hasta: 02 de Marzo del 2019.
Versión 4. Actualizado el 03 de Marzo de 2016.

Página 1 de 2

This Certificate cancels and supercedes the Certificate dated 11/01/2016 issued by SGS Colombia S.A.S. SGS Paper No. 16059983 to 16059984.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to SGS Colombia S.A.S. via phone No. 74122274 ext. 2557.



SGS COLOMBIA S.A.S.

CTS-F490101

Número de Orden: 4200-17845

Certificado No 8264

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

CODELCA S.A.S

Calle 17A No 96C-19,

Bogotá, Colombia.

REFERENCIAS

CAJAS PLÁSTICAS

FABRICADAS POR CODELCA S.A.S.

Calle 17A No 96C-19- Bogotá

REFERENCIA
CAJA DE CONEXIÓN CUADRADA REFERENCIA 4X4 (2400)
CAJA DE CONEXIÓN RECTANGULAR REFERENCIA 2X4
CAJA DE CONEXIÓN OCTAGONAL

FIN DEL DOCUMENTO

Emisión / Fecha: Bogotá D.C., 25 de Enero de 2013.

Válido Hasta: 02 de Marzo de 2019.


Versión 4. Actualizados el 03 de Marzo de 2016.

Página 2 de 2

This Certificate cancels and supersedes the Certificate dated 31/01/2016 issued by SGS Colombia S.A.S. SGS Paper No. 16059983 to 16059984.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to SGS COLOMBIA S.A.S. or via phone No. 7422274 ext. 2557.

• BOMBILLO LED 12 W

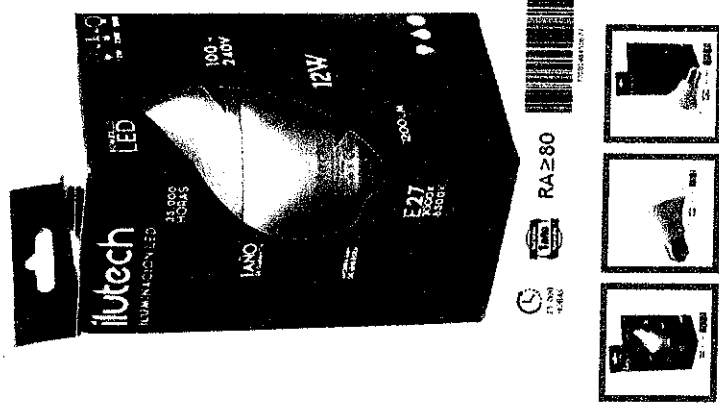

Bombillo Led 12W

Referencia: A70

Condición: Nuevo producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO		
A70	12W	1200 LM		
BASE	VOLTAJE	TEMPERATURA DE COLOR		
E27	100-240V	6500 K		
DISIPADOR	DOMO	TIPO		
INYECCION DE PLASTICO	POLICARBONATO	LED		

☒ Enviar a un amigo

☐ Impresión

twitter

f Compartir

G+ Google+

Pinterest

- **LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W**

Luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en vidrio, 2x18W T8, de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

Chasis en policarbonato resistente al impacto
Acabado profesional con soportes tipo clip de policarbonato
Fácil mantenimiento

APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Estacionamientos
Ambientes industriales

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color: 6500 K (DL)
Flujo luminoso: 3200 lm
Ángulo de apertura: 120°
Tipo de distribución: Directa simétrica
Reproducción de color (IRC): >70
Vida útil: 25000 h L70
Eficacia óptica luminaria (LOR): 62%

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada: 36 W
Tensión de operación: 100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada: 0.3 A @ 120 V
Factor de potencia: >0.70
Distorsión armónica (THD): <20%
Tipo de driver: Integrado en el tubo
Atenuable: NO

• REFLECTOR LED 150W


Reflector LED IP65 150W



Ultra Slim

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
ECO-LED-150W-3535	150W	22000lm




DESCRIPCIÓN GENERAL




Los Reflectores LED ecolite son ideales para diferentes tipos de aplicaciones o la instalación donde hay humedad alta y baja. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines, calles y parques. Construidos bajo altos estándares de calidad y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, BPTIAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- Bajo consumo de energía
- Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver: minimiza el que mantiene estable la corriente en el producto

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

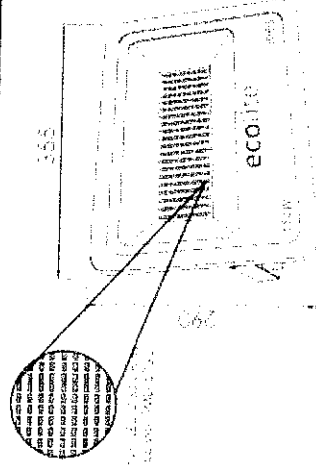

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

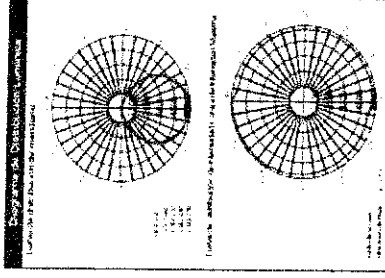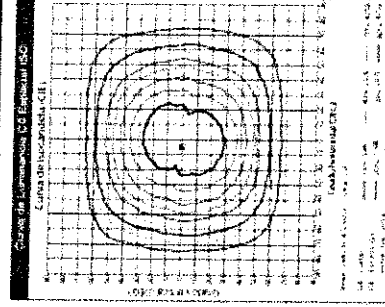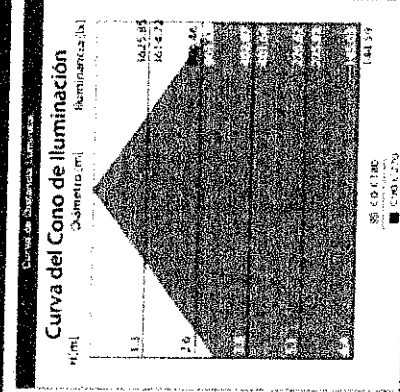

ECO LITE S.A. de CV
Calle 100 No. 100, Col. Centro, Mérida, Yucatán, México



ANEXO 5 CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN DEL PERSONAL FORMATO DE ENTREGA DE E.P.P.S

LISTA DE ENTREGA DE EPP EN OBRA										F-01-08E-LEPP	
										FECHA DE APROBACIÓN	
										19/09/2019	
PROYECTO										CONSECUTIVO: 1	
CONTRATO DE OBRA N° 037-40-E- CACOM-3-CRUEE-2019										PERIODO	
CLIENTE										OSRA	
FUERZA AEREA COLOMBIANA											
DATOS PERSONAL										CONTROL DE ENTREGA	
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CURTIEMBRE	CAMPO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	FUELLA	
						CHUBISCA	GUANTES	RETA	ANILLO	ANILLO	
1	Abel Cartillo	18918668	Maestro		X	X	X	X	X	X	
2	WILLERIDO	18972056	OFICIAL		X	X	X	X	X	X	
3	SUSE MONTANO LAGOS	1253222	OFICIAL		X	X	X	X	X	X	
4	FABIO GONZALEZ	11391150	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X	
5	Diego Guzman	80110511	OFICIAL		X	X	X	X	X	X	
6	CEFAIN GUZMAN	43080353	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X	
7	CARLOS ICON	103240693	OFICIAL		X	X	X	X	X	X	
8	SALOTH ARIE	1.064.372.39	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X	
9	DANNO ORANTE	1061333745	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

REVISOR:  DIRECTOR DE OBRA:  APROBADO:  GERENTE DE PROYECTO: 

ANEXO 6
CONTROL SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN
(NUEVA PROGRAMACION)

INFORME SEMANAL No.	PERIODO	% ACUMULAD O EJECUTAD O	% ACUMULADO PROGRAMADO
FINAL	28/10/19- 29/11/19	100%	100%


ANEXO 7

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA


PRINCIPALES ACTIVIDADES FINALES REALIZADAS

CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL

- **MODULO A**
- **INSTALACION TEJA SANDWICH**

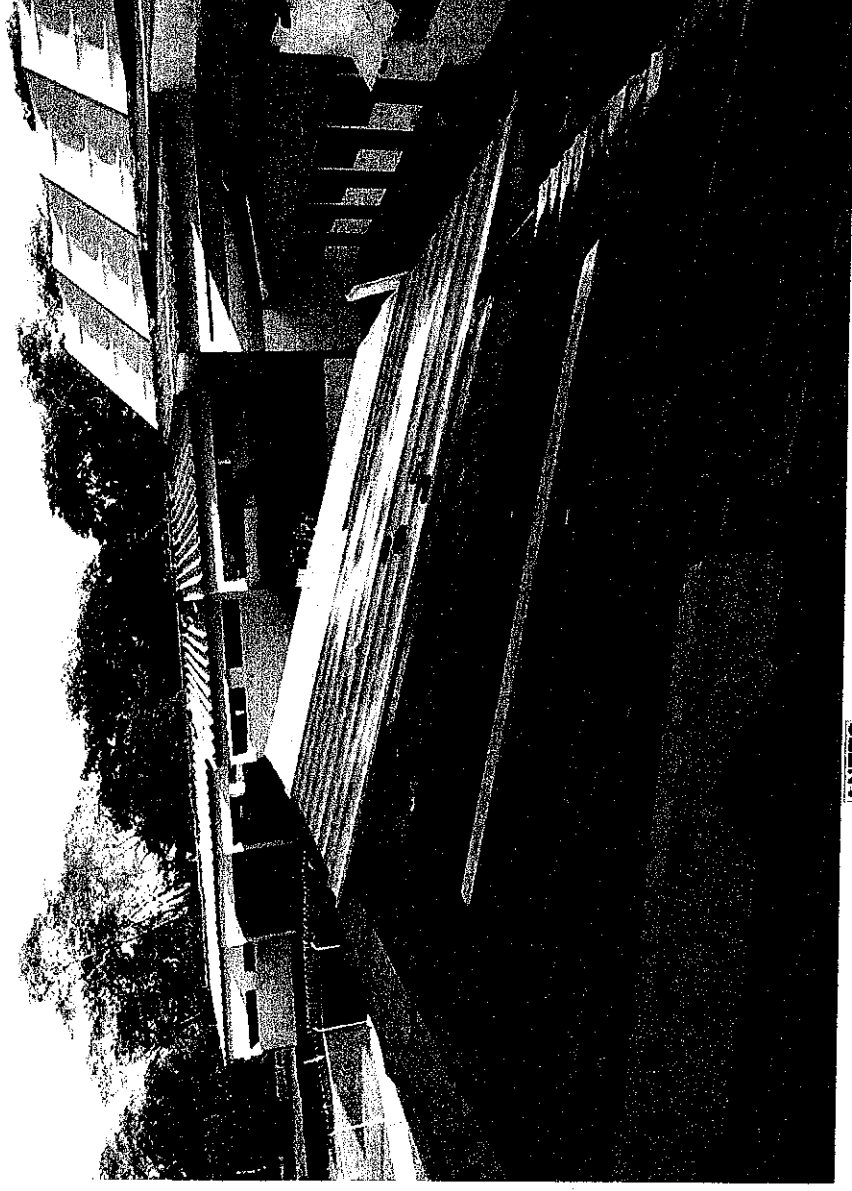

ANTES

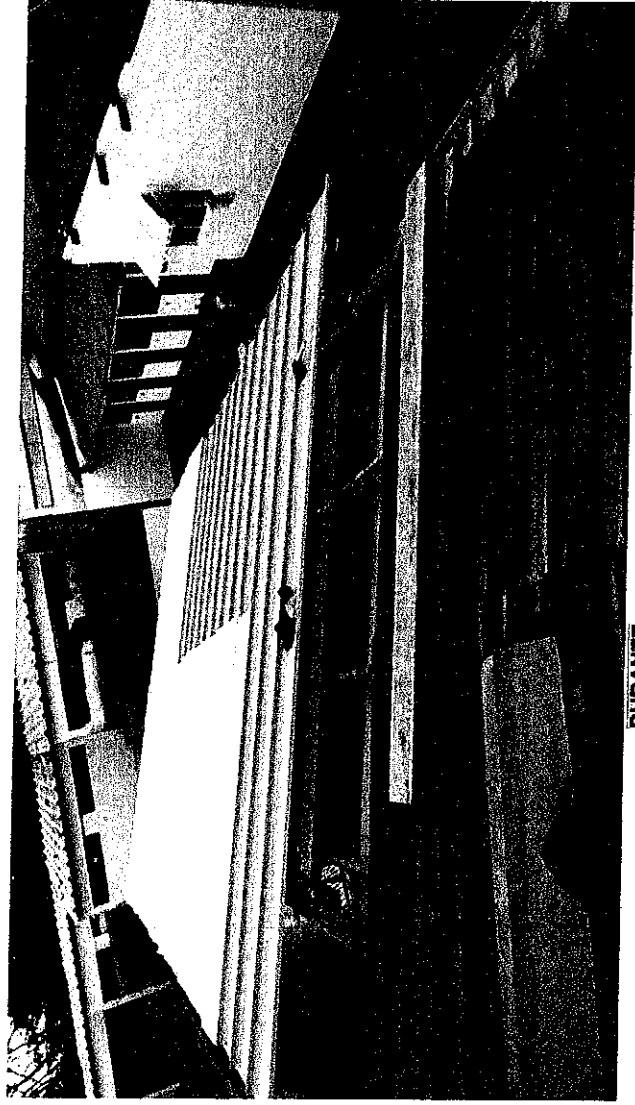

DURANTE



DESPUES O FINAL

INSTALACIÓN DE CIELO RASO 9MM

Se realiza el suministro e instalación de cielo raso 9 MM, color blanco brillante. Las láminas de PVC

son fijados por medio de una estructura de perfiles galvanizados y elementos adicionales como: tabilllas, omegas, viguetas, cornisa y accesorios. Una vez instalada la estructura se procede a la fijación de las laminas PVC 9 mm. Tenga en cuenta que para la instalación se debe recurrir a herramientas como lo son: taladro, martillo, metro, escuadra, caladora, bistorí, espátula, nivel, entre otros; siempre junto con los elementos de seguridad básicos.

El proceso constructivo para la correcta instalación del cielo raso es el siguiente:

1. Se determina niveles en todo el perímetro del cuarto a intervenir, en este caso dormitorio modulo A.
2. Se realiza la instalación de la estructura de fijación con los perfiles galvanizados de acuerdo a los niveles marcados.
3. Inicialmente se instala el perfil moldura a una distancia no mayor a 60 cm, seguidamente se instala las omegas, tabilllas y viguetas.
4. Una vez instalada toda la estructura de omegas y viguetas se procede a instalar el perimetral o cornisa al ángulo. Para iniciar con la instalación de la cornisa se debe cortar los extremos en un ángulo de 45° con la sierra o la caja inglete para que encaje en las esquinas.
5. Finalmente se instala los paneles de PVC en la dirección deseada, fijándola cada 60 cm máximo con el fin de garantizar un elemento seguro y estético ante la vista.




DURANTE



DESPUES


SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO

Se instala ventanas con angeo acorde a especificación contratada.

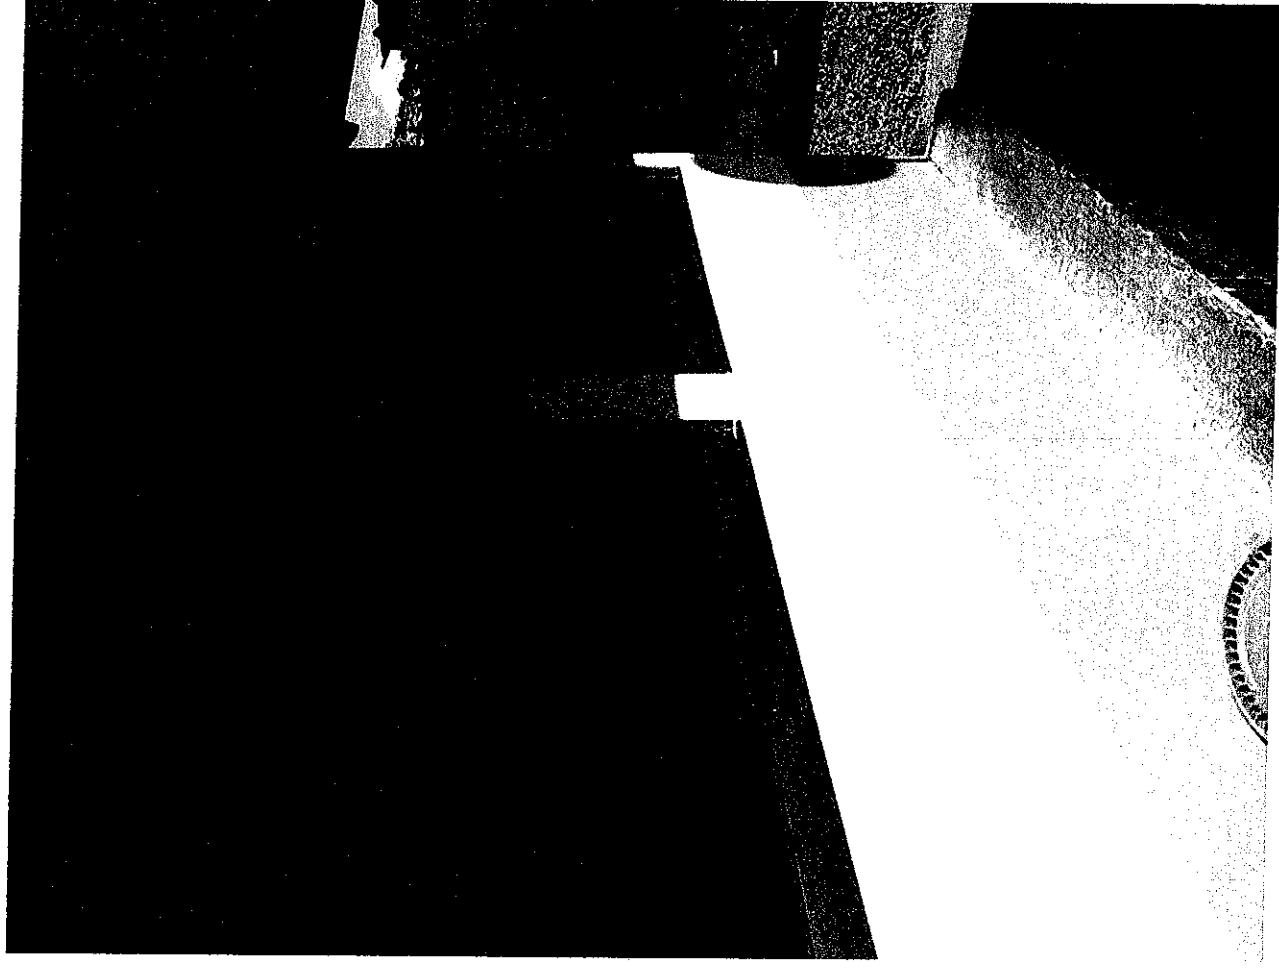

- **MODULO B**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA METALICAS PARA CANILES

Cabe resaltar que contractualmente las puertas estaban diseñadas en malla eslabonada, lo cual no era satisfactorio, ni garantizaría la durabilidad de estos elementos, por tal motivo, la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S pidió aval al supervisor, la cual fue otorgada para fabricarla en varilla 10 mm; teniendo muy claro que no se realizó ninguna modificación económica al contrato., con el fin de poder garantizar elementos funcionales en todos los aspectos. no obstante, se realiza la instalación de puertas con su respectiva pintura anticorrosiva y tres capas de esmalte color gris, cumpliendo a cabalidad con todas las especificaciones técnicas del contrato.

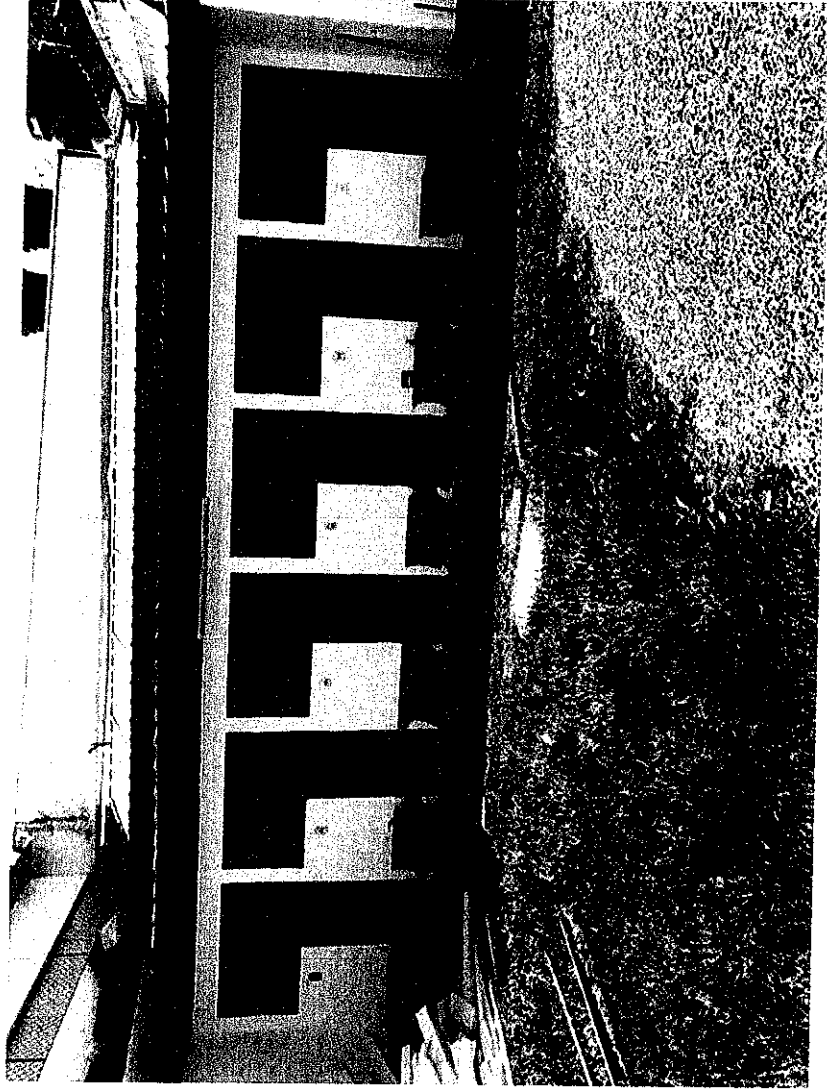

- **MODULO C**

- **INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO**

Se realiza el suministro e instalación de una ventana en aluminio anonizada, la cual fue instalada en la bodega de caniles, estos elementos cuentan con todas las especificaciones que exige el contrato, tales como: angeo, nave fija y corrediza, vidrio 5 mm, empaques triangulares, enganches en las naves y alfajía. La ventana fue instalada con 3 chazos por cada constado, garantizando un elemento estable y debidamente asegurada.



- **INSTALACION TEJA SANDWICH**



ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Diligenciamiento de bitácora, registro fotográfico, mediciones endistintos frentes de trabajo, cotizaciones y compra de materiales, realización de informes semanales y diligenciamiento de formatos necesarios y obligatorios de la Fuerza Aérea Colombiana FAC. Al término de la semana se cuenta con:

- Residente de obra (1)
- Oficiales (2)




Elaboró:



HARRISON HERNAN LUNA-M.
INGENIERO CIVIL.
RESIDENTE OBRA


FECHA										CONTRATO NO.										OBJETO DEL CONTRATO										INTERVENIOR O SUPERVISOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FORMATO BALANCE DE OBRA										FUERZA AEREA COLOMBIANA										INGENIEROS CONSTRUCTORES PAR 9 A.S										TENIENTE CARLOS CUADROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10 DE OCTUBRE DE 2019										057-00-E-CACOM-2-GRUPO 2019										"MAINTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Código										Versión										Vigencia										12/08/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GA-JELOG-FR-092										Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.										DESCRIPCION ACTIVIDAD										UND										PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL										VALOR PARCIAL										CANTIDAD REAL</									

[illegible]


FECHA									
CONTRATO NO.									
OBJETO DEL CONTRATO									
INTERVENIENTOS O SUPERVISOR									
CONTRATISTA									
"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINIA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"									
INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S									
10 DE OCTUBRE DE 2019									
657-00-E-CACOM-2-GRUPO-2019									
FORMATO BALANCE DE OBRA									
FUERZA AEREA COLOMBIANA									
Código									
Versión									
Vigencia									
12/06/2019									
GA-JELOG-FR-092									
2									
19 DE OCTUBRE DE 2019									
CORTE NUMERO 1									
CORTE FINAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
CANTIDAD REAL									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
VALOR PARCIAL									
VALOR PARCIAL REAL									
C									

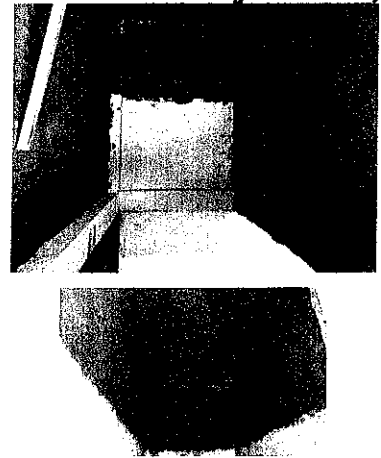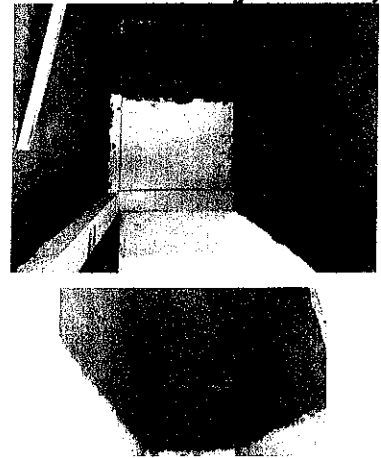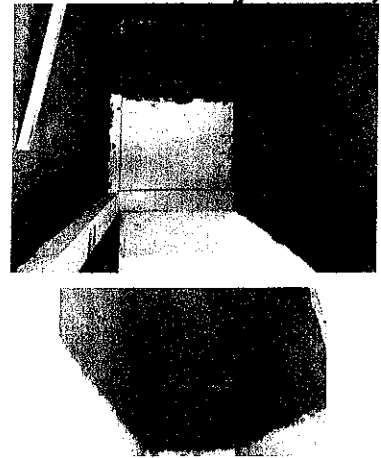
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098		Formato Memorias Corte de Obra		Vigencia 12/06/2019		Contrato No. 057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		Objeto del Contrato "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".		Contratista INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S		Interventor o Supervisor TENIENTE CARLOS CUADROS		Item No NP2		DESCRIPCIÓN ITEM pañete interior, muros e= 15 mm, proporcion 1:4, incluye su aplicacion en filos, carteras y dilataciones"		CORTE No: 2		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019							
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		Medida PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS 6		Medida Total 73.90		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		Medida PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS 6		Medida Total 73.90		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		Medida PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS 6		Medida Total 73.90		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS		Revisó: FLORENTINO MACA		Revisó: FLORENTINO MACA	

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098	
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión 2		Vigencia 12/06/2019	
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019					
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"			
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S			
INTERVENTOR O SUPERVISOR		TENIENTE CARLOS CUADROS			
ITEM No.		NP1		UND	
DESCRIPCIÓN ITEM		Remoción de acabado de muro incluye hasta el pañete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado			
CORTE No. 2		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES	
		Ancho		Longitud	
		8.2		1.341	
		PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS	
		6		65.99	
		TOTAL		65.99	
Revisó:  FLORIANE Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y postfirma Elaboró:		Elaboró:  DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postfirma Autorizó:		TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Postfirma	

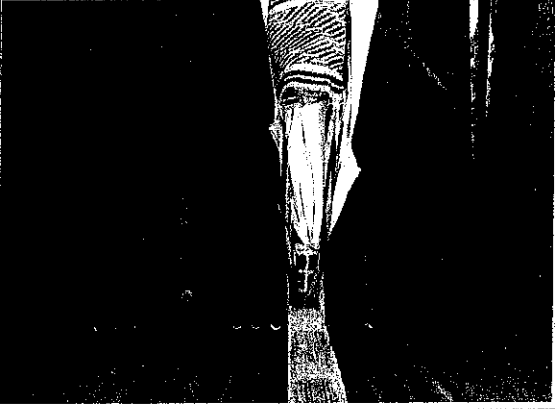		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098																													
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión 2		Vigencia 12/06/2019																													
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".																															
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENTOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS																															
ITEM No NP2		UND m2		DESCRIPCION ITEM paquete interior, muros e= 15 mm. proporcion 1:4, incluye su aplicacion en filos, carteras y dilataciones"																													
CORTE No: 2		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																													
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES <table border="1"> <tr> <td>Medida</td> <td>Medida Parcial</td> <td>Nº de Elementos</td> <td>Medida Total</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,700</td> <td>2</td> <td>25,92</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2,85</td> <td>1</td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,60</td> <td>2</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,5</td> <td>2</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,57</td> <td>2</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,5</td> <td>2</td> <td>1,35</td> </tr> </table>		Medida	Medida Parcial	Nº de Elementos	Medida Total	2	2,700	2	25,92	1	2,85	1	10,26	2	3,60	2	3,60	2	0,5	2	3,60	2	0,57	2	2,17	2	1,5	2	1,35		
Medida	Medida Parcial	Nº de Elementos	Medida Total																														
2	2,700	2	25,92																														
1	2,85	1	10,26																														
2	3,60	2	3,60																														
2	0,5	2	3,60																														
2	0,57	2	2,17																														
2	1,5	2	1,35																														
TOTAL 43,30		Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Posfirma																															
Autorizó: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma		Revisó: FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma Elaboró: HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Posfirma																															


FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código GA-JELOG-FR-098		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA Versión 2 Vigencia 12/06/2019		CONTRATO No. 057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019 "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2". INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S INTERVENITOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS		CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO		DESCRIPCION ITEM Remoción de acabado de muro incluye hasta el pafete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado		CORTE No: 2 FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 		LOCALIZACIÓN MODULO C Ancho Longitud Altura 4.80 2.70 0.5 3.60 2.85 0.5 3.60 1.80 1.80		MEDIDAS MEDIDA PARCIAL N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL		25.92 10.26 1.80		TOTAL 37.98		Revisó: FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma Residente de Obra HERNAN LUNA MACA		Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Posfirma Autorizó: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma	
--	--	---	--	---	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	--	----------------	--	---	--	---	--





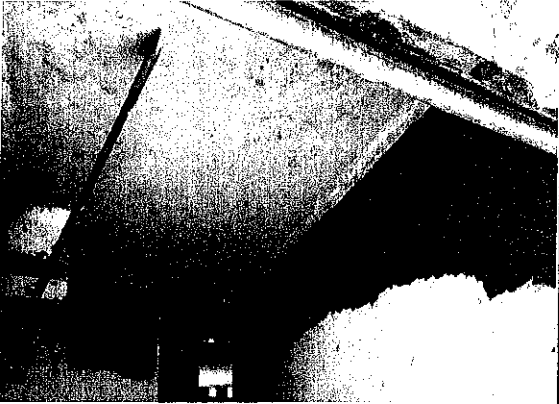
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098		Versión 2		Vigencia 12/06/2019	
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"							
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENIDOR O SUPERVISOR NP2							
ITEM No NP2		UND m2		DESCRIPCIÓN ITEM paquete interior, muros e= 15 mm, proporcion 1:4, incluye su aplicacion en fillos, Carteras y dilataciones"					
CORTE No: 2		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		LOCALIZACIÓN MEDIDA PARCIAL					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES Altura		Nº DE ELEMENTOS 8		MEDIDA TOTAL 79,46			
		Longitud 2,0		1,00 8		16,00 9,98			
Elaboro: DIEGO FERNANDO BORDA YATE		Auxiliar de Obra Firma y Postirma		Elaboro: TENIENTE CARLOS CUADROS					
Revisor: FLOR ALBA MACA		Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y postirma		Elaboro: TENIENTE CARLOS CUADROS					
Residente de Obra Firma y Postirma		Elaboro: TENIENTE CARLOS CUADROS		Elaboro: TENIENTE CARLOS CUADROS					
Revisión 106,44		TOTAL 106,44		TOTAL 106,44					

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión 2
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2" INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		
CONTRATISTA INTERVENTOR O SUPERVISOR		ITEM No 1,5		
DESCRIPCION ITEM Suministro e instalación de concertina incluye cambio de 3 redes de alambre de púas, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR	DIMENSIONES MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS 1
		Longitud 162,0	Altura 	MEDIDA TOTAL 162,00
TOTAL		162,00		
Revisó: FLORIBELDA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y postfirma		Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postfirma		
Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Postfirma		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Postfirma		


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
CONTRATO No. 057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".					
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S			INTERVENIOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS					
ITEM No 1,4			UNID g/b			DESCRIPCIÓN ITEM Resanes, cambio de bloques dañados, pañete y instalación de alfilería incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado		
CORTE No. 2			FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			MECIDA		
ANCHO			LONGITUD			ALTURA		
EXTERIOR			MECIDA PARCIAL			Nº DE ELEMENTOS		
MECIDA TOTAL			MECIDA TOTAL			MECIDA TOTAL		
REVISOR FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y Postirma Elaboró:			ELABORADOR DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postirma Autorizó:			REVISOR HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Postirma		
REVISOR FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y Postirma Elaboró:			ELABORADOR DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postirma Autorizó:			REVISOR HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Postirma		

		FUEZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2
				Vigencia	12/06/2019
CONTRATO No.					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR					
ITEM Nº					
1,3					
UND					
m2					
DESCRIPCIÓN ITEM					
Pintura cerramiento en malla eslabonada doble cara incluye anticorrosivo, esmalte, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado					
CORTE Nº:					
2					
FECHA :					
29 DE NOVIEMBRE DE 2019					
DIMENSIONES					
MEDIDA PARCIAL					
Nº DE ELEMENTOS					
MEDIDA TOTAL					
LOCALIZACIÓN					
ANCHO					
LONGITUD					
ALTURA					
PERIMETRO DE CERRAMIENTO					
200,25					
TOTAL					
200,25					
Elaboró:					
DIEGO FERNANDO BORDA YATE					
Auxiliar de Obra					
Firma y Postfirma					
Autorizó:					
TENIENTE CARLOS CUADROS					
SUPERVISOR					
Firma y Postfirma					
Revisó:					
FLORA BA MACA					
Representante Legal Contratista					
Ingenieros constructores y consultores FYR					
Firma y Postfirma					
HARRISON LUNA MACA					
Residente de Obra					
Firma y Postfirma					

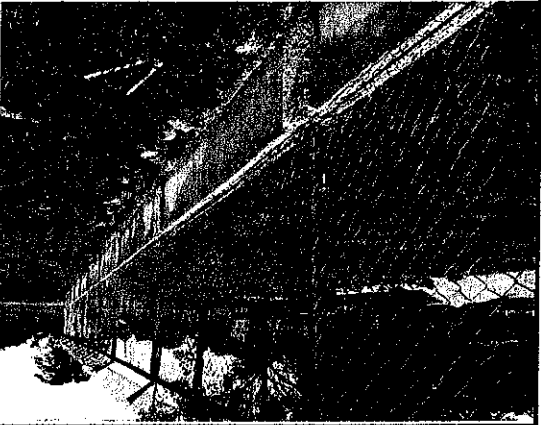
FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2". INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S TENIENTE CARLOS CUADROS		
CONTRATISTA INTERVENIOR O SUPERVISOR		ITEM No 1.2		
DESCRIPCIÓN ITEM Refuerzo inferior, superior y laterales de malla con ángulo de 1" x 1/8 y tensionamiento de mallas a modulo x 3m en contrato del área de caniles incluye puerta principal, incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
LOCALIZACIÓN PERIMETRO DE CERRAMIENTO		DIMENSIONES MEDIDA PARCIAL MEDIDA TOTAL		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		ALTURA 46		
		LONGITUD 46,00		
ANCHO 46,00		AREA TOTAL 46,00		
REVISOR: FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR		AUTORIZO: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra		
ELABORO: HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra		ELABORO: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR		

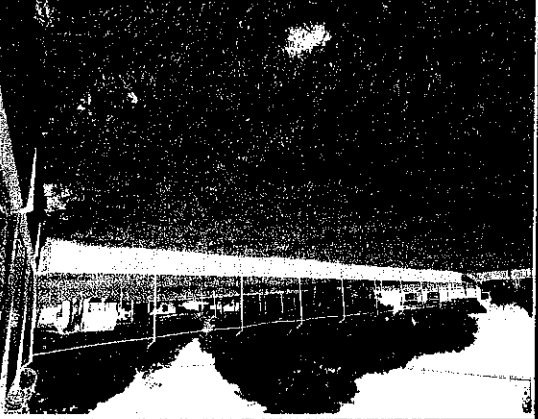		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098		Formato Memorias Corte de Obra		Versión 2		Vigencia 12/06/2019	
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"									
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENIOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS									
ITEM No 1.1		UNID m2		DESCRIPCIÓN ITEM Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado							
CORTE No: 2		FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL			
ANCHO		LONGITUD		ALTURA		2		148,20			
PERIMETRO DE CERRAMIENTO		114,0		0,65		2		148,20			
											
Revisó: FLOR ALBA MORA Representante Legal Contabilista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posición: 		Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y posición: 		Autorizó: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y posición: 		Residente de Obra HARRISON L. LUNA MORA Firma y posición: 					


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
		CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2". INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S TENIENTE CARLOS CUADROS			ITEM N° 3,5
DESCRIPCIÓN ITEM Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y pisos		CORTE N°: 2		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES MEDIDA PARCIAL		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		
PERIMETRO DE CANILES MODULO B		Ancho Longitud Altura		8,5 6		51,00		
TOTAL		61,00		61,00		61,00		



Revisor:
FLORENTINA MACA



Representante Legal Contratista
FLORENTINA MACA




Ingenieros constructores y consultores FyR

Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE		Autorizó: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR	
Firma y Postfirma		Firma y Postfirma	

		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
		CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019				
OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"		CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENIOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS		
ITEM No 34		UNID m2		DESCRIPCION ITEM Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requirieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado		
CORTE No: 2		FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		
LOCALIZACION		DIMENSIONES		MEDIDA MEDIDA PARCIAL		
MODULO B MUROS EXTERNOS MODULO B PUERTAS MURO IZQUIERDO MURO EXTERNO OFICINA MURO IZQ LATE		Altura Longitud Ancho		MECDA TOTAL		
9.00 0.65 2.2 5.7 5.8		0.46 0.46 0.60 0.55 0.62		4.14 -1.79 1.32 3.14 3.60		
TOTAL		MECDA TOTAL		10.40		



		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
CONTRATO No.			057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2". INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S TENIENTE CARLOS CUADROS		
OBJETO DEL CONTRATO			CONTRATISTA INTERVENTOR O SUPERVISOR			ITEM N° 3.3		
DESCRIPCIÓN ITEM			Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requirieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado			FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES		
MODULO B MUROS EXTERNOS			Ancho 9.00			Altura 1.86		
MODULO B PUERTAS			0.65			1.86		
MODULO B VENTANAS			0.70			0.76		
MURO IZQUIERDO			2.2			2.1		
MURO EXTERNO			5.7			2.7		
VENTANA			1.3			-0.6		
MURO IZO LAT			5.8			1		
MEDIDA TOTAL			16.74			-7.25		
MEDIDA TOTAL			-3.19			4.62		
MEDIDA TOTAL			15.39			-0.78		
MEDIDA TOTAL			5.80			31.32		


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2". INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S			
CONTRATISTA INTERVENTOR O SUPERVISOR			ITEM No 3.2			
DESCRIPCIÓN ITEM Alistado y mineralizado de Piso en caniles para evitar bacterias y acumulación de plagas incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado			FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			
CORTE No: 2		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MECIDA		
MODULO B		ANCHO		LONGITUD		ALTURA
PISOS DE CANILES		COMEDEROS		MECIDA PARCIAL		
1,30		0,40		0,8		
3,3		0,8		6		
25,74		-1,92		MECIDA TOTAL		
ELABORÓ: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postfirma		ELABORÓ: HARRISON FERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Postfirma				
AUTORIZÓ: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Postfirma		REVISÓ: FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores F&R Firma y postfirma				



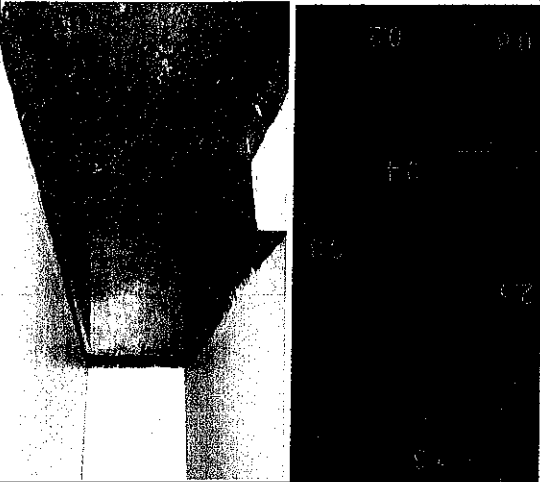


FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código GA-JELOG-FR-098		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA Versión 2 Vigencia 12/06/2019		CONTRATO NO. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".		CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENITOR O SUPERVISOR 3,1		ITEM Nº UND		DESCRIPCIÓN ITEM Estuco y pintura epoxica 3 manos (incluye estuco, fillos y dilataciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado) para muros internos de caniles		CORTE Nº: 2		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN MODULO B MUROS DIVISORIOS MODULO B MURO POSTERIOR MODULO B ANTEPECHO		DIMENSIONES MEDIDA PARCIAL MEDIDA TOTAL		Altura 1,40 1,40 1,40 1,40 0,7		Longitud 3,3 1,3 1,40 1,40 1,40		Ancho 12 6 6 6 6		MEDIDA TOTAL 55,44 10,92 5,88		TOTAL 72,24		Elaboró: DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Posfirma		Revisó: FLOR ALEXANDRA Representante Legal, Contratista Ingenieros constructores y consultores F&R Firma y Posfirma		Elaboró: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma		Firma y Posfirma Residente de Obra	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------	--	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión 2
CONTRATO No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".		
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S		INTERVENITOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS		
ITEM No 2,1		UNID m2		
DESCRIPCIÓN ITEM Suministro instalación y puesta en servicio de puertas en malla eslabonada con perfil circular de h=2,05 m y ventana en malla eslabonada, incluye pasador porta candado, bisagras, pintura anticorrosiva, materiales, equipos necesarios y personal calificado		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		
MODULO B PUERTAS 0,7 Ancho		MODULO B VENTANAS 0,80 Longitud		
MODULO B PUERTAS 2,05 Altura		MODULO B VENTANAS 0,8 Altura		
PARCIAL MEDIDA		PARCIAL MEDIDA		
Nº DE ELEMENTOS		Nº DE ELEMENTOS		
MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		
8,24		3,84		
12,08		12,08		


Revisó: 
 Representante Legal Contratista
 Ingenieros constructores y consultores FyR
 Flór ALBA MACA
 Elabóro: 
 Residente de Obra
 HARRISON HERIÁN LUNA MACA
 Firma y Postfirma


Elabóro: 
 Auxiliar de Obra
 DIEGO FERNANDO BORDA YATE
 Autorizó: 
 SUPERVISOR
 TENIENTE CARLOS CUADROS
 Firma y Postfirma


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código GA-JELOG-FR-098		Versión 2		Vigencia 12/06/2019	
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA									
CONTRATO No. 057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019									
OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".									
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.									
INTERVENIOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS									
ITEM No 1,1		UNID un		DESCRIPCIÓN ITEM Desmonte de puertas y ventana en acero de caniles incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado					
CORTE No: 2		FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL		Nº DE ELEMENTOS 6		MEDIDA TOTAL 6,00	
MODULO B		Ancho		Longitud		Altura		TOTAL 6,00	
									
									
Revisó:  FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y postfirma Elaboró:  DIEGO FERNANDO BORDA YATE Auxiliar de Obra Firma y Postfirma Autizó:  TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Postfirma									
HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Postfirma									

FUERZA AÉREA COLOMBIANA		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Código GA-JELOG-FR-098	Versión 2	Vigencia 12/06/2019
CONTRATO No. 067 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019			OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"			
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCOTORES FAR S.A.S			INTERVENIOR O SUPERVISOR TENIENTE CARLOS CUADROS			
ITEM No. 8,4			UND ml			
DESCRIPCIÓN ITEM Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y pisos			FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		
MODULO C CANILES		Ancho Longitud Altura		MEDIDA PARCIAL Nº DE ELEMENTOS		
15,1 1		15,10 1		MEDIDA TOTAL		
15,10		TOTAL		15,10		






Revisó: 
FLORE ALBA MACA
Representante Legal Contratista

Elaboró: 
HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra

Firma y Postfirma

Elaboró: 
DIEGO FERNANDO BORDA YATE
Auxiliar de Obra

Autorizó: 
TENIENTE CARLOS CUADROS
SUPERVISOR

Firma y Postfirma
