

INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 13
CONVENIO No. 1621 MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE 28 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA”		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 No. 3 – 10 s		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL, DEL CONVENIO	\$2.383.023.552	
	APORTES MIN – FONSECON	\$2.383.023.552	
	APORTES MUNICIPIO	\$0	
	OTROS APORTES	\$0	
FECHA SUSCRIPCION	20 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	16 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	HERNANDO DE JESUS PEREZ	17/07/2023	31/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. Paula Macarena Morales	17/07/2023	31/01/2024
	Ing. Jhoan Sebastian Navas P.	13/02/2024	Vigente
SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. Hernando Orjuela Malagón	17/07/2023	31/12/2023
	Arq. Jorge Andrés Cuitiva Quintana	04/01/2024	Vigente
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. RES2023000486	Contrato Interventoría	
	No. RES2023000487	Contrato Estudios, Diseños y Obra	
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 600-47-994000069351	17/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	17 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION	FECHA: 20/03/2024	
	PRIMERA PRORROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRORROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACION SUSPENSION	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	\$2.144'721.552		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	\$238'302.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$		



2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➤ **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	27/07/23	\$1.072'360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE (\$436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	TREINTA POR CIENTO (30%)		\$ 436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE (\$436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	SETENTA POR CIENTO (70%)		\$ 436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$436.887.652), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	CIEN POR CIENTO (100%)		\$ 436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.072'360.598,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 922.656.856,50

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47-994000069351	Cumplimiento	476.604.710,40	28/06/2023	31/03/2025



4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		\$2.144.442.248,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		DD/MM/AAAA		\$ 0,00
		DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista		UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato		27 de octubre de 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		PRORROGA	DD/MM/AAAA	
		SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
		REINICIO	DD/MM/AAAA	
		MODIFICACIÓN 1	10/04/2024	
		MODIFICACIÓN 2	27/05/2024	
Fecha de terminación del Contrato		16 de agosto de 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$2.144.442.248,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
POLIZA N°	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0			
	Amparos	Vigencia		Suma asegurada
		Desde	Hasta	
	Cumplimiento del contrato	22/09/2023	05/12/2024	\$214.444.224,60
	Buen manejo y correcta inversion del Anticipo	22/09/2023	05/12/2024	\$643.332.674,40
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/09/2023	05/08/2027	\$107.222.112,40
	Estabilidad y calidad de la obra	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$214.444.224,80
	Calidad del servicio	22/09/2023	22/09/2028	\$32.873.600,00
	Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 3			
	Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificadorio No. 1 de fecha 10 de abril de 2024.			
	Fecha de expedición: 10/05/2024 Anexo 4			
	Aclaraciones: Incluye como beneficiario LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 8301144756.			
	Fecha de expedición: 29/05/2024 Anexo 5			
	Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificadorio No. 2 de fecha 27 de mayo de 2024.			
	COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA N°	39-40-101040702 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0			
	Amparos	Vigencia		Suma asegurada
		Desde	Hasta	
	Predios labores y operaciones	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Vehiculos propios y no propios	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00



<

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
N°CMA-002-2023	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		\$238.302.000,00	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00	
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C.No.1.049.611.640 DE TUNJA			
Fecha de Acta de inicio del contrato	27 de octubre de 2023			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA		
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA		
	REINICIO	DD/MM/AAAA		
	MODIFICACIÓN 1	10/04/2024		
	MODIFICACIÓN 2	27/05/2024		
Fecha de terminación del Contrato	16 de agosto de 2023			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$238.302.000,00	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
POLIZA N°	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0			
	Amparos	Vigencia		Suma asegurada
		Desde	Hasta	
	Cumplimiento	14/09/2023	05/12/2024	\$47.660.400,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	14/09/2023	05/08/2027	\$47.660.400,00
	Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2028	\$71.490.600,00



	Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 2 Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 10 de abril de 2024.				
	Amparos		Vigencia		Suma asegurada
			Desde	Hasta	
	Cumplimiento		27/10/2023	01/04/2024	\$47.660.400,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		27/10/2023	30/11/2027	\$47.660.400,00
	Calidad del servicio		27/10/2023	27/11/2028	\$71.490.600,00
	Fecha de expedición: 10/05/2024 Anexo 3 Aclaraciones: Incluye como beneficiario LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 8301144756				
	Fecha de expedición: 28/05/2024 Anexo 4 Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 2 de fecha 27 de mayo de 2024.				

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	12	17 de julio de 2024
INFORME MENSUAL OBRA DE INTERVENTORÍA	4	15/08/24
INFORME FINANCIERO		15/08/24
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Bancolombia 545-541707-25	\$ 223.353.321,20
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Firma acta de inicio	27/10/2023
	Pago Anticipo (03-11-2023) 30%	\$ 643.332.674,40
	Pago Acta Parcial 1 – Contrato de Obra LP-03-2023 (13-06-2024)	\$ 115.057.600,00
	Pago Acta Parcial 1 – Contrato de Interventoría CMA-02-2023 (02-07-2024)	\$ 79.434.000,00
	Pago Acta Parcial 2 – Contrato de Obra LP-03-2023 (16-07-2024)	\$ 84.832.528,10
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	15,04 %
% EJECUTADO DE OBRA	30.20 %

% AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	0.00%	7.00%	18,40%	30,20%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	5,00%	9,31%	0,00%	0,00%

INFORME: 13
AVANCE: 35,55 %
ESTADO: EJECUCIÓN
RECURSOS GIRADOS: 1.072.360.598
Pendiente por recibir: 1.310.662.954



INFORME DE ACTIVIDADES

El municipio de Turmequé, adelantó procesos contractuales de obra e interventoría, los cuales se encuentran en ejecución y dentro de los plazos establecidos para dar cumplimiento al objeto del convenio, de la siguiente forma:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

PROCESO	LICITACION PUBLICA LP-03-2023
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	Dos Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/Cte. (\$2.144.442.248)
ESTADO:	En ejecución
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39604
Pagos	<ul style="list-style-type: none">03/11/2023 Anticipo del 30% (\$ 643.332.674,40)13/06/2024 Pago Acta Parcial Obra 01 (\$ 115.057.600,00)16/07/2024 Pago Acta Parcial Obra 02 (\$ 121.000.000,00)
➤ Actividades	<p>De acuerdo al informe de actividades de la Interventoría se han realizado las siguientes Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE: Se realiza excavación con retroexcavadora en área de plazoleta y zona entre gimnasio y pista de trote debido a fallo encontrado, con profundidades promedio de 0.85 y 1.015 m, para un volumen total de 36,88 m3.➤ MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM: Se realiza relleno de áreas de excavación mecánica de urbanismo por fallo, así como relleno del área de plazoleta en adoquín frente edificio complementar hasta nivel -0.30, para un volumen total de afirmado compactado de 59,83 m3, actividad que se lleva a cabo en la semana de 24 de junio.➤ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM: Se realiza la instalación y compactación con benitin y vibrocompactador del área del gimnasio vital, con un espesor de 20 cm, para un volumen de 9,9 m3, actividad que se desarrolla en la semana del 15 de julio. Se instala subbase granular para la pista de trote en los tramos localizados frente al parque infantil, edificio complementario y gimnasio vital, en un ancho de 1,6 m, y espesor de 20 cm, para un volumen total de 20,25 m3 debidamente compactado con benitin, actividad que se desarrolla en la semana del 22 de julio. Se realiza instalación y compactación de subbase sobre área de plazoleta en adoquín entre edificio complementario y polivalente, con un espesor de 20 cm, para un volumen total de 12,49 m3 actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio.➤ TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO): Se realiza el transporte del material de afirmado de la pista de trote, desde la cantera Agregados Santa Lucia localizada en el municipio de Cucaita, a una distancia de 52,1 km de la obra, para una cantidad de 513,86 m3-km. Se realiza el transporte del material de afirmado y subbase del relleno de urbanismo instalado, así como de la subbase del gimnasio vital y los tramos de la pista de trote instalados, material que se transporta desde la cantera agregados Santa Lucia, para una cantidad total de 4.895,57 m3-km.➤ FILTRO FRANCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL: Se realiza construcción de filtro francés contra el costado de la vía vehicular, en una



- longitud de 26,19 m, el cual se conecta a caja de red de aguas lluvias conforme a diseño sanitario.
- GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES: Se instala geotextil en el área del gimnasio vital bajo la estructura del adoquín conforme al estudio de suelos, en un área de 49,49 m2, actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio. Se instala geotextil bajo estructura de pavimento de áreas de adoquín y andén en concreto para urbanismo, con un área total de 265,10 m2, actividad que inicia en la semana del 22 de julio.
 - SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM: Se realiza la construcción de concreto de 14 Mpa para ser instalado bajo los muros de contención para las graderías del edificio polivalente, con un ancho cada uno de 45 cm, conforme a la zarpa, y una área total de 13,36 m2, esta actividad inicia el 23 de julio de 2024.
 - VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA: Se realiza la construcción de la viga de cimentación del edificio polivalente, con una sección de 35x40 cm, en una longitud de 50,89 m, actividad que se lleva a cabo el 30 de junio de 2024.
 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM: Se realiza la construcción de las vigas aéreas del edificio complementario con una sección de 25x30 cm y una longitud de 45,68 m, actividad que se lleva a cabo en la semana de 8 de julio.
 - MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM: Se funde e instala concreto de 21 Mpa para muro de escalada del edificio complementario con un área de 10,94 m2, en un espesor de 15 cm, actividad que se finaliza en la semana del 02 de julio.
 - MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS: Se realiza la construcción de los muros de contención para las graderías del edificio polivalente, conformado por dos muros, el primero con una altura total de 1.10 m y longitud de 17,29 m, y el segundo con una altura total de 65 cm y una longitud de 14,42 m, actividades que se inician el 29 de julio de 2024.
 - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM: Se funde concreto para placa de contrapiso del edificio de servicios, con una cantidad de 72,96 m2, actividad que se realiza el día 28 de junio. Se realiza la construcción de la placa del parque infantil con espesor de 10 cm, en un área de 157,39 m2, actividad que se inicia en la semana del 29 de julio.
 - SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA: Se realiza el amarre del acero de refuerzo para los muros de contención de las graderías del edificio polivalente, conformado por flejes de ½” según despiece estructural, con un peso total de 618,62 kg, actividad que se inicia el 25 de julio de 2024.
 - MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS: Se realiza la instalación de malla electrosoldada de 6 mm en área de parque infantil con traslapes de 20 cm para un peso total de 499,31 kg, actividad que se inicia en la semana del 29 de julio.
 - SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA: Se realiza la fabricación e instalación de las platinas de anclaje para la estructura metálica de cubierta del edificio polivalente, conformadas por una lámina de ¾” en una sección de 40x40 cm, con o perforaciones para perno de 5/8”, para una cantidad de 8 elementos, actividad que se lleva a cabo el día 30 de junio junto con la fundida del concreto de la viga de cimentación. Se realiza la fabricación e instalación de la estructura metálica para cubierta del edificio de servicios, conformada por columnas de 200x70x3 mm, vigas en perfil de la misma sección y correas en perfil 120x60x2,5 mm, de igual forma se fabrica e instala la estructura de la pérgola de cafetería compuesta por columnas y vigas en perfil de 100x100x2 mm y correas de 100x50x2 mm, ubicada sobre platinas de anclaje en lámina de 3/8” de 22x22 cm, esto para una cantidad total de 1.478,58 kg. Esta actividad se inicia el día 23 de julio. Se realiza fabricación e instalación de estructura metálica de cubierta del edificio complementario, conformada por columnas y vigas de 200x70x3 mm, y correas de 120x60x2,5 mm, para los costados laterales y una estructura central en perfil de 100x50x2 mm, los laterales sobre platinas de 3/8” con una sección de 30x17 cm, todo con un peso total de 1.474,10 kg, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.



- PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO: Se realiza la aplicación de pintura en esmalte de la estructura metálica de cubierta del edificio de servicios, incluida lámina de platinas de anclaje, con una cantidad total de 1.496,55 kg. Se aplica pintura a la estructura metálica del edificio complementario incluida lámina de platinas, con un peso total de 1.466.63 kg, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.
- MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM: Se realiza la construcción de los muros internos, fachada sur, oriental y occidental del edificio de servicios, según medidas arquitectónicas, para un área total de 50,55 m2, actividad que se inicia el 22 de julio.
- ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR: Se realiza enchape de vigas aéreas de fachada sur y oriental del edificio de servicios, con una altura de 30 cm, para un área total de 4,30 m2.
- DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM: Se instalan las dovelas en los muros del edificio de servicios, compuertas por mortero, varilla acero de 1/2" y grafiles de 4 mm, conforme a la especificación del diseño estructural, para una cantidad total de 125,4 m en los muros ya finalizados, actividad que se realiza de manera paralela con el muro prensado.
- ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM: Se realiza la instalación de las varilla de 1/2" de anclaje en viga o placa de piso y viga aérea del edificio de servicio, para los muros en ladrillo prensado, de acuerdo con la localización indicada en planos estructurales, con una cantidad total de 116 unidades en los muros ya finalizados, actividad que se realiza de manera paralela con el muro prensado.
- TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9: Se realiza la instalación de la tubería hidráulica de 1/2" del edificio de servicios conforme al trazado de red de suministro, con una cantidad total de 12,07 m, actividad que se lleva a cabo el 5 de junio.
- REGISTRO DE CORTE 1": Se instalan dos registros de corte de 1" en el edificio de servicios para cada uno de los baños en la semana del 15 de julio.
- REGISTRO DE CORTE 1/2": Se instala un registro de 1/2" para la cafetería en el edificio de servicios, actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio.
- TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR PARA TANQUE: Se realiza la instalación del tanque de agua potable en la placa aérea del edificio de servicios, actividad llevada a cabo en la semana del 02 de julio.
- APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM: Se realiza la apertura de zanja para la instalación de la tubería de la red de aguas lluvias localizada desde las cajas de desagüe del edificio polivalente, hasta la caja de recibo frente al edificio de servicios, en una longitud total de 68,88 m, actividad que se finaliza en la semana del 22 de julio.
- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO: Se realiza relleno en material de recebo de las zanja excavada para la instalación de las tuberías de la red de aguas lluvias localizada entre las cajas del edificio polivalente y la caja de recepción frente al edificio de servicios, en una longitud de 68,88 m.
- INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS: Se realiza la instalación de 25,65 m de tubería de 8" para la recepción de aguas lluvias entre la caja del edificio polivalente y la caja del costado sur del edificio de servicios. Se instalan 38,23 m de tubería de 6" para la red de aguas lluvias localizada entre la caja del edificio complementario y la caja del costado norte del edificio de servicios. Se instalan 5 m de tubería de 4" entre la caja del edificio polivalente y la caja del edificio complementario, actividades que se finalizan en la semana del 22 de julio.
- APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION TY COMPACTACION: Se realiza la instalación de 2 ductos en tubo Conduit PVC tipo pesado de 1" localizada bajo la placa del parque infantil, para la conexión de la acometida parcial hasta el tablero de circuitos del edificio complementario, en una longitud de 13,22 ml, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio. Se instalan 44,16 m de ducto doble de 1" para la conexión



	<p>de los postes de alumbrado localizados entre el edificio polivalente y gimnasio vital y la pista de trote, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.</p> <p>➤ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80: Se realiza la instalación de bordillo en el perímetro del gimnasio vital, con una longitud total de 31,96 m, actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio. Se instala bordillo en el perímetro de la pista de trote de los tramos localizados frente al parque infantil, edificio complementario y gimnasio vital con una longitud total de 35,8 m, actividad que se lleva a cabo desde la semana del 22 de julio. Se realiza la instalación de bordillo en perímetro de la placa de parque infantil en una longitud total de 43,91 m, actividad que se inicia en la semana del 22 de julio.</p>
--	--

INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS

PROCESO	CONCURSO ABIERTO DE MERITOS CMA-002-2023
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS (\$238.302.000,00) M/CTE
ESTADO:	En ejecución
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13755512

NOTA:

Se adjunta:

- Informe semanal No. 11 correspondiente al periodo de 01/07/2024 al 07/07/2024
- Informe semanal No. 12 correspondiente al periodo de 08/07/2024 al 14/07/2024
- Informe semanal No. 13 correspondiente al periodo de 15/07/2024 al 21/07/2024
- Informe semanal No. 14 correspondiente al periodo de 22/07/2024 al 28/07/2024
- Informe semanal No. 15 correspondiente al periodo de 29/07/2024 al 04/08/2024

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/11/2023	04/04/2024	09/05/2024	17/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	25/07/2024
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA



7. REGISTRO FOTOGRAFICO





8. SUPERVISIÓN MUNICIPIO



JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico



GIOVANNI VELA BERNAL
Alcalde Municipal



INFORME FINANCIERO AL 31/07/2024



INFORME FINANCIERO DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024
MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA

DEL BANCO: BANCOLOMBIA

\$ 2,383,023,552.00

\$ 2,383,023,552.00
\$ 0.00

FECHA DE GIRO		
24/07/2023	GIRO 1	\$ 1,072,360,598.00
	GIRO 2	

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 1,072,360,598.00
--------------------------------------	---------------------

\$ 1,072,360,598.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP-03-2023	ANTICIPO 30% REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVENCIA -TIPO 1B EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÁN- BOYACA	2023110003	2023110003	07/11/2023	\$ 643,332,674.40	\$ 0.00	\$ 643,332,674.40
LP-03-2023	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001 Y AMORTIZACIÒN DE ANTICIPO DE RESERVA DEL CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÁN-BOYACA	2024060019	2024060019	13/06/2024	\$ 115,057,600.00	\$ 0.00	\$ 115,057,600.00
CMA-002-2023	ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 1 EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°CMA-002-2023; INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DEL	2024070001	2024070001	07/02/2024	\$ 79,434,000.00	\$ 0.00	\$ 79,434,000.00
LP-03-2023	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002 Y AMORTIZACIÒN DE ANTICIPO DE RESERVA DEL CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÁN-BOYACA	2024070022	2024070028	16/07/2024	\$ 84,832,582.10	\$ 0.00	\$ 84,832,582.10
VALOR TOTAL PAGADO					\$ 922,656,856.50	\$ 0.00	\$ 922,656,856.50

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----

[illegible]

\$ 1,072,360,598.00
\$ 922,656,856.50
\$ 2,803,370.70
\$ 0.00
\$ 2,803,370.70
\$ 152,507,112.20

Hayther Sanchez

Secretaría de Hacienda Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACIÓN DE LOS RECURSOS SOBANTES.

EXTRACTO

BANCARIO



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

PROY INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA
CRA 3 # 4 - 65 CENTRO
TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	348,848,236.44	SALDO PROMEDIO	\$	258,809,083
TOTAL ABONOS		\$	39,373.86	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	125,534,289.10	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	39,373.86
SALDO ACTUAL		\$	223,353,321.20	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS				1,911.49	348,850,147.93
2/07	PAGO A PROVE INTEROBRAS SC S				-60,576,769.00	288,273,378.93
16/07	ABONO INTERESES AHORROS				23,694.54	288,297,073.47
17/07	PAGO A PROV UNION TEMPORAL COB				-64,957,520.10	223,339,553.37
31/07	ABONO INTERESES AHORROS				13,767.83	223,353,321.20
	FIN ESTADO DE CUENTA					

INFORME
MENSUAL
JUNIO
INTERVENTO
RÍA



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 - MES DE JULIO

CONTRATANTE:



MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023

OBJETO:

**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO
1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACÁ**

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

INTERVENTOR:

INTEROBRAS SC SAS

SUPERVISOR:

ARQ. ANDRÉS CUITIVA QUINTANA

PERIODO DEL INFORME:

JULIO 1 A 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 - MES DE JULIO**1. CONDICIONES DEL CONTRATO**

Contrato de Obra	LP 03-2023
Contratante	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
Contratista	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
Supervisor	DIEGO SEBASTIÁN CHINOME PATARROYO
Objeto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACÁ
Valor del Contrato	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.144.442.248) M/CTE
Fecha de Inicio Contrato	27 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de firma del contrato	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES., CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
Modificadorio No.1	10 DE ABRIL DE 2024
Plazo Según Modificadorio No.1	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Modificadorio No.2	27 DE MAYO DE 2024
Nuevo Plazo Según Modificadorio No.2	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación Real	16 DE AGOSTO DE 2024

2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS EN EL CONTRATO

FECHA	TIPO ACTA	CONCEPTO
22/03/2023	INICIO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

30/05/2024	PAGO	ACTA PAGO PARCIAL No. 1
25/07/2024	PAGO	ACTA PAGO PARCIAL No. 2

3. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO

Durante el presente periodo, el personal de obra a cargo del proyecto es:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	30%
DIEGO FERNANDO MONTAÑA	RESIDENTE DE OBRA	100%
JOHN HENRY VELASQUEZ	PROFESIONAL SISOMA	10%

4. RELACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZADA

Durante el periodo del presente informe se ha utilizado la maquinaria relacionada a continuación:

- Estación total, Volquetas, Plancha vibratoria, Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador de concreto

5. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS E INDICADORES

Se llevaron a cabo las siguientes actividades para la construcción del proyecto infraestructura para la convivencia del municipio de Turmequé - Boyacá:

A. EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE

ACTIVIDAD	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	41.28
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	13,36



OBSERVACIONES: Se instala concreto de solados en la base de las vigas de cimentación para limpieza.

ACTIVIDAD	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMAleta	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	50.89
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	50.89



OBSERVACIONES: Se funden vigas en concreto con sección de 40 x 40 cm, de acuerdo con diseño estructural.

ACTIVIDAD	MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	48.08
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	31,71



OBSERVACIONES: Se funde concreto de 21 MPA para los dos muros de graderías de edificio polivalente.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	2294.54
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	1.977,51



OBSERVACIONES: Se amarra e instala el 100% del acero para la viga de cimentación y columna, conforme al despiece de diseño.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	7914.16
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	247.37



OBSERVACIONES: Se instalan las platinas acero en los ejes de viga de cimentación y columna, conforme al despiece de diseño.

B. EDIFICIO DE SERVICIOS

ACTIVIDAD	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	70.40
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	72,96



OBSERVACIONES: Se funde placa en concreto con espesor de 10 cm en concreto de 21 Mpa.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	1513.08
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	1.478,58



OBSERVACIONES: Se realiza suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para la cubierta del edificio de servicios de las baterías

sanitarias y cafetería, así como la pérgola para el área de servicio de la cafetería.

ACTIVIDAD	PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	1513.08
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	1496.55



OBSERVACIONES: Una vez instalada la estructura metálica se realiza la aplicación de esmalte sintético sobre todos los perfiles, a tres manos.

ACTIVIDAD	MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	50.95
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	50,55



OBSERVACIONES: Se realiza la construcción de la mampostería en ladrillo prensado conforme a planos arquitectónicos.

ACTIVIDAD	ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	15.22
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	4,30



OBSERVACIONES: Se enchapan las vigas aéreas en ladrillo prensado, para las fachadas.

ACTIVIDAD	DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	272.54
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	125,40



OBSERVACIONES: Se rellena con mortero y varilla de 1/2" las dovelas de la mampostería y se instalan grafites de 4mm.

ACTIVIDAD	ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	UN	116.00
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	UN	116,00



OBSERVACIONES: Anclado con anchor fix 4 para las dovelas en placa y/o viga de cimentación y viga aérea.

ACTIVIDAD	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	16.85
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	12.07



OBSERVACIONES: Se realiza el armado de la red de suministro de los baños, cafetería y cocineta, que se localiza debajo de la placa, correspondiente a

tubería de 1/2" con sus respectivos accesorios de conexión para las salidas, lavaplatos y poceta.

ACTIVIDAD	REGISTRO DE CORTE 1"	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	UN	2.00
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	UN	2.00



OBSERVACIONES: Para corte de suministro en baño de mujeres y hombres respectivamente

ACTIVIDAD	REGISTRO DE CORTE 1/2"	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	UN	1.0
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	UN	1.00



OBSERVACIONES: Para corte de suministro en cafetería

C. EDIFICIO COMPLEMENTARIO

ACTIVIDAD	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	45.68
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	45.68



OBSERVACIONES: Se realiza la construcción de las vigas aéreas en las cuales se deja embebida las platinas de cubierta. Se aplica Antisol para el curado.

ACTIVIDAD	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	9.94
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	10.94



OBSERVACIONES: Se construye muro de fachada del edificio en concreto para muro de escalada de parque infantil con espesor de 15 cm.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	1476.25
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	1474.10



OBSERVACIONES: Se fabrica la estructura metálica del edificio compuesta por dos cubiertas laterales para teja arquitectónica y una pérgola central para policarbonato.

ACTIVIDAD	PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	1476.25
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	1466.63



OBSERVACIONES: Se realiza pintura de la estructura metálica de todos los perfiles, incluyendo platinas de anclaje.

ACTIVIDAD	APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION TY COMPACTACION.	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	13.22
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	13.22



OBSERVACIONES: Se instalan dos ductos de tubería eléctrica tipo pesado en 1" para la acometida parcial del tablero del edificio complementario.

D. GIMNASIO BIOSALUDABLE

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3	9.90
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3	9.90



OBSERVACIONES: Se instala y compacta material de subbase con espesor de 20 cm en toda el área.

ACTIVIDAD	GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	49.49
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	49.49



OBSERVACIONES: Se instala geotextil en toda el área del gimnasio, bajo material de subbase.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	31.96
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	31.96



OBSERVACIONES: Se instala bordillo en todo el perímetro del gimnasio.

E. PISTA DE TROTE

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3	35.62
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3	20.25

**OBSERVACIONES:**

ACTIVIDAD	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	513.86
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	513.86



OBSERVACIONES: Se transporta el material de subbase desde cantera localizada en el municipio de Cucaita, siendo la más cercana con permisos de funcionamiento.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	229.02
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	35.80



OBSERVACIONES: Se instala bordillo en las áreas de pista localizadas frente a gimnasio vital.

F. ZONA DE JUEGOS INFANTILES

ACTIVIDAD	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	161.73
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	157.39



OBSERVACIONES: Se funde concreto en sitio para placa de contrapiso del área de juegos infantiles con un espesor de 10 cm.

ACTIVIDAD	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	KG	499.31
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	KG	499.31



OBSERVACIONES: Se instala malla electrosoldada No. 6 para el área de placa de contrapiso y se incluye traslapes de 20 cm.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	43.91
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	43.91



OBSERVACIONES: Se instala bordillo en todo el perímetro de la placa, contra las áreas de urbanismo.

G. URBANISMO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3	99.28
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3	36.88



OBSERVACIONES: Se realiza la excavación del área de circulación comprendida entre el edificio polivalente, el complementario, el gimnasio y la pista de trote por ese costado, de acuerdo con la necesidad hasta retirar el 100% de material orgánico.

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3	103.94
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3	59.83



OBSERVACIONES: Se realiza instalación de material de afirmado en las áreas de excavación mecánica y hasta nivel -0.30.

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3	69.29
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3	12.49



OBSERVACIONES: Se instala material de subbase en el área de la circulación entre edificios polivalente y complementario, con espesor de 20 cm

ACTIVIDAD	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M3-KM	4895.57
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M3-KM	4895.57



OBSERVACIONES: Se realiza el transporte de material de subbase y afirmado desde cantera localizada en el municipio de Cucaita.

ACTIVIDAD	FILTRO FRANCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	26.19
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	26.19
		
OBSERVACIONES: Se realiza la instalación del filtro francés localizado contra el perímetro de la vía, donde el proyecto se localiza en la parte inferior.		

ACTIVIDAD	GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	M2	346.46
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	M2	265.10
		
OBSERVACIONES: instalación de geotextil bajo pista de trote y circulación de adoquín.		

ACTIVIDAD	TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR PARA TANQUE	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	UN	1.00
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	UN	1.00



OBSERVACIONES: Se instala tanque plástico de agua potable en placa aérea del edificio de servicios.

ACTIVIDAD	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	206.4
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	66.75



OBSERVACIONES: Se realiza apertura de zanja para tubería de 4", 6" Y 8" en áreas de urbanismo.

ACTIVIDAD	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	206.4
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	66.98



OBSERVACIONES: Se realiza relleno de zanja para tubería de 4", 6" Y 8" en áreas de urbanismo.

ACTIVIDAD	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	28.4
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	25.65



OBSERVACIONES: Se instala tubería de 8" en los tramos junto a edificio de servicios.

ACTIVIDAD	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	68.06
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	38.23



OBSERVACIONES: Se instala tubería de 6" junto a edificio polivalente y gimnasio.

ACTIVIDAD	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	41.77
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	5.00



OBSERVACIONES: Se realiza la instalación de tubería de 4" para desagüe de aguas lluvia y aguas negras.

ACTIVIDAD	APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION Y COMPACTACION.	
PROGRAMADO	UND	CANTIDAD
	ML	147.67
EJECUTADO	UND	CANTIDAD
	ML	44.16



OBSERVACIONES: Se realiza instalación de ductos eléctricos para postes de iluminación.

6. REPORTE DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	15.04%
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	30.53%



UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
R/L JOHAN CAMILO SAENZ
 CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4 - ETAPA DE OBRA

CONTRATANTE:



MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023

OBJETO:

**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO
1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA**

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

INTERVENTOR:

INTEROBRAS SC SAS

SUPERVISOR:

ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA

PERIODO DEL INFORME:

JULIO DE 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4 - ETAPA DE OBRA

1. GENERALIDADES

1.1 LOCALIZACIÓN

La ejecución del proyecto se lleva a cabo en la zona urbana del municipio de Turmequé, Departamento de Boyacá, en la Carrera 2 No. 3-10 sur, predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-21230 y cédula catastral No. 15835-010000390003000, propiedad del municipio de Turmequé.

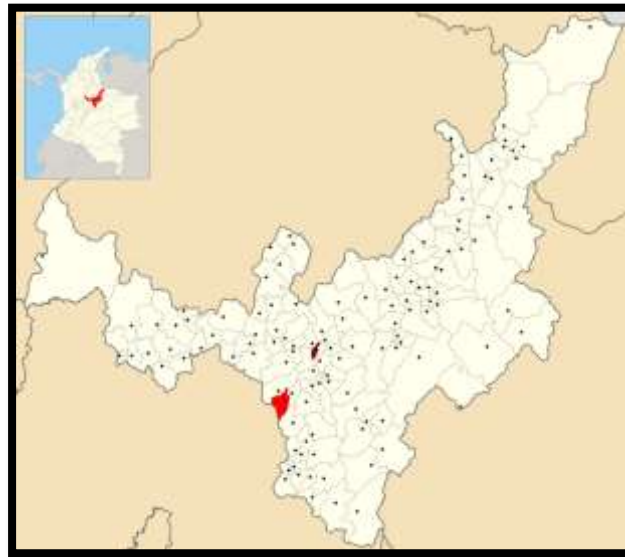


IMAGEN No. 1 – LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ



IMAGEN No 2 – LOCALIZACIÓN PROYECTO EN CASCO URBANO MUNICIPIO TURMEQUÉ

1.2 ESTADO INICIAL

El sitio de intervención se encuentra incluido dentro de un complejo deportivo denominado Zona Estadio. Colinda por el norte con una cancha de fútbol, por el costado oriental con una cancha de baloncesto en asfalto en mal estado, seguida del Centro de Integración Ciudadana, por el costado sur con vía vehicular pública, y por el costado occidental con predio privado con uso residencial.

Inicialmente el lugar de intervención se encontraba ocupado por una cancha de baloncesto en asfalto en mal estado, un Gimnasio Bio saludable y unas jardineras. Estas estructuras y mobiliario fue retirado por parte del municipio previo al inicio de la etapa de obra.

De acuerdo con el estudio de suelos, el costado sur occidental se encontraba comprendido por una capa de material vegetal de aproximadamente de 60 cm, localizada bajo el nivel 0+00 del proyecto, situación que fue corroborada en campo, siendo retirada dicha capa por parte del municipio de Turmequé, conforme al compromiso de actividades adquiridas mediante el convenio 1621 de 2023.



IMAGEN No 3 – ESTADO INICIAL DEL PREDIO



IMAGEN No 4 – ESTADO DE PREDIO PARA INICIO DE OBRA

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA

Modalidad y No. contrato	CONTRATO DE OBRA No. LP 03 -2023
Fecha de Suscripción	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Contratante	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
Contratista	UNIÓN TEMPORAL INFRATUR
Supervisor	ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Interventor	INTEROBRAS SC S.A.S.
Objeto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA.
Valor Total del Contrato	\$2.144.442.248,00
Fecha de Inicio	27 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha Aprobación Inicio de Obra	23 DE ABRIL DE 2024
Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
Plazo Según Modificadorio No. 01 del 10/04/2024	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Plazo Según Modificadorio No. 02 del 27/05/2024	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación Inicial	26 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Actual	16 DE AGOSTO DE 2024
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024

2.2. CONDICIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modalidad y No. contrato	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023
Fecha de Suscripción	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Contratante	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
Contratista	INTEROBRAS SC S.A.S.
Supervisor	ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE

	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA.
Valor Total del Contrato	\$238.302.000,00
Fecha de Inicio	27 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Plazo Según Modificadorio No. 01 del 10/04/2024	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Plazo Según Modificadorio No. 02 del 27/05/2024	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación Inicial	26 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Actual	16 DE AGOSTO DE 2024
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS EN EL CONTRATO

FECHA	TIPO ACTA	CONCEPTO
27/10/2023	INICIO CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
23/04/2024	INICIO OBRA	ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL MINISTERIO Y AUTORIZACIÓN INICIO DE OBRA
30/05/2024	PAGO PARCIAL	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1
04/06/2024	PAGO PARCIAL	ACTA DE PAGO PARCIAL No.2
25/07/2024	PAGO PARCIAL	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
25/06/2024	MODIFICATORIO	ACAT DE MODIFICACIÓN No.1

4. RELACIÓN POLIZAS VIGENTES CONTRATOS

- Contrato de Obra – Seguros del Estado**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
39-44-101155606 ANEXO 5	Cumplimiento del Contrato	214.444.224,80	27/10/2023	09/02/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	107.222.112,40	27/10/2023	09/10/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	214.444.224,80		5 años
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	643.332.674,40	27/10/2023	09/02/2025

	Calidad del servicio	32.873.600,00	27/10/2023	27/10/2028
39-40-101040702 ANEXO 6	Responsabilidad Civil Extracontractual	260.000.000,00	27/10/2023	09/12/2024

- **Contrato de Interventoría – Aseguradora Solidaria**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47- 994000070177 ANEXO 4	Cumplimiento del Contrato	47.660.400,00	27/10/2023	01/04/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	47.660.400,00	27/10/2023	30/11/2027
	Calidad del servicio	71.490.600,00	27/10/2023	27/11/2028

5. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

- **Contrato de obra**

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	30%
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	RESIDENTE DE OBRA	100%
JOHN HENRY VELASQUEZ SILVA	PROFESIONAL SISOMA	10%

- **Contrato de interventoría**

Durante el periodo de la presente acta, el personal a cargo del proyecto fue:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ELIANA SARMIENTO CIFUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	30%
JONATHAN ANDRES ROJAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%

6. INFORMES DEL PERIODO GENERADOS POR INTERVENTORÍA

TIPO DE INFORME	No. INFORME	FECHA
INFORME SEMANAL (01/07/2024 – 07/07/2024)	11	16/07/2024
INFORME SEMANAL (08/07/2024 – 14/07/2024)	12	16/07/2024
INFORME SEMANAL (15/07/2024 – 21/07/2024)	13	23/07/2024
INFORME SEMANAL (22/07/2024 – 28/07/2024)	14	30/07/2024
INFORME SEMANAL (29/07/2024 – 04/08/2024)	15	14/08/2024

7. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Durante el periodo del presente informe se utilizó la siguiente maquinaria y/o equipos:

- Estación total
- Retroexcavadora
- Volquetas
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto
- Saltarín y rana
- Benitin
- Vibrocompactador

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el presente mes se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra:

- **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE:** Se realiza excavación con retroexcavadora en área de plazoleta y zona entre gimnasio y pista de trote debido a fallo encontrado, con profundidades promedio de 0.85 y 1.015 m, para un volumen total de 36,88 m³.
- **MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM:** Se realiza relleno de áreas de excavación mecánica de urbanismo por fallo, así como relleno del área de plazoleta en adoquín frente edificio complementario hasta nivel -0.30, para un volumen total de afirmado compactado de 59,83 m³, actividad que se lleva a cabo en la semana de 24 de junio.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM:** Se realiza la instalación y compactación con benitin y vibrocompactador del área del gimnasio vital, con un espesor de 20 cm, para un volumen de 9,9 m³, actividad que se desarrolla en la semana del 15 de julio. Se instala subbase granular para la pista de trote en los tramos localizados frente al parque infantil, edificio complementario y gimnasio vital, en un ancho de 1,6 m, y espesor de 20 cm, para un volumen total de 20,25 m³ debidamente compactado con benitin, actividad que se desarrolla en la semana del 22 de julio. Se realiza instalación y compactación de subbase sobre área de plazoleta

en adoquín entre edificio complementario y polivalente, con un espesor de 20 cm, para un volumen total de 12,49 m³ actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio.

- **TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO):** Se realiza el transporte del material de afirmado de la pista de trote, desde la cantera Agregados Santa Lucia localizada en el municipio de Cucaita, a una distancia de 52,1 km de la obra, para una cantidad de 513,86 m³-km. Se realiza el transporte del material de afirmado y subbase del relleno de urbanismo instalado, así como de la subbase del gimnasio vital y los tramos de la pista de trote instalados, material que se transporta desde la cantera agregados Santa Lucia, para una cantidad total de 4.895,57 m³-km.
- **FILTRO FRANCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL:** Se realiza construcción de filtro francés contra el costado de la vía vehicular, en una longitud de 26,19 m, el cual se conecta a caja de red de aguas lluvias conforme a diseño sanitario.
- **GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES:** Se instala geotextil en el área del gimnasio vital bajo la estructura del adoquín conforme al estudio de suelos, en un área de 49,49 m², actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio. Se instala geotextil bajo estructura de pavimento de áreas de adoquín y andén en concreto para urbanismo, con un área total de 265,10 m², actividad que inicia en la semana del 22 de julio.
- **SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM:** Se realiza la construcción de concreto de 14 Mpa para ser instalado bajo los muros de contención para las graderías del edificio polivalente, con un ancho cada uno de 45 cm, conforme a la zarpa, y una área total de 13,36 m², esta actividad inicia el 23 de julio de 2024.
- **VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA:** Se realiza la construcción de la viga de cimentación del edificio polivalente, con una sección de 35x40 cm, en una longitud de 50,89 m, actividad que se lleva a cabo el 30 de junio de 2024.
- **VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM:** Se realiza la construcción de las vigas aéreas del edificio complementario con una sección de 25x30 cm y una longitud de 45,68 m, actividad que se lleva a cabo en la semana de 8 de julio.

- MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM: Se funde e instala concreto de 21 Mpa para muro de escalada del edificio complementario con un área de 10,94 m², en un espesor de 15 cm, actividad que se finaliza en la semana del 02 de julio.
- MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS: Se realiza la construcción de los muros de contención para las graderías del edificio polivalente, conformado por dos muros, el primero con una altura total de 1.10 m y longitud de 17,29 m, y el segundo con una altura total de 65 cm y una longitud de 14,42 m, actividades que se inician el 29 de julio de 2024.
- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM: Se funde concreto para placa de contrapiso del edificio de servicios, con una cantidad de 72,96 m², actividad que se realiza el día 28 de junio. Se realiza la construcción de la placa del parque infantil con espesor de 10 cm, en un área de 157,39 m², actividad que se inicia en la semana del 29 de julio.
- SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA: Se realiza el amarre del acero de refuerzo para los muros de contención de las graderías del edificio polivalente, conformado por flejes de ½” según despiece estructural, con un peso total de 618,62 kg, actividad que se inicia el 25 de julio de 2024.
- MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS: Se realiza la instalación de malla electrosoldada de 6 mm en área de parque infantil con traslapes de 20 cm, para un peso total de 499,31 kg, actividad que se inicia en la semana del 29 de julio.
- SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA: Se realiza la fabricación e instalación de las platinas de anclaje para la estructura metálica de cubierta del edificio polivalente, conformadas por una lámina de ¾” en una sección de 40x40 cm, con o perforaciones para perno de 5/8”, para una cantidad de 8 elementos, actividad que se lleva a cabo el día 30 de junio junto con la fundida del concreto de la viga de cimentación. Se realiza la fabricación e instalación de la estructura metálica para cubierta del edificio de servicios, conformada por columnas de 200x70x3 mm, vigas en perfil de la misma sección y correas en perfil 120x60x2,5 mm, de igual forma se fabrica e instala la estructura de la pérgola de cafetería compuesta por columnas y vigas en perfil de 100x100x2 mm y correas de 100x50x2 mm, ubicada sobre platinas de anclaje en lámina de 3/8” de 22x22 cm, esto para una cantidad total de 1.478,58 kg. Esta actividad se inicia el día 23 de julio. Se realiza fabricación e instalación de estructura metálica de cubierta del edificio complementario, conformada por columnas y vigas de 200x70x3 mm, y correas de 120x60x2,5 mm, para los costados laterales y

una estructura central en perfil de 100x50x2 mm, los laterales sobre platinas de 3/8" con una sección de 30x17 cm, todo con un peso total de 1.474,10 kg, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.

- PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO: Se realiza la aplicación de pintura en esmalte de la estructura metálica de cubierta del edificio de servicios, incluida lámina de platinas de anclaje, con una cantidad total de 1.496,55 kg. Se aplica pintura a la estructura metálica del edificio complementario incluida lámina de platinas, con un peso total de 1.466.63 kg, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.
- MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM: Se realiza la construcción de los muros internos, fachada sur, oriental y occidental del edificio de servicios, según medidas arquitectónicas, para un área total de 50,55 m2, actividad que se inicia el 22 de julio.
- ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR: Se realiza enchape de vigas aéreas de fachada sur y oriental del edificio de servicios, con una altura de 30 cm, para un área total de 4,30 m2.
- DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM: Se instalan las dovelas en los muros del edificio de servicios, compuertas por mortero, varilla acero de 1/2" y grafites de 4 mm, conforme a la especificación del diseño estructural, para una cantidad total de 125,4 m en los muros ya finalizados, actividad que se realiza de manera paralela con el muro prensado.
- ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM: Se realiza la instalación de las varilla de 1/2" de anclaje en viga o placa de piso y viga aérea del edificio de servicio, para los muros en ladrillo prensado, de acuerdo con la localización indicada en planos estructurales, con una cantidad total de 116 unidades en los muros ya finalizados, actividad que se realiza de manera paralela con el muro prensado.
- TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9: Se realiza la instalación de la tubería hidráulica de 1/2" del edificio de servicios conforme al trazado de red de suministro, con una cantidad total de 12,07 m, actividad que se lleva a cabo el 5 de junio.
- REGISTRO DE CORTE 1": Se instalan dos registros de corte de 1" en el edificio de servicios para cada uno de los baños en la semana del 15 de julio.

- REGISTRO DE CORTE 1/2": Se instala un registro de ½" para la cafetería en el edificio de servicios, actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio.
- TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR PARA TANQUE: Se realiza la instalación del tanque de agua potable en la placa aérea del edificio de servicios, actividad llevada a cabo en la semana del 02 de julio.
- APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM: Se realiza la apertura de zanja para la instalación de la tubería de la red de aguas lluvias localizada desde las cajas de desagüe del edificio polivalente, hasta la caja de recibo frente al edificio de servicios, en una longitud total de 68,88 m, actividad que se finaliza en la semana del 22 de julio.
- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO: Se realiza relleno en material de recebo de las zanja excavada para la instalación de las tuberías de la red de aguas lluvias localizada entre las cajas del edificio polivalente y la caja de recepción frente al edificio de servicios, en una longitud de 68,88 m.
- INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS: Se realiza la instalación de 25,65 m de tubería de 8" para la recepción de aguas lluvias entre la caja del edificio polivalente y la caja del costado sur del edificio de servicios. Se instalan 38,23 m de tubería de 6" para la red de aguas lluvias localizada entre la caja del edificio complementario y la caja del costado norte del edificio de servicios. Se instalan 5 m de tubería de 4" entre la caja del edificio polivalente y la caja del edificio complementario, actividades que se finalizan en la semana del 22 de julio.
- APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION TY COMPACTACION: Se realiza la instalación de 2 ductos en tubo Conduit PVC tipo pesado de 1" localizada bajo la placa del parque infantil, para la conexión de la acometida parcial hasta el tablero de circuitos del edificio complementario, en una longitud de 13,22 ml, actividad que se lleva acabo en la semana del 29 de julio. Se instalan 44,16 m de ducto doble de 1" para la conexión de los postes de alumbrado localizados entre el edificio polivalente y gimnasio vital y la pista de trote, actividad que se lleva a cabo en la semana del 29 de julio.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80: Se realiza la instalación de bordillo en el perímetro del gimnasio vital, con una longitud total de 31,96 m, actividad que se lleva a cabo en la semana del 15 de julio. Se instala bordillo en el perímetro de la pista de trote de los tramos localizados frente al parque infantil, edificio complementario y gimnasio vital con una longitud

total de 35,8 m, actividad que se lleva a cabo desde la semana del 22 de julio. Se realiza la instalación de bordillo en perímetro de la placa de parque infantil en una longitud total de 43,91 m, actividad que se inicia en la semana del 22 de julio.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

- ✓ Se realizó la toma de muestras de concreto para su respectiva falla de cilindros en laboratorio y verificar su resistencia a la compresión, de acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño.
- ✓ Se revisaron en obra las actividades de amarres de acero y control de diseño mezcla para concretos, de acuerdo con el informe de diseño del laboratorio López Hermanos, allegado por el contratista de obra.
- ✓ Se verificó la instalación de las redes sanitarias y de aguas lluvias, en cuanto a pendientes.
- ✓ Se realiza el diligenciamiento de la bitácora de obra.
- ✓ Se realizó comité técnico de obra en el sitio de ejecución, con la presencia del apoyo de supervisión del municipio, directores y residentes de obra e interventoría.
- ✓ Se hace medición de cantidades de obra para informes semanales y mensual
- ✓ Se Realiza informes semanales No. 11, 12, 13, 14 y 15, así como informe mensual No. 4 del mes de julio de 2024.
- ✓ Se verificó que el personal de obra se encontraba afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial e higiene del personal de obra.
- ✓ Se verifica la utilización de elementos de protección personal EPP, por parte del personal trabajador.
- ✓ Se suscribe la respectiva acta de corte de obra al mes de julio de 2024, con sus respectivas sábanas de cantidades ejecutadas, y se conciliaron las mismas, junto al residente y director de obra.
- ✓ En oficina se recicló el papel de impresión para los documentos manejados para las revisiones.
- ✓ Se verifican documentos normativos

10. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se realiza el seguimiento del plan de manejo ambiental para el periodo del mes de julio, de acuerdo con las siguientes actividades:

MEDIDAS AMBIENTALES	DOCUMENTO VERIFICADO	CALIFICACIÓN
Licencias permisos y trámites	Se allega para el periodo licencia ambiental y permiso minero de cantera Agregados Santa Lucia. Se allega título minero de Ladrigres, empresa proveedora de ladrillo prensado y certificados de reciclaje de materiales.	Cumple
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se verifica la implementación de EPPs del personal de obra. Se realizan capacitaciones del personal de obra en SG-SST	Cumple
Contratación de mano de obra local	Se realiza en el periodo la contratación de 1 trabajador local de acuerdo con oferta de la zona.	Cumple
Adecuación de sitios de acopio	Se realiza el cubrimiento del material granular en acopio con plástico y geotextil.	Cumple
Educación ambiental y cultural	Se realizan charlas al personal de obra en temas ambientales.	Cumple
Movilización y transporte de equipos y materiales	Se realiza cubrimiento de material granular en volquetas con geotextil. Se verifica activo el certificado Tecnicomecánico y de gases de las volquetas que transportan los materiales.	Cumple
Manejo de recurso hídrico y aguas residuales	Se verifica que la toma de agua se realiza de prestador de servicios del Municipio autorizado. En el proyecto no se realiza generación de aguas residuales, toda vez que el contratista cuenta con alquiler de oficina para el servicio de baño y cafetería.	Cumple
Control de Contaminación atmosférica y de ruido	Se realiza cubrimiento del material granular. No se generan quejas respecto de ruido o contaminación atmosférica.	Cumple

11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 2.144.442.248,00	
Valor anticipo	\$ 0,00	\$643.332.674,40

Valor actas parciales	\$ 0,00	\$ 199.890.182,10
Valor amortizado actas parciales	\$ 0,00	\$ 85.667.220,90
Saldo por pagar	\$ 0,00	\$ 1.301.219.391,50
Sumas Iguales	\$ 2.144.442.248,00	\$ 2.144.442.248,00

12. REPORTE DE AVANCE DE OBRA

% DE AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
% PROGRAMADO OBRA	0,70%	1,12%	2,30%	15,04%	100%
% EJECUTADO OBRA	0,00%	7,00%	18,40%	30,53%	
% EJECUTADO CONTRATO	7,66%	14,12%	24,96%	35,55%	

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

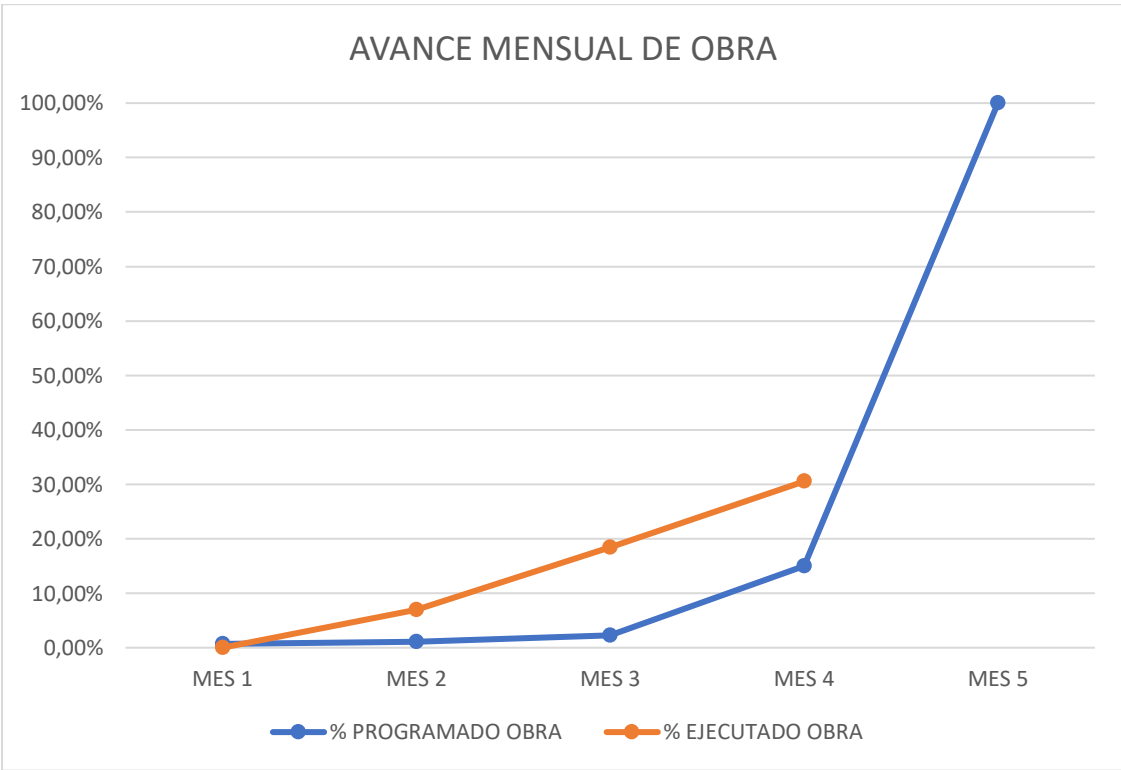

13. FECHAS DE COMITÉS REALIZADOS

02/11/2023	21/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
22/12/2023	18/01/2024	26/02/2024	10/05/2024	27/05/2024
21/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance de obra de la semana correspondió al 30.53% encontrándose por encima del programado, lo cual indica que el rendimiento en obra fue bueno pese a las lluvias frecuentes que se presentaron durante el mes de julio.
- Se debe realizar verificación de las mayores cantidades faltantes por ejecutar para las actividades de mejoramiento del terreno, con el fin de determinar la necesidad de adición de recursos o no, debido a los imprevistos encontrados en etapa de cimentación por la mayor cantidad de excavación y rellenos y/o mejoramientos del terreno hasta nivel de diseño.
- Es necesario se gestione ante el Ministerio del Interior una prórroga al convenio, con el fin de reajustar los tiempos de ejecución de los contratos de obra e interventoría, acorde con el tiempo de obra inicialmente contratado.



INTEROBRAS SC S.A.S.

R/L ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
INTERVENTOR

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO



VIGA DE CIMENTACIÓN ED. POLIVALENTE



VIGA DE CIMENTACIÓN Y PLATINAS ED. POLIVALENTE



VIGA AÉREA ED. COMPLEMENTARIO



VIGAS AÉREAS Y PLATINAS ED. COMPLEMENTARIO



COMPACTACIÓN AFIRMADO URBANISMO



CODOS 2" CONEXIÓN TANQUE



REGISTRO 1" ED. SERVICIOS



REGISTRO 1/2" ED. SERVICIOS



SOLADO MUROS ED. POLIVALENTE



ZANJA E INSTALACIÓN TUBERÍA RED AGUAS LLUVIAS



ACERO MURO GRADERÍAS ED. POLIVALENTE



DOVELAS Y GRAFILES MAMOSTERÍA ED. SERVICIOS



MAMPOSTERÍA ED. SERVICIOS



INSTALACIÓN GEOTEXTIL URBANISMO



ZANJA E INSTALACIÓN TUBERÍA RED AGUAS LLUVIA



ZANJA E INSTALACIÓN TUBERÍA RED AGUAS LLUVIA



ANCJALE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES



INSTALACIÓN AFIRMADO URBANISMO Y GIMNASIO



INSTALACIÓN GEOTEXTIL GIMNASIO VITAL



INSTALACIÓN GEOTEXTIL URBANISMO



INSTALACIÓN SUBBASE GIMNASIO VITAL



COMPACTACIÓN AFIRMADO URBANISMO



ANCLAJE DOVELAS ED. SERVICIOS



TRANSPORTE SUBBASE URBANISMO Y GIMNASIO



MAMPOSTERIA Y ANCLAJE DOVELAS



COMPACTACIÓN AFIRMADO URBANISMO



MURO CONTENCIÓN GRADERÍAS ED. POLIVALENTE



COMPACTACIÓN SUBBASE URBANISMO



ESTRUCTURA METÁLICA ED. COMPLEMENTARIO



SARDINEL GIMNASIO



INSTALACIÓN SARDINEL GIMNASIO



ACERO DE REFUERZO MURO GRADERÍAS



COMPACTACIÓN SUBBASE GIMNASIO



ESTRUCTURA METÁLICA ED. COMPLEMENTARIO



MAMPOSTERÍA ED. SERVICIOS



MURO ESCALADA Y PLANTA ELÉCTRICA



PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA ED. COMPLEM.



INSTALACIÓN SARDINEL PISTA DE TROTE



ESTRUCTURA METÁLICA ED. SERVICIOS



SARDINEL PARQUE INFANTIL



MUROS DE CONTENCIÓN GRADERÍAS



ESTRUCTURA METÁLICA PERGOLA ED. SERVICIOS



ENCHAPE VIGAS AÉREAS EN LADRILLO



PINTURA ESTRUCTURA ED. SERVICIOS



INSTALACIÓN DUCTOS ELÉCTRICOS





PLACA CONCRETO PARQUE INFANTIL



MALLA ELECTROSOLDADA PLACA PARQUE



PLACA DE CONCRETO PARQUE INFANTIL



REGISTRO MINERO CANTERA

LICENCIA AMBIENTAL CANTERA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Radicado ANM No. 20220320439963

Bogotá, 16-03-2023 11:27 AM

Señor:
PEDRO BELLO FORERO
 Representante Legal LADRIGRES
 Titular Minero 18930
 Email: gerencia@ladrillares.com
 Celular: 3105609475
 Dirección: km 48 vía Zipaquirá vereda pajante
 País: Colombia
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Tena

Asunto: Respuesta a su solicitud radicada bajo el No. 20220001661502 del 25 de enero de 2023.

En atención a su **solicitud radicada el día 25 de enero de 2023**, bajo el No. 20220001661502, me permito acusar el recibo, e informar lo siguiente:

A través de radicado No. 2020100496092 del 30 de mayo de 2020, el Titular minero allegó oficio solicitando derecho de preferencia.

Mediante Auto GET No. 67 del 13 de mayo de 2021 notificado por estado No. 076 de 18 de mayo de 2021, se aprobó el Programa de Trabajos y Obras - PTO presentado como solicitud de derecho de preferencia para el mineral de arcilla, para la licencia de explotación No. 18930, quedando el título en la etapa de explotación de conformidad con el Concepto Técnico GET No. 080 del 11 de mayo de 2021.

Mediante Auto GSC-SC No. 001040 del 16 de junio de 2022, notificado por estado jurídico No. 107 del 23 de junio de 2022, se dispuso:

1. **ANULARSE el Derecho de Preferencia** para suscribir Contrato de Concesión Minero No. 18930 consignado en el postulado 1 del artículo 33 de la Ley 2753 o la Sociedad LADRIGRES LTDA, identificada con NIT No. 800.030125-3.
2. A través del Grupo de Gestión de Notificaciones, remítase el presente auto administrativo a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera, los documentos que soportan la capacidad jurídica del Titular Minero, el Concepto Técnico GET No. 080 del 11 de mayo de 2021, el concepto técnico GSC-SC N° 000546 del 26 de enero de 2022 y el Auto GET No. 67 del 13 de mayo de 2021 notificado por estado No. 076 de 18 de mayo de 2021, para elaboración y suscripción de la Minuta del Contrato de Concesión No. 18930.

RADICADO REGISTRO MINERO LADRILLERA

COMERCIALIZADORA YELMOPLAST MC S.A.S


NIT: 900.964.757-8

CERTIFICA QUE:

La Empresa LADRIGRES S.A.S; identificada con número de Nit 800.100.125-3 y Ubicada en la Vereda Pajante en el KM 48 vía Zipaquirá Ubaté, está comprometida con el cuidado y preservación del medio AMBIENTE, para el día 24 del mes de Enero del presente Año nos suministraron 548 kilos de MATERIAL PLASTICO RECIDADO; esto con el fin de transformarlo en materia prima y reutilizarlo para la fabricación de PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA como: POSTES PLASTICOS PARA CERCA, MANGUERA AGRICOLA Y OTROS PRODUCTOS.

La presente Certificación se expide en la ciudad de Zipaquirá a los 24 días del mes de Enero del mes de Enero del 2024

Cordialmente;


CLAUDIA MILENA VILLALBA FAJARDO.
 GESTORA AMBIENTAL

CERTIFICADO RECICLAJE LADRILLERA

COBINO S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20/06/2023

FAC-SST-01

FORMATO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

VERSIÓN 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

TEMA DE CAPACITACIÓN	Resolución 4292 del 2021 (Planura)		
PROYECTO / ÁREA	Unión Temporal Camp Intero	LUGAR	Turkey
FECHA	27/03/24	H/INICIO	10:00 am
		H/FIN	11:30 pm

2. INFORMACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	N.DOCUMENTO	FIRMA
1	Gregorio Alencastro	Asesor	1003717773	
2	Luis A. Alencastro	Asesor	4525026	
3	Yenny Ruiz S.	Asesora	7006998960	
4	Diana Elizabeth Muñoz	Asesora	7056952871	
5	Daniel Silva Molina	Asesor	100619021	
6	Edison Duvan Toboza Tola	Asesor	4049549230	
7	Johnny Eduardo Suarez Soto	Asesora	103881746	
8	Edson Rodriguez	Asesora	79521669	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

3. OBSERVACIONES

RESPONSABLE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Alejandro Alencastro	SG - SST	

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

COBINO S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20/06/2023

FAC-SST-01

FORMATO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

VERSIÓN 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

TEMA DE CAPACITACIÓN	Cotización, Asesoría		
PROYECTO / ÁREA	Unión Temporal Camp Intero	LUGAR	Turkey
FECHA	27/03/24	H/INICIO	11:30 am
		H/FIN	12 pm

2. INFORMACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	N.DOCUMENTO	FIRMA
1	Gregorio Alencastro	Asesor	1003717773	
2	Luis A. Alencastro	Asesor	4525026	
3	Diana Elizabeth Muñoz	Asesora	7006998960	
4	Yenny Ruiz S.	Asesora	7056952871	
5	Daniel Silva Molina	Asesor	100619021	
6	Edison Duvan Toboza Tola	Asesor	4049549230	
7	Johnny Eduardo Suarez Soto	Asesora	103881746	
8	Edson Rodriguez	Asesora	79521669	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

3. OBSERVACIONES

RESPONSABLE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Alejandro Alencastro	SG - SST	

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES




CAPACITACIÓN TRABAJADORES



CAPACITACIÓN TRABAJADORES


REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y
 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Libertad y Orden





CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No: 175044613

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFICAR CDA TUNJA

NIT: 901229068 No. de Certificado de Acreditación: 20-OM-031
 Fecha de expedición: 2024/08/07 Fecha de vencimiento: 2025/08/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	CRH446	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	1997
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5500	NRO. MOTOR:	8UND5926
NRO. CHASIS:	CN18621003	VIN:	
LÍNEA:	KODIAK		
COLOR:	ROJO PERLADO		
NOMBRE PROPIETARIO:	CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA SAS		

FIRMA DEL RESPONSABLE

VERIFICACIÓN VIGENCIA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE GASES VEHÍCULOS DE TRANSPORTE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y
 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Libertad y Orden





CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No: 171298903

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFICAR CDA TUNJA

NIT: 901229068 No. de Certificado de Acreditación: 20-OM-031
 Fecha de expedición: 2024/01/20 Fecha de vencimiento: 2025/01/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TGA292	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	2007
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	7000	NRO. MOTOR:	470HM2U1500547
NRO. CHASIS:	3HAMMAAR371485381	VIN:	
LÍNEA:	4300		
COLOR:	BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA SAS		

FIRMA DEL RESPONSABLE

VERIFICACIÓN VIGENCIA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE GASES VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

INFORMES SEMANALES 11 AL 15




 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA						
	INTEROBRAS SC S.A.S						
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ							
Versión: 01		Página 1 de 7					
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No. 11		MES: JULIO					FECHA DE INFORME
CONTRATO No	LP 03-2023	OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				01-jul-24 al 07-jul-24
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JONATHAN A. ROJAS H.		RESIDENTE DE OBRA: ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO			
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO							
							
2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA							
FECHA DEL CONTRATO:		viernes, 22 de septiembre de 2023		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 2.144.442.248,00	
FECHA DE INICIACIÓN:		viernes, 27 de octubre de 2023		VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:		N/A	
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:		martes, 23 de abril de 2024		PLAZO DE EJECUCIÓN:		OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		DIEZ (10) MESES		FECHA DE TERMINACION INICIAL:		lunes, 26 de agosto de 2024	
MODIFICATORIO No. 1 - PLAZO DEL 10/04/2024:		OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS		FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 1:		miércoles, 17 de julio de 2024	
MODIFICATORIO No. 2 - PLAZO DEL 27/05/2024:		NUEVE (9) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS		FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 2:		viernes, 16 de agosto de 2024	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		\$ 2.144.442.248,00		VALOR DEL ANTICIPO:		\$ 643.332.674,40	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:		\$ 164.368.000,00		VALOR DE OBRA:		\$ 1.980.073.076,00	
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR		REPRESENTANTE LEGAL:		ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:		76 DÍAS		PLAZO RESTANTE OBRA:		40 DÍAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:		1,17%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:	19,90%	PROGRAM. SEMANA	0,97%	PROGRAM. ACUMULADO 3,29%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:		\$ 23.086.582	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	\$ 393.944.168	PROGRAM FINANC SEMANA	\$ 19.181.541	PROGRAM FINANC ACUMULADO \$ 65.205.349

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				
	INTEROBRAS SC S.A.S				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				
Versión: 01					Página 1 de 7
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA					
CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
0	PRELIMINARES				
0.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		\$ 10.312.038,48	\$ 10.312.038,48	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.412.785,92	\$ 1.412.785,92	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.342.673,16	\$ 1.342.673,16	
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 2.651.695,76	\$ 2.651.695,76	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$ 5.424.788,00	\$ 9.622.180,40	\$ 15.046.968,40	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	\$ 1.982.484,00	\$ 11.905.728,03	\$ 13.888.212,03	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 2.394.281,28	\$ 2.394.281,28	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 6.523.195,14	\$ 6.523.195,14	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.651.260,61	\$ 7.651.260,61	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 12.467.040,00	\$ 12.467.040,00	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 957.864,96	\$ 957.864,96	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 480.859,00	\$ 480.859,00	
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 1.352.906,00	\$ 1.352.906,00	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 1.857.329,76	\$ 1.857.329,76	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 1.869.459,12	\$ 1.869.459,12	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 755.173,02	\$ 755.173,02	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.006.263,40	\$ 7.006.263,40	
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$ 209.384,19	\$ 209.384,19	
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$ 2.126.908,80	\$ 2.126.908,80	
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$ 4.612.873,20	\$ 4.612.873,20	
3.3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM		\$ 700.332,80	\$ 700.332,80	
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 8.091.424,00	\$ 8.091.424,00	
3.5	PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 1.234.484,75	\$ 1.234.484,75	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 16.617.840,00	\$ 16.617.840,00	
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$ 1.768.831,96	\$ 1.768.831,96	
7.1.6	TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21		\$ 507.661,20	\$ 507.661,20	
7.1.8	TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11		\$ 99.976,68	\$ 99.976,68	
7.1.9	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9		\$ 94.771,50	\$ 94.771,50	
7.1.10	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"		\$ 162.616,00	\$ 162.616,00	
7.1.11	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"		\$ 804.608,00	\$ 804.608,00	
7.1.16	CODO PRESIÓN 1-1/2"		\$ 209.536,00	\$ 209.536,00	
7.1.20	REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"		\$ 10.792,00	\$ 10.792,00	
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$ 902.497,00	\$ 902.497,00	
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"		\$ 587.436,36	\$ 587.436,36	
7.2.13	CODO SANITARIO 4"		\$ 321.630,00	\$ 321.630,00	
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA		\$ 193.123,00	\$ 193.123,00	
7.2.16	YEE 4" SANITARIA		\$ 201.114,00	\$ 201.114,00	
7.2.17	SIFÓN 2"		\$ 83.944,00	\$ 83.944,00	
7.2.18	SIFÓN 4"		\$ 32.511,00	\$ 32.511,00	
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO			\$ 0,00	

 Interior		INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA INTEROBRAS SC S.A.S			
		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ			
Versión: 01				Página 1 de 7	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	545.126,40	\$ 545.126,40
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	474.256,16	\$ 474.256,16
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$	1.637.016,26	\$ 1.637.016,26
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.858.613,40	\$ 3.858.613,40
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.111.663,03	\$ 6.111.663,03
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$	728.492,56	\$ 728.492,56
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA		\$	3.329.222,40	\$ 3.329.222,40
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$	6.819.830,64	\$ 6.819.830,64
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$	193.874,25	\$ 193.874,25
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLUYE FORMALETA METÁLICA		\$	2.835.878,40	\$ 2.835.878,40
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$	8.206.359,00	\$ 8.206.359,00
3.6	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM		\$	2.425.376,12	\$ 2.425.376,12
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	\$ 2.012.720,00	\$	19.120.000,00	\$ 21.132.720,00
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$	2.109.510,48	\$ 2.109.510,48
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	114.577,88	\$ 114.577,88
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	65.022,00	\$ 65.022,00
D	GINNASIO BIOSALUDABLE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	937.603,28	\$ 937.603,28
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	4.766.713,44	\$ 4.766.713,44
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	\$ 4.525.477,00	\$	2.146.140,18	\$ 6.671.617,18
E	PISTA DE TROTE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.045.157,92	\$ 2.045.157,92
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	9.506.368,00	\$ 9.506.368,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	9.568.395,27	\$ 9.568.395,27
F	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	464.208,36	\$ 464.208,36
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.501.434,60	\$ 3.501.434,60
G	URBANISMO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	240.115,20	\$ 240.115,20
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.850.130,24	\$ 2.850.130,24
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	24.494.889,00	\$ 24.494.889,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	24.654.729,60	\$ 24.654.729,60
7.1.5	TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21		\$	128.215,00	\$ 128.215,00
7.1.19	REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"		\$	18.164,00	\$ 18.164,00
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM		\$	3.765.669,24	\$ 3.765.669,24
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO		\$	4.396.574,40	\$ 4.396.574,40
7.2.7	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"		\$	3.137.402,16	\$ 3.137.402,16
7.2.8	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"		\$	4.383.309,58	\$ 4.383.309,58
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	2.228.775,00	\$ 2.228.775,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,00

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA									
	INTEROBRAS SC S.A.S									
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ										
Versión: 01						Página 1 de 7				
NP-1	PEDRAPLEN COMPACTO			\$	3.813.440,00	\$ 3.813.440,00				
						\$ 0,00				
						\$ 0,00				
AVANCE ACTUAL DE OBRA	19,90%	SUBTOTAL	\$	17.758.909	\$	285.275.066,33	\$	303.033.975		
		A.I.U (30%)	\$	5.327.673	\$	98.819.282,98	\$	90.910.193		
		VALOR TOTAL OBRA	\$	23.086.582	\$	384.094.349,31	\$	393.944.168		
PROGRAMADO	3,29%	ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	133.138.080,00	\$	133.138.080		
		IVA (19%)			\$	31.229.920,00	\$	31.229.920		
		VALOR TOTAL DISEÑOS	\$	-	\$	164.368.000,00	\$	164.368.000		
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	16,60%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	23.086.582	\$	548.462.349,31	\$	558.312.167,93		
6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL										
POLIZAS DE GARANTIA										
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2					
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 643.332.674,40						
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	\$ 107.222.112,40						
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	\$ 214.444.224,80						
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	\$ 32.873.600,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 6 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	\$ 260.000.000,00						
ACTAS REALIZADAS										
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CONTRATOS ADICIONALES	CAUSA	Nº	TIEMPO	PRORROGAS	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.								
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS								
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	ACTA DE PAGO PARCIAL.								
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1	25-jun.-2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES								
7. INFORMACION FINANCIERA										
Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL	
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO DE ANTICIPO		30,00%	\$ 643.332.674,40	0	\$ 643.332.674,40	\$ 643.332.674,40	\$ 1.501.109.573,60	
2	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	5,37%	\$ 164.368.000,00	\$ 49.310.400,00	\$ 115.057.600,00	\$ 758.390.274,40	\$ 1.386.051.973,60	
3	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	4-jun.-2024	3,96%	\$ 121.189.403,00	\$ 36.356.820,90	\$ 84.832.582,10	\$ 843.222.856,50	\$ 1.301.219.391,50	
8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA										
LABORES PRESENTE SEMANA: PARA ESTA SEMANA SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL AREA POLIVALENTE: SE CONTINUA DE TRANSPORTAR MATERIAL DE AFIRMADO Y DE INSTALAR EL MEJORAMIENTO EN MATERIAL COMÚN . SE REALIZA EL SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO PARA LAS VIGAS DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO. SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE PEDRAPLEN COMPACTO PARA LA PISTA DE TROTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE										

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA INTEROBRAS SC S.A.S	
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	
Versión: 01	Página 1 de 7	
OBSERVACIONES:		
Elaborado por:		
 NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	 NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	 NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
9. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>      </div>		

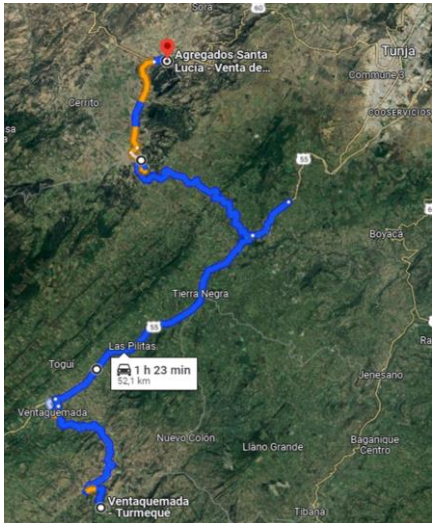
 Interior	<p align="center">INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA</p> <p align="center">INTEROBRAS SC S.A.S</p> <p align="center">PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ</p>	
Versión: 01		Página 1 de 7
<div data-bbox="425 333 855 858">  </div> <div data-bbox="913 333 1326 852">  </div> <div data-bbox="1393 333 1823 852">  </div> <div data-bbox="396 935 902 1297">  </div> <div data-bbox="938 863 1321 1302">  </div>		


 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA						
	INTEROBRAS SC S.A.S						
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ							
Versión: 01		Página 1 de 7					
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No. 12		MES: JULIO					FECHA DE INFORME
CONTRATO No	LP 03-2023	OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				08-jul-24 al 14-jul-24
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JONATHAN A. ROJAS H.		RESIDENTE DE OBRA: ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO			
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO							
							
2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA							
FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023			VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	N/A		
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024			PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	lunes, 26 de agosto de 2024		
MODIFICATORIO No. 1 - PLAZO DEL 10/04/2024:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 1:	miércoles, 17 de julio de 2024		
MODIFICATORIO No. 2 - PLAZO DEL 27/05/2024:	NUEVE (9) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 2:	viernes, 16 de agosto de 2024		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00			VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 643.332.674,40		
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 164.368.000,00			VALOR DE OBRA:	\$ 1.980.073.076,00		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR			REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS		
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	83 DÍAS			PLAZO RESTANTE OBRA:	33 DÍAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,74%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:	20,63%	PROGRAM. SEMANA	1,22%	PROGRAM. ACUMULADO	4,51%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	\$ 14.577.865	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	\$ 408.522.033	PROGRAM FINANC SEMANA	\$ 24.130.602	PROGRAM FINANC ACUMULADO	\$ 89.335.951

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				
	INTEROBRAS SC S.A.S				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				
Versión: 01					Página 1 de 7
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA					
CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
0	PRELIMINARES				
0.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		\$ 10.312.038,48	\$ 10.312.038,48	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.412.785,92	\$ 1.412.785,92	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.342.673,16	\$ 1.342.673,16	
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 2.651.695,76	\$ 2.651.695,76	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$ 720.852,00	\$ 15.046.968,40	\$ 15.767.820,40	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	\$ 1.982.484,00	\$ 13.888.212,03	\$ 15.870.696,03	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 2.394.281,28	\$ 2.394.281,28	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 6.523.195,14	\$ 6.523.195,14	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.651.260,61	\$ 7.651.260,61	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 12.467.040,00	\$ 12.467.040,00	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 957.864,96	\$ 957.864,96	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 480.859,00	\$ 480.859,00	
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 1.352.906,00	\$ 1.352.906,00	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 1.857.329,76	\$ 1.857.329,76	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 1.869.459,12	\$ 1.869.459,12	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 755.173,02	\$ 755.173,02	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.006.263,40	\$ 7.006.263,40	
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$ 209.384,19	\$ 209.384,19	
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$ 2.126.908,80	\$ 2.126.908,80	
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$ 4.612.873,20	\$ 4.612.873,20	
3.3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM		\$ 700.332,80	\$ 700.332,80	
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 8.091.424,00	\$ 8.091.424,00	
3.5	PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 1.234.484,75	\$ 1.234.484,75	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 16.617.840,00	\$ 16.617.840,00	
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$ 1.768.831,96	\$ 1.768.831,96	
7.1.6	TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21		\$ 507.661,20	\$ 507.661,20	
7.1.8	TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11		\$ 99.976,68	\$ 99.976,68	
7.1.9	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9		\$ 94.771,50	\$ 94.771,50	
7.1.10	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"		\$ 162.616,00	\$ 162.616,00	
7.1.11	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"		\$ 804.608,00	\$ 804.608,00	
7.1.16	CODO PRESIÓN 1-1/2"		\$ 209.536,00	\$ 209.536,00	
7.1.20	REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"		\$ 10.792,00	\$ 10.792,00	
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$ 902.497,00	\$ 902.497,00	
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"		\$ 587.436,36	\$ 587.436,36	
7.2.13	CODO SANITARIO 4"		\$ 321.630,00	\$ 321.630,00	
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA		\$ 193.123,00	\$ 193.123,00	
7.2.16	YEE 4" SANITARIA		\$ 201.114,00	\$ 201.114,00	
7.2.17	SIFÓN 2"		\$ 83.944,00	\$ 83.944,00	
7.2.18	SIFÓN 4"		\$ 32.511,00	\$ 32.511,00	
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO			\$ 0,00	

<div> Interior</div>		INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA			<div></div>
		INTEROBRAS SC S.A.S			
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					
Versión: 01					Página 1 de 7
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	545.126,40	\$ 545.126,40
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	474.256,16	\$ 474.256,16
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$	1.637.016,26	\$ 1.637.016,26
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.858.613,40	\$ 3.858.613,40
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.111.663,03	\$ 6.111.663,03
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$	728.492,56	\$ 728.492,56
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$	3.329.222,40	\$ 3.329.222,40
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$	6.819.830,64	\$ 6.819.830,64
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$	193.874,25	\$ 193.874,25
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$	2.835.878,40	\$ 2.835.878,40
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM	\$	6.668.229,00		\$ 6.668.229,00
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$	8.206.359,00	\$ 8.206.359,00
3.6	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM		\$	2.425.376,12	\$ 2.425.376,12
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$	21.132.720,00	\$ 21.132.720,00
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$	2.109.510,48	\$ 2.109.510,48
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	114.577,88	\$ 114.577,88
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	65.022,00	\$ 65.022,00
D	GINNASIO BIOSALUDABLE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	937.603,28	\$ 937.603,28
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$	1.842.177,00	\$	\$ 6.608.890,44
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.671.617,18	\$ 6.671.617,18
E	PISTA DE TROTE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.045.157,92	\$ 2.045.157,92
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	9.506.368,00	\$ 9.506.368,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	9.568.395,27	\$ 9.568.395,27
F	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	464.208,36	\$ 464.208,36
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.501.434,60	\$ 3.501.434,60
G	URBANISMO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	240.115,20	\$ 240.115,20
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.850.130,24	\$ 2.850.130,24
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	24.494.889,00	\$ 24.494.889,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	24.654.729,60	\$ 24.654.729,60
7.1.5	TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21		\$	128.215,00	\$ 128.215,00
7.1.19	REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"		\$	18.164,00	\$ 18.164,00
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM		\$	3.765.669,24	\$ 3.765.669,24
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO		\$	4.396.574,40	\$ 4.396.574,40
7.2.7	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"		\$	3.137.402,16	\$ 3.137.402,16
7.2.8	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"		\$	4.383.309,58	\$ 4.383.309,58
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	2.228.775,00	\$ 2.228.775,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,00


 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA								
	INTEROBRAS SC S.A.S								
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ									
Versión: 01						Página 1 de 7			
NP-1	PEDRAPLEN COMPACTO			\$	3.813.440,00	\$ 3.813.440,00			
						\$ 0,00			
						\$ 0,00			
AVANCE ACTUAL DE OBRA	20,63%	SUBTOTAL	\$	11.213.742	\$	303.033.975,33	\$	314.247.717	
		A.I.U (30%)	\$	3.364.123	\$	104.970.969,05	\$	94.274.315	
		VALOR TOTAL OBRA	\$	14.577.865	\$	408.004.944,38	\$	408.522.033	
PROGRAMADO	4,51%	ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	133.138.080,00	\$	133.138.080	
		IVA (19%)			\$	31.229.920,00	\$	31.229.920	
		VALOR TOTAL DISEÑOS	\$	-	\$	164.368.000,00	\$	164.368.000	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	16,12%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	14.577.865	\$	572.372.944,38	\$	572.890.032,53	
6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL									
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 643.332.674,40					
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	\$ 107.222.112,40					
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	\$ 214.444.224,80					
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	\$ 32.873.600,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 6 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	\$ 260.000.000,00					
ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES						
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	PRORROGAS CAUSAL	
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.							
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS							
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	ACTA DE PAGO PARCIAL.							
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1	25-jun.-2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES							
7. INFORMACION FINANCIERA									
Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO DE ANTICIPO		30,00%	\$ 643.332.674,40	0	\$ 643.332.674,40	\$ 643.332.674,40	\$ 1.501.109.573,60
2	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	5,37%	\$ 164.368.000,00	\$ 49.310.400,00	\$ 115.057.600,00	\$ 758.390.274,40	\$ 1.386.051.973,60
3	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	4-jun.-2024	3,96%	\$ 121.189.403,00	\$ 36.356.820,90	\$ 84.832.582,10	\$ 843.222.856,50	\$ 1.301.219.391,50
8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA									
LABORES PRESENTE SEMANA: PARA ESTA SEMANA SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL AREA POLIVANTE Y EL GIMNASIO BIOSALUDABLE. SE FUNDEN VIGAS VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM PARA EL EDIFICIO COMPLEMENTARIO.									

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA INTEROBRAS SC S.A.S		
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ		
Versión: 01			Página 1 de 7
OBSERVACIONES:			
Elaborado por:			
 NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA		 NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	
		 NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUE	
9. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>       </div>			

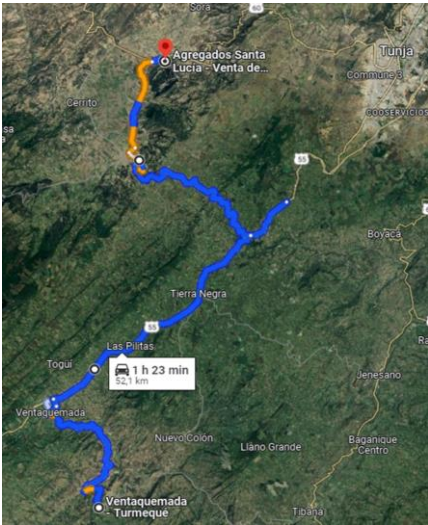 Interior	<p align="center">INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA</p> <p align="center">INTEROBRAS SC S.A.S</p> <p align="center">PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ</p>	
Versión: 01		Página 1 de 7
<div>      </div>		

	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA							
	INTEROBRAS SC S.A.S							
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ								
Versión: 01		Página 1 de 7						
INFORMACIÓN GENERAL								
INFORME SEMANAL No. 13		MES: JULIO					FECHA DE INFORME	
CONTRATO No	LP 03-2023	OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					15-jul-24 al 21-jul-24
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S			RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JONATHAN A. ROJAS H.		RESIDENTE DE OBRA: ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO			
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO								
<div></div>								
2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA								
FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00			
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023			VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	N/A			
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024			PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	lunes, 26 de agosto de 2024			
MODIFICATORIO No. 1 - PLAZO DEL 10/04/2024:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 1:	miércoles, 17 de julio de 2024			
MODIFICATORIO No. 2 - PLAZO DEL 27/05/2024:	NUEVE (9) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 2:	viernes, 16 de agosto de 2024			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00			VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 643.332.674,40			
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 164.368.000,00			VALOR DE OBRA:	\$ 1.980.073.076,00			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR			REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS			
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	90 DÍAS			PLAZO RESTANTE OBRA:	26 DÍAS			
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,21%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:	20,84%	PROGRAM. SEMANA	1,22%	PROGRAM. ACUMULADO	4,51%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	\$ 4.146.613	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	\$ 412.668.645	PROGRAM FINANC SEMANA	\$ 24.130.602	PROGRAM FINANC ACUMULADO	\$ 89.335.951	

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

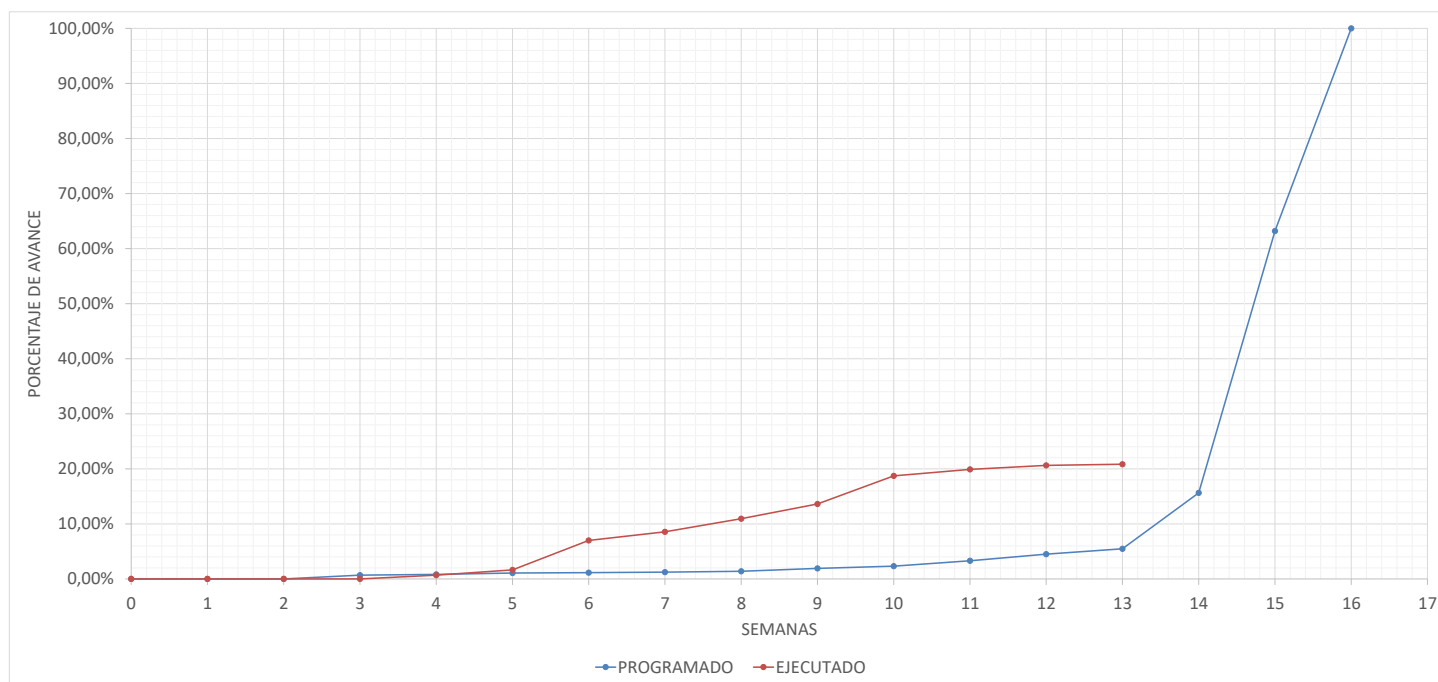

VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$ -	0,00%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$ 22.549.871,69	1,14%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 46.023.808,14	2,32%		01 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 309.791.571,03	15,65%	
01 AL 16 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1.980.073.076,03	100,00%					

<div></div> <div>Interior</div>	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				<div></div>
	INTEROBRAS SC S.A.S				
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					
Versión: 01					Página 1 de 7
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA					
CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
0	PRELIMINARES				
0,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		\$ 10.312.038,48	\$ 10.312.038,48	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE			\$ 0,00	
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.412.785,92	\$ 1.412.785,92	
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.342.673,16	\$ 1.342.673,16	
1,3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 2.651.695,76	\$ 2.651.695,76	
1,4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 15.767.820,40	\$ 15.767.820,40	
1,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 15.870.696,03	\$ 15.870.696,03	
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 2.394.281,28	\$ 2.394.281,28	
2,4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 6.523.195,14	\$ 6.523.195,14	
2,5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.651.260,61	\$ 7.651.260,61	
4,1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 12.467.040,00	\$ 12.467.040,00	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			\$ 0,00	
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 957.864,96	\$ 957.864,96	
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 480.859,00	\$ 480.859,00	
1,3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 1.352.906,00	\$ 1.352.906,00	
1,4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 1.857.329,76	\$ 1.857.329,76	
1,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 1.869.459,12	\$ 1.869.459,12	
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 755.173,02	\$ 755.173,02	
2,4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40	
2,5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.006.263,40	\$ 7.006.263,40	
2,6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$ 209.384,19	\$ 209.384,19	
3,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30x30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$ 2.126.908,80	\$ 2.126.908,80	
3,2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25x30 CM		\$ 4.612.873,20	\$ 4.612.873,20	
3,3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20x30 CM		\$ 700.332,80	\$ 700.332,80	
3,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 8.091.424,00	\$ 8.091.424,00	
3,5	PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 1.234.484,75	\$ 1.234.484,75	
4,1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 16.617.840,00	\$ 16.617.840,00	
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$ 1.768.831,96	\$ 1.768.831,96	
7.1.6	TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21		\$ 507.661,20	\$ 507.661,20	
7.1.8	TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11		\$ 99.976,68	\$ 99.976,68	
7.1.9	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9		\$ 94.771,50	\$ 94.771,50	
7.1.10	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"		\$ 162.616,00	\$ 162.616,00	
7.1.11	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"		\$ 804.608,00	\$ 804.608,00	
7.1.12	REGISTRO DE CORTE 1"	\$ 96.832,00		\$ 96.832,00	
7.1.13	REGISTRO DE CORTE 1/2"	\$ 25.881,00		\$ 25.881,00	
7.1.16	CODO PRESIÓN 1-1/2"		\$ 209.536,00	\$ 209.536,00	
7.1.20	REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"		\$ 10.792,00	\$ 10.792,00	

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				
	INTEROBRAS SC S.A.S				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				
Versión: 01					Página 1 de 7
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	902.497,00	\$ 902.497,00
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"		\$	587.436,36	\$ 587.436,36
7.2.13	CODO SANITARIO 4"		\$	321.630,00	\$ 321.630,00
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA		\$	193.123,00	\$ 193.123,00
7.2.16	YEE 4" SANITARIA		\$	201.114,00	\$ 201.114,00
7.2.17	SIFÓN 2"		\$	83.944,00	\$ 83.944,00
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	32.511,00	\$ 32.511,00
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	545.126,40	\$ 545.126,40
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	474.256,16	\$ 474.256,16
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$	1.637.016,26	\$ 1.637.016,26
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.858.613,40	\$ 3.858.613,40
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.111.663,03	\$ 6.111.663,03
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$	728.492,56	\$ 728.492,56
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$	3.329.222,40	\$ 3.329.222,40
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$	6.819.830,64	\$ 6.819.830,64
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$	193.874,25	\$ 193.874,25
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$	2.835.878,40	\$ 2.835.878,40
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$	6.668.229,00	\$ 6.668.229,00
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$	8.206.359,00	\$ 8.206.359,00
3.6	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM		\$	2.425.376,12	\$ 2.425.376,12
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$	21.132.720,00	\$ 21.132.720,00
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$	2.109.510,48	\$ 2.109.510,48
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	114.577,88	\$ 114.577,88
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	65.022,00	\$ 65.022,00
D	GINNASIO BIOSALUDABLE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	937.603,28	\$ 937.603,28
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	6.608.890,44	\$ 6.608.890,44
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.671.617,18	\$ 6.671.617,18
E	PISTA DE TROTE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.045.157,92	\$ 2.045.157,92
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	9.506.368,00	\$ 9.506.368,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	9.568.395,27	\$ 9.568.395,27
F	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	464.208,36	\$ 464.208,36
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.501.434,60	\$ 3.501.434,60
G	URBANISMO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	240.115,20	\$ 240.115,20

<div></div> <div>Interior</div>		INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA					<div></div>	
		INTEROBRAS SC S.A.S						
		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ						
Versión: 01							Página 1 de 7	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$	2.850.130,24		\$ 2.850.130,24	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM			\$	24.494.889,00		\$ 24.494.889,00	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).			\$	24.654.729,60		\$ 24.654.729,60	
7.1.5	TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21			\$	128.215,00		\$ 128.215,00	
7.1.19	REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"			\$	18.164,00		\$ 18.164,00	
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM			\$	3.765.669,24		\$ 3.765.669,24	
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO			\$	4.396.574,40		\$ 4.396.574,40	
7.2.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0,6X0,6X0,6 M, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO		\$	2.586.528,00			\$ 2.586.528,00	
7.2.22	CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE REJILLA METÁLICA, SECCIÓN 30X50 CM		\$	480.461,00			\$ 480.461,00	
7.2.7	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"			\$	3.137.402,16		\$ 3.137.402,16	
7.2.8	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"			\$	4.383.309,58		\$ 4.383.309,58	
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"			\$	2.228.775,00		\$ 2.228.775,00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS						\$ 0,00	
NP-1	PEDRAPLEN COMPACTO			\$	3.813.440,00		\$ 3.813.440,00	
							\$ 0,00	
AVANCE ACTUAL DE OBRA		20,84%	SUBTOTAL	\$	3.189.702	\$	314.247.717,33	
			A.I.U (30%)	\$	956.911	\$	108.855.409,28	
			VALOR TOTAL OBRA	\$	4.146.613	\$	423.103.126,61	
PROGRAMADO		4,51%	ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	133.138.080,00	
			IVA (19%)			\$	31.229.920,00	
			VALOR TOTAL DISEÑOS	\$	-	\$	164.368.000,00	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO		16,33%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	4.146.613	\$	587.471.126,61	
							\$ 577.036.645,13	
6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL								
CONCEPTO		VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2		
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 643.332.674,40			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	\$ 107.222.112,40			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	\$ 214.444.224,80			
CALIDAD DEL SERVICIO		SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	\$ 32.873.600,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	\$ 260.000.000,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 6 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2		
ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO CAUSAL	
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS						
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	ACTA DE PAGO PARCIAL						
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1	25-jun.-2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES						

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA INTEROBRAS SC S.A.S									
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ									
Versión: 01										Página 1 de 7

7. INFORMACION FINANCIERA									
Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO DE ANTICIPO		30.00%	\$ 643.332.674,40	0	\$ 643.332.674,40	\$ 643.332.674,40	\$ 1.501.109.573,60
2	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	5,37%	\$ 164.368.000,00	\$ 49.310.400,00	\$ 115.057.600,00	\$ 758.390.274,40	\$ 1.386.051.973,60
3	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	4-jun.-2024	3,96%	\$ 121.189.403,00	\$ 36.356.820,90	\$ 84.832.582,10	\$ 843.222.856,50	\$ 1.301.219.391,50


8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
LABORES PRESENTE SEMANA: SE REALIZA LA INSTALACION DEL REGISTRO DE CORTE 1" PARA EL BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, REGISTRO DE CORTE DE 1/2" PARA LA COCINA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS. POR OTRA PARTE, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0,60 X 0,60 X 0,60 CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO. Y EL CARCAMO EN MAMPOSTERIA CON UNA SECCION DE 30 X 50 CM LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN EL URBANISMO DEL PROYECTO.
OBSERVACIONES:

Elaborado por:  NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	 NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	 NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
---	--	---

9. REGISTRO FOTOGRAFICO
      

	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA							
	INTEROBRAS SC S.A.S							
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ								
Versión: 01		Página 1 de 7						
INFORMACIÓN GENERAL								
INFORME SEMANAL No. 14		MES: JULIO					FECHA DE INFORME	
CONTRATO No	LP 03-2023	OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					22-jul-24 al 28-jul-24
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S			RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JONATHAN A. ROJAS H.		RESIDENTE DE OBRA: ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO			
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO								
								
2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA								
FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00			
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023			VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	N/A			
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024			PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	lunes, 26 de agosto de 2024			
MODIFICATORIO No. 1 - PLAZO DEL 10/04/2024:	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 1:	miércoles, 17 de julio de 2024			
MODIFICATORIO No. 2 - PLAZO DEL 27/05/2024:	NUEVE (9) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFIC. No. 2:	viernes, 16 de agosto de 2024			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 2.144.442.248,00			VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 643.332.674,40			
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 164.368.000,00			VALOR DE OBRA:	\$ 1.980.073.076,00			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR			REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS			
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	97 DÍAS			PLAZO RESTANTE OBRA:	19 DÍAS			
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,82%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:	21,66%	PROGRAM. SEMANA	10,18%	PROGRAM. ACUMULADO	15,65%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	\$ 16.201.034	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	\$ 428.869.679	PROGRAM FINANC SEMANA	\$ 201.515.160	PROGRAM FINANC ACUMULADO	\$ 309.791.571	

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

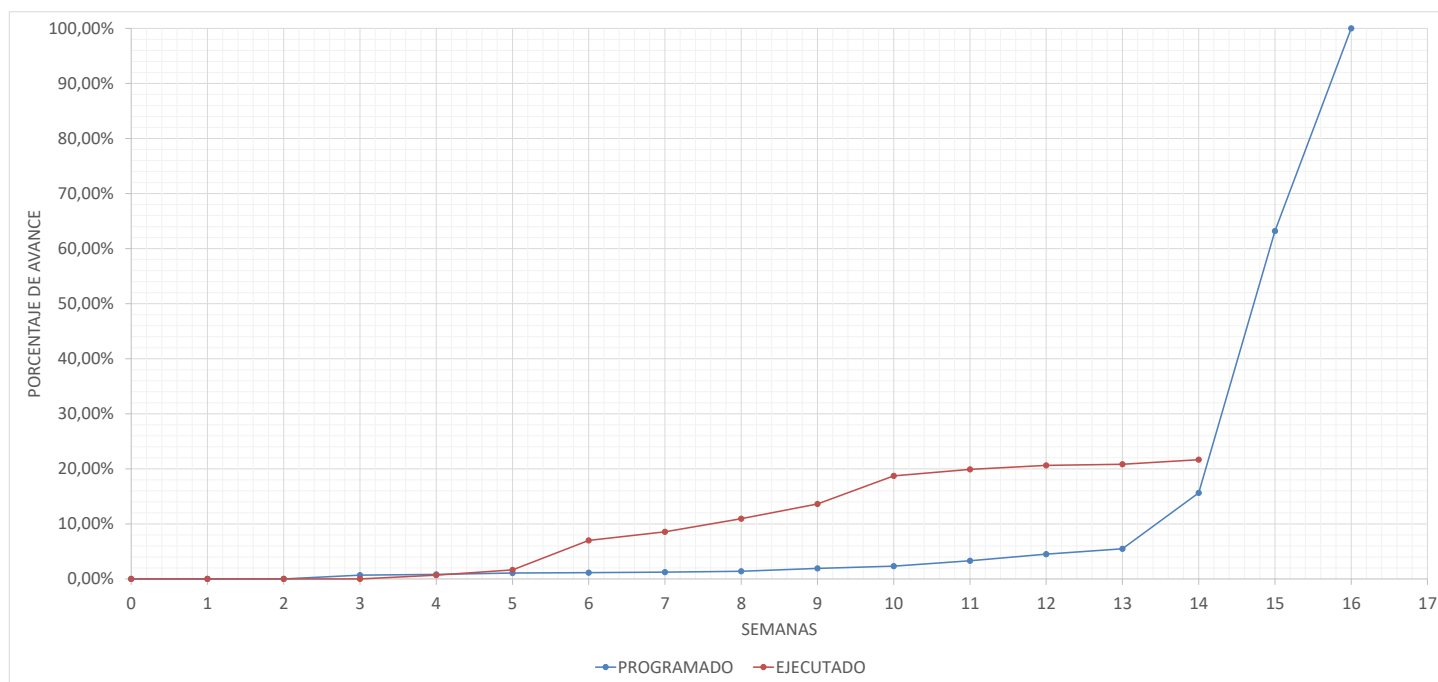


VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$ -	0,00%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$ 22.549.871,69	1,14%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 46.023.808,14	2,32%		01 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 309.791.571,03	15,65%	
01 AL 16 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1.980.073.076,03	100,00%					

<div> Interior</div>	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				<div></div>
	INTEROBRAS SC S.A.S				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				
Versión: 01					Página 1 de 7
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA					
CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
0	PRELIMINARES				
0,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		\$ 10.312.038,48	\$ 10.312.038,48	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE			\$ 0,00	
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.412.785,92	\$ 1.412.785,92	
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 1.342.673,16	\$ 1.342.673,16	
1,3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 2.651.695,76	\$ 2.651.695,76	
1,4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 15.767.820,40	\$ 15.767.820,40	
1,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 15.870.696,03	\$ 15.870.696,03	
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 2.394.281,28	\$ 2.394.281,28	
2,4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 6.523.195,14	\$ 6.523.195,14	
2,5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.651.260,61	\$ 7.651.260,61	
4,1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	\$ 2.815.440,00	\$ 12.467.040,00	\$ 15.282.480,00	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			\$ 0,00	
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 957.864,96	\$ 957.864,96	
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 480.859,00	\$ 480.859,00	
1,3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 1.352.906,00	\$ 1.352.906,00	
1,4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$ 1.857.329,76	\$ 1.857.329,76	
1,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ 1.869.459,12	\$ 1.869.459,12	
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$ 755.173,02	\$ 755.173,02	
2,4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40	
2,5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.006.263,40	\$ 7.006.263,40	
2,6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$ 209.384,19	\$ 209.384,19	
3,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$ 2.126.908,80	\$ 2.126.908,80	
3,2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$ 4.612.873,20	\$ 4.612.873,20	
3,3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM		\$ 700.332,80	\$ 700.332,80	
3,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 8.091.424,00	\$ 8.091.424,00	
3,5	PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 1.234.484,75	\$ 1.234.484,75	
4,1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$ 16.617.840,00	\$ 16.617.840,00	
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$ 1.768.831,96	\$ 1.768.831,96	
5,1	MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	\$ 4.759.552,35		\$ 4.759.552,35	
5,4	DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	\$ 2.458.895,01		\$ 2.458.895,01	
7.1.6	TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21		\$ 507.661,20	\$ 507.661,20	
7.1.8	TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11		\$ 99.976,68	\$ 99.976,68	
7.1.9	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9		\$ 94.771,50	\$ 94.771,50	
7.1.10	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"		\$ 162.616,00	\$ 162.616,00	
7.1.11	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"		\$ 804.608,00	\$ 804.608,00	
7.1.12	REGISTRO DE CORTE 1"		\$ 96.832,00	\$ 96.832,00	
7.1.13	REGISTRO DE CORTE 1/2"		\$ 25.881,00	\$ 25.881,00	

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA				
	INTEROBRAS SC S.A.S				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ				
Versión: 01					Página 1 de 7
7.1.16	CODO PRESIÓN 1-1/2"		\$	209.536,00	\$ 209.536,00
7.1.20	REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"		\$	10.792,00	\$ 10.792,00
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	902.497,00	\$ 902.497,00
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"		\$	587.436,36	\$ 587.436,36
7.2.13	CODO SANITARIO 4"		\$	321.630,00	\$ 321.630,00
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA		\$	193.123,00	\$ 193.123,00
7.2.16	YEE 4" SANITARIA		\$	201.114,00	\$ 201.114,00
7.2.17	SIFÓN 2"		\$	83.944,00	\$ 83.944,00
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	32.511,00	\$ 32.511,00
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	545.126,40	\$ 545.126,40
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	474.256,16	\$ 474.256,16
1.3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$	1.637.016,26	\$ 1.637.016,26
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.858.613,40	\$ 3.858.613,40
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.111.663,03	\$ 6.111.663,03
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM		\$	728.492,56	\$ 728.492,56
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$	3.329.222,40	\$ 3.329.222,40
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$	6.819.830,64	\$ 6.819.830,64
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$	193.874,25	\$ 193.874,25
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$	2.835.878,40	\$ 2.835.878,40
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$	6.668.229,00	\$ 6.668.229,00
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$	8.206.359,00	\$ 8.206.359,00
3.6	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM		\$	2.425.376,12	\$ 2.425.376,12
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA		\$	21.132.720,00	\$ 21.132.720,00
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$	2.109.510,48	\$ 2.109.510,48
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"		\$	114.577,88	\$ 114.577,88
7.2.18	SIFÓN 4"		\$	65.022,00	\$ 65.022,00
D	GINNASIO BIOSALUDABLE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	937.603,28	\$ 937.603,28
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	6.608.890,44	\$ 6.608.890,44
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	6.671.617,18	\$ 6.671.617,18
E	PISTA DE TROTE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	2.045.157,92	\$ 2.045.157,92
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	9.506.368,00	\$ 9.506.368,00
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$	9.568.395,27	\$ 9.568.395,27
F	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$	464.208,36	\$ 464.208,36
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		\$	3.501.434,60	\$ 3.501.434,60
G	URBANISMO				\$ 0,00

 Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA								
	INTEROBRAS SC S.A.S								
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ								
Versión: 01						Página 1 de 7			
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$	240.115,20	\$ 240.115,20			
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$	2.850.130,24	\$ 2.850.130,24			
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM			\$	24.494.889,00	\$ 24.494.889,00			
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).			\$	24.654.729,60	\$ 24.654.729,60			
2.2	GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	\$	308.422,40			\$ 308.422,40			
7.1.5	TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21			\$	128.215,00	\$ 128.215,00			
7.1.19	REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"			\$	18.164,00	\$ 18.164,00			
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	\$	978.077,94	\$	3.765.669,24	\$ 4.743.747,18			
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	\$	1.141.946,40	\$	4.396.574,40	\$ 5.538.520,80			
7.2.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0,6X0,6X0,6 M. INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO			\$	2.586.528,00	\$ 2.586.528,00			
7.2.22	CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE REJILLA METÁLICA, SECCIÓN 30X50 CM			\$	480.461,00	\$ 480.461,00			
7.2.7	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"			\$	3.137.402,16	\$ 3.137.402,16			
7.2.8	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"			\$	4.383.309,58	\$ 4.383.309,58			
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"			\$	2.228.775,00	\$ 2.228.775,00			
NP	ITEMS NO PREVISTOS					\$ 0,00			
NP-1	PEDRAPLEN COMPACTO			\$	3.813.440,00	\$ 3.813.440,00			
						\$ 0,00			
AVANCE ACTUAL DE OBRA		21,66%	SUBTOTAL	\$	12.462.334	\$	317.437.419,33	\$	329.899.753
			A.I.U (30%)	\$	3.738.700	\$	109.960.322,06	\$	98.969.926
			VALOR TOTAL OBRA	\$	16.201.034	\$	427.397.741,39	\$	428.869.679
PROGRAMADO		15,65%	ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	133.138.080,00	\$	133.138.080
			IVA (19%)			\$	31.229.920,00	\$	31.229.920
			VALOR TOTAL DISEÑOS	\$	-	\$	164.368.000,00	\$	164.368.000
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO		6,01%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	16.201.034	\$	591.765.741,39	\$	593.237.679,46
6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL									
CONCEPTO		VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 643.332.674,40				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	\$ 107.222.112,40				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	\$ 214.444.224,80				
CALIDAD DEL SERVICIO		SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	\$ 32.873.600,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 6 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	\$ 260.000.000,00				
ACTAS REALIZADAS		CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS				
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL	
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA							
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS							
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	ACTA DE PAGO PARCIAL							


	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA								
	INTEROBRAS SC S.A.S								
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ								
Versión: 01		Página 1 de 7							
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1		25-jun.-2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES						
7. INFORMACION FINANCIERA									
Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO DE ANTICIPO		30,00%	\$ 643.332.674,40	0	\$ 643.332.674,40	\$ 643.332.674,40	\$ 1.501.109.573,60
2	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may.-2024	5,37%	\$ 164.368.000,00	\$ 49.310.400,00	\$ 115.057.600,00	\$ 758.390.274,40	\$ 1.386.051.973,60
3	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	4-jun.-2024	3,96%	\$ 121.189.403,00	\$ 36.356.820,90	\$ 84.832.582,10	\$ 843.222.856,50	\$ 1.301.219.391,50
4	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	2-jul.-2024	7,24%	\$ 221.948.433,00	\$ 66.584.529,90	\$ 155.363.903,10	\$ 998.586.759,60	\$ 1.145.855.488,40
8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA									
LABORES PRESENTE SEMANA: SE REALIZA EL SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 2 GRADAS CON UNA ALTURA DE 1,10M. PARA EL EDIFICIO POLIVALENTE. SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, CON UN ESPESOR DE 12 CM Y SE INICIA LA INSTALACION DE DOVELAS EN MORTERO, DONDE INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS. SE INSTALA GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES, TAMBIEN SE REALIZA LA APERTURA DE ZANJA PARA TUBERIAS, CON UNA SECCION PROMEDIO DE 40X60 CM Y SE REALIZA EL RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA. PARA EL URBANISMO									
OBSERVACIONES:									
Elaborado por:									
									
NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA			NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA			NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ			
9. REGISTRO FOTOGRAFICO									
									

<div> Interior</div>	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA		<div></div>
	INTEROBRAS SC S.A.S		
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ			
Versión: 01			Página 1 de 7
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			

INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. LP 03 - 2023												
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ												
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ												
INFORMACIÓN GENERAL												
INFORME SEMANAL No. 15			MES: JULIO - AGOSTO						PERIODO DEL INFORME			
CONTRATO DE OBRA No.		LP 03-2023	OBJETO:		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					29-jul-24	al	4-ago-24
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S					RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JONATHAN A. ROJAS H.			RESIDENTE DE OBRA: NG. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO				
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO												
<div></div>												
2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA												
FECHA DEL CONTRATO:			viernes, 22 de septiembre de 2023				VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 2.144.442.248,00			
FECHA DE INICIACIÓN:			viernes, 27 de octubre de 2023				VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:		N/A			
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:			martes, 23 de abril de 2024				PLAZO DE EJECUCIÓN:		OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:			DIEZ (10) MESES				FECHA DE TERMINACION INICIAL:		lunes, 26 de agosto de 2024			
MODIFICATORIO No. 1 - PLAZO DEL 10/04/2024:			OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS				FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFIC. No. 1:		miércoles, 17 de julio de 2024			
MODIFICATORIO No. 2 - PLAZO DEL 27/05/2024:			NUEVE (9) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS				FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFIC. No. 2:		viernes, 16 de agosto de 2024			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$ 2.144.442.248,00				VALOR DEL ANTICIPO:		\$ 643.332.674,40			
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:			\$ 164.368.000,00				VALOR DE OBRA:		\$ 1.980.073.076,00			
CONTRATISTA DE OBRA:			UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR				REPRESENTANTE LEGAL:		ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS			
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:			104 DÍAS				PLAZO RESTANTE OBRA:		12 DÍAS			
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:			8,87%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:		30,53%	PROGRAM. SEMANA		47,56%	PROGRAM. ACUMULADO		63,21%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:			\$ 175.658.377	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:		\$ 604.528.056	PROGRAM FINANC SEMANA		\$ 941.748.470	PROGRAM FINANC ACUMULADO		\$ 1.251.540.041



3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

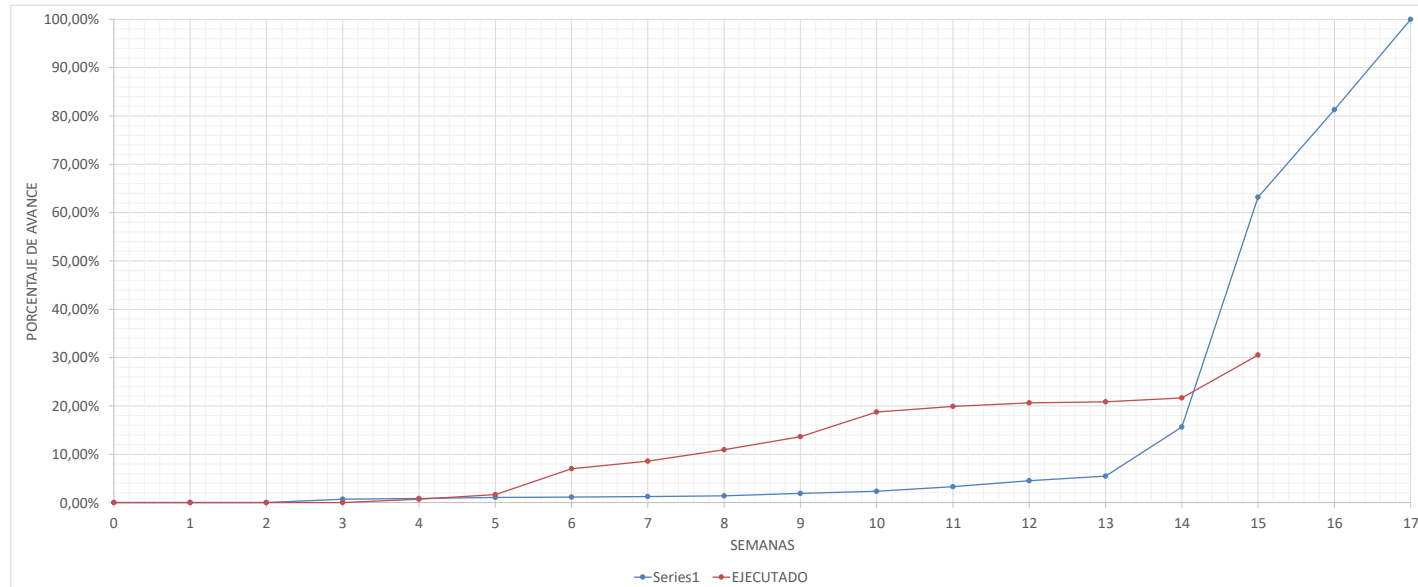

VALOR PROGRAMADO VS EJECUTADO POR MES ACUMULADO				
MES	VALOR PROGRAMADO	% PROG.	VALOR EJECUTADO	% EJE
MES 1 - 23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
MES 2 - 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$ 22,548,871.69	1.14%	\$ 138,510,173.53	7.00%
MES 3 - 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 46,023,806.14	2.32%	\$ 370,857,586.54	18.73%
MES 4 - 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 309,791,571.03	15.65%	\$ 604,528,056.75	30.53%
MES 5 - 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,980,073,076.03	100.00%		

[illegible]

INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. LP 03 - 2023					
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ					
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA					
CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
0	PRELIMINARES				
0.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		\$ 10.312.038,48	\$ 10.312.038,48	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	-\$ 758.634,24	\$ 1.412.785,92	\$ 654.151,68	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	\$ 1.166.980,20	\$ 1.342.673,16	\$ 2.509.653,36	
1.3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 2.651.695,76	\$ 2.651.695,76	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$ 181.836,48	\$ 15.767.820,40	\$ 15.949.656,88	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	\$ 183.050,82	\$ 15.870.696,03	\$ 16.053.746,85	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	\$ 593.930,24	\$ 2.394.281,28	\$ 2.988.211,52	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 6.523.195,14	\$ 6.523.195,14	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.651.260,61	\$ 7.651.260,61	
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	\$ 224.894,13		\$ 224.894,13	
3.9	MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS	\$ 6.909.418,74		\$ 6.909.418,74	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	\$ 537.600,00	\$ 15.282.480,00	\$ 15.820.080,00	
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	\$ 6.427.414,71		\$ 6.427.414,71	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			\$ 0,00	
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 957.864,96	\$ 957.864,96	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		\$ 480.859,00	\$ 480.859,00	
1.3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA		\$ 1.352.906,00	\$ 1.352.906,00	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	-\$ 1.082,36	\$ 1.857.329,76	\$ 1.856.247,40	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	-\$ 1.087,11	\$ 1.869.459,12	\$ 1.868.372,01	
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	\$ 1.160,02	\$ 755.173,02	\$ 756.333,04	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA		\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA		\$ 7.006.263,40	\$ 7.006.263,40	
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS		\$ 209.384,19	\$ 209.384,19	
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA		\$ 2.126.908,80	\$ 2.126.908,80	
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM		\$ 4.612.873,20	\$ 4.612.873,20	
3.3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM		\$ 700.332,80	\$ 700.332,80	
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	\$ 294.233,60	\$ 8.091.424,00	\$ 8.385.657,60	
3.5	PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM		\$ 1.234.484,75	\$ 1.234.484,75	
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	-\$ 164.000,00	\$ 16.617.840,00	\$ 16.453.840,00	
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS		\$ 1.768.831,96	\$ 1.768.831,96	
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	\$ 39.127.280,04		\$ 39.127.280,04	
4.4	PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	\$ 6.176.261,85		\$ 6.176.261,85	
5.1	MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	\$ 5.561.999,40	\$ 4.759.552,35	\$ 10.321.551,75	
5.2	ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR	\$ 414.244,80		\$ 414.244,80	
5.4	DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	\$ 116.444,79	\$ 2.458.895,01	\$ 2.575.339,80	
5.5	ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKI ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM	\$ 1.565.072,00		\$ 1.565.072,00	
7.1.6	TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21	\$ 28.339,32	\$ 507.661,20	\$ 536.000,52	
7.1.8	TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11	\$ 48.076,74	\$ 99.976,68	\$ 148.053,42	
7.1.9	TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	-\$ 20.541,00	\$ 94.771,50	\$ 74.230,50	
7.1.10	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"		\$ 162.616,00	\$ 162.616,00	
7.1.11	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"		\$ 804.608,00	\$ 804.608,00	
7.1.12	REGISTRO DE CORTE 1"		\$ 96.832,00	\$ 96.832,00	

INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. LP 03 - 2023					
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ					
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ					
7.1.13	REGISTRO DE CORTE 1/2"			\$ 25.881,00	\$ 25.881,00
7.1.16	CODO PRESIÓN 1-1/2"	-\$	104.768,00	\$ 209.536,00	\$ 104.768,00
7.1.20	REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"			\$ 10.792,00	\$ 10.792,00
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"			\$ 902.497,00	\$ 902.497,00
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"			\$ 587.436,36	\$ 587.436,36
7.2.13	CODO SANITARIO 4"			\$ 321.630,00	\$ 321.630,00
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"x2" SANITARIA			\$ 193.123,00	\$ 193.123,00
7.2.16	YEE 4" SANITARIA			\$ 201.114,00	\$ 201.114,00
7.2.17	SIFÓN 2"			\$ 83.944,00	\$ 83.944,00
7.2.18	SIFÓN 4"			\$ 32.511,00	\$ 32.511,00
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO				\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$ 545.126,40	\$ 545.126,40
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$ 474.256,16	\$ 474.256,16
1.3	CONCRETO CICLOPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	-\$	284.110,26	\$ 1.637.016,26	\$ 1.352.906,00
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$	5.685.637,08	\$ 3.858.613,40	\$ 9.544.250,48
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	\$	3.494.873,61	\$ 6.111.663,03	\$ 9.606.536,64
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	-\$	217.503,75	\$ 728.492,56	\$ 510.988,81
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA			\$ 3.329.222,40	\$ 3.329.222,40
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA			\$ 6.819.830,64	\$ 6.819.830,64
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS			\$ 193.874,25	\$ 193.874,25
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA			\$ 2.835.878,40	\$ 2.835.878,40
3.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM			\$ 6.668.229,00	\$ 6.668.229,00
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	-\$	272.395,95	\$ 8.206.359,00	\$ 7.933.963,05
3.6	MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM			\$ 2.425.376,12	\$ 2.425.376,12
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	-\$	2.873.920,00	\$ 21.132.720,00	\$ 18.258.800,00
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	-\$	191.773,68	\$ 2.109.510,48	\$ 1.917.736,80
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	\$	38.301.540,30		\$ 38.301.540,30
4.4	PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	\$	6.052.782,01		\$ 6.052.782,01
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"			\$ 114.577,88	\$ 114.577,88
7.2.18	SIFÓN 4"	-\$	32.511,00	\$ 65.022,00	\$ 32.511,00
8.12	APERTURA DE ZANJA 0,25"x0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION TY COMPACTACION.	\$	1.090.597,12		\$ 1.090.597,12
D	GINNASIO BIOSALUDABLE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	-\$	231.386,48	\$ 937.603,28	\$ 706.216,80
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	-\$	1.056.383,36	\$ 6.608.890,44	\$ 5.552.507,08
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA AREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$	1.797.968,70		\$ 1.797.968,70
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	-\$	1.082.877,21	\$ 6.671.617,18	\$ 5.588.739,97
2.2	GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	\$	533.700,16		\$ 533.700,16
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	\$	2.375.810,52		\$ 2.375.810,52
E	PISTA DE TROTE				\$ 0,00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	-\$	620.954,04	\$ 2.045.157,92	\$ 1.424.203,88
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	-\$	149.365,68	\$ 9.506.368,00	\$ 9.357.002,32
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA AREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$	3.677.663,25		\$ 3.677.663,25
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	\$	1.038.282,57	\$ 9.568.395,27	\$ 10.606.677,84
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	\$	2.661.264,60		\$ 2.661.264,60
F	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				

INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. LP 03 - 2023						
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ						
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ						
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	-\$	84.114,44	\$	464.208,36	\$ 380.093,92
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	-\$	424.285,12	\$	3.501.434,60	\$ 3.077.149,48
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	\$	3.097.222,65			\$ 3.097.222,65
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	\$	18.089.619,65			\$ 18.089.619,65
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	\$	3.781.773,94			\$ 3.781.773,94
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	\$	3.264.137,67			\$ 3.264.137,67
G	URBANISMO					\$ 0,00
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE			\$	240.115,20	\$ 240.115,20
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	-\$	1.791.379,20	\$	2.850.130,24	\$ 1.058.751,04
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	-\$	16.599.072,96	\$	24.494.889,00	\$ 7.895.816,04
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA AREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	\$	2.268.346,37			\$ 2.268.346,37
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	-\$	13.331.276,19	\$	24.654.729,60	\$ 11.323.453,41
2.1	FILTRO FRANCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL	\$	7.911.213,30			\$ 7.911.213,30
2.2	GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	\$	3.352.422,08	\$	308.422,40	\$ 3.660.844,48
7.1.5	TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21			\$	128.215,00	\$ 128.215,00
7.1.15	CODO PRESIÓN 2"	\$	96.650,00			\$ 96.650,00
7.1.19	REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"			\$	18.164,00	\$ 18.164,00
7.1.22	TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR PARA TANQUE	\$	1.108.141,00			\$ 1.108.141,00
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40x60 CM	-\$	2.493.614,55	\$	4.743.747,18	\$ 2.250.132,63
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	-\$	2.911.398,00	\$	5.538.520,80	\$ 2.627.122,80
7.2.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0,6X0,6X0,6 M, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO			\$	2.586.528,00	\$ 2.586.528,00
7.2.22	CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE REJILLA METÁLICA, SECCIÓN 30X80 CM			\$	480.461,00	\$ 480.461,00
7.2.7	TUBERÍA PVC SANITARIA 8"	\$	170.216,64		3.137.402,16	\$ 3.307.618,80
7.2.8	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"	-\$	1.324.833,12	\$	4.383.309,98	\$ 3.059.476,86
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	-\$	906.028,51	\$	2.228.775,00	\$ 1.322.746,49
8.12	APERTURA DE ZANJA 0,25X0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1" TAPADO, SEÑALIZACION Y COMPACTACION.	\$	3.643.023,36			\$ 3.643.023,36
NP	ITEMS NO PREVISTOS					\$ 0,00
NP-1	PEDRAPLEN COMPACTO				3.813.440,00	\$ 3.813.440,00
						\$ 0,00
AVANCE ACTUAL DE OBRA		30,53%	SUBTOTAL	\$	135.121.828	\$ 329.899.753,43
			A.I.U (30%)	\$	40.536.548	\$ 114.277.274,59
			VALOR TOTAL OBRA	\$	175.658.377	\$ 444.177.028,02
PROGRAMADO		63,21%	ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 133.138.080,00
			IVA (19%)			\$ 31.229.920,00
			VALOR TOTAL DISEÑOS	\$	-	\$ 164.368.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO		-32,68%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	175.658.377	\$ 608.545.028,02
						\$ 768.896.056,18
6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL						
PÓLIZAS DE GARANTÍA						
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-10115606 - ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	\$ 643.332.674,40		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	\$ 107.222.112,40		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	\$ 214.444.224,80		
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	\$ 32.873.600,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 6 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	\$ 260.000.000,00		

INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. LP 03 - 2023

MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ



ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACION DE DISEÑOS						
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	30-may-2024	ACTA DE PAGO PARCIAL						
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1	25-jun-2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES						

7. INFORMACION FINANCIERA									
Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO DE ANTICIPO		30.00%	\$ 643.332.674.40	0	\$ 643.332.674.40	\$ 643.332.674.40	\$ 1.501.109.573.60
2	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	13-jun-2024	5.37%	\$ 164.368.000.00	\$ 49.310.400.00	\$ 115.057.600.00	\$ 758.390.274.40	\$ 1.386.051.973.60
3	CONTRATO DE OBRA	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	16-jul-2024	3.96%	\$ 121.189.403.00	\$ 36.356.820.90	\$ 84.832.582.10	\$ 843.222.856.50	\$ 1.301.219.391.50
4									

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

LABORES PRESENTE SEMANA:

OBSERVACIONES: EN LA PRESENTE SEMANA SE REALIZA MEDICIÓN DE ACTIVIDADES FINALIZADAS PARA CORTE MES DE JULIO CON CONTRATISTA DE OBRA, LAS CUALES SE AJUSTAN DE ACUERDO A SU MEDIDA REAL. DE IGUAL FORMA SE REALIZA PARA EL EDIFICIO POLIVALENTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE SOLADOS PARA LOS MUROS DE LAS GRADERÍAS, AMARRE DE ACERO DE MUROS Y FUNDIDA DE CONCRETO DE 21 MPA PARA MUROS DE GRADERÍAS 1 Y 2, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA. EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE FUNDE CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO, SE REALIZA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA Y PERGOLA, CON SU PINTURA, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DEL MURO PRENSADO EN FACHADAS, CON SUS RESPECTIVOS ANCLAJES Y DOVELAS, ASÍ COMO EL ENCHAPE EN LADRILLO DE LAS VIGAS AÉREAS Y SE REALIZA CONEXIÓN DE TUBERÍA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EN EL EDIFICIO COMPLEMENTARIO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE FUNDE CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO CON SU RESPECTIVA MALLA ELECTROSOLDADA, SE FABRICA E INSTALA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CON RESPECTIVA PINTURA, Y SE INSTALAN DUCTOS ELÉCTRICOS PARA RED ELÉCTRICA A TABLERO DE EDIFICACIÓN. EN EL GIMNASIO VITAL SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE INSTALA GEOTEXTIL Y MATERIAL DE SUBBASE EN ESPESOR DE 20 CM Y SE INSTALA BORDILLO A-80 EN TODO EL PERÍMETRO DEL ÁREA. EN LA PISTA DE TROTE SE INSTALA MATERIAL DE SUBBASE EN LA ÁREA FRENTE AL PARQUE INFANTIL, CON SU RESPECTIVO TRANSPORTE Y SE INSTALA BORDILLO DEL ÁREA JUNTO AL GIMNASIO VITAL. EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA, Y SE FUNDE PLACA DE PISO CON ESPESOR DE 10 CM EN CONCRETO DE 21 MPA Y SE INSTALA BORDILLO A-80 EN EL PERÍMETRO DEL ÁREA QUE DA CONTRA URBANISMO. EN EL URBANISMO SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN EL ÁREA DE PLAOLETA Y ZONA VERDE CONTRA EDIFICIO POLIVALENTE DEBIDO A FALLO ENCONTRADO, EL CUAL SE RELLENA CON MATERIAL DE AFIRMADO, SE INSTALA MATERIAL DE SUBBASE PARA ÁREA DE PLAZOLETA DE ACCESO ENTRE EDIFICIO POLIVALENTE Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO EN UN ESPESOR DE 20 CM, BAJO EL CUAL SE EXTENDIÓ GEOTEXTIL NT-2500, SE CONSTRUYE FILTRO FRANCES LOCALIZADO EN EL PERÍMETRO CONTRA LA VÍA, SE INSTALA TANQUE PLÁSTICO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SERVICIOS Y SE INSTALAN TUBERÍAS PARA RED DE AGUAS LLUVIAS DESDE SIFÓN DE EDIFICIO POLIVALENTE, HASTA CAJA DE EDIFICIO DE SERVICIOS Y SE INSTALAN DUCTOS ELÉCTRICOS PARA RED DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA LOCALIZADA ENTRE EDIFICIO POLIVALENTE Y PISTA DE TROTE.

DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO, QUE IMPIDIERON EL NORMAL DESARROLLO EN OBRA.

SE PRESENTA UN POCENTAJE DE AVANCE NEGATIVO PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE PRÓRROGA EN TIEMPO No. 1 AL CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEL CUAL SE DERIVAN LOS PRESENTES CONTRATOS, DADO QUE EL TIEMPO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA SUPEDITADO AL TIEMPO DEL CONVENIO.

Elaborado por:



NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA



NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA



NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ



9. REGISTRO FOTOGRAFICO











SOPORTES PAGO ACTA PARCIAL N. 01 OBRA



TURMEQUÉ – BOYACA ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.801.787-8				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
MACROPROCESO	FORMATO	Versión 2	23-07-2019	
PROCESO	F-CT-19			
ACTA DE PAGO PARCIAL				Página 1 de 5

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

CONTRATO ____X____ CONVENIO _____	CONTRATO DE OBRA N°. LP 03 - 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ
NIT	891801787-8
ALCALDE	GIOVANNI VELA BERNAL
C.C. No.	74.150.529 de Turmequé
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
NIT	901755256-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
C.C. No.	7.182.662 de Tunja
INTERVENTOR	INTEROBRAS SC S.A.S.
NIT	901245192-6
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
C.C. No.	1.049.611.640 de Tunja
SUPERVISOR	JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACÁ
VALOR INICIAL	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.144.442.248) M/CTE
ADICIÓN N° 01 EN VALOR	N.A
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES., CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No. 01	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO



TURMEQUÉ – BOYACA				 TURMEQUE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.801.787-8				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
MACROPROCESO	FORMATO	Versión 2	23-07-2019	
PROCESO	F-CT-19			
ACTA DE PAGO PARCIAL				Página 2 de 5

PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No. 02	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSPENSIÓN N°	N.A
FECHA DE REINICIACIÓN N°	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	16 DE AGOSTO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000376 (14/08/2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000487 (22/09/2023)
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	24 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	29 DE MAYO DE 2024
DEPENDENCIA SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE MAYO DE 2024

En las oficinas de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO se reunieron los señores, GIOVANI VELA BERNAL Alcalde Municipal, JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA en calidad de Supervisor, ELIANA SARMIENTO CIFUENTES, representante legal de la empresa INTEROBRAS SC S.A.S., en calidad de Interventoría y el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

De acuerdo con las actas de entrega y aprobación de estudios y diseños adjuntas, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto, el suscrito interventor y supervisor reciben satisfactoriamente y autorizan el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9468567613 del mes de MAYO DE 2024, cuyo plazo de pago es hasta el 17 de junio de 2024, momento en el cual se anexará soporte de pago, conformidad con la normatividad vigente.

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
0	PRELIMINARES	X	
0.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	X	
A	EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE		
A.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	X	
B	EDIFICIO DE SERVICIOS		

TURMEQUÉ – BOYACA			
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.801.787-8			
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
MACROPROCESO	FORMATO	Versión 2	23-07-2019
PROCESO	F-CT-19		
ACTA DE PAGO PARCIAL			Página 3 de 5





B.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	X	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	X	
1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	X	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	X	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	X	
B.2	ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN		
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	X	
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	X	
2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	X	
2.6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	X	
B.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLUYE FORMALETA METÁLICA	X	
B.4	ESTRUCTURAS EN ACERO		
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	X	
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	X	
B.7.2	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	X	
7.2.10	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	X	
7.2.13	CODO SANITARIO 4"	X	
7.2.15	YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA	X	
7.2.16	YEE 4" SANITARIA	X	
7.2.17	SIFÓN 2"	X	
7.2.18	SIFÓN 4"	X	
C	EDIFICIO COMPLEMENTARIO		
C.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	X	
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	X	



TURMEQUÉ – BOYACA				 TURMEQUÉ
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.801.787-8				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
MACROPROCESO	FORMATO	Versión 2	23-07-2019	
PROCESO	F-CT-19			
ACTA DE PAGO PARCIAL			Página 4 de 5	



TURMEQUE

1.3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	X	
1.4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	X	
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	X	
C.2	ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN		
2.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	X	
C.4	ESTRUCTURAS EN ACERO		
4.1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	X	
G	URBANISMO		
G.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	X	
G.7.2	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
7.2.1	APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	X	
7.2.2	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	X	
7.2.9	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	X	

VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ML/C (\$121.189.403,00).

BALANCE ANTICIPO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del anticipo	\$643.332.674,40	
Amortización anticipo acta parcial No. 1	\$ 0,00	\$49.310.400,00 -
Valor amortización presente acta	\$ 0,00	\$36.356.820,90
Saldo por amortizar	\$ 0,00	\$ 557.665.453,50
Sumas Iguales	\$643.332.674,40	\$643.332.674,40

BALANCE CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$2.144.442.248,00	
Valor Anticipo	\$ 0,00	\$643.332.674,40
Valor pagado acta parcial No. 1	\$ 0,00	\$115.057.600,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$84.832.582,10
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$1.301.219.391,50

TURMEQUÉ – BOYACA				
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.801.787-8				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
MACROPROCESO	FORMATO	Versión 2	23-07-2019	
PROCESO	F-CT-19			
ACTA DE PAGO PARCIAL				Página 5 de 5

Sumas Iguales	\$2.144.442.248,00	\$2.144.442.248,00
----------------------	---------------------------	---------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$84.832.582,10).


DOCUMENTOS.

Para todos los efectos legales se entienden incorporados a la presente Acta:

- a) Factura
- b) Pago de seguridad social del Contratista
- c) Informe Contratista
- d) Informe de Supervisión.
- e) Aval de pago por parte de interventoría

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, en Turmequé a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024, por las personas que en ella intervinieron.


JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
 Secretario de Planeación y Desarrollo
 Económico
 SUPERVISOR


UNION TEMPORAL COBING INFRATUR
 R/L JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
 CONTRATISTA


INTEROBRAS SC S.A.S.
 R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
 INTERVENTORÍA


 Vo.Bo. **GIOVANNI VELA BERNAL**
 Alcalde Municipal

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Aura Patricia Soracipa	Claudia Patricia Barreto V.	Jorge Andres Cuitiva Q.
Cargo	Apoyo	Profesional Universitario	Secretario de Planeación y desarrollo económico




**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.182.662, en mi condición de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR identificada con Nit. 901.755.256-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.165.023, y con Tarjeta Profesional No. 105425-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de la UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR identificada con Nit. 901.755.256-7, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Tunja a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.



JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
Representante Legal Contratista
C.C. 7.182.662 de Tunja



LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
Contador Público
C.C. 7.165.023 de Tunja
T.P. 105425-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

47A8C30313E96060

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7165023 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 105425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

105425-T

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C. 7165023
RES. INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD DE BOYACA

DEL 21/10/2004

283326


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

115007

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agudese a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PSX. (57) 1 644 4480 o devolvérsele a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 47-48 Of. 301 en Bogotá D.C.

	MUNICIPIO DE TURMEQUE		Código:	
	GESTION FINANCIERA		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMP. DE EGRESO ALCALDÍA MPAL Nro: EGR - 2024070028

Nit: 891801787-8

martes, 16 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024070022	16-jul-24
-----------------------------	------------	-------------------	------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	CC o NIT	901755256	DV	7
DIRECCION	CL 24 10 16 OF 104	TELEFONO	3125919250		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFERENCIA	VALOR PAGO	64.957.520.10		
DESCRIPCION					

ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 02 DEL CONTRATO LP-003-2023; CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA

SON SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 10 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100605016		BanCol Cta Aho 545-541707-25 Proy. De Infraestructura para la Convivencia Tipo 1B	00.00	64,957,520.10			
24362601		Obras públicas 2%	00.00	2,423,788.00	Fuente	121,189,403.00	2.000
13110105	1.1.01.02.218.1.	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%	00.00	2,423,788.00	Tasa prodep	121,189,403.00	2.000
13112701	1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas 5%	00.00	6,059,470.00	Contribución	121,189,403.00	5.000
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 1%	00.00	1,211,894.00	Estampilla	121,189,403.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%	00.00	4,847,576.00	Estampilla	121,189,403.00	4.000
13058806	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	2,423,788.00	Estampilla	121,189,403.00	2.000
13050804	1.1.01.02.200.01	Retención del 4% 1000	00.00	484,758.00	ICA	121,189,403.00	4.000
24010101 901755256 001	3.2.3.40.4002004.035	Adquisición de Bienes y Servicios UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	84,832,582.10	00.00			
SUMAS IGUALES			84,832,582.10	84,832,582.10			


3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000011	2024000005	3.2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.0	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE. FUENTE: 1.2.3.3.04.10-CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION MIN INTERIOR	84,832,582.10

Meta: 98 Mantener y mejorar discisióis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.

TOTAL PRESUPUESTO 84,832,582.10

Elaboró: HAYTHERAN	Modificó: DAYANNA	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Revisó:	
		
GIOVANNI VELA BERNAL ALCALDE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	c.c ó Nit



MUNICIPIO DE TURMEQUE

Código: COM-2024070022

GESTION FINANCIERA

Versión: 1

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO ALCALDIA No. COM-2024070022

Nit: 891801787-8

martes, 16 de julio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL COBING INGRATUR **CC o NIT** 901755256 **DV** 7
DIRECCION CL 24 10 16 OF 104 **TEL** 3125119250
DESCRIPCION ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 02 DEL CONTRATO LP-003-2023; CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1605015124	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 1B	84,832,582.10	00.00
24010101	Adquisición de Bienes y Servicios UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	00.00	84,832,582.16
19060115	Anticipo al contrato de obra N°LP 03-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA	36,356,820.90	00.00
1605015124	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 1B	00.00	36,356,820.84
SUMAS IGUALES		121,189,403.00	121,189,403.00
Documento	Valor a Girar	84,832,582.16	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000011	2024000005	3.2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.0	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE . FUENTE: 1.2.3.3.04.10- CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION M/IN INTERIOR	84,832,582.10

Meta : 98 Mantener y mejorar dieciséis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.

TOTAL PRESUPUESTO

84,832,582.10

GIOVANNI VELA BERNAL
ALCALDE MUNICIPAL

HAYTHERAN

DAYANNA

Modificó
