



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-025170 Id: 388270
Folios: 1 Fecha: 20-08-2024 15:26:52
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, DC

Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Asunto: Remisión de informes de supervisión y documentos contractuales mes de julio de 2024.

En mi condición de supervisor, adjunto para su archivo los siguientes informes que corresponden al mes de julio de 2024:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
N.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	CAM / CIC /SACUDETE	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
1620-2023	Infraestructura para la Convivencia	Coloso	Sucre	INFORME DE JULIO 2024 MINISTERIO + SOPORTES - FOLIOS (50)
2013-2021	Sacúdete	Espinal	Tolima	INFORME DE JULIO 2024 MINISTERIO + SOPORTES - FOLIOS (109)

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Daniel Suarez / Apoyo a la supervision 

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1620 DE 2023, MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE.”		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.383.023.552	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0.00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 2.383.023.552	
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	18-OCTUBRE-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: 18/06/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	POLIZA INICIAL		

(Vigencia nueva del amparo)	No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA
	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO \$476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 164.561.480
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 79.434.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0
VALOR DE OBRA	\$ 1.980.160.072,04
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 158.868.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 2.383'023.552

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJ E DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	\$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AA AA	\$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AA AA	\$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$436.887.652), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al	100%	DD/MM/A AAA	\$436.887.652

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.072.360.598,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 857.883.478,80

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		\$2.144.708.697	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00	
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	Fecha de terminación actual del contrato	02/09/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$2.144.708.697	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Póliza Acta de Inicio			
Fecha de Expedición: 30/10/2023			
No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

			Desde	Hasta
	-Cumplimiento	\$ 214.470.869,7	26/10/2023	28/10/2024
	Prestaciones sociales	\$ 857.883.478,8	26/10/2023	28/10/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	\$ 107.235.434,85	26/10/2023	28/10/2024

➤ **Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato CM 004 2023 09-10-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		\$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA		NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	Fecha de terminación actual del contrato	02/09/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 30/10/2023				
No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	-Cumplimiento	\$ 23.823.800	09/10/2023	11/12/2024
	Prestaciones sociales	\$ 47.647.600	09/10/2023	11/12/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	\$ 71.471.400	09/10/2023	11/12/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	JULIO - 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	JULIO - 2024	Corte: 31 - JULIO - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$121.527.823,20	Corte: 31 - JULIO - 2024
	SI	NO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i> <i>Según informe semanal N°20 del 29/07/2024 al 04/08/2024:</i>	PORCENTAJE (%) Ejecutado: 49,63% Programado: 56,80%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	56,80%
% EJECUTADO DE OBRA	49,63%
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MUNICIPIO: <p>A este informe se realizó una prórroga amparada en la póliza No 540-47-994000026544 ANEXO 1, del 25 de junio de 2024 a la fecha se envió la documentación para el Segundo desembolso.</p> <p>El avance físico del Proyecto está en un 49,63%, un avance de un 6% aproximadamente con respecto al último informe</p> <p>Dentro de las actividades ejecutadas podemos describir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programadas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 20 correspondiente se realizó la ejecución de las siguientes actividades: Concreto f'c=3000 psi para Vigas Aéreas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye la rejilla metálica según diseño; Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones; Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta para las siguientes semanas la ejecución de las actividades correspondientes a; Piso en baldosa de grano de mármol vibro prensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Estuco Acrílico mono componente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con lana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final; Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros, techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Estructura metálica para Cubierta Termoacústica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cubierta en lamina termoacústica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Caja de acceso a válvulas; Válvula de pie de 1 1/4"; Flotador de 1/2". Por otro lado, se encuentra finaliza la siguiente actividad, que corresponde a la semana presente: Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones.COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectará realizar las siguientes actividades: Piso en baldosa de grano de mármol vibro prensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guarda escoba en baldosa grano de mármol vibro prensado L.=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega.COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectan las siguientes actividades: Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi,	

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.

- **COMPONENTES:** Para el seguimiento del componente 6, en la semana 20, no se encuentra ninguna actividad plasmada correspondiente.
- **COMPONENTES:** Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, se proyectan para las semanas siguientes estas actividades: Suministro e instalación de piso en caucho EPDM granulado, e= 2 cm. Incluye adhesivo, compactación, nivelación, variación de colores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento.
- **COMPONENTE 8:** Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se ejecutaron las actividades que corresponden a: Loseta podo táctil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DIRECCIONAL. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Loseta podo táctil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DE ALERTA. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona Tipo M-121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Señal servicios 33X30 (SUM + INST); Señal tribunas 30X1,20 (SUM + INST); Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST); Tubería pvc sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada.
- **COMPONENTE 9:** Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se necesitan proyectar las tareas que plasmaré a continuación: Poste metálico certificado de 4 mts; Luminaria de emergencia; Luminaria tipo tortuga; Luminaria Panel Led RD 12W/6500 K.
- Se avala lo manifestado por Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la descripción detallada por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea. Es importante mencionar que, desde la semana anterior que corresponde al número (19), se están ajustando las actividades a la nueva reprogramación aprobada con prórroga de tiempo incluida hasta el 30 de septiembre, con esto se presentará un desbalance hasta niverlarse en los porcentajes proyectados para cada semana. Para el informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 49,66% contra un ejecutado del 47,63%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, además se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 02 de julio de 2024, se suscribe la primera prórroga a los contratos de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría del proyecto infraestructura para la convivencia del municipio de Coloso – Sucre en marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023, quedando con un nuevo plazo de ejecución contractual hasta el 02 de septiembre de 2024, tiempo necesario para la finalización de la obra y la consecución del 100% del objeto contractual según lo informado por la entidad territorial.
- Que el 11 de julio de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la subdirección de gestión contractual la constancia de publicación y la póliza actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023 respecto a la primera prórroga del mismo.

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

- Que el 17 de julio de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante memorando de Radicado 2024-3-003122-022172 ID: 368153 a la subdirección de gestión contractual la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el trámite del segundo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023.
- Que el 17 de julio de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante memorando de Radicado 2024-3-003122-022233 Id: 368747 al coordinador financiero y contable la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el trámite del segundo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023.
- Durante el mes de julio de 2024, la subdirección de gestión contractual rechaza la póliza publicada respecto a la primera prórroga del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Toda vez que, la aseguradora en un error de diligenciamiento no extiende el amparo de la misma por 8 meses sino por 7 meses.
- Que el 14 de julio de 2024, la supervisión por parte del municipio de Coloso – Sucre realiza nuevamente la publicación de la póliza del convenio interadministrativo 1620 de 2023 de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la subdirección de gestión contractual.
- Que el 18 de julio de 2024, la supervisión por parte de la administración municipal de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior, el informe mensual de ejecución, el informe mensual financiero, el extracto bancario y los informes semanales de interventoría de la obra infraestructura para la convivencia 1B en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.
- Que el 19 de julio de 2024, la subdirección de gestión contractual realiza la aprobación de la póliza actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023 correspondiente a la infraestructura para la convivencia del municipio de Coloso – Sucre.
- Que el 30 de julio de 2024, la administración municipal de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la constancia de publicación y la póliza actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023 respecto a la primera prórroga del mismo.
- Durante el transcurso del mes de julio de 2024, la supervisión del Ministerio del interior mediante llamadas telefónicas, y correo electrónico reitera a la administración municipal la necesidad del estricto cumplimiento de la **“CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA: 26) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO. 29) Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: i. Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. ii. Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. iii. Balance Financiero discriminado del proyecto. iv. Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. v. Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. vi. Certificación de las cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. Certificaciones de RETIE y RETILAP del proyecto y demás documentos requeridos para su funcionamiento y mantenimiento. 32) Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP”**. Lo anterior con el objetivo de realizar el correcto seguimiento y control de la obra infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.
- Para el mes de julio de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre, presenta el informe semanal de interventoría N°20 del 29/07/2024 al 04/08/2024, en el cual, se reporta un avance del 49.63% sobre el 56,80% programado, presentando una ejecución optima y de acuerdo al cronograma de obra. Por otra parte, se encuentra realizando la ejecución de las siguientes actividades:
 - Finalización de la instalación de la estructura de la cubierta del área polivalente e instalación de la paja sintética.
 - Cajas de inspección y registro de las redes hidráulicas y eléctricas.
 - Vigas áreas en concreto del área polivalente, edificio de servicios y edificio complementario.
 - Vaciado de las placas en concreto de los juegos infantiles, pista de trote y módulos de gym vital.

- Adquisición de los juegos infantiles IDRD de la infraestructura para la convivencia 1B.

- La supervisión del municipio de Coloso - Sucre, remite al Ministerio del interior el informe financiero de la cuenta del convenio donde se puede evidenciar la siguiente información:

Valor desembolsado: \$1.072.360.598,00
Rendimientos financieros: \$ 2.312.124,00
Rendimientos reintegrados: \$ 00,0
Rendimientos en la cuenta del convenio: \$ 2.312.124,00
Saldo actual: \$121.527.823,20


La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita respetuosamente a la administración municipal de Coloso – Sucre realizar una mesa de seguimiento virtual para la revisión de los informes financieros del convenio interadministrativo 1620 de 2023, toda vez que, se evidencian errores de diligenciamiento en los informes. Lo anterior en el acápite de rendimientos financieros y el saldo total en la cuenta del convenio, el cual no concuerda con el valor registrado en los extractos bancarios.

- Para el mes de julio de 2024, se lleva a cabo el trámite administrativo correspondiente al segundo desembolso del convenio según lo estipulado en la **“CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON** desembolsará los recursos al MUNICIPIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma: **2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor”.
- Que para el mes de julio de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre remite a la supervisión del Ministerio del Interior el informe mensual de supervisión, el informe mensual financiero, el extracto bancario de la cuenta y los informes semanales de interventoría.
- La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita a la administración municipal de Coloso – Sucre mejorar en los tiempos de envío de la información, además de diligenciar con mayor rigurosidad la información presentada en los anexos del informe de supervisión del convenio interadministrativo 1620 de 2023.
- Vale la pena mencionar que, para el mes de julio de 2024 no se autoriza el desplazamiento a los municipios para realizar visitas de seguimiento, verificación del porcentaje de ejecución de obra y validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el nexo de condiciones del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
------------	------------	------------	------------	------------	------------

8. SUPERVISOR

<div></div> <div>ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23</div> <div>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana</div>	<div></div> <div>ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión</div>
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1620 de 2023, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$2.383.023.552	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0,00	
	ADICION MIN-FONSECON	\$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$2.383.023.552	
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
PRORROGA No 1 (dos meses)	02/07/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL	18/09/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
		FECHA: DD/MM/AAAA	
		FECHA: DD/MM/AAAA	
		SUSPENSION 01	
		FECHA: DD/MM/AAAA	

 Libertad y Orden	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es	AMPLIACION SUSPENSION	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGUN ACTUACIÓN	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544	

(Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA
	1.CUMPLIMIENTO \$476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	\$ 2.418.653.183
VALOR AJUSTADO	\$ 1.980.147.317
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2023	\$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AAAA	\$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	\$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$436.887.652), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	\$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	\$476,604,710.40	14/07/2023	20/02/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		\$2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA	
	PRORROGA N°1	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha de terminación actual del contrato	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$2.144.708.697

Aseguradora:

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	-Cumplimiento	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

	Prestaciones sociales	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

➤ **Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CM – 004 – 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	\$238.238.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S	
Fecha de Acta de inicio del contrato		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1 REINICIO N°1 PRORROGA N°1	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha de terminación actual del contrato \$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$238.238.000

Aseguradora:

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	-Cumplimiento	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Prestaciones sociales	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2024	SI	N
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$	Corte 30/04/2024

 Libertad y Orden	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	56.8%
% EJECUTADO DE OBRA	49.63%
PERIODO: JULIO DE 2024 VIGENCIA: Hasta el 31/07/2024 JUSTIFICACION DEL AVANCE MUNICIPIO	
A corte de 31 de marzo el municipio de Colosó suscribió los contratos de obra e interventoría, los cuales se relacionan a continuación:	
CONTRATO DE OBRA:	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN
PÚBLICA NATURALEZA DEL CONTRATO	OBRA
PÚBLICA	
NO. DEL CONTRATO	LP – OP – 007 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	26-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ –
SUCRE NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREACIONAL
JA NIT /CC CONTRATISTA	NIT: 901766870-7
OBJETO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.144.708.697).
CDP	CDP N° 231741 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	1. UN PRIMER DESEMBOLSO, EQUIVALENTE AL 40% EN CALIDAD DE ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. B. APROBACIÓN DE PÓLIZA. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 20% CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 30% DE EJECUCION DE LA OBRA DEL 30% DE EJECUCION DE LA OBRA B. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE C, LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA

FORMATO
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL
MINISTERIO - FONSECON
ANEXO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS
NATURALEZA DEL CONTRATO	INTERVENTORIA
NO. DEL CONTRATO	CM – 004 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE
NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	INTERVINCO S.A.S
NIT /CC CONTRATISTA	NIT N° 90.013.868-0
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$238.238.000) IVA INCLUIDO.
CDP	CDP N° 231740 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

A este informe se realizó una prorroga amparado en la póliza No 540-47-994000026544 ANEXO 1, del 25 de junio de 2024 a la fecha se envio la documentación para el Segundo desembolso.

El avance fisico del Proyecto esta en un 49,63% , un avance de un 6% aproximadamente con respect al ultimo informe

Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describir lo siguiente:

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 20 correspondiente se realizó la ejecución de las siguientes actividades: Concreto f'c=3000 psi para Vigas Aereas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad; Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye la rejilla metálica según diseño; Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones; Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta para las siguientes semanas la ejecución de las actividades correspondientes a; Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final; Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros ,techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cubierta en lamina termoacustica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Caja de acceso a valvulas; Valvula de pie de 1 1/4"; Flotador de 1/2". Por otro lado, se encuentra finaliza la siguiente actividad, que corresponde a la semana presente: Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectará realizar las siguientes actividades: Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guardaescoba en baldosa grano de mármol vibroprensado L.=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectan las siguientes actividades: Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 20, no se encuentra ninguna actividad plasmada correspondiente

COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, se proyectan para las semanas siguientes estas actividades: Suministro e instalación de piso en caucho EPDM granulado, e= 2 cm. Incluye adhesivo, compactación, nivelación, variación de colores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE 8: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se ejecutaron las actividades que corresponden a: Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DIRECCIONAL. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DE ALERTA. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona Tipo M-121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Señal servicios 33X30 (SUM + INST); Señal tribunas 30X1,20 (SUM + INST); Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST); Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada.

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se necesitan proyectar las tareas que plasmaré a continuación: Poste metálico certificado de 4 mts; Luminaria de emergencia; Luminaria tipo tortuga; Luminaria Panel Led RD 12W/6500 K.

Se avala lo manifestado por Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la descripción detallada por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea. Es importante mencionar que, desde la semana anterior que corresponde a la número (19), se están ajustando las actividades a la nueva reprogramación aprobada con prórroga de tiempo incluida hasta el 30 de septiembre, con esto se presentará un desbalance hasta nivelarse en los porcentajes proyectados para cada semana. Para el informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 49,66% contra un ejecutado del 47,63%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, ademas se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

Una vez revisada por parte de la supervisión del ministerio se dará suscripción del acta y autorización de la etapa de obras.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

8. SUPERVISOR

<div></div> <div>SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA Supervisor Convenio No 1620 de 2023 Municipio de Coloso – Sucre</div>	
--	--

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO),SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
44985

FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

Julio - Julio 2024
Hasta: Julio 31
592819049
Superdía Especial 365
1838



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	164,388,217.20
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-42,894,174.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	33,780.00
Saldo Final:	121,527,823.20

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/06	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	G. Oficial Red 1	000000	33,780.00	164,421,997.20
08/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	G. Oficial Red 1	000000	-42,894,174.00	121,527,823.20
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

[illegible]



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Clase de tiempo	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	666
Temperatura	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	10
Temperatura	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	35

NOTA:
Se han presentado estratos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y comparados con el Estado Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representó un porcentaje por encima de lo normal y muy por encima de lo normal, manteniéndose un promedio entre 100% - 150% o incluso >150%. Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por los fenómenos.

SE INDICA CADA VEZ QUE SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR LAS QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

[illegible][illegible][illegible]

COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmada en el cronograma de actividades, no se tiene previsto realizar ninguna actividad.

COMPONENTE 2: Las actividades que corresponden a la semana 15 son las siguientes: Luminaria Led Hermética 20W/5500 K; Luminaria High Bay Led 120W/6000 K; Alimentador cable libre de halógenos 5W/12 p por tubería pvc de 2 1/4" para circuito de iluminación tomada.

Se encuentran en ejecución en las componentes 2, 3 y 6 las siguientes actividades: Puesta Se 3m de impermeabilización Integrante 1 a 2 cm. Incluye file y dilataciones; Suministro e instalación de Bordenil perforado 80x. Mod.02.80x20.80 cm. Incluye mortero de pega de 200 kg por 3 m cúbico con recabo canteo; Poner en gredon vital con tubería

perforada incorporada de 160mm de diámetro, apoyada en caga de arena de 5cm, ranla de 20cm de ancho y 50cm de alto, incluye Relleno de drenaje y preparación del terreno para la instalación de la estructura.

El presente informe al desarrollo de las actividades se encuentra detallado por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea.

Además, se muestran algunas evidencias acerca de las condiciones climáticas presentadas estas últimas semanas, escalando un retroceso considerable dentro de la semana y ejecución del proyecto. Al final, se muestra la disposición por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas. Para la informó de la semana anterior se constata con un análisis de la nueva programación del 42.5% contra un cronograma del 28.38%.

Desde la presente semana se está ejecutando actividades y lograr el avance requerido, además de recibir suministro de las actividades mencionadas anteriormente.

ORGANIZACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMAC

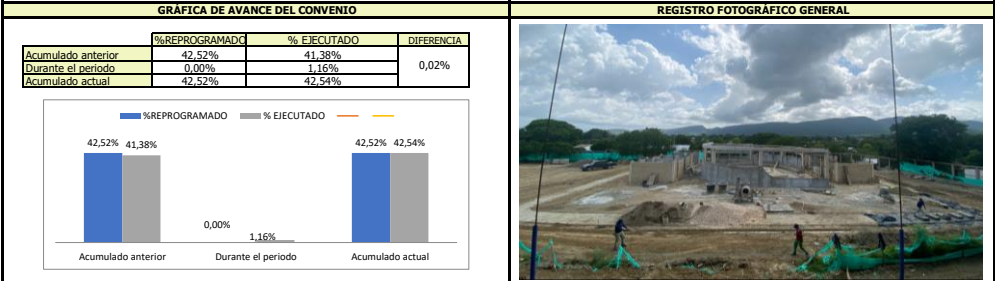
	_____ <i>Wendy D. O.</i>
--	--------------------------

	<p>INTERVENTOR</p> <p>Nombre: <u>JORGE LUIS PACHE ORTIGA</u></p> <p>CC: <u>98852627</u></p>
	<p>SUPERVISOR MUNICIPAL</p> <p>Nombre: <u>SHIRLEY E. QUINONEZ PETEROMA</u></p> <p>CC: <u></u></p>

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		14/07/2024

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Contrato No.	LP-OP-007-2023	
Objeto	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023	
Valor Inicial:		\$ 2.144.708.697,00
Valor Actualizado:		\$ 1.980.147.317,00
Plazo Inicial:		18/03/2024
Plazo Actualizado:		seis (06) meses
Fecha de Inicio:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	
Semana Número: 17 Del: 8/07/2024 Al: 14/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 118 días		
Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)		42,52%	
Valor de la Obra		\$ 841.958.639,19	
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)		42,54%	
Valor de la Obra		\$ 842.441.594,99	



AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO
ACERO PARA VIGAS AÉREAS



EDIFICIO COMPLEMENTARIO
ACERO PARA VIGAS AÉREAS



URBANISMO
EXCAVACIÓN PARA VIGA SARDINEL PARA LA CONTENCIÓN DE LA JARDINERA



	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		14/07/2024


CONTRATO DE OBRA	
Contratista: <u>CONSORCIO RECREACIONAL JA</u>	Objeto
Contrato No. <u>LP-OP- 007- 2023</u>	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial: <u>\$ 2.144.708.697,00</u>	
Valor Actualizado: <u>\$ 1.980.147.317,00</u>	
Plazo Inicial: <u>18/03/2024</u>	
Plazo Actualizado: <u>seis (06) meses</u>	
Fecha de Iniciación: <u>18/03/2024</u>	
Fecha de Vencimiento: <u>18/06/2024</u>	
Semana Número: <u>17</u> Del: <u>8/07/2024</u> Al: <u>14/07/2024</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>118</u> días	
Nombre del Supervisor <u>SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA</u>	

PISTA DE TROTE	
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO	
	
URBANISMO	
INSTALACIÓN DE BORDILLOS A-80	
	
INSTALACIÓN DE BORDILLOS A-80	
	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
CANALIZACIÓN TUBERÍA MALLA A TIERRA	
	
CANALIZACIÓN TUBERÍA MALLA A TIERRA	
	
OTRAS ZONAS	

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		21/07/2024

CONTRATO DE OBRA	
Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No. LP -OP- 007- 2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023
Valor Inicial: \$ 2.144.708.697,00	
Valor Actualizado: \$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial: 18/03/2024	
Plazo Actualizado: seis (06) meses	
Fecha de Inicio: 18/03/2024	
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024	
Semana Número: 18 Del: 15/07/2024 Al: 21/07/2024	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 125 días
Nombre del Supervisor	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA	
OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA SEMANAL
Obra programada (%) 0,00%	Obra Física Ejecutada (%) 1,21%
Valor de la Obra \$ -	Valor de la Obra \$ 23.959.782,54
ACUMULADO	ACUMULADO
42,52%	43,75%
\$ 841.958.639,19	\$ 866.401.377,53

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO																	
<table><tr><td></td><td>% REPROGRAMADO</td><td>% EJECUTADO</td><td>DIFERENCIA</td></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>42,52%</td><td>42,54%</td><td>1,23%</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>0,00%</td><td>1,21%</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>42,52%</td><td>43,75%</td><td></td></tr></table> 			% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	42,52%	42,54%	1,23%	Durante el periodo	0,00%	1,21%		Acumulado actual	42,52%	43,75%	
	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA														
Acumulado anterior	42,52%	42,54%	1,23%														
Durante el periodo	0,00%	1,21%															
Acumulado actual	42,52%	43,75%															


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	

ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO	
ENCOFRADO DE VIGAS AÉREAS	
	
ENCOFRADO DE VIGAS AÉREAS	
	
FUNDIDA DE VIGAS AÉREAS	
	
DESENCOFRADO DE VIGAS AÉREAS	
	

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FECHA	
	21/07/2024	

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B		
--	--	--


CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Contrato No:	LP-OP-007-2023	
Valor Inicial:	\$	2.144.708.697,00
Valor Actualizado:	\$	1.980.147.317,00
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	
Objeto		
"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023		
Semana Número: 18 Del: 15/07/2024 Al: 21/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 125 días		
Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA		

BOLETIN CLIMATOLOGICO		
		

FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS		
		

FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS		
		

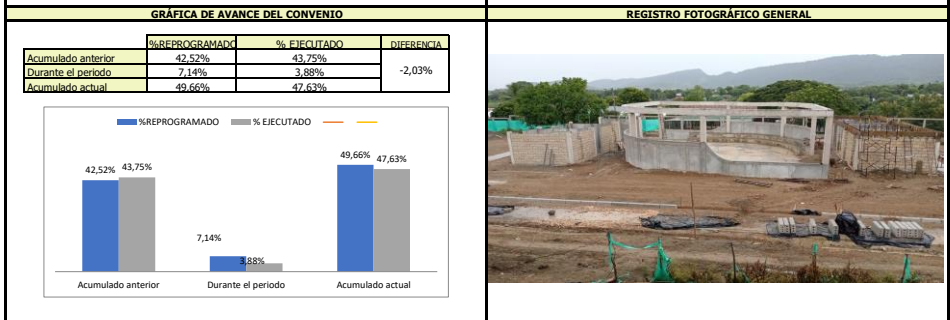
DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS		
COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 18 correspondiente se proyecta la ejecución de las siguientes actividades; Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.		
COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta la ejecución de las actividades correspondientes a; TUBERÍA COBRE TIPO L, con un DIÁMETRO DE 1/2"; TUBERIA PE-AL-PE 1/2" enterrada; Suministro e instalación de estación de cocina con mesón en acero inoxidable SAE 304, con lavaplatos, salpicadero superior de 15 cms en contorno de muros, entrepaños intermedio e inferior de 2,76 m. Mueble con estructura interna en perfil tubular cuadrado. Incluye anclajes y montaje, Dim 0,60 x 2,76 x 0.80 mt.		
COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 18 no corresponde realizar ninguna actividad.		
COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 18 no corresponde realizar ninguna actividad.		
COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 18, no se encuentra ninguna actividad plasmada correspondiente.		
COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, no corresponde la ejecución de ninguna actividad.		
COMPONENTE 8: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 18 no corresponde la ejecución de ninguna actividad.		
COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 18 no corresponde la ejecución de ninguna actividad.		
Se dio continuación a las siguientes actividades en los siguientes componentes 2, 4, y 8 las siguientes actividades: Concreto f'c=3000 psi para Vigas Aereas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm; Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0.35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recco común; Jardinería de duranta, 10 plantas por cada metro cuadrado. Incluye tierra negra e= 10 cm, elemento vegetal y plantación; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada;Cable de cobre #8 desnudo para sistema de puesta a tierra iluminación exterior; Canalización en 1 pvc Ø 1".		
Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la descripción detallada por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea. Además, se muestra la disposición por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas. Para el Informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 42,52% contra un ejecutado del 42,54%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, ademas se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.		

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR  Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 13001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre SHIRLEY E. QUIÑÓNEZ PATERNINA CC

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		28/07/2024

CONTRATO DE OBRA	
Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No. LP-OP-007-2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023
Valor Inicial: \$ 2.144.708.697,00	
Valor Actualizado: \$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial: 18/03/2024	
Plazo Actualizado: seis (06) meses	
Fecha de Iniciación: 18/03/2024	
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024	
Semana Número: 19 Del: 22/07/2024 Al: 28/07/2024	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 132 días
Nombre del Supervisor	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	7,14%	49,66%	
Valor de la Obra	\$ 141.382.518,43	\$ 983.341.157,62	
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	3,88%	47,63%	
Valor de la Obra	\$ 76.829.715,90	\$ 943.231.093,43	



	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	
	FECHA 28/07/2024	

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Contrato No.	IP -OP- 007- 2023	
Objeto	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº IP-OP-007-2023	
Valor Inicial:	\$	2.144.708.697,00
Valor Actualizado:	\$	1.980.147.317,00
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	sóls (05) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	
Semana Número:	19	Del: 22/07/2024, Al: 28/07/2024, Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 132 días
Nombre del Supervisor	SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA	

URBANISMO

EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE VIGA SARDINEL PARA LA CONTENCIÓN DE LA JARDINERA



URBANISMO

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM; INSTALACIÓN DE BORDILLOS JUEGOS INFANTILES



URBANISMO

DEMARCACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES; INSTALACIÓN DE BORDILLOS ZONA DE JUEGOS



URBANISMO

LOSETA PODOCTÁCTIL EN CONCRETO PREFABRICADO - DIRECCIONAL Y DE ALERTA



LOSETA PODOCTÁCTIL EN CONCRETO PREFABRICADO - DIRECCIONAL Y DE ALERTA



OTRAS ZONAS																																	
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	22	22	20	23	24	24	24	23	24	22	24	24	24	24	24	21	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	701
Lluvias moderadas	2	2		1				1		2							2	2														12	
Lluvias intensas			4													3																7	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 120% - 160% o incluso >160%. Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:
EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DONDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		28/07/2024

CONTRATO DE OBRA	
Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No. LP-OP-007-2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023
Valor Inicial: \$ 2.144.708.697,00	
Valor Actualizado: \$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial: 18/03/2024	
Plazo Actualizado: seis (06) meses	
Fecha de Inicio: 18/03/2024	
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024	
Semana Número: 19 Del: 22/07/2024 Al: 28/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 132 días	
Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA	

BOLETIN CLIMATOLÓGICO



FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS	
	


DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS	
COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 19 correspondiente se realizó la ejecución de las siguientes actividades: Concreto f'c=3000 psi para Vigas Aereas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye la rejilla metálica según diseño; Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones; Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de conexión, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.	
COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta la ejecución de las actividades correspondientes a; Piso en baldosa de grano de mármol vibropresado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Estuco Acrílico monocompente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cubierta en lamina termoacustica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Y se ejecutaron las siguientes actividades: Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones; Caja de acceso a válvulas; Válvula de pie de 1 1/4"; Flotador de 1/2".	
COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 19 se proyectará realizar las siguientes actividades: Piso en baldosa de grano de mármol vibropresado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guardaesoba en baldosa grano de mármol vibropresado L=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega.	
COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 19 se proyectan las siguientes actividades: Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med. 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.).	
COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 19, no se encuentra ninguna actividad plasmada correspondiente.	
COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, se proyectan para las semanas siguientes estas actividades: Suministro e instalación de piso en caucho EPDM granulado, e= 2 cm. Incluye adhesivo, compactación, nivelación, variación de colores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento..	
COMPONENTE 8: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 19 se ejecutaron las actividades que corresponden a: Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DIRECCIONAL. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DE ALERTA. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Y se proyectan las siguientes: Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona Tipo M-121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Señal servicios 33X30 (SUM + INST); Señal tribunas 30X1,20 (SUM + INST); Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST). Las tuberías de manejo de agua se encuentran instaladas: Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada.	
COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 19 se necesitan proyectar las tareas que plasmaré a continuación: Poste metálico certificado de 4 mts; Luminaria de emergencia; Luminaria tipo tortuga; Luminaria Panel Led RD 12W/6500 K.	
Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la descripción detallada por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea. Es importante mencionar que, desde esta semana que corresponde a la número (19), se ajustarán las actividades a la nueva reprogramación aprobada con prórroga de tiempo incluida hasta el 30 de septiembre, con esto se presentará un desbalance hasta nivelarse en los porcentajes proyectados para cada semana hasta finalizar el proyecto. Para el informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 42,52% contra un ejecutado del 43,75%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, además se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.	
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre: JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC: [Firma]
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre: SHIRLEY E. QUIÑÓNEZ PATERNINA CC: [Firma]

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		4/08/2024

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP-OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	\$ 2.144.708.697,00	
Valor Actualizado:	\$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	
Semana Número:	20	Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 139 días
Nombre del Supervisor	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA	

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	7,14%		56,80%
Valor de la Obra	\$ 141.382.518,43		\$ 1.124.723.676,06
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	2,00%		49,63%
Valor de la Obra	\$ 39.602.946,34		\$ 982.834.039,77

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	49,66%	47,63%	
Durante el periodo	7,14%	2,00%	-7,17%
Acumulado actual	56,80%	49,63%	





	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		4/08/2024

CONTRATO DE OBRA	
Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No. LP -OP- 007- 2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial: \$ 2.144.708.697,00	
Valor Actualizado: \$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial: 18/03/2024	
Plazo Actualizado: seis (06) meses	
Fecha de Iniciación: 18/03/2024	
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024	
Semana Número: 20 Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 139 días	
Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA	



OTRAS ZONAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	21	21	24	24	22	24	24	24	24	24	24	21	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	705
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas						3	3																									6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 120% - 160% o incluso >160%. Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.



	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		4/08/2024

CONTRATO DE OBRA		
Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA Contrato No. LP -OP- 007- 2023 Valor Inicial: \$ 2.144.708.697,00 Valor Actualizado: \$ 1.980.147.317,00 Plazo Inicial: 18/03/2024 Plazo Actualizado: seis (06) meses Fecha de Iniciación: 18/03/2024 Fecha de Vencimiento: 18/06/2024	Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023	
Semana Número: 20 Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 139 días Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑÓNEZ PATERNINA		

DESCRIPCIÓN OBRAS EJECUTADAS
COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 20 correspondiente se realizó la ejecución de las siguientes actividades: Concreto f'c=3000 psi para Vigas Aereas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye la rejilla metálica según diseño; Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones; Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.
COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta para las siguientes semanas la ejecución de las actividades correspondientes a; Piso en baldosa de grano de mármol vibropresado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Estuco Acrílico monocompente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final; Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros, techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cubierta en lamina termoacustica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Caja de acceso a valvulas; Valvula de pie de 1 1/4"; Flotador de 1/2". Por otro lado, se encuentra finaliza la siguiente actividad, que corresponde a la semana presente: Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones.
COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectará realizar las siguientes actividades: Piso en baldosa de grano de mármol vibropresado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guardaesoba en baldosa grano de mármol vibropresado L=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega.
COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se proyectan las siguientes actividades: Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigera con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.
COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 20, no se encuentra ninguna actividad plasmada correspondiente.
COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, se proyectan para las semanas siguientes estas actividades: Suministro e instalación de piso en caucho EPDM granulado, e= 2 cm. Incluye adhesivo, compactación, nivelación, variación de colores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento.
COMPONENTE 8: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se ejecutaron las actividades que corresponden a: Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DIRECCIONAL. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Loseta podotactil en concreto prefabricado de 20 x 20 cm - DE ALERTA. Acabados según NTC 5610. Incluye limpieza, alistamiento de superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona Tipo M-121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Señal servicios 33X30 (SUM + INST); Señal tribunas 30X1,20 (SUM + INST); Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST); Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada.
COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 20 se necesitan proyectar las tareas que plasmaré a continuación: Poste metálico certificado de 4 mts; Luminaria de emergencia; Luminaria tipo tortuga; Luminaria Panel Led RD 12W/6500 K.
Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la descripción detallada por cada componente del proyecto, acompañado por el registro fotográfico de cada tarea. Es importante mencionar que, desde la semana anterior que corresponde a la número (19), se están ajustando las actividades a la nueva reprogramación aprobada con prórroga de tiempo incluida hasta el 30 de septiembre, con esto se presentará un desbalance hasta nivelarse en los porcentajes proyectados para cada semana. Para el informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 49,66% contra un ejecutado del 47,63%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, además se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre <u>JORGE LUIS PUCHE ORTEGA</u> CC <u>11001627</u> SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre <u>SHIRLEY E. QUIÑÓNEZ PATERNINA</u> CC

RV: POLIZA CONV1620-23 COLOSO_SUCRE

Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Jue 11/07/2024 15:44

Para:gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

CC:Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

 2 archivos adjuntos (1004 KB)

CONTANCIA CARGUE POLIZA CONV1620-23.pdf; 2. POLIZA PRIMERA PRÓRROGA 1620-2023 COLOSO.pdf;

Buenas tardes,

Por medio del presente correo se solicita respetuosamente conocer el estado de revisión de la póliza del convenio interadministrativo 1620 de 2023 respecto a la primera prórroga del convenio de la referencia, toda vez que, se adelanta en simultaneo el proceso del segundo desembolso y no se puede finalizar el flujograma del mismo sin la revision y aprobacion de la garantía.

Sin otro particular, quedo atento a su respuesta.



De: Daniel Felipe Suarez Estrada

Enviado: viernes, 5 de julio de 2024 17:02

Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Asunto: POLIZA CONV1620-23 COLOSO_SUCRE

Buenas tardes,

Por medio del presente correo adjunto la póliza actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023 correspondiente al municipio de Coloso - Sucre respecto a la primera prórroga del mismo.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios.



Apoyo a la Supervisión

ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA

daniel.suarez@mininterior.gov.co

Cel: 3217831526.

Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia

www.mininterior.gov.co



MEMORANDO

Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Asunto: Remisión documentación Segundo desembolso al Convenio 1620 de 2023 con el Municipio de COLOSO – SUCRE.

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente envió la documentación relacionada para el Segundo desembolso del convenio en mención:

1. Cuenta de Cobro Segundo desembolso.
2. Cedula del alcalde
3. Acta de posesión
4. RUT de la entidad
5. Reporte de antecedentes (Contraloría, procuraduría, policía nacional, medidas correctivas, Redam).
6. Certificación bancaria actualizada
7. Certificación de Parafiscales.
8. Certificado por parte del supervisor del municipio.
9. Acta parcial de obra
10. Informe de Interventoría
11. Aprobación de póliza del convenio 1620 de 2023.

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio

Elaboró: Daniel Suarez E /Apoyo al Supervisor

Revisó: Nicolas Gonzales / Apoyo Área Financiero

ENVIO DOCUMENTOS MES DE JUNIO INFORMES SEMNALES DE INTERVENTORIA, FINANCIERO Y SUPERVISION- EXTRACTOS BANCARIOS

Planeacion coloso-sucres.gov.co <planeacion@coloso-sucres.gov.co>

Jue 18/07/2024 14:22

Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

 8 archivos adjuntos (9 MB)

SEMANA 14.pdf; SEMANA 12.pdf; SEMANA 11.pdf; SEMANA 13.pdf; INFORMES SEMANALES. 15.pdf; informe financiero junio
sacudete.pdf; INFORME MENSUAL DE SUPERVISION CONVENIO 1620 COLOSO-SUCRE JUNIO 2024.pdf; EXTRACTOS BANCARIOS MES DE
ABRIL Y MAYO CONVENIO MIN INTERIO.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA

Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente

Ingeniera Civil

Móvil: 3003888060

Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.

Teléfono: (5) 2499873 - 2499052

Código Postal 707030

CONSTANCIA DEL CARGUE DE LA POLIZA AJUSTADA DE LA PRORROGA DEL CONVENIO 1620-2023 MUNICIPIO COLOSO - SUCRE

Planeacion coloso-sucres.gov.co <planeacion@coloso-sucres.gov.co>

Mar 30/07/2024 15:33

Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

 1 archivos adjuntos (354 KB)

constancia de envio y publicacion.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA

Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente

Ingeniera Civil

Móvil: 3003888060

Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.

Teléfono: (5) 2499873 - 2499052

Código Postal 707030



Alcaldía de
Coloso

Secretaría de Planeación, Infraestructura
y Medio Ambiente
NIT. 892280053-7



**CONTRATO MODIFICATORIO No 01 - PRORROGA NO. 001, AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CM - 004 - 2023, SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE COLOSO - INTERVINCO S.A.S**


OBJETO	:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
CONTRATISTA	:	INTERVINCO S.A.S NIT N° 901.013.868-0 R.L. JORGE LUS PUCHE ORTEGA C.C N° 11.001.627
VALOR	:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$238.238.000) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No 01	:	DOS (02) MESES

Entre los suscritos a saber **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el Municipio de Coloso (Sucre), identificado con cédula de ciudadanía N° 92601345 expedida en Coloso - Sucre, obrando en su calidad de Alcalde Municipal, y por tanto representante legal del mismo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **INTERVINCO S.A.S** identificado con el NIT N° 901.013.868-0, representado legalmente por **JORGE LUS PUCHE ORTEGA**, identificado con la C.C N° 11.001.627, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO MODIFICATORIO NO 01 - PRORROGA NO. 01**, al **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CM - 004 - 2023**, celebrado entre las partes en fecha 04 de agosto de 2023, contenida en las cláusulas dispositivas que se expresan a continuación; previo lo siguiente: **CONSIDERACIONES:** 1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la Función Administrativa se desarrolla con fundamento en los principios generales de la actividad contractual y el Estatuto General de Contratación Pública - Ley 80 de 1993, por lo que los contratos que celebre **EL MUNICIPIO** como entidad estatal, están sometidos a dicho Estatuto y demás normas que lo reglamenten o complementen. 2. Que de conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 y especialmente el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Planeación e Infraestructura efectuó, el estudio del análisis del sector, los estudios previos correspondientes que justifican la necesidad, oportunidad y conveniencia y el proyecto de pliego para celebrar el presente contrato. 3. Que cumplidas las etapas del proceso, esto es, las respuestas a las observaciones, la apertura del proceso, publicación de los pliegos definitivos, la evaluación y traslado de la misma se adjudicó el proceso de CM



Nº 004 - 2023 a **INTERVINCO S.A.S**, mediante resolución Nº 1299 del seis (06) de octubre de 2023. **4.** Que como quiera se suscribió contrato de prórroga No. 001 para el contrato de obra No. **LP - OP - 007 - 2023**, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría con el fin de hacer el acompañamiento, verificar, controlar y aprobar las actividades restantes del contrato de obra pública objeto de la presente interventoría. **5.** Que el contratista de interventoría mediante oficio de fecha 28 de junio de 2024, aprobó la prórroga solicitada por el contratista de obra y presento renuncia del pago por mayor permanencia de obra, por lo que las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA. PRORROGAR.** Prorrogar el CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CM - 004 - 2023, por el termino de DOS (02) MESES, de acuerdo con la parte motiva del presente documento; contados a partir de la fecha de terminación del plazo inicial. **CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** El presente modificadorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere **(i)** la modificación y aprobación de las garantías exigidas en el CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CM - 004 - 2023. **(ii)** la acreditación de estar al día con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. **PARAGRAFO:** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del modificadorio, la entidad deberá aprobar las garantías allegadas por el contratista de acuerdo con la modificación realizada. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS CALUSULAS NO MODIFICADAS.** Las demás clausulas y estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CM - 004 - 2023 y sus anexos continúan vigentes, en lo que no resulten contrarias al presente Contrato modificadorio, haciendo parte integral de este, el presente documento que hoy se firma entre las partes, estando a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), en DOS (2) originales, con destino a cada uno de los intervinientes.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
FIRMA 	FIRMA 
Nombre: DAGER MANRIQUE PATERNINA A Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Nombre: INTERVINCO S.A.S NIT Nº 901.013.868-0 R.L. JORGE LUS PUCHE ORTEGA C.C Nº 11.001.627 CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	YENNESSY ARROYO CASTRO	Asesor Externo	
REVISÓ Y APROBO	SHIRLEY ESTER QUIÑOÑEZ PATERNINA	Secretaría de planeación	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Alcaldía de
Coloso

Secretaría de Planeación, Infra
y Medio Ambiente
NIT. 892280053-7

**CONTRATO MODIFICATORIO NO 01 - PRORROGA NO. 001, AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP - OP - 007 - 2023, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE COLOSO - CONSORCIO RECREACIONAL JA**

OBJETO	: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE."
CONTRATANTE	: MUNICIPIO DE COLOSO
CONTRATISTA	: CONSORCIO RECREACIONAL JA NIT: 901766870-7 R.L. JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES C.C N° 19.752.494
VALOR	: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.144.708.697).
PLAZO INICIAL	: OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No 01	: DOS (02) MESES
ACTA DE INICIO	: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el Municipio de Coloso (Sucre), identificado con cédula de ciudadanía N° 92601345 expedida en Coloso - Sucre, obrando en su calidad de Alcalde Municipal, y por tanto representante legal del mismo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **CONSORCIO RECREACIONAL JA**, identificado con el NIT: 901766870-7, representado por **JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES**, identificado con la C.C N° 19.752.494, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO MODIFICATORIO NO 01 - PRORROGA NO. 001, al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP - OP - 007 - 2023**, celebrado entre las partes en fecha 26 de octubre del 2023, contenida en las cláusulas dispositivas que se expresan a continuación; previo lo siguiente: **CONSIDERACIONES:** 1. Que la ENTIDAD CONTRATANTE inicio proceso contractual y es así como, mediante Resolución No. 1176 13 de septiembre de 2023, se ordenó la apertura del proceso de Licitación pública No. LP - OP - 007 - 2023, cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, SUCRE"**. 2. Que teniendo en cuenta la cuantía del proceso se siguió el procedimiento de Licitación pública descrito en el Numeral 1o, artículo 2o de la Ley 1150 de 2007. 3. Que, una vez evaluada la propuesta por el comité de adjudicaciones de la Entidad, mediante audiencia de adjudicación se recomienda adjudicar del proceso de licitación pública No. LP - OP - 007 - 2023, al proponente **CONSORCIO RECREACIONAL JA**, por estimar que es la propuesta más favorable para la Entidad y a los fines que busca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el pliego de condiciones. 4. Que el Ordenador del Gasto mediante acto administrativo No. 1319 (11 de octubre de 2023) adjudicó proceso de licitación pública No. LP - OP - 007 - 2023, al proponente **CONSORCIO RECREACIONAL JA**. 5. Que la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para atender las obligaciones que emanaron del contrato, a

Calle 13 # 4-62 - Plaza Principal - Coloso (Sucre)

E-mail: atencion@coloso-sucre.gov.co

Código Postal 707030



www.coloso-sucre.gov.co

través del Certificado Presupuestal 231741 del 08 de septiembre de 2023, expedido por el responsable del presupuesto. 6. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2024, solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la primera prórroga al convenio objeto del proyecto que desarrolla el contrato de obra en mencion, teniendo en cuenta que: "(...) 1. Que el 08 de marzo de 2024, se realizó la entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, representando un retraso de 2 meses de ejecución por situaciones ajenas al contratista. 2. Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones específicas requeridas para iniciar actividades de obra. 3. Que, durante el segundo trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM). ... 4. Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio como a la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones, ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores. 5. Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra. 6. Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023, se encuentra en un 34,65% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°11. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior. 7. El estado actual del proyecto, ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el primer trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar. 8. El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física para finales del mes de septiembre de 2024. 9. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto



contractual de acuerdo a las situaciones presentadas durante la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto. El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso - Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso - sucre. Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prórroga o ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA. La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, lo cual tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hasta el 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 11 de interventoría, el cual, reporta un avance del 34.65 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas. Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso - Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación del mismo por un término de 4 meses, es decir, hasta el 18 de octubre de 2024. Tiempo necesario para realizar el recibo de la obra para el mes de septiembre de 2024 y realizar entrega a la supervisión del Ministerio del Interior para el mes de octubre de la presente vigencia. (...)" 7. Que en virtud de lo anterior se suscribió PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01., en el cual se Prorroga el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023, hasta el 18 de octubre de 2024. 8. Que la interventoría contratada para el proyecto, mediante oficio de fecha 28 de junio de 2024, avalo la solicitud de prórroga y presento renuncia del pago por mayor permanencia de obra. 10. Que mediante oficio de fecha 18 de junio de 2024, la supervisora del contrato asignada por parte del municipio - secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente, solicito la prórroga N°1 del Contrato LP - OP - 007 - 2023 cuyo objeto es "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"; y al Contrato CM - 004 - 2023 de objeto " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA



CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", que en consecuencia, y buscando ajustar el contrato de obra, es necesario prorrogar el contrato, las cuales comparte las partes y en razón a ello, acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA. PRORROGA. Prorrogar por el término de **DOS (02) MESES**, el plazo del contrato de obra No. LP - OP - 007 - 2023, contados a partir de la terminación del plazo inicial.

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La presente prorroga se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere (i) la modificación y aprobación de las garantías exigidas en el contrato de obra LP - OP - 007 - 2023. (ii) la acreditación de estar al día con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

PARAGRAFO: dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del adicional, el CONTRATISTA se compromete a modificar, presentar y obtener del MUNICIPIO, la aprobación de las garantías que amparan el contrato, extendiendo su vigencia ya aumentando el valor asegurado conforme a la modificación introducida a través del presente otrosí.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS CALUSULAS NO MODIFICADAS. Las demás cláusulas y estipulaciones contenidas en obra pública No. LP - OP - 007 - 2023 y sus anexos continúan vigentes, en lo que no resulten contrarias al presente Contrato de adición, haciendo parte integral de este, el presente documento que hoy se firma entre las partes, estando a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), en DOS (2) originales, con destino a cada uno de los intervinientes.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
Nombre: DAGER MANRIQUE PATERNINA A. Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Nombre: CONSORCIO RECREACIONAL JA NIT: 901766870-7 R.L. JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES C.C N° 19.752.494 CARGO: CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	YENNESSY ARROYO CASTRO	Asesor Externo	
REVISO Y APROBO	SHIRLEY ESTER QUIÑOÑEZ PATERNINA	Secretaria de planeación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01.

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **YAMEL RUIZ ORJUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir de la misma fecha, quien actúa en representación de la **NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, con **NIT 830.114.475-6**, facultado para contratar según las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 2021, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 92.601.345; en calidad de Alcalde, actuando en representación del municipio de **COLOSÓ – SUCRE**, en adelante **EL MUNICIPIO**, con NIT 892.280.053-7; posesionado el 29 de diciembre de 2023 en la Notaria Única del Circulo de Colosó (Sucre), y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante **LAS PARTES**). **LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la primera prórroga del Convenio 1620 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el 28 de junio de 2023, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO**, suscribieron el Convenio No. 1620 de 2023, por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.383.023.552)**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."** El cual, inició el 19 de julio de 2023.

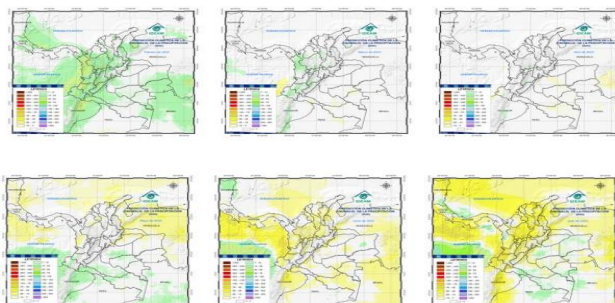
2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 18 de junio de 2024.

3- Que **EL MUNICIPIO**, mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la primera prórroga al convenio teniendo en cuenta que:

"(...) 1. Que el 08 de marzo de 2024, se realizó la entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, representando un retraso de 2 meses de ejecución por situaciones ajenas al contratista.

2. Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones específicas requeridas para iniciar actividades de obra.

3. Que, durante el segundo trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM).



PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01.

4. Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio como a la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones, ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores.
5. Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra.
6. Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023, se encuentra en un 34,65% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°11. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior.
7. El estado actual del proyecto, ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el primer trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar.
8. El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física para finales del mes de septiembre de 2024.
9. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas durante la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto

El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso – Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso – sucre.

Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prórroga o ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA.

La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, lo cual tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hasta el 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 11 de interventoría, el cual, reporta un avance del 34.65 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas.

PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01.

Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación del mismo por un término de 4 meses, es decir, hasta el 18 de octubre de 2024. Tiempo necesario para realizar el recibo de la obra para el mes de septiembre de 2024 y realizar entrega a la supervisión del Ministerio del Interior para el mes de octubre de la presente vigencia. (...)

4.- Que mediante memorando **No. 2024-3-003122-018747 Id: 347085** del 11 de junio de 2024, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la primera prórroga, teniendo en cuenta que:

“(…) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra del 34,65% según informe de interventoría N°11, en mi calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023, y de acuerdo con los informes y validaciones de la supervisión del municipio e interventoría de obra, considero técnicamente viable la prórroga del convenio. Los motivos expuestos por la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 07 de junio del 2024, son considerados procedentes y proporcionales al tiempo de prórroga solicitado Las razones presentadas que han afectado las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023 incluyen:

- 1. Condiciones Climáticas: Factores meteorológicos adversos que han dificultado el progreso de la obra.*
- 2. Mal Estado de la Vía – Acceso Principal: La deteriorada condición de la vía principal ha obstaculizado el transporte y la logística.*
- 3. Disponibilidad de Materiales: Problemas en la cadena de suministro han retrasado la llegada de materiales necesarios para la construcción.*

Para finalizar la obra, según el cronograma aportado por la administración municipal, se requiere completar los siguientes procesos:

- I) Ejecución de obra. (2.5 meses aprox.)*
- II) Recibo y aprobación de la obra por parte de la interventoría. (0.5 meses aprox.)*
- III) Recibo y aprobación de la obra por parte del municipio. (0.5 meses aprox.)*
- IV) Entrega y recibo de obra Ministerio de Interior. (0.5 meses aprox.)*

En vista de lo anterior, se solicita ampliar el término del convenio hasta el 18 de octubre de 2024. Este plazo adicional permitirá completar la obra al 100% y garantizar la entrega con todos sus servicios públicos definitivos, asegurando el cumplimiento cabal del objeto contractual.

Razón por la cual, se solicita ampliar el término del mismo para la finalización de la obra, cumpliendo así a cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Visto que, prima para las partes la terminación del convenio preponderando el garantizar la pronta entrega de la obra y el disfrute de la comunidad. En ese orden de ideas, el plazo estimado y solicitado por parte del municipio como ente ejecutor para la finalización de la obra es del 18 de octubre de 2024. Es un plazo adecuado y necesario para garantizar la funcionalidad y entrega del proyecto con todos sus servicios públicos definitivos para el feliz término del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023. (...)

5.- Que con fundamento en la obligación número veintisiete de la Cláusula segunda del Convenio, **EL MUNICIPIO** presentó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** solicitud de primera prórroga del convenio 1620 de 2023.

6.- Que según informe de interventoría No. 11, con corte al 02 de junio de 2024, la obra presenta un avance del 34.65%.

PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01.

7.- Que en virtud de que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por **EL MUNICIPIO**, y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se suscribe la primera prórroga siendo las causas señaladas por el supervisor del convenio por parte de **EL MINISTERIO** relacionadas con la conveniencia de realizar esta , que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023, hasta el 18 de octubre de 2024, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

*“**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 18 de octubre de 2024.”*

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral de la presente modificación electrónica, el presente anexo de condiciones, la solicitud presentada por el Supervisor del Convenio identificada con el radicado No. 2024-3-003122-018747 Id: 347085 del 11 de junio de 2024, y los documentos soporte aportados con la solicitud.

CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA ÚNICA. **EL MUNICIPIO** deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula octava del mismo.

CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente para el efecto.

Aprobó: Dr. Pedro Jovanny Tenjo Sánchez – Subdirector De Gestión Contractual (E)
Proyectó: Jorge Luis Corrales Ordosgoitia – Abogado Contratista S.G.C. J.L.C.O.



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401608632

PÓLIZA No: 540-47-994000026544

ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

DIA MES AÑO
25 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
25 06 2024
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **MUNICIPIO DE COLOSO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **892.280.053-7**

DIRECCIÓN: **CALLE 13 N° 4 - 62 PLAZA PRINCIPAL**

CIUDAD: **COLOSÓ, SUCRE**

TELÉFONO: **6052949937**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

14/07/2023

18/05/2025

476,604,710.40

BENEFICIARIOS

NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1620 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE.

TEXTO ACLARATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN PRIMERA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01. PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***476,604,710.40	VALOR PRIMA: \$ *****1,286,732	GASTOS EXPEDICION: \$*****5,000.00	IVA: \$ *****245,429	TOTAL A PAGAR: \$ *****1,537,161
---	--	--	--------------------------------	--

NOMBRE INTERMEDIARIO SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES	CLAVE 8852	%PART 100.00	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO 	%PART 	VALOR ASEGURADO
--	----------------------	------------------------	---	------------------	----------------------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDBC20790807FE7F58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

