

Colegio GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) – EL TOLDO

Actividades realizadas

1. Instalación de piso en hall y pasillo.
2. Inicio de pintura en hall frente a comedor.
3. Demolición de lavadero en parte posterior.

Actividades por realizar

1. Instalación de piso en vivienda docente.
2. Construcción de nuevo lavadero.
3. Instalación de nueva cubierta en vivienda docente.



FECHAS

Inicio: 27/05/2024
Fin: 29/08/2024

AVANCE

PROYECTADO: 29%
EJECUTADO: 11%

VALOR FRENTE

\$ 337.709.778,00

VALOR PAGADO

\$ 0,00

Colegio GINNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) – ERASMO VALENCIA

Actividades realizadas

1. Instalación de pisos de salones
2. Instalación de material granular, polietileno y malla electrosoldada en pasillos.
3. Emboquillado de duro piso en salones.

Actividades por realizar

1. Fundición de cimentación de cocina.
2. Fundición de placa de contrapiso en comedor y pasillos.
3. Instalación de pisos en comedor y pasillo.

FECHAS

Inicio: 06/06/2024 PROYECTADO: 21%
Fin: 29/08/2024 EJECUTADO: 9%

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR



VALOR FRENTE VALOR PAGADO

\$ 799.914.269,00

\$ 0,00

SEDES CON OBSERVACIONES

Colegio
FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)

1. Reparación de gotera en el comedor.
2. Bombas eyectoras. En subsanación

Colegio
USMINIA (IED)

1. Tapa filos en espejos baños.
2. Arreglo de soldadura y nivel en canal.
3. Atención de fuga de agua en baños.
4. Flanches de cubierta.

SEDES CON OBSERVACIONES

Colegio
DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED) SEDE A

1. Instalación de gárgolas en terrazas.

Colegio
CHUNIZA (IED)

1. Ajuste de rejillas del carcamo.

Observaciones

1. Recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas. **Falta una sección al lado del baño.**

SEDES CON OBSERVACIONES

Colegio DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED) SEDE B

Bloque administración

1. Instalación vidrios de las persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo.

Generales

1. Aplicación de pintura en las puertas de los salones.
2. Malla encima de las canales instaladas.
3. Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas.
4. Ajuste de pintura en canal.

FRENTES DE OBRA EMERGENCIAS

EMERGENCIAS POR TERMINAR



Colegio

**GINNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ
VARELA SEDE CAPITOLIO**

Faltantes

1. Durante la inspección se definió que era necesario intervención en toda la tubería sanitaria y posiblemente el pozo séptico

Colegio

**GINNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ
VARELA SEDE SAN JUAN**

Faltantes

1. Instalación de manto de impermeabilización.
2. Instalación de vidrios.

Colegio

CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) – NAZARETH

Faltantes

1. Pintura de media caña

Colegio

**GINNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ
VARELA (IED) – TUNAL ALTO**

Faltantes


1. Pintura de media caña.

GRACIAS

OBJETO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS* – GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	
NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	CONSORCIO CLARIDAD	ASESORA SST	 Yoneth Arevala Profesional SST C.C. 52.834.633 RS-3395
LEIDI COSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	CONSORCIO CLARIDAD	TECNICA SST	
LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	CONSORCIO CLARIDAD	TECNICA SST	Leidy Constanza Bejarano R. 
BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	CB INGENIEROS S.A.S	ASESORA SST	
CINDY MILENA DUARTE VELANDIA	CB INGENIEROS S.A.S	APOYO SST	

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

TEMAS TRATADOS

Martes 04 de junio de 2024, a las 4:30 p.m., se dio inicio a la mesa de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de socializar las observaciones e incumplimientos del área de Seguridad y Salud en el trabajo que se han presentado en varias sedes.

Interventoría, solicita al contratista remitir el certificado de las 50 horas de Leidy Bejarano, el contratista informa que lo remitirá el día martes 11 de junio de 2024.

La interventoría manifiesta que la documentación de ingreso del personal cuenta con un orden y debe ser verificada por las inspecciones SST del contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD, debido a que han allegado a la interventoría varios documentos, con inconsistencias, entre ellos, exámenes médicos, afiliaciones de la ARL.

La interventoría informa que no se ha evidenciado inspecciones de Seguridad y salud en el trabajo en algunas sedes, debido a que se han presentado bastantes observaciones con el personal falta, de elementos de protección personal, personal realizando trabajo en alturas sin contar con el permiso de trabajo, el contratista informa que realizará un cronograma con el fin de dar cumplimiento y gestionar el transporte de las inspecciones de SST en cada una de las sedes, con el fin dar cumplimiento a estas observaciones.

Referente al tema de dotación y elementos de protección personal, la interventoría manifiesta que se ha visto personal sin contar con la dotación ni elementos de protección personal en las inspecciones que se realizan, el contratista informa que mañana realizará entrega de epps y dotación al personal que ha tenido este tipo de observaciones.

La interventoría manifiesta inconformidad referente a los baños que se encuentran en las sedes, no se evidencian los baños para uso del personal en buenas condiciones higiénicas, en cuanto a la batería sanitaria que se encuentra en la sede DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B, las actividades constructivas ya finalizaron y no han realizado el retiro de este baño portátil.

En cuanto a puntos de hidratación no se evidencia estos puntos en varias sedes donde se tiene personal en obra, el contratista informa que durante la semana se va gestionar el tema con el fin de darle solución a esta observación.

Interventoría informa que en cuanto la señalización visual se está dando cumplimiento en las sedes, pero se debe instalar señalización que la fluya no deteriore, debido a la señalización que en algunas ocasiones se instala presentan daños, adicional realizar los respectivos mantenimientos a los cercamientos de obra que presentan deterioro.

Interventoría informa que los puntos ecológicos no se han evidenciado en varias sedes, no se ha dado cumplimiento en el transcurso del ejecución del contrato, se solicita gestionar jornadas de orden y aseo en todos los frentes d

La interventoría informa que el material debe mantenerse cubierto, protegido y señalizado, debido a que se han remitido observaciones de este tipo pero no se ha dado un cumplimiento.

Remitir documentos de las volquetas y maquinaria que sea implementada en cada una de las sedes.

Interventoría solicita actualizar el perfil sociodemográfico con el personal que no ha diligenciado la encuesta.

Interventoría solicita dar cumplimiento con las inducciones del personal que sea vinculado al proyecto, de igual forma la cartelera SST en cada una de las sedes.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Observaciones y temas tratados durante la mesa de trabajo	INMEDIATO	CONTRATISTA DE OBRA - CONSORCIO CLARID

Próxima reunión:

NO APLICA



BOGOTÁ

ACTA DE VISITA



Version: 01

Fecha: 23/03/2023

Código: 000-SOP-AC-01

Fecha	11-06-24	Inicio	11:00 am	Fin		Localidad:	Sumatez
IED/Sede	Col. Juan de la Cruz Varela	Tonel alto	Convocada por	Supervisor	- Coordinadores		

Se desmonta tablero regulado
2 CPU de senales placa 14134667 y placa 14134342. con sus monitores y
Compromisos: (Indicar actividad/Responsable/fecha)

Actividad:

Compromiso por parte de construcciones:
Dejar un tablero normal en el salon provisional con espacio y totalizador
Dejar 10 tomas electricas reguladas
Conoleto doble via a una altura de 50 cm sobre piso.
Cajo y paso con tubera de 1" de cosona a salon (aerea)

Asistentes: (Firma / Cargo / Entidad)

302540042

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <i>Juanillo</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	FIRMA: 3213223579
CARGO: <i>Coordinador local</i>	CARGO: <i>Supervisor</i>	CARGO: <i>Coordinador</i>	NOMBRE: <i>Mónica Montero C.</i>
CEDULA: 55442140	CEDULA: 4104244	CEDULA: 1069730721	CARGO: <i>Coordinador</i>

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	FIRMA:
CARGO: <i>Coordinador</i>	CARGO: <i>Coordinador</i>	CARGO: <i>Coordinador</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>
CEDULA: 20.824.186	CEDULA: 4104244	CEDULA: 63511479	CARGO: <i>Coordinador</i>

3212210035

D. Certificados de calidad

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO					  ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019				
INV E 410-13									
Código: FI - GI - 116		Versión: 01		Actualización: 2021-12-04		Página: 1 de 1			
ID Informe:	ID-0035576-2024	-	1	Orden de ingreso:	C24058-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-05-31	Fecha de Ensayo:	2024-05-31	Fecha de Informe:	2024-06-04				
*Cliente:	CB INGENIEROS S A S								
*Dirección:	CL 98 #22-64 OF 503	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA		
ID Obra:	OB-002677	*Obra	PROYECTO MANTENIMIENTO COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)						
*Procedencia:	PREPARADO EN SITIO								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO							
*Fecha de toma	2024-05-03	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28
ID Muestra	#		NO APLICA				
*Localización	NO APLICA		COLEGIO LAS MERCEDES USME				
Tipo de material	-		CILINDRO DE CONCRETO				
DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA							
Muestra	-	1	2	3			
Longitud (L)	mm	202	202	202			
Diámetro (Ø)	mm	102.02	102.02	102.02			
Masa	g	3520	3518	3515			
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	2.0			
Área de la sección transversal	mm²	8174.49	8174.49	8174.5			
Densidad	Kg/m³	2132	2131	2129			
CÁLCULOS DE RESISTENCIA							
Carga máxima	kN	215.0	218.0	220.0			
Factor de corrección	-	1.0	1.0	1.0			
Resistencia a la compresión	Mpa	26.3	26.6	26.9			
Resistencia a la compresión	Psi	3807.2	3860.4	3895.8			
Resistencia a la compresión	%	126.9	128.7	129.9			
Patrón de fractura	-	2	2	2			
RESISTENCIA PROMEDIO					(MPa)		26.6
					%		128.5

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

E. Plan de calidad



CONSORCIO CLARIDAD

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

CO1.PCCNTR.5305904 - GRUPO 5 OBRAS MENORES PARA- ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA LA ATEN EJECUCIÓN DE LAS CION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

INSPECCION, MEDICION, EJECUCIÓN Y ENSAYO							
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y P RECONSTRUCCION/ ENSAYOS		CRITERIO DE ACEPTACION DE LOS RESULTADOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA NORMA	REGISTRO (2) (Formato, Archivo, Ubicación)	RESPONSABILIDADES		FRECUENCIA O NUMERO DE MEDICIONES QUE DEBEN REALIZAR
					(3) ELABORO	(4) REVISO	
VISITA TECNICA PRELIMINAR	Visita reconocimiento a la sede a realizar mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento, determinación de actividades aproximadas a ejecutar	N.A.	N.A.	Archivo del contratista y/o interventor	N.A.	Supervisor contrato, representante interventoría, representante contratista	1 vez al inicio de la intervencion
VISITA MEDICIONES DE OBRA	De acuerdo a las actividades priorizadas tomar mediciones de obra y registro fotografico	N.A.	N.A.	Archivo del contratista y/o interventoria	N.A.	Supervisor contrato, representante interventoría, representante contratista	1 vez al inicio de la intervencion
DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA	Cuantificacion y valoracion de cantidades resultantes de la visita tecnica preliminar	Verificacion de acuerdo a medidas tomadas en la visita	Formato contratista	Archivo del contratista y/o interventoria , se revisa con interventoria y supervision para determinar el alcance final de la intervencion por cada sede	Contratista	Supervisor contrato, representante interventoría, representante contratista	1 vez al inicio de la intervencion, posteriormente se realizan actualizaciones de acuerdo al avance de las obras
ACTA DE VECINDAD INICIO Y FINAL	Revisar y dejar constancia del estado actual de los sectores por donde se haran ingresos de material	Estado actual de la sede y los sectores a intervenir	Formato contratista y formato de SED	Archivo contratista, se realiza visita con interventoria, supervision y delegado de la sede , se debe adjuntar a los informes mensual y final	Contratista, interventor, supervisor, delegado de la sede	Supervisor contrato, representante interventoría, representante contratista	1 vez al inicio de la intervencion y 1 vez al final para hacer el cierre
REUNION INFORMACION INICIO DE OBRA	Reunion con el rector de cada sede donde se informe obras a ejecutar y fechas de inicio y terminacion aproximadas,	N.A.	Formato contratista y formato de SED	Archivo del contratista y/o interventoria el original del acta se archiva en cada carpeta de cada sede , para dajuntar a los informes mensuales y al informe final	Contratista	Residente y/o inspector y/o Director de contratista e interventoria	1 vez al inicio del contrato
ACTA DE CAPACITACION	Capacitar a los trabajadores de obra	N.A.	Formato segun Plan de seguridad y salud en el trabajo	Archivo del contratista y/o interventoria el original del acta se archiva en cada carpeta de cada sede , para dajuntar a los informes mensuales y al informe final	Contratista	Inspector o residente de interventoria o de obra o especialista sisoma	1 vez un mes despues de iniciada la intervencion
REUNION INFORMACION TERMINACION DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO	Informacion general con el rector de cada sede para verificar la terminacion de las obras	N.A.	Formato SED Acta de informacion de terminacion de obras	Archivo del contratista y/o interventoria el original del acta se archiva en cada carpeta de cada sede , para dajuntar a los informes mensuales y al informe final	Contratista	Residente y/o inspector y/o Director de contratista e interventoria	1 vez al finalizar las obras.

DOCUMENTOS DE INSPECCION, MEDICION, EJECUCIÓN Y ENSAYO									
PROCESO	DESCRIPCION	REFERENCIA	ENSAYOS/PRUEBAS	VARIABLES DE INSPECCION	EQUIPOS/HERRAMIENTA	RESPONSABLE	CRITERIO DE ACEPTACION	FRECUENCIA	REGISTROS
DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS	Ubicación de elementos a demoler,desmontar o retirar,verificar ejecución de la actividad de acuerdo al presupuesto	Planos existentes, nuevos esquemas, indicación recibidas por parte del supervisor y del interventor, presupuesto de obra	NA	Inspeccion visual, mediciones de obra, registro fotografico	Flexómetros, Decametros, herramientas menores	Residente De Obra/Contratista	Las demoliciones se podran realizar de forma manual, o con equipo demoledor según el elemento a demoler, las demoliciones existentes deberan ser realizadas de acuerdo con las indicaciones hechas en planos o según los parametros propuestos por el interventor con el visto bueno del supervisor	Antes de iniciar la actividad, vez por actividad y cada que se realice una demolicion o un desmonte	Registro fotografico
LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS	Verificacion de los volúmenes y materiales a retirar	Verificacion del area cuando la limpieza se realice a cualquier area a intervenir	NA	Inspeccion visual, mediciones de obra, registro fotografico	Herramienta menor, para el retiro de escombros volquetas y personal para cargue de escombros (depende del volumen a retirar se hara manual o con equipo)	Residente e inspector de obra/maestro de obra	Para el caso de las obras en general la limpieza del area antes de aplicar un material y para el retiro de escombros se verifica con formato propio y vales de la escombrera o gestores externos para disposicion de residuos , evitar la mezcla de escombros con materiales a utilizar	Durante toda la ejecución de las actividades, antes de iniciar una actividad y al finalizarla	Registro fotografico
EXCAVACION MANUAL	Excavaciones para , obras exteriores o edificaciones,de acuerdo al area a excavar se puede realizar de forma manual o mecanica. En caso que sea continuacion de obra se deben verificar de obras aleañas existentes. Esta actividad en caso que aplique	Levantamiento to pograficos existentes, (en caso que aplique) planos , carteras de topografia.	N.A.	Inspeccion visual, mediciones de obra, registro fotografico, revision de niveles, profundidades	Flexómetros, Decametros,equipos de topografia, niveles, mangueras, estacion (El equipo a utilizar depende del area y volumen a excavar)	Residente De Obra e inspector de obra/ maestro de obra	Nivelacion inicial con nivel y manguera o con equipo de topografia dependiendo del area a intervenir. La cota del fondo de la excavacion no debe difier en mas de un cms de las cotas de acabado definidas en obra o en planos según sea el caso	Revision nivelacion inicial. Verificacion final para dar liberacion a la actividad de excavacion Durante toda la ejecución y a diario	Registro fotografico, carteras de topografia (según sea el caso)
		Especificaciones, Normas INV E-219E-148,E-218, E-125 - 126,E-	Ensayo de limite líquido, indice de plasticidad, contenido de finos, tamaño máximo de agregados.		Flexómetros, equipos de topografia,		Limite liquido menor del 30%. Limite plastico NP	Revision nivelacion inicial.	

				Verificación visual del espesor de la capa compactada espesor de acuerdo a las recomendaciones de estudios de suelos, compactación mayor al 95%			Desgaste maquina de los angeles menor al 35%	-La verificación visual diaria del espesor de capa a compactar.	
	230,E123,E-219. Rellenos en subbase para la construcción de obras de niveles, mangueras, 230,E123,E-219.								
	Rellenos en subbase para la construcción de obras de urbanismo o construcción cimentación de edificaciones, después de hacer la revisión de los niveles finales de excavación y estar liberada esta actividad se procede a compactar la subrasante, instalación de geotextil y extendida y compactación subbase granular	Resultados ensayos de laboratorio, certificados de calidad. Dependiendo de la cantidad de material sino esta dentro de los volúmenes mínimos de acuerdo a la norma se presentaran ensayos del proveedor, de igual manera dependera el numero de ensayos de densidades .	Verificación visual de zonas mal compactadas por variación de la humedad o por presencia de material plástico. Ensayo de compactación PROCTOR modificado. Aprobación de niveles, acabado y resultados por parte de Interventoría. En caso de encontrarse un suelo de mala calidad se debe tener visita técnica del especialista del y tener en cuenta sus recomendaciones para el proceso constructivo	Mediciones de obra, revisión de niveles, ensayos del proveedor	niveles, mangueras, verificación espesores de cada capa y nivel final, cilindro compactador, placa vibratoria y bobcat o retroexcavadora. El equipo a utilizar depende del área a intervenir y profundidad	Residente De Obra e Inspector de obra/maestro de obra	Contenido de finos (pasa T N. 40), equivalente de arena mayor al 40%. -Densidad mínima del 95% del proctor modificado. Indice aplanamiento menor al 35% y alargamiento menor al 30%. Al menos un 50% de dicha fracción presentara una cara fracturada	-Verificación visual diaria de zonas mal compactadas . -Límites de plasticidad y granulometría una vez por todo el material cada 1000 m3. -Ensayos de densidad de la capa superior compactada una vez cada 300 m2 con 5 tomas. Los ensayos se deben tomar cada vez que se cambie la cantera	Registro fotografico, ensayos de laboratorio.
RELLENOS EN SUBBASE GRANULAR									
	Fundida de elementos en concreto para obras exteriores o elementos estructurales para edificaciones, si el concreto es de planta se debe verificar antes de descargar la mixer que la resistencia corresponda a la especificada, se verifica el porcentaje de asentamiento si el concreto se mezcla en obra tener en cuenta las recomendaciones del especialista y del interventor en cuanto a cantidades dependiendo de la resistencia, controlar nivelación y plomo de formaletas para garantizar dimensiones y alineamientos .		Ensayo de asentamiento cono de abrahams Ensayos resistencia ala compresion, el numero de muestras depende de la cantidad de concreto , minimo se deben tomar tres muestras cantidades mayores a 40 m3 , de lo contrario se soportaran con los certificados de la concretera Inspeccion visual y verificación de medidas Ensayo de compactación Aprobación de niveles, acabado y resultados por parte de Interventoría.	Mediciones de obra, inspeccion visual, revision de niveles, ensayos del proveedor ensayos tomados por el contratista del material a utilizar.	Cono de Abrahams, camisas de 15x30 para toma de muestras de concreto, vibrador de concreto, mezcladora, niveleta, formaletas, plomadas	Residente De Obra e Inspector de obra/maestro de obra	Control de asentamiento con el cono de abrahams, toma de muestras Cuando la resistencia de la muestra ensayada a los 14 días es mayor o igual a la resistencia especificada no sera necesario ensayas mas cilindros	Para la prueba de asentamiento el asentamiento se debe hacer por cada carro que llegue a la obra, si la mezcla se hace de forma manual se debe tomar una prueba de asentamiento minimo cada 10m3 Se tomaran muestras de concreto si la cantidad excede los 40 m3 se tomaran tres muestras y un testigo	Registro fotografico, ensayos de laboratorio. Remisiones de la concretera si el concreto es de planta
CONCRETOS		Norma NSR-10 TABLA 1.2.4.2							
	Mantenimiento a las instalaciones existentes hidraulicas y sanitarias, construcción de obras nuevas en las sedes prioritizadas , se deben verificar materiales, cortes de tuberías, armado, limpieza , pendientes	Especificaciones Normas 2011, Especificaciones fabricante	Pruebas de presion Pruebas de estanqueidad Inspeccion visual y verificación especificaciones Revisión de pendientes e instalacion	Dimension de materiales Calidad de elementos y material a instalar o reponer Limpieza de los puntos	Flexometro, calibrador, herramienta menor, manometro	Residente De Obra e Inspector de obra/maestro de obra	Longitudes y secciones según normas Certificados de calidad del material Cumplimiento especificaciones fabricante Verificación de pendientes	A la llegada del material se deben verificar especificacion y durante la ejecucion a diario,	Registro fotografico, certificados de calidad de los proveedores
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS									
	Pinturas de muros, estructuras y elementos metálicos	Especificaciones y recomendaciones proveedor	Certificados calidad proveedor	Color y Tipo Aplicacion y adherencia Dimensión de los elementos Limpieza de las superficies de la estructura	Herramienta menor, andamios certificados, arnes, eslinga, lina de vida (en caso que las pinturas sean en altura), compresores	Residente e Inspector de obra/maestro de obra	Esmalte, vinilo, koraza ,colores según especificacion o recomendación del supervisor e interventor Cubrimiento homogeneo Cumplir con las medidas establecidas Antes de pintar la estructura debe estar limpia sin residuos de grasa, ni mugre	La calidad de la pintura se debe verificar a la llegada del material, verificación una vez al inicio y durante el proceso de pintura, la limpieza se debe verificar a cada elemento	Certificados de calidad de los materiales, registro fotografico.
PINTURA EN ESMALTE									
	Verificación pintura de canchas existentes baloncesto, microfútbol, voleibol	Especificaciones y recomendaciones proveedor	Certificados calidad proveedor	color y tipo Aplicación y adherencia Dimensión de los elementos Trazos perpendiculares Anchos de linea micro futbol, baloncesto, voleibol, patinaje, tenis Estructuras micro futbol, baloncesto, voleibol, Limpieza de las superficies de la estructura	N/A Fluxometro / cinta / herramienta menor	Residente e Inspector de obra/maestro de obra	Pintura de Trafico , colores según especificaciones o recomendación del supervisor y el interventor Cubrimiento homogeneo Cumplir con las medidas dadas por fluxometro y existentes en canchas y en las estructuras Cumplir con las medidas dadas por fluxometro y existentes en las canchas y en las estructuras tolerancias de +/- 0,02 Antes de pintar la estructura y las canchas deben estar limpia sin residuos de grasa y en el caso de las canchas se debe barrer antes	La calidad de la pintura se debe verificar a la llegada del material, verificación una vez al inicio y durante el proceso de pintura, la limpieza se debe verificar a cada elemento	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico.
PINTURA DE DEMARCAACION Y PINTURAS ESTRUCTURAS DEPORTIVAS									
PINTURAS EN GENERAL : VINILO, KORAZA,		Especificaciones y recomendaciones proveedor	Certificados calidad proveedor	Color y tipo	Herramienta menor, andamios certificados, arnes, eslinga, lina	Residente e Inspector de obra/maestro de obra	Colores según existentes o los recomendados por el supervisor y el interventor	La calidad de la pintura se debe verificar a la llegada	

EPOXICA	Verificación pintura de elementos y estructuras existentes tanto de mobiliario urbano como de edificaciones			<div>Aplicación y adherencia</div> <div>Limpieza de las superficies de la estructura</div>	de vida (en caso que las pinturas sean en altura), compresores		<div>Cubrimiento homogéneo</div> <div>Antes de pintar los elementos la superficie debe estar limpia sin residuos de grasa y mugre</div>	del material, verificación una vez al inicio y durante el proceso de pintura, la limpieza se debe verificar a cada elemento	Certificados de calidad de los materiales, registro fotográfico.
IMPERMEABILIZACIONES	Verificación de materiales a utilizar, las áreas a intervenir deben ser autorizadas por el supervisor	Especificaciones y recomendaciones proveedor	Certificado calidad del proveedor	Verificar el tipo de material que corresponda al especificado, verificar instalación, juntas y limpieza del área a intervenir	Fluxometro, nivel, regleta, herramienta menor, nivel y regleta, para el caso de instalación de manto asfáltico soplete	Residente e inspector de obra/maestro de obra	Calidad del producto, aplicación del producto con uniformidad evitando grumos sobre la cubierta o superficie a intervenir, revisar traslapes mínimo 10 cms, antes de su instalación verificar el estado de la superficie a impermeabilizar	A la llegada del material se debe verificar la calidad, inspección durante la instalación y al final, se deben verificar las juntas los traslapes, los remates, sobre bordes y flanches, el área debe estar completamente limpia antes de iniciar la actividad	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotográfico.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Verificación de áreas a intervenir, inventario del estado de las obras y diagnóstico de mantenimiento requerido	Especificaciones del proyecto NORMAS 2010. Especificaciones proveedor y CODENSA. Por ser obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento no es obligación presentar certificado retiro, se presentarán certificados de calidad de los materiales	Equipos de mediciones eléctricos, amperímetros, voltímetros, y los equipos que recomiende el especialista eléctrico para certificar las obras	Verificar el tipo de material que corresponda al especificado, verificar instalación, y pruebas.	Fluxometro, equipo eléctrico y herramienta menor	Residente e inspector de obra	Cumplimiento de especificaciones, verificar el estado de la iluminación antes y después de la instalación	A la llegada del material, cada vez que sea necesario durante la ejecución y una vez al final.	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotográfico.
ACTIVIDAD CUBIERTAS, REPARACIONES EN GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION	Verificación de materiales a utilizar, las áreas a intervenir deben ser autorizadas por el supervisor y el interventor	Especificaciones y Recomendaciones proveedor	Certificados de calidad de los materiales a utilizar	Dimensión y calidad de los materiales y elementos a instalar, calidad de pinturas adherencia y espesor de capas.	Flexómetros, herramientas menores, equipos de soldadura, equipos de pintura, escaleras andamios certificados, arnes, eslinga, línea de vida (en caso que la actividad se desarrolle en altura), planchones	Residente e inspector de obra/ maestro de obra	Cumplimiento de las especificaciones, Longitudes y secciones según normas, alineamientos, pendientes, acabados de todos los elementos, tejas, estructuras, pinturas.	A la llegada del material, verificar especificación y calidad, cada ml instalado, al final revisión y aceptación general	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotográfico
MAMPOSTERIA Y PAÑETES Y ENCHAPES DE MUROS	Verificación de materiales a utilizar, las áreas a intervenir debe ser autorizadas por el supervisor	Planos existentes, nuevos esquemas, indicación recibidas por parte del supervisor y del interventor, presupuesto de obra	Certificados de calidad de los materiales a utilizar	Dimensión y calidad de los materiales, revisar plomos, espesor de los pañetes max 2 cms tolerancia del 1%	Fluxometro, boquilla, herramientas menores	Residente e inspector de obra/ maestro de obra	Cumplimiento de medidas de acuerdo a planos o esquemas, cumplimiento especificaciones y proporciones de materiales para los pañetes y morteros y cerámica para acabados	A la llegada del material se deben verificar especificación y durante la ejecución a diario,	Certificados de calidad de los proveedores y registro fotográfico
ALISTADO DE PISOS Y ACABADOS	Verificación de materiales a utilizar, las áreas a intervenir debe ser autorizadas por el supervisor	Planos existentes, nuevos esquemas, indicación recibidas por parte del supervisor y del interventor, presupuesto de obra	Certificados de calidad de los materiales a utilizar	Dimensión y calidad de los materiales, revisar niveles, antes de realizar la actividad de alistado se debe picar el área existente y revisar niveles de acabados y tener en cuenta espesor del material de acabado	Fluxometro, boquilla, herramientas menores	Residente e inspector de obra/ maestro de obra	Cumplimiento de medidas de acuerdo a planos o esquemas, cumplimiento especificaciones y proporciones de materiales para los alistados de pisos y materiales de acabados (porcelanato, baldosa de granito, vinilcol)	A la llegada del material se deben verificar especificación y durante la ejecución a diario,	Certificados de calidad de los proveedores y registro fotográfico


CHELMAN ROBERT HIGUERA
 Representante Legal
 CONSORCIO EXACTITUD

F. Informes semanales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

1

Fecha

2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA:

3/06/2024

Semana No. 31

Del :

lunes, 27 de mayo de 2024

AL:

domingo, 2 de junio de 2024

Plazo Total

240

días

Plazo Transcurrido

217

Nombre del Supervisor : Ing. Ferney Jiménez Neira

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

Semanal		Acumulado	Semanal		Acumulado
(%) Programado		71,00%	(%) Ejecutado		57,00%
Valor programado (\$)	\$ 194.631.889,64	\$ 6.612.479.858,83	Valor ejecutado (\$)	\$ 0,00	\$ 3.188.722.540,56
Nota: la programación fue ajustada conforme a la prórroga del contrato de obra e interventoría			Evaluación	-14,00%	Atraso en la ejecución


DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	Contrato No:	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	\$ 7.608.734.174	Valor del contrato:	\$ 504.428.924
Plazo:	8 meses	Plazo:	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	Fecha de terminación:	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión N° 1:	N/A	Fecha de suspensión N° 1:	N/A
Fecha de reinicio N° 1:	N/A	Fecha de reinicio N° 1:	N/A
Prórroga N° 1:	2 meses	Prórroga N° 1:	2 meses
Plazo final:	29 de agosto de 2024	Plazo final:	18 de septiembre de 2024
Fecha de vencimiento final:	N/A	Fecha de vencimiento final:	N/A
Fecha de suspensión N° 2:	N/A	Fecha de suspensión N° 2:	N/A
Suspensión N. 3	N/A	Suspensión N. 3	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	Fecha reinicio N. 2	N/A
Prórroga N° 2:	N/A	Prórroga N° 2:	N/A
Plazo final:	N/A	Plazo final:	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A
Adición	N/A	Adición	\$ 89.178.296
Valor total contrato	\$ 7.608.734.174	Valor actualizado contrato	\$ 593.607.220

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTE

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	\$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando González Ochoa	580	Usme	\$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	\$ 542.722.842,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
4	Chuniza	512	Usme	\$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de subsanación de observaciones
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	100,00%	84,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	\$ 750.000.000,00	100,00%	95,00%	Desmonte de cerramiento	Pintura, instalación de caballete, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	\$ 811.831.873,00	100,00%	78,00%	Instalación de estructura para súper board en bloque emisora. Instalación de luminarias en bloque almacén y emisora. Emboquillado de piso en bloque emisora. Instalación de tomacorrientes e interruptores en bloque emisora. Enchape de mesón de cocina. Instalación de piso en baño en bloque emisora. Detalle de estuco en bloque emisora. Instalación de tablero eléctrico frente a bloque emisora. Pintura en el bloque emisora. Instalación de cableado en el bloque emisora.	Agua lluvia, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	\$ 411.446.316,00	100,00%	25,00%	Instalación de malla electrosoldada en pasillo segundo bloque. Fundida de placa de las habitaciones de los dos bloques.	instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aparatos sanitarios, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	\$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra

 INGENIEROS S.A.			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					VERSIÓN	1
								Fecha	2/12/2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE									
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 3/06/2024						
Semana No. 31			Del : lunes, 27 de mayo de 2024			AL: domingo, 2 de junio de 2024			
Plazo Total			240 días						
11	Diego Cuellar sede C	542	Usme	\$ 344.210.600,00	54,00%	25,00%	Instalación de baldosa en granito pulido en aulas del segundo piso	Conformación de nueva placa, escalera, pintura, entre otras.	
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	2017	Sumapaz	\$ 337.709.778,00	8,00%	4,00%	Demolición de enchape de piso y guarda escoba sala vivienda de docentes. Desmontaje de lavamanos espejo y accesorios.	Desmonte, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, entre otras	
13	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	\$ 635.000.000,00	78,00%	9,00%	Corte de acero y fundida de pedestales	Construcción de cocina, instalaciones eléctricas, entre otros	
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	\$ 210.861.638,00	77,00%	4,00%	Desmonte de cubierta e instalación de estructura nueva. Desmonte de puerta corrediza. Soldadura y pintura de empachados estructura metálica para cubierta. Instalación de platina para viga perimetral	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras.	
15	Rural Las Mercedes	534	Usme	\$ 447.180.697,00	78,00%	30,00%	Instalación de rajón en ampliación de cocina Instalación tubería hidráulica y desagüe en cocina. Instalación de malla electrosoldada. Demolición de muro cocina para ampliación de cocina.	Construcción de cocina, pintura, instalaciones eléctricas, entre otros	
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	2026	Sumapaz	\$ 599.909.029,00	8,00%	0,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras	
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.		
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros	
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.	
		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas	
		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape		
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa		
		E			100,00%	90,00%	Capitolio: cambio de tubería de desagüe	Mantenimiento de pozo	
		E			100,00%	80,00%	Nazareth: instalación de aulas provisionales	Culminación de instalación de aulas provisionales	
		E			100,00%	70,00%	Tunal Alto: aula provisional	Culminación de instalación de aulas provisionales	
RESUMEN DE ACTIVIDADES									
COMPONENTE SG-SST									
Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, exámenes medicos de ingreso). Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios. Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo. Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra. Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios. Verificación entrega de dotación al personal. Revisión informes de gestión SST semanal y mensual. Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas. Incidentes y/o accidentes: Durante el presente periodo no se presentaron, incidentes, accidentes o daños a terceros.									
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:									
Seguimiento y control de la programación de obra. Remisión de solicitudes al constructor. Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra. Acta de comité de obra.									
REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA									
PERSONAL OBRA			PERSONAL INTERVENTORIA			MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Anexo Control de Personal Contrato de Obra			Anexo Personal Contrato Interventoría			Anexo Control de Equipos			
SEGUIMIENTO FINANCIERO									
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA									
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO						
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 69.413.115,00					Valor Total Contrato Obra		
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 482.429.484,00					\$ 7.608.734.174,00		
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 1.022.204.883,00					Valor facturado Contrato Obra		
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 868.448.638,00					\$ 3.397.120.058,00		

 INGENIEROS S.A.		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		VERSIÓN 1	
				Fecha 2/12/2022	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE					
UNIDAD EJECUTORA:				FECHA: 3/06/2024	
Semana No. 31		Del : lunes, 27 de mayo de 2024		AL: domingo, 2 de junio de 2024	
Plazo Total		240		días	
				% Avance facturado Acumulado	
5		1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024		\$ 623.934.436,00	
6		30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024		\$ 330.689.502,00	
7					
8					
Total Acumulado		\$		3.397.120.058,00	
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
Acta Parcial de Interventoría No.		Periodo		Costo Total	
1		10 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023		\$ 4.539.860,00	
2		30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023		\$ 32.031.237,00	
3		30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024		\$ 67.795.247,00	
4		30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024		\$ 57.555.340,00	
5		1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024		\$ 41.363.172,00	
6		30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024		\$ 10.686.327,00	
7					
8					
Total Acumulado		\$		213.971.183,00	
AVANCE FINANCIERO					
				Valor Total Contrato Interventoría	
				\$ 593.607.220,00	
				Valor facturado Contrato Interventoría	
				\$ 213.971.183,00	
				% Avance facturado Acumulado	
				36%	
				Saldo por Facturar	
				\$ 379.636.037,00	
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS					
1. La relación de la programación presentada en el capítulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.					
					
FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
NOMBRE: Andrés Felipe Mackenzie Fuentes					

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	31	DEL	27-may-24	AL	2-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

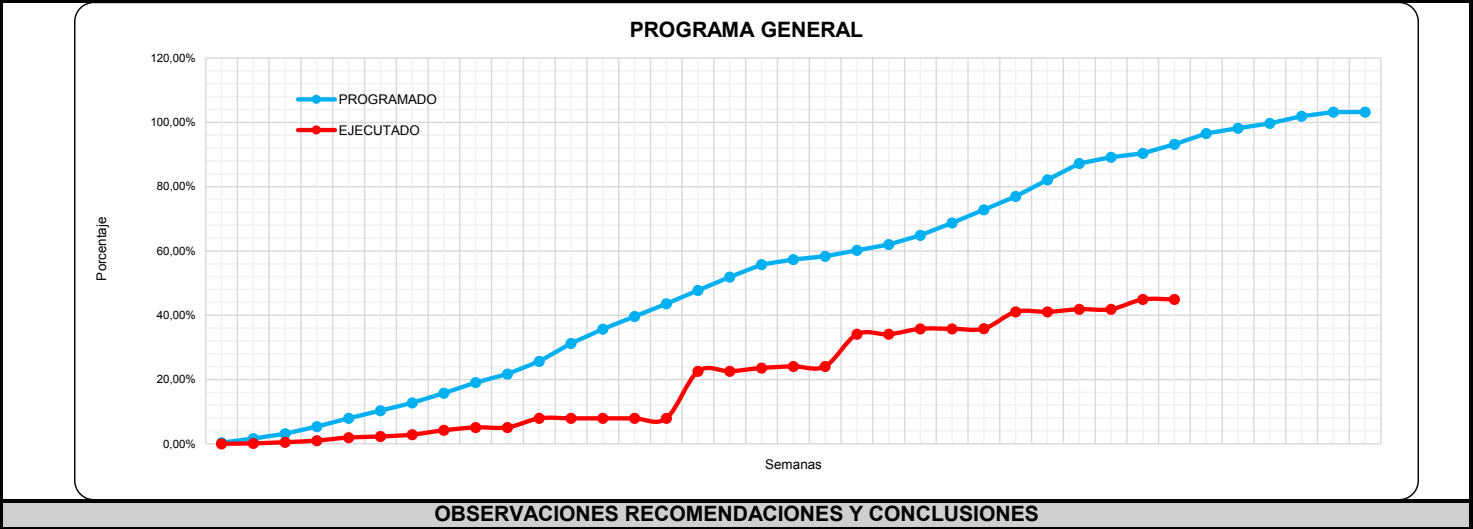
\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

SEMANA No.	31	DEL	27-may-24	AL	2-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	----------

PROGRAMACIÓN DE OBRA									
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
PROGRAMA GENERAL		\$ 7.099.380.673	240,00	93,14%	44,92%	-48,23%	107,80	223,54	-115,74
1	Usminia sede B	\$ 349.948.209	92,00	100,00%	103,32%	3,32%	95,05	92,00	3,05
2	Fernando González Ochoa	\$ 353.157.411	92,00	100,00%	84,60%	-15,40%	77,83	92,00	-14,17
3	Diego Cuellar sede B	\$ 542.722.842	60,00	100,00%	148,27%	48,27%	88,96	60,00	28,96
4	Chuniza	\$ 236.826.369	92,00	100,00%	150,06%	50,06%	138,05	92,00	46,05
5	DILE Sumapaz	\$ 15.242.011	50,00	100,00%	32,80%	-67,20%	16,40	50,00	-33,60
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	\$ 750.000.000	92,00	100,00%	76,26%	-23,74%	70,16	92,00	-21,84
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	\$ 811.831.873	90,00	100,00%	62,30%	-37,70%	56,07	90,00	-33,93
8	Vivienda docente - Campamento	\$ 411.446.316	90,00	100,00%	22,21%	-77,79%	19,99	90,00	-70,01
9	Diego Cuellar sede A	\$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	\$ 799.914.269	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Diego Cuellar sede C	\$ 344.210.600	90,00	74,87%	0,29%	-74,58%	0,26	67,38	-67,12
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	\$ 337.709.778	92,00	4,56%	0,00%	-4,56%	0,00	4,20	-4,20
13	San José de Usme - Don Bosco 2	\$ 635.000.000	90,00	97,49%	0,16%	-97,33%	0,14	87,74	-87,60
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	\$ 210.861.638	89,00	46,59%	0,00%	-46,59%	0,00	41,46	-41,46
15	Rural Las Mercedes	\$ 447.180.697	89,00	62,24%	12,68%	-49,56%	11,29	55,39	-44,11
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	\$ 599.909.029	86,00	4,23%	0,00%	-4,23%	0,00	3,64	-3,64
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
VALOR PRESUPUESTADO		\$ 7.099.380.673							



Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integralmente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ			PERSONAL CONTRATO OBRA FIRMA CONSORCIO CLARIDAD							
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA										
LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL										
NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	2805/2024
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSA LUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	19/04/2024
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/04/2024	N/A
21	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024 APROBADO 29-05-2024	N/A
1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A										
22	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
23	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
24	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
25	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
26	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
27	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/04/2024
28	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
29	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/04/2024
30	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
31	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
32	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
33	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
34	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
35	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
36	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALEZ OCHOA										
37	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
38	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
39	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
40	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
41	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
42	JHOSYMARHT ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
43	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A
3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
58	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
59	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134658898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
60	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
61	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569796	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
62	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
63	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
64	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
65	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
66	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
67	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
68	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	19/09/2024

5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
69	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
70	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
71	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545854	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
72	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
73	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
74	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
75	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
76	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
77	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
78	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
79	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
80	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
81	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
82	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
83	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
84	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
85	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
86	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
87	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110586392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
88	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
89	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
90	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
91	BRAYAN CAMILO USMA MUÑEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
92	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
93	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
94	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
95	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
96	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
97	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
98	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
99	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
100	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
101	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	24/05/2024
102	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
103	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674	3105668482	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
104	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942	3124569865	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	NO INGRESO
105	JHON EDWIN APONTE TORRES	1069230085	3214994825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	N/A
106	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3152456996	INSPECTOR DE OBRA DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/05/2024	N/A
107	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ	1057583536	3147480969	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/05/2024	N/A
108	JOHN ALEXANDER PIRACHICAN PARRA	1075672570	3102459665	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
109	JOHN FREDY SANABRIA CHIQUILLO	1075678799	3234899582	AUXILIAR DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
110	EDISON DAVID SANDOVAL MONSALVE	1075679785	3204749548	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
111	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	21/05/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
112	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
113	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
114	JHON EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	26/02/2024
115	LEONARDO PULCICIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	26/02/2024
116	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	26/02/2024
117	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
118	JEFFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
119	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
120	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
121	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
122	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
123	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
124	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
125	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
126	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
127	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
128	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
129	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
130	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
131	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
132	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
133	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
134	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
135	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
136	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
137	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
138	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
139	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
140	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
141	CARLOS ANDRES BALEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
142	DAVID STIVEN LOPEZ LANCHEROS	1010188018	SIN INFORMACIÓN	OFICIAL DE PINTURA	SALUD TOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	22/05/2024	N/A

6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
143	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3152943678	TECNICO OPERATIVO	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
144	ANDRES AUGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
145	ANDRES FELIPE NIÑO CANO	1015440804	3152957485	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	1/05/2024	N/A
146	PABLO JOSE GUAYAN POLO	1000241613	3106945375	GESTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
147	JUAN DANIEL MORA PEÑALOZA	1073671343	3106845376	TECNICO DE MONTAJE	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
148	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3017934675	AUXILIAR TECNICO	SANITAS EPS	SURA	N/A	COLFONDOS	4/4/2024	N/A
149	ADRIAN ORLANDO POLO MURCIA	79956551	3208765334	JEFE DE PRODUCCIÓN	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PROTECCION	4/4/2024	N/A
150	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3106286754	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/4/2024	N/A
151	DANIEL FRANCISCO TRUJILLO ESPINOZA	1075299743	3035914374	TECNICO DE MONTAJE ELECTROMECANICO 1A	NUEVA EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	COLPENSIONES	1/5/2024	N/A
152	EDILBERTO HERNANDEZ BERMEJO	1013585269	3057458596	TECNICO DE MONTAJE SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PORVENIR	8/5/2024	N/A
153	JAIRO ANDRES ROBAYO SANTAMARIA	1003564973	3212945678	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	14/05/2024	N/A
154	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
155	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154789999	OFICIAL	EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
156	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
157	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
158					NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
159	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
160	BRIAN LEONARDO AVELLANEDA OROZCO	1026298909	3057719914	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	8/4/2024	10/05/2024
161	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3216295647	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	N/A	PROTECCION	8/4/2024	N/A
162	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3206845379	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	9/4/2024	N/A
163	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3214967485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	N/A	COLFONDOS	10/4/2024	N/A
8. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C										
164	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
165	BRANDON YESIDIA DIAZ ROJAS	1030681900	3215372456	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	9/5/2024	20/05/2024
166	JORDAN STEVEN PAEZ RODRIGUEZ	1012453068	3135698674	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	9/5/2024	20/05/2024
167	WILLAM ANDRES CALDERON PARRA	80744758	3204576978	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	COLPENSIONES	14/5/2024	N/A
168	JOSE ISAAC VERA SALDAÑA	1110173856	3217684956	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/05/2024	N/A
169	JESUS ALBERTO VERA GUZMAN	1110177486	3214684558	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/05/2024	N/A
170	CRISTIAN CAMILO VERA GUZMAN	1072709660	3157848996	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	29/05/2024	N/A
171	MIGUEL MORENO LOZANO	3057007	3157749633	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/05/2024	N/A
9. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO SAN JOSÉ DE USME SEDE A										
172	CARMEN LILIANA POLO MURCIA	1077844556	3142678498	ANALISTA SGI	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PORVENIR	1/05/2024	N/A
173	GABRIELA HERNANDEZ JIMENEZ	1003802004	3102540065	ANALITA DE PRODUCCION RESIDENTE	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	13/05/2024
174	JOSE VICTOR VILLAZON FLORES	84093053	3205437644	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	PORVENIR	8/05/2024	N/A
175	NICOLAS JULIO FLOREZ COLLANTES	12641974	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	N/A	COLPENSIONES	8/05/2024	N/A
176	MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	3215768906	MAESTRO DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	COLFONDOS	6/05/2024	N/A
177	EDISON ALEXANDER GONZALEZ VELEZ	70256056	3156387689	MAESTRO DE OBRA	FAMISNAR	SURA	N/A	PROTECCION	6/05/2024	N/A
178	ANDRES AUGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
10. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL										
179	JEFERSON OVIEDO ARRIETA	1063300404	3104587485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
180	OSCAR RAFAEL BITAR BENITEZ	1063291359	315699333	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
181	ERLYN ENRIQUE SIMANCA CACERES	1064800199	3102354145	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
182	ANDRES ELIAS AVILA MORENO	1007795040	3057848589	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	27/05/2024	N/A
0										

Observaciones:

NOVEDADES		
INGRESOS	RETIROS	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	0	1 CAMBIO DE APOYO A RSIDENTE DE OBRA
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO CHUNIZA:	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	0	
RURAL LAS MERCEDES	0	
SAN JOSÉ DE USME	0	
DIEGO MONTAÑA SEDE C	2	0
EL RAIZAL	4	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	6	0
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		1

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>	<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>	 <div>BOGOTÁ</div>	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		INFORME No.		31
			PERIODO	lunes, 27 de mayo de 2024		domingo, 2 de junio de 2024	
			PÁGINA	1	DE	3	
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO							
COLEGIO USMINIA SEDE B							
							
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE					
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B							
							
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE					
COLEGIO CHUNIZA							
							
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE					
COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA							
							
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE					

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

SAN JOSÉ DE USME



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE C



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



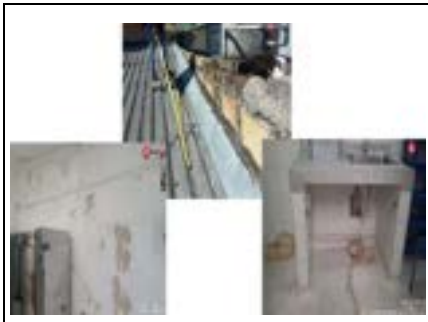
ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



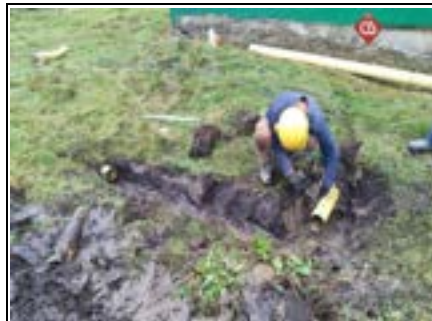
AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE:IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	31	DEL	27-may-24	AL	2-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	----------

OBRAS PROGRAMADAS



PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando González Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
Diego Cuellar sede C	21/02/2024	8/05/2024	-77
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024	6/05/2024	-67
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024	28/05/2024	-88
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	27/05/2024	28/05/2024	-1
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	27/05/2024	28/05/2024	-1
Emergencias		4/01/2024	144

PERIODO DEL INFORME:

SEMANTAL No. 31

SEMANA REPORTADA: lunes, 27 de mayo de 2024

AL

domingo, 2 de junio de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANTAL No. 31						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANTAL No. 31						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLATE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANTAL No. 31						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	X	X	X	X	X	X	

			SEMANAL No.			31			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			31			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	T	T	T	T	T	T	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	T	T	T	T	T	T	
4	PULIDORA	TRUPER	N/A	T	T	T	T	T	
5	TALADRO	BOSCH	N/A	T	T	T	T	T	
6	MARTILLO DEMOEDOR	QURIMA	N/A	N/A	N/A	T	T	T	
7	TROMPO MEZCLADOR	HI - FORCE	N/A	T	T	T	T	T	
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			31			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOEDOR	DEWALT D25601K	D	D	D	D	D	D	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	D	D	D	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
8	PULIDORA 4"	MAKITA-002	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO SAN JOSÉ DE USME									
			SEMANAL No.			31			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	PULIDORA	MAKITA 001	T	T	T	T	T	T	
2	TROMPO MEZCLADOR	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C									
			SEMANAL No.			31			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	MARTILLO DEMOEDOR	QURIMA	X	X	T	T	T	T	
2	MARTILLO DEMOEDOR	1	X	X	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	I	I	I	N/A	
COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL									
			LU			JU			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			27	28	29	30	31	01	02
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	T	T	T	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	T	T	T	T	T	
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			27	28	29	30	31	01	02

OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS								
PERIODO DEL INFORME:		DEL	lunes, 27-may.-24		AL	domingo, 02-jun.-24		
SEMANA REPORTADA:								
Usminia sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Fernando González Ochoa								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Chuniza								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede A								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

IED Campestres Jaime Garzón - Auras								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Vivienda docente - Campamento								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
DILE Sumapaz								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Rural Las Mercedes								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
San José de Usme - Don Bosco 2								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede C								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A

JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	2/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	27/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	28/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	29/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	30/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	31/05/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	1/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	2/06/2024			NO SE REALIZAN ACTIVIDADES				

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo

[illegible]**OBSERVACIÓN :**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

1

Fecha

2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE		FECHA:	10/06/2024
Semana No.	32	Del :	lunes, 3 de junio de 2024	AL:	domingo, 9 de junio de 2024
Plazo Total		240	días		
Plazo Transcurrido		224			
Nombre del Supervisor :	Ing. Ferney Jiménez Neira				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,00%	73,00%	(%) Ejecutado	2,00%	59,00%
Valor programado (\$)	\$ 194.631.889,64	\$ 6.612.479.858,83	Valor ejecutado (\$)	\$ 0,00	\$ 3.188.722.540,56
			Evaluación	-14,00%	Atraso en la ejecución


DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	Contrato No:	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	\$ 7.608.734.174	Valor del contrato:	\$ 504.428.924
Plazo:	8 meses	Plazo:	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	Fecha de terminación:	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión N° 1:	N/A	Fecha de suspensión N° 1:	N/A
Fecha de reinicio N° 1:	N/A	Fecha de reinicio N° 1:	N/A
Prórroga N° 1:	2 meses	Prórroga N° 1:	2 meses
Plazo final:	29 de agosto de 2024	Plazo final:	18 de septiembre de 2024
Fecha de vencimiento final:	N/A	Fecha de vencimiento final:	N/A
Fecha de suspensión N° 2:	N/A	Fecha de suspensión N° 2:	N/A
Suspensión N. 3	N/A	Suspensión N. 3	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	Fecha reinicio N. 2	N/A
Prórroga N° 2:	N/A	Prórroga N° 2:	N/A
Plazo final:	N/A	Plazo final:	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A
Adición	N/A	Adición	\$ 89.178.296
Valor total contrato	\$ 7.608.734.174	Valor actualizado contrato	\$ 593.607.220

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	\$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando González Ochoa	580	Usme	\$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	\$ 542.722.842,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
4	Chuniza	512	Usme	\$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de subsanación de observaciones
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	100,00%	84,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	\$ 750.000.000,00	100,00%	96,00%	Detalles y correcciones de pintura de muros internos y externos	Pintura, instalación de caballete, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	\$ 811.831.873,00	100,00%	83,00%	Instalación de superboard en cuchillas de bloque emisora. Pañete en muros del bloque emisora. Fundida de placa atrás de salones polideportivo. Pintura de ventanas en bloque emisora. Enchape de mesón cocina en bloque emisora. Fundida de dados para estructura del bloque almacén. Instalación de guardaescocha en bloque emisora. Pintura bloque emisora. Soportes de estructura del bloque almacén. Instalación de marcos de puertas.	Agua lluvia, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	\$ 411.446.316,00	100,00%	26,00%	Excavación manual de zanja para desagüe de baños docentes. Fundición de placa de habitaciones y cocina de los bloques. Instalación de pernos en pedestales de la estructura. Fundición de columnetas en vanos de puertas de habitaciones. Mampostería para cierre de ventanas.	instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aparatos sanitarios, entre otras

 INGENIEROS S.A.		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					VERSIÓN	1
							Fecha	2/12/2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE								
UNIDAD EJECUTORA:							FECHA:	10/06/2024
Semana No. 32		Del :		lunes, 3 de junio de 2024		AL: domingo, 9 de junio de 2024		
Plazo Total		240		días				
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	\$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	2020	Sumapaz	\$ 799.914.269,00	6,00%	1,00%	Desmonte de parque infantil. Excavación manual para zapatas Demolición de bordillo Figurado de acero para cimentación.	Construcción de cocin, cambio de acabado de pisos, entre otros
11	Diego Cuellar sede C	542	Usme	\$ 344.210.600,00	64,00%	37,00%	Emboquillado de baldosa en granito pulido. Instalación de baldosa en granito pulido en pasillo del segundo nivel. Desmonte de sanitarios baños niñas y niños. Demolición de mampostería de cafetería existente. Demolición de placa de baños niñas y niños. Excavación manual en el patio. Desmonte de tubería hidrosanitaria de los baños niñas y niños. Demolición de cajas de inspección de los baños. Demolición de divisiones de baños. Desmonte de puertas de los baños.	Conformación de nueva placa, escalera, pintura, entre otras.
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	2017	Sumapaz	\$ 337.709.778,00	14,00%	7,00%	Demolición de enchape de muro y piso de baño de vivienda de docentes	Desmonte, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, entre otras
13	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	\$ 635.000.000,00	83,00%	10,00%	Descapote de terreno	Construcción de cocina, instalaciones eléctricas, entre otros
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	\$ 210.861.638,00	83,00%	16,00%	Instalación de estructura nueva. Soldadura y pintura de empachados estructura metálica para cubierta	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras.
15	Rural Las Mercedes	534	Usme	\$ 447.180.697,00	83,00%	31,00%	Demolición de muros antigua cocina. Demolición de enchape en pasillo baño. Demolición de lavadero existente. Desmonte de piso madera en zona de sala de vivienda docente.	Construcción de cocina, pintura, instalaciones eléctricas, entre otros
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	2026	Sumapaz	\$ 599.909.029,00	14,00%	0,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillado de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.
		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas
		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa	
		E			100,00%	90,00%	Capitolio: cambio de tubería de desagüe	Mantenimiento de pozo
		E			100,00%	80,00%	Nazareth: instalación de aulas provisionales	Culminación de instalación de aulas provisionales
		E			100,00%	70,00%	Tunal Alto: aula provisional	Culminación de instalación de aulas provisionales
RESUMEN DE ACTIVIDADES								
COMPONENTE SG-SST								
Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, exámenes medicos de ingreso). Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios. Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo. Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra. Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios. Verificación entrega de dotación al personal. Revisión informes de gestión SST semanal y mensual. Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas. El día 04 de junio de 2024, se realizo mesa de trabajo area SST, con el fin de socializar los incumplimientos presentados por el contratista de obra. Incidentes y/o accidentes: Durante el presente periodo no se presentaron, incidentes, accidentes o daños a terceros.								
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:								
Seguimiento y control de la programación de obra. Remisión de solicitudes al constructor. Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra. Acta de comité de obra.								
REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA								

 INGENIEROS S.A.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSIÓN 1	
		Fecha 2/12/2022	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE			
UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	10/06/2024
Semana No.	32	Del :	lunes, 3 de junio de 2024
		AL:	domingo, 9 de junio de 2024
Plazo Total	240 días		
PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos	
SEGUIMIENTO FINANCIERO			
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA			
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 69.413.115,00	Valor Total Contrato Obra
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 482.429.484,00	\$ 7.608.734.174,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 1.022.204.883,00	Valor facturado Contrato Obra
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 868.448.638,00	\$ 3.397.120.058,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 623.934.436,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 330.689.502,00	45%
7			Saldo por Facturar
8			\$ 4.211.614.116,00
Total Acumulado	\$	3.397.120.058,00	
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	10 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 4.539.860,00	Valor Total Contrato Interventoría
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 32.031.237,00	\$ 593.607.220,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 67.795.247,00	Valor facturado Contrato Interventoría
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 57.555.340,00	\$ 213.971.183,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 41.363.172,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 10.686.327,00	36%
7			Saldo por Facturar
8			\$ 379.636.037,00
Total Acumulado	\$	213.971.183,00	
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS			
1. La relación de la programación presentada en el capítulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.			
			
FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
NOMBRE: Andrés Felipe Mackenzie Fuentes			

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	32	DEL	3-jun-24	AL	9-jun-24
------------	----	-----	----------	----	----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

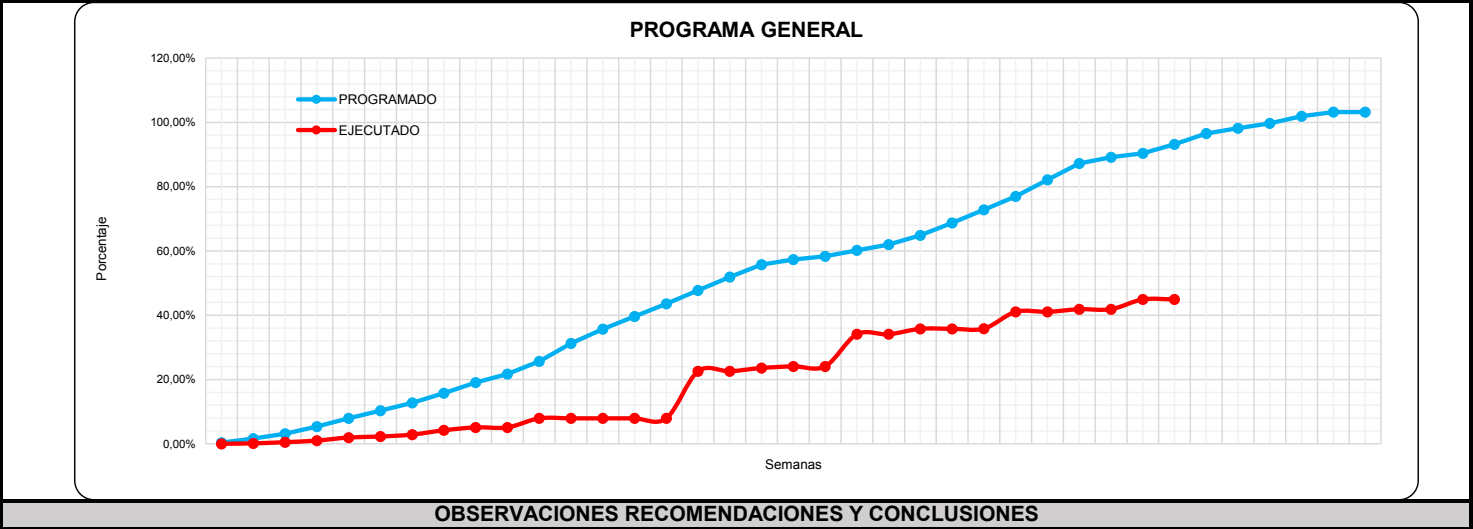
\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

SEMANA No.	32	DEL	03-jun-24	AL	9-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	----------

PROGRAMACIÓN DE OBRA									
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
PROGRAMA GENERAL		\$ 7.099.380.673	240,00	93,14%	44,92%	-48,23%	107,80	223,54	-115,74
1	Usminia sede B	\$ 349.948.209	92,00	100,00%	103,32%	3,32%	95,05	92,00	3,05
2	Fernando González Ochoa	\$ 353.157.411	92,00	100,00%	84,60%	-15,40%	77,83	92,00	-14,17
3	Diego Cuellar sede B	\$ 542.722.842	60,00	100,00%	148,27%	48,27%	88,96	60,00	28,96
4	Chuniza	\$ 236.826.369	92,00	100,00%	150,06%	50,06%	138,05	92,00	46,05
5	DILE Sumapaz	\$ 15.242.011	50,00	100,00%	32,80%	-67,20%	16,40	50,00	-33,60
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	\$ 750.000.000	92,00	100,00%	76,26%	-23,74%	70,16	92,00	-21,84
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	\$ 811.831.873	90,00	100,00%	62,30%	-37,70%	56,07	90,00	-33,93
8	Vivienda docente - Campamento	\$ 411.446.316	90,00	100,00%	22,21%	-77,79%	19,99	90,00	-70,01
9	Diego Cuellar sede A	\$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	\$ 799.914.269	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Diego Cuellar sede C	\$ 344.210.600	90,00	74,87%	0,29%	-74,58%	0,26	67,38	-67,12
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	\$ 337.709.778	92,00	4,56%	0,00%	-4,56%	0,00	4,20	-4,20
13	San José de Usme - Don Bosco 2	\$ 635.000.000	90,00	97,49%	0,16%	-97,33%	0,14	87,74	-87,60
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	\$ 210.861.638	89,00	46,59%	0,00%	-46,59%	0,00	41,46	-41,46
15	Rural Las Mercedes	\$ 447.180.697	89,00	62,24%	12,68%	-49,56%	11,29	55,39	-44,11
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	\$ 599.909.029	86,00	4,23%	0,00%	-4,23%	0,00	3,64	-3,64
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
VALOR PRESUPUESTADO		\$ 7.099.380.673							



Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integralmente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ			PERSONAL CONTRATO OBRA FIRMA CONSORCIO CLARIDAD							
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA										
LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL										
NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	2805/2024
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSA SALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	19/04/2024
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS SIN INFORMACIÓN	SURA	COMPENSAR SIN INFORMACIÓN	PORVENIR SIN INFORMACIÓN	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/04/2024	N/A
21	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024 APROBADO 29-05-2024	N/A
1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A										
22	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
23	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
24	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
25	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
26	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
27	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/04/2024
28	LUIS ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
29	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/04/2024
30	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
31	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
32	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
33	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
34	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
35	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
36	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALEZ OCHOA										
37	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
38	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
39	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
40	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
41	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
42	JHOSMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
43	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A
3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
58	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
59	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134658898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
60	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
61	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569796	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
62	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
63	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
64	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
65	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
66	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
67	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
68	CÉSAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	19/09/2024

5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
69	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
70	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
71	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545854	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
72	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
73	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
74	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
75	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
76	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015887844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
77	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
78	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
79	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
80	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
81	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
82	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
83	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
84	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
85	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
86	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
87	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
88	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
89	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
90	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
91	BRAYAN CAMILO USMA MUÑEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
92	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
93	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
94	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
95	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
96	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	102625495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
97	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
98	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
99	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
100	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
101	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	24/05/2024
102	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
103	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942	3124569685	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	NO INGRESO
104	JHON EDWIN APONTE TORRES	1069230085	3214994825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	N/A
105	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3152456996	INSPECTOR DE OBRA DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/05/2024	N/A
106	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ	1057583536	3147489699	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/05/2024	N/A
107	JOHN ALEXANDER PIRACHICAN PARRA	1075672570	3102459665	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
108	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	21/05/2024	N/A
109	LUIS EDUARDO BOLIVAR TIBOCHA	9636438	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	SIN INFORMACIÓN	COLPENSIONES	3/06/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
110	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
111	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
112	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	26/02/2024
113	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	26/02/2024
114	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	26/02/2024
115	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
116	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
117	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
118	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
119	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
120	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
121	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
122	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
123	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
124	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
125	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
126	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
127	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
128	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
129	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
130	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
131	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
132	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
133	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
134	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
135	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
136	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
137	CARLOS ANDRES BALEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
138	DAVID STIVEN LOPEZ LANCHEROS	1010188018	SIN INFORMACIÓN	OFICIAL DE PINTURA	SALUD TOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	22/05/2024	N/A
139	JULIAN ANDRES GAONA TOBOS	1024497888	3104587485	AYUDANTE ELECTRICO	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	7/06/2024	N/A
140	ADAN DE JESUS OROZCO PARRA	1010176236	3145415455	AYUDANTE DE PINTURA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/06/2024	N/A

	NOVEDADES		
	INGRESOS	RETIROS	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	0	0	CAMBIO DE APOYO A RESIDENTE DE OBRA
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	0	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO CHUNIZA:	0	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0	ENTREGA TOTAL
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0	
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	0	0	
RURAL LAS MERCEDES	0	0	
SAN JOSÉ DE USME	0	0	

DIEGO MONTAÑA SEDE C	0	0
EL RAIZAL	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO	3	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO	2	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA	3	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	8	0
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 BOGOTÁ	INFORME No.		32
			PERIODO	lunes, 3 de junio de 2024 domingo, 9 de junio de 2024	
			PÁGINA	1	DE
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO					
COLEGIO USMINIA SEDE B					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO CHUNIZA					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

SAN JOSÉ DE USME



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE C



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TOLDO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - RAIZAL



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

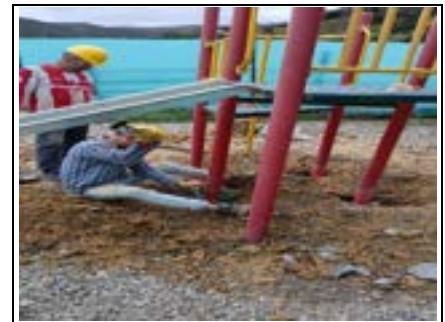
IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



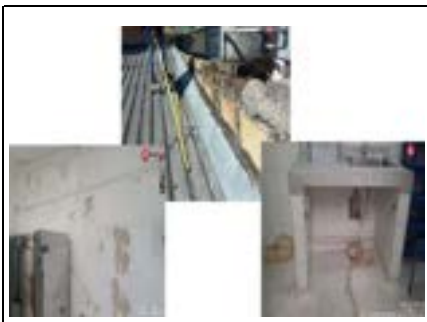
ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	32	DEL	3-jun-24	AL	9-jun-24
------------	----	-----	----------	----	----------

OBRAS PROGRAMADAS



PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando González Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
Diego Cuellar sede C	21/02/2024	8/05/2024	-77
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024	6/05/2024	-67
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024	28/05/2024	-88
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	27/05/2024	28/05/2024	-1
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	27/05/2024	28/05/2024	-1
Emergencias		4/01/2024	144

PERIODO DEL INFORME:

SEMANTAL No. 32

SEMANA REPORTADA: lunes, 3 de junio de 2024

AL

domingo, 9 de junio de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANTAL No. 32						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANTAL No. 32						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLATE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANTAL No. 32						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	X	X	X	X	X	X	

4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	X	X	X	X	X	X	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
10	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	X	X	X	X	X	X	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	X	X	X	X	X	X	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	SKIL 9002-231	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO CHUNIZA

			SEMANAL No.		32				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA350	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	

LA UNIÓN SUMAPAZ

EQUIPO			SEMANAL No.		32				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	D	D	D	D	D	D	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	D	D	D	D	D	D	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	X	X	X	X	X	X	
11	PULIDORA 4"	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
12	PULIDORA 9"	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
13	EQUIPO DE SOLDURA	WALL QUUALITY TOOLS	T	T	T	T	T	T	
14	EQUIPO DE SOLDURA	WEST ALCO	D	D	D	T	T	T	
15	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	DELWAT	X	X	X	X	X	X	
16	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	D	D	D	D	D	D	
17	COMPRESOR	DISC VER	D	D	T	D	T	T	

AURAS - SUMAPAZ

			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
4	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A

			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	D	D	D	D	D	D	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
4	PULIDORA	TRUPER	N/A	T	T	T	T	T	
5	TALADRO	BOSCH	N/A	T	T	T	T	T	
6	MARTILLO DEMOLEDOR	QURIMA	N/A	N/A	N/A	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	HI - FORCE	N/A	D	D	D	D	D	
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	D	D	D	D	D	D	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	D	D	D	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
8	PULIDORA 4"	MAKITA-002	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO SAN JOSÉ DE USME									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	PULIDORA	MAKITA 001		T	T	T	T	T	
2	TROMPO MEZCLADOR	2		T	T	T	T	T	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	MARTILLO DEMOLEDOR	QURIMA		X	T	T	T	T	
2	MARTILLO DEMOLEDOR	1		X	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE		I	I	I	I	N/A	
COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL									
			LU			JU			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	T	T	T	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	T	T	T	T	T	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							

COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	T	T	T	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	T	T	T	T	T	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA									
			SEMANAL No.			32			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			03	04	05	06	07	08	09
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			03	04	05	06	07	08	09
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS								
PERIODO DEL INFORME:		DEL	lunes, 03-jun.-24		AL	domingo, 09-jun.-24		
SEMANA REPORTADA:								
Usminia sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Fernando González Ochoa								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Chuniza								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede A								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SABADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

IED Campestres Jaime Garzón - Auras								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Vivienda docente - Campamento								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
DILE Sumapaz								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Rural Las Mercedes								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
San José de Usme - Don Bosco 2								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede C								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A

JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X	x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x		x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES					

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024							
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	9/06/2024							

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	3/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	4/06/2024	7:00 a.m.	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	5/06/2024	7:00 a.m.	5 :00 p.m		X		x	N/A
JUEVES	6/06/2024	7:00 a.m.	5 :00 p.m		X		x	N/A
VIERNES	7/06/2024	7:00 a.m.	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	8/06/2024	7:00 a.m.	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	9/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

1

Fecha

2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA:

17/06/2024

Semana No.

33

Del :

lunes, 10 de junio de 2024

AL:

domingo, 16 de junio de 2024

Plazo Total

300

días

Plazo Transcurrido

231

Nombre del Supervisor :

Ing. Ferney Jiménez Neira

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,00%	75,00%	(%) Ejecutado	1,00%	60,00%
Valor programado (\$)	\$ 152.984.204,32	\$ 5.837.273.722,39	Valor ejecutado (\$)	\$ 258.429.187,00	\$ 3.447.151.727,56
			Evaluación	-15,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	Contrato No:	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	\$ 7.608.734.174	Valor del contrato:	\$ 504.428.924
Plazo:	8 meses	Plazo:	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	Fecha de terminación:	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión N° 1:	N/A	Fecha de suspensión N° 1:	N/A
Fecha de reinicio N° 1:	N/A	Fecha de reinicio N° 1:	N/A
Prórroga N° 1:	2 meses	Prórroga N° 1:	2 meses
Plazo final:	29 de agosto de 2024	Plazo final:	18 de septiembre de 2024
Fecha de vencimiento final:	N/A	Fecha de vencimiento final:	N/A
Fecha de suspensión N° 2:	N/A	Fecha de suspensión N° 2:	N/A
Suspensión N. 3	N/A	Suspensión N. 3	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	Fecha reinicio N. 2	N/A
Prórroga N° 2:	N/A	Prórroga N° 2:	N/A
Plazo final:	N/A	Plazo final:	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A
Adición	N/A	Adición	\$ 89.178.296
Valor total contrato	\$ 7.608.734.174	Valor actualizado contrato	\$ 593.607.220

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	\$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando González Ochoa	580	Usme	\$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Ajuste a observaciones	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	\$ 542.722.842,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
4	Chuniza	512	Usme	\$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	100,00%	84,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	\$ 750.000.000,00	100,00%	96,00%	Estuco en filos y muros internos y externos del bloque administración. Demolición de placa de contrapiso para sistema de desagüe de aguas lluvias	Pintura, instalación de caballete, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	\$ 811.831.873,00	100,00%	86,00%	Enchape bloque emisora. Pintura bloque almacén y emisora. Pintura de canales en bloque emisora. Instalación de aparatos sanitarios en bloque emisora. Instalación de bajantes en bloque emisora. Instalación de mercos de puertas. Instalación de caballetes, socos y flanches en cubierta del bloque emisora. Instalaciones eléctricas: instalación de tubería, instalación de aparatos eléctricos, instalación de cajas metálicas, instalación de luminarias e instalación de cableado en bloque emisora. Instalación de granito en espacios de tablon cucuta en el pasillo del bloque emisora.	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras

 INGENIEROS S.A.			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					VERSIÓN	1	
								Fecha	2/12/2022	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE									FECHA:	17/06/2024
UNIDAD EJECUTORA:										
Semana No. 33			Del :		lunes, 10 de junio de 2024			AL:	domingo, 16 de junio de 2024	
Plazo Total			300		días					
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	\$ 411.446.316,00	100,00%	32,00%	Instalación y compactación de recebo para anden. Instalación de malla electrosoldada para anden. Instalación de cubierta en bloque 2. Fundida de anden en bloque 1 y 2. Instalación de soportes de canal y canal en bloque 1. Fundida de placa de contrapiso de baño en bloque 1. Instalación de tubería sanitaria para desagües de baños y cocina. Mampostería de cuchillas en bloque 2.	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aparatos sanitarios, entre otras		
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	\$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra		
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	2020	Sumapaz	\$ 799.914.269,00	13,00%	2,00%	Figurado de acero para zapatas. Excavación manual para zapatas y vigas de cimentación.	Construcción de cocina, cambio de acabado de pisos, entre otros		
11	Diego Cuellar sede C	542	Usme	\$ 344.210.600,00	75,00%	42,00%	Demolición de pañete en muros de baños de niños y niñas. Excavación manual en baños de niños y niñas. Picado de muros en baños de niños y niñas. Excavación de rajón en patio. Instalación de rajón en patio.	Conformación de nueva placa, escalera, pintura, entre otras.		
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	2017	Sumapaz	\$ 337.709.778,00	21,00%	9,00%	Demolición de sobre piso en vivienda de docentes	Desmonte, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, entre otras		
13	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	\$ 635.000.000,00	88,00%	13,00%	Descapote de terreno. Demolición de placa en concreto para cajas de inspección. Excavación manual para cajas de inspección. Instalación de estructura metálica para cocina. Instalación y compactación de recebo.	Construcción de cocina, instalaciones eléctricas, entre otros		
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	\$ 210.861.638,00	88,00%	22,00%	Instalación de estructura nueva. Soldadura y pintura de empachados estructura metálica para cubierta	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras.		
15	Rural Las Mercedes	534	Usme	\$ 447.180.697,00	88,00%	31,00%	Muro en mampostería de fachada en ampliación de cocina	Construcción de cocina, pintura, instalaciones eléctricas, entre otros		
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	2026	Sumapaz	\$ 599.909.029,00	21,00%	0,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras		
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.			
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillado de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros		
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.			
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.			
		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.		
		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas		
		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.			
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape			
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa			
		E			100,00%	90,00%	Capitolio: cambio de tubería de desagüe	Mantenimiento de pozo		
		E			100,00%	95,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	Atención de observaciones		
		E			100,00%	70,00%	Tunal Alto: lijado de muros, pintura de muros, ajuste de observaciones, instalación de canal, instalación de bajantes, instalación de mediacaña externa en aula provisional	Culminación de instalación de aulas provisionales		
RESUMEN DE ACTIVIDADES										
COMPONENTE SG-SST										

 <div>INGENIEROS S.A.</div>	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSIÓN 1	Fecha 2/12/2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE			
UNIDAD EJECUTORA:	FECHA: 17/06/2024		
Semana No. 33	Del : lunes, 10 de junio de 2024	AL: domingo, 16 de junio de 2024	
Plazo Total	300	días	
Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, exámenes medicos de ingreso). Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios. Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo. Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra. Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios. Verificación entrega de dotación al personal. Revisión informes de gestión SST semanal y mensual. Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.			
Incidentes y/o accidentes: Durante el presente periodo no se presentaron, incidentes, accidentes o daños a terceros.			
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA:			
Seguimiento y control de la programación de obra. Remisión de solicitudes al constructor. Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra. Acta de comité de obra.			
REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA			
PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoria	Anexo Control de Equipos	
SEGUIMIENTO FINANCIERO			
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA			
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 69.413.115,00	Valor Total Contrato Obra
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 482.429.484,00	\$ 7.608.734.174,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 1.022.204.883,00	Valor facturado Contrato Obra
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 868.448.638,00	\$ 3.397.120.058,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 623.934.436,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 330.689.502,00	45%
7			Saldo por Facturar
8			\$ 4.211.614.116,00
Total Acumulado	\$	3.397.120.058,00	
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Acta Parcial de Interventoria No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	10 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 4.539.860,00	Valor Total Contrato Interventoria
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 32.031.237,00	\$ 593.607.220,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 67.795.247,00	Valor facturado Contrato Interventoria
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 57.555.340,00	\$ 213.971.183,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 41.363.172,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 10.686.327,00	36%
7			Saldo por Facturar
8			\$ 379.636.037,00
Total Acumulado	\$	213.971.183,00	
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS			
1. La relación de la programación presentada en el capítulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.			
<div></div> <div>FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>NOMBRE: Andrés Felipe Mackenzie Fuentes</div>			

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	33	DEL	10-jun-24	AL	16-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO

\$ 7.608.734.174

VR. ASIGNADO
OBRA PROGRAMADA +
EMERGENCIAS

\$ 7.329.303.473

DIFERENCIA

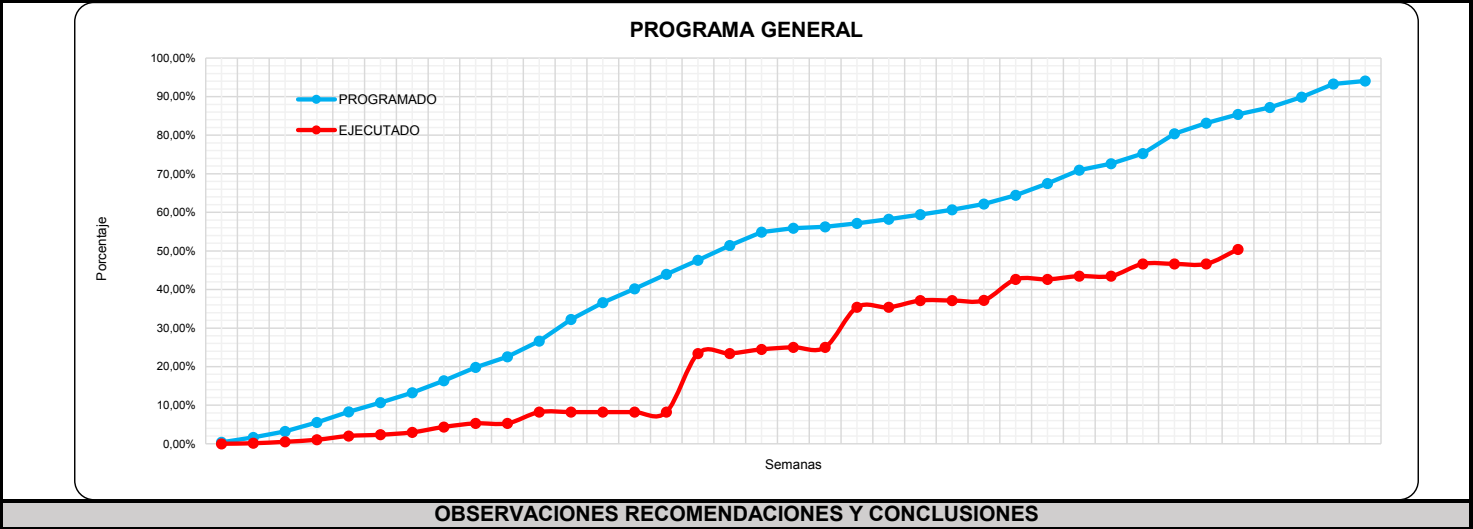
\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

SEMANA No.	33	DEL	10-jun-24	AL	16-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

PROGRAMACIÓN DE OBRA									
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
PROGRAMA GENERAL		\$ 6.836.684.830	300,00	85,38%	50,42%	-34,96%	151,26	256,14	-104,88
1	Usminia sede B	\$ 349.948.209	92,00	100,00%	103,32%	3,32%	95,05	92,00	3,05
2	Fernando González Ochoa	\$ 353.157.411	92,00	100,00%	84,60%	-15,40%	77,83	92,00	-14,17
3	Diego Cuellar sede B	\$ 542.722.842	60,00	100,00%	148,27%	48,27%	88,96	60,00	28,96
4	Chuniza	\$ 236.826.369	92,00	100,00%	150,06%	50,06%	138,05	92,00	46,05
5	DILE Sumapaz	\$ 15.242.011	50,00	100,00%	65,61%	-34,39%	32,80	50,00	-17,20
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	\$ 750.000.000	92,00	100,00%	83,65%	-16,35%	76,96	92,00	-15,04
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	\$ 811.831.873	90,00	100,00%	67,69%	-32,30%	60,92	90,00	-29,07
8	Vivienda docente - Campamento	\$ 411.446.316	90,00	100,00%	31,37%	-68,63%	28,23	90,00	-61,77
9	Diego Cuellar sede A	\$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	\$ 658.356.852	90,00	46,46%	0,00%	-46,46%	0,00	41,81	-41,81
11	Diego Cuellar sede C	\$ 344.210.600	90,00	91,10%	20,00%	-71,10%	18,00	81,99	-63,99
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	\$ 216.571.352	92,00	35,59%	0,00%	-35,59%	0,00	32,74	-32,74
13	San José de Usme - Don Bosco 2	\$ 635.000.000	90,00	98,55%	6,97%	-91,58%	6,27	88,69	-82,42
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	\$ 210.861.638	89,00	79,47%	0,00%	-79,47%	0,00	70,73	-70,73
15	Rural Las Mercedes	\$ 447.180.697	89,00	84,25%	13,90%	-70,35%	12,37	74,98	-62,61
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	\$ 599.909.029	92,00	34,85%	0,00%	-34,85%	0,00	32,06	-32,06
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
VALOR PRESUPUESTADO		\$ 6.836.684.830							



OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integralmente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

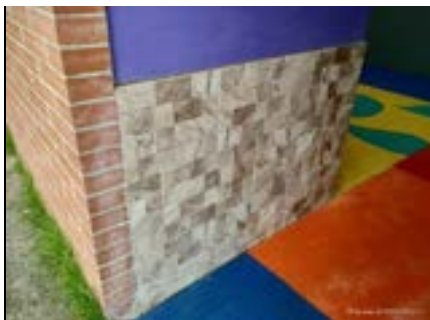
<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ</div>			PERSONAL CONTRATO OBRA FIRMA CONSORCIO CLARIDAD							
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA										
LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL										
NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	2805/2024
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSA SALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	19/04/2024
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/04/2024	N/A
21	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024 APROBADO 29-05-2024	N/A
1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A										
22	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
23	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
24	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
25	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
26	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
27	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/04/2024
28	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
29	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/04/2024
30	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
31	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
32	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
33	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
34	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
35	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
36	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALEZ OCHOA										
37	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
38	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
39	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
40	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
41	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
42	JHOSMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
43	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A
3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
58	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
59	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134658898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
60	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
61	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569796	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
62	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
63	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
64	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
65	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
66	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
67	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
68	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	19/09/2024
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNION - SUMAPAZ										
69	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
70	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
71	JOSE LUIS AGOTTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
72	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
73	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024

74	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
75	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
76	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
77	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
78	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
79	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
80	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
81	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
82	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
83	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
84	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
85	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
86	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
87	LUIS ANTONIO BARRAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
88	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
89	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
90	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
91	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
92	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
93	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
94	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
95	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
96	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
97	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79668903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
98	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
99	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
100	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	24/05/2024
101	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
102	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942	3124569685	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	NO INGRESO
103	JHON EDWIN APOINTE TORRES	1069230085	32149944825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	N/A
104	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3152456996	INSPECTOR DE OBRA DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/06/2024	N/A
105	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ	1057583536	3147489699	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/05/2024	N/A
106	JOHN ALEXANDER PIRACHICAN PARBA	1075672570	3102459665	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
107	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	21/05/2024	N/A
108	LUIS EDUARDO BOLIVAR TIBOCHA	9636438	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	NEUEVA EPS	SURA	SIN INFORMACIÓN	COLPENSIONES	3/06/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
109	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
110	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
111	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	26/02/2024
112	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	26/02/2024
113	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	26/02/2024
114	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
115	JEFFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
116	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082653834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
117	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
118	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
119	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
120	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
121	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789899	INSTALADOR DE CUBIERTA	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
122	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
123	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
124	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
125	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
126	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
127	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
128	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
129	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
130	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
131	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
132	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
133	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
134	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
135	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
136	CARLOS ANDRES BALEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
137	DAVID STIVEN LOPEZ LANCHEROS	1010188018	SIN INFORMACIÓN	OFICIAL DE PINTURA	SALUD TOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	22/05/2024	N/A
138	JULIAN ANDRES GAONA TOBOS	1024497888	3104587485	AYUDANTE ELECTRICO	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	7/06/2024	N/A
139	ADAN DE JESUS OROZCO PARRA	1010176236	3145415455	AYUDANTE DE PINTURA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/06/2024	N/A
6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
140	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3152943678	TECNICO OPERATIVO	NEUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
141	ANDRES AGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
142	ANDRES FELIPE NIÑO CANO	1015440804	3152957485	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	1/05/2024	N/A
143	PABLO JOSE GUAYAN POLO	1000241613	3106945375	GESTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
144	JUAN DANIEL MORA PEÑALOZA	1073671343	3106945376	TECNICO DE MONTAJE	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
145	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3017934675	AUXILIAR TECNICO	SANITAS EPS	SURA	N/A	COLFONDOS	4/4/2024	N/A
146	ADRIAN ORLANDO POLO MURCIA	79956551	3208765334	JEFE DE PRODUCCIÓN	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PROTECCION	4/4/2024	N/A
147	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3106286754	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/4/2024	N/A
148	DANIEL FRANCISCO TRUJILLO ESPINOZA	1075299743	3035914374	TECNICO DE MONTAJE ELECTROMECHANICO 1A	NEUEVA EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	COLPENSIONES	1/5/2024	N/A
149	EDILBERTO HERNANDEZ BERMEJO	1013565269	3057458596	TECNICO DE MONTAJE SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PORVENIR	8/5/2024	N/A
150	JAIRO ANDRES ROBOYO SANTAMARIA	1003564973	3212945678	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	14/05/2024	N/A
151	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
152	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
153	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
154	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NEUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
155	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
156	SACHARIEL CASTAÑO OLMO	1193241753	3154788999	AYUDANTE DE OBRA	CAPITAL SALUD	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/06/2024	N/A

157	ELKIN JOSE ZAMBRANO GONZALEZ	73558523	3136598788	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	12/06/2024	N/A
158	ALFREDO ZAMBRANO JINETE	3830366	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/06/2024	N/A
159	LUIS MIGUEL GARCIA PINTO	1001272063	3054568584	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	COMPENSAR EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/06/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
160	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	5/06/2024
161	BRIAN LEONARDO AVELLANEDA OROZCO	1026298909	3057719914	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	8/4/2024	10/05/2024
162	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3216295647	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	N/A	PROTECCION	8/4/2024	5/06/2024
163	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3206845379	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	9/4/2024	5/06/2024
164	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3214967485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	N/A	COLFONDOS	10/4/2024	5/06/2024
8. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C										
165	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
166	BRANDON YESID DIAZ ROJAS	1030681900	3215372456	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	9/5/2024	20/05/2024
167	JORDAN STEVEN PAEZ RODRIGUEZ	1012453068	3135698674	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	9/5/2024	20/05/2024
168	WILLAM ANDRES CALDERON PARRA	80744758	3204576978	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	COLPENSIONES	14/5/2024	N/A
169	JOSE ISAAC VERA SALDAÑA	1110173856	3217684956	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/05/2024	N/A
170	JESUS ALBERTO VERA GUZMAN	1110177486	3214684558	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/05/2024	N/A
171	CRISTIAN CAMILO VERA GUZMAN	1072709660	3157848996	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	29/05/2024	N/A
172	MIGUEL MORENO LOZANO	3057007	3157749633	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/05/2024	N/A
173	JOSE IGNACIO VERGARA MARTINEZ	1033803954		AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/06/2024	N/A
9. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO SAN JOSÉ DE USME SEDE A										
174	CARMEN LILIANA POLO MURCIA	1077844556	3142678498	ANALISTA SGI	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILAR HUILA	PORVENIR	1/05/2024	N/A
175	GABRIELA HERNANDEZ JIMENEZ	1003802004	3102540065	ANALITA DE PRODUCCION RESIDENTE	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	13/05/2024
176	JOSE VICTOR VILLAZON FLORES	84093053	3205437644	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	PORVENIR	8/05/2024	N/A
177	NICOLAS JULIO FLOREZ COLLANTES	12641974	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	N/A	COLPENSIONES	8/05/2024	N/A
178	MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	3215768906	MAESTRO DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	COLFONDOS	6/05/2024	N/A
179	EDISON ALEXANDER GONZALEZ VELEZ	70256056	3156387689	MAESTRO DE OBRA	FAMISNAR	SURA	N/A	PROTECCION	6/05/2024	N/A
180	ANDRES AGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
181	LUIS GIOVANNI SUA CARDONA	79222131	3205437644	TECNICO DE MONTAJE SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/06/2024	N/A
182	DEIMER MONROY DIAZ	1085050428	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
183	EDWAR MAURICIO GARCIA DIAZ	1022970105	3215768906	AYUDANTE DE OBRA	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
184	HECTOR MAURICIO PULIDO SANCHEZ	1023899001	3156387689	PINTOR ESTRUCTURA METALICA	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
10. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL										
185	JEFERSON OVIEDO ARRIETA	1063300404	3104587485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
186	OSCAR RAFAEL BITAR BENITEZ	1063291359	315699333	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
187	ERLYN ENRIQUE SIMANCA CACERES	1064800199	3102354145	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
188	ANDRES ELIAS AVILA MORENO	1007795040	3057848589	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	27/05/2024	N/A
11. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO										
189	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674	3105668482	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
190	JOHN FREDY SANABRIA CHIQUILLO	1075678799	3234899582	AUXILIAR DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
191	EDISON DAVID SANDOVAL MONSALVE	1075679785	3204749548	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
12. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO										
192	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
193	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
13. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA										
194	WILLIAM MEDINA PINZON	80418856	3147418996	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	31/05/2024	N/A
195	LUIS MIGUEL BORNANCELLI MUZO	7573521	3102544144	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	FAMISANAR	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
196	JOSE GILBER SALAZAR CHACON	6031780	3125477488	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SANITAS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
0										

Observaciones:

	NOVEDADES	
	INGRESOS	RETIROS
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	0	0
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO CHUNIZA:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	5	0
RURAL LAS MERCEDES	0	5
SAN JOSÉ DE USME	4	0
DIEGO MONTAÑA SEDE C	2	0
EL RAIZAL	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA	0	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	11	0
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 BOGOTÁ	INFORME No.		33
			PERIODO	lunes, 10 de junio de 2024 domingo, 16 de junio de 2024	
			PÁGINA	1	DE
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO					
COLEGIO USMINIA SEDE B					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO CHUNIZA					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			
COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA					
					
ESTADO INICIAL	AVANCE	AVANCE			

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

SAN JOSÉ DE USME



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE C



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TOLDO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - RAIZAL



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



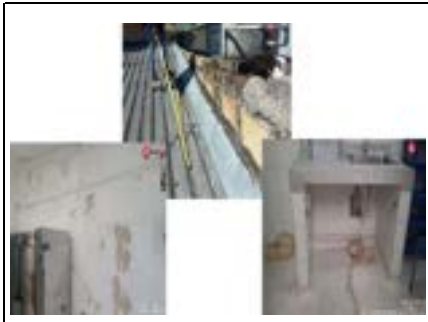
ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO

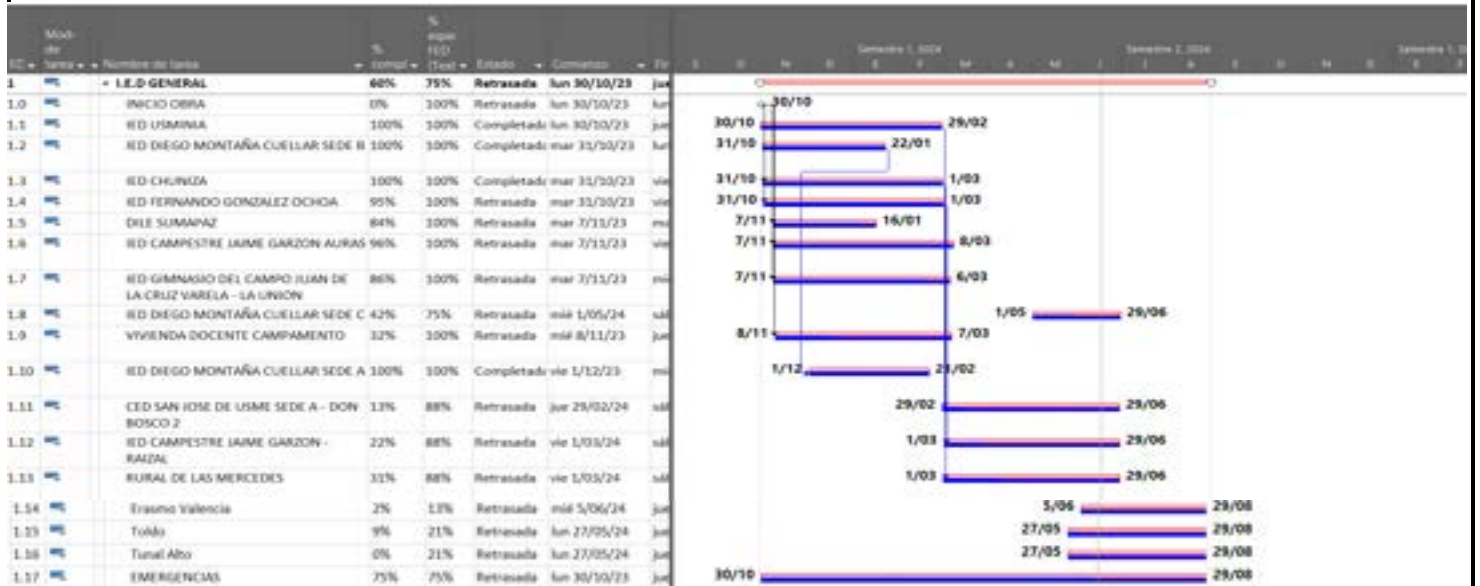


AVANCE: TUNAL ALTO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	33	DEL	10-jun-24	AL	16-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

OBRAS PROGRAMADAS



PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando González Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	5/06/2024	6/06/2024	-1
Diego Cuellar sede C	21/02/2024	8/05/2024	-77
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024	6/05/2024	-67
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024	28/05/2024	-88
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	27/05/2024	28/05/2024	-1
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	27/05/2024	28/05/2024	-1
Emergencias		4/01/2024	144

PERIODO DEL INFORME:

SEMANTAL No. 33

SEMANA REPORTADA: lunes, 10 de junio de 2024

AL

domingo, 16 de junio de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANTAL No. 33						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANTAL No. 33						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLATE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANTAL No. 33						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 - UBERMAN	X	X	X	X	X	X	
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	X	X	X	X	X	X	

6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	X	X	X	X	X	X	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
10	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	X	X	X	X	X	X	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	X	X	X	X	X	X	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	SKIL 9002-231	X	X	X	X	X	X	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANTAL No.		33				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA350	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANTAL No.		33				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	D	D	D	D	D	D	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	D	D	D	D	D	D	
6	TALADRO DEMOLETOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	X	X	X	X	X	X	
11	PULIDORA 4"	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
12	PULIDORA 9"	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
13	EQUIPO DE SOLDURA	WALL QUUQUALITY TOOLS	T	T	T	T	T	T	
14	EQUIPO DE SOLDURA	WEST ALCO	D	D	D	T	T	T	
15	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLETOR	DELWAT	X	X	X	X	X	X	
16	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	D	D	D	D	D	D	
17	COMPRESOR	DISC VER	D	D	T	D	T	T	
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANTAL No.		33				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
4	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA	1	X	T	T	T	T	T	
6	ROTOMARTILLO	1	X	X	T	T	T	T	
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANTAL No.		33				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO

HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEADOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	T	T	T	T	T	T	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
4	PULIDORA	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
5	TALADRO	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
6	MARTILLO DEMOLEADOR	QURIMA	N/A	N/A	N/A	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	HI - FORCE	N/A	D	D	D	D	D	
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEADOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEADOR	DEWALT D25601K	D	D	D	D	D	D	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	D	D	D	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
8	PULIDORA 4"	MAKITA-002	D	D	D	D	D	D	
COLEGIO SAN JOSÉ DE USME									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	PULIDORA	MAKITA 001	X	T	T	T	T	T	
2	TROMPO MEZCLADOR	2	X	T	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	I	I	X	I	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MARTILLO DEMOLEADOR	QURIMA	X	X	T	T	T	T	
2	MARTILLO DEMOLEADOR	1	X	X	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	I	I	I	I	
COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL									
			LU			JU			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	T	T	T	T	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	T	T	T	T	T	T	
3	PLANTA ELECTRICA	1	D	D	D	D	D	D	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO

HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	T	T	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA									
			SEMANAL No.			33			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS								
PERIODO DEL INFORME:		DEL	lunes, 10-jun.-24		AL	domingo, 16-jun.-24		
SEMANA REPORTADA:								
Usminia sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Fernando González Ochoa								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Chuniza								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede A								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

IED Campestres Jaime Garzón - Auras								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			X	X	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Vivienda docente - Campamento								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		X	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				X	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
DILE Sumapaz								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			X	x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Rural Las Mercedes								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
San José de Usme - Don Bosco 2								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede C								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
JUEVES	13/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	14/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		X		x	N/A
SÁBADO	15/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	16/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	10/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
MARTES	11/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A
MIÉRCOLES	12/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			X	X	N/A



INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

1

Fecha

2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA:

24/06/2024

Semana No.

34

Del :

lunes, 17 de junio de 2024

AL:

domingo, 23 de junio de 2024

Plazo Total

300

días

Plazo Transcurrido

238

Nombre del Supervisor :

Ing. Ferney Jiménez Neira

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,00%	78,00%	(%) Ejecutado	3,00%	63,00%
Valor programado (\$)	\$ 125.175.904,40	\$ 5.962.449.626,79	Valor ejecutado (\$)	\$ 303.749.746,09	\$ 3.750.901.473,85
			Evaluación	-15,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	Contrato No:	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	\$ 7.608.734.174	Valor del contrato:	\$ 504.428.924
Plazo:	8 meses	Plazo:	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	Fecha de terminación:	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión N° 1:	N/A	Fecha de suspensión N° 1:	N/A
Fecha de reinicio N° 1:	N/A	Fecha de reinicio N° 1:	N/A
Prórroga N° 1:	2 meses	Prórroga N° 1:	2 meses
Plazo final:	29 de agosto de 2024	Plazo final:	18 de septiembre de 2024
Fecha de vencimiento final:	N/A	Fecha de vencimiento final:	N/A
Fecha de suspensión N° 2:	N/A	Fecha de suspensión N° 2:	N/A
Suspensión N. 3	N/A	Suspensión N. 3	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	Fecha reinicio N. 2	N/A
Prórroga N° 2:	N/A	Prórroga N° 2:	N/A
Plazo final:	N/A	Plazo final:	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A
Adición	N/A	Adición	\$ 89.178.296
Valor total contrato	\$ 7.608.734.174	Valor actualizado contrato	\$ 593.607.220

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	\$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Detalles de la entrega física de la obra
2	Fernando González Ochoa	580	Usme	\$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Ajuste a observaciones	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	\$ 542.722.842,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Detalles de la entrega física de la obra
4	Chuniza	512	Usme	\$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	100,00%	84,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	\$ 750.000.000,00	100,00%	97,00%	Pintura en fachada del bloque laboratorios y administración. Instalaciones eléctricas: instalación de tubería EMT, cajas metálicas y acometida de cable. Excavación de la zanja para tubería de desagüe de aguas lluvias.	Pintura, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	\$ 811.831.873,00	100,00%	89,00%	Detalles de pintura en bloque emisora. Desmonte de cubierta en bloque aulas. Desmonte de cerchas en bloque aulas. Demolición de muro sobre viga de bloque aulas. Pintura en garita de celador. Pintura epoxica en enfermería del bloque emisora. Extendido de recebo, instalación de malla y fundida de placa y cañuela atrás de bloque emisora. Pintura en salón de inclusión	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	\$ 411.446.316,00	100,00%	41,00%	Instalación de cubierta del bloques 1 y 2. Fundida de andenes de los bloques 1 y 2.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aparatos sanitarios, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	\$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Detalles de la entrega física de la obra

 INGENIEROS S.A.			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					VERSIÓN	1
								Fecha	2/12/2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE									
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA:					24/06/2024	
Semana No. 34			Del : lunes, 17 de junio de 2024					AL: domingo, 23 de junio de 2024	
Plazo Total			300 días						
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	2020	Sumapaz	\$ 799.914.269,00	21,00%	9,00%	Demolición de piso tipo madera de aulas 3, 4 y 5. Demolición de piso del pasillo. Demolición y excavación de piso. Instalación de duro piso en aula 1, 2, 3 y 4. Resane de muros exteriores de las aulas 1 y 2. Mortero de nivelación en aula 4.	Construcción de cocina, cambio de acabado de pisos, entre otros	
11	Diego Cuellar sede C	542	Usme	\$ 344.210.600,00	87,00%	48,00%	Instalación de tubería sanitaria en baños de niños y niñas. Instalación de rajón en patio. Destronque de baldosa de granito pulido en las aulas del segundo piso. Extendido y compactación de recebo en patio y baños. Instalación de malla electrosoldada en patio y baños. Fundida de placa de contrapiso en patio y baños. Excavación manual para cárcamos de patio.	Pintura de placa de patio, demolición de escalera, pintura, entre otras.	
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	2017	Sumapaz	\$ 337.709.778,00	29,00%	11,00%	Demolición de piso en vivienda docente. Demolición de enchape de pasillo comedor. Mortero de nivelación en vivienda docente. Demolición de dados soportes del pasillo comedor. Extendido y compactación de recebo. Instalación de malla electrosoldada para placa contrapiso del pasillo comedor. Instalación de duro piso en pasillo comedor.	Instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, entre otras	
13	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	\$ 635.000.000,00	94,00%	14,00%	Instalación de malla electrosoldada para concreto simple. Fundida de concreto simple debajo de la ampliación de cocina. Instalación de estructura metálica para cocina.	Construcción de cocina, instalaciones eléctricas, entre otros	
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	\$ 210.861.638,00	94,00%	24,00%	Soldadura de estructura metálica de vigas de cubierta. Instalación de estructura metálica para cubierta.	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras.	
15	Rural Las Mercedes	534	Usme	\$ 447.180.697,00	94,00%	34,00%	Muro en mampostería de fachada en ampliación de cocina. Fundida de andén detrás de patio. Demolición de muro para conformación de puerta en habitación docente. Mampostería para cierra de baño. Fundida de columnetas en fachada de ampliación de cocina Mampostería interna en ampliación de cocina.	Construcción de cocina, pintura, instalaciones eléctricas, entre otros	
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	2026	Sumapaz	\$ 599.909.029,00	29,00%	0,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras	
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.		
		E			100,00%	98,00%	San Juan: ajuste de humedad de placa de baños	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros	
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.	
		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas	
		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.		
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape		
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa		
		E			100,00%	90,00%	Capitolio: cambio de tubería de desagüe	Mantenimiento de pozo	
		E			100,00%	95,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	Atención de observaciones	
		E			100,00%	80,00%	Tunal Alto: durante la semana no realizaron actividades	Culminación de instalación de aulas provisionales	
RESUMEN DE ACTIVIDADES									
COMPONENTE SG-SST									
Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, exámenes medicos de ingreso). Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios. Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo. Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra. Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios. Verificación entrega de dotación al personal. Revisión informes de gestión SST semanal y mensual. Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.									
Incidentes y/o accidentes: Durante el presente periodo no se presentaron, incidentes, accidentes o daños a terceros.									
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:									

 INGENIEROS S.A.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSIÓN 1	
		Fecha	2/12/2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE			
UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	24/06/2024
Semana No.	34	Del :	lunes, 17 de junio de 2024
		AL:	domingo, 23 de junio de 2024
Plazo Total	300	días	
Seguimiento y control de la programación de obra. Remisión de solicitudes al constructor. Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra. Acta de comité de obra.			
REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA			
PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos	
SEGUIMIENTO FINANCIERO			
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA			
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 69.413.115,00	Valor Total Contrato Obra
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 482.429.484,00	\$ 7.608.734.174,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 1.022.204.883,00	Valor facturado Contrato Obra
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 868.448.638,00	\$ 4.104.842.041,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 623.934.436,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 330.689.502,00	54%
7	30 de abril de 2024 a 29 de mayo de 2024	\$ 707.721.983,00	Saldo por Facturar
8			\$ 3.503.892.133,00
Total Acumulado	\$	4.104.842.041,00	
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	10 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 4.539.860,00	Valor Total Contrato Interventoría
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 32.031.237,00	\$ 593.607.220,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 67.795.247,00	Valor facturado Contrato Interventoría
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 57.555.340,00	\$ 304.261.420,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 41.363.172,00	% Avance facturado Acumulado
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 10.686.327,00	51%
7	30 de abril de 2024 a 29 de mayo de 2024	\$ 90.290.237,00	Saldo por Facturar
8			\$ 289.345.800,00
Total Acumulado	\$	304.261.420,00	
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS			
1. La relación de la programación presentada en el capítulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.			
			
FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
NOMBRE: Andrés Felipe Mackenzie Fuentes			

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	34	DEL	17-jun-24	AL	23-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

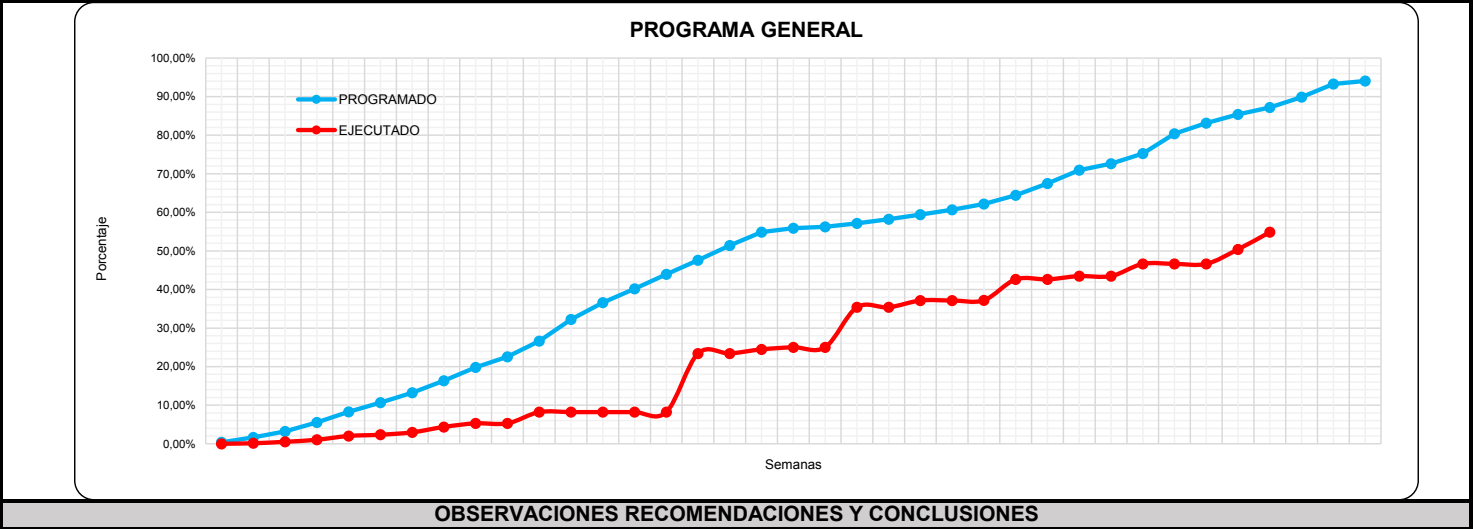
\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

SEMANA No.	34	DEL	17-jun-24	AL	23-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

PROGRAMACIÓN DE OBRA									
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
PROGRAMA GENERAL		\$ 6.836.684.830	300,00	87,21%	54,86%	-32,35%	164,59	261,64	-97,04
1	Usminia sede B	\$ 349.948.209	92,00	100,00%	103,32%	3,32%	95,05	92,00	3,05
2	Fernando González Ochoa	\$ 353.157.411	92,00	100,00%	84,60%	-15,40%	77,83	92,00	-14,17
3	Diego Cuellar sede B	\$ 542.722.842	60,00	100,00%	148,27%	48,27%	88,96	60,00	28,96
4	Chuniza	\$ 236.826.369	92,00	100,00%	150,06%	50,06%	138,05	92,00	46,05
5	DILE Sumapaz	\$ 15.242.011	50,00	100,00%	65,61%	-34,39%	32,80	50,00	-17,20
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	\$ 750.000.000	92,00	100,00%	83,65%	-16,35%	76,96	92,00	-15,04
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	\$ 811.831.873	90,00	100,00%	67,69%	-32,30%	60,92	90,00	-29,07
8	Vivienda docente - Campamento	\$ 411.446.316	90,00	100,00%	31,37%	-68,63%	28,23	90,00	-61,77
9	Diego Cuellar sede A	\$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	\$ 658.356.852	90,00	46,46%	0,00%	-46,46%	0,00	41,81	-41,81
11	Diego Cuellar sede C	\$ 344.210.600	90,00	91,10%	20,00%	-71,10%	18,00	81,99	-63,99
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	\$ 216.571.352	92,00	35,59%	0,00%	-35,59%	0,00	32,74	-32,74
13	San José de Usme - Don Bosco 2	\$ 635.000.000	90,00	98,55%	6,97%	-91,58%	6,27	88,69	-82,42
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	\$ 210.861.638	89,00	79,47%	0,00%	-79,47%	0,00	70,73	-70,73
15	Rural Las Mercedes	\$ 447.180.697	89,00	84,25%	13,90%	-70,35%	12,37	74,98	-62,61
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	\$ 599.909.029	92,00	34,85%	0,00%	-34,85%	0,00	32,06	-32,06
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
VALOR PRESUPUESTADO		\$ 6.836.684.830							



OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integralmente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ</div>			PERSONAL CONTRATO OBRA FIRMA CONSORCIO CLARIDAD							
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA										
LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL										
NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	2805/2024
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSA SALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	19/04/2024
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/04/2024	N/A
21	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024 APROBADO 29-05-2024	N/A
1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A										
22	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
23	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
24	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
25	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
26	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
27	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/04/2024
28	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
29	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/04/2024
30	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
31	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
32	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
33	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
34	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
35	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
36	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALEZ OCHOA										
37	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
38	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
39	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
40	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
41	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
42	JHOSMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
43	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A
3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
58	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
59	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134656898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
60	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
61	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569796	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
62	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
63	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
64	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
65	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
66	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
67	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	10/05/2024
68	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	19/09/2024
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNION - SUMAPAZ										
69	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
70	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
71	JOSE LUIS AGOTTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
72	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
73	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024

74	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
75	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
76	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
77	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
78	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
79	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
80	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
81	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
82	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
83	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
84	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
85	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
86	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
87	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
88	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
89	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
90	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
91	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
92	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
93	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
94	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
95	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
96	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
97	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79668903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
98	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
99	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
100	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	24/05/2024
101	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
102	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942	3124569685	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	NO INGRESO
103	JHON EDWIN APONTE TORRES	1069230085	32149944825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	N/A
104	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3152456996	INSPECTOR DE OBRA DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/06/2024	N/A
105	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ	1057583536	3147489699	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/05/2024	N/A
106	JOHN ALEXANDER PIRACHICAN PARBA	1075672570	3102459665	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
107	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	21/05/2024	N/A
108	LUIS EDUARDO BOLIVAR TIBOCHA	9636438	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	NUOVA EPS	SURA	SIN INFORMACIÓN	COLPENSIONES	3/06/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
109	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
110	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
111	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	26/02/2024
112	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	26/02/2024
113	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	26/02/2024
114	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
115	JEFFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
116	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082653834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
117	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
118	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
119	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
120	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
121	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789899	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
122	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
123	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
124	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
125	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
126	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
127	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
128	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
129	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
130	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
131	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
132	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
133	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
134	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
135	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
136	CARLOS ANDRES BALEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
137	DAVID STIVEN LOPEZ LANCHEROS	1010188018	SIN INFORMACIÓN	OFICIAL DE PINTURA	SALUD TOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	22/05/2024	N/A
138	JULIAN ANDRES GAONA TOBOS	1024497888	3104587485	AYUDANTE ELECTRICO	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	7/06/2024	N/A
139	ADAN DE JESUS OROZCO PARRA	1010176236	3145415455	AYUDANTE DE PINTURA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/06/2024	N/A
6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
140	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3152943678	TECNICO OPERATIVO	NUOVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
141	ANDRES AGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
142	ANDRES FELIPE NIÑO CANO	1015440804	3152957485	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	1/05/2024	N/A
143	PABLO JOSE GUAYAN POLO	1000241613	3106945375	GESTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
144	JUAN DANIEL MORA PEÑALOZA	1073671343	3106945376	TECNICO DE MONTAJE	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCION	1/05/2024	N/A
145	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3017934675	AUXILIAR TECNICO	SANITAS EPS	SURA	N/A	COLFONDOS	4/4/2024	N/A
146	ADRIAN ORLANDO POLO MURCIA	79956551	3208765334	JEFE DE PRODUCCIÓN	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PROTECCION	4/4/2024	N/A
147	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3106286754	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/4/2024	N/A
148	DANIEL FRANCISCO TRUJILLO ESPINOZA	1075299743	3035914374	TECNICO DE MONTAJE ELECTROMECHANICO 1A	NUOVA EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	COLPENSIONES	1/5/2024	N/A
149	EDILBERTO HERNANDEZ BERMEJO	1013565269	3057458596	TECNICO DE MONTAJE SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PORVENIR	8/5/2024	N/A
150	JAIRO ANDRES ROBOYO SANTAMARIA	1003564973	3212945678	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	14/05/2024	N/A
151	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
152	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
153	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
154	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NUOVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
155	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
156	SACHARIEL CASTAÑO OLMO	1193241753	3154788999	AYUDANTE DE OBRA	CAPITAL SALUD	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/06/2024	N/A

157	ELKIN JOSE ZAMBRANO GONZALEZ	73558523	3136598788	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	12/06/2024	N/A
158	ALFREDO ZAMBRANO JINETE	3830366	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/06/2024	N/A
159	LUIS MIGUEL GARCIA PINTO	1001272063	3054568584	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	COMPENSAR EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/06/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
160	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	5/06/2024
161	BRIAN LEONARDO AVELLANEDA OROZCO	1026298909	3057719914	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	8/4/2024	10/05/2024
162	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3216295647	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	N/A	PROTECCION	8/4/2024	5/06/2024
163	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3206845379	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	9/4/2024	5/06/2024
164	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3214967485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	N/A	COLFONDOS	10/4/2024	5/06/2024
8. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C										
165	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
166	BRANDON YESID DIAZ ROJAS	1030681900	3215372456	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	9/5/2024	20/05/2024
167	JORDAN STEVEN PAEZ RODRIGUEZ	1012453068	3135698674	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	9/5/2024	20/05/2024
168	WILLAM ANDRES CALDERON PARRA	80744758	3204576978	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	COLPENSIONES	14/5/2024	N/A
169	JOSE ISAAC VERA SALDAÑA	1110173856	3217684956	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/05/2024	N/A
170	JESUS ALBERTO VERA GUZMAN	1110177486	3214684558	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/05/2024	N/A
171	CRISTIAN CAMILO VERA GUZMAN	1072709660	3157848996	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	29/05/2024	N/A
172	MIGUEL MORENO LOZANO	3057007	3157749633	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/05/2024	N/A
173	JOSE IGNACIO VERGARA MARTINEZ	1033803954		AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/06/2024	N/A
9. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO SAN JOSÉ DE USME SEDE A										
174	CARMEN LILIANA POLO MURCIA	1077844556	3142678498	ANALISTA SGI	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILAR HUILA	PORVENIR	1/05/2024	N/A
175	GABRIELA HERNANDEZ JIMENEZ	1003802004	3102540065	ANALITA DE PRODUCCION RESIDENTE	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	13/05/2024
176	JOSE VICTOR VILLAZON FLORES	84093053	3205437644	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	PORVENIR	8/05/2024	N/A
177	NICOLAS JULIO FLOREZ COLLANTES	12641974	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	N/A	COLPENSIONES	8/05/2024	N/A
178	MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	3215768906	MAESTRO DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	COLFONDOS	6/05/2024	N/A
179	EDISON ALEXANDER GONZALEZ VELEZ	70256056	3156387689	MAESTRO DE OBRA	FAMISNAR	SURA	N/A	PROTECCION	6/05/2024	N/A
180	ANDRES AGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
181	LUIS GIOVANNI SUA CARDONA	79222131	3205437644	TECNICO DE MONTAJE SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/06/2024	N/A
182	DEIMER MONROY DIAZ	1085050428	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
183	EDWAR MAURICIO GARCIA DIAZ	1022970105	3215768906	AYUDANTE DE OBRA	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
184	HECTOR MAURICIO PULIDO SANCHEZ	1023899001	3156387689	PINTOR ESTRUCTURA METALICA	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	15/06/2024	N/A
10. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL										
185	JEFERSON OVIEDO ARRIETA	1063300404	3104587485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
186	OSCAR RAFAEL BITAR BENITEZ	1063291359	315699333	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
187	ERLYN ENRIQUE SIMANCA CACERES	1064800199	3102354145	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/05/2024	N/A
188	ANDRES ELIAS AVILA MORENO	1007795040	3057848589	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	27/05/2024	N/A
11. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO										
189	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674	3105668482	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
190	JOHN FREDY SANABRIA CHIQUILLO	1075678799	3234899582	AUXILIAR DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
191	EDISON DAVID SANDOVAL MONSALVE	1075679785	3204749548	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/05/2024	N/A
12. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO										
192	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
193	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
13. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA										
194	WILLIAM MEDINA PINZON	80418856	3147418996	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	31/05/2024	N/A
195	LUIS MIGUEL BORNANCELLI MUZO	7573521	3102544144	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	FAMISANAR	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
196	JOSE GILBER SALAZAR CHACON	6031780	3125477488	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SANITAS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
0										
Observaciones:										

NOVEDADES			
		INGRESOS	RETIROS
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL		0	0
COLEGIO USMINIA SEDE B:		0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:		0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B		0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO CHUNIZA:		0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ		0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:		0	0
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:		0	0
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:		5	0
RURAL LAS MERCEDES		0	5
SAN JOSÉ DE USME		4	0
DIEGO MONTAÑA SEDE C		2	0
EL RAIZAL		0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO		0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO		0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA		0	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:		11	0
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:			5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 BOGOTÁ	INFORME No.		34
			PERIODO	lunes, 17 de junio de 2024 domingo, 23 de junio de 2024	
			PÁGINA	1	DE
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO					
COLEGIO USMINIA SEDE B					
					
ESTADO INICIAL			AVANCE		
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B					
					
ESTADO INICIAL			AVANCE		
COLEGIO CHUNIZA					
					
ESTADO INICIAL			AVANCE		
COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA					
					
ESTADO INICIAL			AVANCE		



ESTADO INICIAL



AVANCE



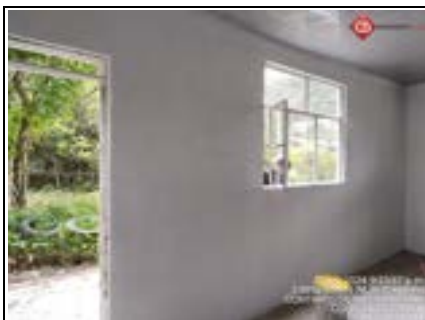
AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

SAN JOSÉ DE USME



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE C



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TOLDO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - RAIZAL



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



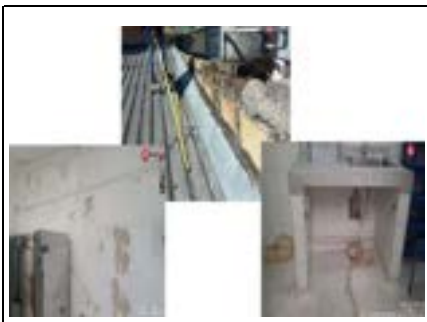
ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO

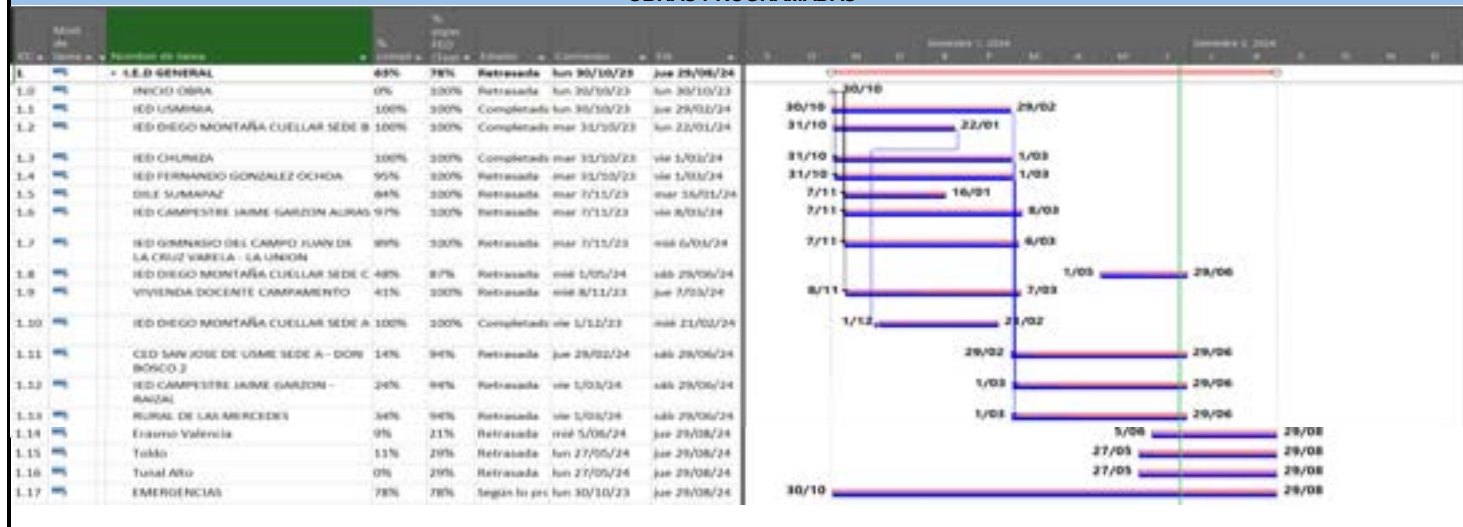


AVANCE: TUNAL ALTO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	34	DEL	17-jun-24	AL	23-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

OBRAS PROGRAMADAS



PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando González Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	5/06/2024	6/06/2024	-1
Diego Cuellar sede C	21/02/2024	8/05/2024	-77
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024	6/05/2024	-67
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024	28/05/2024	-88
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	27/05/2024	28/05/2024	-1
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	27/05/2024	28/05/2024	-1
Emergencias		4/01/2024	144

PERIODO DEL INFORME:

SEMANTAL No. 34

SEMANA REPORTADA: lunes, 17 de junio de 2024

AL

domingo, 23 de junio de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANTAL No. 34						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANTAL No. 34						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLATE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANTAL No. 34						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 - UBERMAN	X	X	X	X	X	X	
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	X	X	X	X	X	X	

6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	X	X	X	X	X	X	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
10	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	X	X	X	X	X	X	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	X	X	X	X	X	X	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	SKIL 9002-231	X	X	X	X	X	X	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.		34				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA350	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.		34				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	D	D	D	D	D	D	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	D	D	D	D	D	D	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	X	X	X	X	X	X	
11	PULIDORA 4"	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
12	PULIDORA 9"	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
13	EQUIPO DE SOLDURA	WALL QUUQUALITY TOOLS	T	T	T	T	T	T	
14	EQUIPO DE SOLDURA	WEST ALCO	D	D	D	T	T	T	
15	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	DELWAT	X	X	X	X	X	X	
16	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	D	D	D	D	D	D	
17	COMPRESOR	DISC VER	D	D	T	D	T	T	
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.		34				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
4	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA	1	X	T	T	T	T	T	
6	ROTOMARTILLO	1	X	X	T	T	T	T	
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.		34				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO

HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	T	T	T	T	T	T	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
4	PULIDORA	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
5	TALADRO	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
6	MARTILLO DEMOLEDOR	QURIMA	N/A	N/A	N/A	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	HI - FORCE	N/A	D	D	D	D	D	
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	D	D	D	D	D	D	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	D	D	D	D	D	D	
7	TROMPO MEZCLADOR	2	D	D	D	D	D	D	
8	PULIDORA 4"	MAKITA-002	D	D	D	D	D	D	
COLEGIO SAN JOSÉ DE USME									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	PULIDORA	MAKITA 001	X	T	T	T	T	T	
2	TROMPO MEZCLADOR	2	X	T	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	I	I	X	I	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MARTILLO DEMOLEDOR	QURIMA	X	X	T	T	T	T	
2	MARTILLO DEMOLEDOR	1	X	X	T	T	T	T	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	I	I	I	I	
COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL									
			LU			JU			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	T	T	T	T	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	T	T	T	T	T	T	
3	PLANTA ELECTRICA	1	D	D	D	D	D	D	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO

HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	T	T	
2	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	T	T	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA									
			SEMANAL No.			34			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS								
PERIODO DEL INFORME:		DEL	lunes, 17-jun.-24		AL	domingo, 23-jun.-24		
SEMANA REPORTADA:								
Usminia sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Fernando González Ochoa								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede B								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Chuniza								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede A								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A
SABADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

IED Campestres Jaime Garzón - Auras								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Vivienda docente - Campamento								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m		x		x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
DILE Sumapaz								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Rural Las Mercedes								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m		x		x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
San José de Usme - Don Bosco 2								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m		x		x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
Diego Cuellar sede C								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m		x		x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12:00 p.m				x	N/A
DOMINGO	23/06/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto

[illegible]**OBSERVACIÓN :**

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo

[illegible]

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	17/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MARTES	18/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	19/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
JUEVES	20/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	21/06/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	22/06/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	23/06/2024			NO SE REALIZAN ACTIVIDADES				

OBSERVACIÓN :



INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

1

Fecha

2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA:

1/7/2024

Semana No.

35

Del :

lunes, 24 de junio de 2024

AL:

domingo, 30 de junio de 2024

Plazo Total

300

días

Plazo Transcurrido

245

Nombre del Supervisor :

Arq Jorge Alberto Moreno Aldana

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELAN TAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,00%	80,00%	(%) Ejecutado	4,00%	67,00%
Valor programado (\$)	\$ 250.175.507,82	\$ 6.212.625.134,61	Valor ejecutado (\$)	\$ 0,00	\$ 3.750.901.473,65
			Evaluación	-13,00%	Atraso en la ejecución


DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	Contrato No:	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	\$ 7.608.734.174	Valor del contrato:	\$ 504.428.924
Plazo:	8 meses	Plazo:	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	Fecha de terminación:	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión N° 1:	N/A	Fecha de suspensión N° 1:	N/A
Fecha de reinicio N° 1:	N/A	Fecha de reinicio N° 1:	N/A
Prórroga N° 1:	2 meses	Prórroga N° 1:	2 meses
Plazo final:	29 de agosto de 2024	Plazo final:	18 de septiembre de 2024
Fecha de vencimiento final:	N/A	Fecha de vencimiento final:	N/A
Fecha de suspensión N° 2:	N/A	Fecha de suspensión N° 2:	N/A
Suspensión N. 3	N/A	Suspensión N. 3	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	Fecha reinicio N. 2	N/A
Prórroga N° 2:	N/A	Prórroga N° 2:	N/A
Plazo final:	N/A	Plazo final:	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A
Adición	N/A	Adición	\$ 89.178.296
Valor total contrato	\$ 7.608.734.174	Valor actualizado contrato	\$ 593.607.220

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	\$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
2	Fernando González Ochoa	580	Usme	\$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Instalación de bomba eyectora	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	\$ 542.722.842,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Detalles de la entrega física de la obra
4	Chuniza	512	Usme	\$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Ajuste a observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	100,00%	100,00%	Mantenimiento de pozo séptico	Ninguna
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	\$ 750.000.000,00	100,00%	98,00%	Demolición de zanjas para la instalación de drenaje de aguas lluvias. Pintura en bloque laboratorios. Instalaciones eléctricas: instalación de tubería EMT e luminarias en bloque administración. Pañete de muros sobre culetas de fachada posterior de laboratorio. Excavación de zanja y caja de inspección para bajantes. Instalaciones eléctricas: instalación de luminarias. Instalación de vidrios en el balcón del bloque administración. Instalación de tuberías sanitaria para drenaje de cubierta. Pintura en muros exteriores del bloque biblioteca.	Pintura, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	\$ 811.831.873,00	100,00%	91,00%	Remates de pintura en bloque emisora. Fundida de cañuela atrás del bloque almacén. Demolición de enchape de muros y piso en terraza del bloque vivienda docente. Demolición de lavaderos del bloque vivienda docente. Demolición de sobre piso en terraza del bloque vivienda docente. Desmonte de instalaciones eléctricas en zona de lavado del bloque vivienda docente. Mortero de nivelación en terraza de bloque vivienda docente. Instalación de lavaderos	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras

8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	\$ 411.446.316,00	100,00%	59,00%	Instalaciones eléctricas: instalación de tubería EMT y cajas metálicas. Pañete de muros internos. Pintura interna. Instalaciones hidrosanitarias. Fundida de placa de contrapiso en habitaciones. Instalación de cubierta en los bloques 1 y 2. Instalación de caballete. Conformación de muro divisorio en cocina y pañete del mismo.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aparatos sanitarios, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	\$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	2020	Sumapaz	\$ 799.914.269,00	30,00%	14,00%	Instalación de tubería sanitaria. Instalación de duro piso en aula 4y 5. Extendido y compactación de material en pasillo de baños y cocina. Estuco en muros del pasillo. Instalación de malla electrosoldada para placa de pasillo. Fundida de placa de pasillo.	Construcción de cocina, cambio de acabado de pisos, entre otros
11	Diego Cuellar sede C	542	Usme	\$ 344.210.600,00	100,00%	55,00%	Pulida de baldosa de granito pulido en las aulas del segundo piso. Instalación de tubería hidráulica en baños de niños y niñas. Pañete de muros de los baños. Enchape de muros de los baños. Demolición de escalera Instalación de escalera metálica.	Pintura de cancha, instalación de escalera metálica, guardaesoba en aula, entre otras
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	2017	Sumapaz	\$ 337.709.778,00	36,00%	35,00%	Fundida de dados de soporte para la estructura del pasillo. Instalación de duro piso en pasillo comedor. Instalación de guardaesoba en pasillo comedor. Pintura en antepecho del pasillo. Enchape de muro en baño vivienda docente. Demolición de enchape de muro y piso atrás de vivienda de docentes. Cargue de sobrepiso atrás de vivienda de docentes. Enchape en mesón cocina de vivienda docentes. Resane y estuco en muros pasillo.	Instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, entre otras
13	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	\$ 635.000.000,00	100,00%	18,00%	Instalación de lámina metaldeck. Instalación de malla electrosoldada para placa. Fundida de placa de contrapiso en la ampliación de la cocina. Instalación de estructura metálica para cubierta. Instalación de cubierta en ampliación de cocina.	Construcción de cocina, instalaciones eléctricas, entre otros
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	\$ 210.861.638,00	100,00%	37,00%	Soldadura de estructura metálica de vigas de cubierta. Instalación de estructura metálica para cubierta.	Instalación de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras.
15	Rural Las Mercedes	534	Usme	\$ 447.180.697,00	100,00%	35,00%	Demolición de piso en baño docente. Mampostería en baño docente. Demolición de muro para ventana de entrega de alimentos. Pañete en muros de baños y muros fachada. Fundida de viga de coronación. Conformación de muro colindante de la escalera entrada a cancha. Instalación de malla electrosoldada para escalera entrada a cancha. Fundida de escalera entrada a cancha. Cuchillas en mampostería.	Construcción de cocina, pintura, instalaciones eléctricas, entre otros
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	2026	Sumapaz	\$ 599.909.029,00	36,00%	0,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, entre otras
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no realizaron actividades	ajuste de observaciones
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	95,00%	Auras: durante la semana no realizaron actividades	Ajuste de puertas
		E			100,00%	100,00%	Betania: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	90,00%	Capitolo: durante la semana no realizaron actividades	Mantenimiento de pozo
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	80,00%	Tunal Alto: durante la semana no realizaron actividades	Culminación de instalación de aulas provisionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
COMPONENTE SG-SST				
<div>Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, exámenes médicos de ingreso).</div> <div>Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios.</div> <div>Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo.</div> <div>Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra.</div> <div>Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios.</div> <div>Verificación entrega de dotación al personal.</div> <div>Revisión informes de gestión SST semanal y mensual.</div> <div>Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.</div>				
<div>Incidentes y/o accidentes:</div> <div>Durante el presente periodo no se presentaron, incidentes, accidentes o daños a terceros.</div>				
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA:				
<div>Seguimiento y control de la programación de obra.</div> <div>Remisión de solicitudes al constructor.</div> <div>Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra.</div> <div>Acta de comité de obra.</div>				
REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA				
PERSONAL OBRA		PERSONAL INTERVENTORIA		MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra		Anexo Personal Contrato Interventoría		Anexo Control de Equipos
SEGUIMIENTO FINANCIERO				
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA				
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 69.413.115,00	Valor Total Contrato Obra	
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 482.429.484,00	\$ 7.608.734.174,00	
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 1.022.204.883,00	Valor facturado Contrato Obra	
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 868.448.638,00	\$ 4.104.842.041,00	
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 623.934.436,00	% Avance facturado Acumulado	
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 330.689.502,00	54%	
7	30 de abril de 2024 a 29 de mayo de 2024	\$ 707.721.983,00	Saldo por Facturar	
8			\$ 3.503.892.133,00	
Total Acumulado	\$	4.104.842.041,00		
AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1	10 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	\$ 4.539.860,00	Valor Total Contrato Interventoría	
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	\$ 32.031.237,00	\$ 593.607.220,00	
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	\$ 67.795.247,00	Valor facturado Contrato Interventoría	
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	\$ 57.555.340,00	\$ 304.261.420,00	
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	\$ 41.363.172,00	% Avance facturado Acumulado	
6	30 de marzo de 2024 a 29 de abril de 2024	\$ 10.686.327,00	51%	
7	30 de abril de 2024 a 29 de mayo de 2024	\$ 90.290.237,00	Saldo por Facturar	
8			\$ 289.345.800,00	
Total Acumulado	\$	304.261.420,00		
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS				
1. La relación de la programación presentada en el capítulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.				
<div></div> <div>FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>NOMBRE: Andrés Felipe Mackenzie Fuentes</div>				

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	35	DEL	24-jun-24	AL	30-jun-24
---------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

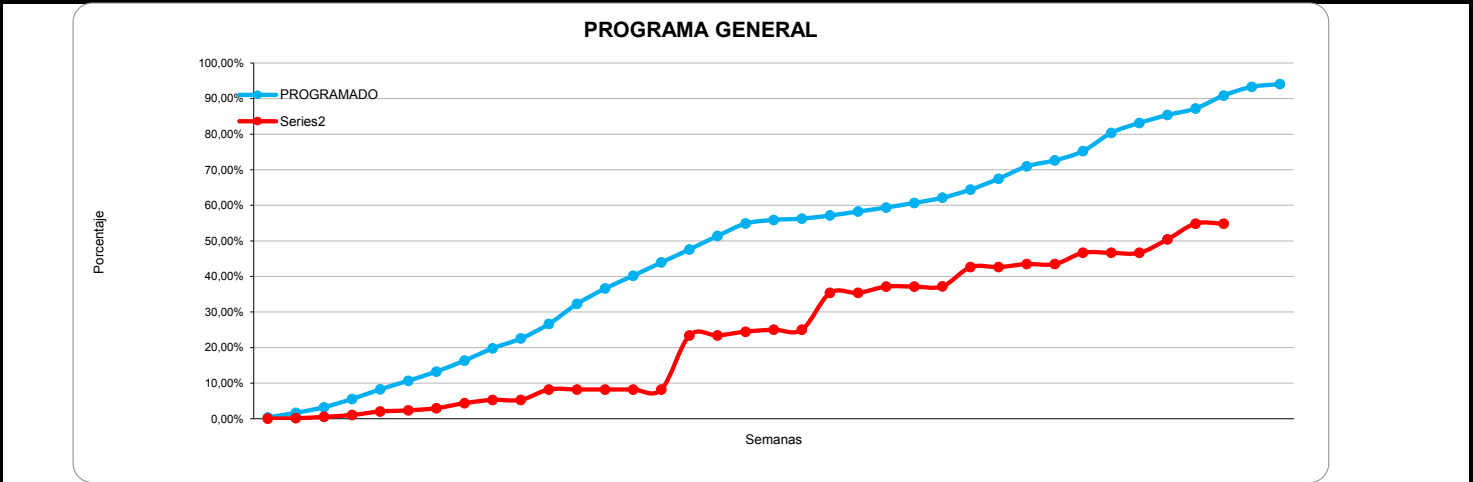
\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

SEMANA No.	35	DEL	24-jun-24	AL	30-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

PROGRAMACIÓN DE OBRA								
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO
PROGRAMA GENERAL		\$ 6.836.684.830	300,00	90,87%	54,86%	-36,01%	164,59	272,62
1	Usminia sede B	\$ 349.948.209	92,00	100,00%	103,32%	3,32%	95,05	92,00
2	Fernando González Ochoa	\$ 353.157.411	92,00	100,00%	90,43%	-9,57%	83,20	92,00
3	Diego Cuellar sede B	\$ 542.722.842	60,00	100,00%	151,13%	51,13%	90,68	60,00
4	Chuniza	\$ 236.826.369	92,00	100,00%	151,49%	51,49%	139,37	92,00
5	DILE Sumapaz	\$ 15.242.011	50,00	100,00%	198,68%	98,68%	99,34	50,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	\$ 750.000.000	92,00	100,00%	83,62%	-16,38%	76,93	92,00
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	\$ 811.831.873	90,00	100,00%	78,02%	-21,97%	70,22	90,00
8	Vivienda docente - Campamento	\$ 411.446.316	90,00	100,00%	65,86%	-34,14%	59,27	90,00
9	Diego Cuellar sede A	\$ 253.419.631	60,00	100,00%	55,37%	-44,63%	33,22	60,00
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	\$ 658.356.852	90,00	59,09%	0,00%	-59,09%	0,00	53,18
11	Diego Cuellar sede C	\$ 344.210.600	90,00	100,00%	20,00%	-80,00%	18,00	90,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	\$ 216.571.352	92,00	61,14%	0,00%	-61,14%	0,00	56,25
13	San José de Usme - Don Bosco 2	\$ 635.000.000	90,00	100,00%	6,97%	-93,03%	6,27	90,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	\$ 210.861.638	89,00	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00	89,00
15	Rural Las Mercedes	\$ 447.180.697	89,00	100,00%	16,95%	-83,05%	15,08	89,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	\$ 599.909.029	92,00	48,42%	0,00%	-48,42%	0,00	44,55
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
VALOR PRESUPUESTADO		\$ 6.836.684.830						



OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integralmente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div> <div>BOGOTÁ</div>			PERSONAL CONTRATO OBRA FIRMA CONSORCIO CLARIDAD							
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA										
LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL										
NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	2805/2024
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/1/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/4/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/4/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/1/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/1/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSA SALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/1/2024	19/4/2024
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/2/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/4/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/4/2024	N/A
21	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024 APROBADO 29-06-2024	N/A
22	DANIELA GRAVIER ORTIZ	1143258116	3173065906	INSPECTORA SST	SANITAS EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	45467	N/A
1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A										
23	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/1/2024
24	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/4/2024
25	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
26	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/4/2024
27	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/2/2024
28	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/4/2024
29	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/1/2024
30	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/4/2024
31	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/1/2024
32	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
33	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/2/2024
34	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
35	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/2/2024
36	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/1/2024	31/1/2024
37	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/3/2024
2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALEZ OCHOA										
38	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
39	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
40	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/1/2024
41	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
42	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
43	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
44	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
45	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/1/2024	31/1/2024
46	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/1/2024	N/A
47	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/1/2024	N/A
48	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/1/2024	30/12/2023
49	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/1/2024	N/A
50	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/1/2024	N/A
51	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/2/2024	11/3/2024
52	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/2/2024	N/A
53	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/2/2024	N/A
54	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/2/2024	N/A
55	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/2/2024	N/A
56	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/3/2024	N/A
57	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/3/2024	N/A
58	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/3/2024	N/A
3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
59	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
60	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134658896	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/3/2024
61	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
62	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1062370985	3102569786	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/1/2024
63	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
64	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/1/2024	3/3/2024
65	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/1/2024	29/2/2024
66	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	5/2/2024	31/3/2024
67	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/2/2024	10/5/2024
68	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/2/2024	10/5/2024
69	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/4/2024	19/9/2024
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNION - SUMAPAZ										
70	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
71	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
72	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023

73	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
74	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/1/2024
75	ANGELO HYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
76	WILMAN STURTEND PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/1/2024
77	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
78	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
79	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
80	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
81	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
82	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
83	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
84	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
85	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
86	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/1/2024	1/2/2024
87	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/1/2024	N/A
88	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/1/2024	28/2/2024
89	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/1/2024	28/2/2024
90	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/1/2024	N/A
91	BRAYAN CAMILO USMA MUNIVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/1/2024	28/2/2024
92	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/1/2024	28/2/2024
93	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/2/2024	28/2/2024
94	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/2/2024	N/A
95	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/2/2024	N/A
96	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/2/2024	N/A
97	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/2/2024	28/2/2024
98	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/2/2024	N/A
99	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/2/2024	N/A
100	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/2/2024	N/A
101	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/2/2024	24/5/2024
102	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/3/2024	N/A
103	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942	3124569685	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/4/2024	NO INGRESO
104	JHON EDWIN APONTE TORRES	1069230085	3214994825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/4/2024	N/A
105	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3152456996	INSPECTOR DE OBRA DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/6/2024	N/A
106	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ	1057583536	3147489699	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/5/2024	N/A
107	JOHN ALEXANDER PIRACHICAN PARRA	1075672570	3102459665	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/5/2024	N/A
108	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	21/5/2024	N/A
109	LUIS EDUARDO BOLIVAR TIBOCHA	9636438	SIN INFORMACIÓN	APOYO INSPECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	SIN INFORMACIÓN	COLPENSIONES	3/6/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
110	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
111	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
112	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/1/2024	26/2/2024
113	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/1/2024	26/2/2024
114	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/2/2024	26/2/2024
115	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/3/2024	N/A
116	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/3/2024	N/A
117	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/3/2024	N/A
118	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
119	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
120	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/3/2024
121	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706885	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
122	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/3/2024	N/A
123	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/3/2024	N/A
124	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/3/2024	N/A
125	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
126	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
127	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
128	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
129	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
130	GINO SAMIR OBANDO	16629250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
131	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
132	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
133	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
134	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
135	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/1/2024	N/A
136	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/2/2024	N/A
137	CARLOS ANDRES BALLEEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/2/2024	N/A
138	DAVID STIVEN LOPEZ LANCHEROS	1010188018	SIN INFORMACIÓN	OFICIAL DE PINTURA	SALUD TOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	22/5/2024	N/A
139	JULIAN ANDRES GAONA TOBOS	1024497888	3104587485	AYUDANTE ELECTRICO	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	7/6/2024	N/A
140	ADAN DE JESUS OROZCO PARRA	1010176236	3145415455	AYUDANTE DE PINTURA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/6/2024	N/A
6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
141	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3152943678	TECNICO OPERATIVO	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
142	ANDRES FELIPE NIÑO CANO	1015440804	3152957485	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	1/5/2024	N/A
143	YEISON ARTURO RIVERA PINEDA	1002340214	3132640640	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	22/5/2024	N/A
144	SACHARIEL CASTAÑO OLMOS	1193241753	3206469768	AYUDANTE DE OBRA	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	11/6/2024	17/06/2024
145	ELKIN JOSE ZAMBRANO GONZALEZ	73558523	3103254765	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	10/6/2024	N/A
146	ALFREDO ZAMBRANO JINETE	3830366	3115297547	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	N/A	PORVENIR	10/6/2024	N/A
147	MICHAEL ESTY GARCIA PIINTO	1024601987	3124639664	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	19/2/2024	N/A
148	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1012349430	3115837547	APOYO INSECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/6/2024	N/A
149	LUIS MIGUEL GARCIA PINTO	1001272063	3129797547	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	14/6/2024	N/A
150	LUIS EINER HERNANDEZ PAVA	1024495430	314567035	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	5/2/2024	N/A
151	CRISTIAN HERNANDEZ PAVA	1024536127	3202269182	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	3/2/2024	N/A
152	PABLO JOSE GUAYAN POLO	1000241613	3106945375	GESTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	1/5/2024	N/A
153	JUAN DANIEL MORA PEÑALOZA	1073671343	3106845376	TECNICO DE MONTAJE	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCION	1/5/2024	N/A
154	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3017934675	AUXILIAR TECNICO	SANITAS EPS	SURA	N/A	COLFONDOS	4/4/2024	N/A
155	WILLAM ANDRES CALDERON PARRA	80.744.758	3204576978	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	COLPENSIONES	14/5/2024	N/A
156	POLO MURCIA ADRIAN ORLANDO	79956551	3208765334	JEFE DE PRODUCCIÓN	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PROTECCION	4/4/2024	N/A
157	DANIEL FRANCISCO TRUJILLO ESPINOZA	1075299743	3035914374	CNICO DE MONTAJE ELECTROMECHANICO	NUEVA EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	COLPENSIONES	1/5/2024	N/A

158	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3106286754	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/4/2024	N/A
159	LUIS MIGUEL GARCIA PINTO	1001272063	3054568594	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	COMPENSAR EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/6/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
160	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	3217956745	CONDUCTOR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/6/2024	N/A
161	JOSE ELVER OLAYA MEDINA	80742548	3137658749	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	18/6/2024	N/A
162	FLORENTINO ROMERO LOPEZ	79217864	3125869875	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	18/6/2024	N/A
163	CARLOS ANDRES OCAMPO ALARCON	1022996056	3205985647	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/6/2024	N/A
164	MILTON MORENO IBARGUEN	4816179	310296876	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/6/2024	N/A
165	ROSENDO GARCIA PRADA	1022978343	313978648	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/6/2024	N/A
166	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	321567864	INGENIERA	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/6/2024	N/A
167	CRISTIAN CAMILO VILLALOBOS ROZO	1023966141	321796745	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/6/2024	N/A
168	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	301597867	INGENIERO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	20/6/2024	N/A
169	FABIO DE JESUS PATIÑO CARDENAS	18414360	3142943765	MESTRO	SANITAS EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSION ES	21/6/2024	N/A
8. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEO MONTANA CUELLAR SEDE C										
170	OMAR RAMON GRATEROL TERAN	5845450	3028050870	CONDUCTOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	27/11/2023	N/A
171	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79243511	3016985674	GERENTE DE OPERACIONES	FAMISANAR	ROS DE VIDA COLI	COMPENSAR	COLPENSIONES	26/6/2024	N/A
172	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3142785647	AUXILIAR DE OBRA	SALUD TOTAL	ROS DE VIDA COLI	COMPENSAR	COLFONDOS	26/6/2024	N/A
173	VICTOR JOSE RIVAS HERNANDEZ	1277014	3159876543	SOLDADOR	FAMISANAR	ROS DE VIDA COLI	COMPENSAR	PROTECCION	26/6/2024	N/A
174	FABIAN RIVERA MARBELLO	1012349809	32011984657	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/6/2024	N/A
175	DAVID CARRILLO QUIÑONEZ	1005854583	3145284658	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	3/2/2024	N/A
176	WILMER HERNANDEZ PAVA	1000972780	3117924365	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	17/3/2024	N/A
177	DAVID FERNANDO DEDE SANCHEZ	1063961267	3054086059	APOYO ADMINISTRATIVO	SANITAS	SURA	N/A	PROTECCION	29/9/2023	N/A
178	JAIRO ANDRES ROBAYO SANTAMARIA	1003564973	3212945678	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	N/A	PORVENIR	14/5/2024	N/A
179	JORDAN STEVEN PAEZ RODRIGUEZ	1012453068	3135698674	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	15/6/2024	N/A
9. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO SAN JOSE DE USME SEDE A										
180	CARMEN LILIANA POLO MURCIA	1077844556	3142678498	ANALISTA SGI	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PORVENIR	1/5/2024	N/A
181	NICOLAS JULIO FLOREZ COLLANTES	12641974	3128764956	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	N/A	COLPENSIONES	8/5/2024	N/A
182	HECTOR MAURICIO PULIDO SANCHEZ	1023899901	3149763676	PINTOR	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	15/6/2024	N/A
183	MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	3215768906	MAESTRO DE OBRA	EPS SURA	SURA	N/A	COLFONDOS	6/5/2024	N/A
184	EDISON ALEXANDER GONZALEZ VELEZ	70256056	3156387689	MAESTRO DE OBRA	FAMISNAR	SURA	N/A	PROTECCION	6/5/2024	N/A
185	ANDRES AGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
10. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL										
186	JEFERSON OVIEDO ARRIETA	1063300404	3104587485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/5/2024	N/A
187	OSCAR RAFAEL BITAR BENITEZ	1063291359	315699333	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/5/2024	N/A
188	ERLYN ENRIQUE SIMANCA CACERES	1064800199	3102354145	SOLDADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/5/2024	N/A
189	ANDRES ELIAS AVILA MORENO	1007795040	3057848589	SOLDADOR	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	27/5/2024	N/A
11. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO										
190	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674	3105668482	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/4/2024	N/A
191	JOHN FREDY SANABRIA CHIQUILLO	1075678799	3234899582	AUXILIAR DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/5/2024	N/A
192	EDISON DAVID SANDOVAL MONSALVE	1075679785	3204749548	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	18/5/2024	N/A
12. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO										
193	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/1/2024	N/A
194	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/1/2024	N/A
13. LISTADO DE TRABAJADORES GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA										
195	WILLIAM MEDINA PINZON	80418856	3147418996	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	31/5/2024	N/A
196	LUIS MIGUEL BORNANCELLI MUZO	7573521	3102544144	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	FAMISANAR	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
197	JOSE GILBER SALAZAR CHACON	6031780	3125477488	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SANITAS	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	6/6/2024	N/A
Observaciones:										

	INGRESOS	RETIROS
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	0	0
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO CHUNIZA:	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0 ENTREGA TOTAL
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	5	0
RURAL LAS MERCEDES	0	5
SAN JOSÉ DE USME	4	0
DIEGO MONTAÑA SEDE C	2	0
EL RAIZAL	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO	0	0
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA	0	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	11	0
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		5

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO
COLEGIO USMINIA SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO CHUNIZA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA
--



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

SAN JOSÉ DE USME



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE C



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TOLDO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - RAIZAL



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



AVANCE: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO



AVANCE: TUNAL ALTO

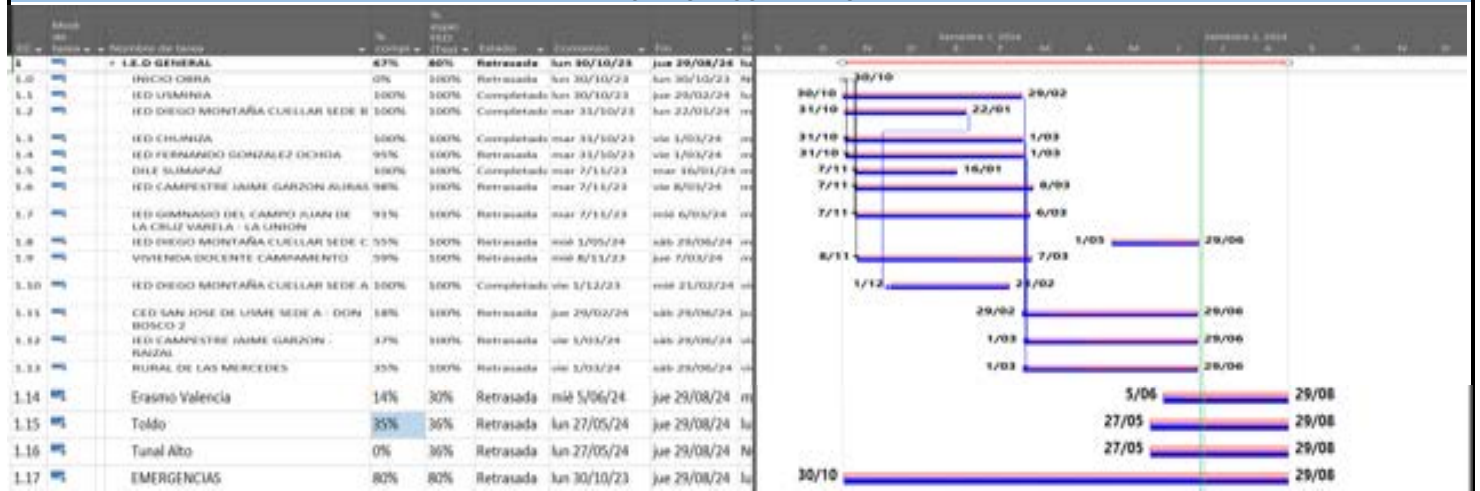


AVANCE: TUNAL ALTO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	35	DEL	24-jun-24	AL	30-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

OBRAS PROGRAMADAS



PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando González Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/4/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/1/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	5/6/2024	6/6/2024	-1
Diego Cuellar sede C	21/2/2024	8/5/2024	-77
San José de Usme - Don Bosco 2	29/2/2024	6/5/2024	-67
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/3/2024	28/5/2024	-88
Rural Las Mercedes	1/3/2024	8/4/2024	-38
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	27/5/2024	28/5/2024	-1
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	27/5/2024	28/5/2024	-1
Emergencias	4/1/2024	4/1/2024	0

[illegible]

PERIODO DEL INFORME:			SEMANAL No. 35							
SEMANA REPORTADA: lunes, 24 de junio de 2024			AL				domingo, 30 de junio de 2024			
COLEGIO USMINIA SEDE B										
			SEMANAL No. 35							
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO	
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16	
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X		
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X		
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X		
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X		
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X		
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X		
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X		
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X		
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X		
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X		
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X		
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X		
COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA										
			SEMANAL No. 35							
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO	
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16	
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X		
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X		
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X		
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X		
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X		
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X		
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X		
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X		
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X		
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X		
11	SOPLATE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X		
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X		
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X		
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X		
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X		
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X		
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X		
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X		
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X		
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X		
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X		
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X		
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X		
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X		
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X		
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B										
			SEMANAL No. 35							
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO	
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16	
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X		
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X		
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 - UBERMAN	X	X	X	X	X	X		
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	X	X	X	X	X	X		
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	X	X	X	X	X	X		
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	X	X	X	X	X	X		
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X		

8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
10	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	X	X	X	X	X	X	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	X	X	X	X	X	X	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	SKIL 9002-231	X	X	X	X	X	X	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.		35				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA350	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.		35				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	VOLQUETA	PLACA: AEH-950 COLOR AZUL	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	VOLQUETA	PLACA: AJB-925 COLOR AZUL	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	VOLQUETA	PLACA: CSI118	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	CAMION	WNN-018 COLOR BLANCO	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A
5	TROMPO MEZCLADOR	CORMAG	T	T	I	X	X	X	X
6	PULIDORA 4"	TRUPER	T	T	T	T	T	D	D
7	PULIDORA 9"	BOSCH	T	T	T	T	T	D	D
8	EQUIPO DE SOLDURA	WALL QUUQUALITY TOOLS	T	T	T	T	T	T	T
9	COMPRESOR	EINTELL	X	X	X	X	X	X	X
10	EQUIPO DE SOLDURA	WEST ALCO	T	T	T	T	T	T	T
11	CORTADORA MANUAL	RUBI	T	T	T	T	T	D	D
12	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	DELWAT	T	T	T	T	T	D	D
13	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	X	X	X	X	X	X	X
14	ARNES (3)		D	D	D	D	D	D	D
15	ESLINGAS (3)		D	D	D	D	D	D	D
16	ANDAMIO (2)		D	D	D	D	D	D	D
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.		35				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	CAMION	PPT 5845450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PULIDORA 4"	TRUPER	T	D	D	D	D	D	D
3	EQUIPO DE SOLDURA	BAUKER	D	D	T	D	T	T	T
4	EQUIPO DE SOLDURA	BAUKER	D	D	D	D	D	D	D
5	COMPRESOR	EINHELL	D	D	T	D	T	T	T
6	ARNES (3)		T	T	T	T	T	T	T
7	ESLINGAS (3)		T	T	T	T	T	T	T
8	ANDAMIO (2)		T	T	T	T	T	T	T
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.		35				
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	TROMPO MEZCLADOR	CODIGO #01 COLOR AZUL REY	D	D	D	D	D	D	N/A

2	PULIDORA	MAKITA	D	D	D	D	D	D	N/A
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	TALADRO INALAMBRICO	BOSCH	N/A	N/A	N/A	T	T	T	N/A
2	TALADRO PERCUTOR	DEWALT	N/A	N/A	N/A	T	T	T	N/A
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	PULIDORA	DEWALT	T	T	T	T	T	T	N/A
COLEGIO SAN JOSÉ DE USME									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			10	11	12	13	14	15	16
1	TROMPO MEZCLADOR	CODIGO #01 COLOR AZUL REY	D	D	D	D	D	D	N/A
2	PULIDORA	MAKITA	D	D	D	D	D	D	N/A
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			24	25	26	27	28	29	30
1	EQUIPO DE SOLDADURA	ELITE	N/A	N/A	N/A	T	T	T	N/A
2	MATILLO DEMOLEDOR	QURIMA	N/A	N/A	T	N/A	N/A	N/A	N/A
3	PULIDORA	TRUPER	N/A	N/A	N/A	T	T	T	N/A
4	COMPRESOR	ELITE	N/A	N/A	N/A	T	T	T	N/A
COLEGIO IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL									
			LU			JU			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			24	25	26	27	28	29	30
1	ANDAMIO (2)		T	T	T	T	T	T	
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - EL TOLDO									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			24	25	26	27	28	29	30
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - TUNAL ALTO									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			24	25	26	27	28	29	30
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - ERASMO VALENCIA									
			SEMANAL No.			35			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			24	25	26	27	28	29	30
1	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	T	T	T	T	T	D	D
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			10	11	12	13	14	15	16
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

IED Campestres Jaime Garzón - Auras															
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL							
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A							
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A							
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES													
OBSERVACIÓN :															
Vivienda docente - Campamento															
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL							
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A							
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A							
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A							
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES													
OBSERVACIÓN :															
DILE Sumapaz															
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL							
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A							
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A							
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES													
OBSERVACIÓN :															
Rural Las Mercedes															
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL							
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A							
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m		x		x	N/A							
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A							
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES													
OBSERVACIÓN :															
San José de Usme - Don Bosco 2															
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL							
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A							
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A							
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A							
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m</												

IED Campestres Jaime Garzón - Raizal								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
<u>OBSERVACIÓN :</u>								

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
<u>OBSERVACIÓN :</u>								

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5:00 p.m				x	N/A
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5:00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5:00 p.m				x	N/A
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5:00 p.m	x			x	N/A
SÁBADO	29/6/2024	7:00 a.m	12:00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	24/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	25/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
MIÉRCOLES	26/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	27/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
VIERNES	28/6/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x			x	N/A
SABADO	29/6/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	30/6/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						
OBSERVACIÓN :								

G. Pólizas

G.1. Interventoría



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15	NO.PÓLIZA 15-44-101284899	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
31 05 2024	19 10 2023		00:00	19 07 2029		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CB INGENIEROS S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.509.943-7
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5313332 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL LOTE NO 5.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/10/2023	18/06/2025	\$118,721,444.20	\$100,885,784.80
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2024	19/07/2029	\$118,721,444.20	\$100,885,784.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/10/2023	18/09/2027	\$59,360,722.10	\$50,442,892.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION NRO 1 DONDE SE ADICIONA LA SUMA DE \$89.178.297 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****343,641.00	\$ *****8,000.00	\$ *****66,811.00	\$ *****418,453.00	\$ *****296,803,610.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE				COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101284899		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31	05	2024	19	10	2023	00:00	19	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CB INGENIEROS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.509.943-7			
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7040592		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9			
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3241000		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF052848A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284899, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de MAYO de 2024

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15	NO.PÓLIZA 15-44-101284899	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
31 05 2024	19 10 2023		00:00	19 07 2029		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CB INGENIEROS S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.509.943-7
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3241000
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****343,641.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****66,811.00	TOTAL A PAGAR \$ *****418,453.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****296,803,610.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11002613551617 (3900) 000000418453 (96) 20250530

REFERENCIA
PAGO:
1100261355161-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

G.2. Obra

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
3605319775**

PÓLIZA No: 360-47-994000028999

ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA**

COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
06 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
06 06 2024
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO CLARIDAD**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: **CR 80 A 25 C 19**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **3134412819**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO	05/09/2023	29/04/2025	1,521,746,834.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2023	29/08/2027	760,873,417.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		1,521,746,834.80

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901059450	-	C H M INGENIERIA SAS	-	PART: 33.00%
NIT 901241893	-	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	-	PART: 33.00%
CC 79109085	-	ORTIZ BELLO, NESTOR ALFONSO	-	PART: 34.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,804,367,087.00	VALOR PRIMA: \$ *****610,366	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****115,970	TOTAL A PAGAR: \$ *****726,336
---	--	---	--------------------------------	--

NOMBRE INTERMEDIARIO DPS ASESORES LTDA	CLAVE 8806	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	----------------------	------------------------	----------------------------------	-------	-----------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000360531977

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDDE207D0807FC7C5A

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000028999 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO CLARIDAD	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.745.447-4
ASEGURADO:	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN:	NIT	899.999.061-9
BENEFICIARIO:	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN:	NIT	899.999.061-9

TEXTO ITEM 1

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO # 5

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

CUMPLIMIENTO DESDE 30/10/2023 AL 01/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 30/10/2023 AL 29/06/2027.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON MODIFICACIÓN No. 01 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA POR DOS (2) MESES QUEDANDO COMO FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO EL 29 DE AGOSTO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**

3605320138

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000008142 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA**

COD. AGE: 360

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO
06 06 2024

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS
29 06 2024 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS
29 08 2024 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO
06 06 2024

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO **PRORROGA**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS
29 06 2024 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS
29 08 2024 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CLARIDAD**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: **CR 80 A 25 C 19**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **3134412819**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO CLARIDAD**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: **CR 80 A 25 C 19**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **3134412819**

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **CONSORCIO CLARIDAD**

NIT : **901745447**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **DISTRITO CAPITAL**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C.**

DIRECCION: **LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CPF 535 USMINIA - LORENZO ALCANTUZ**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **COMERCIAL**

MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 580,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	580,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	58,000,000.00		
	RCE PATRONAL	58,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	58,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO # 5

CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:
CHM INGENIERIA SAS NIT:901059450-4 PART:33%
MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT:901241893-2 PART:33%
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO CC 79.109.085 PART:34%

NOTA:
ASEGURADO:CONSORCIO CLARIDAD Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***580,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****242,329	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****46,042	TOTAL A PAGAR: \$ *****288,371
---	--	---	-------------------------------	--

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000360532013

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

LAPEREZ 0

CDDE207D0807FC7D5F

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA

COD. AGENCIA: 360

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000008142 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO CLARIDAD

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.745.447-4

ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.745.447-4

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA:

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

-COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE LA SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL.

-COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.

-COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

****MODIFICACIÓN****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

DESDE 30/10/2023 AL 29/06/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

****MODIFICACIÓN****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON MODIFICACIÓN No. 01 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA POR DOS (2) MESES QUEDANDO COMO FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO EL 29 DE AGOSTO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008142		ANEXO: 2	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: CONSORCIO CLARIDAD		IDENTIFICACION: 901.745.447-4		

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO CLARIDAD	901745447-4	LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CP	BOGOTÁ, D.C.	580,000,000.00	242,329	288,371
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					242,329	288,371	

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**

3605320138

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000008142 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGE: **360** RAMO: **74** PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	
06	06	2024	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	05	09	2023	23:59		29	08	2024	23:59	359	06	06	2024	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DÍAS	FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION													

TIPO DE MOVIMIENTO		DIA					MES					AÑO					HORAS					DIAS				
MODIFICACION		VIGENCIA DEL ANEXO					05	09	2023	23:59	29	08	2024	23:59	359											
							VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS							

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	CONSORCIO CLARIDAD		IDENTIFICACIÓN: NIT 901.745.447-4
DIRECCIÓN:	CR 80 A 25 C 19	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 3134412819

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD		IDENTIFICACIÓN: NIT	901.745.447-4
DIRECCIÓN: CR 80 A 25 C 19		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3134412819
BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN:	

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD	NIT : 901745447

ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD CLARIDAD NIT : 901745447

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CPF 535 USMINIA - LORENZO ALCANTUZ

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 650,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	65,000,000.00		
	RCE PATRONAL	65,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	65,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023 CUYO OBJETO ES: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO # 5

CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:
CHM INGENIERIA SAS NIT:901059450-4 PART:33%
MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT:901241893-2 PART:33%
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO CC 79.109.085 PART:34%

NOTA:
ASEGURADO:CONSORCIO CLARIDAD Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****70,000,000.00	\$ *****172,123	\$ *****0.00	\$ *****32,703	\$ *****204,827

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR _____

(415)7701861000019(8020)000000000007000360532013

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

LAPEREZ 0

CDDE207D0807FC7B5F

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Companhia de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA

COD. AGENCIA: 360

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000008142 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO CLARIDAD

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.745.447-4

ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.745.447-4

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA:

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

-COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE LA SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL.

-COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.

-COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

****MODIFICACIÓN****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

DESDE 30/10/2023 AL 29/06/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

****MODIFICACIÓN****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON MODIFICACIÓN No. 01 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA POR DOS (2) MESES QUEDANDO COMO FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO EL 29 DE AGOSTO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

****MODIFICACIÓN****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA CON EL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2023.

500 SMLV \$650.000.000

LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE 30/10/2023, FECHA DEL ACTA DE INICIO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008142		ANEXO: 3	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: CONSORCIO CLARIDAD		IDENTIFICACION: 901.745.447-4		

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO CLARIDAD	901745447-4	LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CP	BOGOTÁ, D.C.	70,000,000.00	172,123	204,827
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					172,123	204,827	

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: NO/0E4CPIZe4Qr8aa6vry8==

No. PÓLIZA	CBC-200000074	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	270140000	No. RIESCO		
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del		30/01/2025		24:00 Horas Del	28/02/2025			
					N/A		N/A	
TOMADOR						CONSORCIO CLARIDAD	No. DOC. IDENTIDAD	091.745.447-4
DIRECCIÓN						CRA 80 A 25C 19	TÉLEFONO	3134412819
ASEGURADO						SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN						CLL 74 A # 63-04	TÉLEFONO	3358000
BENEFICIARIO						BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN						CLL 74 A # 63-04	TÉLEFONO	3358000

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE)	VIGENCIA (HASTA)	30/01/2025	28/02/2025	AMPARO	SUMA
ASEGURADA	MONEDA				
DAÑOS MATERIALES			7,688,734,174.00	\$	
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA			7,688,734,174.00	\$	
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL			7,688,734,174.00	\$	
AMIT - HPAAC			7,688,734,174.00	\$	
MANTENIMIENTO			7,688,734,174.00	\$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES			2,000,000,000.00	\$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES			2,000,000,000.00	\$	
REMOCIÓN DE ESCOMBROS			1,000,000,000.00	\$	

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERRANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como límites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DPS ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	508.698,73
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	508.698,73
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	115.652,76
TOTAL A PAGAR	\$	724.351,49

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, fecha de Pago: 12/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 024 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASSEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALICANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADCO

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: (601) 327 4712 - (601) 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CBC-100000074	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	270148608	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ CHAPINERO		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	30/01/2025	24:00 Horas Del	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, MEDIANTE EL CRONOGRAMA DE OBRA Y EL DOCUMENTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RADICADO I-2024-60810 SE REALIZA PRÓRROGA QUEDANDO CON UNA VIGENCIA ASÍ:

PERIODO CONSTRUCCIÓN

DESDE: 30/01/2023

HASTA: 29/08/2024

PERIODO DE MANTENIMIENTO:

DESDE: 30/08/2024

HASTA: 28/02/2025

ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE:

TOMADOR: CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:

C H M INGENIERIA SAS NIT 901.059.450 - PART: 33.00%

MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.241.893 - PART: 33.00%

ORTIZ BELLO, NESTOR ALFONSO CC 79109085 - PART: 34.00%

NIT: 901.745.447-4

ASEGURADO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:

C H M INGENIERIA SAS NIT 901.059.450 - PART: 33.00%

MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.241.893 - PART: 33.00%

ORTIZ BELLO, NESTOR ALFONSO CC 79109085 - PART: 34.00%

NIT: 899.999.061-9 / 901.745.447-4

BENEFICIARIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:

C H M INGENIERIA SAS NIT 901.059.450 - PART: 33.00%

MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.241.893 - PART: 33.00%

ORTIZ BELLO, NESTOR ALFONSO CC 79109085 - PART: 34.00%

NIT: 899.999.061-9 / 901.745.447-4

MANTENIMIENTO TIPO: AMPLIO

DURACIÓN: 6 (MESES)

PERIODO DE PRUEBAS 4 (SEMANAS)

UBICACIÓN: BOGOTÁ D.C (DISTINTAS UBICACIONES)

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO DE OBRA NO. COI.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023. GRUPO 5

OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO 5

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

270148608

Fecha de Facturación

12/06/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

Póliza No.

CBC-100000074

Periodo Facturado

30/01/2025

28/02/2025

Fecha Límite de Pago

12/07/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

608.698,73

IVA

115.652,76

VALOR TOTAL A PAGAR \$

724.351,49

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO CLARIDAD

CRA 80 A 25C 19

901745447

Intermediario

DPS ASESORES LTDA

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **12/07/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

270148608

Fecha de Facturación

12/06/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

Póliza No.

CBC-100000074

Periodo Facturado

30/01/2025

28/02/2025

Fecha Límite de Pago

12/07/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

608.698,73

IVA

115.652,76

VALOR TOTAL A PAGAR \$

724.351,49

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO CLARIDAD

CRA 80 A 25C 19

901745447

Intermediario

DPS ASESORES LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000270148608(3900)000000724351(96)20240712

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270148608(3900)000000724351(96)20240712

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

H.

Correspondencia

H.1. Enviada



**GRUPO
EMPRESARIAL**

31/05/2024
Bogotá D.C.

SED-US-167-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: APU NO PREVISTO NP 008 - TABLERO DE BALONCESTO.

Respetado señor Pinzón,

En la intervención realizada a la cancha deportiva en el Colegio Chuniza, se evidenció la necesidad de la instalación de un tablero de baloncesto nuevo que permita la práctica de este deporte y con ello aprovechar la intervención en la nueva cancha en esta sede, por ello el contratista de obra mediante el comunicado No. CONS-CLARIDAD-129-2023 del 30 de mayo de 2024 remite el APU No Previsto del tablero de baloncesto.

Se anexan las cotizaciones sobre las cuales el contratista de obra realizó el análisis del No Previsto junto con el editable del análisis realizado en hoja de cálculo. Se anexa cotización de la interventoría con el fin de complementar el estudio de mercado.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 30-05-2024 - CONS-CLARIDAD-129-2023

1. Cotización interventoría
 2. 36222 CONSORCIO CLARIDAD
 3. COTIZACION TABLEROS BALONCESTO
- APU 1.2.35
APUS NO PREVISTOS 008 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-169-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES A NO PREVISTOS NP-011 ESTAMPADO DE CONCRETO Y NP-012 CERRAMIENTO

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio del presente y luego de que esta interventoría revisará la justificación de los No Previstos mencionados en el asunto junto con sus respectivos APU, remitimos las siguientes observaciones:

NP 011:

- El precio del DESMOLDATOC (16KG) no tiene justificación.
- El MOLDE ADOQUIN no es catalogado como material sino como equipo, además el valor no tiene justificación.
- La justificación *ESTE ITEM SE REQUIERE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL URBANISMO, YA QUE EN LA INTERVENCION DE LOS PATIOS DE RECREACION DE LOS COLEGIOS EN LAS AREAS PEATONALES ES NECESARIO ESTAMPAR EL CONCRETO CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES POR RESBALAMIENTOS A LOS ALUMNOS EN CASO DE QUE ESTE HUMEDO EL CONCRETO*, no corresponde, pues no es mantenimiento al urbanismo, por lo cual se debe ajustar.





NP 012:

- Para la actividad no requieren andamio.
- El DISCO CORTE METAL es material no herramienta
- El precio del EQUIPO DE SOLDADURA no concuerda con el precio del ítem tomado 1.1.5.
- El precio del PULIDORA ELECTRICA no concuerda con el precio del ítem tomado 1.1.5.
- No hay soporte del valor del TALADRO PERCUTOR ½.
- El precio del DISCO CORTE METAL no concuerda con el precio del ítem tomado 1.3.4.
- No hay soporte del valor del PERFIL EN ANGULO ESTRUCT. EN ACERO 3".
- No hay soporte del valor de la MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"
- No hay soporte del valor del TUBO CUADRADO 1" Cal. 18
- No hay soporte del valor del PORTACANDADO NEGRO No. 4
- No hay soporte del valor del PLATINA 3/8" x 1 1/2"
- El precio de la PINTURA ESMALTE no concuerda con el precio del ítem tomado 1.1.5.
- El cerramiento es en estructura metálica y no requiere lija ni thinner.
- En cambio de ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO y al ser estructura metálica se debería implementar ANTICORROSIVO GRIS PROTECC. ICO.
- Validar la cantidad de los CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/2" por m2.
- Deben validar el rendimiento de la CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFIC + AYUD + PRES).
- La justificación *ESTE ITEM SE REQUIERE YA QUE EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS ES NECESARIO IMPLEMENTAR CERRAMIENTOS PARA AISLAR LAS AREAS, COMO ES EL CASO DEL GIMNASIO EN PATIO EXTERIOR DEL COLEGIO CHUNIZA, POR LOS EQUIPOS QUE TIENE EL AREA YA QUE ES UN PATIO DE RECREACION*, se debe ajustar, toda vez que en la zona que mencionan no hay equipos.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





**GRUPO
EMPRESARIAL**

31/05/2024
Bogotá D.C.

SED-US-170-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: APU NO PREVISTO NP 010 - INSTALACIÓN DE CUBIERTA.

Respetado señor Pinzón,

Como parte del Plan de Contingencia para la intervención en el colegio Campestre Jaime Garzón (IED) sede Raizal, fue solicitado por parte de la SED la instalación de aulas modulares en la sede de Nazareth que pertenece a este mismo colegio.

Dichas aulas provisionales se instalarán con material que se encuentra en el colegio de General Santander, entre este material se encuentra la cubierta que se tiene contemplado volver a usar para las aulas a instalar en Nazareth, por ello el contratista de obra mediante el comunicado No. CONS-CLARIDAD-129-2023 del 30 de mayo de 2024 remite el APU No Previsto de la instalación de cubierta.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 30-05-2024 - CONS-CLARIDAD-129-2023

APUS NO PREVISTOS 010 (PDF y Excel)

APU 17.1.55

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

04/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-170-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES IMPLEMENTACIÓN PMT - DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio de la presente, de acuerdo con las observaciones dadas por la secretaria de movilidad por la implementación del PMT en el colegio Diego Montaña Cuellar sede C, el pasado 23 de mayo de 2024, mediante comunicado SPMT - 202431205284521, y de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría, se informa que en la inspección realizada el 31 de mayo del presente año, en las instalaciones del colegio IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C, no se ha dado cumplimiento con la observaciones e incumplimientos notificados, como se menciona a continuación:

1- No se cuenta con señalización ni se establece un sendero peatonal, donde se garantice pasos seguros y cómodos para peatones, donde se evite el riesgo de accidente.



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO
EMPRESARIAL

04/06/2024
Bogotá D.C.

2. Se evidencia nuevamente volqueta sobre la bahía frente a la sede DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C, este incumplimiento también fue notificado por la secretaria de Movilidad "Se evidencia volqueta sobre anden, situación no autorizada por la SDM, Generando riesgo para los usuarios del sector".



3. Actualmente se tiene material acopiado en la bahía



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO 
EMPRESARIAL

04/06/2024
Bogotá D.C.

El posible incumplimiento de las áreas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en las evidencias reportadas en el presente comunicado, de acuerdo con los lineamientos exigidos por la entidad contratante y la secretaria de Movilidad. Por lo tanto, se **conmina** al Contratista, se entregue la totalidad de las evidencias del cumplimiento de las exigencias solicitadas. Lo anterior se requiere sin perjuicio de las acciones legales que se generen por causa del posible incumplimiento evidenciado.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: SPMT - 202431205284521

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO 
EMPRESARIAL

04/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-171-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Carolina Herrera Ramírez
Directora de Contratación
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: REMISIÓN POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1.PCCNTR.5313332 ACTUALIZADAS POR PRÓRROGA No. 1.

Respetada Señora Carolina,

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales enmarcadas en el contrato de referencia, nos permitimos remitir las garantías respectivas actualizadas con la prórroga y adición No. 1 del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5313332.

GARANTÍA DE SERIEDAD	No. de Póliza
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	15-44-101284899_3
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	15-44-101284899_4

Las pólizas relacionadas se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: lo enunciado

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-172-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

ASUNTO: AUSENCIA DE PERSONAL EN LOS COLEGIOS CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) SEDE AURAS Y COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) SEDES TUNAL ALTO, EL TOLDO Y ERASMO VALENCIA.

Respetado ingeniero Jiménez,

Esta interventoría como parte de sus obligaciones ha realizado el seguimiento respectivo a cada una de las sedes que se encuentran en intervención, por ello evidenciamos que durante los días 3 y 4 de junio de 2024 no hubo personal en las sedes mencionadas en el asunto lo cual nos genera gran preocupación, especialmente la sede de Auras la cual debe ser terminada y entregada en su totalidad a más tardar el 29 de junio de 2024 pero aun falta la entrega del laboratorio de cárnicos, el bloque de administración y los trabajos para el manejo de aguas.

En cuanto a las sedes de Tunal Alto, El Toldo y Erasmo Valencia se ha evidenciado que el avance de las intervenciones desde la aprobación de la prórroga al contrato de obra no ha sido significativo, de hecho, en la sede de Erasmo Valencia solo ha llegado material para la construcción de la cimentación pero no se ha realizado aun ningún trabajo para la cocina allí planteada; la situación de que pasen días sin presencia de personal operativo en estas sedes puede incurrir en retrasos del cronograma y por ende el no cumplimiento de las fechas pactadas para las entregas de dichas intervenciones.





GRUPO 
EMPRESARIAL

05/06/2024
Bogotá D.C.

Continuamos a la espera de la presentación del diseño planteado para la cubierta que se solicitó realizar en la biblioteca de la sede de Tunal Alto y con ello se pueda hacer seguimiento una vez se inicie con la construcción de esta.

Por todo lo anterior, solicitamos que se aumente el personal operativo en cada una de las sedes mencionadas y se remita a esta interventoría todos los productos como esquemas y diseños para realizar el seguimiento adecuado a cada uno de los trabajos.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

ASUNTO: ESTADO DE SEDES INTERVENIDAS PARA SER ENTREGADAS EL 29 DE JUNIO DE 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Si bien el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904 fue prorrogado hasta el 29 de agosto de 2024, es claro también que dicha prórroga fue basada por situaciones ajenas al proyecto ocurridas en el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (IED) sedes Tunal Alto, El Toldo y Erasmo Valencia, por lo que las intervenciones de estas 3 sedes tendrán plazo máximo de terminarse hasta el 29 de agosto de 2024.

Las intervenciones en las otras 13 sedes contempladas en el alcance del proyecto deben ser terminadas en su totalidad en la fecha original de terminación del contrato de obra que será el próximo 29 de junio de 2024, pero de acuerdo con el seguimiento que esta interventoría a realizado a cada una de las intervenciones vemos con preocupación que algunas de estas sedes aun tienen retrasos en su cronograma y los trabajos por realizar son considerables en cuanto al tiempo que demandarían si se toma en cuenta que a la fecha del presente comunicado restan 24 días para que se cumpla con la fecha de entrega de las restantes 13 sedes. A continuación, realizamos un panorama de las sedes más críticas para cumplir con la fecha de entrega prevista para el 29 de junio de 2024:

1. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

En esta sede inicio su intervención el 20 de noviembre de 2023, dicha intervención se inicio por el cambio de cubierta en los bloques de bodega y emisora, si bien el alcance en el bloque de emisora aumentó, se ha evidenciado que el ritmo de trabajo y la falta de personal constante no ha permitido lograr que se finalice este bloque.

Para culminar con el alcance inicial de esta sede falta la intervención en la cubierta, red eléctrica y pintura del bloque de salones frente al bloque de emisora, además de la intervención en el edificio docente, por





lo que a poco más de 3 semanas para que se cumpla la fecha de entrega, se puede evidenciar que la cantidad de trabajo por realizar aun es bastante.

2. Campestre Jaime Garzón (IED) - Auras

El 17 de diciembre de 2023 se inició con la intervención y aunque ya se han entregado varios espacios al colegio, falta culminar el bloque de administración, la pintura externa y los trabajos para el manejo de aguas. Se ha evidenciado que ante la crítica situación para cumplir con la fecha de entrega de esta sede, hay días en los que no hay personal para continuar con los trabajos por lo que es preocupante el avance para lo que resta del tiempo de entrega.

3. Vivienda docente - Campamento

El 03 de enero de 2024 se iniciaron las actividades en esta sede, el avance en las intervenciones no ha sido el adecuado y por ende aun se encuentran ajustando detalles de la estructura metálica lo que no ha permitido la instalación de la cubierta que estaba programada para el 30 de abril de 2024.

Aunado a lo anterior, en esta sede faltan los trabajos de obra civil como lo son la fundición de placas de contrapiso, instalación de aparatos sanitarios, y por supuesto toda la obra blanca y de detalle, por lo que el cumplimiento de la fecha de entrega para esta sede es crítica y preocupante puesto que para cumplirlo los trabajos deben mejorar en cuanto al rendimiento.

4. Campestre Jaime Garzón (IED) - Raizal

En esta sede si bien es cierto se ha evidenciado que los trabajos de la instalación de la estructura metálica para la nueva cubierta han rendido, también es cierto que la intervención se inició de manera tardía por lo que la instalación de toda la cubierta debe terminarse prontamente y con ello continuar con los trabajos de detalle para finalizar toda la intervención propuesta.

5. Rural Las Mercedes

El 08 de abril de 2024 se iniciaron las actividades de la intervención en esta sede, se ha evidenciado que los trabajos no tienen un rendimiento que pueda permitir culminar con la cocina allí planteada puesto que desde el inicio de las actividades en esta sede solo se ha terminado la intervención en el piso del comedor, en cuanto a la cocina y todo lo que ella conlleva solo se ha hecho la fundición de la placa para la ampliación de esta. Se ha evidenciado que el personal en esta sede no ha sido en un gran número por lo que el rendimiento es bajo.

6. Diego Montaña Cuellar sede C

El 06 de mayo de 2024 se inició la intervención en esta sede con la demolición de los pisos que se están interviniendo en salones y patios. Se ha evidenciado que los nuevos pisos de los salones han tenido un buen ritmo de trabajo y están a punto de finalizar, pero en el patio no sucede lo mismo, y allí solo se han hecho trabajos de demolición.





7. DLE Sumpaz

En esta sede falta el saneamiento de la red sanitaria por lo que consideramos que no van a tener inconveniente para cumplir con la fecha de entrega, siempre y cuando se programé rápidamente este trabajo.

8. San José De Usme - Don Bosco 2 (CED)

En cuanto a la cocina planteada para esta sede solo se tiene construida la cimentación sobre la cual se instalará toda la cocina modular, por ello es importante que se cuente rápidamente con todo el material para la instalación de la estructura metálica, paneles, ventanas, puertas, mobiliario y accesorios de esta.

Cabe mencionar que, aunque se hecho entrega parcial de algunas intervenciones, aun no se ha entregado ninguna sede de manera definitiva puesto que quedan observaciones por realizar para dicha entrega, las sedes mencionadas son:

1. Fernando González Ochoa.
2. Chuniza.
3. Diego Montaña Cuellar sede B
4. Diego Montaña Cuellar sede A
5. Usminia

Por todo lo anterior solicitamos mejorar el rendimiento de los trabajos en cada una de las sedes que aun se encuentran activas y atender de manera rápida las observaciones de aquellas que se han entregado de manera parcial para finalizar el proceso de entrega respectivo.

Recomendamos aumentar el personal en cada una de las obras y que dicho personal sea constante para que el rendimiento de las actividades sean uniformes, tener en cada uno de colegios el stock de material listo para ser empleado y con ello evitar retrasos y aumentar las jornadas laborales, para lo anterior y como ha sido una constante durante el desarrollo de todo el contrato, esta interventoría estará presta a gestionar la solicitud de permisos para trabajos a doble jornada, en horario nocturnos, en días festivos y fines de semana.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





SED-US-174-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Respetado ingeniero Jiménez,

A la fecha presentamos lo siguientes incumplimientos a los compromisos adquiridos con anterioridad:

1. Fernando González Ochoa

Técnico:

- Reparación de gotera en el comedor: conforme a la visita realizada al plantel educativo, la gotera persiste en el punto donde fue inicialmente intervenido, es decir, la reparación realizada no cumplió con lo requerido, a lo cual prorrogaron nuevamente para el **1 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Ajuste de puertas de baño de preescolar: conforme al recorrido realizado el 23 de mayo de 2024 fue posible evidenciar el roce entre la puerta de un baño de preescolar y el piso de grano caucho, la cual fue reprogramada para el **1 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Sistema de bombeo: referente a la culminación de las actividades, han sido reiteradas las prórrogas que el Consorcio Claridad ha requerido y a la fecha no ha culminado con la entrega de este espacio.
- Bombas eyectoras: durante la capacitación de los equipos instalados, el Consorcio Claridad le manifestó a los delegados del plantel educativo, que el mantenimiento de las bombas eyectoras se





realizaría en la semana del 29 de abril al 5 de mayo del año en curso, acontecimiento que no sucedió y nuevamente reprogramaron para el **4 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado izquierdo de la cancha) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **17 de febrero de 2024**

2. Chuniza

Técnico:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: en reiteradas oportunidades le hemos indicado al constructor sobre el ajuste de varias tapas de las cajas de inspección, en aras que no se conviertan en tropezaderos para la comunidad estudiantil.
- Ajuste de rejillas de cárcamos: si bien es cierto, cambiaron rejillas, sin embargo, quedaron tres (3) pendientes por cambiar.
- Ajuste de puerta de almacén debajo de la escalera: el Consorcio Claridad ajustó una hoja de la puerta, sin embargo, la otra hoja de la puerta está rozando con el andén construido.
- Ajuste de listones de sillas y reposición: durante la entrega parcial el Consorcio Claridad indico la reposición de listones de manera voluntaria:

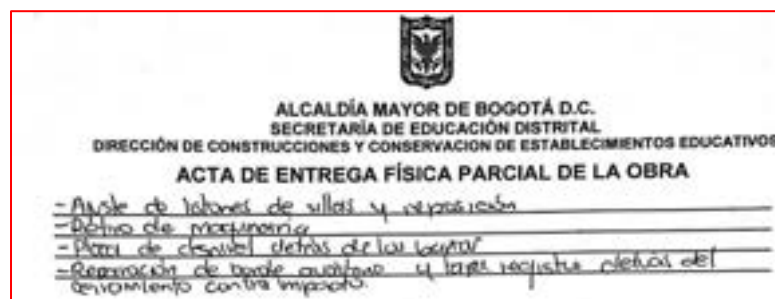




Ilustración 1

- Reposición de tapa registro detrás del cerramiento contra impacto: al igual que el ítem inmediatamente anterior, el contratista de obra se comprometió con el rector a realizar esta actividad el **16 de marzo de 2024**, fecha que continúa incumpliendo.
- Detalles de pintura en canchas y cerramiento contra impacto: el contratista de obra menciona un uso inadecuado, sin embargo, no entregaron el manual de mantenimiento en aras de evitar este tipo de inconvenientes. durante el comité No. 23, establecieron que el **21 de junio de 2024** realizarán la actividad.
- Ajuste de bordillos. No han definido la fecha de dicha reparación.
- En cuanto al mantenimiento a los marcos de baloncesto existentes y que fueron pagados en su totalidad, actualmente presentan falta de soldadura, lo cual fue notificado desde el 8 de mayo del año en curso, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **14 de marzo de 2024**.

3. Diego Montaña Cuellar sede B

Técnico:

Bloque aulas

- Reposición de vidrios rotos: a la fecha no han cambiado la totalidad de los vidrios, pues conforme a un recorrido por la sede, le fue solicitado al contratista de obra instalar los vidrios faltantes.





- Ajuste en las dilataciones del tapaluz de la cubierta y mediacaña en fachada externa en aras de evitar el alojamiento de palomas.
- Arreglo de tomacorrientes de salones por falta de energía. **25 y 26 de mayo de 2024.**

Bloque administración

- Tapas de las bandejas portacables: no indican la fecha de la instalación.
- Instalación de persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo: si bien es cierto, realizaron la actividad pero no dejaron la persiana al borde de la viga en aras de evitar el alojamiento de palomas, independiente si se llegase a instalar la malla tipo angeo; además no cuentan con vidrio, los cuales quedaron en instalar el **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Cielo raso en baño: fue instalado, sin embargo, tiene observaciones.
- Ventana de los baños: aún no ha sido tapada la luz que se presenta entre la ventana de los baños y el muro divisorio.
- Ajuste de vano de puertas de baños de hombres y mujeres: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Bloque aulas (4)

- Pisos, enchape, pintura, puertas, persiana en los costados: reiteramos que fue instalada la persiana, pero hay observaciones.
- Ajuste de cerradura en aula No.18.: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Generales

- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: no indican la fecha de la ejecución.
- Malla encima de las canales instaladas, pintura de bajantes y ajuste de pintura en canal: **17 de junio de 2024.**
- Detalles de pintura en escalera de administración: **14 de abril de 2024.**
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: **14 de abril de 2024.**
- Pañete externo: de acuerdo con el comunicado del asunto, tenían previsto terminar la actividad el **10 de mayo de 2024**, pero no cumplieron con dicha fecha y tampoco han concluido.
- Retiro completo de material incluyendo el baño portátil: **23 de mayo de 2024.**





4. Diego Montaña Cuellar sede A

Técnico:

- Eliminación de abultamiento del piso instalado en las aulas de preescolar: en el comunicado del asunto indican el **10 de mayo de 2024** como fecha de visita técnica, lo cual no se llevó a cabo.
- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: la fecha establecida en el acta de entrega física era el 10 de marzo de 2024, sin embargo, el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el 14 de abril de 2024 y nuevamente solicitan prórroga para el 11 de mayo de 2024, fecha que nuevamente incumplen, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención, pero dado que no fue posible hallar las tapas, el Consorcio Claridad hará el cambio de dos sanitarios para el 20 de abril de 2024, sin embargo, indican que la instalación la realizarán el 11 de mayo de 2024, no obstante, no cumplieron., a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Cambio de tejas, dado que tienen perforaciones y se filtra el agua: sin confirmación de fecha.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado oriental salida bloque preescolar) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **16 de marzo de 2024**.

5. Usminia

Técnico:

Según el comunicado CONS-CLARIDAD-104, el 11 de mayo de 2024 iban a concluir con las siguientes actividades: flanches en fachada externa, hueco en la escalera para evitar alojamiento de palomas, y nivel de la canal, pero esto se llevó a cabo, por lo cual en el durante el comité No. 23, establecieron que el **1 de junio de 2024** realizarán la actividad pero no se cumplió.

6. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

Técnico:





- Aún no remiten en su totalidad los diseños de la estructura del bloque al frente de emisora ni la subsanación de las observaciones a los diseños del bloque de emisora remitidos el 13 de mayo de 2024 mediante el oficio No. SED-US-125-2024.
- En cuanto al retraso de la intervención en el bloque frente a emisora también se debe a las demoras en las entregas de los demás bloques en intervención.
- Respecto al edificio docente, no han dejado intervenir el espacio hasta tanto se termine y entreguen a satisfacción los frentes actuales.
- La parte eléctrica también presentó atrasos porque dependía de la estructura metálica del bloque de emisora.
- Se está a la espera de que esta semana finalice la intervención en el bloque de emisora, pues este según compromisos anteriores, debía entregarse el **6 de junio de 2024**.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (acopio de material pétreo, acopio de RCD's, jardines de los pasillos) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo.

7. Auras

Técnico:

- En la teja que fue instalada en el bloque de laboratorios falta por ajustar algunos elementos que presentan un bombeo lo cual fue notificado por esta interventoría.
- Falta terminación de trabajo de pintura en laboratorios y administración.
- Falta trabajos para manejo de aguas lluvias.

8. Vivienda docente - Campamento

Técnico:

- Instalación de teja: el Consorcio Claridad había previsto la instalación para el **30 de abril de 2024**, pero aún no inician y hay observaciones de la estructura metálica.
- En cuanto a la documentación, las observaciones no han sido subsanadas.

9. DILE



Técnico:

Desde diciembre del 2023 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) otorgó el permiso para intervenir en esta Dirección Local; así las cosas, el atraso es atribuible al contratista de obra.

[illegible]

Por lo anterior, está pendiente el mantenimiento del pozo séptico a realizar el **8 de junio del año** en curso, conforme a lo indicado en el comité No.24.

10.Tunal Alto, Toldo y Raizal

- Entrega de diseños de la cubierta en Tunal Alto: **28 de mayo de 2024**

11.Erasmo Valencia

A la fecha solo han enviado los documentos para el ingreso de 1 oficial y 1 ayudante, de los cuales tampoco han ido a la sede, además, este personal es insuficiente para la intervención en esta sede

Por lo tanto, le requerimos al Consorcio Claridad seriedad en las fechas nuevamente establecidas de manera unilateral, pues varias de ellas llevan más de dos meses de retraso y ajustar las actividades que no presentaron fecha.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

10/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-175-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: REMISIÓN RESPUESTA AL COMUNICADO SPMT 202431205284521 - SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DEL PMT CONSORCIO CLARIDAD.

Respetada Señor Pinzón,

El 07 de junio de 2024, el contratista de obra radicó ante esta interventoría el oficio No. CON-CLARIDAD-135-2023, mediante la cual daba respuesta al comunicado del asunto. Esta interventoría en sus condiciones de vigilancia y control al contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, confirma que las observaciones fueron subsanadas en su totalidad y por ende se radicó se dio aval para que la respuesta fuese radicada a la Secretaria Distrital de Movilidad con todas las evidencias de cumplimiento a las observaciones.

Informamos que la evidencia de cumplimiento fue remitido al correo electrónico jcarrero@movilidadbogota.gov.co y posteriormente radicado a la página de www.movilidadbogota.gov.co/radicacionwebsdm con número de radicado 202461202094642.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: Oficio CON-CLARIDAD-135-2023 con soportes.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-176-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: SOLICITUD DE INFORME MENSUAL NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio de la presente, esta interventoría en cumplimiento de sus compromisos de vigilancia seguimiento y control del contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, nos permitimos remitir el apremio por el presunto incumplimiento en la entrega del informe mensual de gestión del mes de mayo de 2024, dentro del plazo máximo estipulado en el anexo técnico.

Bajo este panorama, se conmina al contratista de hacer entrega del informe mensual No. 7, debido a que se está presentando incumplimiento del **Capítulo 18. Obligaciones de información;** *El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo, por cada frente de trabajo lo siguiente:*

- *Avance de cada una de las actividades programadas.*
- *Balance presupuestal que muestre lo ejecutado, lo proyectado para terminar las obras y el total, conforme no excede del valor total contractual.*
- *Registros fotográficos.*
- *Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.*





- *Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.*
- *Fotocopia de la bitácora o libro de obra.*
- *Resumen de las actividades realizadas en el mes.*
- *Relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.*
- *Informe de seguridad industrial.*
- *Informe de manejo ambiental y del PGRCD.*
- *Informe de gestión social.*
- *Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra con sus alertas respectivas.*

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados durante los cinco (5) días hábiles siguientes posterior al vencimiento de cada mes.

Se le recuerda al contratista que es de carácter urgente, presentar cada uno de los insumos mencionados anteriormente, para realizar la respectiva aprobación y así evitar sanciones por parte de la entidad contratante.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co





GRUPO 
EMPRESARIAL

11/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-177-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: SOLICITUD PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: ASESOR AMBIENTAL


Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio del presente, esta interventoría en cumplimiento de sus compromisos de vigilancia, seguimiento y control del contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, se ha evidenciado que a la fecha el contratista no ha dado cumplimiento, con la presentación del nuevo profesional para el cargo de asesor ambiental.

Solicitamos al contratista en un termino no mayor a dos (2) días hábiles sea presentada la hoja de vida del personal para este cargo que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co y apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-178-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: **NO CONFORMIDADES INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - IED CAMPESTRE JAIME GARZÓN SEDE LAS AURAS.**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con el seguimiento permanente que realiza la interventoría a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD, en la inspección realizada entre los días 11 y 12 de junio del presente año, en las instalaciones del colegio IED CAMPESTRE JAIME GARZÓN SEDE LAS AURAS, se evidencio personal realizando actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas, laborando a una altura de aproximadamente ocho (8) metros, de acuerdo con que las indicaciones realizadas durante el recorrido, se está incumpliendo con la normatividad legal vigente para labores en alturas, por las siguientes observaciones:

1. No se cuenta con los permisos para trabajo de alto riesgo (trabajo en alturas).
2. No se cuenta con la presencia de un inspector de Seguridad y salud en el trabajo certificado como coordinador de alturas.
3. El personal no cuenta con elementos de protección contra caídas ni elementos de protección personal de acuerdo con la actividad realizada entre ellos el casco de seguridad con barbuquejo.
4. Los andamios multidireccionales, no se encuentran con todas las piezas que le permitan dan estabilidad y seguridad para las actividades que se van a realizar.
5. No se cuenta con señalización o demarcación del área de trabajo.





GRUPO 
EMPRESARIAL


13/06/2024
Bogotá D.C.



El posible incumplimiento del área de Seguridad y Salud en el trabajo está basado en las evidencias reportadas en el presente comunicado, de acuerdo con los lineamientos exigidos por la entidad contratante y la legislación aplicable. Por lo tanto, se conmina al contratista, subsanar cada una de las observaciones de manera inmediata.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-179-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda

Director de obra

Carrera 80 A No. 25C -19

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Respetado ingeniero Jiménez,

A la fecha presentamos lo siguientes incumplimientos a los compromisos adquiridos con anterioridad:

1. Fernando González Ochoa

Técnico:

- Reparación de gotera en el comedor: conforme a la visita realizada al plantel educativo, la gotera persiste en el punto donde fue inicialmente intervenido, es decir, la reparación realizada no cumplió con lo requerido, a lo cual prorrogaron nuevamente para el **1 de junio de 2024** dicha intervención, fecha que incumplieron.
- Ajuste de puertas de baño de preescolar: conforme al recorrido realizado el 23 de mayo de 2024 fue posible evidenciar el roce entre la puerta de un baño de preescolar y el piso de grano caucho, la cual fue reprogramada para el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.
- Sistema de bombeo: referente a la culminación de las actividades, han sido reiteradas las prórrogas que el Consorcio Claridad ha requerido y a la fecha no ha culminado con la entrega de este espacio.
- Bombas eyectoras: durante la capacitación de los equipos instalados, el Consorcio Claridad le manifestó a los delegados del plantel educativo, que el mantenimiento de las bombas eyectoras se realizaría en la semana del 29 de abril al 5 de mayo del año en curso, acontecimiento que no sucedió y nuevamente reprogramaron para el **4 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

SST y ambiental:





- Realizar recuperación de zonas verdes (costado izquierdo de la cancha) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo:
17 de febrero de 2024

2. Chuniza

Técnico:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: en reiteradas oportunidades le hemos indicado al constructor sobre el ajuste de varias tapas de las cajas de inspección, en aras que no se conviertan en tropezaderos para la comunidad estudiantil.
- Ajuste de rejillas de cárcamos: si bien es cierto, cambiaron rejillas, sin embargo, quedaron tres (3) pendientes por cambiar.
- Ajuste de puerta de almacén debajo de la escalera: el Consorcio Claridad ajustó una hoja de la puerta, sin embargo, la otra hoja de la puerta está rozando con el andén construido.
- Ajuste de listones de sillas y reposición: durante la entrega parcial el Consorcio Claridad indico la reposición de listones de manera voluntaria:

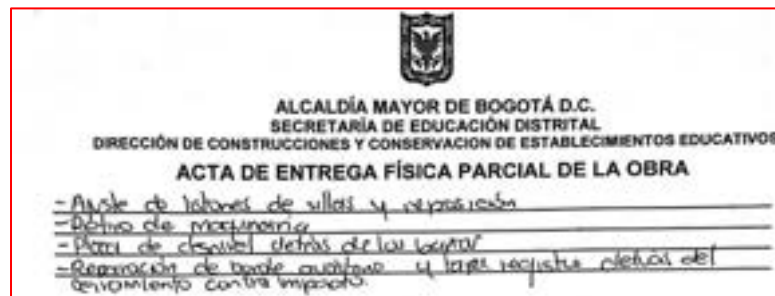


Ilustración 1





- Reposición de tapa registro detrás del cerramiento contra impacto: al igual que el ítem inmediatamente anterior, el contratista de obra se comprometió con el rector a realizar esta actividad el **16 de marzo de 2024**, fecha que continúa incumpliendo.
- Detalles de pintura en canchas y cerramiento contra impacto: el contratista de obra menciona un uso inadecuado, sin embargo, no entregaron el manual de mantenimiento en aras de evitar este tipo de inconvenientes. durante el comité No. 23, establecieron que el **21 de junio de 2024** realizarán la actividad.
- Ajuste de bordillos. No han definido la fecha de dicha reparación.
- En cuanto al mantenimiento a los marcos de baloncesto existentes y que fueron pagados en su totalidad, actualmente presentan falta de soldadura, lo cual fue notificado desde el 8 de mayo del año en curso, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **14 de marzo de 2024**.

3. Diego Montaña Cuellar sede B

Técnico:

Bloque aulas

- Reposición de vidrios rotos: a la fecha no han cambiado la totalidad de los vidrios, pues conforme a un recorrido por la sede, le fue solicitado al contratista de obra instalar los vidrios faltantes.
- Ajuste en las dilataciones del tapaluz de la cubierta y mediacaña en fachada externa en aras de evitar el alojamiento de palomas.
- Arreglo de tomacorrientes de salones por falta de energía. **25 y 26 de mayo de 2024**.

Bloque administración

- Tapas de las bandejas portacables: no indican la fecha de la instalación.
- Instalación de persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo: si bien es cierto, realizaron la actividad pero no dejaron la persiana al borde de la viga en aras de evitar el alojamiento de palomas, independiente si se llegase a instalar la malla tipo angeo; además no cuentan con vidrio, los cuales quedaron en instalar el **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Cielo raso en baño: fue instalado, sin embargo, tiene observaciones.





- Ventana de los baños: aún no ha sido tapada la luz que se presenta entre la ventana de los baños y el muro divisorio.
- Ajuste de vano de puertas de baños de hombres y mujeres: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Bloque aulas (4)

- Pisos, enchape, pintura, puertas, persiana en los costados: reiteramos que fue instalada la persiana, pero hay observaciones.
- Ajuste de cerradura en aula No.18.: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Generales

- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: no indican la fecha de la ejecución.
- Malla encima de las canales instaladas, pintura de bajantes y ajuste de pintura en canal: **17 de junio de 2024**.
- Detalles de pintura en escalera de administración: **14 de abril de 2024**.
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: **14 de abril de 2024**.
- Pañete externo: de acuerdo con el comunicado del asunto, tenían previsto terminar la actividad el **10 de mayo de 2024**, pero no cumplieron con dicha fecha y tampoco han concluido.
- Retiro completo de material incluyendo el baño portátil: **23 de mayo de 2024**.

4. Diego Montaña Cuellar sede A

Técnico:

- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: la fecha establecida en el acta de entrega física era el 10 de marzo de 2024, sin embargo, el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el 14 de abril de 2024 y nuevamente solicitan prórroga para el 11 de mayo de 2024, fecha que nuevamente incumplen, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención, pero dado que no fue posible hallar las tapas, el Consorcio Claridad hará el cambio de dos sanitarios para el 20 de abril de 2024, sin embargo, indican que la





instalación la realizarían el 11 de mayo de 2024, no obstante, no cumplieron., a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.

- Cambio de tejas, dado que tienen perforaciones y se filtra el agua: sin confirmación de fecha.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado oriental salida bloque preescolar) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **16 de marzo de 2024**.

5. Usminia

Técnico:

Según el comunicado CONS-CLARIDAD-104, el 11 de mayo de 2024 iban a concluir con las siguientes actividades: flanches en fachada externa, hueco en la escalera para evitar alojamiento de palomas, y nivel de la canal, pero esto se llevó a cabo, por lo cual en el durante el comité No. 23, establecieron que el **1 de junio de 2024** pero incumplieron la fecha establecida.

6. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

Técnico:

- Aún no remiten en su totalidad los diseños de la estructura del bloque al frente de emisora ni la subsanación de las observaciones a los diseños del bloque de emisora remitidos el 13 de mayo de 2024 mediante el oficio No. SED-US-125-2024.
- En cuanto al retraso de la intervención en el bloque frente a emisora también se debe a las demoras en las entregas de los demás bloques en intervención.
- Respecto al edificio docente, no han dejado intervenir el espacio hasta tanto se termine y entreguen a satisfacción los frentes actuales.
- La parte eléctrica también presentó atrasos porque dependía de la estructura metálica del bloque de emisora.
- Se está a la espera de que esta semana finalice la intervención en el bloque de emisora, pues este según compromisos anteriores, debía entregarse el **6 de junio de 2024**.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (acopio de material pétreo, acopio de RCD's, jardines de los pasillos) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla,





abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo.

7. Auras

Técnico:

- En la teja que fue instalada en el bloque de laboratorios falta por ajustar algunos elementos que presentan un bombeo lo cual fue notificado por esta interventoría.
- Falta terminación de trabajo de pintura en laboratorios y administración.
- Falta trabajos para manejo de aguas lluvias.

8. Vivienda docente - Campamento

Técnico:

- Instalación de teja: el Consorcio Claridad había previsto la instalación para el **30 de abril de 2024**, pero aún no inician, pues han sido reiteradas las oportunidades en las cuales se les ha indicado al Consorcio Claridad sobre las observaciones de la estructura metálica de la cubierta.
- En cuanto a la documentación, las observaciones no han sido subsanadas.

9. DILE

Técnico:

Desde diciembre del 2023 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) otorgó el permiso para intervenir en esta Dirección Local; así las cosas, el atraso es atribuible al contratista de obra.

De acuerdo con el comité de obra No.24 indicaron la programación del mantenimiento del pozo séptico para el **8 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.





10. Tunal Alto, Toldo y Raizal

- Entrega de diseños de la cubierta en Tunal Alto: **28 de mayo de 2024**

11. Erasmo Valencia

A la fecha se están realizando trabajos de cimentación, se solicita que continúen con los trabajos para mejorar el rendimiento.

Por lo tanto, le requerimos al Consorcio Claridad seriedad en las fechas nuevamente establecidas de manera unilateral, pues varias de ellas llevan más de dos meses de retraso y ajustar las actividades que no presentaron fecha.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





SED-US-180-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

ASUNTO: REITERACIÓN DE LA ENTREGA DE SEDE PARA EL 29 DE JUNIO DE 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Continuando con las observaciones del comunicado *SED-US-173-2024 Entrega de sedes para el 29 de junio* del 5 de junio del año en curso, reiteramos nuestra preocupación con la entrega al 29 de junio del 2024 de las diferentes sedes que se encuentran en ejecución, pues hoy 13 de junio de 2024, presentan el siguiente panorama:

1. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

En esta sede inicio su intervención el 20 de noviembre de 2023, dicha intervención se inicio por el cambio de cubierta en los bloques de bodega y emisora, si bien el alcance en el bloque de emisora aumentó, se ha evidenciado que el ritmo de trabajo y la falta de personal es una constante lo cual ocasiona que no se finalice la intervención de este bloque.

Para culminar con el alcance inicial de esta sede falta el ajuste de detalles en la cubierta, terminación de red eléctrica y la culminación del trabajo de pintura en los bloques de bodega y emisora, del bloque de salones frente al bloque de emisora falta la intervención total en la cubierta y pintura, además de la intervención en el edificio docente, por lo que a 16 días para que se cumpla la fecha de entrega, se puede evidenciar que la cantidad de trabajo por realizar aun requiere de mayores tiempos.





2. Campestre Jaime Garzón (IED) - Auras

El 17 de diciembre de 2023 se inició con la intervención y aunque se han entregado varios espacios al colegio, falta culminar el bloque de administración, la pintura externa y los trabajos para el manejo de aguas. Se ha evidenciado que ante la crítica situación para cumplir con la fecha de entrega de esta sede, hay días en los que no hay personal para continuar con los trabajos por lo que es preocupante el avance para lo que resta del tiempo de entrega. A falta de 16 días para que se cumpla con el tiempo de entrega, el trabajo de manejo de aguas se inició apenas el 12 de junio con la demolición de la placa para las zanjas por donde irá la tubería.

3. Vivienda docente - Campamento

Si bien es cierto, el 3 de enero de 2024 iniciaron con las actividades preliminares como lo fue el desmonte de cubierta, sin embargo, solo hasta abril dieron inicio a la instalación de la estructura metálica, la cual tiene observaciones que aún no han sido subsanadas, lo cual genera retrasos para continuar con la instalación de la canal y cubierta, pues esta última estaba prevista para instalar el 30 de abril de 2024.

En cuanto a la obra civil, han fundido las placas de contrapiso e instalaciones sanitarias, no obstante, requieren a la mayor brevedad posible instalar la cubierta con el fin de avanzar con los acabados, incluyendo la instalación de puertas, ventanas y las instalaciones eléctricas, sin dejar a un lado el pozo séptico. Es por ello, que el Consorcio Claridad debe incrementar tanto mano de obra como disponer de los materiales en obra, con el fin de entregar en la fecha establecida desde el inicio del contrato.

Por otro lado, es importante que esta sede cuente con un profesional técnico, pues en los recorridos realizados por esta interventoría no hemos contado con la presencia del residente de obra.

4. Campestre Jaime Garzón (IED) - Raizal

En esta sede si bien es cierto se ha evidenciado que los trabajos de la instalación de la estructura metálica para la nueva cubierta han rendido, también es cierto que la intervención se inició de manera tardía por lo que la instalación de toda la cubierta debe terminarse prontamente y con ello continuar con los trabajos de detalle y pintura exterior para finalizar toda la intervención propuesta. Durante los días 11 y 12 de junio se ha podido establecer que no se ha presentado personal en la obra para continuar con los trabajos.

5. Rural Las Mercedes

Esta sede al igual que Campamento carece de la inspección del residente de obra, pues han sido nulas las veces en las que este profesional ha visitado la obra.





Ahora bien, en cuanto a la ejecución de la obra, desde el jueves 5 de junio del año en curso, los 3 trabajadores que se encontraban allí se retiraron de la sede y desde entonces no han desarrollado ninguna actividad, toda vez que esta sede también debe entregarse el 29 de junio de 2024 y solo a la fecha se ha fundido la placa de contrapiso de la ampliación de la cocina, siendo esta la principal zona de intervención de esta sede; por ende, esta inconclusa la mampostería, instalación de estructura metálica, cubierta, acabados, instalaciones eléctricas, entre otros.

6. Diego Montaña Cuellar sede C

El rendimiento que traían en la instalación de baldosa de granito pulido en las aulas era optimo, teniendo en cuenta el retraso que presentaba esta actividad, sin embargo, a la fecha no han destroncado ni brillado la baldosa, lo cual está generando retrasos significativos para la entrega total para el 29 de junio de 2024, sumando a ello el avance mínimo de la conformación del nuevo patio.

7. DLE Sumpaz

Han sido reiteradas las ocasiones en las cuales el Consorcio Claridad de manera unilateral ha cambiado la fecha de entrega total de esta sede, como sustento de ello, en el comité No.24 argumento que el 8 de junio de 2024 realizarían el mantenimiento del pozo séptico, acontecimiento que no sucedió. Por ello, le requerimos al Consorcio Claridad seriedad con la fecha real de intervención en aras de entregar esta sede el 29 de junio del año en curso.

8. San José De Usme - Don Bosco 2 (CED)

A la fecha solo han construido la cimentación de la cocina modular y el personal en esta sede ha disminuido considerablemente, además no han iniciado con la instalación de la estructura metálica, ni están en obra los demás elementos que conformarán la cocina modular, tales como paneles, ventanas, puertas, mobiliario y accesorios, siendo estas actividades fundamentales para la entrega total.

Cabe mencionar que, aunque se han llevado a cabo entregas parciales y entrega totales aún tienen observaciones sin subsanar en las siguientes sedes:

1. Fernando González Ochoa.
2. Chuniza.
3. Diego Montaña Cuellar sede B
4. Diego Montaña Cuellar sede A
5. Usminia

De acuerdo con todo lo anterior, le requerimos al Consorcio Claridad incrementar la mano de obra en todas las sedes y tener disponibilidad de materiales en cada sede, en aras de incrementar





GRUPO 
EMPRESARIAL


13/06/2024
Bogotá D.C.

el rendimiento de los trabajos en cada una de las sedes activas y que se deben entregar el 29 de junio de 2024, además de subsanar todas las observaciones de las sedes que han sido entregadas de manera parcial y total.

Por otro lado, le sugerimos al contratista de obra aprovechar los permisos solicitados para laborar en horario nocturno y fines de semana, dado que han sido aprovechados en su totalidad, pues durante los últimos días festivos asistieron menos del 40% del personal aprobado

Para finalizar, reiteramos que esta interventoría esta presta a gestionar la solicitud de permisos para trabajos a doble jornada, en horario nocturnos y fines de semana.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO
EMPRESARIAL

15/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-181-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: SEGÚNDO APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio de la presente, esta interventoría en cumplimiento de sus compromisos de vigilancia seguimiento y control del contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, nos permitimos remitir el segundo apremio por el presunto incumplimiento entrega del informe mensual de gestión del mes de mayo de 2024, dentro del plazo máximo estipulado en el anexo técnico.

El pasado 12 de mayo de 2024, mediante oficio SED-US-176-2024 fue solicitado de manera urgente la remisión de esta información, a la fecha no se ha obtenido respuesta, teniendo un atraso de entrega de diez (10) días.

Bajo este panorama, se conmina al contratista de hacer entrega del informe mensual No. 06, debido a que se está presentando incumplimiento del **Capítulo 18. Obligaciones de información;** *El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo, por cada frente de trabajo lo siguiente:*



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



- *Avance de cada una de las actividades programadas.*
- *Balance presupuestal que muestre lo ejecutado, lo proyectado para terminar las obras y el total, conforme no excede del valor total contractual.*
- *Registros fotográficos.*
- *Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.*
- *Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.*
- *Fotocopia de la bitácora o libro de obra.*
- *Resumen de las actividades realizadas en el mes.*
- *Relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.*
- *Informe de seguridad industrial.*
- *Informe de manejo ambiental y del PGRCD.*
- *Informe de gestión social.*
- *Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra con sus alertas respectivas.*

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados durante los cinco (5) días hábiles siguientes posterior al vencimiento de cada mes.

Se le recuerda al contratista que es de carácter urgente, presentar cada uno de los insumos mencionados anteriormente, para realizar la respectiva aprobación y así evitar sanciones por parte de la entidad contratante.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: SED-US-176-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





**GRUPO
EMPRESARIAL**

13/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-181-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE APU NO PREVISTO NP 003 - POLIETILENO Y NP 005 - INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

Respetado señor Pinzón,

El pasado 10 de junio de 2024, mediante correo electrónico la Secretaría de Educación Distrital remitió las siguientes observaciones a los NP 003 y NP 005:

- NP 003: en la sección de MANO DE OBRA se sugirió que el rendimiento del ayudante sea de 0,05.
- NP 005: se solicitó ajuste al COSTO TOTAL que debe ser de \$11.040,00.

El contratista de obra mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-137-2023 radicó a esta interventoría los NP mencionados con los ajustes solicitados; una vez que realizamos la respectiva revisión de estos, aprobamos los APU presentados y los remitimos a la entidad para su respectiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 11-06-2024 - CONS-CLARIDAD-137-2023

APUS NO PREVISTOS 003 y 005 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-182-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

ASUNTO: CONCEPTO Y PROPUESTA POR HUMEDAD EN SALONES DE COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN (IED) – LAS AURAS.

Respetado ingeniero Jiménez,

El 06 de junio de 2024 se realizó recorrido en compañía del asesor hidráulico de la interventoría por los salones de Primero y Preescolar de la sede de Auras con el fin de evaluar la posible solución ante las humedades que se presentan en estos salones. A continuación, se presentan las soluciones el concepto y la propuesta por parte del asesor hidráulico de la interventoría:

- **SALÓN PRIMERO.**

Se evidencia humedad causada por jardín en el costado occidental, rampa en el costado norte y escalera en el costado sur. En la Ilustración 1, se presenta la ubicación del salón y los elementos mencionados anteriormente:

Se evidenció que el nivel freático de la zona era elevado y que la institución no cuenta con elementos que permitan drenar el agua que se presenta por las precipitaciones por ello, se realiza la siguiente recomendación para el manejo de estas aguas:

1. Realizar una mediacaña que permita sellar la placa de concreto que hay entre el jardín y la pared del costado occidental del salón.





2. Se propone dos filtros o geodrenes sobre el jardín del costado occidental, el primero que vaya adyacente al muro donde se recomienda construir la mediacaña y el segundo hacía el paso peatonal desde las escaleras hasta el muro que colinda con el coliseo con la finalidad de evitar que las líneas de flujo alcancen el muro posterior del salón.



Ilustración 1. Ubicación y humedad de salón primero

En ese contexto, para el filtro mencionado se propone un geodren planar que se instale sobre el terreno natural, y que este a su vez comunique el agua hacía un tubo perforado que lo dirija hacía la caja de inspección que se localiza adyacente al coliseo (ver Ilustración 2). La profundidad de este filtro deberá ser 1,00 m por debajo del nivel del piso del salón para abatir el nivel freático que se presupone llega hacía allí.





GRUPO 
EMPRESARIAL

13/06/2024
Bogotá D.C.



Ilustración 2. Propuesta para manejo de aguas.

Convención	Elemento	Fotografía
	Mediacaña sobre toda la pared, para sellar dilatación entre pared y placa.	
	Geodren Planar junto con tubería perforada de 4".	 <p>11/06/2024 3:20:20 p. m. CONTRATO DE INTERVENTORIA C01_PCCNTR.5313332 SED-GRUPO 5</p>



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



- SALÓN PREESCOLAR.

Al igual que el salón primero, se evidencia humedad, pero esta vez causada por el agua subsuperficial y superficial que se percola hacia la escalera del costado sur como se evidencia en la Ilustración 3 y al parecer el relleno detrás del muro occidental del salón mantiene humedad constante.



Ilustración 3. Ubicación de salón preescolar.



Ilustración 4. Humedad presente en salón preescolar.

Ahora bien, con la finalidad de disminuir la humedad en la escalera y consecuentemente en el muro occidental del salón, se recomienda la construcción de cañuela paralela a la escalera (ver Ilustración 5) que garantice la captación de escorrentía superficial y se pueda conectar a la tubería existente en la zona donde se encuentra la rampa mediante un sifón con cúpula, lo anterior resaltando que no es posible realizar subdrenajes, dado que no hay puntos de descole para los mismos, lo cual convierte esta alternativa en una medida de mitigación.





Ilustración 5. Ubicación de cañuela propuesta

Finalmente, y como ya se había mencionado, se evidenció que el nivel freático de la zona era elevado y que la institución no cuenta con elementos que permitan drenar el agua que se presenta por la lluvia, además de la escorrentía por la zona verde del costado norte del salón de preescolar, por ello, se realiza la siguiente recomendación para el manejo de estas aguas:

1. Cañuela en todo el perímetro de las escaleras que comunican al bloque de laboratorios (ver Ilustración 6), evitando que el agua de las lluvias quede empozada en las zonas verdes que se encuentran allí.

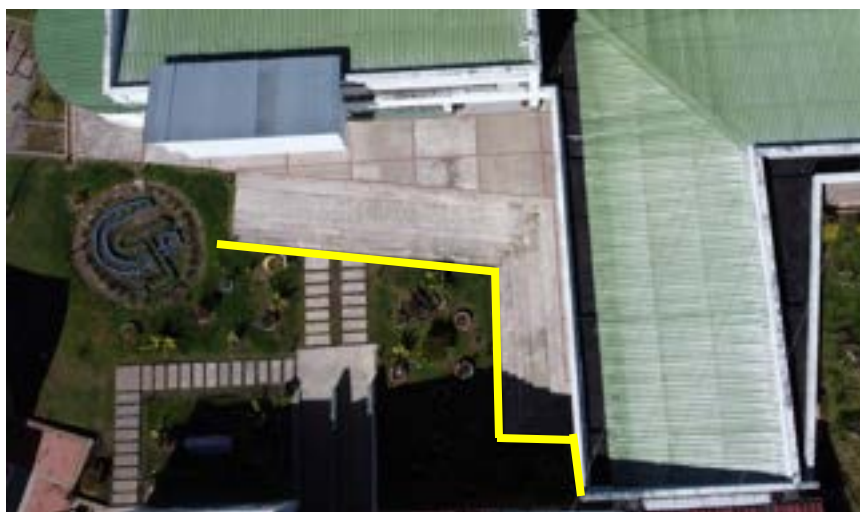


Ilustración 6. Cañuela por el perímetro de las escaleras del bloque de laboratorios






GRUPO 
EMPRESARIAL

13/06/2024
Bogotá D.C.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos que se tenga en consideración las propuestas anteriores y junto con su asesor hidráulico emitan un concepto para el manejo del agua que se presenta en el área y con ello informar a la SED sobre la propuesta definitiva para estas humedades.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO 
EMPRESARIAL

15/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-183-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN EN COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, nos permitimos informar el estado de la intervención de la sede La Unión según el alcance inicial y cómo durante el desarrollo del proyecto se han presentado imprevistos que han ocasionado que los recursos no alcancen para todos los trabajos iniciales.

El 15 de septiembre de 2023 se realizó visita a la sede en cuestión en compañía del contratista de obra, el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría y la interventoría, dicha visita era con el objetivo de realizar un recorrido por todos los espacios que la SED solicitaba intervenir y los trabajos a desarrollar en cada uno de estos sitios.

De esta visita se realizó un acta (que se anexa al presente comunicado), en la cual se priorizaron las actividades a desarrollar, dicha priorización era con el fin de que los recursos fueran asignados de acuerdo con el orden de importancia que se estableciera por parte del colegio y la SED.

Como se puede evidenciar en el acta mencionada, la intervención de la de las cubiertas de los bloques de emisora, bodega y salones eran la prioridad y por ello el contratista de obra inició trabajos en estos espacios.

Al realizar el retiro de la cubierta existente se evidenció que los muros que conformaban el bloque no contaban con elementos que pudiera confinarlos, por lo que al realizar la demolición del piso existente la vibración ocasionó que algunos de los muros empezaran a desplomarse y ello conllevó a que el alcance en esta zona se aumentara puesto que fue necesario intervenir cada uno de los espacios de este bloque.

En la demolición de los pisos se pudo evidenciar que no contaban con placa de contrapiso y el material de relleno estaba saturado, por lo que el trabajo que un inicio era de solo cambiar el piso, se debió



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



complementar con el retiro del material saturado y la realización del relleno con material granular adecuado, finalizando con la construcción de la placa de contrapiso.

Las redes sanitarias del bloque de emisora no estaban en buenas condiciones por lo que se reemplazó la tubería sanitaria y de agua potable, adicionalmente en el apartamento docente se realizó una redistribución de los espacios aprovechando que los muros internos presentaban grandes fisuras y se construirían nuevos.

Además, para el manejo de aguas lluvias se debió realizar intervención en varias zonas del colegio en las cuales se presentó inconvenientes como el estado de las cajas de inspección y el mal estado del material debajo de las placas de concreto, lo cual conllevó a realizar mayor cantidad de actividades y por ende el presupuesto se elevó respecto a lo planeado.

Ahora bien, según lo planeado en la visita inicial se tiene contemplado la intervención en la terraza del edificio docente pues este presenta desniveles que no permite que el agua sea drenada de manera correcta causando empozamientos en este espacio, por lo que se retirará todo el piso existente allí para instalar uno con las pendientes adecuadas, la cubierta de este espacio también se tiene contemplada intervenir.

Como parte del seguimiento y control que esta interventoría hace a las diferentes intervenciones, se realizó un balance presupuestal ajustado de acuerdo con lo ejecutado hasta el momento, de este balance se determinaron los recursos que aún quedan disponibles. Con el monto de estos recursos, se proyectó el valor que demandaría la intervención de toda la cubierta del edificio docente y se pudo esclarecer que el dinero que un queda por ejecutar no alcanzaría para esta intervención puesto que del alcance inicial sucedieron imprevistos que obligaron a realizar trabajos que no estaban contemplados en el bloque de emisora como ya fue mencionado.

Por lo anterior y siguiendo la solicitud de la SED de realizar obras completas, funcionales e integradas, la intervención en la cubierta del edificio docente (a excepción de la terraza) no podría ejecutarse.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: Acta de visita inicial La Unión

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





**GRUPO
EMPRESARIAL**

14/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-184-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: APU NO PREVISTO NP 011 - ESTAMPADO EN CONCRETO.

Respetado señor Pinzón,

En la intervención realizada en el Colegio Chuniza, se evidencia la necesidad que las nuevas áreas que se van a fundir en concreto sean estampadas con el fin de separar estos espacios de las chanchas, y junto con ello lograr que la superficie quede texturizada de manera tal que se eviten accidentes por superficies lisas, por ello el contratista de obra mediante el comunicado No. CONS-CLARIDAD-136-2023 del 07 de junio de 2024 remite el APU No Previsto del estampado en concreto.

Se anexan las cotizaciones sobre las cuales el contratista de obra realizó el análisis del No Previsto junto con el editable del análisis realizado en hoja de cálculo. Se anexa cotización de la interventoría con el fin de complementar el estudio de mercado.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 07-06-2024 - CONS-CLARIDAD-136-2023

1. COT CONCRETOL
 2. COT HOMECENTER
 3. Cotización de interventoría
- APUS NO PREVISTOS 011 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

15/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-185-2024

Señores,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332. "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: INFORME MENSUAL NÚMERO 7 DE INTERVENTORÍA.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito radicar el informe mensual No. 7 de interventoría del periodo entre el 30 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5313332. Se adjunta el informe mensual junto con los anexos respectivos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: Informe mensual de interventoría No. 7. PDF

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

18/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-186-2024

Señores,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: APU NO PREVISTO NP 012 - REJA CERRAMIENTO.

Respetado señor Pinzón,

En la intervención realizada en el Colegio Chuniza, se evidencia la necesidad de cerramientos que dividan las zonas intervenidas y protejan de accidentes a los alumnos y personal del colegio por las actividades deportivas y de recreación que se realizan en la institución, por ello el contratista de obra mediante el comunicado No. CONS-CLARIDAD-136-2023 del 07 de junio de 2024 remite el APU No Previsto de la reja de cerramiento. Se anexa el editable del análisis realizado en hoja de cálculo.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respectiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 07-06-2024 - CONS-CLARIDAD-136-2023

APUS NO PREVISTOS 012 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-187-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Respetado ingeniero Jiménez,

A la fecha presentamos lo siguientes incumplimientos a los compromisos adquiridos con anterioridad:

1. Fernando González Ochoa

Técnico:

- Reparación de gotera en el comedor: conforme a la visita realizada al plantel educativo, la gotera persiste en el punto donde fue inicialmente intervenido, es decir, la reparación realizada no cumplió con lo requerido, a lo cual prorrogaron nuevamente para el **1 de junio de 2024** dicha intervención, fecha que incumplieron.
- Ajuste de puertas de baño de preescolar: conforme al recorrido realizado el 23 de mayo de 2024 fue posible evidenciar el roce entre la puerta de un baño de preescolar y el piso de grano caucho, la cual fue reprogramada para el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.
- Sistema de bombeo: referente a la culminación de las actividades, han sido reiteradas las prórrogas que el Consorcio Claridad ha requerido y a la fecha no ha culminado con la entrega de este espacio.
- Bombas eyectoras: durante la capacitación de los equipos instalados, el Consorcio Claridad le manifestó a los delegados del plantel educativo, que el mantenimiento de las bombas eyectoras se realizaría en la semana del 29 de abril al 5 de mayo del año en curso, acontecimiento que no sucedió y nuevamente reprogramaron para el **4 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

SST y ambiental:





- Realizar recuperación de zonas verdes (costado izquierdo de la cancha) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo:
17 de febrero de 2024

2. Chuniza

Técnico:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: en reiteradas oportunidades le hemos indicado al constructor sobre el ajuste de varias tapas de las cajas de inspección, en aras que no se conviertan en tropezaderos para la comunidad estudiantil.
- Ajuste de rejillas de cárcamos: si bien es cierto, cambiaron rejillas, sin embargo, quedaron tres (3) pendientes por cambiar.
- Ajuste de puerta de almacén debajo de la escalera: el Consorcio Claridad ajustó una hoja de la puerta, sin embargo, la otra hoja de la puerta está rozando con el andén construido.
- Ajuste de listones de sillas y reposición: durante la entrega parcial el Consorcio Claridad indico la reposición de listones de manera voluntaria:

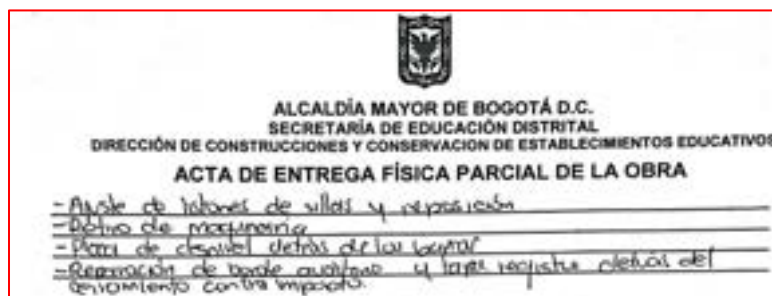


Ilustración 1





- Reposición de tapa registro detrás del cerramiento contra impacto: al igual que el ítem inmediatamente anterior, el contratista de obra se comprometió con el rector a realizar esta actividad el **16 de marzo de 2024**, fecha que continúa incumpliendo.
- Detalles de pintura en canchas y cerramiento contra impacto: el contratista de obra menciona un uso inadecuado, sin embargo, no entregaron el manual de mantenimiento en aras de evitar este tipo de inconvenientes. durante el comité No. 23, establecieron que el **21 de junio de 2024** realizarán la actividad.
- Ajuste de bordillos. No han definido la fecha de dicha reparación.
- En cuanto al mantenimiento a los marcos de baloncesto existentes y que fueron pagados en su totalidad, actualmente presentan falta de soldadura, lo cual fue notificado desde el 8 de mayo del año en curso, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **14 de marzo de 2024**.

3. Diego Montaña Cuellar sede B

Técnico:

Bloque aulas

- Reposición de vidrios rotos: a la fecha no han cambiado la totalidad de los vidrios, pues conforme a un recorrido por la sede, le fue solicitado al contratista de obra instalar los vidrios faltantes.
- Ajuste en las dilataciones del tapaluz de la cubierta y mediacaña en fachada externa en aras de evitar el alojamiento de palomas.
- Arreglo de tomacorrientes de salones por falta de energía. **25 y 26 de mayo de 2024**.

Bloque administración

- Tapas de las bandejas portacables: no indican la fecha de la instalación.
- Instalación de persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo: si bien es cierto, realizaron la actividad pero no dejaron la persiana al borde de la viga en aras de evitar el alojamiento de palomas, independiente si se llegase a instalar la malla tipo angeo; además no cuentan con vidrio, los cuales quedaron en instalar el **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.
- Cielo raso en baño: fue instalado, sin embargo, tiene observaciones.





- Ventana de los baños: aún no ha sido tapada la luz que se presenta entre la ventana de los baños y el muro divisorio.
- Ajuste de vano de puertas de baños de hombres y mujeres: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Bloque aulas (4)

- Pisos, enchape, pintura, puertas, persiana en los costados: reiteramos que fue instalada la persiana, pero hay observaciones.
- Ajuste de cerradura en aula No.18.: **25 y 26 de mayo de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.

Generales

- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: no indican la fecha de la ejecución.
- Malla encima de las canales instaladas, pintura de bajantes y ajuste de pintura en canal: **17 de junio de 2024**.
- Detalles de pintura en escalera de administración: **14 de abril de 2024**.
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: **14 de abril de 2024**.
- Pañete externo: de acuerdo con el comunicado del asunto, tenían previsto terminar la actividad el **10 de mayo de 2024**, pero no cumplieron con dicha fecha y tampoco han concluido.
- Retiro completo de material incluyendo el baño portátil: **23 de mayo de 2024**.

4. Diego Montaña Cuellar sede A

Técnico:

- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: la fecha establecida en el acta de entrega física era el 10 de marzo de 2024, sin embargo, el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el 14 de abril de 2024 y nuevamente solicitan prórroga para el 11 de mayo de 2024, fecha que nuevamente incumplen, a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención, pero dado que no fue posible hallar las tapas, el Consorcio Claridad hará el cambio de dos sanitarios para el 20 de abril de 2024, sin embargo, indican que la





instalación la realizarían el 11 de mayo de 2024, no obstante, no cumplieron., a lo cual, en el comité No.23, indican que la realizarán el **1 de junio de 2024**, fecha que incumplieron nuevamente.

- Cambio de tejas, dado que tienen perforaciones y se filtra el agua: sin confirmación de fecha.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado oriental salida bloque preescolar) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **16 de marzo de 2024**.

5. Usminia

Técnico:

Según el comunicado CONS-CLARIDAD-104, el 11 de mayo de 2024 iban a concluir con las siguientes actividades: flanches en fachada externa, hueco en la escalera para evitar alojamiento de palomas, y nivel de la canal, pero esto se llevó a cabo, por lo cual en el durante el comité No. 23, establecieron que el **1 de junio de 2024** pero incumplieron la fecha establecida.

6. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

Técnico:

- Aún no remiten en su totalidad los diseños de la estructura del bloque al frente de emisora ni la subsanación de las observaciones a los diseños del bloque de emisora remitidos el 13 de mayo de 2024 mediante el oficio No. SED-US-125-2024.
- En cuanto al retraso de la intervención en el bloque frente a emisora también se debe a las demoras en las entregas de los demás bloques en intervención.
- Respecto al edificio docente, no han dejado intervenir el espacio hasta tanto se termine y entreguen a satisfacción los frentes actuales.
- La parte eléctrica también presentó atrasos porque dependía de la estructura metálica del bloque de emisora.
- Se está a la espera de que esta semana finalice la intervención en el bloque de emisora, pues este según compromisos anteriores, debía entregarse el **6 de junio de 2024**.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (acopio de material pétreo, acopio de RCD's, jardines de los pasillos) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla,





19/06/2024
Bogotá D.C.

abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo.

7. Auras

Técnico:

- En la teja que fue instalada en el bloque de laboratorios falta por ajustar algunos elementos que presentan un bombeo lo cual fue notificado por esta interventoría.
- Falta terminación de trabajo de pintura en laboratorios y administración.
- Falta trabajos para manejo de aguas lluvias.

8. Vivienda docente - Campamento

Técnico:

- Instalación de teja: el Consorcio Claridad había previsto la instalación para el **30 de abril de 2024**, pero aún no inician, pues han sido reiteradas las oportunidades en las cuales se les ha indicado al Consorcio Claridad sobre las observaciones de la estructura metálica de la cubierta.
- En cuanto a la documentación, las observaciones no han sido subsanadas.

9. DILE

Técnico:

Desde diciembre del 2023 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) otorgó el permiso para intervenir en esta Dirección Local; así las cosas, el atraso es atribuible al contratista de obra.

[illegible]

De acuerdo con el comité de obra No.24 indicaron la programación del mantenimiento del pozo séptico para el **8 de junio de 2024**, fecha que nuevamente incumplieron.





10. Tunal Alto, Toldo y Raizal

- Entrega de diseños de la cubierta en Tunal Alto: **28 de mayo de 2024**


11. Erasmo Valencia

A la fecha se están realizando trabajos de cimentación, se solicita que continúen con los trabajos para mejorar el rendimiento.

Por lo tanto, le requerimos al Consorcio Claridad seriedad en las fechas nuevamente establecidas de manera unilateral, pues varias de ellas llevan más de dos meses de retraso y ajustar las actividades que no presentaron fecha.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





SED-US-188-2024

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: APROBACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL ASESOR AMBIENTAL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CLARIDAD

Respetado señor Pinzón,

Por medio de la presente nos permitimos notificar el cambio de profesional al cargo de Asesor ambiental, presentada por el contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD mediante oficio CONS-CLARIDAD-143-2023, el día 17 de junio del presente año.

Manifestamos que, conforme a los pliegos de condiciones, el profesional que se menciona a continuación cumple con los requisitos exigidos y es aprobado por la interventoría.

Documentos anexos como soporte:

- 1. Cedula de ciudadanía.
- 2. Diploma de grado.
- 3. Tarjeta profesional
- 4. Certificaciones laborales.
- 5. Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios COPNIA.

A continuación, presentamos el cuadro resumen de la hoja de vida del profesional.





Cargo	Identificación	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
Asesor Ambiental	Identificación	Ingeniero civil o ingeniero ambiental	Posgrado en el área del Medio Ambiente (aplica únicamente para el ingeniero civil)	Cuatro (4) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Tres (3) años de experiencia como Asesor ambiental o residente ambiental en proyectos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.
DANIEL FELIPE OROZCO ROA	1075252748	INGENIERO AMBIENTAL	NO APLICA	70238- 263656 TLM 7/11/2013	EXP 1: CONSORCIO EXACTITUD 901501510-3 RESIDENTE AMBIENTAL C01.PCCNTR.2645877, celebrado con la Secretaria de Educación de Bogotá, cuyo objeto era "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" FI: 18-08-2020 AL 29-09-2023 GRAN TOTAL: 3,12 AÑOS

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: Hoja de vida

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





SED-US-178-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

ASUNTO: FALTA DE INSPECTOR SST EN LOS FRENTE DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

Respetado ingeniero Jiménez,

Mediante oficio No. SED-US-178-2024 del 13 de junio de 2024 informamos que en la inspección realizada entre los días 11 y 12 de junio del presente año, en las instalaciones del colegio IED CAMPESTRE JAIME GARZÓN SEDE LAS AURAS, se evidenció personal realizando actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas, laborando a una altura de aproximadamente ocho (8) metros.

De acuerdo con lo observado durante los recorridos, se está incumpliendo con la normatividad legal vigente para labores en alturas, por las siguientes observaciones:

1. No se cuenta con los permisos para trabajo de alto riesgo (trabajo en alturas).
2. No se cuenta con la presencia de un inspector de Seguridad y salud en el trabajo certificado como coordinador de alturas.
3. El personal no cuenta con elementos de protección contra caídas ni elementos de protección personal de acuerdo con la actividad realizada entre ellos el casco de seguridad con barbuquejo.
4. Los andamios multidireccionales, no se encuentran con todas las piezas que le permitan dar estabilidad y seguridad para las actividades que se van a realizar.
5. No se cuenta con señalización o demarcación del área de trabajo.

Aun cuando se han hecho requerimientos verbales y escritos de no continuar con estos trabajos en alturas hasta no cumplir con los requisitos mínimos, el contratista de obra ha hecho caso omiso a dicha solicitud y se continúan con la ejecución de estos trabajos como se puede ver en el siguiente registro fotográfico.





**GRUPO
EMPRESARIAL**

19/06/2024
Bogotá D.C.




Aunado a lo anterior, en el colegio Juan De La Cruz Varela (IED) en las sedes de La Unión, Erasmo Valencia, Tunal Alto y El Toldo se ha evidenciado que no hay inspector SST que realice el acompañamiento respectivo a las actividades que allí se ejecutan.

Por todo lo anterior, vemos con preocupación la falta de inspector SST en la localidad de Sumapaz más aún cuando los trabajos que están realizando requieren de condiciones especiales como los de trabajos en alturas.

Por ello solicitamos la presentación de un inspector SST de manera urgente en los frentes de Sumapaz y que, hasta no contar con los requisitos y personal mínimo requerido, los trabajos en alturas se suspendan en cada una de las sedes de esta localidad.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



GRUPO 
EMPRESARIAL

19/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-190-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: AJUSTE APU NO PREVISTO NP 011 - ESTAMPADO EN CONCRETO.

Respetado señor Pinzón,

El 29 de junio de 2024 mediante correo electrónico enviado por el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, solicitaron ajustar el soporte del NP 011.

Se evidencia la necesidad de ítem para lograr un superficie texturizada en las zonas duras y áreas de recreación contiguas a las canchas deportivas, lo que genera un mejor acabado que se ajusta mejor al entorno y que por dejar el concreto con la apariencia de adoquín, mejora su integración con el diseño urbano en la mayoría de los colegios. Por tal motivo, el contratista de obra mediante correo electrónico del 19 de junio de 2024 remite el APU No Previsto del estampado en concreto.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: APUS NO PREVISTOS 011 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

19/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-191-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: AJUSTE APU NO PREVISTO NP 012 - REJA CERRAMIENTO.

Respetado señor Pinzón,

El 29 de junio de 2024 mediante correo electrónico enviado por el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, solicitaron ajustar el soporte del NP 012.

En las intervenciones que se realizan en cada una de las sedes educativas, se evidencia la necesidad de cerramientos que dividan las zonas intervenidas y protejan de accidentes a los alumnos y personal del colegio por las actividades deportivas y de recreación que se realizan en la institución, por ello el contratista de obra mediante correo electrónico del 19 de junio de 2024 remite el APU No Previsto de la reja de cerramiento.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: APUS NO PREVISTOS 012 (PDF y Excel)

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

19/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-192-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES A NO PREVISTOS NP-013 ESCALERA METÁLICA CON PASAMANOS.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio del presente y luego de que esta interventoría revisará la justificación de los No Previstos mencionados en el asunto junto con sus respectivos APU, remitimos las siguientes observaciones:

- No se requiere thinner.
- El rendimiento del MORTERO 1:3, TUBERIA AGUAS NEGRAS 1" y TUBERIA AGUAS NEGRAS 3/4" es elevado. Ajustar tomando en cuenta que la escalera se analiza por metro lineal.
- La unidad de medida del PERFIL C 305X80 3MM (apoyo inferior) y PERFIL C 305X80 3MM (pasos) debe ser en m (metros lineales).
- Los valores unitarios donde se menciona que fueron presentado posterior a APUS iniciales, no coinciden. Ajustar.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

25/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-193-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito remitir el acta parcial de obra No. 7 correspondiente al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904, adjunto al presente documento, remito la siguiente documentación:

- Acta parcial de obra No. 7.
- Memoria de cantidades.
- Acta de autorización.
- Soportes parafiscales.
- RIT.
- RUT.
- Certificación bancaria.
- FURC.
- Resolución Facturas de Venta.
- Prefectura.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: los mencionados

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

25/06/2024
Bogotá D.C.

SED-US-194-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: ACTA PARCIAL NÚMERO 7 INTERVENTORÍA.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito remitir el acta parcial de interventoría No. 07 correspondiente al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5305904, adjunto al presente documento, remito la siguiente documentación:

- Acta CB No. 07.
- Prefectura.
- Consolidado planillas de CB INGENIEROS.
- FURC
- RIT

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: lo enunciado

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



**GRUPO
EMPRESARIAL**

24/05/2024
Bogotá D.C.

SED-US-196-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: REMISIÓN DE SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SOBRE MEDIDAS DE CAMPANAS EXTRACTORAS.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito remitir el oficio No. CONS-CLARIDAD-149-2023 del 24 de junio de 2024 mediante el cual el contratista de obra solicita las medidas de las campanas extractoras que se solicitan instalar en las cocinas que se encuentran en construcción o que se están interviniendo en las sedes de San José de Usme, Erasmo Valencia, El Toldo y Las Mercedes.

Lo anterior, con el fin de que el contratista de obra pueda realizar el APU de dichas campanas y esta interventoría pueda revisar y de ser pertinente, presentar a la SED el No Previsto por este ítem.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: CONS-CLARIDAD-149-2023

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-197-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO No. S-2024-173692 - REITERACIÓN RADICACIÓN DE ACTAS PARCIALES.

Respetado señor Pinzón,

El 25 de junio de 2024 mediante radicado No. S-2024-173692, la SED solicitaba el cumplimiento en las fachas de radicación de las actas parciales de los contratos de obra e interventoría, informando que se debían entregar a más tardar el día 20 de cada mes.

Ante dicha solicitud, nos permitimos informar lo sucedido por la no entrega del acta parcial de obra No. 7, la cual fue remitida por el Consorcio Claridad hasta el 18 de junio de 2024 mediante correo electrónico, en dicho correo se encontraban las memorias de cantidades de cada una de las sedes en intervención excepto las cantidades de Las Mercedes y Vivienda Campamento Docente que no hacían parte del correo mencionado.

Esta interventoría con el fin de gestionar oportunamente el acta parcial inició de manera inmediata con la revisión de las memorias de cantidades, y el mismo 18 de junio de 2024 se empezaron a remitir al contratista de obra las primeras memorias con observaciones para que esta fuesen corregidas mientras se continuaba con la revisión de las memorias restantes. Para el 20 de junio de 2024, es decir apenas 2 días después de la radicación del acta parcial, todas las memorias de cantidades habían sido revisadas por la interventoría y remitidas a su vez al contratista de obra para la subsanación de las observaciones y presentación final del acta.





GRUPO 
EMPRESARIAL

26/06/2024
Bogotá D.C.

El 22 de junio de 2024 mediante un nuevo correo electrónico, el contratista de obra remitió nuevamente el acta parcial, pero al hacer la revisión de las memorias de cantidades se evidenció que estas eran iguales a la versión presentada el 18 de junio de 2024, es decir, no se había subsanado ninguna de las observaciones realizadas por esta interventoría, por lo que mediante el mismo hilo de correo electrónico se le informó al contratista de obra que dichas memorias no eran aceptadas hasta que las observaciones fueran subsanadas.

El 24 de junio de 2024 el contratista de obra presenta una nueva versión del acta parcial, la interventoría procede con la revisión de las memorias de cantidades y el acta parcial presentadas, evidenciando que estas fueron ajustadas según lo observado y es en este momento en el que la interventoría procede con la gestión final y posterior radicación tanto del acta parcial de obra como de la interventoría mediante los oficios No. SED-US-193-2024 y SED-US-194-2024 respectivamente.

Lo anterior evidencia que esta interventoría está presta a la gestión de todas las actas parciales tanto de obra como las propias, por lo que para las próximas actas conminaremos al contratista a la presentación de las actas de manera oportuna para que la gestión ante la SED sea la adecuada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-198-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO No. I-2024-74851 - ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904 - CONSORCIO CLARIDAD. VERSIÓN 05.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, remitimos la actualización del informe de presunto incumplimiento del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904, de acuerdo con la solicitud realizada mediante comunicado No. -2024-74851 el 25 de junio de 2024.

Anexo al presente comunicado se encuentra el informe de presunto incumplimiento junto con los anexos que se mencionan en él.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: Informe de posible incumplimiento Consorcio Claridad y Anexos de Presunto incumplimiento contractual.zip

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co





SED-US-199-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES A NO PREVISTOS NP-013 DESMONTE CIELO RASO, NP-014 REINSTALACIÓN CIELO FALSO Y NP-015 MANTENIMIENTO DE PUERTAS.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio del presente y luego de que esta interventoría revisará la justificación de los No Previstos mencionados en el asunto junto con sus respectivos APU, remitimos las siguientes observaciones:

NP 013:

- El rendimiento de la cuadrilla es elevado, recomendamos que este sea de 0,6.

NP 014:

- Para el material FULMINANTE PARA PISTOLA COLOR VERDE O AMARILLO CALIBRE 27XTURA DE 10UND el rendimiento debe ser menor, con 0,10 es suficiente.
- Para la cuadrilla en la mano de obra corregir puesto que no es de Drywall se deber emplear la cuadrilla del ítem contractual 14.1.1 (CUADRILLA II (técnico + ayudante)).

NP 015:





GRUPO 
EMPRESARIAL

27/06/2024
Bogotá D.C.

- El rendimiento de la herramienta menor es elevado, se recomienda valor de 1,0.
- En materiales, la Bisagra en acero tiene un rendimiento elevado puesto que el promedio de una puerta es de 2mx1m y con 3 bisagras es suficiente y con el rendimiento actual la cantidad de bisagras superaría las 3 unidades.
- El rendimiento de la cuadrilla es elevado, ajustar.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexos: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



SED-US-200-2024

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No 66-63

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: APROBACIÓN CAMBIO DE TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CLARIDAD.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente nos permitimos notificar el cambio del Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, presentada por el contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD mediante oficio CONS-CLARIDAD-153-2023, el día 27 de junio del 2024.

Manifestamos que, conforme a los pliegos de condiciones, el técnico que se menciona a continuación cumple con los requisitos exigidos y es aprobado por la interventoría.

Documentos anexos como soporte:

- 1. Cedula de ciudadanía.
- 2. Diploma de grado.
- 3. Licencia de prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.
- 4. Certificaciones laborales.
- 5. Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.

A continuación, presentamos el cuadro resumen de la hoja de vida del profesional.





**GRUPO
EMPRESARIAL**

28/06/2024
Bogotá D.C.

Cargo	Identificación	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
TECNICA SST	Identificación	Técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo o HSE Q con Licencia vigente	N. A	Tres (3) años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula correspondiente.	Dos (2) años de experiencia como técnico o tecnólogo en SST en proyectos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.
DANIELA GRAVIER ORTIZ	1143258116	Técnico profesional en Salud Ocupacional	N.A.	RESOLUCIÓN 0652 de 24 de febrero 2016	EXP1: CONSORCIO EXACTITUD NIT: 901.501.510-3 TECNICO SST contrato No. C01.PCCNTR.2645877 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO FI: 18-08-2020 al 29-09-2023. AÑOS: 3,12

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: Hoja de vida

CC: Supervisor contrato interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana jamorenoa@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodriguez@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507

H.2. Recibida

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 27 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-156-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507


Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: informe mensual No. 7 correspondiente al mes de mayo.

Cordial saludo,

De manera atenta se envía el informe mensual No. 7 (mes mayo) con anexos, ajustado de acuerdo a los requerimientos, para su correspondiente revisión y posterior observación.

Atentamente,



IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Anexos: INFORME MENSUAL No. 7 (228)
ANEXOS.rar

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 2
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 28 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-158-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

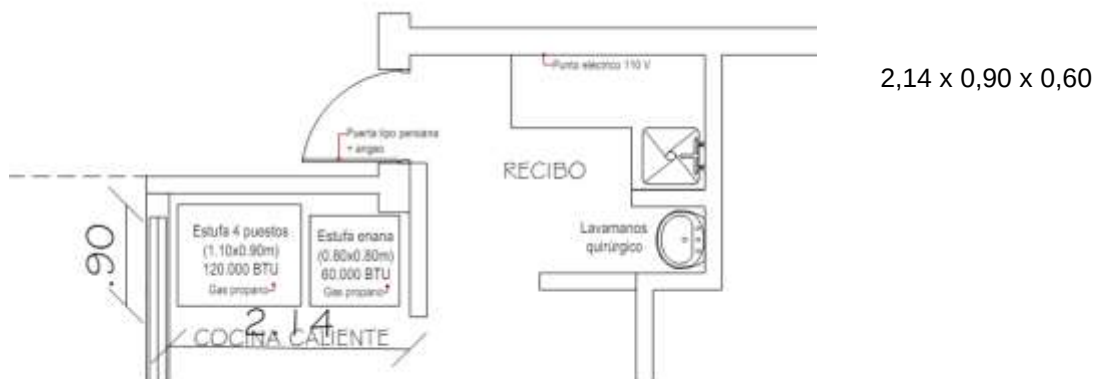
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: verificación medidas de campanas extractoras.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar muy amablemente verificar las siguientes medidas de las campanas extractoras a suministrar e instalar en las instituciones educativas de Las Mercedes, Erasmo Valencia, San José, y Tunal Alto para así proceder de forma definitiva a fabricar bajo dichas medidas.

1. Las Mercedes

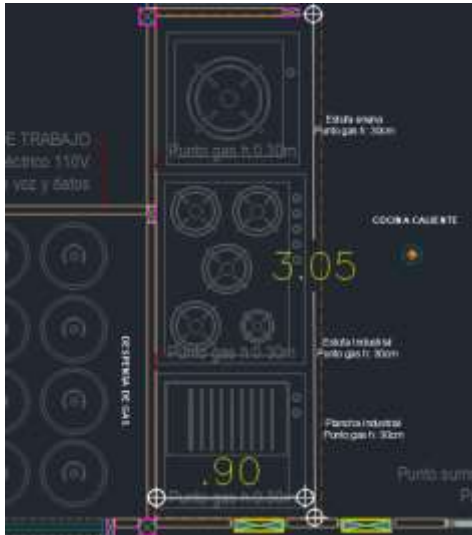


consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 2 de 2
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

2. Erasmo Valencia




3,05 x 0,90 x 0,60

3. San José



4,50 x 1,00 x 0,60

4. Tunal Alto: 3,43 x 1,05 x 0,60



IC. JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 25 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-151-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: NP-013 Desmonte cielo raso, NP-014 Reinstalación cielo falso y NP-015 Mantenimiento de puertas.

Cordial saludo,

En atención al desarrollo del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la entidad contratante, de manera atenta se remiten los siguientes ítems No Previstos – NP para su respectiva verificación y posterior aprobación:

1. NP 013

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-013	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	\$ 24.320,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el alcance proyectado para la IED Jaime Garzón sede Raizal, las cuales comprenden adelantar actividades de instalación de estructura metálica y cambio de cubierta, se deberá realizar el respectivo desmonte de cielo falso existente, constituido por láminas de machimbre de pino, con el fin de protegerlo ante los factores externos de humedad al estar expuesto a la intemperie. la disposición de él se realizará de manera provisional en espacios de la institución educativa, donde se garantice la calidad de este.

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 2 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad vienen de un APU contractual.

2. NP 014

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-014	REINSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE INDIFERENTE EL MATERIAL (NO INCLUYE MASILLA NI ACABADO)	M2	\$ 84.194,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el alcance proyectado para la IED Jaime Garzón sede Raizal, las cuales comprenden adelantar actividades de instalación de estructura metálica y cambio de cubierta, se deberá realizar el respectivo desmontaje de cielo falso existente, constituido por láminas de machimbre de pino, con el fin de protegerlo ante los factores externos de humedad al estar expuesto a la intemperie, generando la reinstalación sobre las áreas de montaje.

MATERIALES.

Los materiales utilizados provienen de ítem contractual y materiales de la Secretaria de Educación.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad vienen de un APU contractual.

3. NP 015

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-015	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA, (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA ABERTURA, LIJADO, PINTURA Y REINSTALACION).	M2	\$ 113.432,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el alcance proyectado para la IED Jaime Garzón sede Raizal, las cuales comprenden adelantar actividades de instalación de estructura metálica y cambio de cubierta, se deberá realizar el respectivo desmonte de puertas en madera existentes, con el fin de protegerlas

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 3 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

ante los factores externos de humedad al estar expuesto a la intemperie; adicional a lo anterior realizando un análisis sobre el estado físico de ellas, se observa el deterioro de las láminas de madera, en su acabado de pintura y sistema de abertura, por lo tanto se considera el mantenimiento respectivo de estas, con el fin de conservar y garantizar el adecuado funcionamiento de estas. el ítem anterior no incluye sistema de cerraduras.


MATERIALES.

Los materiales utilizados provienen de ítem contractual y materiales de la Secretaria de Educación.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad vienen de un APU contractual.

Atentamente,



IC JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Anexos: APUS NO PREVISTOS 013, 014, 015

 		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4		Código: Versión: 0 Fecha: 17/03/2024 Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)		16/05/2024				
CONTRATO No.		C01.PCCNTR.5305904				
OBJETO		"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 5"				
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS				
B. DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-013	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.				M2	24.320,00
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
Cód.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	RENDIMIENTO	V.R. UNITARIO	
HER001	HERRAMIENTA MENOR	H	\$ 830,88	0,75	\$ 623,00	
	ANDAMIO multidireccional	H	\$ 1.815,92	0,63	\$ 1.150,00	
					SUB-TOTAL	\$ 1.773,00
2. MATERIALES						
Cód.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V.R. UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$ -
3. TRANSPORTE						
Cód.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	REND/UNIDAD	V.R. UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$ -
4. MANO DE OBRA						
Cód.	CUADRILLA	UNIDAD	H/C		V.R. UNITARIO	
	CUADRILLA I (oficial + ayudante)	H	\$ 23.257,74	0,75	\$ 17.443,00	
					SUB-TOTAL	\$ 17.443,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 19.216,00
					A.I.U.	\$ 5.103,77
					TOTAL	\$ 24.320,00
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE PROYECTADO PARA LA IED JAIME GARZON SD RAIZAL, LAS CUALES COMPRENDEN ADELANTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y CAMBIO DE CUBIERTA, SE DEBERA REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE, CONSTITUIDO POR LAMINAS DE MACHIMBRE DE PINO, CON EL FIN DE PROTEGERLO ANTE LOS FACTORES EXTERNOS DE HUMEDAD AL ESTAR EXPUESTO A LA INTERPERIE. LA DISPOSICIÓN DE EL SE REALIZARÁ DE MANERA PROVISIONAL EN ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DONDE SE GARANTICE LA CALIDAD DE ESTE.						
CONTRATISTA						
			APROBACIÓN INTERVENTORÍA			
Firma				Firma		
Nombre	ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ			Nombre		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado	ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ			Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
Nombre de la Empresa	CONSORCIO CLARIDAD			Nombre de la Empresa		
NIT ó Cédula	901745447-4			NIT ó Cédula		
APOYO A LA SUPERVISIÓN						
Firma						
Nombre						
NOTAS						
La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems o actividades contractuales. b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los ítems contractuales. c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula. d) El Contratista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios. e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista. f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.						

 <div>ALCALDÍA MAIOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>		 <div>CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4</div>		Código: Versión: 0 Fecha: 17/03/2024 Página: 1 de 1		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
A. DATOS GENERALES						
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)		16/05/2024				
CONTRATO No.		C01.PCCNTR.5305904				
OBJETO		"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 5"				
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS				
B. DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	VALOR UNITARIO	
NP-014		REINSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE INDIFFERENTE EL MATERIAL (NO INCLUYE MASILLA NI ACABADO)		M2	84.194,00	
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HER001	HERRAMIENTA MENOR	H	\$ 830,88	0,75	\$ 623,00	
	ANDAMIO multidireccional	H	\$ 1.815,92	0,63	\$ 1.150,00	
					SUB-TOTAL	\$ 1.773,00
2. MATERIALES						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
	CLAVO ACERO ESTRIADO 1" (500gr)	CAJA	\$ 6.484,00	0,50	\$ 3.242,00	
	FULMINANTE PARA PISTOLA COLOR VERDE O AMARILLO CALIBRE 27XTURA DE 10UND	PAQUETE	\$ 35.779,00	0,20	\$ 7.155,80	
	TORNILLO 7/16	UND	\$ 175,16	11,00	\$ 1.926,74	
	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1" (100 UNIDADES)	PAQUETE	\$ 1.430,00	0,55	\$ 787,00	
					SUB-TOTAL	\$ 13.112,00
3. TRANSPORTE						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	REND/UNIDAD	VR. UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$ -
4. MANO DE OBRA						
Cód.	CUADRILLA	UNIDAD	H/C	VR. UNITARIO		
	CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC (1) HH + AYUD (2) HH + PRES)	H	\$ 39.723,00	1,30	\$ 51.640,00	
					SUB-TOTAL	\$ 51.640,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 66.525,00
					A/IJ	\$ 17.669,04
					TOTAL	\$ 84.194,00
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE PROYECTADO PARA LA IED JAIME GARZON SD RAIZAL, LAS CUALES COMPRENDEN ADELANTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CAMBIO DE CUBIERTA, SE DEBERÁ REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE, CONSTITUIDO POR LÁMINAS DE MACHIMBRE DE PINO, CON EL FIN DE PROTEGERLO ANTE LOS FACTORES EXTERNOS DE HUMEDAD AL ESTAR EXPUESTO A LA INTemperie, GENERANDO LA REINSTALACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE MONTAJE.						
CONTRATISTA						
Firma				APROBACIÓN INTERVENTORÍA		
Nombre		ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ		Nombre		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ		Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
Nombre de la Empresa		CONSORCIO CLARIDAD		Nombre de la Empresa		
NIT ó Cédula		901745447-4		NIT ó Cédula		
APOYO A LA SUPERVISIÓN						
Firma						
Nombre						
NOTAS						
La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:						
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems o actividades contractuales.						
b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los insumos contractuales.						
c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula.						
d) El Contratista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios.						
e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista.						
f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.						

 				CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4		Código: Versión: 0
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						Fecha: 17/03/2024
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)		16/05/2024				
CONTRATO No.		C01.PCCNTR.5305904				
OBJETO		"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 5"				
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS				
B. DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM		DESCRIPCION			UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-015		MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA, (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA ABERTURA, LIADO, PÍNTURA Y REINSTALACION).			M2	113.432,00
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HER001	HERRAMIENTA MENOR	H	\$ 830,88	1,27	\$ 1.051,56	
	PULIDORA	H	\$ 2.924,68	0,76	\$ 2.219,31	
					SUB-TOTAL	\$ 3.271,00
2. MATERIALES						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
	ESMALTE MATE SUPERSint.PINTUO	GL	\$ 47.978,82	0,07	\$ 3.198,59	
	BISAGRA EN ACERO	UND	\$ 10.687,00	1,67	\$ 17.811,67	
					SUB-TOTAL	\$ 21.010,00
3. TRANSPORTE						
Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	REND/UNIDAD	VR. UNITARIO	
		0				
		0				
		0				
					SUB-TOTAL	\$ -
4. MANO DE OBRA						
Cód.	CUADRILLA	UNIDAD	H/C		VR. UNITARIO	
	CUADRILLA I (oficial + ayudante)	H	\$ 29.435,00	2,22	\$ 65.346,00	
					SUB-TOTAL	\$ 65.346,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 89.627,00
					AIU	\$ 23.804,93
					TOTAL	\$ 113.432,00
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE PROYECTADO PARA LA IED JAIME GARZON SD RAIZAL, LAS CUALES COMPRENDEN ADELANTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CAMBIO DE CUBIERTA, SE DEBERÁ REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTES, CON EL FIN DE PROTEGERLAS ANTE LOS FACTORES EXTERNOS DE HUMEDAD AL ESTAR EXPUESTO A LA TEMPERIE; ADICIONAL A LO ANTERIOR REALIZANDO UN ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO FÍSICO DE EL LAS, SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LÁMINAS DE MADERA, EN SU ACABADO DE PINTURA Y SISTEMA DE ABERTURA, POR LO TANTO SE CONSIDERA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE ESTAS, CON EL FIN DE CONSERVAR Y GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTAS. EL ÍTEM ANTERIOR NO INCLUYE SISTEMA DE CERRADURAS.						
CONTRATISTA						
Firma					APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Nombre		ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ			Firma	
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ			Nombre	
Nombre de la Empresa		CONSORCIO CLARIDAD			Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
NIT ó Cédula		901745447-4			Nombre de la Empresa	
					NIT ó Cédula	
APOYO A LA SUPERVISIÓN						
Firma						
Nombre						
NOTAS						
La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:						
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de lo ítems o actividades contractuales.						
b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los insumos contractuales.						
c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula.						
d) El Contratista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios.						
e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista.						
f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.						

	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 5
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 26 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-152-2023

Señores

CB INGENIEROS S.A.S.

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

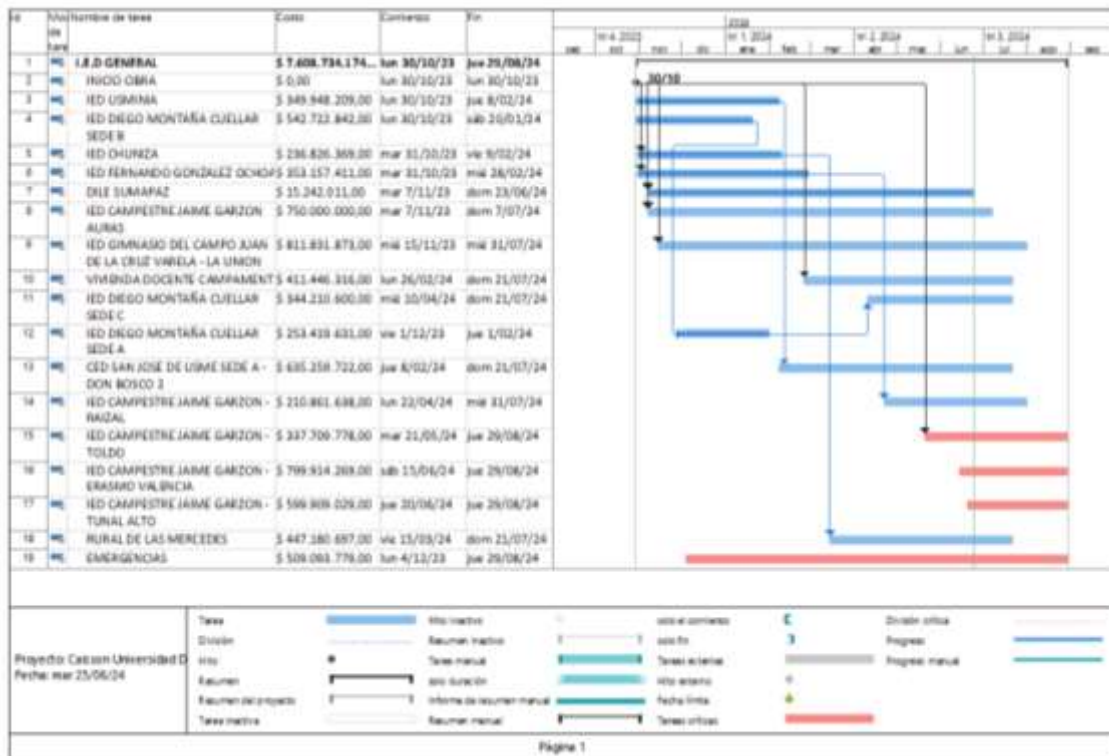
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: solicitud reprogramación general de frentes de obra

Cordial saludo,

De acuerdo con el avance del proyecto se presenta reprogramación de obra teniendo en cuenta aspectos técnicos en cada frente, que han generado actividades adicionales o de una mayor dificultad en su ejecución. Por lo anterior, se solicita una prórroga en tiempo para la entrega de las instalaciones, las cuales se vieron afectadas en su programación inicial.



	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 2 de 5
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

IED JAIME GARZÓN SEDE AURAS (fecha de terminación 07/07/2024)

En este frente de obra se culminan las actividades estipuladas en el presupuesto oficial en el tiempo contractual; sin embargo, el manejo de aguas lluvias no se ejecutó como se tenía proyectado al inicio, teniendo en cuenta que se cambió el esquema de la cubierta y ya no se utilizaría la viga canal como receptora principal de agua, sino que esta iba ser cubierta con la teja tipo sándwich y se proyectaba una canal con el fin de evitar humedades.

En este sentido, fue necesario proyectar un manejo de aguas lluvias hasta las cajas principales, lo cual requirió de obras civiles adicionales que tienen mayor complejidad técnica generando un tiempo adicional de ejecución.



imagen esquema manejo de aguas lluvias cota amarilla y verde

IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN (fecha de terminación 31/07/2024)

Aspectos técnicos que han generado demoras

En la intervención de las baterías de baños se encontró una tubería en gres totalmente tapada, razón por la cual, la batería de niñas estaba fuera de servicio, este aspecto generó cambios sustanciales en la intervención, lo cual conllevó a demolición de placas, ubicación de red hidrosanitaria y diseño de una nueva red que incluía el cambio total de la existente, lo cual implicó construcción de cajas y redes externas hasta entregar en un pozo existente, estas actividades no estaban presupuestadas por lo cual, no se entiende como la interventoría atribuye estos tiempos al Consorcio Claridad cuando fueron actividades que no se encontraban en el proyecto contratado inicialmente.

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 3 de 5
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

En el manejo de aguas lluvias se encontraron diferentes fallos causados por sedimentación y lavado de finos, por lo cual, fue necesario llevar piedra rajón y hacer filtros para conducir el agua a la red de aguas grises.

Bloque de emisora, vivienda docente que se encuentra debajo de la garita solo se tenía proyectado el cambio de cubierta y pisos, sin embargo, se encontraron asentamientos diferenciales considerables con fracturas de placas, así mismo, una vez retirada la cubierta, se evidenció que los muros no estaban aporticados y algunos presentaban peligro de colapso, lo anterior generó nuevas obras de cimentación y estructura para confinar la mampostería existente, otro aspecto que se modificó fue la estructura de cubierta puesto que no habían elementos estructurales donde se pudiera apoyar.

El factor más crítico para el Consorcio Claridad fue la no entrega de espacios para intervenir, puesto que no hay ningún plan de contingencia que sirva para mitigar el atraso, toda vez que las directivas del Colegio entregaron la semana pasada los espacios disponibles para intervención, es claro que esta condicionante no es contractual y afectó el rendimiento de obra en este frente, puesto que no sirve ningún plan de contingencia relacionado con personal o material, cuando no hay frentes de obra.

CAMPAMENTO VIVIENDA DOCENTE (fecha de terminación 21/07/2024)

La intervención de retiro de cubierta dio inicio el 23 de enero de 2024, con actividades de desmonte de cubierta; sin embargo, se evidencio que no había sistema estructural sobre el cual apoyar la estructura metálica, aunado a que son muros en tapia pisada, por lo cual, fue necesario modificar de manera inmediata el plan inicialmente acordado, siendo necesario un nuevo esquema que incluía columnas metálicas de 100*100, con sus correspondientes pedestales, teniendo en cuenta que esta actividad no estaba contemplada en el presupuesto se remitió vía WhatsApp a la interventoría el 26 de febrero de 2024, con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación y no suspender actividades, y dado que en la inspección visual no se podía dimensionar la totalidad de la intervención, lo cual queda evidenciado ya que ninguna de las partes advirtió sobre estas actividades no contempladas en el presupuesto inicial.

Posteriormente la interventoría solicita aclaraciones del esquema presentado y solicita mediante oficio *SED-US-052-2024* donde solicita presentar diseños con viga coronaria, el consorcio Claridad da respuesta mediante comunicación oficial *CONS-CLARIDAD-078-2023* del 29 de febrero de 2024, indicando que no era posible presentar un diseño sobre una viga coronaria teniendo en cuenta que no habían elementos estructurales de apoyo vertical que garanticen el anclaje de la viga a la mampostería y la transmisión adecuada de esfuerzos mediante columnas a la cimentación

Dadas las situaciones técnicas y controversias frente a los diseños que el Consorcio Claridad siempre ha manifestado que no son parte de este tipo de contratos generaron demoras que no pueden ser atribuibles al contratista de obra, y han ocasionado desaceleración en la operación logística en cuanto la instalación de estructura, que para este frente era la ruta crítica, teniendo en cuenta las constantes precipitaciones de la zona durante todo el año.

De acuerdo a lo anterior, ya se instaló la cubierta, por lo que se espera que lo acabados culminen en máximo 3 semanas, toda vez que las precipitaciones no van a afectar el rendimiento de acabados, teniendo en cuenta que se van a ejecutar bajo cubierta.

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 4 de 5
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C (fecha de terminación 21/07/2024)

Las actividades que estaban programadas y presupuestadas se culminan en los tiempos contractuales; sin embargo, surgieron actividades que no estaban en la programación las cuales tienen un tiempo adicional de ejecución así:

Adecuación y mantenimiento de batería de baños

Esta actividad fue identificada durante la ejecución de la obra evidenciando que la red de alcantarillado estaba colapsada y estaba generando malos olores, lo cual podría convertirse en un problema de salubridad, en este sentido, se decidió intervenir de forma total los baños instalando una red hidrosanitaria totalmente nueva.

De igual forma, la instalación donde funcionaba la cafetería no estaba a porticada, situación que se agudizo con la demolición de los pisos ocasionando dilataciones considerables que no permitían un mantenimiento, por lo que fue necesario demoler y adecuar un espacio para el funcionamiento de la tienda escolar.

Por todo lo anterior, se estiman tres semanas después de la programación inicialmente plateada, además se debe tener en cuenta que la entrega de este Colegio fue condicionada a la terminación del IED Diego Montaña Cuellar sede B, lo cual no estaba estipulado en el acuerdo de voluntades y desacelero la cadena logística desplegada por el Consorcio Claridad para este Colegio.

IED SAN JOSÉ DON BOSCO (fecha de terminación 21/07/2024)

La instalación de la cocina en el IED SAN JOSÉ tuvo actividades adicionales en cuanto a la cimentación toda vez que fue necesario implementar una viguetería que permitiera apoyos continuos de los elementos verticales, y evitar deflexiones en la estructura metálica, así como también una placa de contrapiso que garantizará la evacuación de aguas a la canal de aguas lluvias evitando empozamientos.

Dadas las condiciones técnicas se estiman tres semanas más para entregar este frente de obra, totalmente terminado.

IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL (fecha de terminación 31/07/2024)

la entrega de este Colegio estaba condicionada a la adecuación de unas aulas modulares en la sede de Nazareth, situación que no es contractual y que sin duda afecto los tiempos de la programación entregada al inicio del proyecto, sin embargo, se ha desplegado toda la cadena logística del Consorcio Claridad con el fin de cumplir los tiempos impuestos por el apoyo a la supervisión, aun así, se requiere un mes más para culminar las actividades de obra blanca y de urbanismo que se encuentran en el alcance del proyecto.

A la fecha ya se terminó la estructura metálica de cubierta está pendiente la instalación de teja tipo sándwich la cual llega el 26/06/2024, proyectando que la instalación se inicie el 29 de Junio y finalice el 01 de julio de 2024, en este entendido, se han aunado esfuerzo para cumplir con la programación pero no ha sido posible por las actividades de ruta crítica (estructura y cubierta) son predecesoras de obra civil y blanca.

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 5 de 5
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

IED RURAL LAS MERCEDES (fecha de terminación 21/07/2024)

Las actividades en este Colegio se esperan terminar tres semanas después a la fecha se está terminando mampostería, las actividades siguientes son la estructura y cubierta, luego se ejecutarán los acabados de la cocina.

En este frente de obra se han generado dificultades con la permanencia de personal y teniendo en cuenta que se genera un desequilibrio económico por el no reconocimiento del transporte de materiales, más aún teniendo en cuenta que se encuentra por fuera del perímetro urbano y el ítem indica que se debe reconocer después del KM0 del perímetro urbano.

Atentamente,



IC JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Anexo: PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.mpp

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 27 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-153-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: cambio Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y al anexo técnico, me permito informar el cambio de LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ, por DANIELA GRAVIER ORTIZ como Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, cumpliendo a cabalidad con el perfil estipulado en el cargo.

Atentamente,



IC. JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Anexo: DANIELA GRAVIER ORTIZ (15)

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 1 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Bogotá D.C., 27 de junio de 2024

CONS-CLARIDAD-155-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: NP-016 Equipo agua potable y NP-017 Equipo aguas lluvias.

Cordial saludo,

En atención al desarrollo del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la entidad contratante, de manera atenta se remiten los siguientes ítems No Previstos – NP para su respectiva verificación y posterior aprobación:

1. NP 016

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-016	EQUIPO SUMINISTRO AGUA POTABLE- MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO DE PRESION DE SUCCION NEGATIVA A EQUIPO SUMERGIBLE, INCLUYE INSTALACION DE CAMISAS DE ENFRIAMIENTO EN PVC 4" MAS ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES, CAMBIO DE TUBERIA PARA BOMBEO EN PVC -RD 21 PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS),AUTOMATIZACION DE TABLERO DE CONTROL, INSTALACION DE CABLEADO DE FUERZA EN TUBERIA Y CON RECUBRIMIENTO SEGUN NORMA , CON EMPALMES SUMERGIBLES, CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE HIDRONEUMATICO, CAMBIO Y CALIBRACION DE PRESOSTATOS TIPO DANFOSS, ARMADO DE FLAUTA DE DISTRIBUCION A RED DE SUMINISTRO (INCLUYE ACCESORIOS EN PVC, REGISTRO DE CONTROL Y CHEQUE TIPO VERTICAL, SOPORTERIA, FLANCHES DE CONEXION DE 3", PARA LA CONEXION DE RED DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO CHEQUE DE 3M TIPO HORIZONTAL - ACTIVIDAD POR CADA BOMBA). INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE CAMBIO.	UNO	\$ 10.937.602,00

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se justifica por el cambio de bombas sumergibles es necesario realizar ajuste y modificaciones al equipo de suministro de agua potable, ya que algunos de los elementos se encuentran deteriorados o no sirven por condición de los requerimientos de las bombas, y el servicio que se va a prestar.

consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 2 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

MATERIALES.

Los materiales utilizados provienen de ítems contractuales, materiales de la Secretaria de Educación, insumos contractuales del Consorcio Claridad y estudios de mercado.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad vienen de APUS contractuales, equipo contractual del Consorcio Claridad y estudio de mercado.

2. NP 017

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-017	EQUIPO PRESION AGUAS LLUVIAS - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO DE PRESION DE SUCCION NEGATIVA A EQUIPO SUMERGIBLE, INCLUYE INSTALACION DE CAMISAS DE ENFRIAMIENTO EN PVC 4" MAS ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES, CAMBIO DE TUBERIA PARA BOMBEO EN PVC -RD 21 PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS),AUTOMATIZACION DE TABLERO DE CONTROL, INSTALACION DE CABLEADO DE FUERZA EN TUBERIA Y CON RECUBRIMIENTO SEGUN NORMA , CON EMPALMES SUMERGIBLES, CAMBIO Y CALIBRACION DE PRESOSTATOS TIPO DANFOSS, ARMADO DE FLAUTA DE DISTRIBUCION A RED DE SUMINISTRO (INCLUYE ACCESORIOS EN PVC, REGISTRO DE CONTROL Y CHEQUE TIPO VERTICAL, SOPORTERIA, FLANCHES DE CONEXION DE 3", PARA LA CONEXION DE RED DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO CHEQUE DE 3M TIPO HORIZONTAL - ACTIVIDAD POR CADA BOMBA). INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE CAMBIO.	UND	\$ 11.204.342,00

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se justifica por el cambio de bombas sumergibles es necesario realizar ajuste y modificaciones al equipo de presión de aguas lluvias, ya que algunos de los elementos se encuentran deteriorados o no sirven por condición de los requerimientos de las bombas, y el servicio que se va a prestar.


MATERIALES.

Los materiales utilizados provienen de ítems contractuales, materiales de la Secretaria de Educación, insumos contractuales del Consorcio Claridad y estudios de mercado.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad vienen de APUS contractuales y equipo contractual del Consorcio Claridad.

Atentamente,



IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	Página 3 de 3
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

Anexos: APUS NO PREVISTOS BOMBAS V2.xlsm
ESTUDIO DE MERCADO NP BOMBAS.rar

Bogotá D.C., junio de 2024

PARA: **SONIA RODRIGUEZ APARICIO**
Apoyo a la Supervisión del Contrato No CO1.PCCNTR.5313332

DE: **MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE**
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-62405 revisión ítems no previstos Contrato de obra No CO.1.PCCNTRR 5305904, cuyo objeto corresponde a: *“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 05”*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría **CB INGENIEROS SAS** quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU (26.56 %) CONTRACTUAL
NP-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DIAFRAGMA 300 LTS (MODELO MNC 310V- TIEMPO USO CONTINUO 24 HORAS - PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI - 10 BARES - DIMENSIONES 0,55X0,55X1,53 - DIÁMETRO 1 1/4" - MATERIAL ACERO - CAUDAL 01/min	UND	\$ 3.472.098,00	\$ 4.394.287,00
NP-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO CAL 6 / 2 MTS ANCHO X 100 MTS	M2	\$ 2.656,00	\$ 3.361,00
NP-005	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA	Kg	\$ 8.723,00	\$ 11.040,00

Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No previstos: Oscar Julián Olea Salgado – Profesional – DCCEE





Bogotá D.C., junio de 2024

PARA: **SONIA RODRIGUEZ APARICIO**
Apoyo a la Supervisión del Contrato No CO1.PCCNTR.5313332

DE: **MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE**
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-68234 revisión ítems no previstos Contrato de obra No CO.1.PCCNTRR 5305904, cuyo objeto corresponde a: *“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 05”*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría **CB INGENIEROS SAS** quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU (26.56 %) CONTRACTUAL
NP-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BALONCESTO EN ACRÍLICO ORIGINAL 120 CM X 180 X M EN 10 MM DEMARCADO	UN	\$ 958.618,00	\$ 1.213.227,00
NP-010	INSTALACIÓN DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS Y TORNILLERÍA)	M2	\$ 35.367,00	\$ 44.760,00

Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área.

Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No previstos: Oscar Julián olea salgado – Profesional – DCCEE 



Bogotá D.C., junio 2024.

Señores

CB INGENIEROS SAS

Atn.: MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO (R.L.)

Dirección: carrera 10 N°87A-13

Teléfono: 7040592

Ciudad: Distrito Capital de Bogotá

Correo electrónico: info@cbingenieros.com



Asunto: Respuesta Radicado E-2024-91007 y E-202491273. APU NP8 Y NP10. Contrato de obra CO1.PCCNTR.5305904 del 05 de septiembre 2023

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.”

Respetado señor Salgado

En el marco de las competencias de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED descritas en el artículo 31 del Decreto 310 de 2022 y en atención al radicado del asunto remitido a la Secretaría de Educación Distrital y teniendo en cuenta lo señalado en el que la “(...) interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respectiva aprobación” en relación con el Precio No Previsto:

ITEM	DESCRIPCION	UN.	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU (26.56 %) CONTRACTUAL
NP-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BALONCESTO EN ACRILICO ORIGINAL 120CM X 180XM EN 10MM DEMARCADO	UND	958.618,00	\$ 1.213.227,00
NP-010	INSTALACIÓN DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS Y TORNILLERIA)	M2	\$ 35.367,00	\$ 44.760,00

Una vez realizada la verificación por parte del Equipo de Estudios Previos de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, se emite concepto mediante el radicado No. I-2024-71279 del 17 de junio de 2024, así:

“El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada,



sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.”

Por lo anterior, se solicita a la interventoría implementar la actividad y valores señalados, así como realizar el debido seguimiento.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Elaboro: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio -Contratista DCCEE.

Reviso: Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana - Profesional Especializado DCCEE.
Abg. Diana C. C.Armenta - Abogada -DCCEE



Bogotá D.C., junio 2024.

Señores

CB INGENIEROS SAS

Atn.: MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO (R.L.)

Dirección: carrera 10 N°87A-13

Teléfono: 7040592

Ciudad: Distrito Capital de Bogotá

Correo electrónico: info@cbingenieros.com



Asunto: Respuesta Radicado E-2024-87547, E-2024-87694 y E-2024-87701. APU NP2, NP2 Y NP5. Contrato de obra CO1.PCCNTR.5305904 del 05 de septiembre 2023.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.”

Respetado señor Salgado

En el marco de las competencias de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED descritas en el artículo 31 del Decreto 310 de 2022 y en atención al radicado del asunto remitido a la Secretaría de Educación Distrital y teniendo en cuenta lo señalado en el que la “(...) interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respectiva aprobación” en relación con el Precio No Previsto:

ITEM	DESCRIPCION	UN.	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU (26,56%) CONTRACTUAL
NP-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO DIAFRAGMA 300 LTS (MODELO MNC 310V- TIEMPO USO CONTINUO 24 HORAS - PRESION MAXIMA 150 PSI - 10 BARES - DIMENSIONES 0,55X0,55X1,53 - DIAMETRO 1 1/4" - MATERIAL ACERO - CAUDAL 01/min	UND	\$3.472.098,00	4.394.287,00
NP-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO CAL 6 / 2 MTS ANCHO X 100 MTS	M2	\$ 2.656,00	\$ 3.361,00
NP-005	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	\$ 8.723,00	\$ 11.040,00

Una vez realizada la verificación por parte de Equipo de estudios previos de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos educativos, se emite concepto mediante el radicado No. I-2024-71141 del 17 de junio de 2024, así:

“El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como



cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.”

Por lo anterior, se solicita a la interventoría implementar la actividad y valores señalados, así como realizar el debido seguimiento.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Elaboro: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio -Contratista DCCEE.

Reviso: Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana - Profesional Especializado DCCEE.
Abg. Diana Armenta - Abogada -DCCEE

I. Bitácora

BITACORA DE OBRA

SEDE TUNAL ALTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORIO CLARIDAD

No. DE CONTRATO: CO1. PCCNTR. 53059004


OBJETIVO DE CONTRATO: GRUPO 5

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTBRE DE 2023


ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."


CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CR INGENIEROS S.A.S


No. DE CONTRATO: CO1. PCCNTR. 5313332


 JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
 DIRECTOR DE OBRA


 ANDRES FELIPE MACAREZ
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


 LEONARDO TORRES PINA
 RESIDENTE DE OBRA


 CRISTIA CAMILO BARRAGAN
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 DIANA MAYERLI ARGUELLO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Martes 18 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Miércoles 19 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Jueves 20 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Viernes 21 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Sábado 22 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Domingo 23 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Lunes 24 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Martes 25 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Miércoles 26 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Jueves 27 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Viernes 28 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Sábado 29 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Domingo 30 de Junio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Lunes 01 de Julio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Martes 02 de Julio 2024

No se realizan Actividades

Firma Contratista

Interventoria

Miércoles 03 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra
1 inspector Interventoria

Equipos: Herramienta de mano

Actividades: Se realiza recorrido en obra Contratista
Interventoria y se hacen observaciones de lo que
falta en Salón Provisional, se realiza ingreso de
Herramientas del subcontratista, para empezar actividad
en la casera, se revisa el muro de ladrillo que esta
caído, se toman medidas en comedor para campana
Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista

Interventoria



Jueves 04 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra
1 Residente Interventoria, 1 SST Interventoria, 1 inspector
Interventoria, 1 Maestro de obra, 1 Oficial.

Equipos: NA

Actividades: Se realiza recorrido en obra
Contratista, Interventoria para definir Zafatas
para soportes de estructura bloque casera, desmontaje
de carapeta y mezos Salón informativo, Troncho
para salón provisional, desmontaje de lamparas
led y lamparas herméticas bloque casera, desmontaje
techo madera bloque casera



Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 
 viernes 05 Julio 2024
 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector Interventoria
 1 Maestro de obra, 2 Oficial de obra.

Equipos: NA

Actividades: Se realiza desmontaje de techo
 bloque casaca madera, instalación de cancheta
 doble salón provisional, instalación de tablero
 eléctrico con totalizador, salón provisional.

Clima: Se presentan lluvias en el día



Firma Contratista  Interventoria 
 Sábado 6 Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector Interventoria
 1 Maestro de obra, 2 Oficial

Equipos: NA



Actividades: instalación de cancheta doble salón
 provisional, instalación de cableado salón provisional,
 desmontaje de techo en bloque casaca, traslado de
 material a punto de acuyón.

Clima: Se presentan lluvias en el día

Firma Contratista  Interventoria 
 Domingo 07 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1
 Maestro de obra, 1 Oficial de obra.

NO se realizara actividades en obra, Día Festivo



Firma Contratista  Interventoria 
 Lunes 8 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria
 1 Maestro de obra, 2 Oficial de obra.

Equipos: NA

Actividades: Arreglo de cerramiento casaca instalación de
 Tama regulados Marangu, arreglo acometida salón provisional
 Tablero eléctrico, instalación de vidrios salón provisional
 cableado Tablero eléctrico acometido, instalación de Pisos

Clima: Tiempo seco

Firma Contratista  Interventoria 
 Martes 9 de Julio 2024



Personal en obra: 1 Director de obra, 1 Director Interventoria
 1 Residente de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector
 de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 SST de obra, 1 Maestro
 de obra, 2 Oficial de obra. Chelma, Ing. Sonia R.

Equipos: NA

Actividades: Tapado de goteras salón provisional
 instalación vidrios ventanas salón provisional, remate
 de super board puerta salón provisional, demoliciones
 de enchape Puella casaca, desmontaje de techo, demoli-

ción y luminarias herméticas Salón provisional, casaca,
 desmontaje de luz led oficina coordinación, casaca,
 desmontaje de techo coordinación, se realiza segundo
 en obra: Contratista SED, Coordinador de la sede,
 Interventoria, se realiza entrega salón provisional.

Clima: Tiempo seco

Firma Contratista  Interventoria 
 Miércoles 10 de Julio 2024



Personal de obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria
 1 Maestro de obra, 2 Oficial de obra.

Equipos: NA

Actividades: Se demolicion enchape de piso casaca
 Puella, recogida de R.D Puella casaca, Asco en
 Puella casaca, Sellado de platinas y media caña
 con Sika Flex, Pintura media caña salón provisional.

Lijado y Remate super board puerta salón provisional.
 Pintura en Remate de Puella salón provisional.

Clima: Tiempo seco

Firma Contratista  Interventoria 
 Jueves 11 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra
 1 SST de obra, 1 Maestro de obra, 2 Oficiales de obra

Equipos: NA

Actividades: Se realiza asco en Puella casaca, traslado


de materiales Sabana, Saco, Fraccionamiento, Punto de acopio, Organización de materiales y organización de cerámicas. Zona verde acopio de materiales.

Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Viernes 12 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: NA. Se reporta la llegada de una camioneta.


Actividades: Se realiza demolición de Sabana Puzillo Casera.

Clima: Se presenta nublado de lluvias en el día.
Firma Contratista  Interventoria
Sábado 13 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: NA


Actividades: demolición Sabana Puzillo Casera, recolección de RCD Puzillo Casera.

Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Domingo 14 de Julio 2024

No se realizó actividades en obra.

Firma Contratista  Interventoria
Lunes 15 de Julio 2024

No se realizó actividades en obra.


Firma Contratista  Interventoria
Martes 16 de Julio 2024

Personal en obra: Inspector de obra, Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra.

Equipos: NA

Actividades: Organización de materiales, Punto de acopio.


NOTA: el Residente de obra reporta la llegada de una camioneta con estructura metálica y vanilla el día 12-07-2024.

Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Miércoles 17 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: 1 Volqueta

Actividades: Se realiza desmenuje de Materiales Cemento, madera para ceramización, Tablas, Se realiza recolección de RCD, caños, Puzillo Casera.

Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Jueves 18 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes.

Equipos: Demolidor 1

Actividades: Se realiza demolición de escalera casera, retiro de basandas, maderas para demolición de escalera, Traslado de RCD a Punto de acopio.

Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Viernes 19 de Julio 2024

Personal en obra: Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: 1 Demolidor

Actividades: Demolición Escalera Casera, Traslado de RCD a Punto de acopio, Arreglo de ceramización para acopio de Materiales.


Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista  Interventoria
Sábado 20 de Julio 2024

Personal en obra: Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 SST de obra, 1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra.

Equipos: 1 Demolidor

Actividades: demolición de escalera casera. Se realiza Traslado de RCD a Punto de acopio.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 


Domingo 21 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria
1 SST, 1 Maestro de obra, 3 Ayudante de obra.

Equipos: 1 Demolidor

Actividades: Demolicion de escaleta casera, asieglo de ceramendo patio de casera, Trasego de RCD.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 

Lunes 22 de Julio 2024



Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria
1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra.

Equipos: Demolidor

Actividades: Se realiza demolición de escalera casera, Trasego de RCD a punto de acopio,

corte de acero escalera.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 

Martes 23 de Julio 2024



Personal en obra: 1 Director de obra, 1 Residente interventoria
1 Inspector de obra, 1 Inspector interventoria, 1 SST de obra
1 SST Interventoria, 1 Maestro, 3 Ayudantes de obra
Ing. Jona Rodriguez

Clima: Se presentan 6 horas de lluvias en el día

Equipos: N/A

Actividades: demolición de escalera, demolición de rampa casera, Trasego de RCD a punto de acopio

recorrido en obra, Contratista, S&O, Interventoria

Firma Contratista  Interventoria 

Miércoles 24 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector interventoria
1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra.


Equipos: 1 demolidor

Actividades: Se realiza demolición de escalera

Casera, Trasego de RCD a punto de acopio

desmontaje de baranda, Rampa, demolición de rampa casera

Clima: Se presentan 1 hora de lluvias en el día

Firma Contratista  Interventoria 

Jueves 25 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra
1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra



Equipos: 1 camion

Actividades: Trasego de RCD a punto de acopio
demolición de escalera y Rampa, instalacion de 6 tacos

zola provisional, Desmigue materiales de camion

varilla, Acero para zapatas

Clima: Se presentan 1 hora de lluvias en el día

Firma Contratista  Interventoria 


Viernes 26 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra
1 Inspector Interventoria, 1 Maestro, 3 Ayudantes de obra.

Equipos: de molador

Actividades: demolición de escalera casera, Trasego de RCD a punto de acopio.

Clima: Se presentan 6 horas de lluvias en el día

Firma Contratista  Interventoria 



Sábado 27 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra
1 Inspector Interventoria, 3 Ayudantes de obra

Equipos: 1 demolidor

Actividades: de molienda de escalera casera, Trasego de RCD a punto de acopio.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 


Domingo 28 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra
1 Inspector Interventoria, 2 Ayudante de obra.

Equipos: 2 demolidor

Actividades: Demolicion de escalera Casana, Trasego de RCD a Puesto de control.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 



Martes 29 de Julio 2024

Personal en obra: Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes, 1 soldador, 1 Pintor.

Equipos: demolidor 2, Equipo soldadura 1

Actividades: Soldadura de empalmes estructuras metálicas demolicion de escalera Casana, trasego RCD.

Clima: Se presenta 2 horas de lluvia.

Firma Contratista  Interventoria 



Martes 30 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector Interventoria, 1 Maestro, 2 Ayudantes.

Equipos: demolidor 2

Actividades: se realiza demolicion de escalera y trasego de material RCD casana, corte con pulidora para demolicion de placa, demolicion de placa piso frente a casana, excavacion manual de zapatas casana.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 


Miércoles 31 de Julio 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector Interventoria, 1 Maestro, 2 Ayudantes.

Equipos: 2 Demolidor

Actividades: demolicion de placa piso casana excavacion manual de zapatas frente a casana Trasego de RCD.

Clima: Tiempo Seco

Firma Contratista  Interventoria 

BITACORA DE OBRA

SEDE GRASMO VALENCIA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CLARIDAD

NO. DE CONTRATO: CO1. PCCNTR. 5305904


OBJETO DE CONTRATO: GRUPO 5

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2023


ADELCATAR OBRA DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CB INGENIEROS S.A.S

NO. DE CONTRATO: CO1. PCCNTR 5313332




JAIR IÑIGO JIMENEZ PINEDA
DIRECTOR DE OBRA



LEONARDO TORRES LARA
RESIDENTE DE OBRA



ANDRES FELIXE MACKENZIE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CRISTIAN CAMILO BARRAGAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIANA MAYERLY ARGUELLO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JuNES 06 JUNIO 2024 Inicio Actividades

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 SST de obra, 1 Maestro de obra, 2 Ayudante de obra.

Equipos: 1 volquete doble trazo Arena, Grusilla

1 Camión con Materiales, 1 Camión con Materiales. Tuberia concreto varilla de 1/2, Felisaibum, madera, Herramientas

Actividades: Se realiza desmontaje de Puig, Se realiza excavación manual para madera de cementos, se realiza cerramientos. Arco de trabajo, se realiza clausura de seguridad, instalación de malla cementita, desape de materiales cemento.

NOTAS: el día 21 de Mayo 2024 se realiza socialización con la comunidad, docentes de la sede, Rectores de la sede y con el Ing. Juan Rodríguez SED, Interventoria. 21 de Junio 2024

el día 21 de Junio 2024 se realiza asta de varilla del

Clima: Se presenta 3 horas de lluvias durante el día

Firma Contratista: [Firma] Interventoria: [Firma]

Martes 3 de Junio 2024

Personal de obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: Herramienta de mano

Actividades: instalación de cementos, Armado cuerpo para aspe de Material Señalización y cerramiento de cerca. Se realiza desmontaje de Puig, demolición y retiro. Se realiza trasego de Puig.

Clima: Tiempo seco

Firma Contratista: [Firma] Interventoria: [Firma]

Sábado 8 de Junio 2024

Personal en obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: Herramienta de mano, 1 Camión

Actividades: Se realiza instalación de cementos, Trasego de RCD, Sacado de Medidas Niveles para Zapatas.

excavación manual de Zapatas, Armado de bazo para Fijado de Acero, Descargue de cemento Materiales Acero, Accesorios

Clima: Tiempo seco

Firma Contratista: [Firma] Interventoria: [Firma]

Domingo 9 de Junio 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: Herramienta de mano, 1 Camión

Actividades: Se realiza excavación de Zapatas y demolición de bordillo, se realiza trasego de RCD, Corte de Acero y Fijado, se realiza excavación para viga, Descargue de materiales cemento Acero baula Fleje.

Tiempo: Clima seco

Firma Contratista: [Firma] Interventoria: [Firma]

Lunes 10-06-2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Inspector de obra, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.

Equipos: Herramienta de mano

Actividades: Se realiza armado de canastas para Zapatas Armado de canastas para viga Armado Acero, Fijado de Acero y Corte, excavación manual de Zapatas y viga Trasego de RCD.

Clima: Se presenta 4 horas de lluvias durante el día

Firma Contratista: [Firma] Interventoria: [Firma]


Martes 11 de Junio 2024

Personal en obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra, ingreso Ing. Juan Rodríguez SED, Personal de OTIC, Oscar Zapata Tecnología, Andrés Galindo Técnico Nivel 2, Miguel Sanchez ingeniero electrico Miguel Cuadros Supervisor OTIC, Yamil Torres Coordinador Suministro OTIC.

Equipos: Herramienta de mano

Actividades: Se realiza excavación manual de zapatas y suaja viga, se realiza trasiego de RCD Armado de canchales para zapata, Armado de acero para viga, Engrudo de Acero, se realiza visita de OTIC, Ing. Saúl Rodríguez S&D, Contratista.

Clima: Se presentaron lluvias durante el día.


Firma Contratista:  Firma Interventoria: 

Miércoles 12 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro, 3 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realizan actividades de excavación manual para zapatas y vigas. De igual manera se realiza el trasiego de material RCD hasta el punto de acopio autorizado. De igual manera se realiza amarrado de acero para cimentación y al figurado. Se presentaron fuertes lluvias durante casi toda la jornada laboral dificultando la ejecución de actividades.

Firma Contratista: 

Firma Interventoria: 


Jueves 13 de Junio de 2024


Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realiza la excavación manual de las últimas 2 zapatas. Así se completo los 9 zapatas con medidas de .80mts x .80mts x .90mts. De igual manera se termino la excavación de zanjas para vigas perimetrales e intermedias. Como el terreno presenta alta cantidad de arcilla se procede a descontaminar con rebase revuelto con cemento con una capa agregada de .10mts. Posterior a ello se agrega un solado de .10mts para afirmar y eliminar humedad. Se presentan

algunas lluvias en horas de la tarde

Firma Contratista: 


Firma Interventoria: 


Viernes 14 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realiza excavación manual de la zanja para la tubería de la trampa de grasa. Sobre las 9:30 llega el camión de placas SHU-38 con cemento, Puropiso, pegador. Además llega la volqueta de placas 5x8-473 con material de río. Sobre las 2 pm se termina de descargar el camión y no se pueden realizar más actividades ya que las condiciones del clima no favorecieron.

Firma Contratista: 

Firma Interventoria: 


Sábado 15 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Martillo Demolidor.

ACTIVIDADES: Se realizaron actividades correspondientes al armado y figurado de las vigas laterales de 7mts de longitud x .25 x .25 mts con separación de refuerzo en fleje inicial de .10mts y intermedia de .17mts. Se figuraron y armaron 3. De igual manera se armaron los canchales para zapatas. Por otra parte se empezó a demoler el piso en madera del solon 7. Se presentó lluvia durante toda la jornada laboral.

Firma Contratista: 

Firma Interventoria: 

Domingo 16 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector

de Interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes
EQUIPOS: Herramienta de mano

ACTIVIDADES: El personal Ingresó sobre las 9 Am a realizar labores de descarga de material que llega en el camión de placas. SWH-362 con enchape de porcelanato, baguilla, pegador y cemento. Una vez descargado el material se procede a desastalar el piso de madera del sala 1 y 2 realizando su respectivo trasiego de RCDs. las actividades se suspenden sobre las 3 pm por inicio de lluvia.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 17 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta de mano

ACTIVIDADES: se realiza la demolición de piso en madera de salones 3 y 4. Esta actividad comprende retirar la madera existente y realizar el trasiego de todo este material hasta el sitio de acopio. Se presentan algunas lluvias durante la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 18 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Martillo de demolición.

ACTIVIDADES: se continua con la demolición de piso tipo madera de los salones 4 y 5. Esta actividad comprende el trasiego de ese material hasta el acopio. Por otra parte se empieza a demoler el piso del pasillo que conduce hacia las cocinas del baño. De igual manera se realiza el trasiego de

ese material hasta el sitio de acopio. se presentan lluvias suaves en horas de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 19 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 maestro de obra, 2 Ayudantes

EQUIPOS: Martillo demoledor, Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: se continua con la demolición y excavación del piso existente y así vez se excava 0.10 mts. para poder agregar carpeta de recebo. por otra parte se inicia el pegue de piso duro piso en sala 1. se evidencia que salones 4 y 5 se tiene que agregar un piso de nivelación para el pegue de duropiso. De igual manera se evidencia que los pedestales que soportan los pariles de madera y que así vez soportan la estructura de cubierta están quedando sobre pequeñas áreas del piso que se está demoliendo. se presentan lluvias por toda la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 20 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 2 ayudantes, 1 Inspector de Interventoria

EQUIPOS: Martillo demoledor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realizan actividades de demolición y excavación del piso existente en pasillo baños y en pasillo comedor. esta actividad comprende el trasiego del RCD hasta el acopio. se evidencia que todo el pasillo de comedor y pasillo baño cuenta con 2 capas de tableta. Por otra parte se realiza la instalación de piso duro piso en salones 1 y 2. Junto con el reare con mortero a paredes interiores de las aulas. se presentan algunas

Trabaja en la jornada de la mañana

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 21 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero residente, 1 Inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Martillo demoledor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realiza demolición, excavación y trasiego del material tipo escombros retirado del piso existente hasta el sitio de acopio. de igual manera se agrega mortero de 0,006m para nivelación de piso salón N° 4. Por otra parte se continúa con la instalación de piso Duropiso en salones 2 y 3. Se presentan lluvias en casi toda la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 22 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Martillo demoledor, Herramienta menor

ACTIVIDADES: se continúa con la demolición, excavación y trasiego del material RCD hasta el sitio de acopio. Este material es proveniente del piso de los pasillos que se están demoliendo. Adicionalmente se realizó la instalación de piso Duropiso en salones 3 y 5. Mientras que en salones 1, 2 y 4 se realizó el aplique de boquilla en intermedio de baldosas. Se presentaron lluvias fuertes en horas de la mañana y algunas lluvias más suaves en horas de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 23 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES: se realiza trasiego de recebo para agregarla en capa de 0,18 mts para su compactación en pasillo de circulación baños. Adicionalmente se realizó el reape con ponete tipo mortero en muros externos del pasillo comedor y pasillo baños. Se presentan lluvias en la jornada de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 24 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector de interventoria, 1 maestro y 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES: se realiza el trasiego de recebo para aplicarlo en pasillos con una carpeta de 0,18 mts. y se realiza su afirmado y compactado con el conguero. Por otra parte se realizó el pegue e instalación de piso Duropiso en salón N° 4. Esta obra queda con un faltante de aprox 6 mts² por toma de medidas incorrectas. De igual manera se recibe observación por parte del residente de obra para ampliar la caja de inspección aguas lluvias a un área de medidas .60 x .60. Se prevén algunas lluvias en horas de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 25 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero residente, 1 Inspector de interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes.

EQUIPOS: Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realiza el afirmado y compactación de recebo en las pasillas. Adicionalmente por observación de la interventoría se solicita fundir un dado (pedestal), como soporte y afirmamiento de una de las columnas de mortaja que sostienen la estructura de la cubierta. El personal se retira a las 2 pm por falta de materiales para desempeñar sus labores.

Firma contratista

Firma Interventoría

Miércoles 26 de junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 2 ayudantes.
EQUIPOS: Canguro y Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realiza el afirmado y compactación del material tipo recebo. Después de afirmado se mide y corta un plástico que actuara como material aislante de humedad. Se realiza observación por parte de interventoría, para que se retire un recebo que no cuenta con la consistencia necesaria y por el contrario supera la plasticidad del material. Se recibe material que se transporta en el camion de placas SUH-362 del cual se descarga cemento, malla pintura. Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Jueves 27 de junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero residente, 1 Inspector de Interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes.
EQUIPOS: Trompo para premezclado, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realiza la instalación de

mezcla en pasillo comedor compensar hasta el pasillo baños, esta actividad se dejó con una mezcla esparcida para realizar el empalme de este concreto con el de pasillo comedor. Esta capa quedo con un aprox de .10 a .12 mts. con resuelto de malla electrosoldada de 6mm. sobre las 3 pm se retira el personal. se presentan Fiestas patronales en horas de la tarde.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Viernes 28 de junio de 2024.

No se realizan actividades ya que el personal viaja por permanencia de 3 fines de semana realizando actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Sábado 29 de junio de 2024.

No se realizaron actividades ya que el personal viaja por permanencia de 3 fines de semana realizando actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Domingo 30 de junio de 2024.

No se realizaron actividades ya que el personal viaja por permanencia de 3 fines de semana realizando actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Lunes 01 de julio de 2024 (Festivo)

No se realiza ninguna actividad en esta sede debido a que el personal viaja por permanencia de 3 fines de semana realizando actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoría

BITACORA DE OBRA.

Colegio Campestre Jaime Garzón
I.E.D. sede Raízal

CONTRATISTA DE OBRA: Consorcio claridad.

Nº DE CONTRATO: COT, PCCNTR. 530 5904


OBJETO DEL CONTRATO: Grupo 5


FECHA DE INICIO:


"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."


CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CB INGENIEROS S.A.S

Nº DE CONTRATO: COT. PCC NTR. 5313332


JAIRDO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
DIRECTOR DE OBRA.


ANDRES FELIPE MACKENZIE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.


LEONARDO TORRES LARA.
RESIDENTE DE OBRA.


CRISTIAN CAMILO BARRAGAN.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIANA MAYERLY ARGUELLO.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Martes 28 de Mayo del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores, 1 electrico.

Equipos: 1 taladro, 1 pulidora

Actividades: la obra inicia desmontando las luminarias en los salones, vivienda docente, cocina y pasillo de circulación. Por otra parte se realizo el desmonte de cielo falso de madera tipo machimbre en los salones de preescolar, primero, Informática y pasillo de circulación. Se realiza la observación de cubrir puntos electricos, cajas y uniones por los que pueda ingresar agua a la tubería. las condiciones del Clima Fueron de lloviznas durante casi toda la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 29 de Mayo del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra, 3 oficiales de acabados

Equipos: 1 pulidora, 1 taladro, 1 planta o generador de energia para eventualidades con el fluido electrico, sin embargo el generador no cuenta con combustible.

Actividades: se realiza el desmonte de la cubierta de teja tipo Eternit en los salones de preescolar, primero, Informática y pasillo de circulación. Esta actividad comprendio cubrir todos los puntos electricos. En la cocina se retiro solamente el cielo raso tipo PVC. Algunos mobiliarios fueron trasladados hasta una bodega cercana para evitar que se mojaran. Todo el personal desarrollo trabajos en alturas los cuales no tuvieron certificación ni supervisión por parte de un profesional SST del consorcio. de igual manera se hace la observación por parte de la interventoria para reunir el requerimiento total de puntos electricos.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 30 de Mayo del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria, 3 ornamentadores

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, - planta o generador de energia para eventualidades mas sin embargo no cuenta con combustible

Actividades: se realiza el consolidado de medidas para corte y soldadura de empalmes en estructura metalica. Por observación de la institución educativa se retiran las puertas para evitar daños. De igual manera se le realiza la observación de aplicar anticorrosivo y primer mano de pintura antes de su instalacion en puertas. Clima no favorable

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 31 de mayo del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, 1 generador de energia para eventualidades, sin embargo no cuenta con combustible

Actividades: se realizaron actividades consolidadas de empalmes estructurales metalicos para la cubierta. De igual manera se midieron y cortaron las planchas para asegurar las celosias. las actividades quedaron suspendidas sobre las 2 pm por presencia de neblia y lluvia tipo nevada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 1 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria, 3 ornamentadores

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, 1 generador de energia para eventualidades, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realizan soldaduras y cordones de empacados en estructura metálica para cubierta. Toda pieza soldada se limpia y se le realiza aplicación de anticorrosivo y primera mano de pintura. El clima fue nublado sin lluvias.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 02 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, 1 generador de energía para eventualidades, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: las actividades inician sobre las 11am debido al mal estado del clima y la baja niebla que impide poder soldar. Sin embargo se realiza la toma de medidas y corte de material. De igual manera se realizan algunas soldaduras de empacados.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 03 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, 1 generador de energía para eventualidades, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: Debido a las lluvias acompañados de fuertes vientos y niebla baja, se inician labores de corte y soldadura de empacados sobre la 1ra. Estas labores se desarrollaron hasta las 8 pm teniendo en cuenta que el estado del clima mejoró.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 04 de Junio del 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 taladro, 1 pulidora, 1 generador de energía para eventualidades en el fluido eléctrico, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realiza la cubida de empacados sobre muros (perfil 160 x 120). Mas sin embargo, se evidencia (que) que el muro de doble pared del costado de la cancha, tiene una anomalía en su escuadra. Adicionalmente se realiza la observación para que se cubra con carton o algun otro material el piso para evitar salpicaduras y manchas en las lasas del polideportivo.

NOTA: De acuerdo con los niveles tomados en campo, se evidencia que los muros intermedios Eje (A-B) (2-4) no se encuentran alineados en altura, lo que genera vacíos entre las vigas empachadas (Perfil 160 x 120) y la culatas, por lo que se deberá soldar a la platina un suplemento (ángulo) con el fin de anclar la estructura de cubierta al módulo y manejar los niveles respectivos. El clima favoreció la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 05 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 taladro, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico, sin embargo no se cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realizan la soldadura de vigas de correa y cordones en las correas. Esta actividad estuvo muy interrumpida por el mal estado del clima y la baja niebla. Por otra parte se le realiza nuevamente la observación al contratista para que la estructura se solda, una vez se cuente con anticorrosivo y una

Primer mes de pintura.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 06 del Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 taladro, 1 pulidora, 1 generador de energía para eventualidades en el fluido eléctrico, sin embargo no cuentan con combustible.

ACTIVIDADES: se realizó medición y corte de vigas al igual que las correas para la estructura de la cubierta. Por otra parte se limpió y se pintó las secciones que estaban listas para ser soldadas. En toda la jornada laboral se cuentan fuertes lluvias. El personal labora hasta las 7:43 pm debido a que las condiciones del tiempo mejoraron a esta hora.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 07 del Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 ornamentadores.

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 taladro, 1 pulidora, 1 generador de energía para eventualidades en el fluido eléctrico, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realiza soldadura de correas y vigas para la estructura de cubierta. Por indicación de interventoria se solicita que se bajen de la misma por temas de seguridad ya que los fuertes lluvias representan peligro en la ejecución de actividades. Aunque el personal tiene sus EPPs no cuentan con los permisos por parte del profesional del consorcio Claridad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 08 de Junio del 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector de interventoria, 3 ornamentadores.

Equipos: 1 equipo de soldadura, 1 taladro, 1 pulidora, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico, sin embargo no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realizan actividades correspondientes a soldadura de empalmes, vigas y correas para estructura de cubierta, sin embargo el personal no está laborando con los respectivos permisos para trabajos en alturas emitidos por parte del profesional del consorcio Claridad. Este personal labora hasta lo 8pm según registro de Bitácora por parte del grupo de vigilancia de la I.E.D. sede Raizal. Las condiciones del clima fueron de lluvias suaves en todo el día.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 09 de Junio del 2024

Por parte del consorcio Claridad se recibe correo solicitando permiso para realizar actividades, sin embargo no se presenta ningún trabajador.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes (festivo) 10 de Junio del 2024.

Por parte del consorcio Claridad se recibe correo solicitando permiso para realizar actividades, sin embargo no se presenta ningún trabajador.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 11 de Junio del 2024

En el transcurso del fin de semana no se presenta persona a la obra. Adicionalmente para este día tampoco se presenta personal por parte del consorcio Claridad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Nota: Se evidencia que la viga perimetral sobre los aleros, esta proyectada sobre una longitud de 1 metro a cada eje, siendo el soporte de la Alerada; más esto no corresponde al confinamiento total de dicho muro, por lo tanto se procede sobre la estructura 160x120 sobre el muro exterior y se apoyan en planta sobre los ejes existentes, con el fin de pagar la estructura a la Alerada.

De este tema pendiente, que se continúa una viga perimetral sobre los Muros laterales de los, la cual según el soporte principal de la estructura, instalando una placa en C para su anclaje con la ch y el elemento.

El día 30 de Mayo se realiza sanidad de los hallos, con el fin de de saneamiento.

Miércoles 12 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 generador de energía.

ACTIVIDADES: El personal Ingresó sobre las 2 pm luego de llegar en el bus de línea de la zona. Este personal realiza labores de corte y pintura de secciones de correas sencillas de la cubierta.

NOTA: Durante la instalación del sistema de vigas empachados perfil IPE 160x120 $e=3mm$ bajo los ejes (A+C), se evidencia irregularidad en planta sobre la edificación, lo que conlleva a trabajar bajo la dirección de los muros perimetrales dobles existentes, con el fin de que la viga a instalar no quedara desalineada y salida respecto a los muros de soporte.

Clima: se presentaron lluvias suaves en horas de la tarde.

Jueves 13 de Junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía.

ACTIVIDADES: Solo se realizaron actividades de alistamiento, corte, pintura, medición y trasiego de la estructu-

ctura hasta los salones. Esto debido a la cantidad de personal que se encuentra en obra y a las fuertes lluvias que afronta la zona.

Vi

Firma Contratista

Firma Interventor:

Viernes 14 de Junio del 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra de Interventoría, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 generador de energía.

ACTIVIDADES: Se realizan actividades en el polideportivo cubierto autorizado por parte de la I.E.D, esto debido a las fuertes lluvias del sector y del cual no se pudo desarrollar ninguna actividad al aire libre, solo actividades de medición, corte y pintura de correas clima: se presentaron fuertes lluvias en toda la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Sábado 15 de Junio de 2024

PERSONAL DE OBRA: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Ingeniero Inspector de Interventoría, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía (no tiene combustible)

ACTIVIDADES: Se realizaron actividades de soldadura de empachados y correas en la sección de los salones se aprovecho y se pintaron 6 correas. las actividades estuvieron interrumpidas por borrascas y fuertes vientos en la zona. Se les realiza la observación del consorcio claridad para suspender actividades hasta que no se cuente con los permisos por parte del profesional SOT para realizar actividades en alturas. se deja en constancia que el personal utiliza sus respectivos EPP y otros de seguridad.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Domingo 16 de Junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 taladro, 1 pulidora.

ACTIVIDADES: se realiza la desinstalación de la cubierta existente en la cocina compensar la cual es de albaño y de donde se realizó el traslado al sitio de acopio autorizando, se les realiza la observación al Ing de Apoyo para retirar el eco de la I.E.D. De igual manera se realizó la limpieza del perfil tipo C para proceder con el agregado de anticorrosivo y aplicación de pintura. El personal se retira sobre las 3 pm debido a las complicaciones con el clima de la región.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Lunes 17 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: Equipo de soldadura, pulidora, 1 generadores de energía.

ACTIVIDADES: se realizó la soldadura de empachados de vigas tipo C, estas vigas se instalaban en el perímetro de muros cocina compensar al igual que las platinas que van soldadas a los cerchas. El personal del consorcio claridad realiza actividades en alturas con EPP pero sin los permisos por parte del profesional SST. Se presentaron lluvias después de medio día.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Martes 18 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 3 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 pulidora, 1 generador de energía.

ACTIVIDADES: se realiza la limpieza de empachados

se les aplica anticorrosivo y se les agrega la primera mano de pintura antes de subirlas a los muros perimetrales de la cocina compensar. Se aprovecha y se alinea la estructura para poder puntear las vigas. Durante casi toda la jornada se presentó lluvias esto dificultó las actividades propuestas.

NOTA: se recibe material con los siguientes elementos y firma) Materiales: Estructura metálica, madera, cemento y todo lo de cerramiento.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Miércoles 19 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoría, 4 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 Pulidora, Equipos de soldadura, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico - no cuenta con combustible.

ACTIVIDADES: se realiza la nivelación de la estructura y la soldadura de platinas de afirmamiento a las cerchas existentes. se realiza la nivelación con la estructura anteriormente soldada y se realiza la alineación y toma de cuadrada. Adicionalmente se midió, cortó y se agregó anticorrosivo y pintura en las correas.

CLIMA: se presentaron lluvias en la jornada de la mañana, en la cual se aprovecha para cruzar medidas y corte.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Jueves 20 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra, 4 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía.

ACTIVIDADES: Las actividades inician sobre las 10 am ya que amaneció lloviendo en la zona. Allí se inicia con la subida de las correas a la estructura y se puntearon

Por otra parte se realizó medición, corte y pintura de correas. Se dejó bajo constancia que el personal se sube en la estructura con lluvia poniendo en riesgo su integridad.

Clima: se presentaron lluvias en toda la mañana.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 21 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 Pulidora, equipo de soldadura, 1 generador de energía

ACTIVIDADES: se realiza el encerramiento del sitio del acopio del material de Rio y PCs, esta actividad se realiza por sugerencia de la interventoria. Adicionalmente se realiza el desvío de la entrada y salida desde el polideportivo hasta el lavadero existente. En cuanto al polideportivo se reorganizó el material y la estructura dejando así demarcado solo la mitad del polideportivo. En cuanto a los flejes, varillas etc, se trasladaron hasta la bodega que conformaron una vez empezó la intervención. Se presenta poca lluvia facilitando la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 22 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria,

EQUIPOS: Pulidora, equipo soldadura, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico

ACTIVIDADES: se realiza la limpieza y agregado de anticorrosivo y aplicación de pinturas a los perfiles tipo C. Adicionalmente se realizó la resoldadura de la estructura de cubierta en sector salones primero y segundo.

CLIMA: se presentaron lluvias durante casi toda la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 23 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores

EQUIPOS: Equipo de soldadura, pulidora, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico.

ACTIVIDADES: la jornada inicia sobre las 09:00 Am en la cual se resoldó parte de la estructura en empachados, vigas y correas. Adicionalmente se realizó el trasego de material para organizar los elementos que se encontraban en el polideportivo autorizado por parte de la J.E.D.

CLIMA: El clima favoreció la ejecución de actividades

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 24 de Junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía

ACTIVIDADES: se realizaron actividades de reforzar las soldaduras y cordones en estructura de cubierta. Esta actividad se realiza una vez se tengan fijas todas las elementos de la estructura al igual que una buena simetría y alineación. Se presenta buen clima en toda la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 25 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico.

ACTIVIDADES: se realizan labores de resoldado de los empachados perimetrales, esta actividad comprendió asegurar todas las celosías existentes.
CLIMA: se contó con buen clima durante toda la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 26 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 taladro, 1 pulidora, Equipo de soldadura.

ACTIVIDADES: se realizan actividades de resoldado de estructura y aplicación de pintura en soldaduras ya acabadas. De igual manera se realizó la medida, corte y figurado para soportes de canales. Sobre las 10 am ingresa el vehículo de placas 632-732 con láminas y máquina para figurado de cubierta. De igual manera ingresa la volqueta de placas.

AJB-925 con material de río. Sobre las 2 pm se retira el vehículo con máquina de figurado.

Durante la jornada de la tarde se presentaron fuertes lluvias que intervinieron las actividades del personal.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 27 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 pulidora, 1 equipo de soldadura.

ACTIVIDADES: se realizan actividades de instalación de soportes de canales de las cuales con desmontados en horas de la tarde por orden de interventoria debido a problemas de alineación de la primer Correa. Pasado el medio día se realizan pruebas de tintas en 5 soldaduras corregidas

por parte del inspector de Interventoria. Es así como arroja una totalidad de 4 soldaduras con problemas de porosidad y 1 cola en lavas condiciones. Esto genera realizar la respectiva observación al ingeniero de apoyo del consorcio claridad para que se corrija y se repita nuevamente la prueba a 5 días a partir de esta fecha. De igual manera se deja en esta bitácora que no se puede instalar cubierto hasta que no obtenga aprobación por parte de interventoria. El estado del clima favoreció la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 28 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía para eventualidades en el fluido eléctrico.

ACTIVIDADES: En consecuencia de las soldaduras que salieron mal en la prueba de tintas, se realiza observación de corregir cada uno de las soldaduras ya que se va a volver a realizar la prueba. Esto comprendió ligar cada cordón y volver a repetir el cordón.

Adicionalmente se realizó la aplicación de anticorrosivo y pintura en soportes de canales. En la jornada del medio día se presentaron lluvias (quavez en la ejecución de actividades).

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 29 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores.

EQUIPOS: 1 pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 generador de energía para eventualidades con el fluido eléctrico.

ACTIVIDADES: se realizan actividades de corrección de soldaduras y resoldado de partes donde no se ha aplicado cordones corridos. Por otra parte se realizó el ensamble y soldado de vigas rectangulares para soporte de canales.

CLIMA: El buen estado del clima favoreció la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 30 de junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 1 ornamentador

EQUIPOS: 1 compresor

ACTIVIDADES: se realizan actividades de pintura de estructura montada sobre muros. Esta actividad se realizó en el perímetro del salón preescolar en donde ya se recabo toda la estructura. Esta actividad solo se realizó en la jornada de la mañana ya que el personal se vio obligado a interrumpir la actividad por fuertes lluvias.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 01 de julio de 2024. (festivo)

No se realizó ninguna actividad laboral. En la obra se presenta un ornamentador a organizar unos canales y se retira a las 20 min de su ingreso según bitácora de vigilancia de la I.E.D. Cede Razón

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 02 de julio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores, 2 cubierta

EQUIPOS: 1 Taladro, 1 pulidora, compresor con pistola, 1 equipo de soldadura.

ACTIVIDADES: se realizan actividades de resoldado de estructura y correcciones de cordones de la prueba de tintas. Adicionalmente se realiza la aplicación de pintura con compresor en la parte donde la estructura ya está verificada y a prueba por parte de la interventoria. Por otra parte se continúa con la metalación de soportes para canales.

NOTA: se realiza la observación al consorcio claridad de no realizar la instalación de cubierta hasta que no se verifiquen los cordones de soldadura. Se presentan lluvias en horas de la tarde las cuales interrumpen las labores en la estructura.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 03 de julio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores, 2 cubierta

EQUIPOS: 1 Taladro, 1 pulidora, 1 compresor con pistola, 1 generador de energía, 1 equipo de soldadura.

ACTIVIDADES: se realizan labores de resoldado y rectificación de cordones de soldadura. Esta actividad se realiza ya que algunos soldaduras presentan porosidades. Adicionalmente se realiza la limpieza y aplicación de pintura 3 en 1 en canales. Por otra parte se realiza la metalación de soportes canales. No se pudo avanzar en la ejecución de actividades ya que la lluvia y fuertes vientos impidieron su realización.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 04 de julio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 2 ornamentadores, 2 cubierta.


EQUIPOS: 1 pulidora, 1 compresor con pistola, equipo de soldadura, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se realizan pruebas de tintas en las

BITACORA DE OBRA

SAN JOSÉ DE USME - DON BOSCO. 2 (IED) SEDE A.

- CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CLARIDAD
- NO. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5305904
- OBJETO DEL CONTRATO: GRUPO 5 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
- FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2023.
- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CB INGENIEROS SAS.
- NO. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5313332.




JAIRD ERNESTO JIMENEZ PINEDA
DIRECTOR DE OBRA.

ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LEONARDO TORRES LARA.
RESIDENTE DE OBRA I.

CRISTIAN CAMILO BARRAGAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GUILLERMO ALBERTO VELANDIA
RESIDENTE DE OBRA II


DIANA MAYERLY ARGÜELLO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

• LUNES, 06 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal en Obra: 2 Oficiales, 2 personas de apoyo.

Actividades: Se realizó cerramiento con poliscorbria y lámina de zinc en zona de obra.

OBSERVACIONES Y NOTAS: Interventoría Informa que el contratista no remitió información sobre inicio de actividades en esta sede.

Firmas: Interventoría: *Diana A* Contratista: *Jaime*

• MARTES, 07 de Mayo de 2024.

Clima:

PERSONAL EN OBRA: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 personas de apoyo.

ACTIVIDADES: Se realizó replanteo de ejes de cimentación y se inició la excavación de zapatas del eje 1.

OBSERVACIONES Y NOTAS: Interventoría Informa que el contratista no remitió información sobre inicio de actividades en esta sede.

Firmas: Interventoría: *Diana A* Contratista: *Jaime*

• MIÉRCOLES, 08 de Mayo de 2024.

Clima:

PERSONAL EN OBRA: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 personas de apoyo, 1 Residente de Obra, 1 Inspector, 1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Continúa actividades de excavación, se reporta llegada de 1 viaje de 14m³ de mixto.

Interventoría Informa que el contratista no remitió información sobre inicio en esta sede y que el personal estaba ingresando sin autorización.

Firmas: Interventoría: *Diana A*

Contratista: *Jaime*

• JUEVES, 09 de Mayo de 2024.

Clima:

PERSONAL EN OBRA: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Residente de Obra,

1 Inspector, 1 SST, Interventoría, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Se inicia excavación vigas de cimentación eje AB y C.
excavación zapatas eje 3.
OBSERVACIONES Y NOTAS:

Firmas: Interventora: Diana A. Contratista: Jany

- VIERNES
SABADO, 10 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal en Obras: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Interventora, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Inicia excavación vigas de cimentación eje A y C.

OBSERVACIONES Y NOTAS: Se remite autorización para que el ingreso

del personal fuera a partir de las 6:00am a 2:00p.m. debido a que realizan fumigación en la institución.

Firmas: Interventora: Diana A. Contratista: Jany

- SABADO, 11 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal en Obras: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Interventora, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Continúa excavación vigas de cimentación eje A y C.

OBSERVACIONES Y NOTAS:

Firmas: Interventora: Diana A. Contratista: Jany

- DOMINGO, 12 de Mayo 2024 - No se realizara actividades.

- LUNES FESTIVO, 13 de Mayo 2024 - No se realizara actividades.

- MARTES, 14 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal en Obras: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente, 1 Inspector.

1 SST, Interventora, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Se inicia excavación viga de cimentación ejes D y E.

Se realiza perfilación de excavaciones, vigas y zapatas de cimentación.

OBSERVACIONES Y NOTAS:

Firmas: Interventora: Diana A. Contratista: Jany

• MIÉRCOLES; 15 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal: 2 Oficiales, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, Interventora
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Inicio de armado de parillas para zapatas.

• OBSERVACIONES Y NOTAS: Interventora informa a la SED mediante correo electrónico, debido a que se evidenció que la red de gas que llega a la cocina actual interfiere con la cimentación de la cocina modular a construir, por ende, es posible que se pueda solicitar una visita de la empresa operadora del servicio al sitio, en aras de validar la desconexión y nueva conexión en miras de proyectar la ubicación más apropiada para la cocina a instalar.

Firmas: Interventora: *ANA A*

Contratista: *Juan*

• JUEVES; 16 de Mayo de 2024.

Clima:

Personal: 2 Oficiales, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, Interventora
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: ~~Rep~~ Continúa excavación manual en viga de cimentación.

OBSERVACIONES Y NOTAS:

Firmas: Interventora: *ANA A*

Contratista: *Juan*

• VIERNES, 17 de mayo de 2024

Clima:

Personal: 1 Inspector SST, 1 apoyo residente obra,
1 residente de interventoría.

Actividades: fijado de acero para vigas de cimentación, y zapatas.

Observaciones y notas: la interventoría le solicita al contratista de obra el espesor de las vigas de cimentación en el tramo donde se cruzan con las tuberías de aguas lluvias.

Firmas: Interventoría:

Contratista: *Jaime*

- Sábado 18 de mayo de 2024.

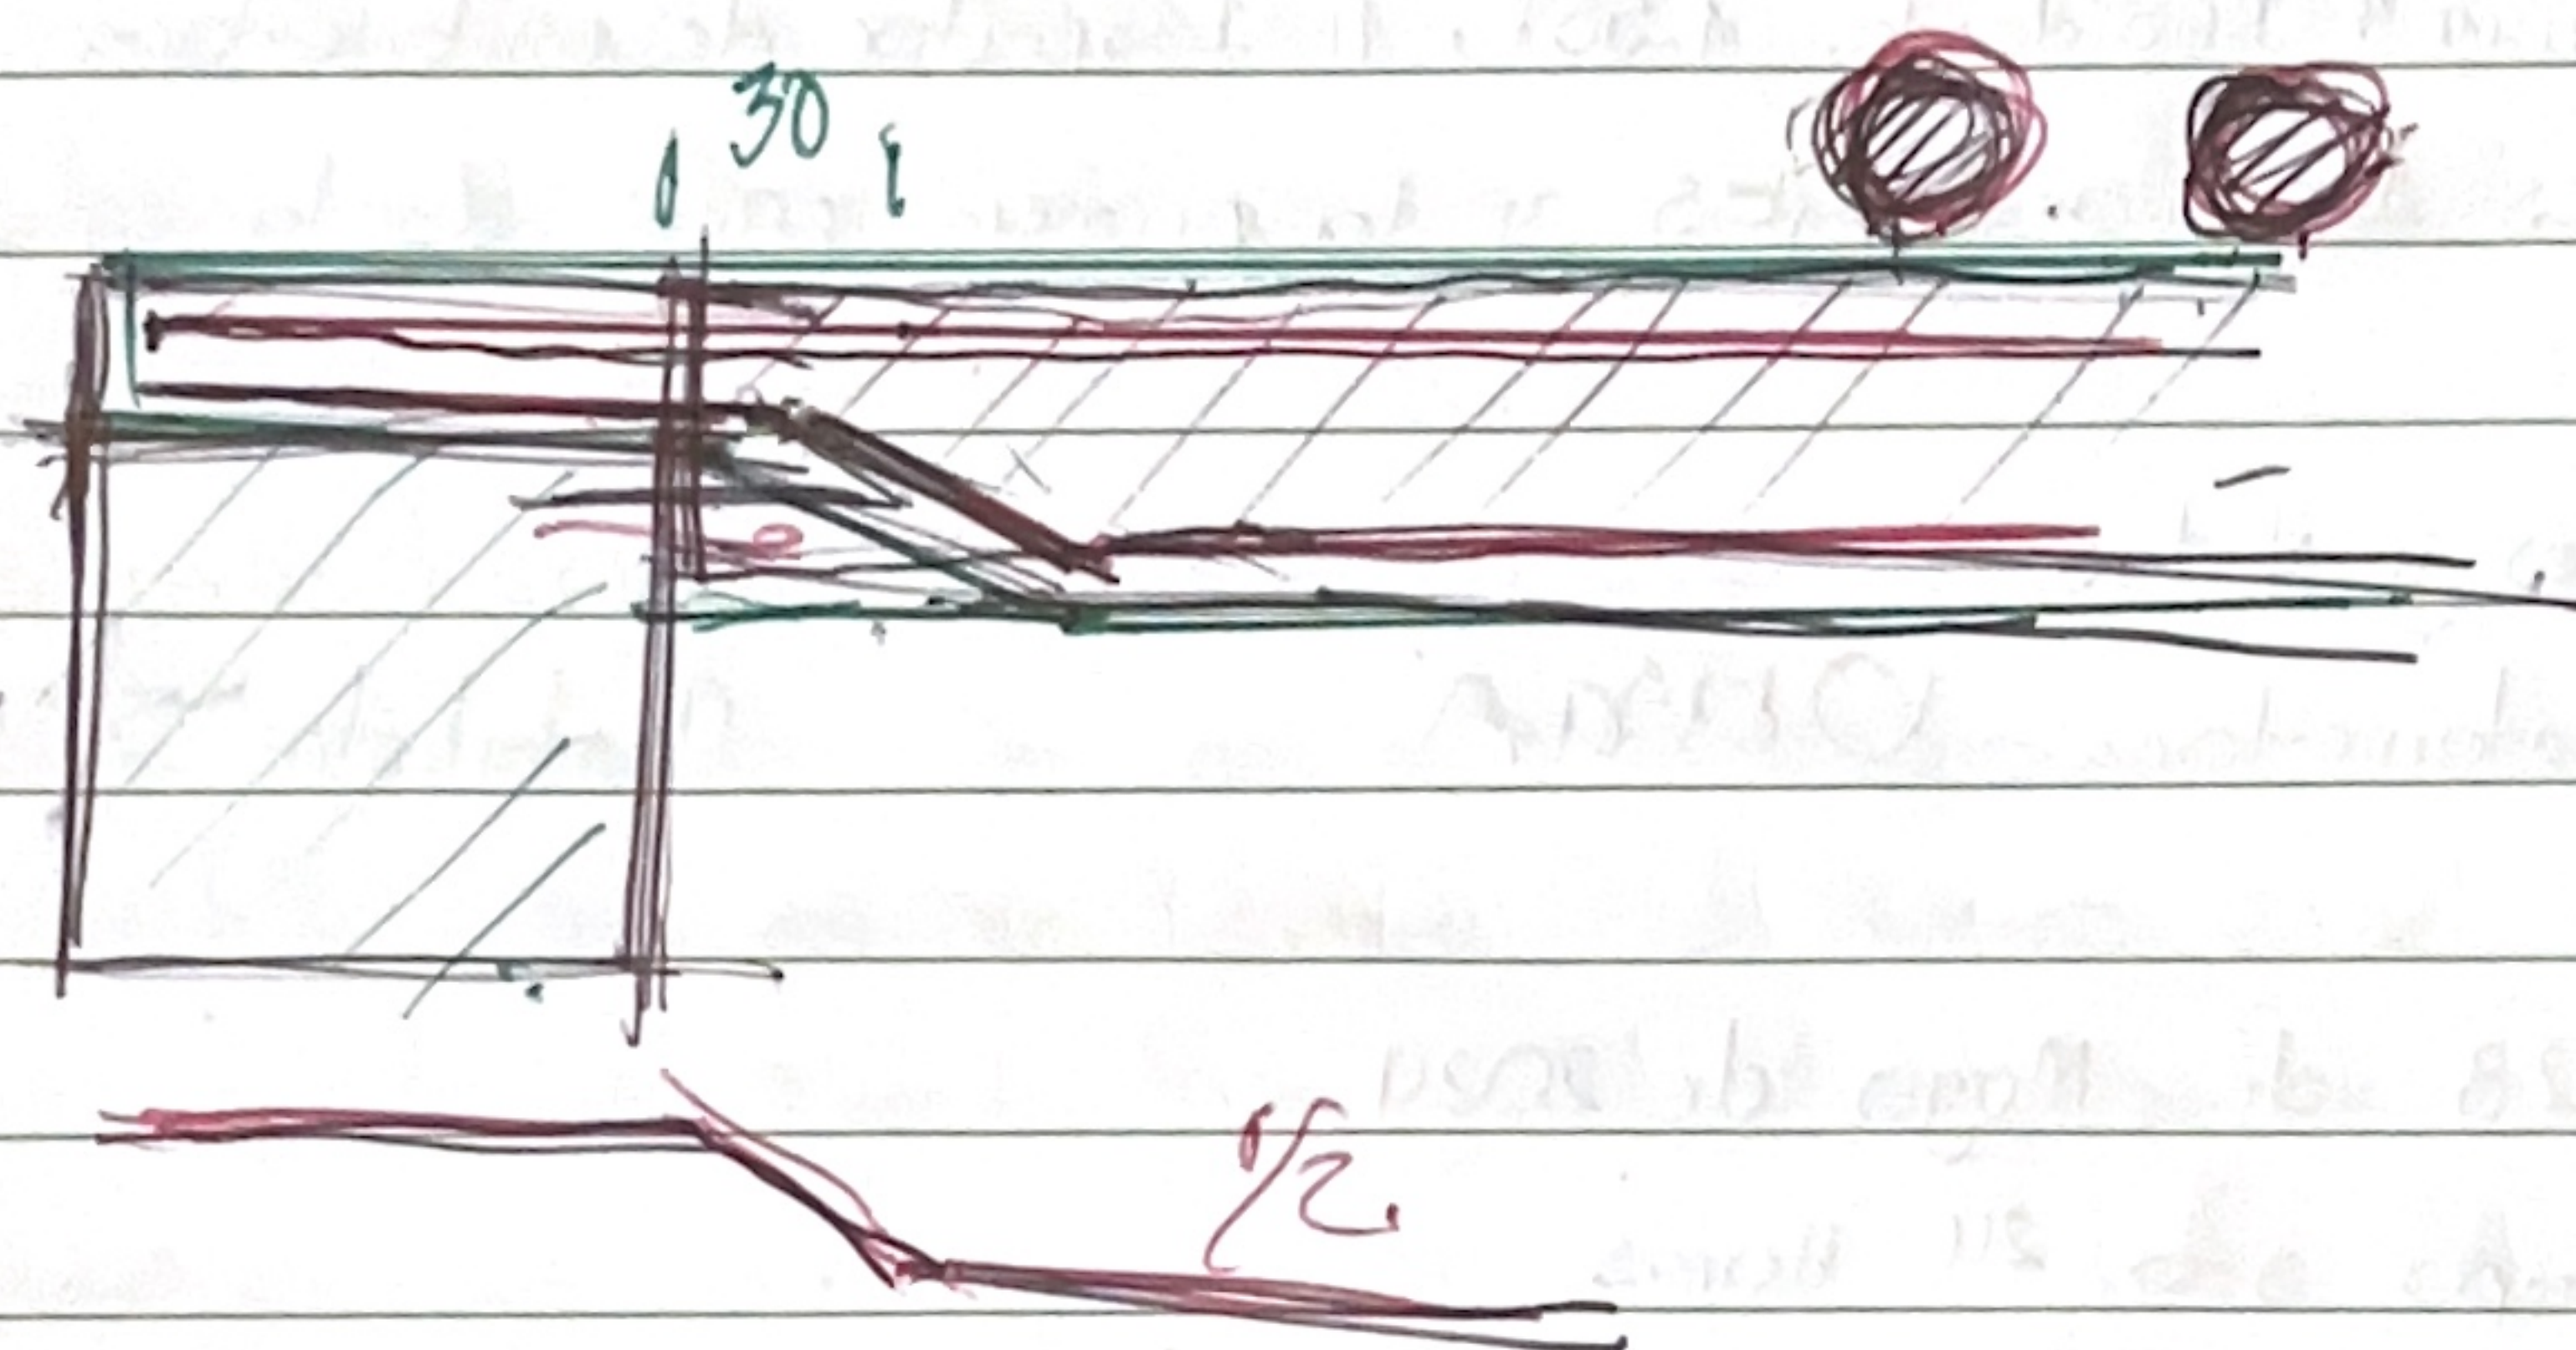
Clima: Tiempo seco 24 Horas

Personal: 2 Oficiales, 1 Inspector de obra de apoyo, 1 SST

Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Inspector

Actividades: Fundida de solado para vigas de amarra y zapatas.

Observaciones y notas: a la solicitud de la interventoría, el contratista responde el siguiente bosquejo:



Firmas: Interventoría: *Orana A*

Contratista: *Jaime*

• Domingo; 19 de Mayo 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas

Personal: No se realizaron actividades.

• Lunes; 20 de Mayo 2024.

Clima:

Personal: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 encargado, 1 Inspector de obra de apoyo, 1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realizó encofrado para zapatas de cimentación.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: *Orana A*

Contratista: *Jaime*

• Martes; 21 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas

Personal: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Inspector de Obra de Apoyo, 1 SST.

Interventoría: 1 Residente de Interventoría.

Actividades: Se realiza fundición de pedestales.

Observaciones y Notas: La interventoría hace la observación al contratista debido a que el cerramiento del punto de acopio de materiales se encuentra caído, se solicita subsanar esta observación.

Firmas: Interventoría: *Olivia A.*

Contratista: *Juan*

• Miércoles; 22 de Mayo de 2024.

• Clima:

Personal en Obra: 2 Oficiales, 1 Inspector de obra de apoyo, 1 SST.

Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Inspector de interventoría.

Actividades: Llegaron flejes y la primera parte de la estructura metálica.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: *Olivia A.*

Contratista: *Juan*

• Jueves; 23 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas

Personal en Obra: 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Encargado, 1 Inspector de obra de Apoyo, 1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realiza encofrado y fundición de vigas de cimentación.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: *Olivia A.*

Contratista: *Juan*

• Viernes; 24 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas

Personal en Obra: 4 Oficiales, 1 Encargado, 1 SST, Interventoría:

1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realiza descofrado de vigas de las zapatas y se realiza amarrado de flejes para viga de 10 cm. y se realiza fundición de vigas de cimentación.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría *Olivia A.*

Contratista: *Juan*

- Sabado; 25 de Mayo de 2024.

Clima: (Tiempo seco 24 Horas) Se produjeron lluvias suaves durante el día.

Personal en Obra: 4 Oficiales, 1 Inspector de obra de apoyo, 1 SST, Interventoría, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realizó instalación de formaleta para continuación de la fundida de viga de cimentación.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: DANA A.

Contratista: J. J. J.

- Domingo; 26 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas.

Personal en Obra: 2 Oficiales, 1 Ayudante, Interventoría, 1 Residente de Interventoría.

- Actividades: Corte de madera para encajonar pedestales, se realizó corte de acero, se realizó traslado de material mixto en carretilla, se realizó amare de hierro, y se excavó una zona que solicitó la Interventoría profundizar, se excavó 30cm, y se demolió una parte de viga que solicitó la Interventoría.

- Observaciones y Notas: la Interventoría, solicitó la demolición de la viga de cimentación del Eje 1, pues no cumple con los niveles requeridos, además de su evidente desplome. Aunado a lo anterior, la Interventoría le solicitó al constructor el concepto sobre las vigas de cimentación intermedias entre ejes 1-2 y 2-3.

Firmas: Interventoría: DANA A.

Contratista: J. J. J.

- Lunes; 27 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco

Personal en Obra: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Encargado de cuadrilla

Interventoría: 1 SST.

- Actividades: Se realizó amare de hierro, en pedestales, Armado de caponas para fundición de pedestales.

Observaciones y notas: El contratista pregunta referente a la tubería eléctrica y de gas que atraviesa la viga, Interventora informe que referente a la tubería eléctrica el constructor iba a encamisar la tubería y referente a la tubería de gas la SED no ha dado respuesta.

Ornata

Jaime

Martes, 28 de mayo de 2024

Clima: Seco

Personal en obras: 3 oficiales, 1 ayudante, 1 encargado de la cuadrilla
Interventoría: 1 residente, 1 inspector y 1 SST.

Actividades: armado de encofrado para fundición de pedestales. Se hizo recorrido con el apoyo a la supervisión del Contrato de Interventoría y el arquitecto Alejandro de la SED. Se estableció nivel de los pedestales de acuerdo con el orden adyacente a la zona de construcción. Se definió que se pondría una placa delgada para sellar el terreno debajo de la cornisa, dicha placa conservará la pendiente del terreno.

Firma: Interventoría: Ornata Contratista: Jaime

• Miércoles, 29 de Mayo de 2024

Clima: Tiempo seco 21 Horas, lluvia suave 3 horas.

Personal en Obra: 1 Ayudante, 1 Encargado, 1 SST, 1 Residente

Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realizó la actividad del corte de viga de acuerdo con la observación realizada por la SED para los pedestales.

Observaciones y Notas: Interventoría notifica que a partir de la fecha se dio aprobación a la hoja de vida para el cargo de Residente de Obra al Ing. ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ, quien a partir de la fecha firmara la Bitácora de obra.

Firma: Interventoría: Ornata Contratista:

Jaime

- Jueves; 30 de Mayo de 2024.

Clima: Tiempo seco 21, lluvia suave 3.

Personal en Obra: 3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente, 1 Inspector
1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realiza nivelación de cimientos de pedestales,
Se realiza fundida de pedestales y trasiego de material
excavado para el acopio temporal.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: OKANA A.

Contratista:



- Viernes; 31 de Mayo de 2024.

Personal: 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente, 1 SST, Interventoría,
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.


- Clima: Tiempo seco 24 Horas.

Actividades: Se realiza encofrado de cimientos para pedestales, y
se realiza fundida de pedestales, se realiza trasiego de RCD's
al acopio temporal.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: OKANA A.

Contratista:



JUNIO 2024

- Sabado; 01 de Junio de 2024.

Clima: Tiempo seco 24 Horas

Actividades en Obra: Se realiza amarrado de acero en vigas de
zapatas, Se realiza fundida de pedestales faltantes.


Personal: 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente de Obra, 1 SST

Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: OKANA A.

Contratista:




- Domingo; 02 de Junio 2024.
- No se realizan actividades.
- Lunes Festivo 03 de Junio 2024.
- No se realizan actividades.
- Martes, 04 de Junio 2024.

Clima: Tiempo lluvioso.

No se realizaron actividades constructivas, sin Personal. Observaciones y Notas: Interventoria hace la observación que se evidencia el cerramiento caído y también el cerramiento del punto de acopio. El contratista subsana esta observación.

Firma: Interventoria, Diana A.


Contratista: 

- Miércoles, 05 de Junio de 2024.

Clima: Tiempo lluvioso.

No se realizaron actividades constructivas, sin Personal de Obra. Observaciones y Notas: Nuevamente Interventoria informa que se encuentra el cerramiento caído, se le informa al contratista para que proceda a subsanar.

Firma: Interventoria, Diana A.

Contratista: 

- Jueves; 06 de Junio de 2024.


Clima: Tiempo seco 24h

Personal en Obra: 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 técnico SST, Interventoria; 1 Residente de Obra, 1 SST.

Actividades: Se realiza arreglo de cerramiento, cerramiento caído.

Observaciones y Notas: Se hace la observación que el cerramiento del material de nuevo está caído.

Firmas: Interventoria: Diana A.

Contratista: 

- Viernes 07 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 24h

Personal en Obra: 2 Oficiales, 1 ayudante, 1 técnico SST, Interventoria; 1 Residente de Obra.

1 SST.

Actividades: Trabajo de descapote de terreno.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: 

Contratista: 


• Sábado 08 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 24h

Personal en Obra: 2 oficiales, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Continua descapote de terreno, levantamiento de cerramiento de material.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: 

Contratista: 

• Domingo 09 Junio 2024

No se realizaron actividades

• Lunes 10 de Junio 2024

No se realizaron actividades


• Martes 11 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 79h - Lluvia suave 5h

Personal en Obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Descapote de terreno, trasego de material de descapote

Observaciones y Notas: Inicio lluvias 1:00 pm hasta las 5:00 pm

Firmas: Interventoria: 

Contratista: 

• Miércoles 12 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 79h - Lluvia suave 5h

Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 encargado, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Jornada de orden y aseo, retiro de viaje de RCDs.

Observaciones y Notas: Inicio lluvias 1:00 pm hasta las 5:00 pm

Firmas: Interventoria:

Contratista:

- Jueves 13 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24h

Personal en obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 logístico, 1 técnico SST, Interventoria;
1 residente de obra, 1 SST

Actividades: Trabajo de columnas de estructura metálica, excavación de cimientos de inspección 60x60, Instalación estructura metálica.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

- Viernes 14 de Junio 2024

No se realizaron actividades.

- Sábado 15 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24h

Personal en obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 SST subcontratista, Interventoria; 1
residente de obra, 1 SST.

Actividades: Instalación de recebo y compactación, retiro RCDs

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

- Domingo 16 de Junio 2024

No se realizaron actividades.

- Lunes 17 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24h

Personal en obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente
de obra, 1 SST

Actividades: Compactación de recebo, instalación de malla electrosoldada.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

• Martes 18 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 24h

Personal en Obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST

Actividades: Traslape de malla electrosoldada, Fundida de placa en cocina.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Diana A^o

Contratista: 

• Miércoles 19 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 24h

Personal en Obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Aplicación de agua para curado de placa, llegada de estructura metálica faltante, instalación malla electrosoldada.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Diana A^o

Contratista: 

• Jueves 20 de Junio 2024


Clima: Tiempo seco 20h - Lluvia suave 4h

Personal en Obra: 1 oficial, 1 encargado, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Estado actual placa y estructura metálica, excavación para caja de inspección.

Observaciones y Notas: Inicio de lluvias 2:00pm hasta 5:00pm

Firmas: Interventoria: Diana A^o

Contratista: 

• Viernes 21 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 20h - Lluvia suave 4h

Personal en Obra: 2 ayudantes, 2 encargadas, 1 técnico SST, Interventoria; 1 residente de obra, 1 SST

Actividades: Instalación estructura metálica faltante, llegada estructura metálica y lamina metal deck

Observaciones y Notas: Inicio lluvias 2:00pm hasta 5:00pm.

Firmas: Interventoria: Diana A°

Contratista:

- Sábado 22 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 20h - lluvia suave 4h

Personal en obra: 2 ayudantes, 2 encargados, Interventoria; 7 residente de obra, 1 SST

Observaciones y Notas: Inicio de lluvias 2:00pm hasta 5:00 pm

Firmas: Interventoria: Diana A°

Contratista:

- Domingo 23 de Junio 2024

No se realizaron actividades

- Lunes 24 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24h

Personal en obra: 2 ayudantes, 7 soldador, 1 encargado, 7 técnico SST, Interventoria; 7 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Instalación de lamina Metaldeck, instalación de soportes para lamina metaldeck, instalación de pases para redes y malla electrosoldada.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Diana A°

Contratista:

- Martes 25 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24h

Personal en obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 técnico SST, Interventoria; 7 residente obra, 1 SST.

Actividades: Fundida de placa sobre lamina metaldeck, instalación de malla electrosoldada sobre lamina Metaldeck, avance fundida de placa sobre lamina Metaldeck

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Diana A°

Contratista:

• Miércoles 26 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24 h

Personal en Obra: 3 oficiales, 1 ayudante, 1 técnico SST, Interventoria; 7 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Culminación de fundida placa sobre lamina Metaldeck, afinado de placa.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

• Jueves 27 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24 h

Personal en Obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 3 supervisores técnicos, 1 técnico SST, Interventoria; 7 residente de obra, 1 SST.

Actividades: Curado de concreto de placa de cocina, inicio de soportes para parales de cubierta.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

• Viernes 28 de Junio 2024

No se realizaron actividades

• Sábado 29 de Junio 2024

Clima: Tiempo seco 24 h

Personal en Obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 instalador de cubierta, Interventoria; 1 SST.

Actividades: Instalación de cubierta en futura cocina, avance de instalación de cubierta Futura Cocina.

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: DIANA A°

Contratista:

• Domingo 30 de Junio 2024


No se realizaron actividades.


BITÁCORA DE OBRA

COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA (IED) SEDE B

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.


- Lunes 26 de Febrero 2024.
No se realizaron actividades
- Martes 27 de Febrero 2024.
- Se realizó recorrido comite de obra, realizando inspección de crujidos y
tintes de aguas lluvias en compañía de interventoría, controlador
y apoyo a la Supervisión de la DEO. Ing. Jorja
Observaciones y Notas: Ninguna.

Firmas: Interventoría:  OAVIA



 Contratación

- Miércoles, 28 de Febrero 2024.
No se realizaron actividades
- Jueves 29 de Febrero 2024.
No se realizaron actividades.

MARZO 2024.

- 1 - C Marzo 2024.
Reparación para lloreros en zona preescolar.
1. apuntante.
Observaciones: la malla de volebal fue desmontada y
en un costado de la cancha
Firmas: interventoría  Contratación.
Desde el 2 de marzo al 31 de marzo de 2024
no realizaron actividades.

ABRIL 2024.

- 22 de abril de 2024.
Ajuste de pautas de patio de preescolar.
firmas:  Interventoría
 Contratación.
Mayo 2024.
25 de mayo de 2024.
Instalación de enchape en muro de preescolar,
cabe mencionar que el enchape se encontraba
suelto y el contratista de obra reemplazó
pezas

JULIO 2024

8 de julio 2024.

El contratista instala la bomba ejetora sin
paso permiso de ingreso.

Intendencia Quince A.

BSTACORA DE OBRA

Colegio Campestre
Jaime Garzón I.E.D
Las Auras

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CLARIDAD

NO. DE CONTRATO: C01, PCCNTR. 5305904


OBJETO DE CONTRATO: GRUPO 5

FECHA DE INICIO: Viernes 15 de Diciembre 2023


"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS CEDES ADMINISTRATIVAS".

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CB INGENIEROS SAS

NO DE CONTRATO: C01. PCCNTR. 5313332


JAIRO ERNESTO JIMENES P

Director de Obra


ANDRES FELIPE MACKENZIE


Director de Interventoría


DAVID ESTEVAN NUÑEZ CANO


Residente de obra


CRISTIAN CAMILO BARRAGAN

Residente de Interventoría


GUILLERMO ALBERTO VELANDIA

Residente de obra


DIANA MAYERLI ARGUELLO

Residente de interventoría

Se realiza observación de conformación de zanja Perimetral para drenaje de agua en cubierta. y se hace instalación de grifería para tanques sanitarios, llaves de manguera en poceta y urinarios. El personal se retira a las 3 pm justificando cansancio físico. El estado del clima fue de lluvias suaves en el transcurso del día.

Firma Contratista

Firma Interventoria

viernes 31 de mayo del 2024.

Personal de Obra: 7 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 4 oficiales.

EQUIPOS: N/A.

ACTIVIDADES: se retomaron actividades en la sede Aurox en donde se realizó el aseo en pasillos y retiro (N) de escombros y residuos. Esta actividad solo comprendió un momento y fue realizada por 2 oficiales ya que los otros 2 salieron al momento de la institución. El personal restante se retira sobre las 10 Am y las actividades quedan suspendidas.

Firma Contratista

Firma Interventoria

viernes 1 del junio de 2024.

Por parte del contratista no se recibe ninguna solicitud para permiso de laborar el fin de semana, por este motivo no se desarrolla ninguna actividad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 2 de junio de 2024.

No se presenta personal por parte del contratista a la cual no se realiza ninguna actividad en la sede.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 3 de junio de 2024

No se presenta personal por parte del contratista a la cual no se desarrolla ninguna actividad. Es día festivo.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 4 de junio de 2024.

No se presenta personal por parte del contratista a la cual no se desarrolla ninguna actividad. En comunicación con el Ingeniero de apoyo por parte del consorcio claridad manifestando inconvenientes con el transporte.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miércoles 5 de junio de 2024.

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 4 oficiales de acabados.

EQUIPOS: 1 taladro

ACTIVIDADES: se realizan trabajos de limpieza y retoques de pintura a la estructura de sostenimiento de cubierta. Adicionalmente por indicación de la institución educativa se retiran los estantes y modulos tipo gavetas que se encuentran atornillados debajo del mezon del laboratorio de cornicos. Por otra parte se realizan algunos retoques de pintura a muros del mismo laboratorio. En horas de la tarde se desplaza el personal hasta la sede Nazareth - Atención emergencia, con el fin de realizar algunos ajustes a los trabajos realizados, sin embargo no fue posible el ingreso por confusión de lista de autorización. se cancela actividad para el otro día.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 06 de junio de 2024

PERSONAL DE OBRA: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados, 3 electricos.

EQUIPOS: N/A

ACTIVIDADES: el grupo de acabados realizaron actividades de resane de muros y corrección de filas

en coluca. El grupo de electricos desarrollo actividades de desmonte de cables de la estructura de la cubierta antigua. las actividades despues de medio dia estuvieron interrumpidas por actividades de la institucion educativa en la cual solicitaron una parte del espacio de interven

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 07 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de obra.

EQUIPOS: N/A

Actividades: se realiza la aplicacion de estuco para resane en muros del segundo piso bloque administracion. Adicionalmente se realiza la aplicacion de pintura y resane en muros perimetrales exteriores bloque administracion se deja bajo anotacion que mientras el inspector de obra realiza recorrido por las otras sedes del mismo colegio, el personal aprovecha para realizar trabajos en alturas de los cuales no tienen autorizacion por parte de un profesional SST del consorcio claridad. Adicionalmente no se aseguran con arnes y linea de vida junto con la utilizacion obligatoria de los EPP. Esto, ademas de generar un riesgo en la integridad del personal hace que las observaciones del inspector de interventoria se omitan o simplemente no se hagan el respectivo escote.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sabado 08 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de obra.

EQUIPOS: N/A

Actividades: se realizan actividades correspondientes a la aplicacion de estuco para resanes de filos y

muros. las actividades se tuvieron que suspender sobre la 1 pm debido a la utilizacion de andamios sin los elementos de seguridad y proteccion. Adicionalmente por parte de la profesional SST leidy constanza Bejarano se habia quedado en pasar para dar autorizacion de trabajos en alturas.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 09 de Junio del 2024

Por parte del consorcio claridad se solicita permiso para laborar el fin de semana, sin embargo no se presento personal a la obra.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 10 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados.

EQUIPOS: N/A

ACTIVIDADES: se realizan labores de correccion de filos y abrimiento de rezones en muros del bloque de administracion. El personal del consorcio claridad esta desarrollando actividades en alturas sin EPPs y sin los elementos como arnes, linea de seguridad, casco etc. mas los permisos por parte del profesional SST del consorcio claridad. Se presentan lluvias cuaves en el desarrollo de la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 11 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados.

EQUIPOS: 1 Pulidora sin seguro

ACTIVIDADES: se realiza la aplicacion de estuco para resane de muros y filos en interiores y muros exteriores del bloque administrativo. se realiza la aplicacion de pintura en dichos muros con trabajos en alturas. se deja bajo

anotación que el personal del consorcio claridad aprovecha los desplazamientos que realiza el inspector de interventoría, para realizar trabajos en alturas de los cuales no tienen autorización. Además de no seguir la indicación genera riesgo por tampoco asegurar el andamio, utilizar línea de seguridad, arnes y casco. También se hace la suspensión de la actividad correspondiente a la marcación con el disco de pulidora del sistema de desagüe de aguas lluvias de la cubierta de los laboratorios y salón de informática. Esta actividad se suspende ya que el trabajador manipula el equipo sin gorra de seguridad, casco, guantes y sin el seguro de la pulidora. Todas estas observaciones se hacen llegar al ingeniero de Apoyo. Clima lluvias fuertes.

Firma Contratista

Miércoles 12 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoría, 3 oficiales de acabados

Equipos: 1 pulidora, 1 martillo demolidor

ACTIVIDADES: se realiza la aplicación de estuco para corrección de muros y filos a través de la aplicación de estuco, por otra parte se realizó la aplicación de pintura blanca en muros superiores y pintura verde en bóvedas. Adicionalmente se traza y raya la losa de contrapiso para el sistema de desagüe de aguas lluvias de bloque laboratorios y administración. se presentan fuertes lluvias. en toda la jornada laboral.

Firma Contratista

Jueves 13 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoría, 3 oficiales de acabados

Equipos: 1 Pulidora, 1 Martillo demolidor

ACTIVIDADES: se realiza la demarcación y posterior

Firma Interventoria

Firma Interventoria

rayadura con disco de pulidora a la losa de contrapiso para el sistema de desagüe de aguas lluvias del bloque administración y laboratorios. Adicionalmente se continúa con la aplicación de estuco y pintura en muros internos del bloque administración. El clima favoreció en la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Viernes 14 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoría, 3 oficiales de acabados

Equipos: 1 pulidora, 1 taladro, 1 martillo demolidor

ACTIVIDADES: se realiza la demarcación y rayadura de losa de contrapiso destinada a la (excavación) excavación de la zanja para el sistema de desagüe de aguas lluvias de los bloques de administración y laboratorios. De igual manera se realizaron actividades de pintura y aplicación de estuco para resanes.

Nota: Por parte del consorcio claridad se están desarrollando actividades en alturas del cual no cuentan con EPP ni permisos, avisados por parte del profesional OSA del consorcio claridad. El clima favoreció la ejecución de actividades

Firma Contratista

Sábado 15 de Junio del 2024

No se realizaron actividades en esta sede y aunque solicitaron permiso para laborar el fin de semana, no se presenta personal por parte del consorcio claridad.

Firma Contratista

Domingo 16 de Junio del 2024

No se realizaron actividades en esta sede a pesar de haber solicitado permiso para laborar no se presentó nadie por parte del consorcio claridad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Firma Interventoria

Firma Interventoria

Lunes 17 de Junio de 2024

No se ejecuto ninguna actividad en esta cede y aunque solicitaron permiso para laborar el fin de semana no se presento nadie del consorcio claridad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 18 de Junio de 2024

No se ejecuto ninguna actividad en esta cede y aunque solicitaron permisos para laborar el fin de semana no se presento nadie del consorcio claridad.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miercoles 19 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de obra de interventoria, 3 oficiales de acabados y 3 electricos.

Equipo: 1 pulidora, 1 taladro y un martillo Demoledor

ACTIVIDADES: se continuan con los labores de aplicacion de estuco y pintura de la fachada del bloque de laboratorios y la fachada de administracion. Adicionalmente continuan con la demarcacion y rayadura del contrapiso para la zanja del sistema de desagüe. En la ejecucion de esta actividad se fracturo un tubo de agua potable del cual se solicito su cambio y subsanacion de la misma. En cuanto a los electricos se realizo la instalacion de tuberia EMT para puntos electricos. El Clima fue de lluvias durante toda la jornada. Desarrollaron actividades en alturas.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 20 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria, 4 oficiales de acabados, 3 electricos.

Equipo: 1 taladro, 1 martillo demoledor.

ACTIVIDADES: se realiza aplicacion de estuco y pintura en muros exteriores del bloque administracion.

De igual manera se realizo la demolicion, excavacion y trasiego de la zanja destinada para el desagüe de aguas lluvias. Esta actividad comprendio reparar 2 mts de tuberia que se afectaron debido a que no se cuenta con un plano de distribucion de agua potable y red electrica. Por parte de los electricos se realizo actividades con referencia a la medicion y corte de tuberia EMT para la instalacion de red electrica. Se presentaron fuertes lluvias en el transcurso de toda la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 21 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria, 3 oficiales de acabados, 3 electricos.

Equipo: 1 Martillo demoledor

ACTIVIDADES: se realiza el alistamiento de material para conformacion de manpoderia en culatas superiores de la parte externa del bloque de laboratorios. De igual manera se realizo la demolicion, excavacion y trasiego de material sacado de las zanjas para el sistema de desagüe de las cubiertas de los bloque administracion y laboratorios. En cuanto a las actividades por parte del personal de electricidad, se termino de figurar y asegurar la tuberia EMT y se procedio a la instalacion de iluminacion en el bloque administracion. Buen estado de Clima.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sabado 22 de Junio del 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de interventoria, 3 oficiales de acabados, 2 electricos.

Equipo: 1 taladro.

ACTIVIDADES: se realizaron trabajos en el bloque laboratorios costado externo, alli se conformo la manpoderia de la culata superior. Adicionalmente

se (ver) (ver) verifico el voltaje de una red que se trozo por la excavación que se realiza para el sistema de desagüe de aguas lluvias. Sin embargo se comprobo que no maneja ninguna carga a lo que se arreglo y se dejo nuevamente por si llega a manejar algun circuito. Por otra parte en el bloque administración se realizo la acometida de cableado para Iluminarias. Se presentaron lluvias suaves en la mayoría de la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 23 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados, 2 electricos

EQUIPOS: 1 taladro

ACTIVIDADES: se termina de conformar el muro de mamposteria del costado externo del laboratorio de ensayos. Se empezó a realizar pegue de panele en este mismo muro. Adicionalmente se realizo la excavación de una caja de inspección en la cual se encuentra 1 roca de gran tamaño la cual obliga a realizar un desvío en la tubería de desagüe de aguas lluvias. En cuanto a los electricos se realizo la acometida de cable N° 2 para iluminarias. El personal se retira a las 3 pm. Se presento lluvias suaves en toda la mañana.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 24 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados, 2 electricos

EQUIPOS: Taladro

ACTIVIDADES: se realizaron trabajos de mamposteria en bloque del laboratorio cornices colata exterior. Sin embargo se realiza la observación de demoler el

muro ya que no se realizo el respectivo trave con el muro de continuidad perpendicular. De igual manera se continuo con la excavación de la zanja para el sistema de desagüe de aguas lluvias. Por otra parte electricos se encargaron de realizar instalación de iluminarias, interruptores y algunas tomacorrientes.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Martes 25 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 3 oficiales de acabados, 2 electricos

EQUIPOS: 1 Taladro, Herramienta de mano

ACTIVIDADES: se realiza la excavación, demolición y trasego de la zanja del costado izquierdo del bloque administración y en coincidencia con el parq para la zanja de desagüe de aguas lluvias recogida en la cubierta. Se realiza la observación de excavar por debajo de 2 vigas de cimentación encontrados en el pasillo de bloque adm al parque. Adicionalmente se realizan revocines con panele perimetro del bloque administración. En cuanto a la electricos se realiza inventario de material e insumos sobrantes. Adicionalmente se realiza la observación de que no se evidencia trave o continuidad en los muros de mamposteria colata posterior laboratorio cornices. Se presentan lluvias en la jornada del mediodía.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Miercoles 26 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 5 oficiales de acabados

EQUIPOS: Herramienta de mano

ACTIVIDADES: se realiza la aplicación de pintura blanca y verde en muros exteriores del bloque

biblioteca. Se dejó en constancia de esto bitácora que en reiteradas ocasiones se le informó al personal de obra e ingeniero residente de apoyo que no pueden realizar actividades en alturas en cuanto no tengan sus EPP y permisos por parte del profesional SOT. Adicionalmente se realizó la puesta de tubería 6" en las zonas de desagüe aguas lluvias y se comenzó el fraseo con arena de pórea para como el aporte de tubería. Después de medio día se presentan lluvias con fuertes vientos.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Jueves 27 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 5 oficiales de acabados.

Equipos: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realiza el fraseo de arena de pórea para realizar como a la tubería de 6" en el sistema de desagüe de aguas lluvias. Por otra parte se realizó la aplicación de pintura verde en zócalos. Adicionalmente se realizó consolidación y cruce de medidas con el Ingeniero de apoyo.

CLIMA: se presentaron algunas lluvias durante la jornada.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Viernes 28 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 5 oficiales de acabados.

Equipos: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realizó instalación de tubería pvc de 4" en bajantes bloque laboratorios. De igual manera se realiza el empalme con la tubería de 6" red principal. De igual manera se realiza la aplicación de pintura en muros exteriores bloque

biblioteca. Se dejó en constancia que mientras el inspector de interventoria ha recorrido por los otras sedes, el personal del consorcio claridad realizan actividades en alturas sin EPP y permisos por parte de un profesional SOT. Se presentan lluvias durante la jornada laboral.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Sábado 29 de Junio de 2024

Personal de obra: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector de Interventoria, 5 oficiales de acabados.

Equipos: Herramienta de mano.

ACTIVIDADES: Se realizan trabajos de aplicación de pintura en exteriores en el bloque biblioteca y bloque laboratorios. Adicionalmente se realiza la acometida de tubería pvc 6" en zona excavado parque. Una vez pegado y empalmeado se tapa con mismo material excavado. El personal realizan actividades en alturas sin EPP y sin permisos otorgados por parte de un profesional SOT. Se presentan algunas lluvias sin afectar la ejecución de actividades.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Domingo 30 de Junio de 2024

El personal del consorcio claridad no se presenta a laborar a pesar de sacar los permisos para desarrollar actividades el fin de semana. Por tal motivo no se desarrolla ninguna actividad.

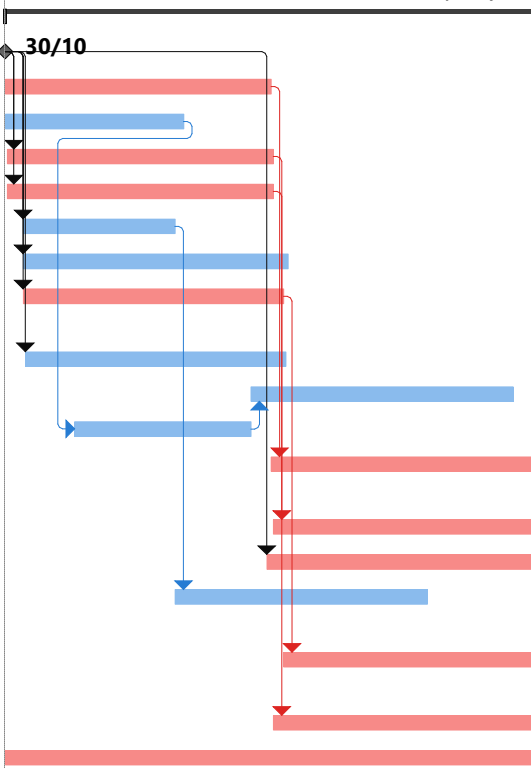
Firma Contratista

Firma Interventoria

Lunes 1 de Julio de 2024 (Festivo)

El personal del consorcio claridad no se presenta a laborar a pesar de sacar los permisos para desarrollar actividades el fin de semana. Por tal motivo no se desarrolla ninguna actividad.

J. Programación general

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	2023				2024			2024			2024		
							tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
1		I.E.D GENERAL	\$ 7.608.734.174,00	182 días	30/10/23	29/06/24													
2		INICIO OBRA	\$ 0,00	0 días	30/10/23	30/10/23													
3		IED USMINIA	\$ 349.948.209,00	92 días	30/10/23	29/02/24													
4		IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	\$ 542.722.842,00	60 días	30/10/23	20/01/24													
5		IED CHUNIZA	\$ 236.826.369,00	92 días	31/10/23	1/03/24													
6		IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	\$ 353.157.411,00	92 días	31/10/23	1/03/24													
7		DILE SUMAPAZ	\$ 15.242.011,00	50 días	7/11/23	16/01/24													
8		IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURA	\$ 750.000.000,00	92 días	7/11/23	8/03/24													
9		IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	\$ 811.831.873,00	90 días	7/11/23	6/03/24													
10		VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	\$ 411.446.316,00	90 días	8/11/23	7/03/24													
11		IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C	\$ 344.210.600,00	90 días	20/02/24	19/06/24													
12		IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	\$ 253.419.631,00	60 días	1/12/23	20/02/24													
13		CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	\$ 635.259.722,00	90 días	29/02/24	29/06/24													
14		IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZ	\$ 210.861.638,00	89 días	1/03/24	29/06/24													
15		IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TOL	\$ 337.709.778,00	92 días	27/02/24	29/06/24													
16		IED CAMPESTRE JAIME GARZON - ERASMO VALENCIA	\$ 799.914.269,00	90 días	16/01/24	11/05/24													
17		IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TUNAL ALTO	\$ 599.909.029,00	86 días	6/03/24	29/06/24													
18		RURAL DE LAS MERCEDES	\$ 447.180.697,00	89 días	1/03/24	29/06/24													
19		EMERGENCIAS	\$ 509.093.779,00	182 días	30/10/23	29/06/24													

Proyecto: Caisson Universidad D Fecha: 27/10/23	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

K. Informes diarios

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. <u>137</u>	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	<u>1-06-2024</u> DOMINGO

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudantes	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de estructura y instalacion suPer board bloque emisora enfermeria, emisora. se realiza puñete en muro pasillo emisora, se realiza pintura en apto #2. Se realiza limpieza de ventanas Aula #1, se realiza pintura de ventanas Aula #2, se realiza puñete en muro aula #2, se realiza puñete en pasillo donde se instala el tablero electrico, instalacion de luminarias en pieza #2. bloque emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTTOLOSAORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 138

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

2-06-2024
DDMMAAAACOLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA - ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contralista	Interventoria			
Brindante	1	0	NA		
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
Inspector	0	1			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de estructura para super board
Se realiza instalación de super board apto #2 em.saca
en ferreteria, fusete de muro en apto #1 cocina, instalación
de tubería para lavadora apto #1

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 139

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

3-06-2024
COMMAAAACOLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	1	0			
Inspector	0	1			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de estructura muros divisorios apto #2 pieza y sala, division apto #1, se realiza instalacion de superbord, se realiza remate de pañete en pasillo entrada, apto #2

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOSA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INFORME DIARIO No. 140

FECHA

INTERVENIR AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

04-06-2024

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		Ingreso Inspector de Obra Yelson Arturo Rivera Pineda.
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Muestro	1	0			
Oficial	3	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	10	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Mezclador	1	concreto placa
LLUVIA SUAVE				piso
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Mezclado de concreto y transiego para
Fundida de placa, se realiza Fundida de placa fisoceros,
de salones folio deportivo, se realiza instalacion de sistema walk
en juntas super board, se realiza instalacion de estructura
para Super board e instalacion de Super board, se realizo
fijatura en ventanilla aula # 7, 9 exterior, se realizo
enchafe de meson cocina apta # 7 bloque en serra, se
hace remate de dado almacena, se realiza recorrido
contratista, inventaria

ESPACIO PARA GRÁFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLOSA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 141

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

5-06-2024
COMMMMAAA

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de estructura e instalación de super board en apto # 1, 2 bloques emisora, pintura en ventana emisora, Avla # 1, aplicación de estuco e instalación de cinta malla en super board, lijado de super board bloque emisora, encorace de super board almacén

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 149

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

6-06-2024
DDMMAAAACOLEGIO La Union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	94	Herramientas	1	concreto
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza enlucido de muro superboard Almacén
 Heculado de concreto y trazo, se realiza fundida
 dades soporte estructura Almacén, se realiza instalacion
 de guarda escoba bloque Aula #1, subestacion enfermeria
 enfermeria, apto #2, se realiza aplicacion de pintura bloque
 enfermeria, se realiza embagallado de guarda escoba
 bloque enfermeria.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 15

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

2-06-2024
DDMMAAAACOLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		el contratista tiene permiso de realizar actividades hasta las 10:00 PM se realizan actividades bloque embargo
Inspector SST	1	1			
Electrico	1	0			
Soldador	3	0			
Ayudante	1	0			
Muestrero	3	0			
Oficial	1	0			
TOTAL	2	0	TOTAL		
	13	1			

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Equipo Soldadura	1	Soportes estructura
LLUVIA SUAVE		Compresor	1	Pintura 3 en 1
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza soldadura de soportes estructura y pintura 3 en 1 en bloque Almacén, se realiza instalación de guarda escoba apto #2, 1 bloque emisora, limpieza de ventanas bloque emisora, limpieza de piso escape bloque emisora, Pañete de mazo como mazo apto #2 remate de funete Pasillo Almacén, Aplicación de pintura bloque Almacén, Acomodación de cajas eléctricas se realiza embagullado de guarda escoba, instalación de platines Almacén

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 144

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

8-06-2024

DDMMAAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Director obra	1	0	Ayudante	2	Ingreso Chelmay y David
Residente	1	0			
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Maestro	1	0			
Oficial	3	0			
Soldador	1	0			
Electricos	2	0			
TOTAL	11	1	TOTAL	2	

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camion	1	Materiales, Puertas
LLUVIA SUAVE		Camion	1	ventanas, vidrios
LLUVIA FUERTE				Puertas
OBSERVACIONES:		Compresor	1	Pintura 3 en 1
		Equipo Soldador	1	Almacen

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza soldadura soportes de estructura bloque Almacen, pintura 3 en 1 estructura Almacen, pintura guarda estoba Almacen, pintura bloque Almacen, pintura bloque emisora, instalacion Marcos de Puertas, enchufe tablero cuenta, fusilla enfermeria, Paquete fusilla emisora Descarga de Materiales, Puertas, tuberia sanitaria 4" Flanchos, Resilla carcunao, accesorios electricos, tuberia 6mt, Descarga de materiales camion, ventanas Puertas, vidrios

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 145

FECHA

9-06-2024
DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO

la Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N/A		
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Maestro	1	0			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
		0			
		0			
TOTAL		1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
TIEMPO SECO	24	Camión	1	descargue material	
LLUVIA SUAVE					
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Alistado de pedestales Almacén, Pintura Fachada Almacén, cambio de vidrios Rotos Aula #7 y Almacén, Pintura de ventanas, Pintura Fachada emisora, instalaciones de tablero cuenta fusillo exterior, cambio de vidrios Rotos bloque emisora, instalaciones Marcos de Puertas bloque emisora, instalaciones de ventanas con rejillas bloque emisora baños, Fusillo, instalación de puerta corrediza baño apto #1, anclajes con espico puerta apto #2 viga, Fachada de viga, descargue de materiales camión, granito, enchufe lavamanos.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTTOLLO A ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 146		FECHA 10-06-2024 <small>COMARAAA</small>		
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				
COLEGIO <u>la union</u>					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N A		
Inspector SST	1	1			
Maestro Oficial	1	0			
Ayudante Electrico	3	0			
	1	0			
	2	0			
	0	0			
TOTAL	10	1		TOTAL	
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24		N A		
LLUVIA SUAVE					
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Pintura exterior Almacén, Emisora, Pintura de canales emisora, Almacén, cachape baño apto #1, 2, Pintura 3 en 1 estructura Almacén, bloque Emisora, instalación de puertas, instalación de caballetes, Flanched de cubierta, Pintura interior bloque Emisora, instalación cableado bloque Emisora, instalación de sascos bloque Emisora, instalación tubería EMT Pasillo Emisora, instalación de caja Pasillo Emisora.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		INSPECTOR DE OBRA			
LOTT LOLOS AORTIZ					



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 147

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

11-06-2024
COMARAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21		NA		
LLUVIA SUAVE	3				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
se presentan lluvias					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se realiza cableado bloque emisora, enchape de muro baño apto #1, enchape baño apto #2, instalacion sanitaria baño apto #2 instalacion griferia y sifon ducha apto #2, estuco y Santa malla muro de enfermeria, pintura bloque Almacenes interno, Fajete de muro apto #2 viga, pintura de ventanas, instalacion de Aferratos electricos bloque emisora, instalacion de luminarias led enchape en baño enfermeria, pintura muro enfermeria Super board, se realiza Area en obra					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTTTOLOSA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 148

FECHA

12-06-2024
COMBIAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO

La Union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	3	0			
Electrico	3	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	10	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
TIEMPO SECO	23	NA			
LLUVIA SUAVE	1				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
Se presenta una hora de lluvia suave en la tarde					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se instalan bajantes de canal atras del bloque Emisora, Almacén. Se hace enchufe de muro baño apto #1, Enfermería. Se hace aplicación de pintura y renato bloque emisora, se hace instalación de aparatos electricos Tomas, cajas, luminarias led y lamparas hermeticas bloque emisora, realizan actividad de cableado bogre emisora, se realiza demolición para fure tuberia atras del bloque Almacén, instalación de puntos electricos para ducha bloque Almacén y tiro de RCD producto de demolición					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTTIOLA AORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 149

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

13-06-2024
DOMINGOCOLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		No hubo energía desde las 8.PM
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Electrico	3	0			
Oficial	3	0			
Ayudante	9	0			
Soldador	1	0			
	0	0			
TOTAL	12	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	Compresor	1	Pintura Puerta
LLUVIA SUAVE	3	Eguo Soldadura	1	Soldadura Puerta
LLUVIA FUERTE		Camión	1	Materiales
OBSERVACIONES:				
Se presentan 3 horas de lluvias durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación acrometida bloque Almacén, instalación de luminarias led bloque emisora, instalación lamparas hermeticas fusillo emisora, cableado bloque Emisora, instalación lamparas Emergencia fusillo emisora, cableado tablero fusillo emisora, Asco bloque Almacén, excavación manual al lado de bloque Almacén, Pintura bajantes bloque emisora, enchufe baño apto #1, baño Emisora pintura de Puertas bloque emisora, Ajuste de Puertas bloque emisora, Pintura bloque emisora, Descargue de Materiales cemento, Accesorios, Pintura e instalación de luminarias secundarias bloque emisora, limpieza de pisos bloque Almacén

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTI LOSAORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 150

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

14-06-2024
COMMIANA

COLEGIO

la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contralista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Electrico	3	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	NA		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias suaves durante el dia y hora)				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalacion de granito Pasillo bloque emisora en espacio de tablon cocota, se realiza instalacion de tuberia EMT y cajas guseta de seguridad, se realiza cableado e instalacion de aparatos, luminaria led guseta de seguridad, se realiza instalacion de luminarias de emergencia Pasillo guseta de seguridad y Pasillo de Almacen, instalacion de tuberia y cajas para luz de emergencia se realiza instalacion y organizacion de tuberia EMT a traves del bloque emisora la union para conexi6n de datos cableado

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTI LOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 151

FECHA

15-06-2024
DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO I

COLEGIO

La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	N/A		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	2.0	N/A		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron lluvias suaves durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
Se realiza instalación de granito en puerta apto #1	
bloque emisora, se realiza acabados de pintura en	
bloque emisora, se realiza terminado en fisogranito	
y Tablon cucuta fusilla bloque emisora, Aseo en	
bloque emisora, lavado de granito, instalación de	
Tubería EMT, plan conexión de datos apto #1 de	
bloque emisora	

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	COTTOLAS AORTIZ	INSPECTOR DE OBRA
----------------	-----------------	-------------------



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 152

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

16-06-2024
DOMINGOCOLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	NA		
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	NA		
LLUVIA SUAVE	3			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se realizan lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza aseo en bloque emisoras, se realizan remates de pintura bloque Emisora, se realiza Aseo en bloque Almacén, se realiza instalación de bajante canal pasillo Emisora, se realiza pintura en bajante pasillo emisoras.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	KOTTIOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 153

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 8

13-06-2024
DOMINAAA

COLEGIO

La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	1	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza limpieza de tubería EMT bloque emisora
se realiza pintura detallado bloque emisora
se realiza desmontaje de cubierta salón #7 bloque
salones polideportivo, se realiza desmontaje de celosías
salón #2, se realiza trasiego de R.C.D, se realiza
demolicion de encoracé y muro sobre viga salón #2.
pintura en garajita Fachada posterior cubierta.
Se realizan observaciones de parte de la Interventoria
al inspector de obra para la entrega de los bloques
Almacén y Emisora, recorrido en obra

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTOLOJAORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA:	
----------------	-----------------------	--------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 154

FECHA

18-06-2024
DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contralista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19		Andamio Certificado	1	desmontaje
LLUVIA SUAVE	3				cubierta salón?
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
Se presentan lluvias suaves durante el día 3 horas					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza retiro de RCD Salón #7, demolición encofrado viga, retiro de guarda escoba bloques Almacén excavación manual para placa al lado de Almacén traslado de RCD zona verde Almacén, compactación de piso e instalación de malla al lado de Almacén Mezclado de concreto y traslado para fundición, fundido de placa piso al lado de Almacén, consolidación de medidas para memorias					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTTI LOSA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 155	FECHA 19-06-2024 <small>COMUNICAR</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO La Unión


PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22	volqueta	1	Receba común
LLUVIA SUAVE	2			b 400
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan 2 horas de lluvias suaves durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza pintura guinda escoba bloque Almacén
 se realiza pintura y estuco bloque encaden detalles
 se realiza desmontaje de cubierta y cerchas metálicas
 salón #1 bloque polideportivo, se realiza demolición de encorocí y cubiertas de muro sobre viga, ASCO en pasillo de salones, desahogue de volqueta, Receba común b 400, trasiego de teja Acanto de Acopio.

ESPACIO PARA GRAFICO



ELABORADO POR:	LOTTOLISA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 156

FECHA

INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

20-06-2024
COMBIAAACOLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Huésped	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	2.1	Andamio certificado	1	Farilla emisora
LLUVIA SUAVE	3	Mezclador	1	concreto
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentaron 3 horas de lluvias suaves durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pintura epoxica aplicación impermeabilizadora, cocina apto #1, apto #2, Traje de B.D bloque Salones Polideportivo Apto Atrio del bloque emisora, Farolada de placa piso atrio de emisora y Almacén, Mezclado de concreto para Farolada Remates de pintura estructura cubierta Pasillo emisora Armado de Andamio, Remates de pintura bloque emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLASHORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 157

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

21-06-2024
DOMINGO

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N/A		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22	Andamio certificado	1	puzillo emisor
LLUVIA SUAVE	2			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan 2 horas de lluvias durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS


Se realiza Armado de Andamio certificado puzillo Emisor, Remate de pintura puzillo emisor, se realiza instalación de accesorio desague lavu platos cocina conexión de desague lavamanos bloque emisor, trasiego Recebo común, extendido recebo común atrás de Almacen compactación de piso para fundido de cancheta, instalación de malla electro soldada, Aplicación de Actonal salón inclusión, organización de cosas salón inclusión para Realizar pintura, Trasiago de R.C.D.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOS PORTILLO

INSPECTOR DE OBRA



FECHA

22-06-2024

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO I

COLEGIO	la unión
---------	----------

Powered by CamScanner



FECHA:

INTERVENDORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO E

23-06-2024

COLEGIO	La Unión
---------	----------

ESPACIO PARA GRABAR

ELABORADO POR:

LOTT TOLOSA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 166

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

24-06-2024
COMISSAAA

COLEGIO 16 UNION

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Andamio		bloque emisora
LLUVIA SUAVE	4	certificado	1	
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan 4 horas de lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza Armado de Andamio certificado atral del bloque emisora, remate de pintura, demolición de escape cuarto lavado vivienda de docentes, demolición de dos lavaderos cuarto lavado vivienda docente, demolición de sobre piso cuarto de lavado vivienda de docentes, Tanques lavado y lavaderos, Traslado de BID a punto acopio frente a inclusión, Ajuste e instalación barandas de movilidad reducida baño niños y niñas

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	COTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 167

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

25-06-2024
DOMMIAAACOLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N/A		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camión	1	Soportes lavadero
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza demolición enchufe muro vivienda docentes, demolición enchufe de piso vivienda docentes, desmontaje electricidad Tomas y switches cuarto de lavado subida de materiales para cargue de sobre piso alistado, descargue de materiales camión soporte estructura

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LATTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 168

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

26-06-2024

COMMAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		
Inspector	1	1			
Muestrero	1	0			
Oficial	1	0			
Soldador	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camión	1	Perfil 100x50
LLUVIA SUAVE				Puerta, Rejilla
LLUVIA FUERTE				Para Curcuma
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Mezclado manual para cargue de sobre piso, se realiza cargue de sobre piso vivienda de docentes, se realiza subida de material a vivienda docentes Arena, cemento, se realiza recorrido en obra Contratista, Interventoria, se realiza descargue de Materiales camion, se realiza Traslado de RCD de Salares polideportivo, descargue de Perfil 100x50 11 und, 1 Rejilla para Curcuma, 1 Puerta

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 169

FECHA

23-06-2024
DDMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	N/A		Se realiza el Retiro del señor Gerencio de Jesus Gusman Arias, por no estar Autorizado
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20		E. Equipo Soldadura	1	N/A
LLUVIA SUAVE	4				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
Se presentan 4 horas de lluvias durante el día					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza Mezclado manual para cargue de sobrepiso Se realiza cargue de sobre piso vivienda de docentes Se realiza limpieza de estructura metálica, Transferido de RCD, remates de Puente aleros de vivienda de docentes, Azco Aleros de vivienda de docentes					
NOTAS: Se realizó el Retiro del colegio al señor Gerencio de Jesus Gusman Arias por no estar autorizado y no estar en el listado Actualizado, el Arquitecto Leonardo Torres lo volvió a ingresar al colegio sin acatar las observaciones de la Interventoría					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR: <u>LOTTOLAS A ORTIZ</u>			INSPECTOR DE OBRA		



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 170

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

28-06-2024
COMISSIAAACOLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Soldador	1	0			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	9.0	Equipo Soldadura	1	Soldadura estructura
LLUVIA SUAVE	4	Andamio Certificado	1	Subir material defensivo
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el día 4 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza limpieza de estructura, soldadura de platinas y soportes estructura, sellado de juntas perfil T.P.O.E, Anclajes para platinas salón 1, 2 bodega polideportivo, raspado de pintura paredes salón 1 interior y exterior, arreglo de pautas agua potable para lavaderos apto #1, 2, instalación de lavaderos en apto #1, 2. Area en obra, traslado de BCD

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLLODAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 171

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

29-06-2024
DDMMAAAACOLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Aspente	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	2	0			
Soldador	1	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22	Equipo soldadura	1	Salon #1
LLUVIA SUAVE	2			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron 2 horas de lluvias durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza remates de cuchillas Salon #2, Armado de Andamio certificado para remate, Mezclado manual para remates cuchillas, raspado de pintura exterior en Salones 1, 2, raspado de pintura interior, instalacion de Platinas, soldadura en fijo celda de tarro, instalacion de lavaderos, Aplicado de epoxico en Andajes de Platinas

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLO AORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 172

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B

30-06-2024
DOMINGOCOLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	N A		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Andamio certificado	1	Salones 1, 2
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

remate de cuchillas Salón, 1, 2 Frente a polideportivo
Mezclado manual Fucha Puñete cuchillas, raspa de
pintura Salones 1, 2 exteriores, remate Observaciones
bloque emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 122		FECHA 05-06-24 COMANAMA		
	INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS REDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B				
COLEGIO Jaime Escrivan - Sede Auras.					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Carga	Cantidad		Carga	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventor			
Ingeniero Apoyo	1	0	N/A		Se realiza la observación al consorcio claridad para retocar pintura exterior de rampa biblioteca
Inspector	0	1			
Oficiales	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	16 hrs.		N.A.		
LLUVIA SUAVE	4 hrs.				
LLUVIA FUERTE	4 hrs.				
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se presentan 4 oficiales de obra, los cuales empiezan la ejecución de actividades retirando gavetas o módulos inferiores atornillados y fijados al mezon. Por otra parte se realizo la limpieza de la estructura de la cubierta y se retoco las partes con peladuras o imperfectas.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLOZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 123		FECHA 06-06-24. <small>(DOMINICA)</small>		
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1</small>				
COLEGIO <u>Jaime Garzon- Sede Auris</u>					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		El personal electrico se retiro a las 12 debido al desplazamiento hasta Uda Tunal Alto.
Inspector.	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricos.	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
TIEMPO SECO	16 hrs.		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
LLUVIA SUAVE	5 hrs.				
LLUVIA FUERTE	3 hrs.				
OBSERVACIONES:					
J. ACTIVIDADES REALIZADAS					
El grupo de oficiales de acabados desarrollo actividades de remate de estuco en muros del bloque de administracion del 2do piso. Por otra parte el grupo de electricos realizo la desinstalacion de 9 correas de la cubierta antigua que hacian falta por bajar. Nota: Quedan 2 correas sobre los muros del bloque administrativo, ya que tienen tuberia con cables de instalacion de datos interna de la cual no se pueden quitar.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LDIT TOLAZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 124.

FECHA

07-06-24.

COMBANA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Auras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0			se requiere de la presencia de la profesional SST para Permiso de Alturas.
Inspector oficiales	0	1			
	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
TIEMPO SECO	20 hrs.				
LLUVIA SUAVE	4 hrs.				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realizan actividades correspondientes al rescate y aplicacion de estuco en filos y muros donde se retiraron las correas de la cubierta antigua. De igual manera se realiza la limpieza de la estructura de cubierta del bloque de administracion. Por observacion de la interventoria no se realizan actividades en alturas debido a la falta de permisos por parte de la profesional SST del consorcio claridad.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLOTA ORTIZ.		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 125	FECHA 08-06-24 <small>COMBINADA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime GARZON - Sede Auras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		se suspenden actividades por incumplimiento en EPP y permisos para trabajar en alturas.
Inspector.	0	1			
Oficiales	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO		N.A.		
LLUVIA SUAVE	3 hrs.			
LLUVIA FUERTE	4 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

la jornada inicia con labores de correccion de Filas y muros a traves de la aplicacion de estuco. Estas actividades solo comprendio la parte baja ya que el personal del consorcio claridad no cuenta con los EPP ni los permisos de sot. para trabajar en alturas. De esta manera solo aprobo trabajos en planta baja y con los EPP adecuados. se hace la observacion de suspender labores e iniciar una vez corregido todo.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 126.

FECHA

10-06-2024

DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Acoras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		El día Domingo 9 de Junio no se realizan actividades.
Inspector.	0	1			
Oficiales.	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19 hrs	N.A.		
LLUVIA SUAVE	3 hrs			
LLUVIA FUERTE	2 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la aplicación de estuco en filas y muros internos del bloque de administración. Adicionalmente se realizó la aplicación de pintura en muros lyados. las actividades se suspenden sobre las 2 pm por temas de alimentación del personal del consorcio claridad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTI TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 127

FECHA

11-06-24
DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Barzon - Sede Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0			se suspenden actividades en alturas y trabajos de manipulacion de pulidora por falta de implementos EPPST.
Inspector.	0	1			
Oficiales.	7	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	15 hrs.	Pulidora.	1	Trazado y marcado de la contrapiso
LLUVIA SUAVE	6 hrs.			
LLUVIA FUERTE	3 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de acabados de pintura y estuco en muros externos e internos del bloque administrativo, la mayoria de actividades estan para desarrollar en alturas, lo cual atrasa las actividades ya que no se cuentan con los permisos del profesional del consorcio Claridad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTT TOLOZA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 128	FECHA 12-06-24 <small>0000000000</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Aurora

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		se reitera las observaciones por el uso de EPP y por mismo para trabajos en alturas.
Inspector	0	1			
Oficiales	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	2	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	17 hrs.	Pulidora	1	marcar y rayar.
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	Rotomartillo	1	Perforar y demo
LLUVIA FUERTE	5 hrs.			ler losa de con
OBSERVACIONES:				creto.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza correccion de muros y filas atraves de la aplicacion de estuco. De igual manera se aplica pintura blanca en muros superiores y color verde en zocalos. Adicionalmente se demarca y raya las lasas de contrapiso para el sistema de drenaje de aguas lluvias.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLIA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 129

FECHA

13-06-24
COMBAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Farzon - sede Acora

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoy	1	0	N.A.		se hace bajar a un trabajador por estar realizando actividades de alturas sin los EPPs y permisos obligatorios
Inspector.	0	1			
Oficiales.	7	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Pulidora	1	Rayar y Demarcar
LLUVIA SUAVE	3 hrs	Rotomartillo	1	Demolicion de
LLUVIA FUERTE	1 hr.			losa para desagues
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la demolición de lava de contrapiso para sistema de desagüe de aguas lluvias. Esta actividad comprendía rayar con la pulidora y posterior con el roto martillo. Por otra parte se continuo con la pintura en muros internos y externos del bloque de administración, actividad de la cual se entregó blanco a la parte superior del zocalo y verde en la parte inferior o zocalo.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTT TOLOZA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 130		FECHA 14-06-24 <small>COMUNICA</small>		
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>				
COLEGIO <u>Jaime Garzon-Cede Auras</u>					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N/A		Personal del consorcio claridad realiza labores en alturas sin EPPs y sin permisos por parte del profesional JST.
Inspector.	0	1			
Oficiales	7	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24 hrs.		Pulidora	1	corte y rayaduras.
LLUVIA SUAVE			Taladro	1	Perforaciones.
LLUVIA FUERTE			rotomartillo	1	Remoción de placa para conduccion de aguas lluvias.
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se continua con la demarcacion y rayadura de losa de contrapiso para instalacion de drenaje de aguas lluvias. De igual manera se continua aplicando pintura al bloque administracion en zócalos y en muro completo. por otra parte se realiza el encorrece en muros exteriores bloque administracion.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		10TT TOLDOZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 131	FECHA 19.06.24	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5		
COLEGIO Jaime Garzon - sede Auras			
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL		PERSONAL OPERATIVO EN OBRA	
Cargos	Cantidad Contratista Interventoria	Cargos Cantidad Observaciones	
Ing Apoyo	1	0	El personal del convorcio claridad de desarrolla actividades en alturas sin EPPOT y sin el permiso del profesional
Inspector	0	1	
Oficiales	3	0	
Electricos	3	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
TOTAL	7	1	
ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS	
TIEMPO SECO	18 hrs.	DESCRIPCION CANTIDAD ACTIVIDADES	
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Pulidora 1 cortes y marcacion	
LLUVIA FUERTE	3 hrs.	rotomartillo Demolicion de placa	
OBSERVACIONES		Taladro 1 Perforaciones	
ACTIVIDADES REALIZADAS			
se desarrollan actividades de pintura de Fachada en el bloque de laboratorios y en la fachada del bloque administracion. los electricos desarrollaron actividades de instalacion de tuberia EMT para derivacion interna de puntas electricas. en el bloque administrativo. NOTA: Desde el dia 14 de junio el personal no desarrollo ninguna actividad en la sede Auras.			
ESPACIO PARA GRAFICO			
ELABORADO POR:	LOTT TOLDEA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	



INFORME DIARIO No. 132

FECHA

20-06-24

XXXXXXXXXX

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N.A.		El personal del consorcio claridad desarrolla actividades en alturas sin EPP y permisos de un profesional SST
Inspector	0	1			
Oficiales	4	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	15 hrs.	Rotomartillo	1	Demolicion contrapiso
LLUVIA SUAVE	5 hrs.	Taladro	1	Perforaciones
LLUVIA FUERTE	4 hrs.	Herramienta de		mano.
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollan actividades de pintura en muros exteriores del bloque administración. De igual manera se realizó la demolición, excavación y trasiego del escombro hasta el acopio. El personal electrico realizó toma de mediciones, corte, figurado y postura de tubería galvanizada EMT en el bloque administración.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTE TALOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 133

2

FECHA

21-06-24

CALLEJAS

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Garzon - sede Auras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventoria			
Ing Apoyo.	1	0			
Inspector	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricas	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22 hrs.	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	2 hrs	de mano.		
LLUVIA FUERTE		Taladro	1	Perforaciones
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el alistamiento de bloque, cemento, Arena y demas para levantar el muro exterior de la parte de atras del bloque de laboratorios. Adicionalmente se continua con la excavacion de la zanja para tuberia de desague de aguas lluvias. En cuanto a los electricos se realizo la instalacion de tuberia EMT y cajas Ravelt y un acometida de cable N°12 para iluminarias y fomarcorrientes en bloque rectoria.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TAOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 134	FECHA 22-06-24 <small>(Jueves)</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROPIETARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon- Sede Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0			
Inspector	0	7			
Oficiales.	3	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	7	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Mano		
LLUVIA FUERTE	3 hrs	taladro	1	Perforaciones.
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan trabajos de mamparteria con bloque en el costado externo del bloque de laboratorios. Adicionalmente se continua con la excavacion de las zanjas para el desague de aguas lluvias. Adicionalmente en cuanto a lo electrico se realizaron trabajos de acometida de cableado para luminarias y toma corrientes.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	JOH TOLAZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 135	FECHA 23-06-24 <small>DIAMAGAAA</small>
	<small>INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon-Sede Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N/A		El personal del consorcio claridad realiza actividades de alturas sin epp y sin el arnes y seguridad del andamio
Inspector	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Taladro	1	Perforaciones.
LLUVIA SUAVE	5 hrs.	Herramienta		
LLUVIA FUERTE	1 hrs.	de Mano		
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se terminan los trabajos de mamposteria con bloque en el costado externo del bloque laboratorios. Adicionalmente se realizo pegue de panele perimetral en el mismo muro donde se realizo la mamposteria. Por otra parte se continuo con la excavacion de las zanjas para sistema de desagües de aguas lluvias. se realizo capa de paso e inspeccion

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR: LOTT TOLDA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA
--	--------------------------



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 136

INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

FECHA

29-06-24

DOMINAAA

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ing Apoyo	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Taladro	1	Perforaciones
LLUVIA SUAVE	4 hrs.	Herramienta		
LLUVIA FUERTE	2 hrs.	Mano		
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan trabajos de mamposteria en un costado donde se habia colocado eternboard. Sin embargo por consistencias a la interperie se determino que se hiciera en bloque. Por otra parte se continua con la excavacion en la parte norte del bloque administracion para el sistema de desagüe del bloque (laboratorias y adm. En cuanto a las actividades del grupo electrico, se realizo la instalacion de luminarias en pasillos y oficinas del bloque administracion

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLDO CRIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 137

INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

FECHA

25-06-24

DOMINGO

COLEGIO Jaime Garzon Sede Auras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N-A		Se realiza la observación por un muro de mampostería que no cuenta con el trave del muro perpendicular.
Inspector	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	de Mano.		
LLUVIA FUERTE	2 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de excavación del costado izquierdo del bloque adm y en colindancia con el parque. Esta actividad comprendió excavar y pasar por debajo de la conformación de 2 vigas existentes. Adicionalmente se realizó la aplicación de pañete en muros perimetrales exteriores. Por otra parte los electricos solo realizaron inventario de material sobrante.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 138	FECHA 26-06-24 <small>COMINAAA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - sede Aucas.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	NA.		se ejecutan actividades en alturas. sin los EPP ni los permisos por parte del profesional SST
Inspector.	0	1			
Oficiales.	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	14 hrs.	Herramienta de Mano.		
LLUVIA SUAVE	2 hrs.			
LLUVIA FUERTE	3 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza aplicacion de pintura blanca y verde en muros completos y zocalos respectivamente. Esta actividad la ejecutan sin supervicion en alturas en el bloque de la biblioteca. Por otra parte se comienza a poner la tuberia pvc 6" de desagüe para recoger el agua lluvia de los bloques administracion y laboratorio. se realiza una cama con arena de playa para evitar vacios o falsos.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLDOA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 1391

FECHA

27-06-24

DDMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESEIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Jaime Garzon - sede Aurac.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N.A.		El personal del grupo claridad realizan actividades en alturas sin EPP y sin permisos de un profesional SST.
Inspector	0	7			
Oficiales.	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	7	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	2 hrs	de Mano		
LLUVIA FUERTE	2 hrs			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza trasiego de arena de peña para realizar cama a la tubería de 6" para el sistema de desagüe de aguas lluvias. se realizo consolidación de mediciones con el mg Residente de apoyo. Por otra parte se realizo la aplicacion de pintura verde en zócalos.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	WOT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 140	FECHA 28-06-2017 <small>DOMINGO</small>
	<small>INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Auras.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ing Apoyo	7	0	N.A.		El personal realiza actividades en alturas de los cuiles no estan autorizados por parte de un profesional SST.
Inspector	0	7			
Oficiales.	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	7	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	de Mano.		
LLUVIA FUERTE	2 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalacion de tuberia de 6" PVC para sistema de desagüe aguas lluvias bloque laboratorio y administración. la red principal queda a esa dimension y las bajantes a 4". De igual manera se continua con la aplicacion de pintura externa bloque biblioteca.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 141	FECHA 29-06-24 <small>DDMMAAAA</small>			
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE MESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3				
COLEGIO Jaime Garzon - Sede Aurica					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL					
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	7	0	N.A		El personal esta desarrollando actividades a mas de 9mto de alturas sin EPP y sin permisos.
Inspector	0	7			
Oficiales	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	7	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22 hrs		herramienta de mano		
LLUVIA SUAVE	2 hrs				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realizan trabajos de aplicación de pintura en exteriores en el bloque de biblioteca y bloque laboratorio química. El personal del consorcio Clarib no están acatando las recomendaciones dadas por parte de la interventoria, estas obedecen a los trabajos en alturas.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		1011 TOLAZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



INFORME DIARIO No. 7

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

6-06-2024

COLEGIO

Seed Told

[illegible]



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 8

FECHA

7-06-2024
CONFIRMA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERTENECEN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Sanle Toledo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS

TIEMPO SECO	24	NA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
LLUVIA SUAVE					
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza demolición enchufe baño piso vivienda docentes #1, se realiza retiro de RCD a punto acopio ingreso Residente atomax nuevamente medidas de cubierta

ESPACIO PARA DIBUJO

ELABORADO POR

Lett Toledo A Ortiz

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 9

FECHA

13-06-2024
COMBAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		Los dias 8,9,10,11,12 No se realizaron Actividades en obra
Inspector	1	1			
Conductor	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	2	1	Camion	1	Descargue de Materiales
LLUVIA SUAVE	3				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
Se presentan lluvias suaves durante el dia 3 horas					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza descargue de Material, cemento 30 bultos, Accesorios.					
NOTA La seguridad privada de la sede Reporto la llegada de un personal no autorizado el dia 13-6-2024 Actividades descargue de material entraron a la vivienda de docentes #1					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLAJA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 10	FECHA 14-06-2024 <small>COMBUNA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		se evidencia
Inspector	0	1			personal NO
	0	0			Autorizado
	0	0			Realizando
	0	0			Actividades
	0	0			en obra en
	0	0			compañia del
	0	0			Residente
TOTAL	1	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	NA		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el día 4 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza demolición de sobre piso vivienda decentes #1, se realiza Traslado de RCD de la demolición de sobre piso a punto de Acopio

NOTA: A la llegada del inspector de Interventoria se evidencia personal Trabajando en la sede el cual No se encuentra dentro del listado de personal Autorizado es compañía del Personal se evidencia al Residente de obra se toma evidencia y se le pide que retire al personal de la sede por no estar autorizado

ESPACIO PARA GRAFICO

Personal NO Autorizado
 Wilfredy castillo Bernal
 EDWIN Augusto cruz Gonzalez
 Yeison Camilo Perez
 Edith carolina

ELABORADO POR:	LOTTI TOLDO AORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 11

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

15-06-2014
COMBIMAAA

COLEGIO sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	NA		
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	1	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	NA		
LLUVIA SUAVE	6			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza revision a la sede y se toma video Avance de obra vivienda docente #1

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTI LOJA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 13

FECHA

18-06-2024
COMARCA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	Volqueta		viaje de Arena
LLUVIA SUAVE	6	Doble trazo		Amarillo, Mixto
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia 6 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza Toma de Niveles sacado de punta y cargue sobre piso vivienda docentes # 1, Mezclado de mortero para cargue de sobre piso

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTI LOSA PORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 14

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE MESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

19-06-2024

DOMINICA

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	Volqueta	1	Recebo común
LLUVIA SUAVE	6			Materiales, duro piso
LLUVIA FUERTE				Pegucor, Malla, boquilla
OBSERVACIONES:				Madera, compactador

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cargue sobre piso vivienda docentes #1, se realiza Mezclado Manual para sobre piso, se realiza excavación Manual pasillo comedor, se realiza traslado de RCD, se realiza demolición de dados soportes pasillo comedor, se realiza postura de pasillos en Madera pasillo comedor Soportes de estructura cubierta Descargue volqueta, Malla electrosoldada, pegucor, duro piso, boquilla, tablas, compactador de piso, enchufe muro baño y cocina

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 15

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

20-06-2024
COMARAAACOLEGIO sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	Computador	1	compactacion
LLUVIA BUAVE	6			Pasillo comedor
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentaron lluvias durante el dia 6 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS				
Se realiza fraseo de Recebo Común b 400, extendido de Recebo común b 400 y compactación de piso, instalación de malla electrosoldada, Mezclade concreto, curque placa piso pasillo comedor				

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

COTTI COLA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 16

FECHA

21-06-2024
COMIENZO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	N A		
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1		TOTAL	

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Volqueta	1	Recebo común
LLUVIA SUAVE	4			b 400
LLUVIA FUERTE		compactador	1	pasillo comedor
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el día 4 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza cargue de sobre piso pasillo comedor, Mezclado para sobre piso, trasiego de Recebo común, compactación de piso, instalación de malla electro soldada, cargue de Placa piso pasillo comedor, Descargue de Volqueta Recebo común b 400.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTOLASA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 17

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

27-06-2024
DOMINGOCOLEGIO sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	NA		
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	NA		
LLUVIA SUAVE	6			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron lluvias durante el día 6 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de malla electrosoldada en fusillo comedor, Mezclado Manual para Fundido Piso, Cargue de piso Fundido fusillo comedor, instalación de durapiso en fusillo comedor, Traslado de Material para Fundido

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLAS AORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 18

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

24-06-2024
COMBINAAAA

COLEGIO Sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		el dia 23 No se realizo actividades en obra
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	2.0	NA		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan 4 horas de lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza sacado de puntos para cargue de sobre piso pasillo comedor, se realiza instalacion de duro piso pasillo comedor, se realiza alistado en rampa entrada a pasillo comedor, se realizo fundida de dados de soporte pasillo comedor 3 dados se realiza instalacion de guarda escoba, se realiza Aseo de enchape duro piso en pasillo comedor, sacado de cortes guarda escoba

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTI OLOSA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 19	FECHA 25-06-2024 <small>COMUNAS</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1</small>	

COLEGIO se de el tordo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N A		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camion	1	Materiales
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación duro piso pasillo comedor, enchape baño vivienda #1 de cargue camion, cemento 20 bultos perfil 100x50 6 und, perfil tipo c 150x60, 24 und, win 3 und Aluminio, pintura Zen 1, Tuxer, Platinas 15 und 25x15, se realiza raspado de pintura exterior vivienda de docentes #1, de molicion de enchape a tras de vivienda #1 piso y muro, Trasego de BCD se realiza Mezclada Masul para sobre piso, se realiza cargue sobre piso pasillo comedor

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR: <u>COTTOLOSA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA
--	--------------------------

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 20		FECHA 26-06-2024 COMMAAAA		
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				
COLEGIO <u>Sede el Toldo</u>					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		Ingreso SST Interventoria Carlos Rincon
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24		NA		
LLUVIA SUAVE					
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza Mercado Manual para cargue de Sobre Piso Atras de vivienda docentes, se realiza cargue de sobre piso atras de vivienda de docentes, se realiza enchufe de baño pared y piso vivienda de docentes, se realiza instalacion de enchufe duro piso fustillo comedero vivienda de docentes, se realiza recorrido en obra, Contratista, Interventoria. se realiza consolidación de Medidas para memoria					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		INSPECTOR DE OBRA			
LOTTOLAS A ORTIZ					



FECHA

27-06-2024

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Sede el Toledo



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 22

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

28-06-2024
COMMANAACOLEGIO sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	NA		
Oficial	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	NA		
LLUVIA SUAVE	6			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el día 6 horas, día nublado				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de enchufe en mesón cocina vivienda docente, embagullado en baño y mesón vivienda de docentes, se realiza remate de estuco y lijado en pasillo comedor, se realiza pintura de dados soportes pasillo comedor, pintura de madera soportes estructura pasillo comedor, pintura guedres y antepecho pasillo comedor, embagullado de duro piso pasillo comedor

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLLO AORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 23

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

29-6-2024
COMBIAAAA

COLEGIO sede el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N/A		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Soldador	2	0			
Ayudante	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	Equipo soldadura	1	vivienda docentes
LLUVIA SUAVE	6			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el día 6 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintura pasillo comedor Paredes, embagullado de duro
 Piso pasillo comedor, rezane y estuco exterior bloque
 comedor, pintura soportes de estructura, soldadura
 en piso cellado de tarro, desmontaje cubierta vivienda
 docentes, desmontaje de cerchas metalicas vivienda
 docentes

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 24

FECHA

30-6-2024
00000000

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Se de el Toldo

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Soldador	3	0			
Ayudante	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	10	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Equipo Soldadura	2	Vivienda docente
LLUVIA SUAVE	4	Compresor	1	Pintura 3 en 1
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron 4 horas de lluvias durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza rezone de muros exterior bloque comedor
 se realiza raspado de pintura y aplicación estuco exterior bloque comedor, aplicación de Anxonal (trus) del bloque comedor, pintura pedestal pasillo comedor
 soldadura en piso sellado de tarros, instalación de platinas con ceroxico, soldadura de empuchado en vivienda docente, pintura 3 en 1 en estructura.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 05

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

01-06-24
DDMMAAAACOLEGIO Jaime Garzon Cede Garzon

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Carga	Cantidad		Carga	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventor			
Ingeniero Apoyo	1	0			se realiza la observación de colocar una
Inspector	0	1			
Soldadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24 horas	N/A		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
se realizan actividades de soldadura de empacados estructura metalica para cubierta. Adicionalmente se realiza la aplicación de primera mano de pintura y anticorrosivo.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LUIS TOLOZA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO N° 06	FECHA 04-06-24 DOMINGO	
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FINCAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FINCAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FINCA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS GRUPO B			
COLEGIO Jaime Escrivá Sede Páez			
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			
Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventor	
Ingeniero Apoyo	1	0	
Inspector	0	1	
Ornamentadores	3	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
TOTAL	4	1	
PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			
Cargo	Cantidad	Observaciones	
		los dificultades del clima han impedido el avance de la ejecución de actividades.	
TOTAL			
ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TIEMPO SECO	17 hrs.	N.A.	
LLUVIA SUAVE	5 hrs.		
LLUVIA FUERTE	2 hrs.		
OBSERVACIONES:			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			
se realizaron actividades de limpieza de estructura de vigas metálicas. Esta actividad estuvo interrumpida por las fuertes lluvias que impedían poder manipular la estructura metálica.			
ELABORADO POR: COTT TOLAZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		

[illegible]

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. <u>08</u>		FECHA <u>06-06-24</u> <small>DOMINGO</small>		
	INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS REDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				
COLEGIO <u>Jaime Garzon-Velez Parícut</u>					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ingeniero Apoyo	1	0			
Inspector	0	1			
Ornamentadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
TIEMPO SECO	15 hrs.		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
LLUVIA SUAVE	6 hrs.		EQUIPO DE SOLDADURA	1	cordones y soldadura
LLUVIA FUERTE	3 hrs.		FULDORA.		cortes y pulido
OBSERVACIONES:			PLANTA GASOLINA.		Disponible a even
					tualidades con el
					Fluido electrico.
					Nota: No tiene
					Gasolina.
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realizan trabajos de soldadura de amarrados, vigas de amarre e instalación de correas. De igual manera se realiza limpieza de estructura para agregar anticorrosivo y un posterior mano de pintura en aceite. Sin embargo se deja la observación de las lluvias constantes que afronta la zona de intervención.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		INSPECTOR DE OBRA			



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 09

FECHA

07-06-24

CONVIAAAA

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Y ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Garzón - Sede Raízal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		El personal se encuentra laborando hasta tarde debido al estado del clima durante el día.
Inspector	0	1			
Ornamentadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Equipo SOLDADURA	1	cordones y soldadura
LLUVIA SUAVE	3 hrs	Polidora	1	cortes y pulido.
LLUVIA FUERTE	1 hrs	Planta Gasolina	1	Disponible a even
OBSERVACIONES:				tualidades con el
				Fluido eléctrico
				NOTA: No tiene
				Gasolina.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan trabajos de soldadura de empacador, vigas de amarre e instalación de correas. Adicionalmente una vez se mide y se corta cada viga se procede a limpiar y agregar anticorrosivo y pintura. Las condiciones del clima no favorecen para ejecutar actividades, por ello se trabaja hasta horas de la noche en la sede.

ESPACIO PARA GRÁFICO

ELABORADO POR:

EDITH TOLDO ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 10	FECHA 08-06-24. <small>DDMMAAAA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO Jaime Garzon- sede Raizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		se realiza observacion de recolección y demarcación de RCDS.
Inspector.	0	1			
ornamentadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	16 hrs.	Equipo soldadura	1	cordones
LLUVIA SUAVE	5 hrs.	Pulidora	1	cortes y pulido
LLUVIA FUERTE	3 hrs.	Planta gasolina	1	Disponible a eventualidades con el fluido electrico
OBSERVACIONES:				NOTA: No tiene Gasolina.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan trabajos de soldadura de empacados, vigas y correas para la estructura de cubierta. Adicionalmente una vez cortada se limpia y se agrega anticorrosivo y pintura. se deja estipulado que aunque hacen el respectivo aseguramiento de línea de vida, arnes y EPP, no se cuentan con los permisos por parte de la profesional JST del consorcio claridad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TADDA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 77	FECHA 12-06-24. <small>DOMINGO</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - Vede Karzan

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contralista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0			El personal solicito permiso para laborar el fin de semana pero se retiró desde el día sábado y ingresó el miércoles a las 2 pm
Inspector.	0	1			
ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO		Equipo Soldadura	1	cordones y soldadura
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	Pulidora	1	corte y pulido
LLUVIA FUERTE		Generador Energia	1	para eventualidad del fluido electrico
OBSERVACIONES:				NOTA: No tiene combustible.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El personal Ingresó sobre las 2pm Haciendo labores de corte y pintura de secciones de correas sencillas de la estructura de la cubierta.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLUZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 12		FECHA 13-06-24. <small>DDMMAAAA</small>		
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>				
COLEGIO Jaime Garzon- Sede Raiza					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargos	Cantidad		Cargos	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A		
Inspector	0	1			
ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
TIEMPO SECO			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
LLUVIA SUAVE	3 hrs.		Equipo soldadura	1	soldadura y cordone
LLUVIA FUERTE	4 hrs.		Pulidora	1	polido y cortes
OBSERVACIONES:			Generador Energia	1	para eventualidad
					del fluido
					electrico
					NOTA: No cuenta con
					combustible.
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se realiza la medicion, corte y pintura de correas para estructura de cubierta. Adicionalmente se marcaron donde van a quedar cada seccion. como solo hay 2 ornamentadores, solo se realiza trabajos de alistamiento ya que se necesitan de mas para subir la estructura de manera segura.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLDOZ ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

INGENIEROS S.A.S.		INFORME DIARIO No 13		FECHA	
		INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROGRAMARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3		14-06-24	
COLEGIO Jaime Garzón-Sede Raizal					
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ingeniero Apoy	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	15 hrs.		Equipo soldadura	1	soldadura y cables
LLUVIA SUAVE	4 hrs		Pulidora	1	Pulido y cortes
LLUVIA FUERTE	5 hrs.		Generador Energía	1	Destinada para eventualidades con el flujo eléctrico
OBSERVACIONES			NOTA: No cuenta con combustible.		
Las fuertes lluvias no dejaron desarrollar ninguna actividad en la estructura.					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se desarrollaron actividades de medición, corte y pintura de correas. Estas actividades se desarrollaron en el polideportivo cubierto autorizado por parte de la J.E.D. No se desarrollo ninguna actividad al aire libre por estado del clima.					
ESPACIO PARA GRÁFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 14	FECHA 15-06-24
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERTANECEN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO Jaime Farfán - sede Raizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
amanuenses	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	14 hrs.	Equipo soldadura	1	soldadura y cables
LLUVIA SUAVE	2 hrs	Pulidora	1	Pulido y cortes
LLUVIA FUERTE	3 hrs	Generador energia	1	Eventualidades con el fluido electrico
OBSERVACIONES				NOTA: NO tiene combustible.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollaron actividades de soldadura de correas y empachados del bloque de calones. Esta actividad estuvo interrumpida por la lluvia en borrascas y la baja niebla.

ESPACIO PARA GRAFICO	
ELABORADO POR:	LOTT TOLERA ORTIZ
INSPECTOR DE OBRA	



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No 15

FECHA

16-06-24

TEMA/ASUNTO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERTANECAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Kaizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A		
Inspector	0	1			
Ornamentadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Taladro	1	Desatornillar.
LLUVIA SUAVE	6 hrs.			
LLUVIA FUERTE	—			
OBSERVACIONES				

3 ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizo la desinstalacion de la cubierta existente en la cocina compenar. la cubierta es teja de albesto. la cual se acopio para disposicion final. De igual manera se realizo la limpieza de perfil tipo C y se procedio a agregar anticorrosivo y pintura. Durante toda la jornada se mantuvo una lluvia suave. las actividades se suspendieron sobre las 3pm. por condicion climatica.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TADZA OPTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No 16

FECHA

17-06-24

C. RAMANA

INTERVENIENDO AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERTENECAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNDONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVIDO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Colegio Jaime Barzon-Cede Raizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENIENDA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
Ornamentadores	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Equipo soldadura	1	soldadura.
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Pulidora.	1	corte y pulido
LLUVIA FUERTE	7 hrs.	Generador Energia	1	Para eventualidades con el fluido electrico
OBSERVACIONES				Nota: No cuenta con combustible.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo la soldadura de emparado de vigas tipo C. Estas vigas se instalaron en el perimetro de la zona de cubierta de la cacinga compensar. El personal del consorcio claridad realiza actividades en altura y aunque utilizan EPP y equipos como arnes y linea de vida, no cuentan con el permiso del profesional JOT del consorcio claridad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOZA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA

INGENIEROS S.A.S.		INFORME DIARIO No. 17		FECHA	
		INTERVENCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Y ADOCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRECISTAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLFOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5		18-06-24	
COLEGIO Jaime Bartsch - sede RAIZA					
PERSONAL CONTRATO OBRAL E INTERVENTORIAL ADMINISTRATIVO-CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
Ornamentadores	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
TIEMPO SECO	17 hrs.		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
LLUVIA SUAVE	4 hrs.		Equipo soldadura	1	soldadura
LLUVIA FUERTE	3 hrs.		Pulidora	1	cortes y pulido
OBSERVACIONES			Generador Energía	1	Para eventualidades con el fluido eléctrico
			NOTA: No cuenta con combustible.		
5. ACTIVIDADES REALIZADAS					
<p>Se realizó la soldadura de empacados de las vigas tipo C. Estas vigas empacadas están en el perímetro de la cubierta de la cocina compensar. Adicionalmente se limpió, agregó anticorrosivo y se les agregó la primer mano de pintura antes de ser subida a muro para su soldadura. El personal desarrolla actividades en alturas sin permisos firmados y avalados por el profesional JOT del consorcio Claridad.</p>					
ESPACIO PARA GRÁFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLOZA ORTIZ.		INSPECTOR DE OBRA	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO N° 18	FECHA 19-06-24. <small>JUMIPANAS</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROPIETARIAS, GARANTIZAR EL FUNDONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTINTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1</small>	

COLEGIO Jaime Garzon- Sede Ralza

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A.		se realiza cruce de mediciones por parte del contratista y la interventoria.
Inspector	0	1			
Ornamentadores	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19 hrs.	Equipo Soldadura.	1	Soldadura.
LLUBIA SUAVE	4 hrs.	Polidora	1	corte y pulido
LLUBIA FUERTE	1 hrs.	Generador Energia	1	para eventualidades con el fluido electrico
OBSERVACIONES				Nota: No cuenta con combustible

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la nivelacion de la estructura y la soldadura de platinos de currimiento con las cerchas existentes. se traza Hila para darle escuadra a la misma teniendo en cuenta la anterior seccion y a soldar. Adicionalmente se midio, corto y se agrego cinti corrosivo a parte de las correas. El personal realiza actividades en alturas y aunque cuentan con los EPP y uso de arnes y linea de vida, no cuentan con la autorizacion y firma de permisos por parte del profesional SST del consorcio claridad.

ELABORADO POR: LOTT TOLZADORTIZ			INSPECTOR DE OBRA
---	--	--	--------------------------

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 19	FECHA 20-06-24 <small>CELEBRADA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO - Jaime Garzon - sede Raizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A		El personal desarrollo actividades hasta las 08:30 p.m.
Inspector	0	1			
Ornamentadores	4	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Equipo soldadura	1	soldadura.
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Pulidora	1	cortes y pulido
LLUVIA FUERTE	3 hrs.	Generador Energia	1	Destinado para tener
OBSERVACIONES:				funcionamiento con el
				fluido electrico
				NOTA: no cuentan con
				combustible.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la subida y soldadura de las correas del cortado norte de la estructura. Las lluvias no permitieron un buen avance en las actividades propuestas. Adicionalmente el personal realiza trabajos en alturas sin los permisos por parte del profesional JST del consorcio claridad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ.	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	---------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 20

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

21-06-24

XXXXXXXXXX

COLEGIO Jaime Garzon- Sede Raizal

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N.A		se hace la observación de agregar anticorrosivo y pintura a la estructura antes de ser soldada y subida a los muros.
Inspector	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22 hrs.		soldadura		soldadura
LLUVIA SUAVE	2 hrs.		pulidora	1	corte y pulido
LLUVIA FUERTE			Generador Energia	1	para eventualidad con el flujo electrico
OBSERVACIONES:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se realiza encerramiento de acopio de material de rio y RCDs, de igual manera se realiza desvío de la entrada y salida al polideportivo. Por otra parte se realizo el retiro de estructura, Hierro, Flejes del polideportivo. Por otra parte se continuo con la soldadura de empujados y correas de la estructura de la cubierta.					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTT TOLOZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



FECHA

22-06-24)

SLANDER

INTERVENIENDO AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Jaime Farfán - Sede Kaita

Powered by CamScanner

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 22	FECHA 23-06-24 <small>CUARABAMA</small>
	<small>INTERVENIENDO AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1</small>	

COLEGIO Jaime Garzon-vede Parzai

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ingeniero Apoyo	1	0	N-A		
Inspector	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21 hrs.	Equipo soldadura	1	Soldadura
LLUVIA SUAVE	3 hrs	pulidora	1	Pulido y corte
LLUVIA FUERTE		Generador Energia	1	Para eventualidades con el fluido electrico- no tiene combustible
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

la jornada inicio sobre las 09:00 am, se realizaron actividades de resoldamiento de la estructura en empachados, vigas, correas y platinas. Adicionalmente se organizo parte del material que estaba apropiado en el polideportivo

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOCRA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 23

FECHA

24-06-24

DOMINICANA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO Jaime Garzon-Sede Raiza

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	7	0			
Inspector	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22 hrs.	Equipo soldadura	1	soldaduras.
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	Generador energia	1	Para eventualidad
LLUVIA FUERTE				des con el fluido
OBSERVACIONES:				electrico.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de reforzar las soldaduras y cordones que se aplicaron sobre la estructura. Este resoldamiento se hace una vez se tengan fijos todos los elementos de la estructura.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTT TOLOZA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 25	FECHA 26-06-24 <small>DOMINGO</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Rariza

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo	1	0	N.A.		Ingresar vehiculo con lamina y maquina para fabricar teja 622-732. Ingresar vehiculo con material de Rio ATB925
Inspector	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	17 hrs.	Taladro	1	Perforaciones
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	Pulidora.	1	corte y pulido
LLUVIA FUERTE	5 hrs.	maquina de	1	figurado de
OBSERVACIONES:		Figurado Teja.		laminas.
		Equipo soldadura.	1	cordones y soldadura.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza actividades de resoldado de punto de soldadura en la estructura de cubierta. De igual manera se realiza la pintura de la estructura ya con su respectiva resoldada. Ademas se realizo la toma de medidas y corte para los soportes de las canales.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TAOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No 26	FECHA 27-06-24. <small>DOMINGO</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Barton - Sede Parícuti

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contralista	Interventoría			
Ing Apolo	1	0			se realizan pruebas de tintas obteniendo como resultado 4 con porosidad y una en buen estado de sellado
Inspector	0	1			
ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	23 hrs.	Pulidora	1	cortes y pulido
LLUVIA SUAVE	1 hrs	equipo soldadura	1	soldadura.
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de instalacion de soportes de canales y resoldado de la estructura. Como la prueba de tintas salio mal se realizaron las respectivas observaciones y se empezo a corregir una por una.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLosa ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 27

FECHA

28-06-24.
DOMINGO

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Raital

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoy.	1	0			
Inspector.	0	1			
ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19 hrs.	polidora.	1	cortes y pulido
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Equipo Soldadura	1	soldadura
LLUVIA FUERTE	2 hró.	Generador de Energia.	1	para contingencias.
OBSERVACIONES:				en caso de no tener fluido electrico en la zona
se presento lluvias en la mayoria de la jornada laboral.				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de lijado y resoldado de estructura. Esta actividad se realiza por observacion de interventoria ya que no salieron bien las pruebas de tintas en la estructura. Adicionalmente se realiza la aplicacion de anticorrosivo y pintura a soportes de canales.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTT TOLOLA ORTIZ.</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	---------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 28	FECHA 29-06-24 <small>COMBAMMA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO Jaime Garzon - Sede Raital.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Apoyo.	1	0			Se realiza la observación al contratista de no realizar instalación de cubierta hasta que no se tenga la aprobación de soldadura con la prueba.
Inspector.	0	1			
Ornamentadores	2	0			
	0	0			
	0	6			
	0	6			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	7	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24 hrs.	Pulidora.	1	cortes y pulido
LLUVIA SUAVE		equipo soldadura	1	soldadura.
LLUVIA FUERTE		Generador de energía.	1	para contingencias.
OBSERVACIONES:				con el fluido eléctrico.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de corrección de soldaduras, y resoldado en las partes donde hicieron falta, por otra parte se continuo con el corte, emsamble y soldado de los soportes para conales.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOBA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 7

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

6-06-2024
COMUNAAAACOLEGIO Sede Tunal Alto

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		Se reporto la llegada de un camión con materiales el día 5-06-2024 10:24 PM
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Soldador	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Compresor	1	Pintura 3 en 1
LLUVIA SUAVE	4	Equipo Soldador	1	Salon provisional
LLUVIA FUERTE		Camión	1	5-06-2024
OBSERVACIONES:				estructura metálica
se presentaron lluvias durante la mañana				y teja ventana
				Puerta salón provisional
				nal

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza soldadura de estructura salón provisional
 instalación de puerta salón provisional, se realiza
 pintura 3 en 1 en estructura salón provisional
 se realiza instalación de teja salón provisional

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOS AORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 9

FECHA

8-06-2024
COMBIMAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO SEDE TUNAL ALTO

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Director obra	1	0	N/A		Ingreso Chelman y David
Residente	1	0			
Inspector	1	1			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
Electrico	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camion	1	Estuco, Pintura
LLUVIA SUAVE				Lampuras led
LLUVIA FUERTE				Accesorios, Super board
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo instalacion de ventanasi, instalacion de Super board, Aplicada de estuco, instalacion de cinta malla instalacion de luminarias y Aparatos, instalacion de cableado salda provisional, se realizo de cargue de Materiales camion, Super board, luminarias, estuco, pintura accesorios electricos

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTIOLOSAORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 10

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B

9-06-2024
DDMMAAAA

COLEGIO Sede Tunal Alto

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
TOTAL			TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza aplicacion de estuco y instalacion de cinta malla, instalacion de ventanas. Ajustes, se realiza ligado de estuco

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTI TOLOS PORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 11

FECHA

10-06-2024
COMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO Sede Tunal Alto

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Oficial	3	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza lijado de muros, se realiza aplicado de pintura en salón provisional interior y exterior

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTI LOSA HORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 12

FECHA

11-06-2024
DDMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Sede Tunal Alto

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Director obra	1	0	NA		Ingreso Ing Sonia Rodriguez SED. NO se realizaron Actividades en obra solo Reunión con OTIC.
Residente	1	0			
Inspector	1	1			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
			DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21		NA		
LLUVIA SUAVE	3				
LLUVIA FUERTE					
OBSERVACIONES:					
se presentaron lluvias durante el dia					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
se realiza recorrido con OTIC, Contratista, SED, coordinador de la sede, docente).					
NOTA: Se aprobaron 10 Tomas Reguladas Naranja, 1 Tablero electrico con Totalizador, canaleta doble cajas de paso, Tuberia 1", Para Puje de conexi3n de datos casaca a salon provisional.					
Personal OTIC: Oscar Zapata, Tecn3logo. Andres Galindo Tecnico Nivel 2. Miguel Sanchez, Ing electrico, Miguel Cuadros, Supervisor OTIC, Yamile Torres, coordinadora Sede, Sumapaz OTIC					
ESPACIO PARA GRAFICO					
ELABORADO POR:		LOTTI TOLOS A ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA	



FECHA

13-06-2024

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Sede Tunal Alto

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		el dia 12 no se realizaron actividades
Inspeccion	1	1			
Electrico	1	0			
Oficial	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	NA		
LLUVIA SUAVE	3			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron 3 horas de lluvias suaves durante el día				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza arreglo de luminaria led, corrección de observación sales provisional, llevada de arena y cemento para media caña

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LATTOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 14

FECHA

14-06-2024
DDMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

COLEGIO Señe Tunal AHO

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Oficial	2	0			
Soldador	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Compresor	1	Pintura 3 en 1
LLUVIA SUAVE	4	Equipo soldadura	1	Salón provisional
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron lluvias durante el día 4 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de canal, se realiza pintura 3 en 1 en canal, instalación de canal salón provisional, instalación de bajante y pintura salón provisional, sacado de niveles e instalaciones de media caña salón provisional. Aseo de obra.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTTOLO AORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------------	-------------------	--



FECHA

15-06-2074

COLEGIO sede Tunja Alto

ESPACIO PARA GRÁFICO

ELABORADO POR:

LOITTOLOSAORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 1

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B

6-06-2024

DDMMAAAA

COLEGIO Sede Erasmo Valeriano

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		el dia 1-06-2024 llega Volqueta con Arena y Gravilla 5-06-2024 llegó camión con materiales
Inspector	1	1			
SST	1	0			
Muestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	Volqueta	1	doble Trague
LLUVIA SUAVE	3			Arena, gravilla
LLUVIA FUERTE		Camion	1	Tuberia, cemento
OBSERVACIONES:				varilla 1/2 lona
se presentan lluvias durante el dia				madera, Herramienta

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza desmontaje de puente, se realiza excavación manual para madera de cerramiento, se realiza cerramiento de Area de trabajo, se realiza charla de seguridad instalación de madera cerramiento, descargue de Materiales

NOTA: el dia 21 de mayo se realiza socialización con la comunidad, docentes de la sede, Rector del colegio, contratista SED, Sonia Rodriguez, Interventoria.

el dia 24 de mayo se realiza acta de vecindad

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTULOJA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-----------------	-------------------	--



FECHA

7-06-2024

COLEGIO San Exuperio Valencia

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza instalación de cerramiento
- Se realiza armado de carpas para acopio Material
- Se realiza señalización y cerramiento de carpas
- Se realiza demolición y retiro del Parque desmontaje
- Se realiza traslado de fangos

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTTI TOLISA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 3

FECHA

8-06-2024
DDMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO I

COLEGIO Sede Granma Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Director obra	1	0	NH		
Residente	1	0			
Inspector	1	1			
Oficial	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camion	1	Material.
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalacion de cerrojos, se realiza trabajo de RCD, sacado de medidas, Niveles para zapatas, excavacion de zapata, Armado de burro para figurado de Alero, Descarga de Material camion, Acero, accesorios

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LETTOLOSA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 4

FECHA

9-06-2024
COMMAAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Inspector	1	1	NA		
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza excavacion de zapatas y demolición de bordillo, se realiza traslado de RCD, corte de Acero y Figurado. se realiza excavacion para viga

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOS AORTIZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 5

FECHA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 8

10-06-2024
COMMAAAA

COLEGIO Sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	1	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	NA		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza armado de canastas para zapatas y armado de Acero para viga, Figurado de Acero y corte, excavacion manual de zapatas y viga, trasiego de RCD

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOTT TOLOSA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 07

FECHA

12-06-24.

COMARCA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO J.C.V - Sede Erasmo Valencia.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A.		
Inspector.	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	17 hrs.	Herramienta de		
LLUVIA SUAVE	5 hrs.	mano.		
LLUVIA FUERTE	2 hrs.			
OBSERVACIONES:				
llovias durante toda la jornada laboral.				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavación manual para zapatas y vigas. De igual manera se realiza el traspiego de material RCDs. hasta el punto de acopio autorizado. De igual manera se realiza amarre de acero para cimentación y su figurado.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 08

FECHA

13-06-24.
COSANAAA

INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO J.C.V. - sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	22 hrs.	Herramienta de		
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	Mano		
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizo la excavacion manual de las ultimas 2 zapatas. Con esto se completo las 9 zapatas con medidas de .80x.80x.90. De igual manera se termino la excavacion de tanjas para vigas perimetrales e intermedias. como el terreno presenta alta cantidad de arcilla, se procede a descontaminar con relleno revuelto con cemento en una capa de .70 mts. Posterior a ello se agrego un solado de .70 cm para afirmar y eliminar humedad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	<u>LOIT TOLAZA ORTIZ</u>	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 09	FECHA 14-06-24 <small>COMMMAAA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>	

COLEGIO J.C.V - Sede Erasmo Valenciano.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente Appo	1	0	N.A.		llega material por parte del consorcio claridad SHN-362 cemento, Duroflow pegador. llega volqueta con material de Rio SXB-473
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	14 hrs.	He montenta Mano		
LLUVIA SUAVE	7 hrs.			
LLUVIA FUERTE	3 hrs			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la excavacion manual de la zanja para la tuberia de la trampa de grasa. sobre las 9:30 llega el camion con material del cual por lluvias termina su descargue a las 2 pm. Durante el resto de jornada se realizaron ajustes de medidas para corte ya que las condiciones climaticas no favorecieron la ejecucion de actividades.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR: LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA
---	--------------------------

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 10	FECHA 15-06-24 <small>COMBINAAA</small>
	<small>INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B</small>	

COLEGIO J.C.U. - sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ing Residente	1	0	N.A.		las fuertes lluvias estuvieron presentes durante toda la jornada.
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	15 hrs.	Rotomartillo	1	Demolicion de placa existente
LLUVIA SUAVE	5 hrs.			
LLUVIA FUERTE	4 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron actividades correspondientes al armado y figurado de las vigas laterales de fmo de longitud x.25 x.25 con separacion de refuerzo en fleje inicial de .10m y intermedia de .17 mts. Se figuraron y armaron 3. De igual manera se armaron las candelas para zapatas. Por otra parte se empezó con la demolicion del salon 1 en piso de madera.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



INFORME DIARIO No. 12

FECHA

17-06-24

CONCLUSIONS

INTERVENCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Y ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO B

COLEGIO J.C.V-Sede Erasmo Valencia.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Herramienta Mano.		
LLUVIA SUAVE	3 hrs			
LLUVIA FUERTE	1 hr0			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la demolición del piso tipo Madera de los salones 3, 4 y 5. Esta actividad comprendió retirar la madera existente y realizar el traslado de todo este material hasta el acopio de la parte exterior.

ESPAÇO PARA GRÁFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLGA OZTIR

INSPECTOR DE OBRA

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 13	FECHA 18-06-24 <small>COMUNICA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO J.C.U - Sede Erasmo Valencia.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	0	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Rotomartillo.	1	Demolicion de piso.
LLUVIA SUAVE	2 hrs.			
LLUVIA FUERTE	2 hrs			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la demolicion de piso tipo madera en los salones 3, 4 y 5. Esta actividad comprende el trasiego del material hasta el acopio. Por otra parte se empieza a demoler el piso del pasillo que conduce hacia las escaleras del Baño. Esta actividad tambien contempla el trasiego del material hasta el punto de acopio.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ.	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	---------------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 14	FECHA 19-06-24 <small>CONVIVIA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO J.C.V - Sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N/A		se evidencio que los postes tales que soportan la estructura de la cubierta estan soporte dos sobre el piso que se esta demoliendo
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	17 hrs.	Roto martillo.	1	Demolicion de
LLUVIA SUAVE	3 hrs	Herramienta		PISO existente.
LLUVIA FUERTE	4 hrs	de Mano		
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se continua con la demolicion y excavacion de del piso existente dejando una medida de .10 mts por debajo del piso existente para la capa de recebo. Por otra parte se inicia a realizar el pegue del piso Durapiso en el salon N° 1.

ELABORADO POR: LOTT TOLOZA ORTIZ		INSPECTOR DE OBRA
--	--	--------------------------

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 15	FECHA 20-06-24 <small>CLABAAAA</small>
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROPIETARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO J.C.U. sede Erasmio Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A.		se hace la recomendación al consorcio claridad de no demoler debajo de los cables existentes para evitar movimientos de la estructura
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21 hrs	Rotomartillo		Demolicion de
LLUVIA SUAVE	3 hrs	demoledor.		Pisos existentes
LLUVIA FUERTE	—	Herramienta		
OBSERVACIONES:		mano.		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se demuele, excava y se realiza el trasiego del material tipo escombros hacia el sitio de acopio. se deja bajo registro fotografico que el piso que se demuele tiene 2 capas de baldosa, solo en salon comedor. Por otra parte se realiza la instalacion del piso durapiso en el salon 1 y 2. se realiza resane de muros exteriores salon 1 y 2 y se instalan maestros para piso de nivelacion salon 4. esta actividad se realiza ya que el contrapiso existente tiene irregularidades con su nivel y uniformidad.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTE TOLBA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 16

FECHA

21-06-24

CUMPLIDA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO J.C.U. - Sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Controlista	Interventoria			
Ingeniero Residente	1	0	N.A.		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18 hrs.	Martillo Demoledor	1	Demolicion de
LLUVIA SUAVE	3 hrs.	Herramienta		Pisos existentes
LLUVIA FUERTE	3 hrs.	de Mano		
OBSERVACIONES:				

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

se hace demolicion, excavacion y traslado del material tipo escombro hacia el sitio de acopio. se realiza la sobre placa del salon N° 4. para nivelacion de piso y posterior postura de Euro piso. Por otra parte se realiza la puesta de piso Euro piso en salon 2 y 3.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ.	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 17

FECHA

22-06-24

CUMBAYASA

INTERVENCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Y ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO J.C.U. - sede Erasmo Valencia.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Ing Residente	1	0	N.A		por concepto de interventoría se va a modificar la tubería de los bajantes de la canal, reemplazando la tubería de gres por pvc. de igual manera se trasladará hacia el centro el ciferon.
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		
ESTADO DEL CLIMA			EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	17 hrs.		Martillo Demolitor	1	Demolición de piso existente
LLUVIA SUAVE	4 hrs.				
LLUVIA FUERTE	3 hrs.		Herramienta de mano		
OBSERVACIONES					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se hace demolición, excavación y franeo del escombro hasta el oído de propio. De igual manera se realizó el pegue de baldosa Duropiso en salón 3 y 5. Adicionalmente se realizó el afine con boquilla en salón 2 y 7 en donde ya se instaló la baldosa. Por otra parte se realizó el resane con estuco en muros del salón 7.					
ESPACIO PARA GRÁFICO					
ELABORADO POR:			INSPECTOR DE OBRA		
LOTT TOLOBA ORTIZ					



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 18

FECHA

23-06-21

CLASIFICACION

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO J.C.V - Sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19 hrs	Herramienta		
LLUVIA SUAVE	5 hrs	de Mano		
LLUVIA FUERTE	—			
OBSERVACIONES				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el traspiego del relleno para agregarlo y compactarlo en el pasillo de circulación. Adicionalmente se realizo al pañete de muros externos del muro de circulación de salones 1, 2 y 3 y pasillo salones 4 y 5, pasillo circulación cocina hasta baños.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	-------------------	-------------------	--



FECHA

24-06-24.

CONCLUSIONS

COLEGIO J.C.V. - sede Erasmo Valencia

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21 hrs.	Herramienta de Mano		
LLUVIA SUAVE	—			
LLUVIA FUERTE	3 hrs			
OBSERVACIONES:				

—ACQUITTALS—

Se realiza trasiego de recebo para aplicarlo en pasillas de eapa aproximada de 0.17 m² de igual manera se compacto una parte pequeña con el cincuro. Por otra parte se realizo el -peque del piso durapiso en Scillon 4. Mas sin embargo hizo falta una parte de aprox. 5 m² ya que no se tomaron bien las medidas por parte del consorcio Claridad.

ESPECIALLY FOR THE PEOPLE OF THE WORLD

ELABORADO POR:

LOTT TOLDOZA CETHZ

INSPECTOR DE OBRA



INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 20

FECHA

25-06-24
00:00:00

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO J.C.U. sede Erasmo.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20 hrs.	Herramienta de mano		
LLUVIA SUAVE	1 hr.			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la compactación de recibo en pasillos. Adicionalmente se realiza el encofrado para fundir un dabo que no tenia soporte para la canaleta de aguas lluvias. El personal se retira a las 2 pm por falta de material.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOEA ORTIZ.	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 21	FECHA 26-06-24 <small>COMPARAA</small>
	<small>INTERVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3</small>	

COLEGIO J.C.V. -- sede Erasmo Valencia

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Ing Residente	1	0	N.A		por observación del Ing Residente de interventoría, se ordena retirar parte del material aplicado para afirmar, ya que está muy húmedo y tiene demasiada plasticidad.
Inspector	0	1			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21 hrs.	Canguro		Afirmado y compactación
LLUVIA SUAVE	3 hrs.			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza el afirmado y compactación del material tipo recebo. Esta actividad comprendió en el área de pasillos y perímetros del salón comedor. Adicionalmente se realizó la medición, corte y puesta de plástico negro para aislar la humedad de la placa. También se cortó la malla electrosoldada y se puso en el mismo sitio o área del plástico. Se recibe material del consorcio claridad transportado en el vehículo SNH-362, tipo camion. Este mismo llevado material para sede la Unión.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTI TOLOZA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	
----------------	--------------------	-------------------	--



INFORME DIARIO No. 22

FECHA

27-06-24

CONCLUSIONS

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 3

COLEGIO J. C. V sede Erasmo Valenciano.

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Iny Residente	7	0	N.A		se realiza la observación de dejar el respectivo empalme para la junta del sobre piso ya que se funde en 2 secciones.
Inspector	0	7			
Maestro	7	0			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	7	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	16 hrs.	Trompo para	1	mezcla.
LLUVIA SUAVE	2 hrs.	premezclado		
LLUVIA FUERTE	4 hrs.			
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza la instalación de mezcla en el pasillo de comedor compensar hasta pasillo baños, esto comprendio dejar una capa esparcida para continuar con la fundida. Esta capa quedo con un espesor de ≈ 10 a 12 con refuerzo de malla electrosoldada de 7 mm , sobre las 3 pm se retira el personal

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:

LOTT TOLOBA ORTIZ

INSPECTOR DE OBRA

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 188				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				lunes, 27 de mayo de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Obra civil	4		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Excavación manual en patio			TIEMPO SECO		24	
Trasiego de material de excavación			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
Finaliza trasiego total de arena de río que estaba afuera			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Excavación manual en patio		Trasiego de material de excavación		Finaliza trasiego total de arena de río que estaba afuera		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3	Se suspende actividad de fundida de canastas de pedestales porque las canastas	N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
Encargado de cuadrilla	1		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Amarre de hierro			TIEMPO SECO		21	
Encofrado de pedestales			LLUVIA SUAVE		3	
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Amarre de hierro		Encofrado de pedestales				
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		21	
N/A			LLUVIA SUAVE		3	
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudante	1	no se realizaron actividades desde 11:00 am sin residente y inspectores	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
demolición de pegacor existente para conformación de enchape en patio			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
demolición de pegacor existente para conformación de enchape en patio						
			N/A			
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Eléctricos	2					
Inspector técnico de obra	1			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Ajuste de tubería OTIC en bloque salones			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Ajuste de tubería OTIC en bloque salones						
			N/A			
			N/A			
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697		

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 189				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				martes, 28 de mayo de 2024	

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL					
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	1		N/A	N/A	N/A
Obra civil	5		N/A	N/A	N/A
Director de obra	1		N/A	N/A	N/A
Representante legal	1		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de granito pulido en salón 3°			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Demolición de andén patio			LLUVIA SUAVE		
Instalación de granito pulido en salón 8°			LLUVIA FUERTE		
N/A					
N/A					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
Instalación de granito pulido en salón 3°		Demolición de andén patio		Instalación de granito pulido en salón 8°	
					

SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
Encargado de cuadrilla	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Arreglo de refuerzo de acero según indicación de interventoría			TIEMPO SECO	21	Observaciones
Se realiza fundida de viga de cimentación futura cocina			LLUVIA SUAVE	3	
Inicio de mezclado de concreto para viga de cimentación			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Arreglo de refuerzo de acero según indicación de interventoría		Se realiza fundida de viga de cimentación futura cocina		Inicio de mezclado de concreto para viga de cimentación	
					

CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A		No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO	21	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE	3		
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		No se encuentran residente ni inspectores	N/A	N/A	N/A
Ayudantes	1			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS		4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de piedra rajón		TIEMPO SECO	24	Observaciones
Instalación de baldosa para complemento de patio		LLUVIA SUAVE		
		LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Instalación de piedra rajón	Instalación de baldosa para complemento de patio			
			N/A	
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 190				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				miércoles, 29 de mayo de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se inicia con instalación de baldosa granito en salón 9°			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Estado de salón 8°			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se inicia con instalación de baldosa granito en salón 9°		Estado de salón 8°		N/A		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
Encargado de cuadrilla	1		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se corto varilla según establecido por la SED para pedestales			TIEMPO SECO	21	Observaciones	
estado final de varillas a nivel definido			LLUVIA SUAVE	3		
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se corto varilla según establecido por la SED para pedestales		estado final de varillas a nivel definido				
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
		OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Obra civil	5	Se retira un trabajador de cubierta por no estar aprobado por parte de la interventoría 2, no se	N/A	N/A	N/A	
Técnicos de estructura	3		N/A	N/A	N/A	
Almacén y logística	1		N/A	N/A	N/A	
oficiales de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza relleno con B200 en habitación segundo bloque			TIEMPO SECO	21	Observaciones	
Se realiza compactación con (rana)			LLUVIA SUAVE	3		
Conformación de pedestales de estructura metálica			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza relleno con B200 en habitación segundo bloque		Se realiza compactación con (rana)		Conformación de pedestales de estructura metálica		

								
RURAL LAS MERCEDES								
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES			
Oficiales	2	No se encuentran residente ni inspectores						
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA					
finaliza instalación de baldosa complemento de baldosa			TIEMPO SECO	24	Observaciones			
Demolición de zanja para desagüe de cocina			LLUVIA SUAVE					
			LLUVIA FUERTE					
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697		

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 191				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				jueves, 30 de mayo de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2	Se realizo visita de personal de las cámaras de seguridad	N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Continua instalación de baldosa granito pulido en salón 8°			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza trasiego de arena de río hacia segundo piso			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Continua instalación de baldosa granito pulido en salón 8°		Se realiza trasiego de arena de río hacia segundo piso		N/A		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Nivelación de cajones de pedestales			TIEMPO SECO	21	Observaciones	
Se realiza fundida de pedestales			LLUVIA SUAVE	3		
Trasiego de material			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Nivelación de cajones de pedestales		Trasiego de material		N/A		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3	No se encuentran residente ni inspectores	N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se continua con fundida de placa pasillo segundo bloque			TIEMPO SECO	21	Observaciones	
Se realiza relleno de andén primer bloque y segundo bloque			LLUVIA SUAVE	3		
Llegada de viaje de recebo B200			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se continua con fundida de placa pasillo segundo bloque		Se realiza relleno de andén primer bloque y segundo bloque		Llegada de viaje de recebo B200		



RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2	No se encuentran residente ni inspectores			
Ayudantes	1				
N/A	N/A				
N/A	N/A				
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realizo relleno de recebo B200 e zona de ampliación de cocina			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Se realiza zanja para desagüe sala docentes			LLUVIA SUAVE		
Se realiza instalación de tubería de 4" para desagüe			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Se realizo relleno de recebo B200 e zona de ampliación de cocina		Se realiza zanja para desagüe sala docentes		Se realiza instalación de tubería de 4" para desagüe	
					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 195				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				lunes, 3 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	
N/A			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	
N/A			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		21	
N/A			LLUVIA SUAVE		3	
N/A			LLUVIA FUERTE		Observaciones	
N/A						
N/A						
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	
N/A			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

INGENIEROS S.A.S.		INFORME DIARIO No. 196				FECHA	
		INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				martes, 4 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL							
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad			
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria		
Director	0	0	Técnico en SST	1	0		
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0		
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0		
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1		
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0		
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1		
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2		
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Oficiales	2		Volqueta	1	Retiro de RCDs		
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A		
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A		
SST	1		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
Se realiza retiro de RCDs			TIEMPO SECO		24	Observaciones	
Se inicia emboquillado desde salones #9 y #8 segundo piso			LLUVIA SUAVE				
Se inicia emboquillado desde salones #4 primer piso			LLUVIA FUERTE				
N/A							
N/A							
REGISTRO FOTOGRAFICO							
Se realiza retiro de RCDs		Se inicia emboquillado desde salones #9 y #8 segundo piso		Se inicia emboquillado desde salones #4 primer piso			
							
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE				
N/A			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
CAMPAMENTO DE DOCENTES							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Oficiales	2	No se realizaron actividades	Volqueta	1	Llegada de material de arena amarilla		
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A		
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
Se realiza excavación manual de zanja para desagüe de baños docentes			TIEMPO SECO		24	Observaciones	
Se realizo fundida de placa en habitación docente #2 segundo bloque			LLUVIA SUAVE				
Avance excavación manual para desagüe de baños docentes			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
Se realiza excavación manual de zanja para desagüe de baños docentes		Se realizo fundida de placa en habitación docente #2 segundo bloque		Avance excavación manual para desagüe de baños docentes			
							
RURAL LAS MERCEDES							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A		
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A		
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				

Demolición de muros antigua cocina	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Se realiza demolición de enchape en pasillo baño	LLUVIA SUAVE		
Se realiza demolición de lavadero existente	LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Demolición de muros antigua cocina	Se realiza demolición de enchape en pasillo baño	Se realiza demolición de lavadero existente	
			
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 196				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				miércoles, 5 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se inicia instalación de baldosa granito pulido en pasillo segundo piso			24			
Se realiza emboquillado en salón #7			LLUVIA SUAVE			
Avance de instalación de baldosa en granito pulido en pasillo			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se inicia instalación de baldosa granito pulido en pasillo segundo piso		Se realiza emboquillado en salón #7		Avance de instalación de baldosa en granito pulido en pasillo		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades 2. se hace la observación que nuevamente se cayo	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO			
N/A			24			
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3	Sin inspectores técnicos	Volqueta	1	Llegada de material de arena amarilla	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
Técnicos de estructura	3		N/A	N/A	N/A	
Logística y almacén	1		N/A	N/A	N/A	
Encargado	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza instalación de pernos en pedestales faltantes			TIEMPO SECO			
Se realiza fundida de columnetas en habitaciones docentes			LLUVIA SUAVE			
se realiza anclaje de correas en estructura metálica segundo bloque			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza instalación de pernos en pedestales faltantes		Se realiza fundida de columnetas en habitaciones docentes		se realiza anclaje de correas en estructura metálica segundo bloque		
						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2	Sin inspectores técnicos de obra 2. se le hace la observación al contratista que la mampostería de muro	N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			

Continua demolición de baldosa en pasillo baño docentes	TIEMPO SECO		Observaciones
Se realizo desmonte de piso madera en zona de star	LLUVIA SUAVE	24	
Se inicia muro en mampostería en ampliación de cocina	LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Continua demolición de baldosa en pasillo baño docentes	Se realizo desmonte de piso madera en zona de star	Se inicia muro en mampostería en ampliación de cocina	
			
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 197				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				jueves, 6 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	1		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza retiro de RCDs			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Desmonte de sanitarios baños niños			LLUVIA SUAVE			
Demolición de cafetería existente en patio			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza retiro de RCDs		Desmonte de sanitarios baños niños		Demolición de cafetería existente en patio		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2	Se hace la observación que el cerramiento de material otra vez esta caído	N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza arreglo de cerramiento			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Cerramiento caído			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza arreglo de cerramiento		Cerramiento caído		N/A		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
Oficial	1	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudante	1	Sin inspectores técnicos	Volqueta	1	Llegada de material de arena amarilla	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
Encargado	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Corte de varilla para anclajes de columnetas			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Desenfofrado de columnetas			LLUVIA SUAVE			
Se realiza mampostería en muros de ventanas			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Corte de varilla para anclajes de columnetas		Desenfofrado de columnetas		Se realiza mampostería en muros de ventanas		





RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2	Sin inspectores técnicos de obra 2. los trabajadores se retiraron a las 2:00 pm de la tarde	Volqueta	1	Llegada de RCDs
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Mampostería en muro para ampliación de cocina			TIEMPO SECO		Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Mampostería en muro para ampliación de cocina					
			N/A		
ELABORADO POR:			JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 198				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				viernes, 7 de junio de 2024	

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA			ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficial	1		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Inicio de excavación manual de patio			24		
Demolición de placa en baños			Observaciones		
Se realiza emboquillado de baldosa granito en corredor			LLUVIA FUERTE		
N/A					
N/A					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Inicio de excavación manual de patio		Demolición de placa en baños		Se realiza emboquillado de baldosa granito en corredor	
					

SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
Residente	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realiza trabajos de descapote de terreno			24		
N/A			Observaciones		
N/A			LLUVIA SUAVE		
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
		N/A		N/A	

CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A		No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			24			
N/A			Observaciones			
N/A			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A		No se realizaron	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A			TIEMPO SECO	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	<i>jairo A duarte C</i> 1105671697	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 199				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				sábado, 8 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	3		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
Residente	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Demolición de tubería en baños			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Demolición de caja de inspección			LLUVIA SUAVE			
Se realiza demolición de placa en patio			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Demolición de tubería en baños		Demolición de caja de inspección		Se realiza demolición de placa en patio		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
Residente	1		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Continúa con descapote de terreno			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza levantamiento de cerramiento de material			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Continúa con descapote de terreno		Se realiza levantamiento de cerramiento de material		Continúa con descapote de terreno		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudante de contratista	1	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
Oficiales de cubierta	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Llegada de cubierta y canal			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Llegada de cubierta y canal						

	N/A	N/A
RURAL LAS MERCEDES		
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	No se realizaron actividades
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS		
4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	TIEMPO SECO	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE	
N/A	LLUVIA FUERTE	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA

jairo A duarte C
1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 200				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				domingo, 9 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 201				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				lunes, 10 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instaladores de canal	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza pintura en canal			TIEMPO SECO			Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		24	
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza pintura en canal			Se realiza pintura en canal		N/A	
						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO			Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		24	
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 202				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				martes, 11 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Demolición de pañete de baños			TIEMPO SECO	19	Observaciones	
Se realiza retiro de viaje de RCDs			LLUVIA SUAVE	5		
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A					Inicio de lluvias 1:00 pm hasta las 5:00 pm	
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza retiro de viaje de RCDs		Se realiza demolición de placa en patio				
		N/A		N/A		
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Residente des obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza trabajos de descapote de terrero			TIEMPO SECO	19	Observaciones	
Trasiego de materia de descapote			LLUVIA SUAVE	5		
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza trabajos de descapote de terrero		Trasiego de materia de descapote				
				N/A		
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		Pulidora	1	Corte de estructura	
Ayudantes	2		Equipo de soldadura	1	Soldadura de soporte de canal	
Instaladores de canal	2		N/A	N/A	N/A	
Soldador	1		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	N/A					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza compactación con (rana) en ande primer bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Aplicación de segunda mano en canal			LLUVIA SUAVE	24		
Corte de estructura metálica para soporte de canal			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza compactación con (rana) en ande primer bloque		Aplicación de segunda mano en canal		Corte de estructura metálica para soporte de canal		

								
RURAL LAS MERCEDES								
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES			
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA					
N/A			TIEMPO SECO				Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE		24			
N/A			LLUVIA FUERTE					
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL			INSPECTOR DE OBRA		jairo A duarte C 1105671697	

 INGENIEROS S.A.S.		INFORME DIARIO No. 203				FECHA	
		INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				miércoles, 12 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL							
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad			
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria		
Director	0	0	Técnico en SST	1	0		
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0		
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0		
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1		
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0		
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1		
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2		
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Ayudantes	2		Volqueta	1	Retiro de RCDs		
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A		
SST	1		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
Excavación manual en baños de niños			TIEMPO SECO		19	Observaciones	
Picado de pañete en baños niñas			LLUVIA SUAVE		5		
Se realiza retiro de viaje de RCDs			LLUVIA FUERTE				
N/A							
N/A						Inicio de lluvias 1:00 pm hasta las 5:00 pm	
REGISTRO FOTOGRAFICO							
Excavación manual en baños de niños		Picado de pañete en baños niñas		Se realiza retiro de viaje de RCDs			
							
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Oficiales	1		N/A	N/A	N/A		
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A		
Encargado	1		N/A	N/A	N/A		
Residente des obra	1		N/A	N/A	N/A		
SST	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
Jornada de orden y aseo			TIEMPO SECO		19	Observaciones	
Retiro de viaje de RCDs			LLUVIA SUAVE		5		
N/A			LLUVIA FUERTE				
						Inicio de lluvias 1:00 pm hasta las 5:00 pm	
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
Jornada de orden y aseo		Retiro de viaje de RCDs		N/A			
CAMPAMENTO DE DOCENTES							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
Oficiales	3		Pulidora	1	Corte de estructura		
Ayudantes	2		Equipo de soldadura	1	Soldadura de soporte de canal		
Soldadores	2		Taladro	1	Instalación de tapas em correas		
Inspector tecnico de obra	1		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
Se realizo fundida de baño en cocina docentes			TIEMPO SECO			Observaciones	
Instalación de tubería de 4" de desagüe de baños			LLUVIA SUAVE		24		
Mampostería en muro divisorio baño y cocina			LLUVIA FUERTE				
soldadura en soportes de la canal							
Mampostería en cuchillas laterales de primer bloque							
Instalación de tapas en correas de corte							
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
Se realizo fundida de baño en cocina docentes		Instalación de tubería de 4" de desagüe de baños		Mampostería en muro divisorio baño y cocina			

					
soldadura en soportes de la canal	Mampostería en cuchillas laterales de primer bloque	Instalación de tapas en correas de corte			
					
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A			TIEMPO SECO		Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	
				<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 204				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				jueves, 13 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	2		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Excavación de piso			24			
Picado de pañete en baños			LLUVIA SUAVE			
Retiro de viaje de RCDs			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Excavación manual piso		Picado de pañete en baños niñas		Se realiza retiro de viaje de RCDs		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Logístico	1		N/A	N/A	N/A	
Residente des obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Traslado de columnas de estructura metálica			24			
Excavación de cajas de inspección de 60 x 60			LLUVIA SUAVE			
Instalación de estructura metálica			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Traslado de columnas de estructura metálica		Excavación de cajas de inspección de 60 x 60		Instalación de estructura metálica		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	2		Pulidora	1	Corte de estructura	
Soldadores	2		Equipo de soldadura	1	Soldadura de soporte de canal	
Inspector técnico de obra	1		Taladro	1	Instalación de tapas em correas	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realizo aplicación de primera mano de pintura en soportes			24			
Instalación de cuchillas horizontales en primer bloque			LLUVIA SUAVE			
Instalación de soportes de canal primer bloque			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realizo aplicación de primera mano de pintura en soportes		Instalación de cuchillas horizontales en primer bloque		Instalación de soportes de canal primer bloque		



RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 205				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				viernes, 14 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza excavación manual en patio			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Retiro de RCDs			LLUVIA SUAVE			
Estado de los salones			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza excavación manual en patio		Retiro de RCDs		Estado de los salones		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades el personal de obra se retira a las 11:00 am	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		Pulidora	1	Corte de estructura	
Ayudantes	2		Equipo de soldadura	1	Soldadura de soporte de canal	
Soldadores	2		Taladro	1	Instalación de tapas em correas	
Estructura metálica	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de soporte detrás de primer bloque			I		Observaciones	
Instalación de malla electrosoldada en anden segundo bloque			LLUVIA SUAVE			24
Cambio de tornillería en estructura según observación de interventoría			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
Instalación de soporte detrás de primer bloque		Instalación de malla electrosoldada en anden segundo bloque		Cambio de tornillería en estructura según observación de interventoría		
						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1	No se realizaron actividades desde	N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	

Inspector técnico de obra	1	Medio día	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Mampostería en muro ampliación de cocina			TIEMPO SECO	Observaciones	
N/A			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Mampostería en muro para ampliación de cocina					
			N/A		
ELABORADO POR:			JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 206				FECHA	
	<small>INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5</small>				sábado, 15 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	3		Volqueta	1	Retiro de RCDs	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de piedra rajón en patio			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Llegada de viaje de piedra rajón			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de piedra rajón en patio		Llegada de viaje de piedra rajón		N/A		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
SST subcontratista	1		N/A	N/A	N/A	
Residente	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de recebo y compactación			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Retiro de RCDs			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de recebo y compactación		Retiro de RCDs		N/A		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		Pulidora	1	Corte de estructura	
Ayudantes	2		Equipo de soldadura	1	Soldadura de soporte de canal	
Instaladores de canal	2		Taladro	1	Instalación de tapas em correas	
Soldador	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Fundida de anden segundo bloque			TIEMPO SECO		24	Observaciones
Instalación de canal detrás de primer bloque			LLUVIA SUAVE			
Instalación de soportes detrás de segundo bloque			LLUVIA FUERTE			
Instalación de cubierta primer tramo			N/A		N/A	
Fundida de anden primer bloque			N/A		N/A	
N/A			N/A		N/A	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Fundida de anden segundo bloque		Instalación de canal detrás de primer bloque		Instalación de soportes detrás de segundo bloque		

		
Instalación de cubierta primer tramo	Fundida de andén primer bloque	
		N/A
RURAL LAS MERCEDES		
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	No se realizaron actividades
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS		
N/A		TIEMPO SECO
N/A		LLUVIA SUAVE
N/A		LLUVIA FUERTE
4. ESTADO DEL CLIMA		
	24	Observaciones
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA
		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 207				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				domingo, 16 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 208		FECHA		
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5		lunes, 17 de junio de 2024		
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL					
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A
Oficial de consorcio	1		N/A	N/A	N/A
Ayudantes del consorcio	1		N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de tubería sanitaria en baños niñas			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Instalación de piedra rajón en patio			LLUVIA SUAVE		
Retiro de RCDs			LLUVIA FUERTE		
N/A					
N/A					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
Instalación de tubería sanitaria en baños niñas		Instalación de piedra rajón en patio		Retiro de RCDs	
					
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Compactación de recebo			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Instalación de malla electrosoldada			LLUVIA SUAVE		
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Compactación de recebo		Instalación de malla electrosoldada			
				N/A	
CAMPAMENTO DE DOCENTES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Instalador de cubierta	1	Se hace observación que el trabajador no tiene los implementos de seguridad se les informa al residente de parar actividades y	N/A	N/A	N/A
Oficial de estructura	1		N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de poliestireno en cubierta			TIEMPO SECO		Observaciones
Se realizo escobado de andenes bloque 1 y 2			LLUVIA SUAVE	24	
Se realiza pintura en columnas de primer bloque			LLUVIA FUERTE		
N/A			N/A	N/A	
N/A			N/A	N/A	
N/A			N/A	N/A	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					

Instalación de poliestireno en cubierta	Se realizo escobado de andenes bloque 1 y 2	Se realiza pintura en columnas de primer bloque			
					
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A		TIEMPO SECO			Observaciones
N/A		LLUVIA SUAVE	24		
N/A		LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697	

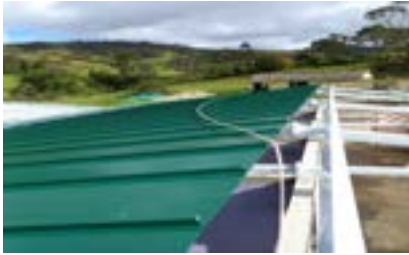
 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 209				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				martes, 18 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial de destronque	1		N/A	N/A	N/A	
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	4		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Destroqué de piso en granito segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Conformación de base en patio			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realizo traslape de malla electrosoldada			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza fundida de placa en cocina			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realizo traslape de malla electrosoldada		Se realiza fundida de placa en cocina		N/A		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instaladores de cubierta	2		N/A	N/A	N/A	
Soldador	1		N/A	N/A	N/A	
Eléctricos	3		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de soportes de canal detrás de segundo bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Instalación de caballete en primer bloque			LLUVIA SUAVE	24		
desmonte de redes eléctricas y de poste			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de soportes de canal detrás de segundo bloque		Instalación de caballete en primer bloque		desmonte de redes eléctricas y de poste		
						

RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A		TIEMPO SECO		Observaciones	
N/A		LLUVIA SUAVE			
N/A		LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 210				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				miércoles, 19 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A	
Oficial de destronque	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Continua destronque de salones segundo piso			TIEMPO SECO		24	
Extendido de recebo en patio			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
Compactación de recebo			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Continua destronque de salones segundo piso		Extendido de recebo en patio		Compactación de recebo		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza aplicación de agua para curado de placa			TIEMPO SECO		24	
Llegada de estructura metálica faltante			LLUVIA SUAVE		Observaciones	
Instalación de malla electrosoldada			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza aplicación de agua para curado de placa		Llegada de estructura metálica faltante		Instalación de malla electrosoldada		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instaladores de canal	2	Sin inspector técnico de obra	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de canal detrás de segundo bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Trasiego teja hacia cubierta			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A			
N/A			N/A			
N/A			N/A			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de canal detrás de segundo bloque		Trasiego teja hacia cubierta				

		N/A			
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Sin inspector técnico de obra	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
Ingeniero de subcontratista	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realiza orden y aseo en obra			TIEMPO SECO		Observaciones
Trasiego y acopio de RCDs			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Se realiza orden y aseo en obra		Trasiego y acopio de RCDs			
		N/A			
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697		

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 211				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				jueves, 20 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		Volqueta	1	Llegada de medio viaje de recebo	
Ayudantes	4		Pulidora	1	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de malla electrosoldada en patio			TIEMPO SECO	20	Observaciones	
Instalación de malla electrosoldada en baños			LLUVIA SUAVE	4		
Destronque de baldosa en segundo piso			LLUVIA FUERTE			
N/A					Inicio de lluvias 2:00 pm hasta 5:00 pm	
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Instalación de malla electrosoldada en patio		Instalación de malla electrosoldada en baños		Destronque de baldosa en segundo piso		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1		N/A	N/A	N/A	
Encargado	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Estado actual de placa y estructura metálica			TIEMPO SECO	20	Observaciones	
Se realizo excavación para caja de inspección			LLUVIA SUAVE	4		
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Estado actual de placa y estructura metálica		Se realizo excavación para caja de inspección		N/A		
						
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instaladores de canal	2	Sin inspector técnico de obra	N/A	N/A	N/A	
Instaladores de canal	2		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
continua instalación de cubierta en segundo bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Avance de instalación de cubierta segundo bloque			LLUVIA SUAVE	24		
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
continua instalación de cubierta en segundo bloque		Avance de instalación de cubierta segundo bloque				

				N/A	
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Sin inspector técnico de obra	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
Ingeniero de subcontratista	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Nivelación de recebo para andén detrás de patio			TIEMPO SECO		Observaciones
continua instalación de cubierta en segundo bloque			LLUVIA SUAVE	24	
Mampostería en ampliación de cocina			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Nivelación de recebo para andén detrás de patio		continua instalación de cubierta en segundo bloque		Mampostería en ampliación de cocina	
					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	
				<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 212				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				viernes, 21 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		Mixer	4	Llegada de concreto para patio	
Ayudantes	4		Maquina de helicóptero	1	Quemado de placa	
Residente de obra	1		Bomba de concreto	1	bombeo de concreto de mixer	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Llegada de bomba y primera mixer			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Inicio de fundida de patio			LLUVIA SUAVE			
Inicio de quemado de placa con (helicóptero)			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Llegada de bomba y primera mixer		Inicio de fundida de patio		Inicio de quemado de placa con (helicóptero)		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
encargado	2		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de estructura metálica faltante			TIEMPO SECO	20	Observaciones	
Llegada de estructura metálica y lamina de metal deck			LLUVIA SUAVE	4		
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de estructura metálica faltante		Llegada de estructura metálica y lamina de metal deck				
				N/A		
CAMPAMENTO DE DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instaladores de canal	2	Sin inspector técnico de obra	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación poliestireno			TIEMPO SECO		Observaciones	
Avance instalación de segunda capa de cubierta			LLUVIA SUAVE	24		
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación poliestireno		Avance instalación de segunda capa de cubierta				

				N/A	
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Sin inspector técnico de obra	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
Ingeniero de subcontratista	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Inicio de demolición para puerta en habitación docentes			TIEMPO SECO		Observaciones
Cubrimiento de concreto de entrada existente a baño			LLUVIA SUAVE	24	
cubrimiento de concreto de ventana de baño existente			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Inicio de demolición para puerta en habitación docentes		Cubrimiento de concreto de entrada existente a baño		cubrimiento de concreto de ventana de baño existente	
					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA <i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697	

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 212		FECHA		
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5		sábado, 22 de junio de 2024		
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL					
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficial	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	3		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Excavación manual de carcamos en patio			TIEMPO SECO	24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		
N/A			LLUVIA FUERTE		
N/A					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
encargado	2		N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de estructura metálica			TIEMPO SECO	20	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE	4	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRAFICO					
Instalación de estructura metálica		Instalación de estructura metálica		Instalación de estructura metálica	
					
CAMPAMENTO DOCENTES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
N/A	N/A	No se realizaron actividades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A			TIEMPO SECO		Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
N/A			N/A	N/A	
N/A			N/A	N/A	
N/A			N/A	N/A	
5. REGISTRO FOTOGRAFICO					
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A
Ingeniero de subcontratista	1		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Relleno de concreto en columnas en ampliación de cocina			TIEMPO SECO		Observaciones
Demolición de escalones faltantes entrada a cancha			LLUVIA SUAVE	24	
Mampostería en muro divisorio en ampliación de cocina			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRAFICO					
Relleno de concreto en columnas en ampliación de cocina		Demolición de escalones faltantes entrada a cancha		Mampostería en muro divisorio en ampliación de cocina	



ELABORADO POR:

JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL

INSPECTOR DE OBRA

Jairo A. Duarte C
1105671697

INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 212

REINVENTORA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ASOCIACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Y ASO COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PRESENTAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 1

FECHA

domingo, 23 de junio de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
Asesor SST	0	0	Asesor	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo Ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2

COLEGIO DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE C

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS					
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES			
Oficinas de planta de piso	0		Pulidora de piso	1	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA					
Pulido de pisos en segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones			
Pulido de piso granito paño segundo piso			LLUVIA SUAVE					
N/A			LLUVIA FUERTE					
N/A								
REGISTRO FOTOGRAFICO								
Pulido de pisos en segundo piso		Pulido de piso granito paño segundo piso		N/A				
								

SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
N/A			TIEMPO SECO	24	Observaciones		
N/A			LLUVIA SUAVE				
N/A			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
N/A			TIEMPO SECO	24	Observaciones		
N/A			LLUVIA SUAVE				
N/A			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
		No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
			TIEMPO SECO	24	Observaciones		
			LLUVIA SUAVE				
			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS				
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES		
		No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
			N/A	N/A	N/A		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA				
			TIEMPO SECO	24	Observaciones		
			LLUVIA SUAVE				
			LLUVIA FUERTE				
5. REGISTRO FOTOGRAFICO							

ELABORADO POR:

JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL

INSPECTOR DE OBRA

Jairo A. Duarte C
1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 213				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				lunes, 24 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
Oficial de destronque	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Pulida de granito en aulas segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Instalación de tubería hidráulica en baños			LLUVIA SUAVE			
Se realiza pañete en muro de los baños			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Pulida de granito en aulas segundo piso		Instalación de tubería hidráulica en baños		Se realiza pañete en muro de los baños		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Soldador	1		N/A	N/A	N/A	
Encargado	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de lamina metaldeck			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Instalación de soportes para lamina metaldeck			LLUVIA SUAVE			
Instalación de pase para redes y malla electrosoldada			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de lamina metaldeck		Instalación de soportes para lamina metaldeck		Instalación de pase para redes y malla electrosoldada		
						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Oficial de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudante de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Inicio de fundida de sobre placa en habitaciones primer bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Instalación de poliestireno y segundo capa de cubierta			LLUVIA SUAVE	24		
Fundida de baño primer bloque			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Inicio de fundida de sobre placa en habitaciones primer bloque		Instalación de poliestireno y segundo capa de cubierta		Fundida de baño primer bloque		



RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficial	1		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Demolición de piso en baño docentes			TIEMPO SECO		Observaciones
Mampostería y pañete en puerta antiguo baño			LLUVIA SUAVE	24	
Se realiza filos en puertas acceso a habitación docentes			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Demolición de piso en baño docentes		Mampostería y pañete en puerta antiguo baño		Se realiza filos en puertas acceso a habitación docentes	
					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 214				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				martes, 25 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A	
Oficial de destronque	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza pulida de pasillo segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza pañete en baño			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza pulida de pasillo segundo piso		Se realiza pañete en baño		N/A		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza fundida de placa sobre lamina metaldeck			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Instalación de malla electrosoldada sobre lamina metaldeck			LLUVIA SUAVE			
Avance de fundida de placa sobre lamina metaldeck			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza fundida de placa sobre lamina metaldeck		Instalación de malla electrosoldada sobre lamina metaldeck		Avance de fundida de placa sobre lamina metaldeck		
						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Oficial de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudante de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de caballete segundo bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Se realiza pañete en ampliación de ventanas			LLUVIA SUAVE	24		
Llegada de pozo séptico y trampa de grasas			LLUVIA FUERTE			
Finaliza instalación de cubierta y caballete en segundo bloque			N/A	N/A		
Se realiza afinado de viga de amarres y columnetas			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de caballete segundo bloque		Se realiza pañete en ampliación de ventanas		Llegada de pozo séptico y trampa de grasas		

																																			
Finaliza instalación de cubierta y caballete en segundo bloque	Se realiza afinado de viga de amarres y columnetas																																		
		N/A																																	
RURAL LAS MERCEDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA</th> <th colspan="3">2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>OBSERVACIONES</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>ACTIVIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oficial</td> <td>2</td> <td rowspan="4"></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Ayudantes</td> <td>2</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Inspector técnico de obra</td> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>			1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	Oficial	2		N/A	N/A	N/A	Ayudantes	2	N/A	N/A	N/A	Inspector técnico de obra	1	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS																																
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES																														
Oficial	2		N/A	N/A	N/A																														
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A																														
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A																														
			N/A	N/A	N/A																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">3. ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th colspan="2">4. ESTADO DEL CLIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se realiza encofrado de viga de amarre en ampliación de cocina</td> <td>TIEMPO SECO</td> <td rowspan="3">24</td> <td rowspan="3">Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Se realiza muro de contención en escalera entrada a cancha</td> <td>LLUVIA SUAVE</td> </tr> <tr> <td>Se realiza pañete en muro de contención de escaleras</td> <td>LLUVIA FUERTE</td> </tr> </tbody> </table>			3. ACTIVIDADES REALIZADAS		4. ESTADO DEL CLIMA		Se realiza encofrado de viga de amarre en ampliación de cocina	TIEMPO SECO	24	Observaciones	Se realiza muro de contención en escalera entrada a cancha	LLUVIA SUAVE	Se realiza pañete en muro de contención de escaleras	LLUVIA FUERTE																					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS		4. ESTADO DEL CLIMA																																	
Se realiza encofrado de viga de amarre en ampliación de cocina	TIEMPO SECO	24	Observaciones																																
Se realiza muro de contención en escalera entrada a cancha	LLUVIA SUAVE																																		
Se realiza pañete en muro de contención de escaleras	LLUVIA FUERTE																																		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																			
Se realiza encofrado de viga de amarre en ampliación de cocina	Se realiza muro de contención en escalera entrada a cancha	Se realiza pañete en muro de contención de escaleras																																	
																																			
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697																																

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 215				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				miércoles, 26 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudante	2		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
			N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
SE realiza demolición de escalera acceso a segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Llegada de escalera metálica			LLUVIA FUERTE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
SE realiza demolición de escalera acceso a segundo piso			Llegada de escalera metálica		N/A	
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
SST	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Culminación de fundida de placa sobre lamina metaldeck			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza afinado de placa			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Culminación de fundida de placa sobre lamina metaldeck			Se realiza afinado de placa		N/A	
						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Raspado de pintura en muros habitaciones segundo bloque			TIEMPO SECO		Observaciones	
Se realiza filos de columnetas en puertas			LLUVIA SUAVE	24		
Se realiza afinado de fachada exterior			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de caballete segundo bloque			Se realiza pañete en ampliación de ventanas		Se realiza afinado de fachada exterior	

								
RURAL LAS MERCEDES								
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES			
Oficial	2		N/A	N/A	N/A			
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A			
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A			
			N/A	N/A	N/A			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA					
Pañete en muro exterior ampliación de cocina			TIEMPO SECO			Observaciones		
Se realizo instalación de malla electrosoldada en escalera			LLUVIA SUAVE			24		
N/A			LLUVIA FUERTE					
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
Pañete en muro exterior ampliación de cocina			Se realizo instalación de malla electrosoldada en escalera			N/A		
								
ELABORADO POR:			JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL			INSPECTOR DE OBRA <i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697		

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 216				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				jueves, 27 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Gerente de operaciones	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Soldador	1		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes de obra civil	1		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Continua demolición de escalera acceso a segundo piso			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Armado de escalera metálica			LLUVIA FUERTE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Continua demolición de escalera acceso a segundo piso			Armado de escalera metálica		N/A	
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Supervisión técnica	3		N/A	N/A	N/A	
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza curado de concreto de placa de cocina			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Inicio de soportes para parales de cubierta			LLUVIA SUAVE			
			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza curado de concreto de placa de cocina			Inicio de soportes para parales de cubierta		N/A	
						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Mampostería de muro en baño docentes			TIEMPO SECO		Observaciones	
Se realiza pañete en segundo baño			LLUVIA SUAVE	24		
Instalación de tubería MT y cajas raswell			LLUVIA FUERTE			
Raspado de muro en habitaciones segundo bloque			N/A	N/A		
Continua filos en puertas habitaciones docentes			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Mampostería de muro en baño docentes			Se realiza pañete en segundo baño		Instalación de tubería mt y cajas raswell	

																																																																																	
Raspado de muro en habitaciones segundo bloque	Continúa filos en puertas habitaciones docentes																																																																																
		N/A																																																																															
<div style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center; padding: 2px;">RURAL LAS MERCEDES</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #D9E1F2;">1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA</th> <th colspan="3" style="background-color: #D9E1F2;">2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #D9E1F2;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">CANTIDAD</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">OBSERVACIONES</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">CANTIDAD</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">ACTIVIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oficial</td> <td>2</td> <td rowspan="4"></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Ayudantes</td> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Inspector técnico de obra</td> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #D9E1F2;">3. ACTIVIDADES REALIZADAS</td> <td colspan="3" style="background-color: #D9E1F2;">4. ESTADO DEL CLIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina</td> <td colspan="2">TIEMPO SECO</td> <td rowspan="3">Observaciones</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Se realiza fundida de escalera hacia cancha</td> <td colspan="2">LLUVIA SUAVE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Se realiza descargue de material</td> <td colspan="2">LLUVIA FUERTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #D9E1F2;">5. REGISTRO FOTOGRÁFICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina</td> <td colspan="2">Se realiza fundida de escalera hacia cancha</td> <td colspan="2">Se realiza descargue de material</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ELABORADO POR:</td> <td colspan="2">JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL</td> <td>INSPECTOR DE OBRA</td> <td> <i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697 </td> </tr> </tbody></table>			1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	Oficial	2		N/A	N/A	N/A	Ayudantes	1	N/A	N/A	N/A	Inspector técnico de obra	1	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina			TIEMPO SECO		Observaciones	Se realiza fundida de escalera hacia cancha			LLUVIA SUAVE		Se realiza descargue de material			LLUVIA FUERTE		5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina		Se realiza fundida de escalera hacia cancha		Se realiza descargue de material								ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS																																																																														
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES																																																																												
Oficial	2		N/A	N/A	N/A																																																																												
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A																																																																												
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A																																																																												
			N/A	N/A	N/A																																																																												
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA																																																																														
Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina			TIEMPO SECO		Observaciones																																																																												
Se realiza fundida de escalera hacia cancha			LLUVIA SUAVE																																																																														
Se realiza descargue de material			LLUVIA FUERTE																																																																														
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																	
Se realiza pañete en muro interior de ampliación de cocina		Se realiza fundida de escalera hacia cancha		Se realiza descargue de material																																																																													
																																																																																	
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697																																																																												

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 217	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	viernes, 28 de junio de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL					
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Instaladores de escaleras	3		N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Adecuación de escalera			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Se realiza instalación de baranda en escaleras			LLUVIA FUERTE		
Descargue de baldosa			LLUVIA FUERTE		
N/A					
N/A					

REGISTRO FOTOGRAFICO		
Adecuación de escalera	Se realiza instalación de baranda en escaleras	Descargue de baldosa
		

SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A			TIEMPO SECO	24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		
N/A			LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
CAMPAMENTO DOCENTES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	4		N/A	N/A	N/A
Instalador de cubierta	1		N/A	N/A	N/A
Eléctricos	3		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Pañete en cocina docentes			TIEMPO SECO		Observaciones
Continua raspado de pintura en habitaciones docentes			LLUVIA SUAVE	24	
Continua instalación de tubería MT en segundo bloque			LLUVIA FUERTE		
Se realiza instalación de tapa en canales primer bloque y segundo bloque			N/A	N/A	
Se realiza aplicación de impermeabilizante en habitaciones docentes			N/A	N/A	
Se realiza aplicación de primera de pintura en habitaciones y pasillo			N/A	N/A	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Pañete en cocina docentes		Continua raspado de pintura en habitaciones docentes		Continua instalación de tubería MT en segundo bloque	



Se realiza instalación de tapa en canales primer bloque y segundo bloque



Se realiza aplicación de impermeabilizante en habitaciones docentes



Se realiza aplicación de primera de pintura en habitaciones y pasillo



RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudante	2		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realiza elevación de cuchillas en ampliación de cocina			TIEMPO SECO		Observaciones
Se realiza filos de ventana ampliación de cocina			LLUVIA SUAVE	24	
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Se realiza elevación de cuchillas en ampliación de cocina		Se realiza filos de ventana ampliación de cocina		N/A	
					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 218				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				sábado, 29 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Oficial	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
Oficial de pintura	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza instalación de enchape en baños			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se realiza pintura en barandas de las escalera			LLUVIA FUERTE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
Se realiza instalación de enchape en baños		Se realiza pintura en barandas de las escalera		N/A		
						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Instalador de cubierta	1		N/A	N/A	N/A	
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A	
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Instalación de cubierta en futura cocina			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Avance de instalación de cubierta futura cocina			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Instalación de cubierta en futura cocina		Avance de instalación de cubierta futura cocina		N/A		
						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
Oficiales	1	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
Ayudantes	2		N/A	N/A	N/A	
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
Se realiza afinado de pañete en cocina docentes			TIEMPO SECO	24	Observaciones	
Se continua con instalación de tubería MT y cajas Raswell en segundo bloque			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
N/A			N/A	N/A		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Se realiza afinado de pañete en cocina docentes		Se continua con instalación de tubería MT y cajas raswell en segundo bloq				

		N/A			
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	1		N/A	N/A	N/A
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realiza pañete en columnetas en muro divisorio			TIEMPO SECO		Observaciones
Estado de escalera entrada a cancha			LLUVIA SUAVE	24	
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Se realiza pañete en columnetas en muro divisorio		Estado de escalera entrada a cancha			
		N/A			
ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697		

 INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 219				FECHA	
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5				domingo, 30 de junio de 2024	
PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL						
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad		
	Contratista	Interventoria		Contratista	Interventoria	
Director	0	0	Técnico en SST	1	0	
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0	
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0	
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1	
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0	
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	2	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO		24	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE			
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CAMPAMENTO DOCENTES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO			Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		24	
N/A			LLUVIA FUERTE			
N/A			N/A		N/A	
N/A			N/A		N/A	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
RURAL LAS MERCEDES						
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES	
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA			
N/A			TIEMPO SECO			Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		24	
N/A			LLUVIA FUERTE			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA		<i>Jairo A. Duarte C</i> 1105671697

L. Matriz de riesgos

MATRIZ 2 - RIESGOS
CONCURSO DE MERITOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Código CCE-EICP-FM-118 Versión No.1
MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

INTERVENTORÍA														FECHA ELABORACIÓN		1/11/2016					
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS														FECHA ACTUALIZACIÓN		31/03/2021					
MATRIZ DE RIESGOS DE INTERVENTORÍA														QUIEN ACTUALIZÓ:							
No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (ESP-OF-RA-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES / POLITICOS	SE PRESENTAN ACCIONES JUDICIALES O DE OPOSICIÓN AL PROYECTO, QUE IMPIDEN EL INICIO O DETERMINAN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. GRUPOS DE INTERÉS ACUDEN ANTE LA AUTORIDAD O JUEZ DEL CASO QUIEN PROFIERE UNA ORDEN CONTRA LOS INTERESES DE LAS INTERVENCIÓNES, O LA COMUNIDAD REALIZA ACCIONES DE HECHO, A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS CONTRATISTAS, OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y ACCIONES QUE CORRESPONDEN.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS PARA CREAR PLANES DE CONTINGENCIA. PREVIO ANÁLISIS E INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA FRENTE A LA EVENTUALIDAD, PLANTEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA PRESENTAR A LA SED.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	EVENTUALIDAD	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITÉS DE OBRA, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS .	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBE ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO, PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO PARA SU POSTERIOR REVISIÓN FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, DE LO CUAL SE PRESENTARÁ A LA SED LA POSIBILIDAD DE REQUERIR EL PERSONAL IDÓNEO Y ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN, Y DE ESTA FORMA REALIZARÁ EL ANÁLISIS DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	EVENTUALIDAD	LA INTERVENTORÍA VIGILARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO, POR MEDIO DE UN INFORME PARA PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN.	CUANDO OCURRA EL EVENTO
3	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA SED	4	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ VIGILAR QUE DICHS EVENTOS SE MITIGUEN, EVITEN O CORRIJAN UNA VEZ OCURRIDOS, MANTENIENDO INDEMN E A LA SED POR LAS FALENCIAS DEL SEGUIMIENTO QUE PUDIERAN HABERSE PRESENTADO EN LA AFECTACIÓN A TERCEROS.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ARREGLOS REQUERIDOS, Y SE ELABORARÁ ACTA DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS ADELANTADOS POR LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O LA SED ENTRE OTROS)	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTORIA / SED	EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN INFORME DE LAS NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN-SED PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SED PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, EN CASO QUE APLIQUE.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SED	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALIZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	EL CONTRATISTA DE OBRA IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA ACOMETA CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLOS DE LOS TRABAJOS POR ASPECTOS LEGALES, INDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PRORROGAS DEL CONTRATO, SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	EL CONTRATISTA DE OBRA ELABORARÁ EL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR.	MENSUALMENTE.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)		ETAPA (PLANIFICACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-S-P-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	GENERAL	ESPECÍFICO					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cualmo?
7	GENERAL		EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES DEBIDO A INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.	AFECTACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS	2			RIESGO ALTO	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	1. EL CONTRATISTA DE OBRA DESARROLLARÁ UN PLAN DE MEJORA QUE PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL MISMO. 2. EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 3. LA INTERVENTORIA REALIZARÁ UN INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EL TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS A PRESENTARSE. 4. DE RESULTAR INEFICACES LOS TRATAMIENTOS DE LOS NUMERALES ANTERIORES, LA ENTIDAD HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR (EN CASO DE QUE EL CONSTRUCTOR RENUNCIE O TRASLADE A UN TERCERO COMPROMISOS POR EL ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CUANDO ASÍ DIERA LUGAR AL INICIO DE UN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO).	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA/ SED	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN SED A LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRAMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.	AFECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, REITERANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA RESPUESTA. A SU VEZ, REALIZARÁ CON DILIGENCIA Y PERICIA LOS AJUSTES Y SUBSANACIONES REQUERIDAS. LA INTERVENTORIA HARÁ EL SEGUIMIENTO Y LOS REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL IMPULSO Y PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS TRÁMITES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE DEBERÁN ADELANTAR REUNIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO O LA CORRESPONDIENTE.	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES POR PARTE DE ALGUNO DE SUS COLABORADORES.	AFECCIÓN PATRIMONIAL DE LA INTERVENTORIA Y EVENTUALMENTE LLAMAMIENTO SOLIDARIO A LA SED	4	3	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA/ SED	ATENDER LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO A PROVEEDORES Y COLABORADORES REGULADAS EN EL CONTRATO, ACORDE CON LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA/ SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL O DIFICULTAD EN LA CONSECUENCIA DEL PERSONAL	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROYECTO	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL PERFIL DEL PROFESIONAL DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRE POR FUERZA MAYOR. EL INTERVENTOR ASUME COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO DE SU NEGOCIO SI EXISTE MAYOR VALOR POR CUENTA DE DAR CUMPLIMIENTO AL PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO Y OFRECIDO POR EL INTERVENTOR.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	APROBACIONES Y REQUERIMIENTOS A TRAVES DE LA SUPERVISION REALIZADA POR LA SED	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	NO SUSCRIPCIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA INTERVENTORIA	UNA VEZ VERIFICADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA- SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN	DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EVALUAR LAS SOLUCIONES JURIDICAS DEL CASO.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN N SED	DESDE EL ACTA DE ADJUDICACIÓN	EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO	NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, POSIBLE FALTA DE LIQUEZ DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHO PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO	MENSUALMENTE
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS	LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUMPLEN CON LOS AMPAROS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LEY, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER Y MODIFICAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA, LA SUPERVISIÓN DEBERÁ VIGILAR Y EXIGIR QUE EL INTERVENTOR MANTENGA ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS PREVISTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN	LA INTERVENTORIA PRESENTA A LA SED INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL EVENTO QUE SE PRESENTO MODIFICACIONES.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)		FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACION - CONTRATACION - EJECUCION)	TIPO (E-S-P-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cambio?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS		CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL ACTA DE INICIO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE INTERVENTORIA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACION MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACION/ SED/ SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO	EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCION DE CONTRATATACION, Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL		PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DEMORAS EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y EN LOS PROCESOS DE PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMATICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACION DE LA SED Y DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED. LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS DEBERÁ REPOSAR EN UNA NUBE CON EL FIN DE EVITAR PERDIDA SIGNIFICATIVA DE INFORMACIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION POR LA DEMORA, LA APROBACION DE DOCUMENTACIÓN O PERDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	MENSUALMENTE
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALIZA		EMERGENCIA SANITARIA Y/O AMBIENTAL DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL	POSIBLE INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORIA SED	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO QUE SE ESTABLEZCA POR LAS ENTIDADES COMPETENTES. EL PLAN DE ACCIÓN, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORIA SED	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN SED, REALIZA EL CONTROL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES		INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.	SANCIONES ECONÓMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CONTRATO.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA DE OBRA / CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA SED	HASTA LA LIQUIDACIÓN	LA SUPERVISIÓN REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	MENSUALMENTE.
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO		VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA SED	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ÍTEMES.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA SED	ETAPA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	MESA DE TRABAJO INTEGRADA DE OBRA E INTERVENTORIA JUNTO A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA SED (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACION DE ACCIONES NECESARIOS.	SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL / ANTE LA SOLICITUD
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS		ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL.	DAÑOS AL PERSONAL DEL PROYECTO Y A LA INFRAESTRUCTURA. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.	1	3	4	RIESGO BAJO	SED	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO; DEBERA QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIO CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA SED	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O LA SED, EN EL LUGAR DE LA OBRA.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
21	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL		HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	4	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATISTA DE	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA SED	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	SEMANALMENTE

M. Actas de
cobro

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRÁVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.

ESTABLECIMIENTO	:	USME Y SUMAPAZ
LOCALIZACION	:	LOCALIDAD 5 Y 20
VR. INICIAL	:	\$ 504.428.924,00
ANTICIPO	:	
VR. ADICIONAL	:	\$ 89.178.296,00
VR. FINAL	:	\$ 593.607.220,00

PLAZO INICIAL	:	9 meses
FECHA INICIACION	:	19 de octubre de 2023
FECHA TERMINAC.INICIAL	:	18 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	:	2 meses
TIEMPO SUSPENDIDO	:	
PLAZO TOTAL	:	11 meses
FECHA FINAL	:	18 de septiembre de 2024

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUOVO SALDO REG.
2454	12-abr-23	4332	6-sep-23	\$ 504.428.924.00	\$ 290.457.741,00	\$ 44.566.296,00	\$ 245.891.444,00
3907	15-may-24	4756	29-may-24	\$ 89.178.297,00	\$ 89.178.297,00	\$ 45.706.106,00	\$ 43.472.191,00
TOTALES				\$ 593.607.221,00	\$ 379.636.038,00	\$ 90.272.402,00	\$ 289.363.635,00

A PAGAR	\$ 90.272.402,00	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE
----------------	-------------------------	---

<u>TIPO DE REGIMEN</u>							
REGIMEN COMUN	☒	AUTORETENEDOR	☐	RESOLUCION N°	_____	ICA	☒
REGIMEN SIMPLIFICADO	☐	GRAN CONTRIBUYENTE	☐	RESOLUCION N°	_____	CODIGO	70201

BANCO DAVIVIENDA SUCURSAL CALLE 100 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☒ CTA. N° 466900067367

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS POR % DE AVANCE DE INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.	%	95,00%	\$ 423.889.852,10	\$ 402.695.359,50
2	La Entidad realizará al contratista de interventoría el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato de interventoría, el cual se hará una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría y sea suscrita la correspondiente acta de terminación	%	5,00%	\$ 423.889.852,10	\$ 21.194.492,60
3					

COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL (INC. IVA)	\$ 423.889.852,10
--	--------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS POR % DE AVANCE DE INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.	%	95,00%	\$ 74.939.744,54	\$ 71.192.757,31
2	La Entidad realizará al contratista de interventoría el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato de interventoría, el cual se hará una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría y sea suscrita la correspondiente acta de terminación	%	5,00%	\$ 74.939.744,54	\$ 3.746.987,23
3					

COSTO TOTAL CONTRATO ADICIONAL (INC. IVA)	\$ 74.939.744,54
--	-------------------------

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
9,30%	\$ 37.450.668,43	44,65%	\$ 179.807.716,92	53,95%	\$ 217.258.385,35	53,95%
	\$ 37.450.668,43		\$ 179.807.716,92		\$ 217.258.385,35	51,25%

\$	37.450.668,43	\$	179.807.716,92	\$	217.258.385,35	51,25%
----	---------------	----	----------------	----	----------------	--------

[illegible]

\$	38.408.492,57		\$	38.408.492,57	51,25%
----	---------------	--	----	---------------	--------

RESUMEN EJECUTIVO									
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		\$	498.829.596,64			\$	75.859.161,00		
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	\$	94.777.623,36			\$	14.413.240,59		
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		\$	593.607.220,00			\$	90.272.401,59		
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006						\$	0,41		
VALOR A PAGAR EN ACTA						\$	90.272.402,00		
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			289.363.635		PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
VERDADERO									
CONTRATISTA							SUPERVISOR		
NIT/ C.C	CB INGENIEROS SAS						JORGE ALBERTO MORENO ALDANA		
REP. LEGAL	860.509.943-7						79.464.447		
C.C.	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO								
	11.202.387								

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.										
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS										
ACTA PARCIAL No. 7										
CONTRATO DE OBRA No. 5305904-2023				PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 30 DE ABRIL DE 2024 HASTA 29 DE MAYO DE 2024						
CONTRATISTA : CONSORCIO CLARIDAD				OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".						
DIRECCION : Carrera 80 A No. 25C -19				ESTABLECIMIENTOS : GRUPO No. 5		PLAZO INICIAL : 8 MESES				
C.C. ó NIT : 901.745.447-4				LOCALIZACION : LOCALIDAD 5 Y 20		FECHA INICIACION : 30 DE OCTUBRE DE 2023				
TELEFONO : 6017040592 - 3134				VR. INICIAL : \$ 7.608.734.174,00		FECHA TERMINAC.INICIAL : 29 DE JUNIO DEL 2024				
INTERVENTOR : CB INGENIEROS S.A.S.				ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRAC : 2 MESES				
DIRECCION : Cll 98 # 22-64 Oficina 507				VR. ADICIONAL		TIEMPO SUSPENDIDO :				
C.C. ó NIT : 8605099437				VR. FINAL : \$ 7.608.734.174,00		PLAZO TOTAL : 10 MESES				
TELEFONO : 6017040592						FECHA FINAL : 29 DE AGOSTO DEL 2024				
INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES										
DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.			
2420	4-abr-23	4330	6-sep-23	\$ 7.608.734.174,00	\$ 4.210.072.332,00	\$ 707.721.983,00	\$ 3.502.350.349,00			
				\$ 7.608.734.174,00	\$ 4.210.072.332,00	\$ 707.721.983,00	\$ 3.502.350.349,00			
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO										
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
I	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	GL	1,00	\$ 7.099.640.395,00	\$ 7.099.640.395,00					
II	EMERGENCIAS GRUPO No. 5	GL	1,00	\$ 509.093.779,00	\$ 509.093.779,00					
1	IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA									
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$ 30.872,00				95,00	\$ 2.932.840,00	95,00 \$ 2.932.840,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$ 76.548,00				232,10	\$ 17.766.790,80	232,10 \$ 17.766.790,80
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM ± 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$ 32.665,00				206,51	\$ 6.745.649,15	206,51 \$ 6.745.649,15
1.2.57	DESMONTE Y REINSTALACION DE TABLETA (INCLUYE TRASIEGO Y BASE EN ARENA)	M2		\$ 55.855,00				51,69	\$ 2.887.144,95	51,69 \$ 2.887.144,95
1.2.62	DESMONTE DE PISO EN MADERA	M2		\$ 20.868,00				90,67	\$ 1.892.101,56	90,67 \$ 1.892.101,56
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GÓTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		\$ 42.620,00				148,50	\$ 6.329.070,00	148,50 \$ 6.329.070,00
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2		\$ 35.918,00				108,40	\$ 3.893.511,20	108,40 \$ 3.893.511,20
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		\$ 131.360,00		2,01	\$ 264.033,60		\$ 264.033,60	2,01 \$ 264.033,60
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M		\$ 8.754,00				21,10	\$ 184.709,40	21,10 \$ 184.709,40
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$ 66.628,00				34,82	\$ 2.319.986,96	34,82 \$ 2.319.986,96
2.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		\$ 199.302,00				34,82	\$ 6.939.695,64	34,82 \$ 6.939.695,64
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		\$ 140.339,00				10,80	\$ 1.515.661,20	10,80 \$ 1.515.661,20
2.3.17	CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 10 CM (INCLUYE FORMALETAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		\$ 19.318,00				26,80	\$ 517.722,40	26,80 \$ 517.722,40
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN		\$ 35.441,00				8,00	\$ 283.528,00	8,00 \$ 283.528,00
2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN		\$ 151.294,00				2,00	\$ 302.588,00	2,00 \$ 302.588,00
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		\$ 7.194,00				482,77	\$ 3.473.047,38	482,77 \$ 3.473.047,38
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$ 18.820,00				804,62	\$ 15.142.948,40	804,62 \$ 15.142.948,40
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC DE 3"	UN		\$ 75.806,00				2,00	\$ 151.612,00	2,00 \$ 151.612,00
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3"	UN		\$ 958.195,00				1,00	\$ 958.195,00	1,00 \$ 958.195,00
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		\$ 70.748,00				1,00	\$ 70.748,00	1,00 \$ 70.748,00
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		\$ 36.989,00				6,00	\$ 221.934,00	6,00 \$ 221.934,00
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$ 65.638,00				6,00	\$ 393.828,00	6,00 \$ 393.828,00
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2		\$ 122.244,00				232,10	\$ 28.372.832,40	232,10 \$ 28.372.832,40

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 707.721.983,00

SON: SETECIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

7.1.12	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M		\$	29.721,00				108,20	\$	3.215.812,20		108,20	\$	3.215.812,20	
7.1.15	PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO	M2		\$	310.757,00				90,67	\$	28.176.337,19		90,67	\$	28.176.337,19	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M		\$	17.286,00				80,32	\$	1.388.411,52		80,32	\$	1.388.411,52	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2		\$	594.960,00				116,44	\$	69.277.142,40		116,44	\$	69.277.142,40	
7.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		\$	107.023,00				232,10	\$	24.840.038,30		232,10	\$	24.840.038,30	
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		\$	147.895,00				90,07	\$	13.320.902,65		90,07	\$	13.320.902,65	
7.2.84	SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.	M2		\$	315.784,00				90,07	\$	28.442.664,88		90,07	\$	28.442.664,88	
7.2.109	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - E: 0.08 M.	M2		\$	63.965,00				90,07	\$	5.761.327,55		90,07	\$	5.761.327,55	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		\$	105.690,00		1,22	\$	128.941,80				1,22	\$	128.941,80	
13.1.14	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M		\$	49.992,00				21,10	\$	1.054.831,20		21,10	\$	1.054.831,20	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		\$	23.133,00				115,05	\$	2.661.451,65		115,05	\$	2.661.451,65	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN		\$	424.253,00				2,00	\$	848.506,00		2,00	\$	848.506,00	
16.1.59	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE UNIDAD DE ARCO Y TABLERO DE BALANCESTO. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y REFUERZO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	UN		\$	504.748,00				2,00	\$	1.009.496,00		2,00	\$	1.009.496,00	
17.1.26	TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER TERMOESTABLE CON CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	118.425,00				81,35	\$	9.633.873,75		81,35	\$	9.633.873,75	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		\$	55.397,00				24,00	\$	1.329.528,00		24,00	\$	1.329.528,00	
18.1.20	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3		\$	59.029,00				23,10	\$	1.363.569,90		23,10	\$	1.363.569,90	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00		3,00	\$	13.494,00		437,59	\$	440,59	\$	1.981.773,82	
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		\$	1.981,00				594,00	\$	1.176.714,00		594,00	\$	1.176.714,00	
2.	IED USMINIA SEDE B															
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PAALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00				21,84	\$	674.244,48		21,84	\$	674.244,48	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	46.664,00				46,21	\$	2.156.343,44		46,21	\$	2.156.343,44	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.665,00				246,29	\$	8.045.062,85		246,29	\$	8.045.062,85	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	27.496,00				65,31	\$	1.795.763,76		65,31	\$	1.795.763,76	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.568,00				47,27	\$	735.899,36		47,27	\$	735.899,36	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	9.835,00				47,27	\$	464.900,45		47,27	\$	464.900,45	
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	20.416,00				22,92	\$	467.934,72		22,92	\$	467.934,72	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00				26,64	\$	790.435,44		26,64	\$	790.435,44	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.730,00				2,59	\$	40.740,70		2,59	\$	40.740,70	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	16.844,00				17,00	\$	286.348,00		17,00	\$	286.348,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00				39,95	\$	758.730,40		39,95	\$	758.730,40	
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	118.537,00				1,00	\$	118.537,00		1,00	\$	118.537,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCAS, CORRIAS Y/O PERFILERÍA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CAÑALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2		\$	32.492,00				151,04	\$	4.907.591,68		151,04	\$	4.907.591,68	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS	UN		\$	9.784,00				38,00	\$	371.792,00		38,00	\$	371.792,00	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		\$	79.795,00				1,00	\$	79.795,00		1,00	\$	79.795,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		\$	5.669,00				22,00	\$	124.718,00		22,00	\$	124.718,00	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	12.370,00				72,28	\$	894.103,60		72,28	\$	894.103,60	
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN		\$	11.210,00				2,00	\$	22.420,00		2,00	\$	22.420,00	
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	M2		\$	116.287,00				10,30	\$	1.197.756,10		10,30	\$	1.197.756,10	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		\$	16.241,00				23,96	\$	389.134,36		23,96	\$	389.134,36	
1.4.7	TRASIEGO CARRETELLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$	27.594,00				76,23	\$	2.103.490,62		76,23	\$	2.103.490,62	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	14.166,00				48,26	\$	683.651,16		48,26	\$	683.651,16	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	78.085,00				1,68	\$	131.182,80		1,68	\$	131.182,80	

2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO <= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	50.516,00				57,01	\$	2.879.917,16	57,01	\$	2.879.917,16	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	\$	74.819,00				6,21	\$	464.625,99	6,21	\$	464.625,99	
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	886.007,00				0,09	\$	79.740,63	0,09	\$	79.740,63	
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	905.487,00				0,34	\$	307.865,58	0,34	\$	307.865,58	
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	\$	78.778,00				13,01	\$	1.024.901,78	13,01	\$	1.024.901,78	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	\$	82.769,00				4,90	\$	405.568,10	4,90	\$	405.568,10	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	\$	100.255,00				36,80	\$	3.689.384,00	36,80	\$	3.689.384,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	\$	6.524,00				148,83	\$	970.966,92	148,83	\$	970.966,92	
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	\$	7.194,00				76,55	\$	550.700,70	76,55	\$	550.700,70	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	\$	18.820,00				2.192,07	\$	41.254.757,40	2.192,07	\$	41.254.757,40	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	\$	54.318,00				26,97	\$	1.464.956,46	26,97	\$	1.464.956,46	
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M	\$	29.965,00				79,90	\$	2.394.203,50	79,90	\$	2.394.203,50	
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0,15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	\$	143.460,00				3,69	\$	529.367,40	3,69	\$	529.367,40	
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$	7.967,00				201,39	\$	1.604.474,13	201,39	\$	1.604.474,13	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	\$	33.445,00				211,98	\$	7.089.671,10	211,98	\$	7.089.671,10	
3.2.14	DOVELA EN MUROS CON CONCRETO FLUIDO 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 1/2", INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO HASTA 5M DE ALTURA	M	\$	20.787,00				5,00	\$	103.935,00	5,00	\$	103.935,00	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN	\$	68.406,00				86,00	\$	5.882.916,00	86,00	\$	5.882.916,00	
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	\$	121.037,00				9,30	\$	1.125.644,10	9,30	\$	1.125.644,10	
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	119.355,00				21,77	\$	2.598.358,35	21,77	\$	2.598.358,35	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	68.520,00				16,54	\$	1.133.320,80	16,54	\$	1.133.320,80	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	70.429,00				7,32	\$	515.540,28	7,32	\$	515.540,28	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	42.706,00				33,58	\$	1.434.067,48	33,58	\$	1.434.067,48	
4.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UN	\$	56.738,00				5,00	\$	283.690,00	5,00	\$	283.690,00	
4.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UN	\$	56.739,00				11,00	\$	624.129,00	11,00	\$	624.129,00	
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	17.584,00				17,22	\$	302.796,48	17,22	\$	302.796,48	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	12.686,00				10,24	\$	129.904,64	10,24	\$	129.904,64	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	12.855,00				20,96	\$	269.440,80	20,96	\$	269.440,80	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	\$	50.113,00				9,00	\$	451.017,00	9,00	\$	451.017,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	\$	50.113,00				10,00	\$	501.130,00	10,00	\$	501.130,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	\$	139.642,00				7,00	\$	977.494,00	7,00	\$	977.494,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	\$	78.799,00				16,00	\$	1.260.784,00	16,00	\$	1.260.784,00	
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	\$	77.380,00				5,00	\$	386.900,00	5,00	\$	386.900,00	
4.8.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	\$	971.645,00				3,00	\$	2.914.935,00	3,00	\$	2.914.935,00	
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	\$	1.185.009,00				1,00	\$	1.185.009,00	1,00	\$	1.185.009,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	\$	14.705,00				31,48	\$	462.913,40	31,48	\$	462.913,40	
4.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	\$	1.305.446,00				1,00	\$	1.305.446,00	1,00	\$	1.305.446,00	
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	\$	4.284,00				11,00	\$	47.124,00	11,00	\$	47.124,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	202.801,00				4,00	\$	811.204,00	4,00	\$	811.204,00	
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	\$	211.686,00				1,00	\$	211.686,00	1,00	\$	211.686,00	
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	199.528,00				3,00	\$	598.584,00	3,00	\$	598.584,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	203.028,00				15,00	\$	3.045.420,00	15,00	\$	3.045.420,00	
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUERTA A TIERRA	UN	\$	657.146,00				1,00	\$	657.146,00	1,00	\$	657.146,00	
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X63A 50 KA	UN	\$	383.159,00				1,00	\$	383.159,00	1,00	\$	383.159,00	

5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		\$	23.689,00				9,00	\$	213.201,00		9,00	\$	213.201,00	
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		\$	23.689,00				4,00	\$	94.756,00		4,00	\$	94.756,00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		\$	38.729,00				9,00	\$	348.561,00		9,00	\$	348.561,00	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		\$	48.227,00				37,35	\$	1.801.278,45		37,35	\$	1.801.278,45	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN	M		\$	27.656,00				29,91	\$	827.190,96		29,91	\$	827.190,96	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RANVEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	185.231,00				40,00	\$	7.409.240,00		40,00	\$	7.409.240,00	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	229.252,00				26,00	\$	5.960.552,00		26,00	\$	5.960.552,00	
5.1.85	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	225.283,00				3,00	\$	675.849,00		3,00	\$	675.849,00	
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	192.420,00				14,00	\$	2.693.880,00		14,00	\$	2.693.880,00	
5.1.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 6 + T (# 8 AWG) LIBRE HALOGENO	M		\$	82.861,00				7,44	\$	616.485,84		7,44	\$	616.485,84	
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE QUAYAS PARA PANEL LED	UN		\$	56.481,00				26,00	\$	1.468.506,00		26,00	\$	1.468.506,00	
5.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0.3X0.3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN		\$	271.175,00				1,00	\$	271.175,00		1,00	\$	271.175,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		\$	30.277,00				248,48	\$	7.523.228,96		248,48	\$	7.523.228,96	
7.1.17	RESANE DE PLACA DE ENTREPISO (BAJO PLACA SE DEBE LIMPIAR, PICAR Y RESANAR)	M2		\$	43.030,00				69,63	\$	2.996.178,90		69,63	\$	2.996.178,90	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		\$	165.341,00				27,32	\$	4.517.116,12		27,32	\$	4.517.116,12	
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M		\$	13.689,00				20,40	\$	279.255,60		20,40	\$	279.255,60	
7.2.44	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		\$	20.077,00				158,74	\$	3.187.022,98		158,74	\$	3.187.022,98	
7.2.51	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		\$	114.860,00				222,19	\$	25.520.743,40		222,19	\$	25.520.743,40	
7.2.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		\$	72.857,00				36,74	\$	2.676.766,18		36,74	\$	2.676.766,18	
7.2.95	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		\$	52.510,00				27,32	\$	1.434.573,20		27,32	\$	1.434.573,20	
7.2.101	CONSTRUCCION DE BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO PARA ACCESO A SALONES ANCHO 10 CM	M		\$	36.104,00				10,56	\$	381.258,24		10,56	\$	381.258,24	
7.2.104	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 25 X 35 HASTA UN ANCHO DE 60CM	M		\$	60.924,00				45,84	\$	2.792.756,16		45,84	\$	2.792.756,16	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		\$	105.690,00				62,13	\$	6.566.519,70		62,13	\$	6.566.519,70	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANEJA INTERIOR - EXTERIOR Y MÉRULA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	738.375,00				10,56	\$	7.797.240,00		10,56	\$	7.797.240,00	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	723.485,00				6,68	\$	4.832.879,80		6,68	\$	4.832.879,80	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		\$	670.634,00				1,93	\$	1.294.323,62		1,93	\$	1.294.323,62	
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN		\$	278.647,00				3,00	\$	835.941,00		3,00	\$	835.941,00	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SAUCIDERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		\$	1.022.481,00				6,96	\$	7.116.467,76		6,96	\$	7.116.467,76	
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOUPLE Y SIFÓN)	UN		\$	362.911,00				8,00	\$	2.903.288,00		8,00	\$	2.903.288,00	
11.1.41	GRIFERIA EXPUESTA PARA ORINAL TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2" DOCOL. O SIMILAR.	UN		\$	316.814,00				2,00	\$	633.628,00		2,00	\$	633.628,00	
11.1.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO, SISTEMA Y VALVULA PUSH PARA SANITARIO Y GRIFERIA PARA LAVAMANOS.	UN		\$	3.314.037,00				1,00	\$	3.314.037,00		1,00	\$	3.314.037,00	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		\$	1.154.718,00				22,98	\$	26.535.419,64		22,98	\$	26.535.419,64	
12.1.11	INSTALACION DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN		\$	76.722,00				8,00	\$	613.776,00		8,00	\$	613.776,00	
12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN		\$	193.980,00				1,00	\$	193.980,00		1,00	\$	193.980,00	
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE - MOVILIDAD REDUCIDA	UN		\$	655.345,00				1,00	\$	655.345,00		1,00	\$	655.345,00	
12.1.23	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M		\$	959.930,00				5,35	\$	5.135.625,50		5,35	\$	5.135.625,50	
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		\$	1.221.257,00				0,94	\$	1.147.981,58		0,94	\$	1.147.981,58	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	32.665,00				99,83	\$	3.260.946,95		99,83	\$	3.260.946,95	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	15.835,00				2,65	\$	41.962,75		2,65	\$	41.962,75	

13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	20.413,00				130,25	\$	2.658.793,25		130,25	\$	2.658.793,25	
13.2.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	19.956,00				204,61	\$	4.083.197,16		204,61	\$	4.083.197,16	
13.2.2	PINTURA VINOLO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	\$	14.139,00				458,04	\$	6.476.227,56		458,04	\$	6.476.227,56	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	22.834,00				32,46	\$	741.191,64		32,46	\$	741.191,64	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	15.595,00				354,94	\$	5.535.289,30		354,94	\$	5.535.289,30	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	13.906,00				16,54	\$	230.005,24		16,54	\$	230.005,24	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	26.338,00				15,39	\$	405.341,82		15,39	\$	405.341,82	
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	\$	177.128,00				6,18	\$	1.094.651,04		6,18	\$	1.094.651,04	
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	\$	87.205,00				10,70	\$	933.093,50		10,70	\$	933.093,50	
17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	\$	20.856,00				47,48	\$	990.242,88		47,48	\$	990.242,88	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALU/ZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	\$	226.106,00				185,93	\$	42.039.888,58		185,93	\$	42.039.888,58	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)		\$	55.397,00				31,38	\$	1.738.357,86		31,38	\$	1.738.357,86	
17.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 HASTA UN DESARROLLO DE 80CM,INCLUYE TAPAS Y SOSCOS,SOPORTE EN U Y ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA NI ESTRUCTURA	M	\$	260.357,00				19,24	\$	5.009.268,68		19,24	\$	5.009.268,68	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$	4.498,00				276,85	\$	1.245.271,30		276,85	\$	1.245.271,30	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	\$	2.041,00				4.516,00	\$	9.217.156,00		4.516,00	\$	9.217.156,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	\$	2.445,00				4.516,00	\$	11.041.620,00		4.516,00	\$	11.041.620,00	
3.	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B														
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	101.571,00				2,60	\$	264.084,60		2,60	\$	264.084,60	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	76.548,00				3,74	\$	286.289,52		3,74	\$	286.289,52	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	46.664,00				43,87	\$	2.047.149,68		43,87	\$	2.047.149,68	
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	19.843,00				345,32	\$	6.852.184,76		345,32	\$	6.852.184,76	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	32.665,00				27,12	\$	885.874,80		27,12	\$	885.874,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	27.496,00				218,94	\$	6.019.974,24		218,94	\$	6.019.974,24	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	15.568,00				24,71	\$	384.685,28		24,71	\$	384.685,28	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	9.835,00				22,42	\$	220.500,70		22,42	\$	220.500,70	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	29.671,00				8,52	\$	252.796,92		8,52	\$	252.796,92	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	15.730,00				17,83	\$	280.465,90		17,83	\$	280.465,90	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	\$	16.844,00				8,00	\$	134.752,00		8,00	\$	134.752,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	18.992,00				13,86	\$	263.229,12		13,86	\$	263.229,12	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFLERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	32.492,00				873,44	\$	28.379.812,48		873,44	\$	28.379.812,48	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	25.254,00				187,00	\$	4.722.498,00		187,00	\$	4.722.498,00	
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	17.302,00				17,22	\$	297.940,44		17,22	\$	297.940,44	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	\$	9.784,00				131,00	\$	1.281.704,00		131,00	\$	1.281.704,00	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	\$	79.795,00				2,00	\$	159.590,00		2,00	\$	159.590,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	\$	5.669,00			2,00	\$	430.844,00		76,00	\$	442.182,00		
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	18.279,00			28,00	\$	511.812,00			\$	511.812,00		
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	12.370,00				41,58	\$	514.344,60		41,58	\$	514.344,60	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	\$	13.774,00				10,77	\$	148.345,98		10,77	\$	148.345,98	
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	7.060,00				337,23	\$	2.380.843,80		337,23	\$	2.380.843,80	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	\$	27.594,00				100,08	\$	2.761.607,52		100,08	\$	2.761.607,52	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	\$	78.085,00				0,16	\$	12.493,60		0,16	\$	12.493,60	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	\$	74.819,00				0,16	\$	11.971,04		0,16	\$	11.971,04	
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	\$	78.206,00				131,20	\$	10.260.627,20		131,20	\$	10.260.627,20	

2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$	100.255,00				4.53	\$	454.155,15		4.53	\$	454.155,15	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		\$	6.524,00								382,72	\$	2.496.865,28	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$	18.820,00				9.957,04	\$	187.391.492,80		9.957,04	\$	187.391.492,80	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIBADO No 5	M2		\$	54.318,00				61,81	\$	3.357.395,58		61,81	\$	3.357.395,58	
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M		\$	29.965,00				80,07	\$	2.399.297,55		80,07	\$	2.399.297,55	
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	7.967,00				234,51	\$	1.868.341,17		234,51	\$	1.868.341,17	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		\$	33.445,00				234,51	\$	7.843.186,95		234,51	\$	7.843.186,95	
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2		\$	10.856,00				25,20	\$	273.571,20		25,20	\$	273.571,20	
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M		\$	84.051,00				19,65	\$	1.651.602,15		19,65	\$	1.651.602,15	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		\$	16.662,00				476,00	\$	7.931.112,00		476,00	\$	7.931.112,00	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	138.381,00				72,06	\$	9.971.734,86		72,06	\$	9.971.734,86	
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UN		\$	153.017,00				13,00	\$	1.989.221,00		13,00	\$	1.989.221,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00				28,24	\$	1.935.004,80		28,24	\$	1.935.004,80	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		\$	50.113,00				2,00	\$	100.226,00		2,00	\$	100.226,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		\$	50.113,00				2,00	\$	100.226,00		2,00	\$	100.226,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		\$	139.642,00				2,00	\$	279.284,00		2,00	\$	279.284,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		\$	78.799,00				4,00	\$	315.196,00		4,00	\$	315.196,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		\$	162.314,00			3,00	\$	486.942,00			5,00	\$	811.570,00	
4.11.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA CON VARILLA 3/8" CON PERNO BEAN CLAMB DE 1" A 1-1/2"	UN		\$	31.245,00				34,00	\$	1.062.330,00		34,00	\$	1.062.330,00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	152.454,00				5,00	\$	762.270,00		5,00	\$	762.270,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	202.801,00				14,00	\$	2.839.214,00		14,00	\$	2.839.214,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15A, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	203.028,00				56,00	\$	11.369.568,00		56,00	\$	11.369.568,00	
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		\$	819.936,00				2,00	\$	1.639.872,00		2,00	\$	1.639.872,00	
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3x63A 50 KA	UN		\$	383.159,00				2,00	\$	766.318,00		2,00	\$	766.318,00	
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		\$	23.689,00			1,00	\$	23.689,00			16,00	\$	379.024,00	
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA			\$	23.689,00								19,00	\$	450.091,00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		\$	38.729,00				27,00	\$	1.045.683,00		27,00	\$	1.045.683,00	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBERIDO EN MURO.	M		\$	18.809,00				11,47	\$	215.739,23		11,47	\$	215.739,23	
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		\$	38.252,00				80,66	\$	3.085.406,32		80,66	\$	3.085.406,32	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		\$	48.227,00				20,00	\$	964.540,00		20,00	\$	964.540,00	
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		\$	53.109,00				20,95	\$	1.112.633,55		20,95	\$	1.112.633,55	
5.1.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA IMC DE 1"	M		\$	71.571,00				17,24	\$	1.233.884,04		17,24	\$	1.233.884,04	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN	M		\$	27.656,00				729,38	\$	20.171.733,28		729,38	\$	20.171.733,28	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	185.231,00				93,00	\$	17.226.483,00		93,00	\$	17.226.483,00	
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	117.122,00				3,00	\$	351.366,00		3,00	\$	351.366,00	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	229.252,00				73,00	\$	16.735.396,00		73,00	\$	16.735.396,00	

5.1.85	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	225.283,00				3,00	\$	675.849,00		3,00	\$	675.849,00	
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	192.420,00				20,00	\$	3.848.400,00		20,00	\$	3.848.400,00	
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		\$	56.481,00				74,00	\$	4.179.594,00		74,00	\$	4.179.594,00	
5.1.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE, EN LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CAL.20, 20 X 10 CM, CON ESCALERILLA INTERNA, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN (RED CABLE DATOS).	M		\$	187.506,00				60,00	\$	11.250.360,00		60,00	\$	11.250.360,00	
5.1.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 6 + T (# 8 AWG) LIBRE HALOGENO	M		\$	82.861,00				44,97	\$	3.726.259,17		44,97	\$	3.726.259,17	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		\$	68.715,00				5,21	\$	358.005,15		5,21	\$	358.005,15	
7.2.51	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		\$	114.860,00				4,53	\$	520.315,80		4,53	\$	520.315,80	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		\$	105.690,00				16,72	\$	1.767.136,80		16,72	\$	1.767.136,80	
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		\$	172.229,00				35,04	\$	6.034.904,16		35,04	\$	6.034.904,16	
8.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. ANCHO MAXIMO DE MURO 0,50 M	M		\$	118.944,00				23,09	\$	2.746.416,96		23,09	\$	2.746.416,96	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMORADA CON REFUEZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	738.375,00				6,94	\$	5.124.322,50		6,94	\$	5.124.322,50	
9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMORADA CON REFUEZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	654.281,00				3,01	\$	1.969.385,81		3,01	\$	1.969.385,81	
9.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2		\$	464.130,00		20,63	\$	9.575.001,90				20,63	\$	9.575.001,90	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		\$	670.634,00				20,19	\$	13.540.100,46		20,19	\$	13.540.100,46	
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2		\$	868.303,00		3,65	\$	3.169.305,95				3,65	\$	3.169.305,95	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN		\$	620.620,00				2,00	\$	1.241.240,00		2,00	\$	1.241.240,00	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		\$	946.209,00				2,00	\$	1.892.418,00		2,00	\$	1.892.418,00	
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLÉ Y SIFÓN)	UN		\$	362.911,00		3,00	\$	1.088.733,00				3,00	\$	1.088.733,00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		\$	33.830,00				2,00	\$	67.660,00		2,00	\$	67.660,00	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	32.665,00				132,12	\$	4.315.699,80		132,12	\$	4.315.699,80	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		\$	15.130,00				301,22	\$	4.557.458,60		301,22	\$	4.557.458,60	
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	36.167,00				84,60	\$	3.059.728,20		84,60	\$	3.059.728,20	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	12.818,00				283,98	\$	3.640.055,64		283,98	\$	3.640.055,64	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00				266,46	\$	2.107.432,14		266,46	\$	2.107.432,14	
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	20.413,00				137,22	\$	2.801.071,86		137,22	\$	2.801.071,86	
13.2.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00				607,56	\$	12.124.467,36		607,56	\$	12.124.467,36	
13.2.2	PINTURA VINOLO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		\$	14.139,00				1.798,23	\$	25.425.173,97		1.798,23	\$	25.425.173,97	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	22.834,00				328,51	\$	7.501.197,34		328,51	\$	7.501.197,34	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	15.595,00				433,98	\$	6.767.918,10		433,98	\$	6.767.918,10	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	21.362,00				6,66	\$	142.270,92		6,66	\$	142.270,92	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00				20,92	\$	290.913,52		20,92	\$	290.913,52	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00				113,54	\$	1.085.101,78		113,54	\$	1.085.101,78	
13.4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	11.705,00				46,15	\$	540.185,75		46,15	\$	540.185,75	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	26.338,00				77,30	\$	2.035.927,40		77,30	\$	2.035.927,40	
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	120.012,00				4,25	\$	510.051,00		4,25	\$	510.051,00	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		\$	69.566,00				64,95	\$	4.518.311,70		64,95	\$	4.518.311,70	
14.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO 6 MM	M2		\$	85.787,00				32,38	\$	2.777.783,06		32,38	\$	2.777.783,06	
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		\$	177.128,00				0,58	\$	102.734,24		0,58	\$	102.734,24	
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m		\$	43.977,00		15,00	\$	659.655,00				15,00	\$	659.655,00	
17.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. INCLUYE ANDAMIO TIPO CANASTA, ELEMENTOS DE PROTECCION Y RESCATE	M2		\$	29.535,00				26,78	\$	790.947,30		26,78	\$	790.947,30	

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	\$	226.106,00				660,50	\$	149.343.013,00		660,50	\$	149.343.013,00			
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	\$	113.886,00				15,50	\$	1.765.233,00		15,50	\$	1.765.233,00			
17.1.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	\$	134.353,00				326,00	\$	43.799.078,00		326,00	\$	43.799.078,00			
17.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 HASTA UN DESARROLLO DE 80CM,INCLUYE TAPAS Y SOSCOS,SOPORTE EN U Y ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA NI ESTRUCTURA	M	\$	260.357,00				95,60	\$	24.890.129,20		95,60	\$	24.890.129,20			
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$	4.498,00				1.292,64	\$	5.814.294,72		1.292,64	\$	5.814.294,72			
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	\$	2.041,00				11.810,00	\$	24.104.210,00		11.810,00	\$	24.104.210,00			
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	\$	2.445,00				11.810,00	\$	28.875.450,00		11.810,00	\$	28.875.450,00			
20.1.6	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	M3	\$	5.007,00				139,01	\$	696.023,07		139,01	\$	696.023,07			
4.	IED JAIME GARZON SEDE AURAS																
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M	\$	30.872,00				115,80	\$	3.574.977,60		115,80	\$	3.574.977,60			
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	27.496,00				8,46	\$	232.616,16		8,46	\$	232.616,16			
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	20.416,00				74,10	\$	1.512.825,60		74,10	\$	1.512.825,60			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	29.671,00			17,92	\$	531.704,32			17,92	\$	531.704,32			
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCAS, CORREAS Y/O PERIFLERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	32.492,00			96,20	\$	3.125.730,40		382,72	\$	12.435.338,24		478,92	\$	15.561.068,64
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	\$	9.784,00				19,00	\$	185.896,00		19,00	\$	185.896,00			
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	\$	5.669,00				62,00	\$	351.478,00		62,00	\$	351.478,00			
1.2.64	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$	5.538,00			123,85	\$	685.881,30		245,96	\$	1.362.126,48		369,81	\$	2.048.007,78
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	\$	16.241,00				3,20	\$	51.971,20		3,20	\$	51.971,20			
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	\$	27.594,00				162,50	\$	4.484.025,00		162,50	\$	4.484.025,00			
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	14.166,00				16,92	\$	239.688,72		16,92	\$	239.688,72			
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	\$	18.820,00				11.585,43	\$	218.037.792,60		11.585,43	\$	218.037.792,60			
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M2	\$	29.965,00			5,00	\$	149.825,00			5,00	\$	149.825,00			
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN	\$	16.662,00				112,00	\$	1.866.144,00		112,00	\$	1.866.144,00			
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	202.801,00				3,00	\$	608.403,00		3,00	\$	608.403,00			
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	199.528,00				8,00	\$	1.596.224,00		8,00	\$	1.596.224,00			
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	203.028,00				32,00	\$	6.496.896,00		32,00	\$	6.496.896,00			
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	232.939,00			2,00	\$	465.878,00			2,00	\$	465.878,00			
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	\$	594.876,00				0,80	\$	475.900,80		0,80	\$	475.900,80			
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA	UN	\$	383.374,00			-1,00	\$	383.374,00		1,00	\$	383.374,00				
5.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN	\$	75.844,00				6,00	\$	455.064,00		6,00	\$	455.064,00			
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X30A 10 KA	UN	\$	80.214,00				6,00	\$	481.284,00		6,00	\$	481.284,00			
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	\$	156.667,00			1,00	\$	156.667,00			1,00	\$	156.667,00			
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	\$	38.729,00				14,00	\$	542.206,00		14,00	\$	542.206,00			
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$	48.227,00			78,00	\$	3.761.706,00		66,44	\$	3.204.201,88		144,44	\$	6.965.907,88
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T)	M	\$	17.079,00			97,10	\$	1.658.370,90		79,00	\$	1.349.241,00		176,10	\$	3.007.611,90

5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº10 (F) + 1Nº10 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN	M		\$	20.757,00		97,10	\$	2.015.504,70	79,00	\$	1.639.803,00	176,10	\$	3.655.307,70	
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3Nº6 (F) + 1Nº6 (N) + 1Nº8 (T) AWG THHN	M		\$	72.938,00		40,50	\$	2.953.989,00	9,42	\$	687.075,96	49,92	\$	3.641.064,96	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	185.231,00					57,00	\$	10.558.167,00	57,00	\$	10.558.167,00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	188.043,00					3,00	\$	564.129,00	3,00	\$	564.129,00	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	229.252,00					53,00	\$	12.150.356,00	53,00	\$	12.150.356,00	
5.1.85	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	225.283,00					3,00	\$	675.849,00	3,00	\$	675.849,00	
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	192.420,00					4,00	\$	769.680,00	4,00	\$	769.680,00	
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		\$	25.741,00					16,00	\$	411.856,00	16,00	\$	411.856,00	
5.1.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT ALUMINIO 2400 INCLUYE TAPA 10X10 Y TAPAS DE COSTADOS	UN		\$	52.241,00		10,00	\$	522.410,00	17,00	\$	888.097,00	27,00	\$	1.410.507,00	
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM. INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		\$	183.842,00		50,55	\$	9.293.213,10				50,55	\$	9.293.213,10	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	12.818,00		141,87	\$	1.818.489,66	213,46	\$	2.736.130,28	355,33	\$	4.554.619,94	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00		506,38	\$	4.004.959,42	700,24	\$	5.538.198,16	1.206,62	\$	9.543.157,58	
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	20.413,00					119,73	\$	2.444.048,49	119,73	\$	2.444.048,49	
13.1.13	PAÑETES LISOS 1:3, SOBRE MUROS EN ÁREA DE CULATAS (DE 0 A30 CM)	M		\$	14.359,00		63,85	\$	916.822,15	28,40	\$	407.795,60	92,25	\$	1.324.617,75	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00		46,57	\$	929.350,92	407,94	\$	8.140.850,64	454,51	\$	9.070.201,56	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		\$	14.139,00		195,62	\$	2.765.871,18	651,89	\$	9.217.072,71	847,51	\$	11.982.943,89	
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		\$	29.750,00		155,16	\$	4.616.010,00	12,19	\$	362.652,50	167,35	\$	4.978.662,50	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	22.834,00					199,26	\$	4.549.902,84	199,26	\$	4.549.902,84	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	15.595,00					80,38	\$	1.253.526,10	80,38	\$	1.253.526,10	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00		376,29	\$	5.232.688,74	540,90	\$	7.521.755,40	917,19	\$	12.754.444,14	
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVA LUJADA DE LA SUPERFICIE	M		\$	6.789,00					90,37	\$	613.521,93	90,37	\$	613.521,93	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00		191,16	\$	1.826.916,12	420,06	\$	4.014.513,42	611,22	\$	5.841.429,54	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LAMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		\$	69.566,00					4,40	\$	306.090,40	4,40	\$	306.090,40	
14.1.6	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M2		\$	69.074,00		20,80	\$	1.436.739,20				20,80	\$	1.436.739,20	
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PÉLCULA DE SEGURIDAD	M2		\$	97.812,00					4,56	\$	446.022,72	4,56	\$	446.022,72	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		\$	226.106,00					598,06	\$	135.224.954,36	598,06	\$	135.224.954,36	
17.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		\$	304.720,00		7,47	\$	2.276.258,40	67,20	\$	20.477.184,00	74,67	\$	22.753.442,40	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		\$	55.397,00		38,81	\$	2.149.957,57	12,73	\$	705.203,81	51,54	\$	2.855.161,38	
17.1.61	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE TAPA MURO CAL 22. DESARROLLO 61 CM PARA UNION ENTRE EDIFICIOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA ANTICORROSIVO Y ESMALTE			\$	123.033,00					13,67	\$	1.681.861,11	13,67	\$	1.681.861,11	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00		1.225,41	\$	2.121.184,71	23.897,42	\$	41.366.434,02	25.122,83	\$	43.487.618,73	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00		127,88	\$	575.204,24	468,10	\$	2.105.513,80	595,98	\$	2.680.718,04	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		\$	2.041,00					7.610,00	\$	15.532.010,00	7.610,00	\$	15.532.010,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		\$	2.445,00					7.610,00	\$	18.606.450,00	7.610,00	\$	18.606.450,00	
5.	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A															
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00					55,89	\$	1.725.436,08	55,89	\$	1.725.436,08	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	62.252,00					48,06	\$	2.991.831,12	48,06	\$	2.991.831,12	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	22.855,00					94,76	\$	2.165.739,80	94,76	\$	2.165.739,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	27.496,00					9,20	\$	252.963,20	9,20	\$	252.963,20	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00					11,99	\$	355.755,29	11,99	\$	355.755,29	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00					21,00	\$	398.832,00	21,00	\$	398.832,00	

1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFLERIA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CAÑALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.492,00				47,19	\$	1.533.297,48		47,19	\$	1.533.297,48	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	25.254,00				54,01	\$	1.363.968,54		54,01	\$	1.363.968,54	
1.2.38	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	120.790,00				2,00	\$	241.580,00		2,00	\$	241.580,00	
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	M2		\$	116.287,00		18,52	\$	2.153.635,24				18,52	\$	2.153.635,24	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	14.008,00				23,10	\$	323.584,80		23,10	\$	323.584,80	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$	27.594,00				156,70	\$	4.323.979,80		156,70	\$	4.323.979,80	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	78.085,00				30,67	\$	2.394.866,95		30,67	\$	2.394.866,95	
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	117.078,00				1,97	\$	230.643,66		1,97	\$	230.643,66	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3		\$	74.819,00				4,32	\$	323.218,08		4,32	\$	323.218,08	
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR 8-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		\$	147.970,00				4,32	\$	639.230,40		4,32	\$	639.230,40	
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		\$	140.339,00				6,11	\$	857.471,29		6,11	\$	857.471,29	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$	100.255,00				44,24	\$	4.435.281,20		44,24	\$	4.435.281,20	
2.3.2	MESÓN EN CONCRETO E = 0.10 M HASTA 0.6 M DE ANCHO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO.	M		\$	129.268,00				3,41	\$	440.803,88		3,41	\$	440.803,88	
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN		\$	35.441,00				13,00	\$	460.733,00		13,00	\$	460.733,00	
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)	M2		\$	21.297,00				44,24	\$	942.179,28		44,24	\$	942.179,28	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$	18.820,00				661,41	\$	12.447.736,20		661,41	\$	12.447.736,20	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		\$	33.445,00				9,86	\$	329.767,70		9,86	\$	329.767,70	
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		\$	16.614,00				1,50	\$	24.921,00		1,50	\$	24.921,00	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	UN		\$	16.662,00				120,00	\$	1.999.440,00		120,00	\$	1.999.440,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00				9,00	\$	616.680,00		9,00	\$	616.680,00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	42.706,00				6,00	\$	256.236,00		6,00	\$	256.236,00	
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN		\$	151.558,00				1,00	\$	151.558,00		1,00	\$	151.558,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		\$	50.113,00				2,00	\$	100.226,00		2,00	\$	100.226,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		\$	139.642,00				1,00	\$	139.642,00		1,00	\$	139.642,00	
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		\$	767.423,00				1,00	\$	767.423,00		1,00	\$	767.423,00	
4.8.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		\$	971.645,00				2,00	\$	1.943.290,00		2,00	\$	1.943.290,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		\$	14.705,00				86,39	\$	1.270.364,95		86,39	\$	1.270.364,95	
4.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN		\$	57.773,00		1,00	\$	57.773,00				1,00	\$	57.773,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		\$	30.277,00				43,20	\$	1.307.966,40		43,20	\$	1.307.966,40	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M		\$	17.286,00				26,11	\$	451.337,46		26,11	\$	451.337,46	
7.2.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M		\$	19.555,00				25,40	\$	496.697,00		25,40	\$	496.697,00	
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2		\$	114.476,00				43,20	\$	4.945.363,20		43,20	\$	4.945.363,20	
7.2.84	SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.	M2		\$	315.784,00				94,76	\$	29.923.691,84		94,76	\$	29.923.691,84	
7.2.109	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - E: 0.08 M.	M2		\$	63.965,00				94,76	\$	6.061.323,40		94,76	\$	6.061.323,40	
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANILIA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	791.567,00				4,10	\$	3.245.424,70		4,10	\$	3.245.424,70	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANILIA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		\$	869.706,00				7,72	\$	6.714.130,32		7,72	\$	6.714.130,32	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		\$	796.165,00		2,00	\$	1.592.330,00				2,00	\$	1.592.330,00	
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLÉ Y SIFÓN)			\$	362.911,00		2,00	\$	725.822,00				2,00	\$	725.822,00	
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN		\$	45.126,00				2,00	\$	90.252,00		2,00	\$	90.252,00	
12.1.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN		\$	76.722,00				1,00	\$	76.722,00		1,00	\$	76.722,00	

13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	\$	15.130,00				29,32	\$	443.611,60	29,32	\$	443.611,60	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	\$	7.909,00				247,51	\$	1.957.556,59	247,51	\$	1.957.556,59	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	19.956,00				247,51	\$	4.939.309,56	247,51	\$	4.939.309,56	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	\$	14.139,00				27,65	\$	390.943,35	27,65	\$	390.943,35	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	15.595,00		15,92	\$	248.272,40			15,92	\$	248.272,40	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	13.906,00				59,45	\$	826.711,70	59,45	\$	826.711,70	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	\$	69.566,00				140,45	\$	9.770.544,70	140,45	\$	9.770.544,70	
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	\$	156.471,00				10,75	\$	1.682.063,25	10,75	\$	1.682.063,25	
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	\$	105.198,00				8,55	\$	899.442,90	8,55	\$	899.442,90	
17.1.26	TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER TERMOESTABLE CON CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$	118.425,00				70,68	\$	8.370.279,00	70,68	\$	8.370.279,00	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M	\$	55.397,00				8,00	\$	443.176,00	8,00	\$	443.176,00	
17.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANQUE TAPA MURO CAL 22. DESARROLLO 61 CM PARA UNIÓN ENTRE EDIFICIOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M	\$	123.033,00				42,09	\$	5.178.458,97	42,09	\$	5.178.458,97	
18.1.20	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	\$	59.029,00				4,42	\$	260.908,18	4,42	\$	260.908,18	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$	4.498,00				138,98	\$	625.132,04	138,98	\$	625.132,04	
6.	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	m	\$	30.872,00				148,69	\$	4.590.357,68	148,69	\$	4.590.357,68	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	\$	298.850,00				0,10	\$	29.885,00	0,10	\$	29.885,00	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	\$	294.315,00				0,66	\$	194.247,90	0,66	\$	194.247,90	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	101.571,00				6,48	\$	658.180,08	6,48	\$	658.180,08	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	76.548,00				161,51	\$	12.363.267,48	161,51	\$	12.363.267,48	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	46.664,00				232,34	\$	10.841.913,76	232,34	\$	10.841.913,76	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	62.252,00		16,17	\$	1.006.614,84			16,17	\$	1.006.614,84	
1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	93.313,00				15,90	\$	1.483.676,70	15,90	\$	1.483.676,70	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	22.855,00				44,96	\$	1.027.560,80	44,96	\$	1.027.560,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	27.496,00				61,48	\$	1.690.454,08	61,48	\$	1.690.454,08	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	15.568,00				40,98	\$	637.976,64	40,98	\$	637.976,64	
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	18.806,00				129,99	\$	2.444.591,94	129,99	\$	2.444.591,94	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	9.835,00				167,39	\$	1.646.280,65	167,39	\$	1.646.280,65	
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	\$	15.730,00		1,00	\$	15.730,00			4,00	\$	62.920,00	
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$	20.416,00				19,16	\$	391.170,56	19,16	\$	391.170,56	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	29.671,00				22,74	\$	674.718,54	22,74	\$	674.718,54	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	15.730,00				2,33	\$	36.650,90	2,33	\$	36.650,90	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	\$	16.844,00				15,00	\$	252.660,00	15,00	\$	252.660,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$	18.992,00		3,20	\$	60.774,40			77,23	\$	1.466.752,16	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFLERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	32.492,00				355,14	\$	11.539.208,88	355,14	\$	11.539.208,88	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	25.254,00				75,09	\$	1.896.322,86	75,09	\$	1.896.322,86	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	UN	\$	79.795,00				2,00	\$	159.590,00	2,00	\$	159.590,00	
1.2.63	DEMOLICION DE PISOS PISO BALDOSA VIBROPRESNADA GRANO MARMOL 30*30 PERILATO CLARO	M2	\$	16.926,00				45,82	\$	775.549,32	45,82	\$	775.549,32	
1.2.64	REMOCION DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$	5.538,00				54,47	\$	301.654,86	54,47	\$	301.654,86	
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN	\$	11.210,00				12,00	\$	134.520,00	12,00	\$	134.520,00	
1.2.69	DESMONTE Y REINSTALACION DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACION DE NIVEL)	M2	\$	52.845,00				1,68	\$	88.779,60	1,68	\$	88.779,60	

13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	\$	29.750,00		14,32	\$	426.020,00		14,32	\$	426.020,00	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	22.834,00		188,67	\$	4.308.090,78		188,67	\$	4.308.090,78	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	13.906,00		23,48	\$	326.512,88		49,08	\$	682.506,48	
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE	M	\$	6.789,00		35,16	\$	238.701,24		35,16	\$	238.701,24	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	\$	9.557,00		604,32	\$	5.775.486,24		108,95	\$	1.041.235,15	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	\$	25.309,00		8,00	\$	202.472,00		2,25	\$	56.945,25	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	\$	23.133,00		12,47	\$	288.468,51					
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	\$	177.128,00						7,78	\$	1.378.055,84	
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PÉLCULA DE SEGURIDAD	M2	\$	97.812,00						1,21	\$	118.352,52	
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	\$	119.573,00						0,47	\$	56.199,31	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FUSION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	\$	226.106,00		66,17	\$	14.961.434,02		181,19	\$	40.968.146,14	
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	\$	113.886,00		7,10	\$	808.590,60					
17.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	\$	304.720,00						32,49	\$	9.900.352,80	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM	\$	1.731,00		6.246,90	\$	10.813.383,90		52.294,07	\$	90.521.035,17	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$	4.498,00						41,66	\$	187.386,68	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	\$	2.041,00						2.770,00	\$	5.653.570,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIFEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	\$	2.445,00						2.770,00	\$	6.772.650,00	
7.	IED CHUNIZA												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M	\$	30.872,00						144,85	\$	4.471.809,20	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$	32.665,00						753,00	\$	24.596.745,00	
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	\$	35.918,00						7,20	\$	258.609,60	
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTÉ DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	\$	116.287,00						3,00	\$	348.861,00	
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTÉ, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	\$	131.360,00						1,00	\$	131.360,00	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, "INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS"	M3	\$	78.085,00						50,00	\$	3.904.250,00	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	\$	66.628,00						307,45	\$	20.484.778,60	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	\$	74.819,00						151,35	\$	11.323.855,65	
2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	210.097,00						134,35	\$	28.226.531,95	
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3	\$	140.339,00						13,50	\$	1.894.576,50	
2.3.7	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL	M	\$	331.421,00						44,15	\$	14.632.237,15	
2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	M	\$	72.799,00						19,02	\$	1.384.636,98	
2.3.39	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	\$	126.159,00						160,76	\$	20.281.320,84	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	\$	7.194,00						1.566,24	\$	11.267.530,56	
4.1.32	SEI TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADA 8" NO INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	119.198,00						5,50	\$	655.589,00	
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º NOVAFORT DE 8"	UN	\$	259.330,00						1,00	\$	259.330,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	68.520,00						15,60	\$	1.068.912,00	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCp RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	12.855,00						16,00	\$	205.680,00	
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UND	\$	52.300,00						1,00	\$	52.300,00	
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN	\$	767.423,00						2,00	\$	1.534.846,00	
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA	UN	\$	1.185.009,00						1,00	\$	1.185.009,00	
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	\$	36.989,00						2,00	\$	73.978,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	\$	14.705,00						314,00	\$	4.617.370,00	
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	\$	122.244,00						753,00	\$	92.049.732,00	
7.1.12	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	\$	29.721,00						85,80	\$	2.550.061,80	
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	\$	107.023,00						407,54	\$	43.616.153,42	
9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./, 14 EJS. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M	\$	1.866.312,00						25,00	\$	46.657.800,00	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	\$	23.133,00						14,40	\$	333.115,20	
16.1.18	CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FLJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	\$	10.997.282,00						1,00	\$	10.997.282,00	

1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	27.496,00				6,00	\$	164.976,00		6,00	\$	164.976,00		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	9.835,00				19,92	\$	195.913,20		19,92	\$	195.913,20		
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.730,00				2,04	\$	32.089,20		2,04	\$	32.089,20		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	16.844,00				3,00	\$	50.532,00		3,00	\$	50.532,00		
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	25.254,00				15,77	\$	398.255,58		15,77	\$	398.255,58		
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		\$	9.784,00		1,00	\$	9.784,00				2,00	\$	19.568,00		
1.2.61	DESMONTE DE BARANDAS EN ESCALERA EXTERIORES, INCLUYE EXCAVACION, DEMOLICION DADOS DE CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBRRO.	M		\$	82.874,00				3,60	\$	298.346,40		3,60	\$	298.346,40		
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	14.008,00				19,30	\$	270.354,40		19,30	\$	270.354,40		
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	14.166,00		30,47	\$	431.638,02				30,47	\$	431.638,02		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	78.085,00				57,58	\$	4.496.134,30		57,58	\$	4.496.134,30		
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3		\$	74.819,00		4,52	\$	338.181,88				4,52	\$	338.181,88		
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		\$	156.497,00				27,56	\$	4.313.057,32		27,56	\$	4.313.057,32		
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		\$	140.339,00		2,88	\$	404.176,32		17,02	\$	2.388.569,78		19,90	\$	2.792.746,10
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		\$	52.768,00		7,75	\$	408.952,00				7,75	\$	408.952,00		
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$	100.255,00		28,18	\$	2.825.185,90		88,61	\$	8.883.595,55		116,79	\$	11.708.781,45
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M		\$	183.481,00				19,30	\$	3.541.183,30		19,30	\$	3.541.183,30		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		\$	6.524,00		46,10	\$	300.756,40				46,10	\$	300.756,40		
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)	M2		\$	21.297,00		28,18	\$	600.149,46		113,70	\$	2.421.468,90		141,88	\$	3.021.618,36
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	138.381,00		27,14	\$	3.755.660,34				27,14	\$	3.755.660,34		
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UN		\$	153.017,00		5,00	\$	765.085,00				5,00	\$	765.085,00		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00				8,40	\$	575.568,00		8,40	\$	575.568,00		
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		\$	35.013,00				1,00	\$	35.013,00		1,00	\$	35.013,00		
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	33.740,00		9,74	\$	328.627,60				9,74	\$	328.627,60		
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	53.024,00		9,00	\$	477.216,00				9,00	\$	477.216,00		
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	12.855,00		16,00	\$	205.680,00				16,00	\$	205.680,00		
4.6.5	INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		\$	139.642,00		1,00	\$	139.642,00				1,00	\$	139.642,00		
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		\$	78.799,00		2,00	\$	157.598,00				2,00	\$	157.598,00		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		\$	30.277,00		13,34	\$	403.895,18		88,61	\$	2.682.844,97		101,95	\$	3.086.740,15
7.2.9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO = 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		\$	50.101,00		48,58	\$	2.433.906,58				48,58	\$	2.433.906,58		
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2		\$	132.277,00		1,08	\$	142.859,16		88,61	\$	11.721.064,97		89,69	\$	11.863.924,13
7.2.104	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 25 X 35 HASTA UN ANCHO DE 60CM	M		\$	60.924,00		19,80	\$	1.206.295,20				19,80	\$	1.206.295,20		
9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO.	M		\$	335.914,00		9,65	\$	3.241.570,10		9,65	\$	3.241.570,10		19,30	\$	6.483.140,20
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		\$	32.665,00		15,47	\$	505.327,55				15,47	\$	505.327,55		
10	DIRECCIÓN LOCAL DE SUMAPAZ																
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		\$	16.241,00		1,20	\$	19.489,20				1,20	\$	19.489,20		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	70.429,00		2,00	\$	140.858,00				2,00	\$	140.858,00		
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		\$	24.703,00		2,00	\$	49.406,00				2,00	\$	49.406,00		
7.2.81	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA PODOCTÁCIL, PARA INTERIORES O EXTERIORES, PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTO. TRABAJO PESADO, ALTO TRAFICO, EN POLIPROPILENO, USO APLICABLE A CUALQUIER CLIMA, RESISTENTE A TODA CLASE DE QUIMICOS, LIQUIDOS INFLAMABLES. PERMANECE INTACTO A TRAVES DEL TIEMPO, NO ACUMULA BASURAS, HONGOS O HUMEDAD. ES IMPORTANTE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD PARA ELLO Y CONTAR CON PERSONAL ABSOLUTAMENTE CALIFICADO PARA LA PREPARACION DEL PISO SU COLOCACION Y AJUSTE PERFECTO PARA GARANTIZAR SU VIDA UTIL. MEDIDA DE 40 X 40 NO ENSUCIA NI DEGRADA EL SUELO DONDE SE APLICA. TABLETA EN VARIOS COLORES Y DISEÑOS.	M		\$	317.401,00		19,57	\$	6.211.537,57				19,57	\$	6.211.537,57		
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MÁXIMO 1.00 X 1.00 EN LÁMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN		\$	278.647,00		13,26	\$	3.694.859,22				13,26	\$	3.694.859,22		
12.1.23	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M		\$	959.930,00		20,32	\$	19.505.777,60				20,32	\$	19.505.777,60		
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00		323,49	\$	559.961,19				323,49	\$	559.961,19		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00		22,44	\$	100.935,12				22,44	\$	100.935,12		
11	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C																

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	46.664,00	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.730,00	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	16.844,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00	
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN		\$	84.822,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		\$	30.277,00	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		\$	165.341,00	
12	IED SAN JOSÉ					
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M		\$	126.719,00	
2.2.1	CONCRETO CICLOPEO - 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3		\$	446.392,00	
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		\$	886.007,00	
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		\$	139.387,00	
2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		\$	1.068.505,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		\$	6.524,00	
13.	IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL					
1.2.26	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	20.416,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCÍAS, CORREAS Y/O PERIFLERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CAÑALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.492,00	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	25.254,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		\$	5.669,00	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$	18.820,00	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00	
II	EMERGENCIAS GRUPO No. 5					
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A					
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	76.548,00	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	25.254,00	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	12.370,00	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC/P RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	30.816,00	
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC/P DE 1-1/2 "	UN		\$	16.817,00	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC/P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	12.686,00	
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC/P DE 3/4"	UN		\$	5.529,00	
8.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. ANCHO MAXIMO DE MURO 0,50 M	M		\$	118.944,00	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		\$	14.139,00	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		\$	69.566,00	
17.1.3	FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		\$	97.925,00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00	
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN					
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	9.835,00	
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	14.638,00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		\$	16.241,00	

18,70	\$	577.306,40
367,31	\$	17.140.153,84
12,26	\$	363.766,46
2,90	\$	45.617,00
20,00	\$	336.880,00
27,95	\$	530.826,40
3,00	\$	254.466,00
288,57	\$	8.737.033,89
238,71	\$	39.468.550,11
2,16	\$	66.683,52
8,50	\$	1.077.111,50
1,06	\$	473.175,52
1,15	\$	1.018.908,05
59,50	\$	8.293.526,50
0,74	\$	790.693,70
885,33	\$	5.775.892,92
48,00	\$	979.968,00
251,25	\$	8.163.615,00
24,85	\$	627.561,90
70,00	\$	396.830,00
3.332,98	\$	62.726.683,60
1.539,08	\$	2.664.147,48
1,00	\$	76.548,00
13,58	\$	342.949,32
5,00	\$	61.850,00
2,50	\$	77.040,00
5,00	\$	84.085,00
2,50	\$	31.715,00
4,00	\$	22.116,00
1,00	\$	118.944,00
31,47	\$	248.896,23
40,66	\$	574.891,74
10,64	\$	147.959,84
32,43	\$	2.256.025,38
10,64	\$	1.041.922,00
21,28	\$	95.717,44
0,48	\$	4.720,80
6,90	\$	101.002,20
0,50	\$	8.120,50

1,00	\$	76.548,00
13,58	\$	342.949,32
5,00	\$	61.850,00
2,50	\$	77.040,00
5,00	\$	84.085,00
2,50	\$	31.715,00
4,00	\$	22.116,00
1,00	\$	118.944,00
31,47	\$	248.896,23
40,66	\$	574.891,74
10,64	\$	147.959,84
32,43	\$	2.256.025,38
10,64	\$	1.041.922,00
21,28	\$	95.717,44
0,48	\$	4.720,80
6,90	\$	101.002,20
0,50	\$	8.120,50

18,70	\$	577.306,40
367,31	\$	17.140.153,84
12,26	\$	363.766,46
2,90	\$	45.617,00
20,00	\$	336.880,00
27,95	\$	530.826,40
3,00	\$	254.466,00
288,57	\$	8.737.033,89
238,71	\$	39.468.550,11
2,16	\$	66.683,52
8,50	\$	1.077.111,50
1,06	\$	473.175,52
1,15	\$	1.018.908,05
59,50	\$	8.293.526,50
0,74	\$	790.693,70
885,33	\$	5.775.892,92
48,00	\$	979.968,00
251,25	\$	8.163.615,00
24,85	\$	627.561,90
70,00	\$	396.830,00
3.332,98	\$	62.726.683,60
1.539,08	\$	2.664.147,48
1,00	\$	76.548,00
13,58	\$	342.949,32
5,00	\$	61.850,00
2,50	\$	77.040,00
5,00	\$	84.085,00
2,50	\$	31.715,00
4,00	\$	22.116,00
1,00	\$	118.944,00
31,47	\$	248.896,23
40,66	\$	574.891,74
10,64	\$	147.959,84
32,43	\$	2.256.025,38
10,64	\$	1.041.922,00
21,28	\$	95.717,44
0,48	\$	4.720,80
6,90	\$	101.002,20
0,50	\$	8.120,50

3.1.32	LAVADO Y RETIRO DE HUMEDAD CON HONGO DE PISO	M2		\$	15.606,00				6,10	\$	95.196,60		6,10	\$	95.196,60	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		\$	50.113,00				1,00	\$	50.113,00		1,00	\$	50.113,00	
4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		\$	74.229,00				1,00	\$	74.229,00		1,00	\$	74.229,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTJE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		\$	162.314,00				2,00	\$	324.628,00		2,00	\$	324.628,00	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		\$	105.690,00				0,56	\$	59.186,40		0,56	\$	59.186,40	
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN		\$	134.312,00				6,00	\$	805.872,00		6,00	\$	805.872,00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00				31,16	\$	621.828,96		31,16	\$	621.828,96	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	15.595,00				14,75	\$	230.026,25		14,75	\$	230.026,25	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN		\$	200.299,00				2,00	\$	400.598,00		2,00	\$	400.598,00	
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2		\$	103.135,00				0,80	\$	82.508,00		0,80	\$	82.508,00	
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2		\$	87.205,00				0,18	\$	15.696,90		0,18	\$	15.696,90	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00				870,63	\$	1.507.060,53		870,63	\$	1.507.060,53	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00				41,71	\$	187.611,58		41,71	\$	187.611,58	
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO															
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00				11,40	\$	351.940,80		11,40	\$	351.940,80	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFLERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.492,00				6,66	\$	216.396,72		6,66	\$	216.396,72	
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	UND		\$	9.565,00				18,00	\$	172.170,00		18,00	\$	172.170,00	
3.2.8	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL, (ANCHO < 0.75 M)	M		\$	26.119,00				2,06	\$	53.805,14		2,06	\$	53.805,14	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		\$	68.406,00				18,00	\$	1.231.308,00		18,00	\$	1.231.308,00	
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		\$	25.741,00				1,00	\$	25.741,00		1,00	\$	25.741,00	
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M		\$	25.309,00				2,55	\$	64.537,95		2,55	\$	64.537,95	
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		\$	147.895,00				12,18	\$	1.801.361,10		12,18	\$	1.801.361,10	
8.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPERBOARD PRO DE 8 MM, INCLUYE, ANGULO 29X29X24mm C26, PERFIL D OMEGA 60 244 C26, PARAL 39 GUÍA GALV. 2.44 mm, PASTA MASTIQUE, ESTUCO PLASTICO PASTA, MASILLA PANEL-ESTUCO, PINTURA EPOXICA, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2		\$	144.687,00				12,36	\$	1.788.331,32		12,36	\$	1.788.331,32	
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2		\$	43.583,00				1,76	\$	76.706,08		1,76	\$	76.706,08	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	12.818,00				10,65	\$	136.511,70		10,65	\$	136.511,70	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00				27,90	\$	220.661,10		27,90	\$	220.661,10	
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		\$	29.750,00				35,50	\$	1.056.125,00		35,50	\$	1.056.125,00	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00				38,21	\$	531.348,26		38,21	\$	531.348,26	

13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00			57,89	\$	553.254,73		57,89	\$	553.254,73	
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	120.012,00			8,77	\$	1.052.505,24		8,77	\$	1.052.505,24	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR	M2		\$	245.762,00			16,81	\$	4.131.259,22		16,81	\$	4.131.259,22	
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 6, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		\$	57.009,00			1,67	\$	95.205,03		1,67	\$	95.205,03	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00			1.398,21	\$	2.420.301,51		1.398,21	\$	2.420.301,51	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00			44,83	\$	201.645,34		44,83	\$	201.645,34	
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT														
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00		30,00	\$	926.160,00			30,00	\$	926.160,00	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.568,00			12,77	\$	198.803,36		12,77	\$	198.803,36	
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	18.806,00			4,47	\$	84.062,82		4,47	\$	84.062,82	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	9.835,00			0,72	\$	7.081,20		0,72	\$	7.081,20	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	25.254,00			2,50	\$	63.135,00		2,50	\$	63.135,00	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	12.370,00			0,50	\$	6.185,00		0,50	\$	6.185,00	
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERÍAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN		\$	11.210,00		11,00	\$	123.310,00			11,00	\$	123.310,00	
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	M2		\$	116.287,00		9,01	\$	1.047.745,87			9,01	\$	1.047.745,87	
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	M2		\$	131.360,00		4,00	\$	525.440,00			4,00	\$	525.440,00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		\$	16.241,00		0,20	\$	3.248,20			0,20	\$	3.248,20	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$	27.594,00		37,65	\$	1.038.914,10			37,65	\$	1.038.914,10	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	14.166,00			0,50	\$	7.083,00		0,50	\$	7.083,00	
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	50.516,00		21,00	\$	1.060.836,00			21,00	\$	1.060.836,00	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$	18.820,00		34,97	\$	658.135,40			34,97	\$	658.135,40	
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)	UN		\$	17.512,00		20,00	\$	350.240,00			20,00	\$	350.240,00	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		\$	68.406,00		68,00	\$	4.651.608,00			68,00	\$	4.651.608,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC'S 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00		8,60	\$	589.272,00			8,60	\$	589.272,00	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		\$	35.013,00		4,00	\$	140.052,00			4,00	\$	140.052,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		\$	50.113,00			1,00	\$	50.113,00		1,00	\$	50.113,00	
4.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN		\$	57.773,00		2,00	\$	115.546,00			2,00	\$	115.546,00	
4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		\$	74.229,00		6,00	\$	445.374,00			6,00	\$	445.374,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		\$	162.314,00		2,00	\$	324.628,00			2,00	\$	324.628,00	
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	199.528,00		3,00	\$	598.584,00			3,00	\$	598.584,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	203.028,00		13,00	\$	2.639.364,00			13,00	\$	2.639.364,00	
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		\$	23.689,00		3,00	\$	71.067,00			3,00	\$	71.067,00	
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		\$	23.689,00		4,00	\$	94.756,00			4,00	\$	94.756,00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		\$	38.729,00		4,00	\$	154.916,00			4,00	\$	154.916,00	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		\$	48.227,00		30,40	\$	1.466.100,80			30,40	\$	1.466.100,80	
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T)	M		\$	17.079,00		30,10	\$	514.077,90			30,10	\$	514.077,90	
5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº10 (F) + 1Nº10 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN	M		\$	20.757,00		30,10	\$	624.785,70			30,10	\$	624.785,70	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	185.231,00		18,00	\$	3.334.158,00			18,00	\$	3.334.158,00	

5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	229.252,00		12,00	\$	2.751.024,00			12,00	\$	2.751.024,00			
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	192.420,00		6,00	\$	1.154.520,00			6,00	\$	1.154.520,00			
5.1.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG	UN		\$	151.061,00		1,00	\$	151.061,00			1,00	\$	151.061,00			
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS 1#6 + 1#8 + 1#10T	M		\$	40.094,00		71,40	\$	2.862.711,60			71,40	\$	2.862.711,60			
5.1.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT ALUMINIO 2400 INCLUYE TAPA 10X10 Y TAPAS DE COSTADOS	UN		\$	52.241,00		11,00	\$	574.651,00			11,00	\$	574.651,00			
5.1.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 3X12 LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES INCLUYE CONECTORES AUTODESFORRE O DE RESORTE	M		\$	17.151,00		7,20	\$	123.487,20			7,20	\$	123.487,20			
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		\$	20.152,00		57,46	\$	1.157.933,92			57,46	\$	1.157.933,92			
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		\$	105.690,00					0,72	\$	76.096,80	0,72	\$	76.096,80		
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		\$	172.229,00		149,43	\$	25.736.179,47			149,43	\$	25.736.179,47			
8.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M		\$	190.969,00		8,94	\$	1.707.262,86			8,94	\$	1.707.262,86			
9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO.	M		\$	335.914,00		11,80	\$	3.963.785,20			11,80	\$	3.963.785,20			
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN		\$	134.312,00		5,00	\$	671.560,00			5,00	\$	671.560,00			
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00		45,95	\$	363.418,55		9,25	\$	73.158,25	55,20	\$	436.576,80	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	15.835,00					36,10	\$	571.643,50	36,10	\$	571.643,50		
11.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UND		\$	224.670,00					1,00	\$	224.670,00	1,00	\$	224.670,00		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00		159,56	\$	3.184.179,36			159,56	\$	3.184.179,36			
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		\$	14.139,00		45,95	\$	649.687,05			45,95	\$	649.687,05			
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		\$	29.750,00					37,16	\$	1.105.510,00	37,16	\$	1.105.510,00		
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	22.834,00		128,32	\$	2.930.058,88			128,32	\$	2.930.058,88			
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00		105,81	\$	1.471.393,86			105,81	\$	1.471.393,86			
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00		450,49	\$	4.305.332,93		37,16	\$	355.138,12	487,65	\$	4.660.471,05	
17.1.46	REINSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMAS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M		\$	34.175,00		18,77	\$	641.464,75			18,77	\$	641.464,75			
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		\$	55.397,00					8,00	\$	443.176,00	8,00	\$	443.176,00		
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00		1.913,11	\$	3.311.593,41		631,58	\$	1.093.264,98	2.544,69	\$	4.404.858,39	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00		357,20	\$	1.606.685,60		16,00	\$	71.968,00	373,20	\$	1.678.653,60	
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO																
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PÁRALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00		21,30	\$	657.573,60			21,30	\$	657.573,60			
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	M2		\$	116.287,00		1,56	\$	181.407,72			1,56	\$	181.407,72			
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		\$	131.360,00		1,00	\$	131.360,00			1,00	\$	131.360,00			
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	50.516,00					1,00	\$	50.516,00	1,00	\$	50.516,00		
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		\$	18.820,00		352,90	\$	6.641.578,00			352,90	\$	6.641.578,00			
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		\$	68.406,00		32,00	\$	2.188.992,00			32,00	\$	2.188.992,00			
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00					1,00	\$	68.520,00	1,00	\$	68.520,00		
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN		\$	202.801,00		1,00	\$	202.801,00			1,00	\$	202.801,00			
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15A, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	203.028,00		4,00	\$	812.112,00			4,00	\$	812.112,00			
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		\$	38.729,00		4,00	\$	154.916,00			4,00	\$	154.916,00			
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		\$	27.656,00		13,85	\$	377.504,40			13,85	\$	377.504,40			
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$	185.231,00		6,00	\$	1.111.386,00			6,00	\$	1.111.386,00			
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		\$	229.252,00		6,00	\$	1.375.512,00			6,00	\$	1.375.512,00			
5.1.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT ALUMINIO 2400 INCLUYE TAPA 10X10 Y TAPAS DE COSTADOS	UN		\$	52.241,00		4,00	\$	208.964,00			4,00	\$	208.964,00			
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		\$	20.152,00		23,60	\$	475.587,20			23,60	\$	475.587,20			
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		\$	172.229,00		55,85	\$	9.618.989,65			55,85	\$	9.618.989,65			
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00		55,85	\$	1.114.542,60			55,85	\$	1.114.542,60			

13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	22.834,00		55,85	\$	1.275.278,90			55,85	\$	1.275.278,90				
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00		111,70	\$	1.067.516,90			111,70	\$	1.067.516,90				
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00		2.219,80	\$	3.842.473,80		753,48	\$	1.304.273,88		2.973,28	\$	5.146.747,68	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00		132,79	\$	597.289,42						132,79	\$	597.289,42	
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS																	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00							10,63	\$	315.402,73		10,63	\$	315.402,73
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		\$	5.669,00							18,00	\$	102.042,00		18,00	\$	102.042,00
1.2.64	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		\$	5.538,00							55,09	\$	305.088,42		55,09	\$	305.088,42
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		\$	25.741,00							18,00	\$	463.338,00		18,00	\$	463.338,00
7.1.17	RESANE DE PLACA DE ENTREPISO (BAJO PLACA SE DEBE LIMPIAR, PICAR Y RESANAR)	M2		\$	43.030,00							4,50	\$	193.635,00		4,50	\$	193.635,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2		\$	209.153,00													
7.2.84	SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.	M2		\$	315.784,00							53,57	\$	16.916.548,88		53,57	\$	16.916.548,88
9.1.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN TUBO CUADRADO DE (80X40) CMS CAL. 18 Y VERTICALES EN TUBO CUADRAOD DE 1", INCLUYE PINTURA EN ESMALTE.	M2		\$	817.643,00							3,60	\$	2.943.514,80		3,60	\$	2.943.514,80
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		\$	54.969,00							2,35	\$	129.177,15		2,35	\$	129.177,15
9.3.20	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA.	M2		\$	862.503,00							5,02	\$	4.329.765,06		5,02	\$	4.329.765,06
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2		\$	868.303,00							2,01	\$	1.745.289,03		2,01	\$	1.745.289,03
11.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN		\$	224.670,00							3,00	\$	674.010,00		3,00	\$	674.010,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	15.835,00							4,50	\$	71.257,50		4,50	\$	71.257,50
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	12.818,00							32,99	\$	422.865,82		32,99	\$	422.865,82
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		\$	7.909,00							19,61	\$	155.095,49		19,61	\$	155.095,49
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	19.956,00							102,97	\$	2.054.869,32		102,97	\$	2.054.869,32
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		\$	14.139,00							27,90	\$	394.478,10		27,90	\$	394.478,10
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		\$	29.750,00							112,71	\$	3.353.122,50		112,71	\$	3.353.122,50
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		\$	13.906,00							20,96	\$	291.469,76		20,96	\$	291.469,76
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		\$	6.789,00							51,35	\$	348.615,15		51,35	\$	348.615,15
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		\$	9.557,00							300,55	\$	2.872.356,35		300,55	\$	2.872.356,35
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN		\$	200.299,00							2,00	\$	400.598,00		2,00	\$	400.598,00
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		\$	90.656,00							0,88	\$	79.777,28		0,88	\$	79.777,28
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00							573,94	\$	993.490,14		573,94	\$	993.490,14
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00							202,00	\$	908.596,00		202,00	\$	908.596,00
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ																	
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		\$	147.895,00							28,51	\$	4.216.486,45		28,51	\$	4.216.486,45
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00							179,89	\$	311.389,59		179,89	\$	311.389,59
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		\$	4.498,00							28,52	\$	128.282,96		28,52	\$	128.282,96
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B																	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	62.252,00							159,62	\$	9.936.664,24		159,62	\$	9.936.664,24
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.665,00							159,62	\$	5.213.987,30		159,62	\$	5.213.987,30
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00							7,11	\$	210.960,81		7,11	\$	210.960,81
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00							9,00	\$	170.928,00		9,00	\$	170.928,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	78.085,00							63,22	\$	4.936.533,70		63,22	\$	4.936.533,70
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		\$	74.819,00							39,42	\$	2.949.364,98		39,42	\$	2.949.364,98
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		\$	147.970,00							23,90	\$	3.536.483,00		23,90	\$	3.536.483,00
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$	100.255,00							159,62	\$	16.002.703,10		159,62	\$	16.002.703,10
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		\$	7.194,00							329,43	\$	2.369.919,42		329,43	\$	2.369.919,42
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	68.520,00							9,20	\$	630.384,00		9,20	\$	630.384,00
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		\$	36.989,00							7,00	\$	258.923,00		7,00	\$	258.923,00
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$	65.638,00							2,00	\$	131.276,00		2,00	\$	131.276,00
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		\$	14.705,00							159,62	\$	2.347.212,10		159,62	\$	2.347.212,10
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		\$	4.284,00							18,10	\$	77.540,40		18,10	\$	77.540,40
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		\$	30.277,00							159,62	\$	4.832.814,74		159,62	\$	4.832.814,74
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 M. ESCOBEADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		\$	113.864,00							14,35	\$	1.633.948,40		14,35	\$	1.633.948,40

7.2.44	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		\$	20.077,00				97,50	\$	1.957.507,50		97,50	\$	1.957.507,50										
7.2.51	ENCHAFE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		\$	114.860,00				159,62	\$	18.333.953,20		159,62	\$	18.333.953,20										
9	IED GENERAL SANTANDER																								
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PAREALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRAR EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		\$	30.872,00				128,33	\$	3.961.803,76		128,33	\$	3.961.803,76										
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		\$	298.850,00				0,56	\$	167.356,00		0,56	\$	167.356,00										
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.204,00				292,63	\$	4.449.146,52		292,63	\$	4.449.146,52										
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	9.835,00				58,46	\$	574.954,10		58,46	\$	574.954,10										
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	29.671,00				17,10	\$	507.374,10		17,10	\$	507.374,10										
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	15.730,00				57,99	\$	912.182,70		57,99	\$	912.182,70										
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		\$	16.844,00				25,00	\$	421.100,00		25,00	\$	421.100,00										
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00				10,50	\$	199.416,00		10,50	\$	199.416,00										
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFLERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	32.492,00				312,61	\$	10.157.324,12		312,61	\$	10.157.324,12										
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		\$	19.945,00				32,06	\$	639.436,70		32,06	\$	639.436,70										
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		\$	9.784,00				24,00	\$	234.816,00		24,00	\$	234.816,00										
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		\$	5.669,00				35,00	\$	198.415,00		35,00	\$	198.415,00										
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	12.370,00				25,00	\$	309.250,00		25,00	\$	309.250,00										
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN		\$	11.210,00				22,00	\$	246.620,00		22,00	\$	246.620,00										
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00				10.643,40	\$	18.423.725,40		10.643,40	\$	18.423.725,40										
10.	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO																								
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		\$	18.992,00				4,00	\$	75.968,00		4,00	\$	75.968,00										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		\$	78.085,00				4,00	\$	312.340,00		4,00	\$	312.340,00										
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	119.355,00				4,00	\$	477.420,00		4,00	\$	477.420,00										
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		\$	1.731,00				292,88	\$	506.975,28		292,88	\$	506.975,28										
ITEMS NO PREVISTOS GRUPO No. 5																									
1	IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA																								
NP 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP REFERENCIA 4PWP60G 30C36P3 TRIFASICA CON UN CAUDAL DE 90 GALONES POR MINUTO A UNA ALTURA DE 64 METROS.	UN		\$	5.047.544,00				4,00	\$	20.190.176,00		4,00	\$	20.190.176,00										
COSTO DIRECTO CONTRATO					\$	7.608.734.174,00	\$					707.721.982,53	\$					3.398.661.840,58	\$					4.106.383.823,11	53,97%

RESUMEN EJECUTIVO													
VALOR COSTO DIRECTO				\$ 7.608.734.174,0									
A. I. U. (26,56%)													
VALOR TOTAL				\$ 7.608.734.174,00									
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ()													
VALOR A PAGAR													
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA													
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO													
SALDO DEL CONTRATO		\$ 3.502.350.349,00		SALDO POR AMORTIZAR									

		\$ 707.721.982,53			\$ 3.398.661.840,58			\$ 4.106.383.823,11	53,97%		
		\$ 707.721.982,53			\$ 3.398.661.840,58			\$ 4.106.383.823,11	53,97%		
		\$ 707.721.982,53			\$ 3.398.661.840,58			\$ 4.106.383.823,11	53,97%		
		\$ 0,47			\$ 1,42			\$ 1,89			
		\$ 707.721.983,00			\$ 3.398.661.842,00			\$ 4.106.383.825,00			
PRESENTE ACTA				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ACTUAL			

							
NOMBRE DE CONTRATISTA :		CONSORCIO CLARIDAD		NOMBRE DE INTERVENTORIA :		CB INGENIEROS	
C.C. O NIT :		901.745.447-4		C.C. O NIT :		8605099437	
REP. LEGAL :		ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ		REP. LEGAL :		ING. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	
C.C. :		79.450.429		C.C. :		11.202.387	

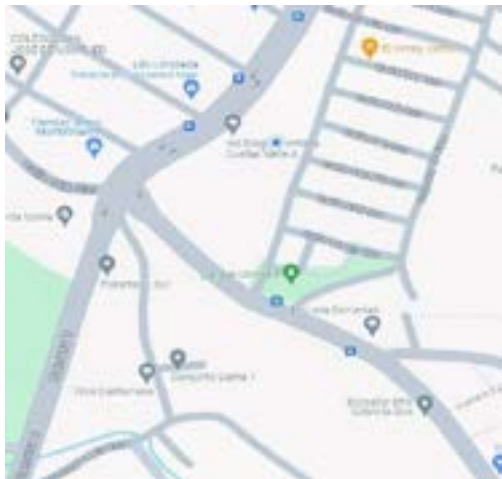
N. Actas de
vecindad

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELAN TAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA
Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Dirección DIAGONAL 97A No. 1-20 SUR
Teléfono _____ No. de pisos 2
Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? _____	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuantos _____	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS INTERNOS	☒	NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
VENTANERIA EN LAMINA COLLROLLED	SI	☒	LA VENTANERIA PRESENTA OXIDACION EN VARIOS PUNTOS Y DILATACIONES ENTE SUS ELEMENTOS
VIDRIOS VENTNAS	SI	☒	SE ENCUENTRAM EN BUEN ESTADO
PUERTA ACCESO P/PAL ACCESO METALICA	SI	☒	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESAGASTADA POR USO
PISOS EN VALDOSA	☒	NO	LOS PISOS SE ENCEUNTRAN EN REGULAR ESTADO
ARMARIOS	SI	☒	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	☒	LOS APRATOS ELECTRICOS SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO PRESENTAN DESGASTE POR USO, LAS TUBERIAS SE ENCUNTRAN MANCHADAS DE PINTURA

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

5 ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
La presente acta de vecindad se realiza al aula No 10, area a intervenir, Se solicito retirar los tableros, televisor, afiches, cortinas y elementos de sistemas

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Rector: Eulogio Muñoz Realpe	Nombre: Guillermo Alberto Velandia Cordova	Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. O NIT 87.246.972	C.C. O NIT 19.418.347	C.C. O NIT: 1.013.653.274

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: MUROS Y PUERA PRINCIPAL



FOTO 2: VENTANA DE AULA



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES				
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
DD	MM	AA					
ACTA No.: 01							
Entidad contratante:		Secretaría de Educación Distrital - SED		Entidad Interventora		CB INGENIEROS S.A.S.	
Entidad ejecutora de la Obra:		Consortio Claridad		Localidad: USME		Vereda: N.A	

FOTO 3: ELEMENTOS DE SISTEMAS



FOTO 5: CORTINA Y BANCA PERIMETRAL



FOTO 4: BLAKCLOUD PROYECTOR VIDEOBEN



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR
 Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA
 Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
 Dirección DIAGONAL 97A No. 1-20 SUR
 Teléfono _____ No. de pisos 2
 Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? _____	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuantos <input type="text"/>	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS INTERNOS	☒	NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
VENTANERIA EN LAMINA COLLROLLED	SI	☒	LA VENTANERIA PRESENTA OXIDACION EN VARIOS PUNTOS Y DILATACIONES ENTE SUS ELEMENTOS
VIDRIOS VENTNAS	SI	☒	SE ENCUENTRAM EN BUEN ESTADO
PUERTA ACCESO P/PAL ACCESO METALICA	SI	☒	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESAGASTADA POR USO
PISOS EN VALDOSA	☒	NO	LOS PISOS SE ENCEUNTRAN EN REGULAR ESTADO
ARMARIOS	SI	☒	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	☒	LOS APRATOS ELECTRICOS SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO PRESENTAN DESGASTE POR USO, LAS TUBERIAS SE ENCUNTRAN MANCHADAS DE PINTURA

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

5 ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
La presente acta de vecindad se realiza al aula No 4, área a intervenir, Se solicitó retirar los tableros, televisor, afiches.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Rector: Eulogio Muñoz Realpe	Nombre: Guillermo Alberto Velanda Córdoba	Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. O NIT 87.246.972	C.C. O NIT 19.418.347	C.C. O NIT: 1.013.653.274

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: MUROS INTERNOS



FOTO 2: ILUMINACION



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES			
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
DD	MM	AA				
ACTA No.: 01						
Entidad contratante:			Secretaría de Educación Distrital - SED		Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:			Consortio Claridad		Localidad: USME	Vereda: N.A

FOTO 3: ARMARIO INTERNO



FOTO 4: VENTANA AULA



FOTO 5: VENTANA Y PUERTA PRINCIPAL



FOTO 6: PUERTA PRINCIPAL



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELAN TAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA
Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Dirección DIAGONAL 97A No. 1-20 SUR
Teléfono _____ No. de pisos 2
Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? _____	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos _____	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS INTERNOS	☒	NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
VENTANERIA EN LAMINA COLLROLLED	SI	☒	LA VENTANERIA PRESENTA OXIDACIÓN EN VARIOS PUNTOS Y DILATACIONES ENTE SUS ELEMENTOS
VIDRIOS VENTNAS	SI	☒	SE ENCUENTRAM EN BUEN ESTADO
PUERTA ACCESO P/PAL ACCESO METALICA	SI	☒	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESAGASTADA POR USO
PISOS EN VALDOSA	☒	NO	LOS PISOS SE ENCEUNTRAN EN REGULAR ESTADO
ARMARIOS	SI	☒	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	☒	LOS APRATOS ELECTRICOS SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO PRESENTAN DESGASTE POR USO, LAS TUBERIAS SE ENCUNTRAN MANCHADAS DE PINTURA

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

5 ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
La presente acta de vecindad se realiza al aula No 8, área a intervenir, Se solicito retirar los tableros, televisor, afiches.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor Nombre: Rector: Eulogio Muñoz Realpe C.C. O NIT 87.246.972	Firma Residente de obra Nombre: Guillermo Alberto Velandia Córdoba C.C. O NIT 19.418.347	Vo.Bo. Representante de la Interventoría Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña C.C. O NIT: 1.013.653.274
---	--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: VENTANA E ILUMINACION



FOTO 2: MUROS INTERNOS



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES			
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
DD	MM	AA				
ACTA No.: 01						
Entidad contratante:			Secretaría de Educación Distrital - SED		Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:			Consortio Claridad		Localidad: USME	Vereda: N.A

FOTO 3: TABLERO Y APARATOS ELÉCTRICOS



FOTO 5: ESTADO VENTANA Y MUROS



FOTO 4: PUERTA PRINCIPAL Y VENTANA AULA



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELAN TAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA
Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Dirección DIAGONAL 97A No. 1-20 SUR
Teléfono _____ No. de pisos 2
Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? _____	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos _____	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS INTERNOS	☒	NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
VENTANERIA EN LAMINA COLLROLLED	SI	☒	LA VENTANERIA PRESENTA OXIDACIÓN EN VARIOS PUNTOS Y DILATACIONES ENTE SUS ELEMENTOS
VIDRIOS VENTNAS	SI	☒	SE ENCUENTRAM EN BUEN ESTADO
PUERTA ACCESO P/PAL ACCESO METALICA	SI	☒	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESAGASTADA POR USO
PISOS EN VALDOSA	☒	NO	LOS PISOS SE ENCEUNTRAN EN REGULAR ESTADO
ARMARIOS	SI	☒	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	☒	LOS APRATOS ELECTRICOS SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO PRESENTAN DESGASTE POR USO, LAS TUBERIAS SE ENCUNTRAN MANCHADAS DE PINTURA

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

5 ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
La presente acta de vecindad se realiza al aula No 7, área a intervenir, Se solicito retirar los tableros, televisor, afiches.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor Nombre: Rector: Eulogio Muñoz Realpe C.C. O NIT 87.246.972	Firma Residente de obra Nombre: Guillermo Alberto Velandía Córdoba C.C. O NIT 19.418.347	Vo.Bo. Representante de la Interventoría Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña C.C. O NIT: 1.013.653.274
---	--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: VENTANAS Y DEPOSITO



FOTO 2: VENTANA Y APARATOS ELECTRICOS



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES			
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
DD	MM	AA				
ACTA No.: 01						
Entidad contratante:			Secretaría de Educación Distrital - SED		Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:			Consortio Claridad		Localidad: USME	Vereda: N.A

FOTO 3: ESTADO MUROS



FOTO 4: ILUMINACION AULA



FOTO 5: ESTADO PUERTA AULA



FOTO 6: TABLERO Y APARATOS ELECTRICOS



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA
Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Dirección DIAGONAL 97A No. 1-20 SUR
Teléfono _____ No. de pisos 2
Long. del frente (mts) _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? _____	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos _____	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS INTERNOS	☒	NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
VENTANERIA EN LAMINA COLLROLLED	SI	☒	LA VENTANERIA PRESENTA OXIDACION EN VARIOS PUNTOS Y DILATACIONES ENTE SUS ELEMENTOS
VIDRIOS VENTNAS	SI	☒	SE ENCUENTRAM EN BUEN ESTADO
PUERTA ACCESO P/PAL ACCESO METALICA	SI	☒	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESAGASTADA POR USO
PISOS EN VALDOSA	☒	NO	LOS PISOS SE ENCEUNTRAN EN REGULAR ESTADO
ARMARIOS	SI	☒	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	☒	LOS APRATOS ELECTRICOS SE ENCUNTRAN EN BUEN ESTADO PRESENTAN DESGASTE POR USO, LAS TUBERIAS SE ENCUNTRAN MANCHADAS DE PINTURA

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	USME Vereda: N.A

5 ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
La presente acta de vecindad se realiza al aula No 6, area a intervenir, Se solicito retirar los tableros, televisor, afiches.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Rector: Eulogio Muñoz Realpe	Nombre: Guillermo Alberto Velandía Córdoba	Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. O NIT 87.246.972	C.C. O NIT 19.418.347	C.C. O NIT: 1.013.653.274

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: VENTANAS Y APARATOS ELECTRICOS



FOTO 2: ESTADO MUROS Y TUBERIA ELECTRICA



ACTA DE VECINDAD IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES			
3	MAYO	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANSTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
DD	MM	AA				
ACTA No.: 01						
Entidad contratante:			Secretaría de Educación Distrital - SED		Entidad Interventora	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:			Consortio Claridad		Localidad: USME	Vereda: N.A

FOTO 3: ESTADO MUROS



FOTO 4: ILUMINACION AULA



FOTO 5: TABLERO Y PUERTA PRINCIPAL



FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES		
28	ABRIL	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
00	MM	AA			
ACTA No.: 01					

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora:	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consortio Claridad	Localidad:	SUMAPAZ
		Venda:	LAS VEGAS

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ALMACENISTA

Nombre del Propietario: SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Dirección: VEREDA LAS VEGAS - LOCALIDAD DE SUMAPAZ

Teléfono: _____ No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cual?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos <input type="text"/>	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
PARQUE INFANTIL	SI	☒ NO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE DE PINTURA POR EL USO
BODEGA / MUROS EN VIDRIO	☒ SI	☐ NO	LOS VIDRIOS QUE CUBREN LA BODEGA SE ENCUENTRAN MANCHADOS - HORRORS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MUROS Y ADICIONAL EN LA PARTE INFERIOR DE MURO EN VIDRIO ESTA PATIDO.
PUERTA ACCESO A BODEGA QUE TIENEN MUROS EN VIDRIO	☒ SI	☐ NO	LA PUERTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR CLIMA Y POR AÑOS DE USO (PUERTA EN MADERA)
PUERTA ACCESO PIPAL ACCESO COLEGIO METALICA	SI	☒ NO	PUERTA METALICA QUE PRESENTA OXIDO EN LA PARTE INFERIOR POR LAS DOS CARAS Y PINTURA DESGASTADA POR USO
BORDILLOS PERIMETRAL PARQUE INFANTIL	SI	☒ NO	LOS BORDILLOS EN CONCRETO PERIMETRALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PLACA EN CONCRETO ACCESO PIPAL COLEGIO	☒ SI	☐ NO	LAS PLACAS EN CONCRETO SE ENCUENTRA CON VARIAS FISURAS
CERRAMIENTO EN MALLA ESCLABONADA CANCHA MULTIPLE	☒ SI	☐ NO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA MALLA QUE RODEA LA CANCHA, CON VARIAS ONDULACIONES
GRADERIA INTERNA CANCHA MULTIPLE	☒ SI	☐ NO	LA GRADERIA - PRESENTA CONCRETO EN MAL ESTADO Y ADICIONAL ACUMULACION DE ESCOMBROS
MURO FACHADA PIPAL	SI	☒ NO	EL MURO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. SOLO SE EVIDENCIA DESGASTE POR EL USO

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
PLATAFORMA EN CONCRETO / ACCESO A COLEGIO	☒ SI	☐ NO	SE EVIDENCIA UNA RAPA ACCESO A LA INSTITUCION DONDE PRESENTA FISURAS ADICIONAL LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES, AFECTACIONES PROPIAS DE LA ANTIGÜEDAD

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.



**CONSORCIO
CLARIDAD**
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA



SECRETARÍA
EDUCACIÓN



FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES	
25	ABRIL	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	
DO	MM	AA		
ACTA No.: 01				
Entidad contratante:			Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora: CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:			Consorcio Claridad	Localidad: SUMAPAZ Vereda: LAS VEGAS
5 ANEXOS				
Fotografías (archivo fotográfico)				
5. OBSERVACIONES ADICIONALES (útilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")				
La presente acta de vecindad se realiza a los accesos dentro del colegio y a las zonas a intervenir propiamente.				
FIRMAS				
Firma Responsable Propietario/poseedor		Firma Residente de obra		Vo.Ba. Representante de la Interventora
Nombre: Fabián López		Nombre: Leonardo Torres Lara		Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. O NIT: 75177704		C.C. O NIT: 68.279.853		C.C. O NIT: 1.013.653.274
REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO				
FOTO 1: PLACA EN CONCRETO ACCESO PRINCIPAL E ERASMO VALENCIA		FOTO 2: PUERTA ACCESO PRINCIPAL E ERASMO VALENCIA		



**CONSORCIO
CLARIDAD**
NIT 901.745.867-8

ACTA DE VECINDAD IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA



GOBIERNO
DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

FECHA				PRIMA TÉCNICA (CONFORME AL ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES)
25	NOVIEMBRE	2014	NA	PROYECTO: OBJETO ACERCAAR OBRAS DE ADICIONACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADICIONACION Y O MEJORAMIENTO DE CONDUCTOS ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTINTALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
ACTA No. 01				

Entidad contratante:

Secretaría de Educación (Secretaría SED)

Entidad interveniente:

CD INGENIEROS S.A.S.

Entidad administradora de la Obra:

Consorcio Claridad

Lugar: SUMAPAZ

Vereda LAS VEGAS

FOTO 3: ZONA PARQUE APARTADO (ZONA A INTERVENIR)



FOTO 4: VISTA EN CONCRETO ACCESO PRINCIPAL A ERASMO VALENCIA



FOTO 5: BORDILLO PERIMETRAL ZONA DE JARDIN JUAN A INTERVENIR



FOTO 6: ESTADO ACTUAL DEBIDA DE ALMACENAMIENTO EN VEHICULO





**CONSORCIO
CLARIDAD**
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



BOGOTÁ

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	ABRIL	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			

Entidad contratante:	Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad Interventora:	CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:	Consorcio Claridad	Localidad:	SUMAPAZ
		Vereda:	LAS VEGAS

FOTO 7: ESTADO ACTUAL, PARQUE INFANTE,



FOTO 8: ESTADO ACTUAL ACCESO CANCHA MULTIPLE - ESCALERAS



FOTO 9: ESTADO ACTUAL, BANCA EN CONCRETO CANCHA MULTIPLE

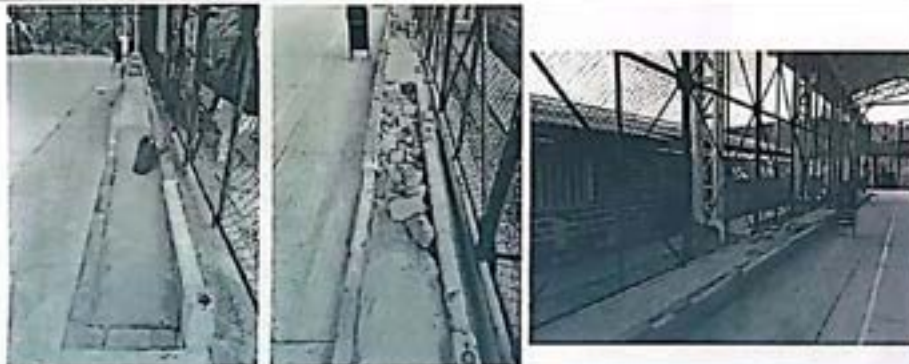


FOTO 10: ESTADO ACTUAL PLACA CANCHA MULTIPLE



FOTO 11: ESTADO ACTUAL ACCESO CANCHA ACCESO A CANCHA MULTIPLE

FOTO 12: ESTADO ACTUAL CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIPLE



**CONSORCIO
CLARIDAD**
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA



GOBIERNO DE
BOGOTÁ

BOGOTÁ

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	ABRIL	2024	PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DD	MM	AA	
ACTA No.: 01			
Entidad contratante:		Secretaría de Educación Distrital - SED	Entidad interventora: CB INGENIEROS S.A.S.
Entidad ejecutora de la Obra:		Consorcio Claridad	Localidad: SUMAPAZ Veeda: LAS VEGAS
		 	

ACTA DE VECINDAD IED JUAN DE LA CRUZ VARELA - SEDE EL TOLDO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA	2024	PROYECTO	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE CONEDORES EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS DISTRICALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERCEROS DE INFRASTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
ACTA No.:	01	Secretaría de Educación Distrital - SED	CONSORCIO CLARIDAD
Problema encontrado:		Entidad Interventora	Localidad: SUMAPAZ Vereda EL TOLDO
Entidad ejecutora de la Obra:			CB INGENIEROS S.A.S.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Ubica esta sección para anular la información correspondiente en el numeral 3, ESTADO DEL PREGIO ANTES DE INTERVENIR)			
La presente acta de vecindad se radica a los efectos dentro del cuerpo y a las zonas a intervenir/ proporcionar.			

FIRMAS

Firma Responsable Proyecto/Interventor Nombre: Fabian A Lopez Rozo C.C. O.N.T. 99572304	Firma Responsable de obra Nombre: Alfonso C.C. O.N.T. 88 278 853	Vo.Bo. Representante de la Interventora Nombre: Christian Camilo Sarmiento Ojeda C.C. O.N.T. 1.073.553.274
---	--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

FOTO 1: ESTADO ACTUAL, FACHADA VÍA ACCESO



FOTO 2: ESTADO ACTUAL, INTERIOR DE COCINA



FICHA TÉCNICA URBANÍSTICA ESTADO ACTUAL DE PROYECTUADES Y LOTES

Secretaría de Educación Distrital - SEDCONSEJO CLAUDAD

1

Location: SUNNYVALE

mg/100g,

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral 3. EVALUO DEL PUNDO ACTOS DE INTERVENCIÓN)

La presente acta de verificación se realizó a las sucesores dentro del colegio y a las zonas a intervenir propiamente.

Firmen Verantwortliche: Principals@nycpcas.com

Firma Responsabile Progettazione Nome I abriel Lopez Restrepo CC.O NT 99574307 	Firma Progettista ex aequo Nome CC.O NT 99574307 	Nome CC.O NT 1073653274 	Valido, Representante ex aequo Nome Carlos Camilo Barriga Pardo 
---	--	---	---

FIGURA 1: ESTIMAO ACTUAL, PLACAS E LUBRIFICANTES ACTUAIS A CONDIÇÃO



FIGURE 2. ESTIMATED ANNUAL NUMBER OF DEATHS IN CANCER PATIENTS



O. Balances presupuestales

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	33	DEL	10-jun-24	AL	16-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO

\$ 7.608.734.174

VR. ASIGNADO
OBRA PROGRAMADA +
EMERGENCIAS

\$ 7.329.303.473

DIFERENCIA

\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	34	DEL	17-jun-24	AL	23-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	35	DEL	24-jun-24	AL	30-jun-24
------------	----	-----	-----------	----	-----------

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	\$ 349.948.209,00	\$ 368.303.926,74	\$ 18.355.717,74
2	Fernando González Ochoa		Usme	\$ 353.157.411,00	\$ 351.987.816,80	-\$ 1.169.594,20
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	\$ 542.722.842,00	\$ 827.574.178,91	\$ 284.851.336,91
4	Chuniza		Usme	\$ 236.826.369,00	\$ 357.259.490,76	\$ 120.433.121,76
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	\$ 15.242.011,00	\$ 15.242.011,00	\$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	\$ 750.000.000,00	\$ 645.219.795,71	-\$ 104.780.204,29
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	\$ 811.831.873,00	\$ 808.880.103,87	-\$ 2.951.769,13
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	\$ 411.446.316,00	\$ 452.221.333,92	\$ 40.775.017,92
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	\$ 253.419.631,00	\$ 140.061.812,66	-\$ 113.357.818,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	\$ 799.914.269,00	\$ 658.356.852,00	-\$ 141.557.417,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	\$ 344.210.600,00	\$ 336.699.160,65	-\$ 7.511.439,35
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	\$ 337.709.778,00	\$ 216.571.352,00	-\$ 121.138.426,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	\$ 635.000.000,00	\$ 516.912.696,46	-\$ 118.087.303,54
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	\$ 210.861.638,00	\$ 210.861.638,00	\$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	\$ 447.180.697,00	\$ 424.988.269,60	-\$ 22.192.427,40
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	\$ 599.909.029,00	\$ 599.909.029,00	\$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				\$ 7.099.380.673,00	\$ 6.931.049.468,08	-\$ 168.331.204,92

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS

\$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA

PRESUPUESTO

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE	DIFERENCIA
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	A	Usme	\$ 5.198.994,76	\$ 5.180.659,95	-\$ 18.334,81
2	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN		Sumapaz	\$ 5.379.289,20	\$ 4.568.398,72	-\$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	\$ 7.539.117,09	\$ 16.181.115,24	\$ 8.641.998,15
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 4.431.089,03	\$ 4.431.089,03	\$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 1.423.309,88	\$ 1.423.309,88	\$ 0,00
6	IED JAIME GARZON SEDE AURAS	B	Sumapaz	\$ 45.253.968,69	\$ 40.464.402,48	-\$ 4.789.566,21
7	IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ		Sumapaz	\$ 3.987.501,65	\$ 4.651.637,95	\$ 664.136,30
8	IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE B	B	Usme	\$ 64.390.582,12	\$ 75.531.103,89	\$ 11.140.521,77
9	IED GENERAL SANTANDER		Usaquen	\$ 42.912.275,33	\$ 61.174.785,00	\$ 18.262.509,67
10	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO		Sumapaz	\$ 1.569.178,10	\$ 1.372.703,28	-\$ 196.474,82
11	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	\$ 56.745.334,94	\$ 60.079.096,00	\$ 3.333.761,06
12	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	\$ 120.340.875,45	\$ 123.195.703,00	\$ 2.854.827,55
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				\$ 359.171.516,24	\$ 398.254.004,42	\$ 39.082.488,18

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS

\$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	\$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	\$ 7.329.303.473
--------------------	------------------	--	------------------

DIFERENCIA

\$ 279.430.701

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado los balances de los diferentes frentes, sin mebargo, estos podrán ser ajustados en los siguientes informes.

P. Actas de
entrega

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Harry Liz Parle	Ed. Usminia	Recepcionista	
Guillermo Castilla	Usminia	Almacenista	
Guillermo Velazquez	Usminia	Residente Jura	
Diana Aguillo	CB Ingenieros	Residente Inter	

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES
Entrega Usminia sede B - entrega total	

TEMAS TRATADOS

Actividades realizadas	
PUNTO DE REFRIGERIO :	cambio de 2 tomas. GFCI. pintura externa. bapante canal.
PUESTA A TIERRA :	Cable tuberías cobre
BANOS NIÑOS :	puerta. (roja) con 3 llaves, 2 registros dientes acero inoxidable. freno mesón policarbonato con 4 push y su respectiva grifería pintura interna, espejo. enchape pared, luminarias, interruptor. balda de granito pulido en piso, bapante.
BANO PMR	Pintura interna, encha piso, lavamanos balda de granito pulido piso sanitario, puerta con 5 llaves. banos espejo sensor movimiento, rampa ingreso.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Reparación escaleras: pintura.	20-4-24	Consejo Clavador
Escaleras: taca hueco palomas	20-4-24	Consejo Clavador
Tablones en fachada externa.	23-4-24	Consejo Clavador
Ajustes puertas.- cerraduras. (todas).	20-4-24	Consejo Clavador

Próxima reunión:

OBJETO

INTERVENCIÓN INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES

TEMAS TRATADOS

BANOS NIÑAS: enchape pared, pintura interna, divisiones acero inoxidable, espejo, meson policarbonato con 4 push y antea, paca, 2 luminarias interruptor, ventana, persiana, puerta con 5 llaves, 1 registro

SALON 101: puerta (roja) con 4 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado internamente, quadrescoba, mantenimiento ventanar, 4 tamboconientes

SALON 102: puerta (amarilla) con 4 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado internamente, quadrescoba, mantenimiento ventanar, 2 tamboconientes

PASILLO PRIMER PISO: enchape piso, quadrescoba, tablero, 4 luminarias

ESCALERAS: pintura barandas, 11 lámparas emergencia, 1 luminaria

SALON 202: puerta (amarilla) con 5 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado internamente, quadrescoba, mantenimiento ventanar, pintura estructural, 2 tamboconientes

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
en las puertas de salones 101, 102, 201, 202		
tapar los huecos presentes al lado de la cerradura	20-4-24	Consorcio Claridad.
interruptor de lámparas en pasillos.	27-4-24	Consorcio Claridad.

Próxima reunión: _____

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
/	/	/	/

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES
/	/

TEMAS TRATADOS

SAJON 201: puerta (rojal) con 3 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado internamente, quadrescoba, mantenimiento ventanas, pintura estruct. y tornacorneter

BODEGA: puerta Camanital con 5 llaves, 2 paneles, 1 interruptor, enchape piso, 1 tornacorneter, quadrescoba

PASILLO SEGUNDO PISO: 1 lámpara emergencia, enchape piso, quadrescoba

BODEGA PRIMER PISO: enchape piso, quadrescoba

PATIO: 4 capas de inspección, kapinte.

CUBIERTA BLOQUE AULAS Y BARRA: estructura metálica y teja tipo sandwich.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Próxima reunión: _____

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Eulogio Muñoz Rentería	Grupo 5	Rector	
Luisa Andrade Prada	Grupo 5	Almacenista	Luisa Andrade P.
Cindy Milán Duarte V	SST Interventoría	CB INGENIEROS	Milán Duarte V
Diana Aníballo	Residente Interventoría	CB Ingenieros	Diana A.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES
Entrega física de Grupo B.	

TEMAS TRATADOS

Bloque aulas:

- Observaciones: pintura en columna entre barrios y bloque aulas, instalación de udras en barrios, ajuste de tubería de tachada, tapaluz encima de peisiana de bloque aulas, ajuste y nivelación de rejilla de la balante, bandeja encima tubería metálica tachada

- Aula No. 20: 6 paneles, 1 interruptor doble, tomacorriente normales 3, guardaesoba y enchape piso, pintura blanca y zocalo qns, 1 puerta con bisagra, mirilla

observaciones: ajuste de interruptor, tapa de la caja metálica, ingreso peisiana en la peisiana

- Aula No. 19: 6 paneles, 1 interruptor doble, 3 tomacorriente normales, guardaesoba y enchape piso, pintura blanca y zocalo qns, 1 puerta con bisagra y mirilla.

Observaciones: ajuste de interruptor, instalación de repli rojas en las ventanas, terminación de tubería de voz y datos, detalles de pintura en la puerta

- Aula No. 18: 6 paneles, 1 interruptor doble, 3 tomas corrientes dobles, guardaescoba y enchape piso, pintura blanca y zocalos qns, 1 puerta con bisagra y mirilla.

Observaciones: 1 toma corriente desajustado, instalación de repar en ventanas, detalles de pintura en puerta, tapas en las tomacorrientes.

- Aula No. 15: 6 paneles, 1 interruptor doble, 3 tomacorrientes dobles, guardaescoba y enchape piso, pintura blanca y zocalos qns, 1 puerta con bisagra y mirilla.

Observaciones: ajustar el interruptor, instalación de repar en ventanas, detalles de pintura en la puerta, en la persiana. hacen falta vidrios.

Zona verde: falta adecuación, y tapas tubería.

Andén: reposición de placa en donde va la tubería eléctrica.

Saliente y canal: abrazaderas en canal y filtraciones en la canal.

En general: en algunas partes la tonalidad de pintura del zocalo no es acorde.

En las aulas No. 17 y No. 16 no hay luz, sin embargo, el consorcio Clamblad conecta equipos durante la ejecución del proyecto, verificar el estado de las ventanas, dado que no se pudo abrir.


Retirar cerramiento y materiales dispuestos en la cancha.

Retiro de material al ingreso del colegio y detrás de las aulas 16 y 17.

Retiro de batería portátil. - baño de los trabajadores.

Ajuste de cárcano, incluye limpieza.

Las puertas se entregan sin llaves.



[Handwritten signature]

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO

FECHA CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Los compromisos descritos en el acta, serán atendidos conforme a la indicación del director de obra.

13-May-24

Corporación Clanchet

Próxima reunión: _____



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Diego Montaña Cuellar sede A
DIRECCIÓN : Transversal 6b No. 100 c 55 sur
LOCALIDAD : Usme
FECHA DE ENTREGA : 2 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el colegio Diego Montaña Cuellar sede A, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número transversal 6b No. 100 c 55 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDA D	OBSERVACIONES
Auditorio	Marquesina de marco fachada	4 metros aproximad amente	Debido a la humedad presentada en la parte superior de la marquesina, se presentó un desprendimiento del superboard

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

Página 1 de 3



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐

NO ☐

N.A ☒

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio, por lo cual, no fue intervenida la parte eléctrica ni sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

Dado que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio, no se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N/A ☒

Nota: no aplica dado que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

El señor rector solicita retoque de pintura en una parte de la lámina del flanche. El contratista de obra atenderá esta observación: fecha de entrega el 10 de febrero de 2024.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra


INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato


Eulando Muñoz R.
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Rector



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Nazareth
DIRECCIÓN	: Calle 3 No 2-05 Nazareth
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 19 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Nazareth, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Calle 3 No 2-05 Nazareth que comprende

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cocina	Pared lateral derecha	30 m ² aproximadamente	Humedad que se presenta en la superficie.
Cocina	Lavaplatos	0.50 m aproximadamente	Fuga
Cocina	Lavaplatos	2 m aproximadamente	Pintura e instalación de grifería de lavaplatos de pedal.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐ N.A ☐

Nota: la grifería de pedal instalada quedó funcional.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
Consortio Claridad
Director de obra


INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato


COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN -
SEDE NAZARETH
Rectora





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Tabaco ✓
DIRECCIÓN	: Corregimiento Betania- Sede Tabaco
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 19 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Tabaco, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Vereda Tabaco que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Exterior	Placa de concreto	9 m ² aproximadamente	Instalación de parque infantil.
Aulas	Edificación de aulas	4 m ² aproximadamente	Cambio de tejas perforadas.
Exterior	Adyacente a la entrada del colegio.	9 m aproximadamente	Cerramiento de escombros.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ NO ☐ N.A ☒

Nota: no se intervino ninguna red eléctrica, hidráulica o sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

Solo se instaló el parque infantil con el que ya contaba el colegio.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra


INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato


COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN -
SEDE TABACO
Rectora





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

La presente acta de entrega es parcial, por ello, es entregada la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar en aras de habilitar el espacio para las jornadas escolares. Una vez culminen los demás espacios intervenidos en el colegio Fernando González Ochoa se realizará el acta de entrega física de la obra.

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Fernando González Ochoa
DIRECCIÓN	: Carrera. 4d este No.89 sur 77
LOCALIDAD	: Usme
FECHA DE ENTREGA	: 15 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE LA OBRA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros, contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.5313332.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de las obras del colegio Fernando González Ochoa, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número carrera. 4d este No.89 sur 77 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cancha múltiple	Cancha múltiple	232,1 m2	Demolición de placa existente. Construcción de placa para cancha múltiple. Pintura para cancha múltiple. Pintura de cerramiento contra impacto.
Ludoteca	Ludoteca	90 m2	Desmonte de piso existente. Instalación de neopreno. Instalación de piso mipolam.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

Preescolar	Patio de preescolar y terraza de ludoteca	116 m2	Desmante de piso existente. Instalación de piso grano caucho. Instalación de estructura metálica y teja traslucida para cubierta
------------	---	--------	--

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar, por lo cual, no fue intervenida la parte eléctrica ni sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar, por lo cual, los diseños y los colores fueron socializados y aprobados por las directivas del colegio.

4.- Descripción de los equipos entregados

Dado que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar no se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil.?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

SI ☐

NO ☐

N/A ☒

Nota: no aplica dado que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Reparación de tapa de caja de inspección e instalación de trazo
negro para el 17 feb.
Ajuste de puerta de baño preescolar 22 feb
Instalación planche: mantes 20 feb.
Instalación de enchape: mantes 20 feb


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días febrero del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
Consortio Claridad
Director de obra


INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato


COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA
Rectora



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Auras
DIRECCIÓN	: Corregimiento de Nazareth, vereda Auras
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 07 de mayo de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Auras, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Corregimiento de Nazareth, vereda Auras que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Biblioteca	Módulo 1 y 2	85 m ² aprox.	Se instaló nueva cubierta (tipo sándwich) con su respectiva estructura metálica. Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante.
Aulas	Primero	40 m ² aprox.	Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio con pintura tipo vinilo interior. Se instaló nueva red eléctrica con paneles Tipo LED.
Aulas	Segundo	40 m ² aprox.	Se instalaron nuevas canales para el drenaje de la nueva cubierta.
Aulas	Preescolar 2	65 m ² aprox.	Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante. Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio.
Aulas	Laboratorio de química	65 m ² aprox.	Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante. Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			Para este espacio se pintó con pintura tipo epóxica.
Aulas	Jardín A	65 m ² aprox.	Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante. Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio.
Aulas	Jardín B	65 m ² aprox.	Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante. Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio. Se instaló el piso tipo puzzle.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI

☒

NO

☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI

☒

NO

☐

N.A

☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI

☒

NO

☐

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI

☒

NO

☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI

☐

NO

☐

N/A

☒



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA


Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- Tapas de las cajas eléctricas y tomacorrientes. Fecha para el 14 de mayo de 2024.
- Instalación de flanches para tapa luz (con el fin de evitar la entrada de palomas). Fecha para el 14 de mayo de 2024.
- Pintura en las paredes que recubren los soscros de las canales. Fecha para el 08 de mayo de 2024.
- Detalles de pintura en algunas paredes. Fecha para el 08 de mayo de 2024.
- Queda pendiente comprobar que las goteras de las canales hayan quedado selladas.
- Se instalarán los vidrios en el salón de primero, segundo y en biblioteca. Fecha para el 09 de mayo de 2024.
- Instalación de tableros. Fecha para el 08 de mayo de 2024.
- Tapa de hueco al lado de las cajas eléctricas en el salón de Jardín A y B. Fecha para el 14 de mayo de 2024.
- Limpieza del piso puzzle del salón de Jardín B. Fecha para el 10 de mayo de 2024.
- Laboratorio de química ajustar toma corriente. Fecha para el 08 de mayo de 2024.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de mayo del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
Consortio Claridad
Dirección de obra


INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de Interventoría

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato




COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN -
SEDE AURAS
Rectora



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Auras
DIRECCIÓN	: Corregimiento de Nazareth, vereda Auras
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 30 de mayo de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Auras, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Corregimiento de Nazareth, vereda Auras que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Laboratorios	Ofimática	46 m ² aprox.	Se instaló nueva cubierta (tipo sándwich) con su respectiva estructura metálica. Se resanaron las paredes con estuco plástico y aplicación de impermeabilizante.
Laboratorios	Ensayos	41 m ² aprox.	Se pintaron todas las paredes que conforman el espacio con pintura tipo vinilo interior. Se instaló nueva red eléctrica con paneles Tipo LED. Se instalaron nuevas canales para el drenaje de la nueva cubierta.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI

☒

NO

☐



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

N.A ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N/A ☒

Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- En laboratorio de ensayos falta la instalación de 2 tomacorrientes de 220V y el cambio de tomas GFCI que no servían. **Fecha para el 05 de junio de 2024.**
- Ajuste de pintura en la estructura metálica de la cubierta en ambos espacios. **Fecha para el 05 de junio de 2024.**
- Ajuste de pintura en los filos superiores de las paredes de ambos espacios. **Fecha para el 05 de junio de 2024.**
- Se deben limpiar los restos de pintura en los marcos de ventanas y puertas. **Fecha para el 05 de junio de 2024.**



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los siete (30) días del mes de mayo del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.



CONTRATISTA
Consortio Ciudad
Director de obra



INTERVENTOR
CS Ingenieros
Director de Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato



COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN -
SEDE AURAS
Rectora
