

El Retiro, Antioquia, 12 de agosto de 2024

EPC-GS-IER6135-8.2-391-24

Señores

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Atn. Ing. JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARIN

Supervisor de Contrato

Secretaria de Infraestructura Física

Calle 42B Número 52- 106 CAD "José María Córdova" - La Alpujarra.La ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría N° 4600016135 - Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia.

Asunto: Entrega de informes mensuales. Informe N.12 - agosto 2024.

Estimados Señores:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones administrativas contractuales, adjunto remitimos informes mensuales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de agosto y 30 de agosto de 2024:

DESCRIPCIÓN	FOLIOS (Doble cara)	CD
Informe SGSST	19	
Informe Técnico	26	1
Informe Ambiental	31	1
Informe Social	21	1

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

YENY MARCELA PÉREZ VELÁSQUEZ

Directora Interventoría

Anexo: Lo Anunciado
YP

ARCHIVO SIF
2024 OCT 7 16:30:17



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO:
CONTRATO 46000016135 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL
PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS
DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No. 12, V_0
EMPROCIV S.A.S

EL RETIRO- ANTIOQUIA, AGOSTO DE 2024

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	---	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600016135 DE 2023

DEPENDENCIA	PERSONA QUE APRUEBA	DOCUMENTO
EMPROCIV S.A.S	Ing. Yeny Marcela Pérez Velásquez	VERSIÓN 0.0

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice de Revisión	Sección Modificada	Fecha de Modificación	Observaciones
V.0		Agosto 31 - 2024	Versión inicial del documento

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Contrato No: 4600016135 DE 2023
Título del documento: Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 11, Versión 0.
Fecha: 01 de agosto al 31 de agosto de 2024

Numero de Revisión:	
Responsable por Elaboración:	Nombre: Ing. Yeny Marcela Pérez Velásquez Firma: 
Responsable por Revisión:	Nombre: Ing. Yeny Marcela Pérez Velásquez Firma: 

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	8
2.1. OBJETIVO GENERAL	8
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
3. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN	9
3.1. ANTECEDENTES	9
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	10
4. ALCANCE	11
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	13
4.1.1. Localización general	13
4.1.2. Localización específica	14
5. ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR	15
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	16
7. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA	17
7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA	17
8. ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR	18
8.1. PERSONAL ASIGNADO POR LA INTERVENTORÍA DEDICACION DE PERSONAL SEGÚN PROPUESTA	22
8.2. EQUIPOS DE INTERVENTORIA	23
8.3. SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO	23
8.4. RESUMEN ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA	26
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	27
8.6. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	27
8.7. RESUMEN DE ENSAYO Y PRUEBAS	28
8.8. SEGUIMIENTO A GARANTIAS	28
8.8.1. Garantías de Interventoría	28
8.8.2. Garantías de Contrato de Obra	29
8.9. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	29

8.10.	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL	30
8.11.	ESTUDIOS Y DISEÑOS	32
9.	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	32
9.1	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN.....	33
10.	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.....	34
10.1.	CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO DEL CONTRATO ...	34
10.2.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO DEL CONTRATO ..	35
1.1.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	36
11.	CONCLUSIONES.....	50

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características Técnicas del Proyecto	16
Tabla 2. Relación Personal de Interventoría	22
Tabla 3. Equipos de Interventoría	23
Tabla 4. Plan de Inversión del Anticipo	24
Tabla 5. Resumen para aprobación desembolso anticipo	25
Tabla 6. Relación pagos autorización	26
Tabla 7. Resumen estado del tiempo	26
Tabla 8. Resumen Maquinaria y Equipo	27
Tabla 9. Garantías de Interventoría	29
Tabla 10. Garantías de Obra	29
Tabla 11. Relación comités realizados en el Periodo	30
Tabla 12. Correspondencia Enviada por Interventoría	35
Tabla 13. Correspondencia Recibida por Interventoría	35

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. sección vial del proyecto.....	12
Ilustración 2. Localización general del proyecto.....	14
Ilustración 3. Localización específica del proyecto.....	15
Ilustración 4. Sección Típica.....	16

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Antioquia adelantó el Concurso de Méritos CM 14723 de 2023, para contratar el *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."* y en tal sentido, la entidad suministró anexos técnicos, información con la que se realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.

El día 25 de julio de 2023 la gobernación de Antioquia suscribe acta de inicio con la Empresa de Proyectos Civiles EMPROCIV S.A.S. el contrato de interventoría No. 1585 de 2021 el cual tiene como objeto la ejecución de el *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"*, correspondiente a una vía alterna a la principal de acceso al municipio de El Retiro de 2600 metros lineales, y que para el objeto del contrato se interviene en 1300 metros lineales, entre las abscisas que describe el objeto del presente contrato..

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 11 del contrato 4600016135 de 2023, para el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
--	--	--

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, municipio de El Retiro subregión oriente del departamento de Antioquia, para que el contratista de obra 4600015848 de 2023 haga entrega de un producto de calidad dentro del plazo contractualmente pactado.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento a las ejecuciones técnicas de cada una de las actividades desarrolladas en este periodo.
- Efectuar seguimiento y control administrativo a la entrega de informes y correspondencia generada.
- Ejecutar seguimiento y control financiero, contable al dinero entregado por la gobernación de Antioquia como anticipo y que sea invertido según el plan de inversión del anticipo aprobado.
- Presentar a la entidad contratante informe técnico periódicamente como lo establece el contrato de interventoría, donde se evidencien el porcentaje de ejecución y compararlo con el porcentaje faltante de ejecución.

	<p style="text-align: center;">CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABACHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA N° 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	
---	--	---

3. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

3.1. ANTECEDENTES:

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien, servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Anual de Adquisiciones.

En el año 2019, la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, mediante Resolución No. S98042019060049209 del 28 de mayo de 2019, abrió el Proceso de Contratación por Licitación Pública No. 9804, con el fin de contratar la "Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras Complementarias en la Vía Carabanchel - La María Municipio del Retiro, Subregión Oriente del Departamento de Antioquia".

Mediante las resoluciones N° S2019060144915 Y S2019060145590 del 18 y 23 de julio de 2019 respectivamente, la entidad adjudicó el contrato N° 4600010113 de 2019 a La Unión Temporal Vial SCS Oriente, y el contrato de consultaría N°4600010111 de 2019 con la sociedad VIASTOP SAS, como producto del concurso de méritos 10107 cuyo objeto es: "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras Complementarias en la Vía Carabanchel La María Municipio del Retiro, Subregión Oriente del Departamento de Antioquia".

El alcance del contrato de obra N° 4600010113 de 2019 tuvo como finalidad realizar la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobre la vía Carabanchel – La María en una longitud de 2,6 Km, desde el puente la María hasta el sector conocido como el Malí de Carabanchel por un valor de \$7.792.013.412, dichas actividades se realizarían con recursos obtenidos a través del derrame de Valorización del sector. El contrato de obra tuvo una adición por valor de \$1.250.000.000, recursos propios.

Los trabajos establecidos dentro del alcance sobre la vía a través del contrato de obra N° 4600010113 de 2019, de acuerdo a los estudios y documentos previos y demás documentación que hacen parte del proceso de Licitación N°9804 de 2019 y publicados en la página de contratación pública, tenían como finalidad la siguiente: "realizarla ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobre la vía Carabanchel - La María en una longitud de 2.6 Km,

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

desde el puente la María - hasta el sector conocido como el Malí de Carabanchel, dichas actividades se realizarán con recursos Obtenidos a través del derrame de Valorización del sector.

Los trabajos que se realizarán sobre la vía a través de la presente contratación comprenden: mejoramiento de la capa de rodadura, ampliación de la calzada, construcción de andenes y ciclo rutas en los 2.6 km de vía, construcción de obras de drenaje, box Culvert, construcción de muros de contención, remplazos de obras de drenaje existentes, obras de subdrenaje, señalización y gestión predial."

El alcance del contrato de obra N° 4600010113 de 2019, tuvo modificación mediante el documento denominado "PRORROGA 6 Y MODIFICACIÓN 2" del 3 de febrero de 2023, el cual se anexa al presente proceso, en este documento se modifica la Clausula tercera del contrato con el fin de reducir el alcance, el cual es firmado por las partes y queda de la siguiente manera: Que en el documento denominado "JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO", se relacionan las situaciones que generaron las modificaciones en la ejecución del proyecto y por ende afectaciones al presupuesto contractual para cumplir con el alcance contractual, así como las actividades de obra que comprenderían el nuevo alcance físico Km 0+000 hasta Km 1+300. Los anteriores pueden ser consultados en el portal SECOP II; Así las cosas y teniendo en cuenta el compromiso adquirido con el Municipio de El Retiro y su comunidad, la entidad se ve obligada a dar continuidad y terminación al proyecto conforme a la concepción inicial que sobre el mismo se tuvo.

Se precisa que no fue posible terminar el proyecto inicial según la planificación esperada debido a los ajustes que sobre la marcha del proyecto debieron incorporarse y que alteraron la cantidad de obra a ejecutar.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se pretende con el presente proceso (CM 14723 de 2023) dar terminación al proyecto para satisfacer las necesidades de transitabilidad en el corredor vial Carabanchel - La María del municipio de El Retiro para efectos de cumplir con el proyecto de la manera en la cual fue concebido y con ello, cumplir con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de las comunidades usuarias del corredor vial.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

Por todo lo anterior, el presente proceso de selección (CM 14723 de 2023) planteaba adjudicar el mejoramiento del tramo de vía restante, el cual comprende aproximadamente 1,3Km de longitud del Corredor vial ARROYITO - CONEJERAS conocido como "CARABANCHEL LA MARÍA" del Municipio del Retiro, (CÓDIGO 05607VT12) - Subregión Oriente, tramo vial ubicado del K1+300 al K2+600, a través de la pavimentación, ampliación, rectificación, construcción de andenes, y construcción de ciclovía, construcción de obras de drenaje, subdrenaje, obras de estabilización de taludes y obras de contención entre otras, de esta forma se culmina los trabajos sobre todo el corredor vial correspondiente a 2,6 Km, quedando totalmente pavimentada y con una sección de vía de aproximadamente 12m, de los cuales 7m corresponde a carriles viales, 3m a carril de ciclovía, 1,5m de andén y 0,5m de zonas verdes, de esta forma se conecta el punto denominado Carabanchel con El Puente La María.

La vía Arroyito - Conejeras con código 05607VT12 se cataloga como vía de Tercer orden, a cargo del Municipio de El Retiro, el tramo ubicado de la abscisa K1+300 al K2+600, cuenta con una superficie de rodadura en concreto asfáltico en regular estado, con presencia de grietas longitudinales y transversales, pieles de cocodrilo y baches. La vía presenta un ancho promedio de calzada de 5,0 m.

De acuerdo con la Circular No. 9 Inventario de la Red Vial en el Departamento de Antioquia de diciembre de 2015 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia) La vía "CARABANCHEL LA MARÍA" se encuentra denominada, como vía ARROYITO - CONEJERAS código 05607VT12, vía terciaria a cargo del Municipio de El Retiro.

4. ALCANCE

El alcance del contrato de obra al que realizaremos la interventoría corresponde a la Ampliación, rectificación, pavimentación de 1.3 kilómetros de vía y construcción de obras de drenajes y muros de contención. Ancho total de la sección transversal o corona de 12.00 m, e incluye andén (1.5m), vía vehicular (7.0m), zona verde (0.5m) y ciclo ruta (3.0m).



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO 4600016135 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL -
LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO
DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12
01 de agosto al 31 de agosto de 2024

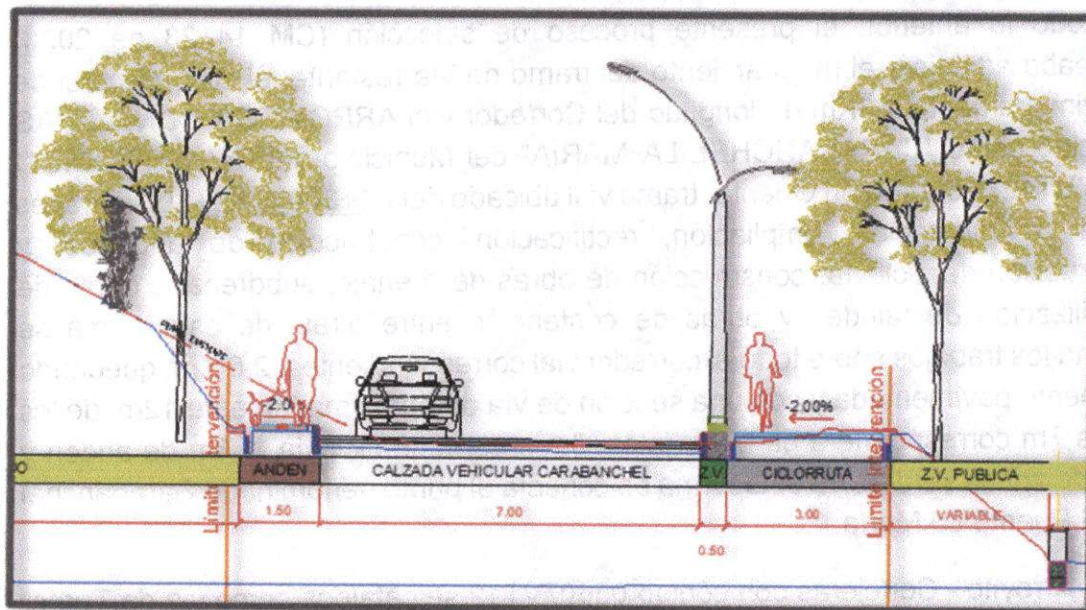


Ilustración 1. sección vial del proyecto

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Rocería.
- Tala de Árboles.
- Gestión predial
- Explanaciones, Conformación de banca.
- Llenos estructurales.
- Construcción de alcantarillas con Tubería.
- Construcción alcantarillas tipo Box Culvert.
- Limpieza de obras transversales existentes.
- Excavaciones sin clasificar de la explanación, canales y préstamos.
- Mejoramiento de la subrasante.
- Suministro, colocación, conformación y compactación de material de subbase granular y base granular.
- Imprimación.
- Suministro y colocación de mezcla densa en caliente Tipo MDC 2.
- Construcción de filtros y cunetas.
- Transporte de material proveniente de la excavación y material granular.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

- Obras de mitigación del impacto ambiental.
- Concretos: Todas las obras que incluyan esta actividad.
- Revegetalización.
- Demás obras complementarias.

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1. Localización general

El Retiro es un municipio de Colombia, situado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, en altiplano de Oriente, donde se asientan varios municipios. El Retiro limita por el norte con los municipios de Envigado y Rionegro, por el este con los municipios de Rionegro y La Ceja, por el sur con La Ceja y Montebello y por el oeste con los municipios de Santa Bárbara, Caldas y Envigado.

El altiplano de Oriente, también conocido como valle de San Nicolás está enmarcado por una topografía montañosa a ondulada, que oscila entre los 1900 y los 2600 metros sobre el nivel del mar. Sus condiciones geológicas dan lugar a la formación de diversos microclimas, bosques y sitios de diverso valor paisajístico y ecológico.

El altiplano de Oriente posee una extensión de 198 km² y se encuentra enclavado en la cordillera central de los Andes al oriente a una altura de 2.080 msnm. La precipitación promedio anual varía entre 1.800 y 2.500 milímetros y una temperatura media de 18.5 °C; La altitud del resto del territorio varía entre los 2.060 y los 2.600 msnm, cuenta con una topografía de pequeñas colinas de cimas redondeadas.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	--	---

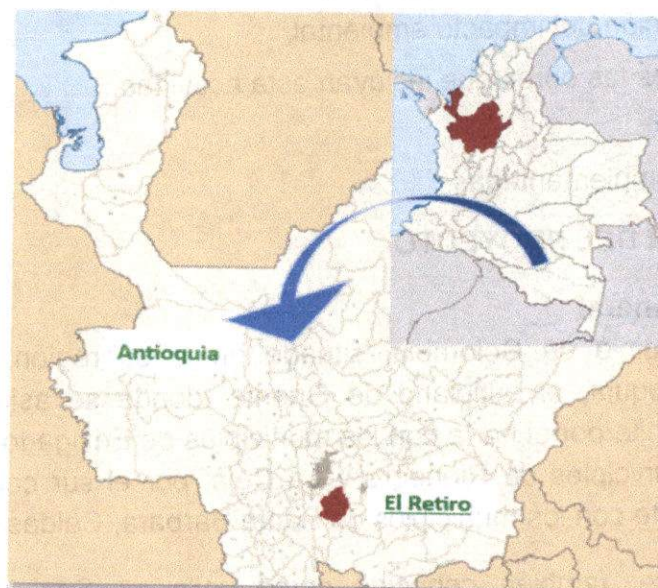


Ilustración 2. Localización general del proyecto

Fuente: Google – Ajustado por Emprociv S.A.S

4.1.2. Localización específica

El proyecto de Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - la María municipio de El Retiro, Subregión Oriente del departamento de Antioquia, se encuentra localizado en el sector comprendido entre el denominado Mall Carabanchel y el puente conocido como La María sobre el río Pantanillo, donde conecta con la vía principal de ingreso al área urbana del municipio.

El Retiro, es un municipio de Colombia situado en la subregión oriente del departamento de Antioquia que, limita por el:

- Norte con los municipios de Envigado y Rionegro
- Este con los municipios de Rionegro y La Ceja,
- Sur con la ceja y Montebello
- Oeste con los municipios de Santa Bárbara, Caldas y Envigado.

El Tramo proyectado se encuentran en zona de alto desarrollo urbanístico, corresponde a zonas de expansión y zona urbana con alta proyección habitacional, según el PBOT vigente y al desarrollo propio del Municipio de El Retiro.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
--	--	--



Ilustración 3. Localización específica del proyecto

Fuente: Adaptado y modificado de la plataforma tecnológica de Google Earth Pro.

Coordenadas de Localización:	Inicio: 6° 5'1.62"N; 75°30'4.96"O
	Fin: 6° 5'39.22"N; 75°30'5.36"O

5. ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR

El tramo vial a intervenir sobre el corredor vial "CARABANCHEL - LA MARÍA", cuenta con una superficie de rodadura en concreto asfáltico en regular estado, presenta alto desgaste, baches, desprendimiento de agregado fino, y agregado grueso, con presencia de grietas longitudinales y transversales, pieles de cocodrilo. Dentro del tramo a intervenir se identificaron algunos sistemas de drenaje, que requieren la demolición o sellamiento lo cual se indica en los planos de diseño que entrega la entidad. La vía presenta un ancho promedio de calzada de 5,0 m. En este tramo hay presencia de postes que hacen parte del trazado de las redes de energía en la zona, los cuales deben ser trasladados de acuerdo con los planos de diseño que entregue la entidad.

En este tramo hay presencia de obras de drenaje tales como obras transversales y cunetas, las cuales deben ser selladas o demolidas, según lo indicado en los planos de construcción que entrega la entidad.

Se identifica que se deben realizar obras longitudinales que recojan el agua de la ladera, puesto que en la mayoría del tramo no existen, y esto no ayuda a la infiltración de agua en la vía y por consiguiente surjan afectaciones en el pavimento.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSICISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	---	--

En cuanto al drenaje transversal del tramo se observó que se presenta drenajes permanentes de agua que no poseen estructuras con capacidad suficiente para captarla, por lo que requieren estructuras de paso como alcantarilla o box Culvert según sea el caso, para el proyecto en ejecución se cuenta con diseño de box Culvert.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ELEMENTO	VIA CARABANCHEL – LA MARIA	
	NUMERO	LONGITUD - CARACTERISTICA
Vías	1	1.3 km
Ciclovía	1	1.3 km
Andenes	1	1.3 km
Obras de drenaje		
Sumideros	56	
Box Culvert	2	K1+780; K2+185
Muros de contención	5	K1+440; K1+590; K1+865; K2+440; K2+500

Tabla 1. Características Técnicas del Proyecto

Se detalla la sección típica a construir.

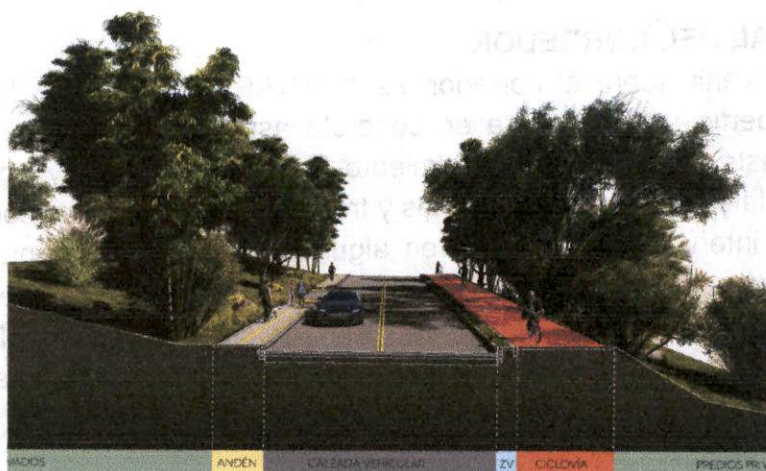


Ilustración 4. Sección Típica

DESCRIPCION	ANCHO (m)
Anden	1.5
Calzada Vehicular	7.0
Zona Verde	0.5
Ciclovía	3.0

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

7. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO:	CM 14723 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4600016135 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	EMPROCIV S.A.S
INTEGRANTES:	EMPROCIV SAS. 100 %
NIT	900.096.419-9.
DIRECCIÓN:	Oficina Principal: Calle 13 No. 3-46 Oficina 301 Cota, Cundinamarca.
TELÉFONO:	3105729576
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$904.962.427
VALOR ADICIONAL No. 1	\$357.278.055
VALOR ADICIONAL No. 2	\$632.255.077
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$1.894.495.560.
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA SUSPENSION No. 1	Diciembre 22 de 2023 a enero 22 de 2024
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN.	Enero 23 de 2024 a febrero 06 de 2024
FECHA REINICIO No. 1	Febrero 07 de 2024
PRORROGA No. 1	Cuatro (4) meses quince (15) días
PRORROGA No. 2	100 días
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	09 de Octubre 2024

Tabla 1. Información General Interventoría

Fuente: Elaboración Propia Emprociv S.A.S

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA	
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO:	LP 14667
CONTRATO DE OBRA No.	4600015848 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de mayo de 2023
CONTRATISTA:	Consortio El Retiro PG
INTEGRANTES:	Promciviles S.A.S (70%) Promotora Puga Ltda (30%)
NIT:	901.720.055-2
DIRECCIÓN:	Av. Carrera 19 No. 95-12/20 Of. 605 Bogotá D.C
TELÉFONO:	3105729576
OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$11.693.070.651,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$11.693.070.651,00
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	Diciembre 22 de 2023
FECHA REINICIO No. 1	Febrero 07 de 2024
PRORROGA No. 1	Cuatro (4) meses
PRORROGA No. 2	100 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	Septiembre 25 de 2024
INTERVENTOR:	Emprociv S.A.S
SUPERVISOR DEL PROYECTO:	Ing. Jose Bernardo Álvarez Pulgarín

Tabla 2. Información General Contrato de obra

Fuente: Elaboración Propia

8. ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR

Durante este periodo de la Etapa de Construcción y plazo vigente del contrato, la Interventoría ha dado cumplimiento a las actividades definidas en el Contrato de Interventoría No. 4600016135 de 2023, para lo que dispuso del personal profesional mínimo requerido para cumplir con las actividades previstas en esta etapa (construcción) del Contrato de Obra 4600015848 de 2023.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

Durante el presente periodo la Interventoría realizaron las siguientes actividades:

1. La interventoría verificó que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad.
2. Se verificó que el contratista de obra haga cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Se solicitó la información requerida para el ingreso del personal en obra y demás documentos necesarios para el desarrollo de los trabajos programados cumpliendo con la normatividad SST.
3. Con el personal ambiental y forestal de interventoría, se realizó continuo seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente según resoluciones de la autoridad ambiental, de acuerdo con las actividades desarrolladas en el periodo del informe mensual.
4. Se revisa permanentemente la presencia en el proyecto, de los profesionales y demás personal propuesto por el contratista de obra y aprobados por la interventoría.
5. Se verifica y exige que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra y actividades contratadas.
6. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades del PMA.
7. Con la finalidad de garantizar las metas propuestas dentro del plazo contractual, la interventoría realiza permanente seguimiento a la implementación del PMT versión 2 (PMT v.2) aprobado por el municipio de El Retiro el día 27 de noviembre de 2023, y ante quien se solicitó prórroga de acuerdo con el nuevo plazo de ejecución del contrato de obra, de ser aprobada la prórroga No.2, se solicitara prórroga al PMT aprobado por el municipio de El Retiro.
8. Se lleva el control de cantidad de árboles talados y de las demás actividades de aprovechamiento forestal realizada por el contratista de obra.
9. El equipo profesional, tecnólogo y comisión de topografía de interventoría, con dedicación del 100%, se realiza control y seguimiento a las actividades donde el contratista realiza excavaciones, demoliciones, llenos y en general movimiento de tierras, construcción de estructuras, así como localizaciones y replanteos durante el desarrollo del contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

10. Se lleva un Control al avance del contrato de obra con base en el cronograma de obra presentado por el contratista y aprobado por interventoría cronograma de obra V.12.
11. Semanal mente se hace seguimiento a las programaciones presentadas por el Consorcio El Retiro PG, con esa información desde la interventoría se controla la ejecución de las actividades programadas semanalmente.
12. Se tiene contacto permanente con el supervisor del proyecto, con quien se intercambia información solicitada entre las partes para el óptimo desarrollo del contrato, así como también se informa de los atrasos de las actividades del contratista, ya sea en su inicio o en su ejecución.
13. Desde las diferentes áreas (ambiental, social, SST, técnico), se establece comunicación permanente para retroalimentar información entre las partes interesadas del proyecto.
14. La interventoría hace seguimiento a las fuentes de materiales de donde provienen estos insumos para el desarrollo de las diferentes actividades civiles que el contratista de obra materializa.
15. Cumpliendo con las solicitudes del supervisor, se da respuesta a las mismas oportunamente, según información que solicite periódicamente sobre aspectos legales financieros y técnicos.
16. Permanentemente se tiene comunicación con la supervisión para conocer información actualizada sobre el estado de los predios no liberados o en trámite jurídico-financiero para lograr su intervención.
17. Permanentemente se recibe visita en obra del supervisor o funcionarios de la gobernación, a quien se informa de las actividades ejecutadas por el contratista de obra y las de interventoría.
18. La interventoría y su equipo de profesionales participan en reuniones de veeduría desarrolladas en este periodo.
19. Se verifica el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal.
20. El ingeniero residente de interventoría bajo supervisión del director de interventoría, diligencia a diario el libro de obra - Bitácora, donde es firmada por contratista de obra e interventoría.
21. Se cuenta con registro fotográfico diario, de las actividades realizadas por el contratista durante el desarrollo del proyecto y se presenta el relacionado para el presente periodo mensual a corte del último día calendario de cada mes.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

22. Se hace un seguimiento permanente al cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

23. La interventoría presenta a la supervisión informes semanales, se elaboraron cinco (5) informes semanales, de los componentes ambiental, social, SST, técnico y financiero.

24. En el periodo de este informe mensual, se presentan informes mensuales ambiental, social, SST y el informe mensual técnico.

25. La interventoría hace control de calidad a los materiales usados para la ejecución de las obras civiles desarrolladas por el contratista de obra, en el presente informe se anexan los resultados de los controles de calidad de los materiales.

26. La interventoría realizó gestión para programar y recibir visita de funcionarios de EPM -Aguas. EPM - Gas y así, coordinar las actividades entre el Consorcio El Retiro PG y EPM, ya que EPM proyecta la construcción de red de conducción de acueducto en la sección donde este proyecto construirá la ciclorruta y construcción de red de gas en la sección de andén.

27. La interventoría tiene contacto ocasional con los operadores de las redes de telecomunicaciones (TIGO- EPM y Conecta Retiro), así como con funcionarios del municipio de El Retiro – Retirar S.A E.S.P, para informar y programar con el contratista de obra el traslado de las redes de telecomunicaciones existentes en el corredor vial.

28. Participación en comités de seguimiento (cuando la supervisión los programa), donde la interventoría elabora las actas de comité de seguimiento y comunicaciones.

29. Semanalmente la interventoría programa y realiza comités de obra, para el seguimiento y cumplimiento de las actividades del contratista de obra y de las de interventoría.

30. Con los equipos, el personal profesional y tecnológico de interventoría relacionado en la tabla 2, se hace control y seguimiento de las actividades que el contratista de obra ejecutadas durante el periodo del presente informe mensual.

31. Los profesionales de interventoría participaron el día 02 y 16 de julio de 2024, en reunión de veeduría, donde se acompañó al equipo profesional de la gobernación de Antioquia, reunión programada para ser realizada cada veinte (20) días donde se mostrará el avance del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

32. La interventoría hace control de calidad a las actividades donde se requiere hacer ensayos o tomas de muestras a los materiales instalados como de concreto y pasta de cemento.

33. Administrativamente, la interventoría hace revisión del acta N.8 de costos presentadas por el contratista de obra, las mismas son remitidas para respectivo tramite financiero en la gobernación de Antioquia por medio del supervisor.

34. La interventoría ha realizado mesas de trabajo con el contratista de obra para revisar, observar y aprobar memorias de cálculo para el trámite de actas parciales, estas mesas de trabajo se realizaron para el acta de pago mensual 8 del consorcio El Retiro PG, a la fecha de corte de este informe se cuenta con la aprobación de memorias de cálculo hasta el acta 8, la trazabilidad de los tiempos de entregas y revisión se plasma registros de correspondencia y actas de reunión que la interventoría programa para dar celeridad a este proceso.

35. En conjunto con los profesionales de interventoría y obra, se hace revisión, conciliación de las cantidades de obra generadas en este periodo.

8.1. PERSONAL ASIGNADO POR LA INTERVENTORÍA DEDICACION DE PERSONAL SEGÚN PROPUESTA.

NOMBRE	CARGO	CANT.	PERMANENCIA
Yeny Marcela Pérez Velásquez	Directora de Interventoría	1	100%
Maricela Úsuga Bedoya	Residente de Interventoría	1	100%
Laura Daniela Orjuela Hernández	Ingeniera Auxiliar	1	100%
Julio Cesar Aguilar Acevedo	Ingeniero Profesional Ambiental Residente	1	100%
Mireya Maricsa Higuera Calderón	Profesional Ingeniero SST Residente	1	100%
Yeris Anith Flórez Jaimes	Profesional Social	1	100%
Ariel de Jesús Martínez Monsalve	Tecnólogo en construcción Civiles	1	100%
Varios	Comisión de Topografía	1	100%

Tabla 2. Relación Personal de Interventoría.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

8.2. EQUIPOS DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	CANT.	PERMANENCIA
Equipos celulares	9	100%
Radios de comunicación	4	100%
Estación de topografía	1	100%
Nivel de alta precisión	1	100%
Camioneta 4X4	1	100%
Equipos de computo	9	100%
Impresora y escáner	1	100%
Oficina	1	100%
Elementos de medición	4	100%

Tabla 3. Equipos de Interventoría

8.3. SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO

Como se estipula en la minuta del contrato la sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO	ARMOTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	25/07/2023	\$ 11.693.070.651,00				\$ 11.693.070.651,00	
Adiciones							
Anticipo pago # 1	30/08/2023		\$ 1.753.960.598,00		\$ 1.753.960.598,00	\$ 9.939.110.053,00	
TOTALES		\$ 11.693.070.651,00	\$ 1.753.960.598,00	\$ -	\$ 1.753.960.598,00	\$ 9.939.110.053,00	\$ -

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el interventor autoriza el desembolso del anticipo al contratista Consorcio El Retiro PG, por valor de: **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 1.753.960.598)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

Para trámite de cobro del anticipo, el contratista de obra ha presentado los documentos requeridos para revisión y aprobación de interventoría, durante este mes no se han recibido solicitudes de desembolso de anticipo, el plan de inversión del anticipo se discrimina así:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Costos de personal (Nomina y pagos seguridad social	\$0.00	0.00%
2	Compra de materiales y accesorios	\$960.000.000	55.00%
2.1	Concreto, cemento y asfalto	\$432.000.000	
2.2	Hierro y Alambre	\$228.000.000	
2.3	Granulares	\$240.000.000	
3	Transporte de materiales y equipos	\$530.000.000	30%
4	Alquiler de maquinaria y equipo	\$263.960.598	15%
TOTAL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO		\$1.753.960.598	100%

Tabla 4. Plan de Inversión del Anticipo.

Hasta la fecha se ha realizado el trámite para los siguientes desembolsos de anticipo:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCI S.A.S.
---	--	--

DESEMBOLSO ANTICIPO No 1					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOCUMENTO
OMR SAS	901230950-7	Compra tubería	\$ 43.319.648,00	ORDEN No 023 - 29-10-2023	FAC483
MANUFACTURAS DE CEMENTOS S	860003012-2	Prefabricados	\$ 50.000.000,00		Cuenta de cobro MD033
CEMENTOS ARGOS SA	890100251-0	Anticipo concreto	\$ 50.000.000,00		Cuenta de cobro
POSTEEQUIPOS SAS	800082458-2	Postes Eléctricos	\$ 15.661.095,00		ORDEN DE PEDIDO 13141
valor desembolso			\$ 158.980.743,00		

DESEMBOLSO ANTICIPO No 2					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOCUMENTO
Maxichem Colombia SAS	860,005,050-1	Compra tubería	\$ 50.000.000,00	ORDEN No 038 - 29-11-2023	Cuenta de cobro
GJY FERRETERIAS S.A.	800,130,426-3	comprar acero	\$ 100.000.000,00	ORDEN No 039 - 29-11-2023	Cuenta de cobro
valor desembolso			\$ 150.000.000,00		

DESEMBOLSO ANTICIPO No 3					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOCUMENTO
GJY FERRETERIAS S.A.	800,130,426-3	comprar acero	\$ 175.938.239,00		Cuenta de cobro
CEMENTOS ARGOS SA	890100251-0	Anticipo concreto	\$ 167.109.158,00		PROFORMA No. 99222
valor desembolso			\$ 343.047.397,00		

DESEMBOLSO ANTICIPO No 4					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOCUMENTO
RENTAL EP SAS	901002043-4	alquiler maquinaria	\$ 250.000.000,00	No 10-2023	CUENTA DE COBRO
RENTAL EP SAS	901002043-4	transporte de material	\$ 44.240.503,00	No 11-2023	factura FE 212
valor desembolso			\$ 294.240.503,00		

DESEMBOLSO ANTICIPO No 5					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	DOCUMENTO
RENTAL EP SAS	901002043-4	transporte de material	\$ 56.657.957,00	No 11-2023	factura FE 213
Maxichem Colombia SAS	860,005,050-1	Compra materiales	\$ 23.575.002,00		Cuenta de cobro
GJY FERRETERIAS S.A.	800,130,426-3	comprar acero	\$ 381.865.622,00		proforma 92222
MANUFACTURAS DE CEMENTOS SA	860003012-2	Prefabricados	\$ 50.000.000,00		Cuenta de cobro
CEMENTOS ARGOS SA	890100251-0	Anticipo concreto	\$ 207.075.069,00		Cuenta de cobro
valor desembolso			\$ 719.173.650,00		

Tabla 5. Resumen para aprobación desembolso anticipo.

Se adjunta al informe la aprobación de la reprogramación de inversión de anticipo.

En la siguiente tabla de relacionan los pagos realizados por la gobernación de Antioquia en cada acta parcial:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial		\$ 11.693.070.651				\$ 11.693.070.651	
Adiciones		\$ 0,00					
Pago No.1			\$ 89.427.937	\$ 22.356.984	\$ 67.070.952	\$ 11.625.999.699	3000247418
Pago No.2			\$ 218.797.383	\$ 54.699.346	\$ 164.098.037	\$ 11.461.901.662	3000247420
Pago No.3			\$ 181.653.497	\$ 45.413.374	\$ 136.240.123	\$ 11.325.661.539	3000247421
Pago No.4			\$ 241.505.335	\$ 60.376.334	\$ 181.129.002	\$ 11.144.532.537	3000247902
Pago No.5			\$ 397.457.258	\$ 99.364.314	\$ 298.092.943	\$ 10.846.439.594	3000247903
Pago No.6			\$ 642.465.905	\$ 160.616.476	\$ 481.849.429	\$ 10.364.590.166	3000248416
Pago No.7			\$ 351.344.163	\$ 87.836.041	\$ 263.508.122	\$ 10.101.082.043	3000248417
Pago No.8			\$ 1.035.500.858,00	\$ 258.875.215,00	\$ 776.625.643,00	\$ 9.324.456.400,30	
TOTALES		\$ 11.693.070.651	\$ 3.158.152.335,27	\$ 789.538.084,20	\$ 2.368.614.250,70	\$ 9.324.456.400,30	

Tabla 6. Relación pagos autorización.

8.4. RESUMEN ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

En los anexos presentados en este informe se encuentra la copia de bitácora donde se evidencian los registros y/o anotaciones del estado del tiempo en la zona donde se desarrollan actividades del proyecto el municipio de El Retiro, adicionalmente se anexa registro del estado del tiempo.

Interventoría N° 4600016135 - Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del K1+300 al K2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia.																																
HORARIO	AGOSTO DEL 2024																															
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
6:00 A.M 7:00 A.M.																																
7:00 A.M 8:00 A.M.																																
8:00 A.M 9:00 A.M.																																
9:00 A.M 10:00 A.M.																																
10:00 A.M 11:00 A.M.																																
11:00 A.M 12:00 M.																																
12:00 M 1:00 P.M.																																
1:00 P.M 2:00 P.M.																																
2:00 P.M 3:00 P.M.																																
3:00 P.M 4:00 P.M.																																
4:00 P.M 5:00 P.M.																																
5:00 P.M 6:00 P.M.																																
LLUVIA INTENSIDAD BAJA LLUVIA INTENSIDAD MEDIA LLUVIA INTENSIDAD ALTA CLIMA SECO																																
CUADRO RESUMEN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.																																
CONTROL	INTENSIDAD BAJA					INTENSIDAD MEDIA					INTENSIDAD ALTA					CLIMA SECO					TOTALES											
NUMERO DE HORAS						4					10					261					275											
PORCENTAJE	0.00%					1.45%					3.54%					94.91%					100.00%											

Tabla 7. Resumen estado del tiempo

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	---	--

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se relaciona la maquinaria y equipo presente en obra, que da cumplimiento a los requerimientos del área SST.

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR 236D	1	Disponible
VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL SD45DTF	1	Disponible
EXCAVADORA 313D2L	1	Disponible
Retroexcavadora 426F2	1	Disponible
Miniretroexcavadora	1	Disponible
Camión estacas JAC-387	1	Disponible
Volqueta Doble 14m3	3	Disponible
Planta generadora eléctrica	1	Disponible
Martillo neumático demoledor	2	Disponible
Compactadores tipo canguro.	2	Disponible
Equipo de soldadura	1	Disponible
Compresor para demolición	1	Disponible
Micropiloteadora	1	Disponible

Tabla 8. Resumen Maquinaria y Equipo

8.6. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Para el presente periodo del informe mensual, se ha verificado el cumplimiento legal de los aportes al sistema de seguridad social del contratista, evidenciando el cumplimiento con la presentación de esta documentación. Ver informe SST.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

8.7. RESUMEN DE ENSAYO Y PRUEBAS

Por parte de la interventoría, se hace permanente seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra, haciendo control de calidad, apoyados en la experiencia y con el conocimiento profesional del equipo de trabajo de la interventoría, teniendo en cuenta el plan de ensayos y actividades desarrolladas por el contratista de obra.

Con la toma de muestras para ensayos de Proctor modificado, y obtenidos los resultados del mismo, por parte del laboratorio de interventoría se han realizado pruebas a los tramos donde el constructor a finalizado compactación mecánica de materiales con los cuales ha llenado nuevamente las áreas donde ha realizado excavaciones mecánicas para la construcción de redes de aguas lluvias, los resultados de la compactación de estas zonas son aceptables, aunque se ha dado instrucción al constructor de mejorar la compactación en algunos tramo, cuando se realizó construcción de redes de aguas lluvias.

Para el presente periodo de informe mensual, se han tomado muestras de pasta de cemento usada para la construcción de micropilotes de los muros de contención.

Las tomas de muestras de concreto premezclado del proveedor Argos, para probar resistencia a la compresión, son tomadas por el constructor como autocontrol de calidad, se solicita la presentación de estos resultados, la interventoría toma muestras de concreto para control de calidad de los materiales.

8.8. SEGUIMIENTO A GARANTIAS

Las garantías relacionadas a continuación de la interventoría y contratista de obra son las aprobadas con la adjudicación de los contratos.

8.8.1. Garantías de Interventoría

COMPAÑÍA	AMPAROS	NUMERO POLIZA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NB-100065668	\$ 232.000.000	19-7-2023	31-12-2023
	1. CUMPLIMIENTO		\$ 180.992.485,40	19-7-2023	30-06-2024

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

COMPAÑÍA	AMPAROS	NUMERO POLIZA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
	2. PRESTACIONES SOCIALES	NB-100271783	\$ 217.190.982,48	19-7-2023	31-12-2026
	3. CALIDA DEL SERVICIO		\$ 180.992.485,40	19-7-2023	31-12-2028

Tabla 9. Garantías de Interventoría

8.8.2. Garantías de Contrato de Obra

COMPAÑÍA	AMPAROS	NUMERO POLIZA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CBO-100004690	\$ 584.653.533	11-7-2023	31-12-2023
	1. CUMPLIMIENTO	CBO-100019259	\$ 2.338.614.132	11-7-2023	1-7-2024
	2. BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		1.753.960.559	11-7-2023	1-7-2024
	3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		\$ 1.169.307.066	11-7-2023	31-12-2026
	4. ESTABILIDAD DE LA OBRA		\$ 2.338.614.312	31-12-2023	31-12-2028
	3. CALIDA DEL SERVICIO		\$ 12.201.783	31-12-2023	31-12-2028

Tabla 10. Garantías de Obra

8.9. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO.

Durante este periodo se realizaron comités de obra entre obra e interventoría, se realizan estas reuniones para trámites administrativos, financieros, legales y de seguimiento técnico, evaluando compromisos y dar a conocer el avance de obra reportando avance físico y financiero, de estos comités se generaron actas firmadas por los representantes de cada una de las partes, en cada comité se relacionan los temas ambientales, forestales, sociales, SST, haciendo seguimiento a las actividades ejecutadas y programadas por el Consorcio El Retiro PG.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
--	--	--

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
13/6/2024	Comité de obra	Este comité de obra con profesionales de obra e interventoría.
26/6/2024	Comité de obra	Este comité de obra con profesionales de obra e interventoría.

Tabla 11. Relación comités realizados en el Periodo.

8.10. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL.

A través de la gobernación de Antioquia, el 11 de junio se realiza el proceso de expropiación en el predio del señor Emmanuel Muñetón, posteriormente se hará la delimitación y cerramiento con el contratista de obra.

El pasado 13 de diciembre de 2023, se participó en reunión virtual con propietarios, topógrafo del predio Alto Group, abogado predial de la gobernación de Antioquia, Topógrafo de contratista de obra e ingeniero Residente de interventoría, donde se dio claridad acerca de la materialización de la información de la fichas prediales correspondientes a este predio (607-2-1-0-16-1164; 607-2-1-0-16-1163), obteniendo como conclusión, la aceptación de la información suministrada a conformidad por parte de los propietarios, respecto a este predio aún se espera la autorización para la intervención y construcción de obras civiles.

Con los propietarios predio de la señora Ester Eugenia Sierra Prada, la gobernación de Antioquia continua con el proceso legal para la adquisición del predio, este predio este liberado para intervención con aprovechamiento forestal y construcción de obras civiles, una vez se ha dado reinicio a los contratos de obra e interventoría (febrero 07 de 2024), se obtiene el permiso de intervención es este predio.

En el predio CP Corp. S.A.S, el día 19 de febrero de 2024, se realizó reunión con representante legal y propietario del predio, donde se socializaron las actividades civiles a realizar, se dieron a conocer detalles del tipo de muro de contención a construir, área necesaria de intervención durante el proceso constructivo. La conclusión de esta reunión es que se informara oportunamente al propietario la fecha de inicio de estas actividades, entregar relación del personal que ingresa al predio, iniciando con el cerramiento provisional, y haciendo aprovechamiento

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

forestal en tramos de 15m e ir construyendo muro de contención, esto por solicitud del propietario para disminuir el riesgo de seguridad para el predio.

En el siguiente grafico se relaciona el estado a la fecha de corte del presente informe, de los predios liberados y/o con permiso de intervención.

Durante este mes de abril, la gobernación de Antioquia ha remitido respuesta a solicitud de interventoría del día 14 de marzo de 2024 mediante oficio EPC-GS-IER6135-2.4-261-24 se solicita información actualización de la predial y acuerdos realizados con los propietarios en la etapa de gestión predial, a través del área social de interventoría, donde describen el estado de los predios y los compromisos con cada uno de los propietarios de los predios, se ha compartido esta información al área técnica para tener conocimiento y hacer seguimiento al contratista de obra para la ejecución de las actividades según acuerdos entre gobernación y propietarios.

Durante el mes de junio la gobernación de Antioquia ha informado verbalmente que el predio del señor Emmanuel Muñeton y Alto Group están libres para su intervención de aprovechamiento forestal y construcción de obras civiles.



Ver anexos – actas de reunión y otros - informe social.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
--	--	--

8.11. ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Siendo realizadas las exploraciones geotécnicas para en laboratorio conocer las características mecánicas del suelo, el consorcio El Retiro PG procedió a elaborar las propuestas estructurales como obras de contención, estas propuestas fueron presentadas por el constructor a interventoría, quien con el equipo de especialistas en geotécnica y estructuras, evaluaron y presentaron observaciones para respectivos ajustes a los estudios y diseños, siendo subsanadas por el consorcio El Retiro PG, y aprobados parcialmente por interventoría para continuar con la planificación e inicio de la construcción de las obras de contención, se cuenta con aprobación de geotecnia de 12 obras de contención, la interventoría ha solicitado al contratista de obra, realizar una nueva revisión en la dimensión de la estructura propuesta del muro 6, para contención de talud del predio señor Gabriel Dib, dado este cumplimiento a la solicitud, la revisión de este diseño la realizan los especialistas de interventoría.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha realizado seguimiento en obra a la ejecución de las actividades aprobadas mediante el contrato de adjudicación, A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista de obra consorcio El Retiro PG desde el día 01 de agosto al 31 de agosto de 2024.

- Muro 1: Construcción de módulo de cierre en K1+300 e instalación de filtro.
- Muro 3: Excavación y perfilamiento de terreno para implantación de muro.
- Muro 4: Bombeo de aguas y conformación de material para mejoramiento del suelo en ciclópeo sobre abscisa K1+720. Se realizaron excavaciones para la construcción de los módulos 11 y 12.
- Muro 5: Se realizaron excavaciones, perforación y llenado de pilotes, así como la fundición de vástagos y zapatas en muro de contención.
- Muro 7: Se continua con la construcción de filtro, se realiza disposición y compactación del material de lleno en la parte posterior del muro.

17

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	---	--

- Ente las abscisas K1+490 y K1+570 se realizó el montaje de bordillo en ciclorruta.
- Se ejecutó la instalación de tubería sanitaria entre las abscisas K2+195 a K2+230.
- Construcción de caja de empalme voz y datos sector Senior Fizebad.

9.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN

Según el flujo de inversión entregado a esta interventoría, a la fecha de corte el contratista llevaría un avance ejecutado de \$ 5.589.287.771,18 correspondiente al 47.80% (programado), y se cuenta con ejecución financiera del \$ 2.122.651.477 correspondiente al 18.12%, ejecución física de \$4.678.448.896 correspondiente al 43%, presentando un atraso del 4%, este seguimiento a la ejecución se realiza con el Cronograma de obra es la versión No. 14 presentado por el contratista de obra, para la prórroga aprobada de los 100 días.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

10. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.

Se relaciona correspondencia generada durante los días vigentes del contrato en el mes del periodo del presente informe.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO DEL CONTRATO

CONSECUTIVO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIRIGIDA A
358	1/08/2024	Caracterización material granular Tipo	CONSORCIO EL RETIRO PG
359	1/08/2024	Entrega de informes semanales N°46. Del 22 al 28 de Julio de 2024	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
360	1/08/2024	Solicitud entrega de información social y	CONSORCIO EL RETIRO PG
361	5/08/2024	Restablecimiento de buzones de PQRS.	CONSORCIO EL RETIRO PG
362	12/08/2024	Observaciones técnicas en obra	CONSORCIO EL RETIRO PG
363	12/08/2024	Entrega Informe Mensual N.11 Julio	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
364	12/08/2024	Remisión Comunicado	CONSORCIO EL RETIRO PG
365	14/08/2024	Solicitud soportes y/ o vales de los viajes de	CONSORCIO EL RETIRO PG
366	14/08/2024	Retiro de material vegetal de obra.	CONSORCIO EL RETIRO PG
367	14/08/2024	Respuesta a correo	CONSORCIO EL RETIRO PG
368	15/08/2024	Entrega APU_Alternativas constructivas_AC-28, AC-29, AC-30, AC-31, AC-32 y AC-33	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
369	21/08/2024	Dotación y EPP Imagen Corporativa.	CONSORCIO EL RETIRO PG
370	21/08/2024	Kits de Emergencias.	CONSORCIO EL RETIRO PG
371	21/08/2024	Retiro de material estéril y mala disposición en	CONSORCIO EL RETIRO PG
373	23/08/2024	Aprobación Prórroga y adición Contrato de Obra 4600015848	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
374	27/08/2024	Entrega de informes semanales N°49. Del 12 al 18 de Agosto de 2024	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
375	28/08/2024	Respuesta comunicado D-136-2024-41 – CONCEPTO REDISEÑO MURO 2 k01+440 (DER)	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
376	30/08/2024	Solicitud de Prórroga No. 3 y Adición No 3 Contrato de Interventoría N° 4600016135	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
377	29/08/2024	Entrega de informes semanales N°50. Del 20 al 24 de Agosto de 2024	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
378	29/08/2024	Retiro de material de excavación zona	CONSORCIO EL RETIRO PG
379	29/08/2024	Observaciones a la actividad de Instalación de	CONSORCIO EL RETIRO PG

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

Tabla 12. Correspondencia Enviada por Interventoría
Fuente: Elaboración Propia Emprociv S.A.S

10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO DEL CONTRATO

CONSECUTIVO COMUNICACIÓN	ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIRIGIDA A
correo	Alcaldia del Retiro	1/08/2024	Solicitud información movimiento	Yeny Perez
correo	Mincivil S.A.S	1/08/2024	Disposición final de RCD	Yeny Perez
D-147-2024-41	Consorcio el Retiro PG	8/08/2024	Reiteracion Aprobacion	Yeny Perez
D-148-2024-41	Consorcio el Retiro PG	8/08/2024	inexistencia de "Cable de aluminio	Yeny Perez
IF-D-28-24 U	SPT GEOTECNIA	8/08/2024	Entrega resultados de ensayos de	Yeny Perez
D-150-2024-41	Consorcio el Retiro PG	8/08/2024	Respuesta a su requerimiento para	Yeny Perez
TEC-41-049-2024E	Consorcio el Retiro PG	8/08/2024	Informe semanal semana 47	Yeny Perez
2024030291093	Gobernacion de Antioquia	8/08/2024	Solicitud de requerimiento de permisos y/o autorización para	Alba lucia Londoño
D-151-2024-41	Consorcio el Retiro PG	9/08/2024	Respuesta a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
D-153-2024-41	Consorcio el Retiro PG	9/08/2024	Respuesta a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
correo	Gobernacion de Antioquia	12/08/2024	Solicitud,peticion Emmanuel	Yeny Perez
D-154-2024-41	Consorcio el Retiro PG	15/08/2024	Entrega de alternativas	Yeny Perez
correo	Consorcio el Retiro PG	15/08/2024	Alternativas constructivas Julio	Yeny Perez
TEC-41-050-2024E	Consorcio el Retiro PG	15/08/2024	Informe semanal semana 48	Yeny Perez
D-155-2024-41	Consorcio el Retiro PG	16/08/2024	Solicitud de Adicion y prórroga-	Yeny Perez
correo	Gobernacion de Antioquia	20/08/2024	Informe favorable de Obra extra	Yeny Perez
D-156-2024-41	Consorcio el Retiro PG	20/08/2024	Entrega Acta de cobro N°10	Yeny Perez
correo	Gobernacion de Antioquia	21/08/2024	Solicitud de compartir "S48-2024	Yeny Perez
TEC-41-051-2024E	Consorcio el Retiro PG	21/08/2024	Informe semanal semana 49	Yeny Perez
correo	Consorcio el Retiro PG	22/08/2024	Información propuesta RASANTE	Yeny Perez
correo		22/08/2024	RV: Petición Segundo	Yeny Perez
D-157-2024-41	Consorcio el Retiro PG	22/08/2024	Alcance a comunicados D-90-2024-41,D95-2023-41,D-105-2024-41,D-110-	Nestor espinosa
D-152-2024-41	Consorcio el Retiro PG	26/08/2024	Respuesra a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
D-158-2024-41	Consorcio el Retiro PG	26/08/2024	Respuesra a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
D-159-2024-41	Consorcio el Retiro PG	26/08/2024	Respuesra a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
correo	Gobernacion de Antioquia	26/08/2024	Actas de Alternativas Constructivas	Yeny Perez
D-160-2024-41	Consorcio el Retiro PG	26/08/2024	respuesta a comunicado EPC-GS-	Yeny Perez
TEC-41-052-2024E	Consorcio el Retiro PG	28/08/2024	Informe semanal semana 50	Yeny Perez
D-161-2024-41	Consorcio el Retiro PG	29/08/2024	Alcance comunicado D-136-2024-	Yeny Perez
D-162-2024-41	Consorcio el Retiro PG	30/08/2024	solicitud de reajustes de precios a costo directo por cambio de	Nestor espinosa

Tabla 13. Correspondencia Recibida por Interventoría
Fuente: Elaboración Propia Emprociv S.A.S

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

1.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
<p>Foto N°1. Excavaciones para construcción y terminación de muro de contención N°1</p>	<p>Foto N°2. Instalación de acero de refuerzo zapata módulo de cierre muro de contención N°1</p>
	
<p>Foto N°3. Socialización de diseños y proceso constructivo con propietarios del predio colindante muro N°3</p>	<p>Foto N°4. Inicio de actividades para conformación de plataforma de acceso para entrada de maquinaria muro N°3</p>

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°5. Excavación y perfilamiento de terreno para implantación de muro N°3



Foto N°5. Excavación y retiro de material K1+740 muro de contención N°4



Foto N°7. Retiro de agua mediante bomba K1+740 muro de contención N°4



Foto N°8. Perforación y llenado de pilotes muro de contención N°5



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO 4600016135 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL -
LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO
DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12
01 de agosto al 31 de agosto de 2024



Foto N°9. Instalación de acero de refuerzo en zapatas de los módulos muro de contención N°5



Foto N°10. Vaciado de concreto en vástago y zapata de los módulos muro de contención N°5



Foto N°11. Chequeo de la distancia de separación de acero en vástago de muro N°5

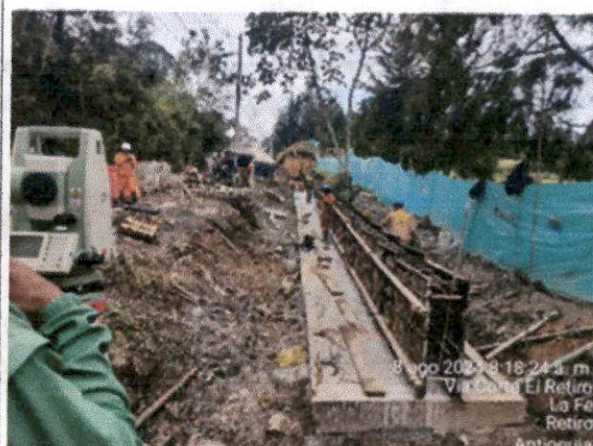


Foto N°12. Chequeo topográfico de alineamiento de vástago, marcación de niveles de terminado y levantamiento de la excavación realizada muro N°5

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°13. Se continua con la construcción de filtro en muro de contención N°7



Foto N°14. Excavaciones manuales para la instalación de tubería sanitaria K2+280



Foto N°15. Asistencia a visita por parte de la gobernación para revisión de acceso a predios de Alto Group y Emmanuel Muñetón



Foto N°16. Encofrado, vaciado de concreto y desencofrado de vástago en módulo de cierre muro de contención N°1



Foto N°17. Mejoramiento de suelo K1+740 muro de contención N°4



Foto N°18. Retiro de material saturado K1+740 muro de contención N°4



Foto N°19. Instalación de bordillo ciclorruta K1+490 - K1+570.



Foto N°20. Instalación de tubería sanitaria y construcción de caja para aguas residuales K2+290

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°21. Instalación de tubería de gas por parte de epm

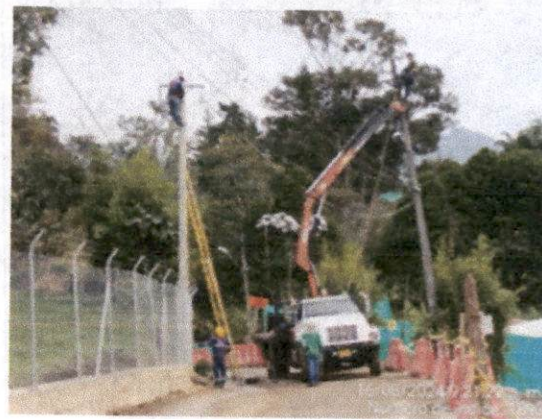


Foto N°22. Traslado de postes de energía



Foto N°23. Asistencia a comité de obra



Foto N°24. Asistencia a reunión de veeduría ciudadana



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO 4600016135 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL -
LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO
DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12
01 de agosto al 31 de agosto de 2024



Foto N°25. Marcación y excavación manual de micropilotes viga de confinamiento N°4



Foto N°26. Instalación de solado de limpieza para viga de confinamiento K1+610 viga de confinamiento N°4



Foto N°27. Construcción de ciclópeo K1+720 muro de contención N°4

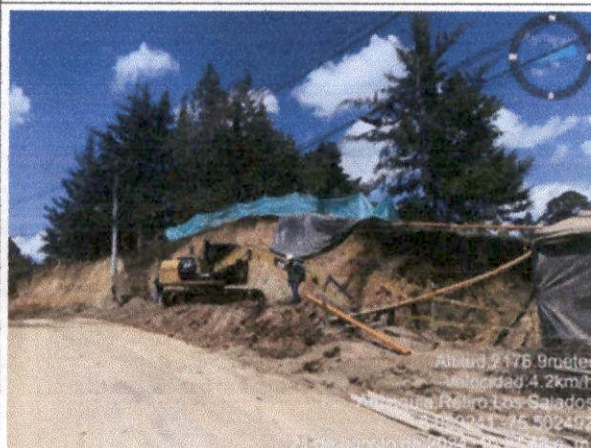


Foto N°28. Excavaciones y perforación de micropilotes para construcción de muro K1+900 muro de contención N°5

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°29. Recubrimiento con plástico, entibado y retiro de pilotes debido al deslizamiento de material en el talud muro de contención N°5



Foto N°30. Toma de muestra de cilindros del vástago módulo 17 muro de contención N°5



Foto N°31. Levantamiento topográfico de la excavación y construcción del muro de contención muro de contención N°5



Foto N°32. Se realiza disposición del material de lleno en la parte posterior del muro de contención N°7



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO 4600016135 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL -
LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO
DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12
01 de agosto al 31 de agosto de 2024



Foto N°33. Compactación del material de lleno en la parte posterior del muro de contención N°7



Foto N°34. Se realiza mejoramiento con Cal al material de afirmado dispuesto en la ciclorruta de muro de contención N°11



Foto N°35. Demolición de caja de aguas lluvias sector caballeriza K1+710



Foto N°36. Retiro de material de excavaciones K2+180

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--

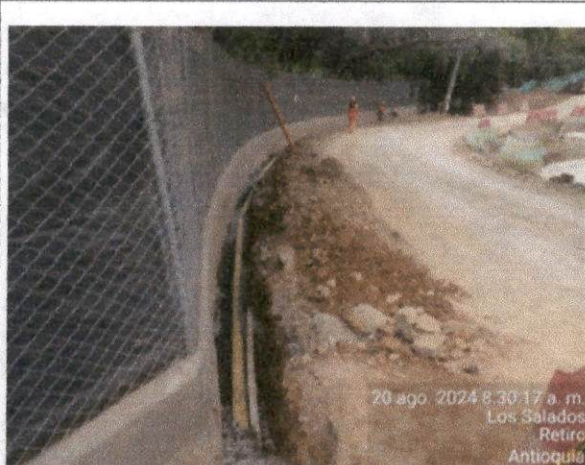


Foto N°37. Instalación de tubería sanitaria
K2+195 – K2+230



Foto N°38. Construcción de caja para empalme
de poste de energía K2+330

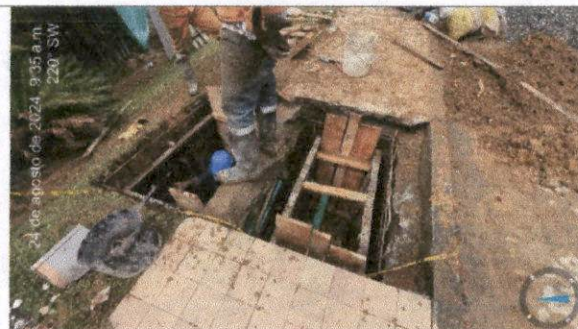


Foto N°39. Excavación e instalación de acero de
refuerzo para construcción de caja de voz y datos
K2+380



Foto N°40. Se realiza levantamiento topográfico
del acceso al predio Senior Fizebad



Foto N°41. Asistencia a comité de obra



Foto N°42. Instalación de filtro en módulo de cierre muro de contención N°1



Foto N°43. Excavaciones módulos 11 y 12 muro de contención N°4



Foto N°44. Rectificación de medidas ciclópeo K1+750 muro de contención N°4

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°45. Levantamiento topográfico muro de contención N°4



Foto N°46. Verificación de asentamiento concreto vástago módulo 15 muro de contención N°5



Foto N°47. Revisión de espaciamiento acero de refuerzo muro de contención N°5



Foto N°48. Deslizamiento talud muro de contención N°5



Foto N°49. Retiro de material resultante de
deslizamiento muro de contención N°5



Foto N°50. Instalación de acero de refuerzo en
viga de cerramiento, margen izquierda K1+300



Foto N°51. Construcción de sumidero e
instalación de tubería 10 pulgadas K1+350



Foto N°52. Excavaciones para construcción de
muro cierre en box K1+780

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024</p>	 <p>EMPROCIV S.A.S.</p>
---	--	--



Foto N°53. Retiro de material no apto para llenos y levantamiento topográfico para llenos de estructura en sector ciclorruta K2+260 – K2+290

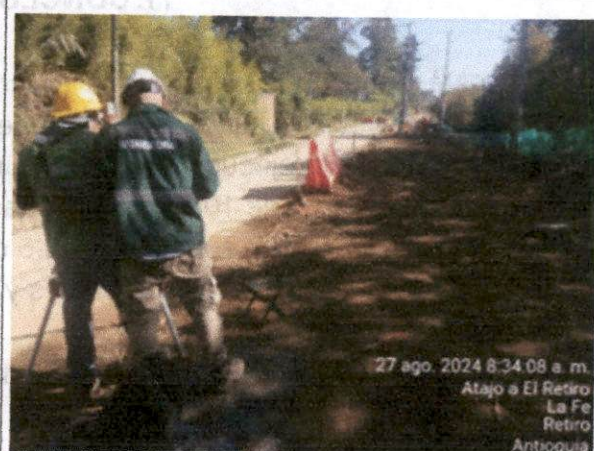


Foto N°54. Chequeo y marcación topográfica de sumidero sobre ciclorruta K2+280 - K2+360



Foto N°55. Limpieza de caja empalme poste de energía K2+330



Foto N°56. Desencofrado caja de empalme voz y datos sector Senior Fizebad

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
--	--	--

11. CONCLUSIONES

- Para este periodo se reporta una programación de 79,0% con una ejecución financiera del 50.8%, ejecución física del 66% evidenciando una diferencia del 13%, respecto a la ejecución física según Cronograma de Obra V14., aprobado para la Prórroga N.2 de 100 días calendario. La desviación se presenta dado que no se ha logrado iniciar con el muro N.5 correspondiente a ALTO-GROUP, Muro N.3 por ajuste a los diseños, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría.
- Durante este mes se registró el estado del clima durante las jornadas laborales, en el numeral 8.3. (Resumen estado del tiempo durante el desarrollo de la obra) del presente informe se reportó un 95.80% de clima seco, un 4,20% de lluvias con intensidad alta.
- El personal de interventoría propuesto hace presencia del 100% en el proyecto para actividades técnicas, administrativas, ambientales, financieras y legales de acuerdo con la dedicación contratada.
- Durante este periodo se realizaron dos (2) comités de obra para avaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el contratista de obra, interventoría y supervisión.
- La interventoría en mesas de trabajo programadas ha realizado revisión de las memorias de cálculo presentadas por el consorcio el Retiro PG para el respectivo tramite de las actas de pago, estas memorias correspondientes al acta No.10 – junio 2024.
- La interventoría hace seguimiento de control de calidad de las actividades desarrolladas como lo es toma de muestras de concreto premezclado, toma de muestras de la pasta de cemento inyectada para la construcción de micropilotes moldes que serán falladas a compresión.
- Se hace seguimiento a los llenos en Muro N.9 mediante toma de densidades de campo las cuales son liberadas para inicio de vaciado.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONTRATO 4600016135 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA No 12 01 de agosto al 31 de agosto de 2024	 EMPROCIV S.A.S.
---	---	---

- El grupo de profesionales de interventoría participa en reunión de veeduría realizada el día 02 y 16 de julio de 2024.
- Se recibe por parte del contratista solicitud de prorroga al 27 de febrero la cual se esta evaluando por parte de la Gobernación de Antioquia.
- Se hace entrega de los informes de seguimiento de la interventoría para el trámite de las actas de costos N.8 y N.9.
- Se hace seguimiento al trámite de actas de costos de interventoría 7, 8 y 9.
- Se hace seguimiento a las alternativas constructivas presentadas a supervisión para aprobación.

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN
VER EXPEDIENTE FISICO

