

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Belén de los Andaquíes y Morelia del Departamento de Caquetá del Programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”



INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 05
PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:

4318 DE 2023 – OAC LOS ALETONES
4045 DE 2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
4346 DE 2023 – OAC CAMPOALEGRE


PERIODO:

DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

Tipo de Documento: INFORME TÉCNICO	Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA 4879 DE 2023	
Título: INFORME MENSUAL No 5. AGOSTO/2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
Emitido para: Aprobación		
ELABORÓ: Ing. Residente	Firma:	
	Nombre:	Ing. Diego Fernando Gallego Calderon C. C. No. 1.006.524.418 de Belén de los Andaques M P No. 091037 0644694 CND
REVISÓ: Ing. Director	Firma:	
	Nombre:	Ing. Elkin David Ramos Mosquera C. C. No. 7.692.245 de NEIVA M P No. 19202 61820 CAU
APROBÓ: Supervisor	Firma:	
	Nombre:	José Ricardo Burbano Barcenás



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(VER A CONTINUACIÓN FORMATO: *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023 4045 DE 2023 4346 DE 2023	Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE
Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023	Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA


Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
----------------	--

INFORME MENSUAL No. 5	MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024
------------------------------	--------------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4-6
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7-13
	CONTENIDO		14-17
1	INTRODUCCIÓN		18-20
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		21
2.1	Localización		21-26
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		27
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		27-29
2.4	Características técnicas del proyecto		29-41
3	INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS		42
3.1	Información general de convenios solidarios		42-52
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		53-63
3.3	Seguimiento ítems no previstos		63
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		63-65
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS		66
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	66
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	67
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	67
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	67-68
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	68
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	68-69
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	69
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	69
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		70
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		70
	• Seguimiento programa de obra		70-73
4.10	• Actas de comité de obra		73
4.11	• Actas de reunión		73
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		74
5.1	Información general del contrato		74-77
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		78
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		79
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	79
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	79
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	79
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	79
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		79
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	79
7	Conclusiones y recomendaciones		80
8	Anexos		81-85
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		86-106
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		107-120
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		121-186
8.4	Informes semanales		187-214
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		215-221
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		222-230
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		231-240
8.8	Estado general del tiempo		241-247
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		248-254

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023 4045 DE 2023 4346 DE 2023		Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE	
Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023		Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
INFORME MENSUAL No. 5		MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		255-264
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		265-271
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		272-279
8.13	Seguimiento programa de obra		280-286
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		287-292
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		293-296
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		297-298
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contratos de interventoría		299-302
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		303-304
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.			
Firma: Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(VER A CONTINUACIÓN FORMATO: *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION	1
				PÁGINA	

FECHA		2/09/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	---

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA	PERIODO MES:	01/08/2024 AL 31/08/2024
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	4318 DE 2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 196.378.598,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 196.378.598,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
----------------------------	--------------	--------------	----------------------------	---	-------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																	
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>102</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ML	Mejoramiento	102	Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros			MEJORAMIENTO			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ML		Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros				MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																			
Pavimentación	Construcción	ML																																																																			
	Mejoramiento	102																																																																			
	Rehabilitación																																																																				
Estructuras	Túneles																																																																				
	Puentes																																																																				
	Pontones																																																																				
Mantenimiento																																																																					
Otros																																																																					
MEJORAMIENTO																																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																		
Pavimentación	Construcción	ML																																																																			
	Mejoramiento																																																																				
	Rehabilitación																																																																				
Estructuras	Túneles																																																																				
	Puentes																																																																				
	Pontones																																																																				
Mantenimiento																																																																					
Otros																																																																					
MEJORAMIENTO																																																																					

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 147.803.248,00	\$ -	\$ 147.803.248,00	OBRAS	\$ 48.711.354,00	\$ -	\$ 48.711.354,00	\$ 100.244.493,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 44.141.253,00	\$ -	\$ 44.141.253,00	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.080.858,30	\$ -	\$ 2.080.858,30	\$ 10.546.079,30
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.434.097,00	\$ -	\$ 4.434.097,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 196.378.598,00	\$ -	\$ 196.378.598,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				VALOR EJECUTADO	\$ 50.792.212,30	\$ -	\$ 50.792.212,30	\$ 110.790.572,30

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 140.214.318,97	MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 91.431.520,00	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	24,841%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 2/09/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA RIOSTRA Y HUELLA



FUNDIDA IN SITU DE CONCRETO 3000 PSI EN HUELLA Y VIGA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																							
				VERSION	1																																																																																							
				PÁGINA																																																																																								
FECHA					2/09/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024																																																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: 4045 DE 2023			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																									
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 185.171.800,00																																																																																							
			FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																																							
			FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 185.171.800,00																																																																																							
			FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																							
			PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																							
CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023			INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>5</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros				MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	5	<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros					MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	3	3					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																									
Pavimentación	Construcción																																																																																											
	Mejoramiento																																																																																											
	Rehabilitación																																																																																											
Estructuras	Túneles																																																																																											
	Puentes																																																																																											
	Pontones																																																																																											
Mantenimiento																																																																																												
Otros																																																																																												
MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	5																																																																																									
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																								
Pavimentación	Construcción																																																																																											
	Mejoramiento																																																																																											
	Rehabilitación																																																																																											
Estructuras	Túneles																																																																																											
	Puentes																																																																																											
	Pontones																																																																																											
Mantenimiento																																																																																												
Otros																																																																																												
MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	3	3																																																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 138.939.422,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 138.939.422,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>COSTOS DE ADMINISTRACIÓN</td><td>\$ 42.064.195,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 42.064.195,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ 4.168.183,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 4.168.183,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 185.171.800,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 185.171.800,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 138.939.422,00	\$ -	\$ 138.939.422,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 42.064.195,00	\$ -	\$ 42.064.195,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.168.183,00	\$ -	\$ 4.168.183,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 185.171.800,00	\$ -	\$ 185.171.800,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>COSTOS DE ADMINISTRACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																									
OBRAS	\$ 138.939.422,00	\$ -	\$ 138.939.422,00																																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 42.064.195,00	\$ -	\$ 42.064.195,00																																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.168.183,00	\$ -	\$ 4.168.183,00																																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 185.171.800,00	\$ -	\$ 185.171.800,00																																																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																								
OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																												
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 144.921.005,83				MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 133.016.746,00				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6																																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -6,429%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5																																																																																								
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13																																																																																								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 2/09/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE ALETAS 3000 PSI



FUNDIDA DE POCETA 3000 PSI

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION	1
				PÁGINA	

FECHA				2/09/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
-------	--	--	--	---	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA	PERIODO MES:	01/08/2024 AL 31/08/2024
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	4346 DE 2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 199.753.948,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 199.753.948,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
----------------------------	--------------	--------------	----------------------------	---	-------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																					
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td><td>102</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>UN</td><td>1</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ML	102	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros				MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN	1	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEJORAMIENTO</td><td>ALCANTARILLAS</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ML			Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros					MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN		
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																						
Pavimentación	Construcción	ML	102																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																								
	Rehabilitación																																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento																																																																																									
Otros																																																																																									
MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN	1																																																																																						
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																					
Pavimentación	Construcción	ML																																																																																							
	Mejoramiento																																																																																								
	Rehabilitación																																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento																																																																																									
Otros																																																																																									
MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN																																																																																							

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 151.067.610,00	\$ -	\$ 151.067.610,00	OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 44.154.310,00	\$ -	\$ 44.154.310,00	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.532.028,00	\$ -	\$ 4.532.028,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.753.948,00	\$ -	\$ 199.753.948,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	MANO DE OBRA CALIFICADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA	2/09/2024
	(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto



CORTE DE TALUD PARA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE



Foto



INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	18
	ANTECEDENTES	20
	FINALIDAD DEL PROYECTO	20
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	21
2.1.	LOCALIZACIÓN GENERAL	21
	2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS.....	21
2.2.	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	27
	2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	27
	A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES.....	27
	B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES	28
	C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE.....	28
	2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS	29
3.	INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS	42
	3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS	42
➤	CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023	42
	➤ CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023	46
	➤ CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	50
	3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	53
	3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS.....	63
	3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	63
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS	66
	4.1. INFORME SEMANAL	66
	4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....	67
	4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....	67
	4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS	67
	4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	68
	4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	68
	4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS	69
	4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS...69	
	4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL.....	70
	➤ SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO	70
	➤ SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.....	70
	4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	73

	4.11. ACTAS DE REUNIÓN	73
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	74
	5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	74
	5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	78
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	79
	6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	79
	6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	79
	6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.....	79
	6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	79
	6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	79
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	80
8.	ANEXOS	81
	8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	81
	8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318.....	81
	8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045	81
	8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346.....	81
	8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS ..81	
	8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318	81
	8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045	81
	8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346	81
	8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO	81
	8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318	81
	8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	81
	8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346	81
	8.4. INFORMES SEMANALES	81

8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318	81
8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045	81
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346	81
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS	81
8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318.....	81
8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045	81
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346....	81
8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....	82
8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318.....	82
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045	82
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346.....	82
8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS	82
8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318	82
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	82
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346	82
8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....	82
8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318.....	82
8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	82
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346.....	82
8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	82
8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318	82
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	82
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346	82
8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS	82


8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318	82
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	82
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346	82
8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS	83
8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318	83
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	83
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346	83
8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS	83
8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318.....	83
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045	83
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346.....	83
8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA	83
8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318	83
8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....	83
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346	83
8.14. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	83
8.15. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	83
8.16. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	83
8.17. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	83
8.18. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO	83

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**", hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor BENITO OME MUÑOZ de la JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.
- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor LUIS ELVER CAANTILLO PATIÑO de ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.
- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023



VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, encabezada por el señor JESUS OME RENTERIA de la JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, los cultivos ilícitos y aprovechamientos forestales.

Debido el aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas, las trochas son intervenidas con maquinarias pesada para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, una de las principales actividades económicas de la región que afectan la transitabilidad y aspecto de estas.

El programa caminos para la paz pretende ayudar a la transformación de nuestros campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías terciarias con el objetivo de regenerar las comunicaciones, comercio y acceso a bienes básicos como la salud y educación de estas veredas.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá se localiza en el Sur del país, haciendo parte de la región Amazonia. Cuenta con una superficie de 88.965 Km², es el tercer departamento más extenso. Su capital es la ciudad de Florencia, y está dividido política y administrativamente en 16 municipios; dos de ellos son los municipios de Belén de los Andaquies y Morelia en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de Belén de los Andaquies se encuentra localizado en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia. Se encuentra en la Zona de transición Andino-Amazónica. En este municipio Se desprende la cordillera Oriental de los Andes Colombianos del Macizo Colombiano. Entre sus paisajes se encuentran el de montaña, piedemonte, lomeríos y valles. Su cabecera municipal se encuentra localizada sobre las coordenadas 1°24'59" latitud Norte y 75°52'21" a una altitud de 310 m s. n. m.

En cuanto al municipio de Morelia se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia y al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 1°29'25" de latitud norte y 75°43'43" de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46468 hectáreas (464.7 km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- VEREDA LOS ALETONES (CS # 4318 - 2023)

El tramo a intervenir de Placa Huella se encuentra ubicado en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda Los Aletones, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda Aletones en Km 11+450 de la vía Tramo Los Mosquera, con coordenadas iniciales 1,48793 N ; - 75,86604 W, y punto final de coordenadas 1,48851 N- 75,86735 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link “Microsoft bing”.

<https://www.bing.com/maps?osid=ebdd4dd3-54ae-4426-9c87-2888ad8574f4&cp=1.488768%7E-75.865319&lvl=17.5&v=2&sV=2&form=S00027&style=h>




Ilustración 1. Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.

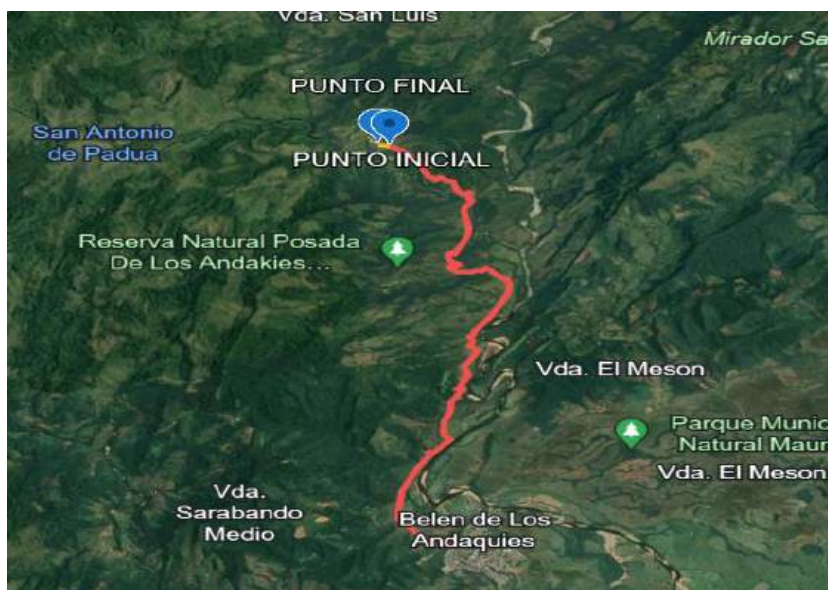


Ilustración 2. Ubicación del proyecto en la Vereda Los Aletones.



Ilustración 3. Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Los Aletones.

- ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES (CS # 4045 - 2023)

Los puntos a intervenir de Alcantarillas se encuentran ubicados en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda El Porvenir, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda El Porvenir en Km 2+400 de la vía Tramo Génova, con coordenadas iniciales 1,42528 N; - 75,88028 W, y punto final de coordenadas 1,44111 N; - 75,87000 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

<https://www.bing.com/maps?osid=395e39ac-09e7-4d8c-bc15-5c781dcf6238&cp=1.43193%7E-75.866188&lvl=14.7&v=2&sV=2&form=S00027>



Ilustración 4. Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.



Ilustración 5. Ubicación del proyecto ASOJUNTAS BELEN en la Vereda El Porvenir.

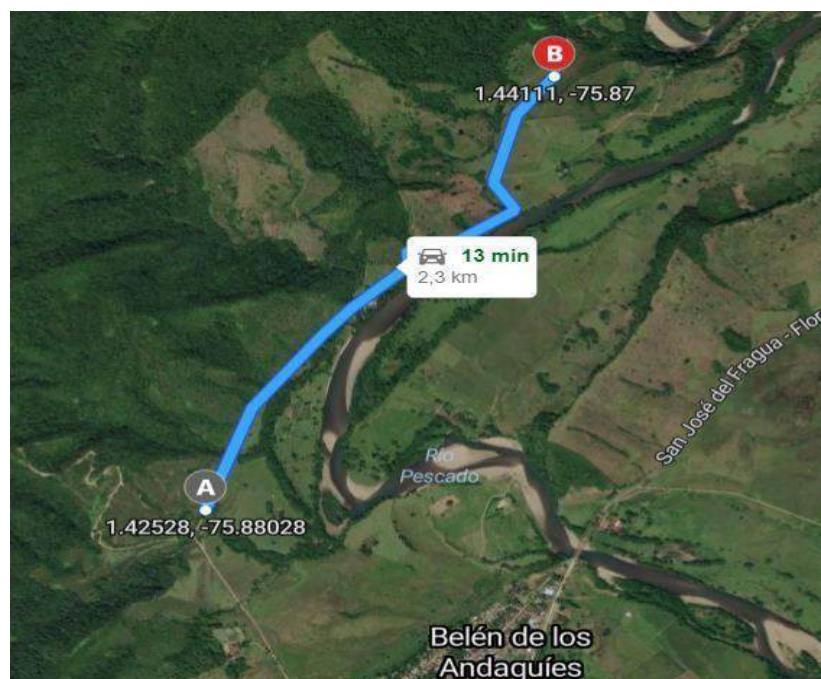


Ilustración 6. Tramo de Alcantarillas de intervención en la Vereda El Porvenir.

- VEREDA CAMPOALEGRE (CS # 4346 - 2023)

Los puntos a intervenir de Alcantarilla y Placa Huella se encuentran ubicados en el Se encuentra ubicados en el municipio de Morelia Caquetá en la vereda Campoalegre, teniendo como punto de referencia inicial el PR 21+000 de la vía Morelia – Valparaíso, con coordenadas iniciales 1,31611 N; - 75,69974 W, y punto final de coordenadas 1,31416 N; - 75,69173 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link “Microsoft bing”.

<https://www.bing.com/maps?osid=40c04c60-c5b6-498e-a7ae-c62470f7a743&cp=1.315309%7E-75.700997&lvl=16.8&v=2&sV=2&form=S00027>

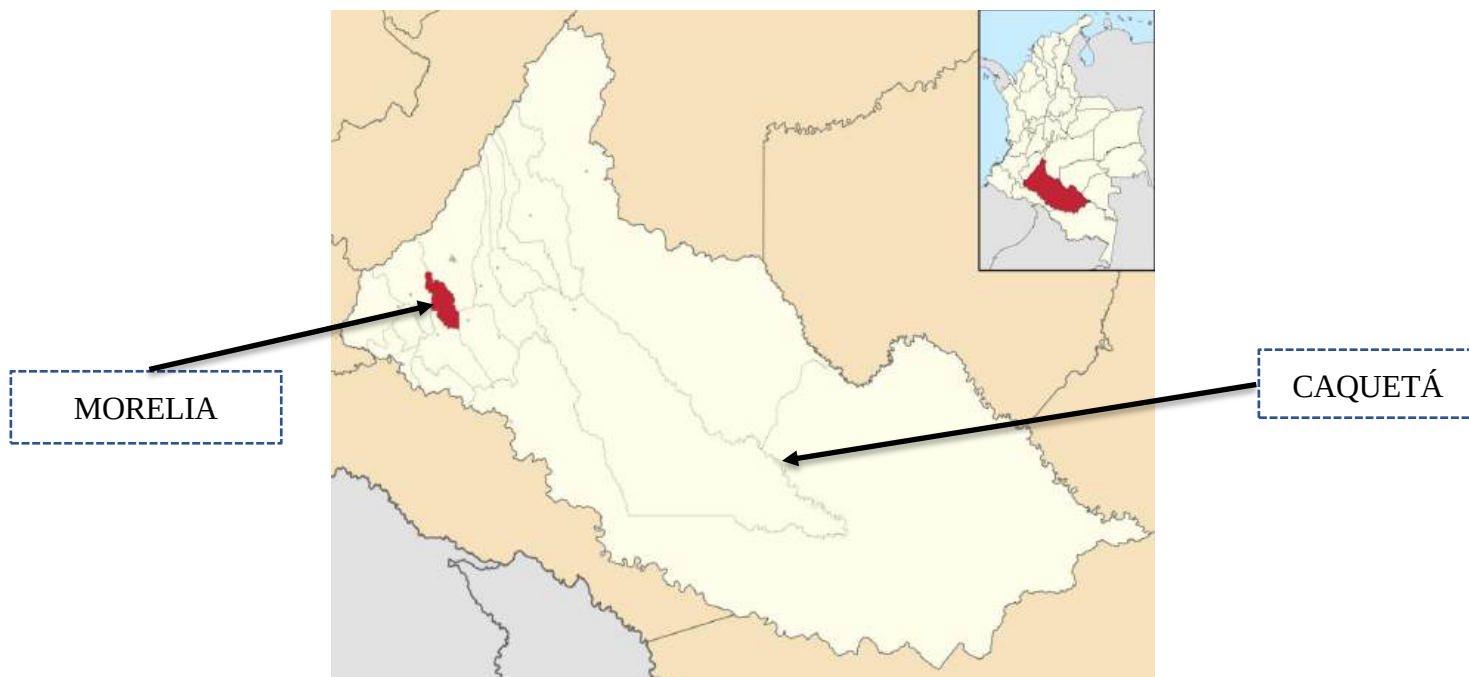


Ilustración 7. Localización municipio de Morelia en el departamento del Caquetá.



Ilustración 8. Ubicación del proyecto en la Vereda Campoalegre.

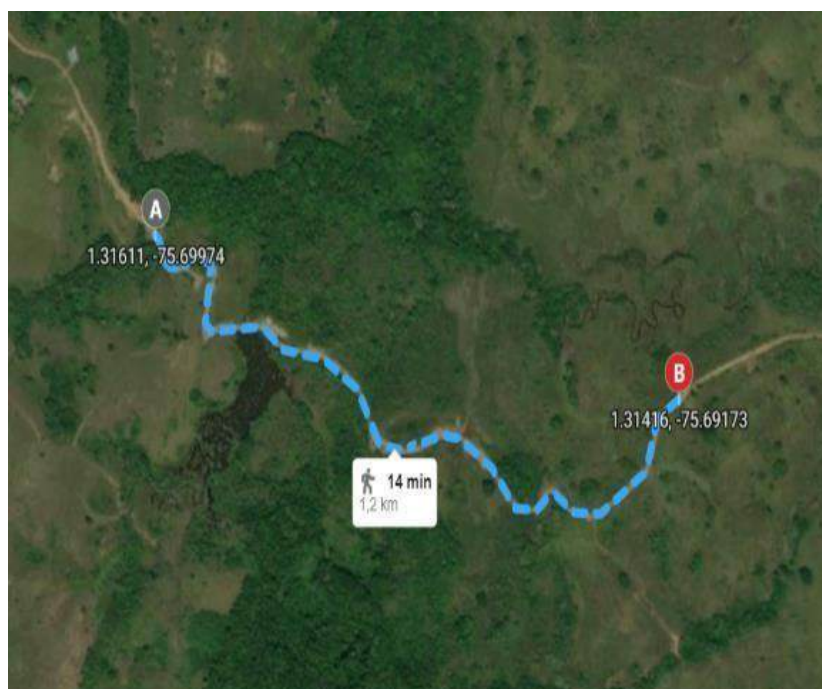


Ilustración 9. Tramo de placa huella y alcantarilla de intervención en la Vereda Campoalegre.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Belén de los Andaquies en sus veredas Aletones, El Porvenir, San Luis, San Antonio, Las Minas, El Prado y Los Ángeles, en el municipio de Morelia en sus Veredas Campo Alegre, Fuente Hermosa, Virginia y Rochela. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a las comunidades una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, la cual ocupa un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía terciaria, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES

➤ INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Los Aletones*

➤ ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir llamado Los Mosquera actualmente se ha convertido en un punto crítico que dificulta el acceso y el tránsito de vehículos o motocicletas hacia las diferentes zonas veredales del municipio. Una de las principales causas de esta problemática se genera en épocas de invierno principalmente por la composición del suelo tipo arcilloso que suelen presentar un alto porcentaje de saturación de humedad provocando una afectación directa al estado de la vía. Debido esto se requiere una intervención directa a través de un mejoramiento a la estructura de la vía y pavimentación mediante el sistema

de placa huella con el fin de mejorar la movilidad y el transporte de los diferentes productos agrícolas comercializados en la zona con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento económico en el área rural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

➤ INVENTARIO

En el tramo de intervención se evidencian alcantarillas en concreto reforzado y tramos de placa huella por sectores.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Regular	8
Placa Huella	Regular	500 m

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención – Asojuntas Belén de los Andaquies*

➤ ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Los puntos a intervenir se encuentran por nombre vía Génova – La abeja, los cuales presentan diversos puntos críticos en diferentes tramos principalmente por el mal manejo y drenaje de aguas lluvias en épocas de inviernos que provocan la pérdida de los finos, socavación, derrumbes entre otros afectando la movilidad y el tránsito vial de los habitantes, productos agrícolas, etc. Por lo tanto, se requiere la necesidad de realizar mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje existentes (cunetas y alcantarillas) además de construir o implementar nuevas obras de canalización y desagües en puntos críticos a lo largo de la vía. De esta manera se busca mitigar el impacto y daños de la vía por causas de las fuertes lluvias.

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE

➤ INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Campoalegre*

➤ ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir se encuentra en un estado general de la superficie como una vía carretable que presenta irregularidades del terreno a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias, los cuales impiden la transitabilidad de fácil acceso en épocas de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es variable entre 5 a 6 m aproximadamente. Se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Aletones, Campoalegre y la Asociación comunal de juntas del municipio de Belén de los Andaquies, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LOS ALETONES (CS#4318 DE 2023)**

La organización de acción comunal de la vereda Los Aletones tiene como alcance la construcción de ciento dos (102) metros lineales de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	<ul style="list-style-type: none"> - Desmante y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

Figura 169: Esquema o plano de placa huella. El diagrama muestra varias vistas de una placa huella: una sección transversal (Corte B-B), una sección longitudinal (Corte A), una vista de la riostra y una vista de la cuneta. Las dimensiones incluyen anchos variables, espesores de concreto (0.15m, 0.20m, 0.25m) y materiales granulares o suelo cemento (0.15m). Se indica un gancho a 135° para el refuerzo.

CANTIDADES DE OBRA POR CADA 100 m DE VÍA (ANCHO DE BANCA 4.5 m)

CONCRETO F=21 Mpa (m ³)	CONCRETO CICLOPEO (m ³)	ACERO DE REFUERZO (kg)	MATERIAL GRANULAR COMPACTADO O SUELO CEMENTO (m ³)
87.0	13.0	2005	65

DETALLES ORIGINALES - REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUDINAL (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
3	0.54	0.08	0.08	0.56

NOTAS:



- EL CONCRETO PARA LA BERMÁ, CUNETA, VIGA RIOSTRA Y EN LOS TIELOS O PLACAS HUELLAS, DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 21 MPa, Y DEBE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO INV-502-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL IVIAS.
- EL CONCRETO CICLOPEO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 14 MPa Y DEBE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO INV-502-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL IVIAS.
- EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PLACA DEBE TENER UN PUNDO YULIA Y ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO INV-502-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL IVIAS.
- EL SUELO CEMENTO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCOMPUISA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DÍAS DE CURADO Y DEBE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS INV-502-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL IVIAS.
- LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O APUNDO DEBE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS INV-502-13, INV-502-15 E INV-502-17 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL IVIAS.
- PARA EL DISEÑO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE DEBE EMPLEAR MATERIAL RESISTENTE O FRAGMENTADO, CUYAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DEL IVIAS (M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37, M-38, M-39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47, M-48, M-49, M-50, M-51, M-52, M-53, M-54, M-55, M-56, M-57, M-58, M-59, M-60, M-61, M-62, M-63, M-64, M-65, M-66, M-67, M-68, M-69, M-70, M-71, M-72, M-73, M-74, M-75, M-76, M-77, M-78, M-79, M-80, M-81, M-82, M-83, M-84, M-85, M-86, M-87, M-88, M-89, M-90, M-91, M-92, M-93, M-94, M-95, M-96, M-97, M-98, M-99, M-100, M-101, M-102, M-103, M-104, M-105, M-106, M-107, M-108, M-109, M-110, M-111, M-112, M-113, M-114, M-115, M-116, M-117, M-118, M-119, M-120, M-121, M-122, M-123, M-124, M-125, M-126, M-127, M-128, M-129, M-130, M-131, M-132, M-133, M-134, M-135, M-136, M-137, M-138, M-139, M-140, M-141, M-142, M-143, M-144, M-145, M-146, M-147, M-148, M-149, M-150, M-151, M-152, M-153, M-154, M-155, M-156, M-157, M-158, M-159, M-160, M-161, M-162, M-163, M-164, M-165, M-166, M-167, M-168, M-169, M-170, M-171, M-172, M-173, M-174, M-175, M-176, M-177, M-178, M-179, M-180, M-181, M-182, M-183, M-184, M-185, M-186, M-187, M-188, M-189, M-190, M-191, M-192, M-193, M-194, M-195, M-196, M-197, M-198, M-199, M-200, M-201, M-202, M-203, M-204, M-205, M-206, M-207, M-208, M-209, M-210, M-211, M-212, M-213, M-214, M-215, M-216, M-217, M-218, M-219, M-220, M-221, M-222, M-223, M-224, M-225, M-226, M-227, M-228, M-229, M-230, M-231, M-232, M-233, M-234, M-235, M-236, M-237, M-238, M-239, M-240, M-241, M-242, M-243, M-244, M-245, M-246, M-247, M-248, M-249, M-250, M-251, M-252, M-253, M-254, M-255, M-256, M-257, M-258, M-259, M-260, M-261, M-262, M-263, M-264, M-265, M-266, M-267, M-268, M-269, M-270, M-271, M-272, M-273, M-274, M-275, M-276, M-277, M-278, M-279, M-280, M-281, M-282, M-283, M-284, M-285, M-286, M-287, M-288, M-289, M-290, M-291, M-292, M-293, M-294, M-295, M-296, M-297, M-298, M-299, M-300, M-301, M-302, M-303, M-304, M-305, M-306, M-307, M-308, M-309, M-310, M-311, M-312, M-313, M-314, M-315, M-316, M-317, M-318, M-319, M-320, M-321, M-322, M-323, M-324, M-325, M-326, M-327, M-328, M-329, M-330, M-331, M-332, M-333, M-334, M-335, M-336, M-337, M-338, M-339, M-340, M-341, M-342, M-343, M-344, M-345, M-346, M-347, M-348, M-349, M-350, M-351, M-352, M-353, M-354, M-355, M-356, M-357, M-358, M-359, M-360, M-361, M-362, M-363, M-364, M-365, M-366, M-367, M-368, M-369, M-370, M-371, M-372, M-373, M-374, M-375, M-376, M-377, M-378, M-379, M-380, M-381, M-382, M-383, M-384, M-385, M-386, M-387, M-388, M-389, M-390, M-391, M-392, M-393, M-394, M-395, M-396, M-397, M-398, M-399, M-400, M-401, M-402, M-403, M-404, M-405, M-406, M-407, M-408, M-409, M-410, M-411, M-412, M-413, M-414, M-415, M-416, M-417, M-418, M-419, M-420, M-421, M-422, M-423, M-424, M-425, M-426, M-427, M-428, M-429, M-430, M-431, M-432, M-433, M-434, M-435, M-436, M-437, M-438, M-439, M-440, M-441, M-442, M-443, M-444, M-445, M-446, M-447, M-448, M-449, M-450, M-451, M-452, M-453, M-454, M-455, M-456, M-457, M-458, M-459, M-460, M-461, M-462, M-463, M-464, M-465, M-466, M-467, M-468, M-469, M-470, M-471, M-472, M-473, M-474, M-475, M-476, M-477, M-478, M-479, M-480, M-481, M-482, M-483, M-484, M-485, M-486, M-487, M-488, M-489, M-490, M-491, M-492, M-493, M-494, M-495, M-496, M-497, M-498, M-499, M-500, M-501, M-502, M-503, M-504, M-505, M-506, M-507, M-508, M-509, M-510, M-511, M-512, M-513, M-514, M-515, M-516, M-517, M-518, M-519, M-520, M-521, M-522, M-523, M-524, M-525, M-526, M-527, M-528, M-529, M-530, M-531, M-532, M-533, M-534, M-535, M-536, M-537, M-538, M-539, M-540, M-541, M-542, M-543, M-544, M-545, M-546, M-547, M-548, M-549, M-550, M-551, M-552, M-553, M-554, M-555, M-556, M-557, M-558, M-559, M-560, M-561, M-562, M-563, M-564, M-565, M-566, M-567, M-568, M-569, M-570, M-571, M-572, M-573, M-574, M-575, M-576, M-577, M-578, M-579, M-580, M-581, M-582, M-583, M-584, M-585, M-586, M-587, M-588, M-589, M-590, M-591, M-592, M-593, M-594, M-595, M-596, M-597, M-598, M-599, M-600, M-601, M-602, M-603, M-604, M-605, M-606, M-607, M-608, M-609, M-610, M-611, M-612, M-613, M-614, M-615, M-616, M-617, M-618, M-619, M-620, M-621, M-622, M-623, M-624, M-625, M-626, M-627, M-628, M-629, M-630, M-631, M-632, M-633, M-634, M-635, M-636, M-637, M-638, M-639, M-640, M-641, M-642, M-643, M-644, M-645, M-646, M-647, M-648, M-649, M-650, M-651, M-652, M-653, M-654, M-655, M-656, M-657, M-658, M-659, M-660, M-661, M-662, M-663, M-664, M-665, M-666, M-667, M-668, M-669, M-670, M-671, M-672, M-673, M-674, M-675, M-676, M-677, M-678, M-679, M-680, M-681, M-682, M-683, M-684, M-685, M-686, M-687, M-688, M-689, M-690, M-691, M-692, M-693, M-694, M-695, M-696, M-697, M-698, M-699, M-700, M-701, M-702, M-703, M-704, M-705, M-706, M-707, M-708, M-709, M-710, M-711, M-712, M-713, M-714, M-715, M-716, M-717, M-718, M-719, M-720, M-721, M-722, M-723, M-724, M-725, M-726, M-727, M-728, M-729, M-730, M-731, M-732, M-733, M-734, M-735, M-736, M-737, M-738, M-739, M-740, M-741, M-742, M-743, M-744, M-745, M-746, M-747, M-748, M-749, M-750, M-751, M-752, M-753, M-754, M-755, M-756, M-757, M-758, M-759, M-760, M-761, M-762, M-763, M-764, M-765, M-766, M-767, M-768, M-769, M-770, M-771, M-772, M-773, M-774, M-775, M-776, M-777, M-778, M-779, M-780, M-781, M-782, M-783, M-784, M-785, M-786, M-787, M-788, M-789, M-790, M-791, M-792, M-793, M-794, M-795, M-796, M-797, M-798, M-799, M-800, M-801, M-802, M-803, M-804, M-805, M-806, M-807, M-808, M-809, M-810, M-811, M-812, M-813, M-814, M-815, M-816, M-817, M-818, M-819, M-820, M-821, M-822, M-823, M-824, M-825, M-826, M-827, M-828, M-829, M-830, M-831, M-832, M-833, M-834, M-835, M-836, M-837, M-838, M-839, M-840, M-841, M-842, M-843, M-844, M-845, M-846, M-847, M-848, M-849, M-850, M-851, M-852, M-853, M-854, M-855, M-856, M-857, M-858, M-859, M-860, M-861, M-862, M-863, M-864, M-865, M-866, M-867, M-868, M-869, M-870, M-871, M-872, M-873, M-874, M-875, M-876, M-877, M-878, M-879, M-880, M-881, M-882, M-883, M-884, M-885, M-886, M-887, M-888, M-889, M-890, M-891, M-892, M-893, M-894, M-895, M-896, M-897, M-898, M-899, M-900, M-901, M-902, M-903, M-904, M-905, M-906, M-907, M-908, M-909, M-910, M-911, M-912, M-913, M-914, M-915, M-916, M-917, M-918, M-919, M-920, M-921, M-922, M-923, M-924, M-925, M-926, M-927, M-928, M-929, M-930, M-931, M-932, M-933, M-934, M-935, M-936, M-937, M-938, M-939, M-940, M-941, M-942, M-943, M-944, M-945, M-946, M-947, M-948, M-949, M-950, M-951, M-952, M-953, M-954, M-955, M-956, M-957, M-958, M-959, M-960, M-961, M-962, M-963, M-964, M-965, M-966, M-967, M-968, M-969, M-970, M-971, M-972, M-973, M-974, M-975, M-976, M-977, M-978, M-979, M-980, M-981, M-982, M-983, M-984, M-985, M-986, M-987, M-988, M-989, M-990, M-991, M-992, M-993, M-994, M-995, M-996, M-997, M-998, M-999, M-1000, M-1001, M-1002, M-1003, M-1004, M-1005, M-1006, M-1007, M-1008, M-1009, M-1010, M-1011, M-1012, M-1013, M-1014, M-1015, M-1016, M-1017, M-1018, M-1019, M-1020, M-1021, M-1022, M-1023, M-1024, M-1025, M-1026, M-1027, M-1028, M-1029, M-1030, M-1031, M-1032, M-1033, M-1034, M-1035, M-1036, M-1037, M-1038, M-1039, M-1040, M-1041, M-1042, M-1043, M-1044, M-1045, M-1046, M-1047, M-1048, M-1049, M-1050, M-1051, M-1052, M-1053, M-1054, M-1055, M-1056, M-1057, M-1058, M-1059, M-1060, M-1061, M-1062, M-1063, M-1064, M-1065, M-1066, M-1067, M-1068, M-1069, M-1070, M-1071, M-1072, M-1073, M-1074, M-1075, M-1076, M-1077, M-1078, M-1079, M-1080, M-1081, M-1082, M-1083, M-1084, M-1085, M-1086, M-1087, M-1088, M-1089, M-1090, M-1091, M-1092, M-1093, M-1094, M-1095, M-1096, M-1097, M-1098, M-1099, M-1100, M-1101, M-1102, M-1103, M-1104, M-1105, M-1106, M-1107, M-1108, M-1109, M-1110, M-1111, M-1112, M-1113, M-1114, M-1115, M-1116, M-1117, M-1118, M-1119, M-1120, M-1121, M-1122, M-1123, M-1124, M-1125, M-1126, M-1127, M-1128, M-1129, M-1130, M-1131, M-1132, M-1133, M-1134, M-1135, M-1136, M-1137, M-1138, M-1139, M-1140, M-1141, M-1142, M-1143, M-1144, M-1145, M-1146, M-1147, M-1148, M-1149, M-1150, M-1151, M-1152, M-1153, M-1154, M-1155, M-1156, M-1157, M-1158, M-1159, M-1160, M-1161, M-1162, M-1163, M-1164, M-1165, M-1166, M-1167, M-1168, M-1169, M-1170, M-1171, M-1172, M-1173, M-1174, M-1175, M-1176, M-1177, M-1178, M-1179, M-1180, M-1181, M-1182, M-1183, M-1184, M-1185, M-1186, M-1187, M-1188, M-1189, M-1190, M-1191, M-1192, M-1193, M-1194, M-1195, M-1196, M-1197, M-1198, M-1199, M-1200, M-1201, M-1202, M-1203, M-1204, M-1205, M-1206, M-1207, M-1208, M-1209, M-1210, M-1211, M-1212, M-1213, M-1214, M-1215, M-1216, M-1217, M-1218, M-1219, M-1220, M-1221, M-1222, M-1223, M-1224, M-1225, M-1226, M-1227, M-1228, M-1229, M-1230, M-1231, M-1232, M-1233, M-1234, M-1235, M-1236, M-1237, M-1238, M-1239, M-1240, M-1241, M-1242, M-1243, M-1244, M-1245, M-1246, M-1247, M-1248, M-1249, M-1250, M-1251, M-1252, M-1253, M-1254, M-1255, M-1256, M-1257, M-1258, M-1259, M-1260, M-1261, M-1262, M-1263, M-1264, M-1265, M-1266, M-1267, M-1268, M-1269, M-1270, M-1271, M-1272, M-1273, M-1274, M-1275, M-1276, M-1277, M-1278, M-1279, M-1280, M-1281, M-1282, M-1283, M-1284, M-1285, M-1286, M-1287, M-1288, M-1289, M-1290, M-1291, M-1292, M-1293, M-1294, M-1295, M-1296, M-1297, M-1298, M-1299, M-1300, M-1301, M-1302, M-1303, M-1304, M-1305, M-1306, M-1307, M-1308, M-1309, M-1310, M-1311, M-1312, M-1313, M-1314, M-1315, M-1316, M-1317, M-1318, M-1319, M-1320, M-1321, M-1322, M-1323, M-1324, M-1325, M-1326, M-1327, M-1328, M-1329, M-1330, M-1331, M-1332, M-1333, M-1334, M-1335, M-1336, M-1337, M-1338, M-1339, M-1340, M-1341, M-1342, M-1343, M-1344, M-1345, M-1346, M-1347, M-1348, M-1349, M-1350, M-1351, M-1352, M-1353, M-1354, M-1355, M-1356, M-1357, M-1358, M-1359, M-1360, M-1361, M-1362, M-1363, M-1364, M-1365, M-1366, M-1367, M-1368, M-1369, M-1370, M-1371, M-1372, M-1373, M-1374, M-1375, M-1376, M-1377, M-1378, M-1379, M-1380, M-1381, M-1382, M-1383, M-1384, M-1385, M-1386, M-1387, M-1388, M-1389, M-1390, M-1391, M-1392, M-1393, M-1394, M-1395, M-1396, M-1397, M-1398, M-1399, M-1400, M-1401, M-1402, M-1403, M-1404, M-1405, M-1406, M-1407, M-1408, M-1409, M-1410, M-1411, M-1412, M-1413, M-1414, M-1415, M-1416, M-1417, M-1418, M-1419, M-1420, M-1421, M-1422, M-1423, M-1424, M-1425, M-1426, M-1427, M-1428, M-1429, M-1430, M-1431, M-1432, M-1433, M-1434, M-1435, M-1436, M-1437, M-1438, M-1439, M-1440, M-1441, M-1442, M-1443, M-1444, M-1445, M-1446, M-1447, M-1448, M-1449, M-1450, M-1451, M-1452, M-1453, M-1454, M-1455, M-1456, M-1457, M-1458, M-1459, M-1460, M-1461, M-1462, M-1463, M-1464, M-1465, M-1466, M-1467, M-1468, M-1469, M-1470, M-1471, M-1472, M-1473, M-1474, M-1475, M-1476, M-1477, M-1478, M-1479, M-1480, M-1481, M-1482, M-1483, M-1484, M-1485, M-1486, M-1487, M-1488, M-1489, M-1490, M-1491, M-1492, M-1493, M-1494, M-1495, M-1496, M-1497, M-1498, M-1499, M-1500, M-1501, M-1502, M-1503, M-1504, M-1505, M-1506, M-1507, M-1508, M-1509, M-1510, M-1511, M-1512, M-1513, M-1514, M-1515, M-1516, M-1517, M-1518, M-1519, M-1520, M-1521, M-1522, M-1523, M-1524, M-1525, M-1526, M-1527, M-1528, M-1529, M-1530, M-1531, M-1532, M-1533, M-1534, M-1535, M-1536, M-1537, M-1538, M-1539, M-1540, M-1541, M-1542, M-1543, M-1544, M-1545, M-1546, M-1547, M-1548, M-1549, M-1550, M-1551, M-1552, M-1553, M-1554, M-1555, M-1556, M-1557, M-1558, M-1559, M-1560, M-1561, M-1562, M-1563, M-1564, M-1565, M-1566, M-1567, M-1568, M-1569, M-1570, M-1571, M-1572, M-1573, M-1574, M-1575, M-1576, M-1577, M-1578, M-1579, M-1580, M-1581, M-1582, M-1583, M-1584, M-1585, M-1586, M-1587, M-1588, M-1589, M-1590, M-1591, M-1592, M-1593, M-1594, M-1595, M-1596, M-1597, M-1598, M-1599, M-1600, M-1601, M-1602, M-1603, M-1604, M-1605, M-1606, M-1607, M-1608, M-1609, M-1610, M-1611, M-1612, M-1613, M-1614, M-1615, M-1616, M-1617, M-1618, M-1619, M-1620, M-1621, M-1622, M-1623, M-1624, M-1625, M-1626, M-1627, M-1628, M-1629, M-1630, M-1631, M-1632, M-1633, M-1634, M-1635, M-1636, M-1637, M-1638, M-1639, M-1640, M-1641, M-1642, M-1643, M-1644, M-1645, M-1646, M-1647, M-1648, M-1649, M-1650, M-1651, M-1652, M-1653, M-1654, M-1655, M-1656, M-1657, M-1658, M-1659, M-1660, M-1661, M-1662, M-1663, M-1664, M-1665, M-1666, M-1667, M-1668, M-1669, M-1670, M-1671, M-1672, M-1673, M-1674, M-1675, M-1676, M-1677, M-1678, M-1679, M-1680, M-1681, M-1682, M-1683, M-1684, M-1685, M-1686, M-1687, M-1688, M-1689, M-1690, M-1691, M-1692, M-1693, M-1694, M-1695, M-1696, M-1697, M-1698, M-1699, M-1700, M-1701, M-1702, M-1703, M-1704, M-1705, M-



- **ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES (CS#4045 DE 2023)**

La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies tiene como alcance la construcción de cinco (5) alcantarillas.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS
ACTIVIDADES A REALIZAR:	<ul style="list-style-type: none"> - Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

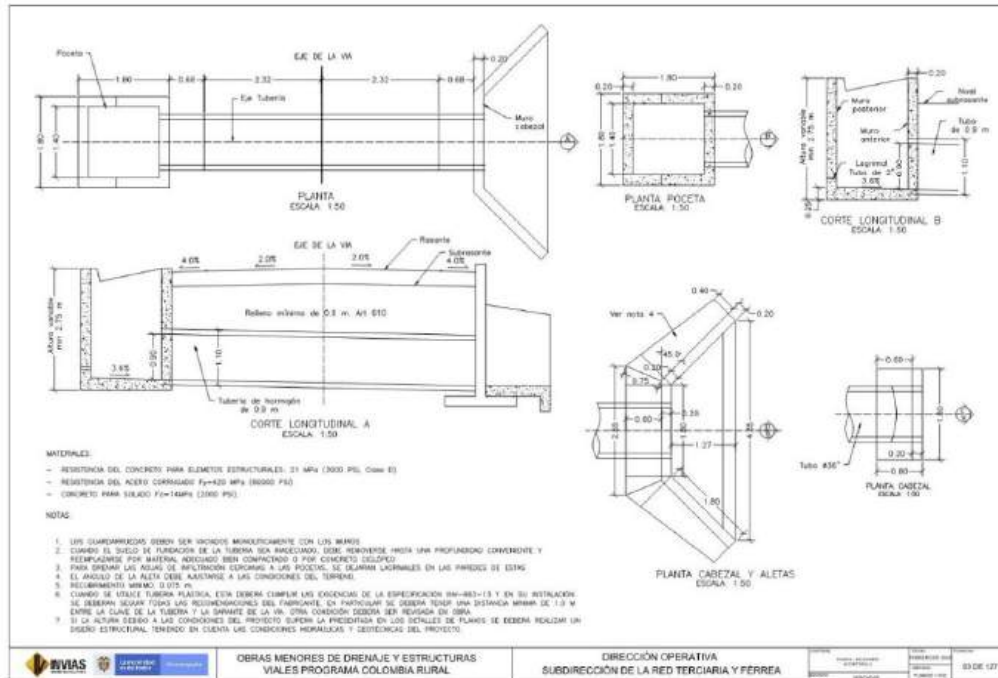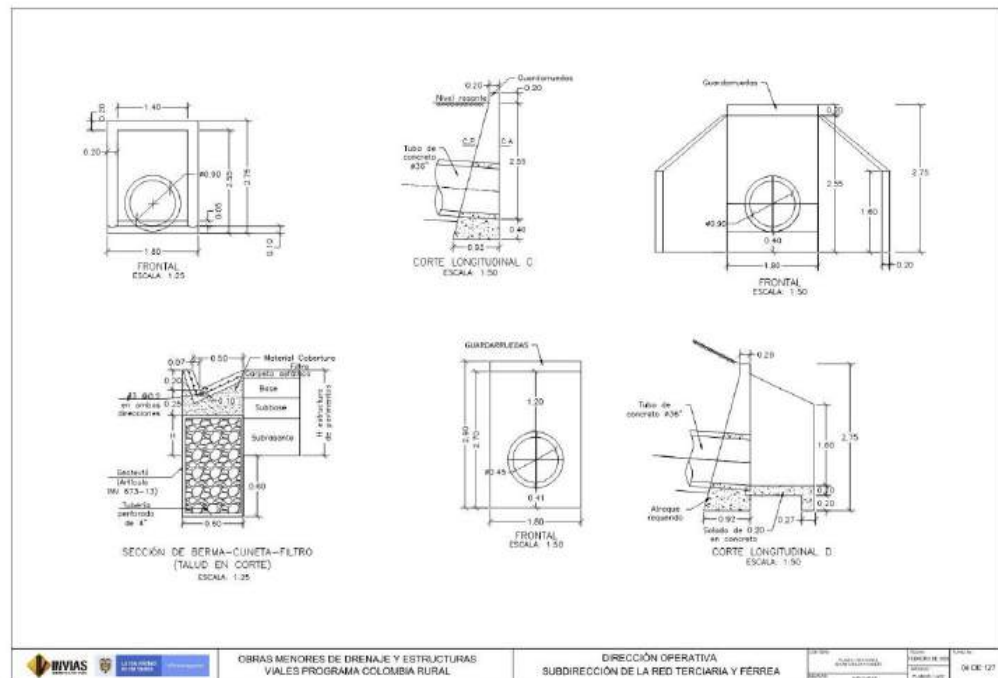

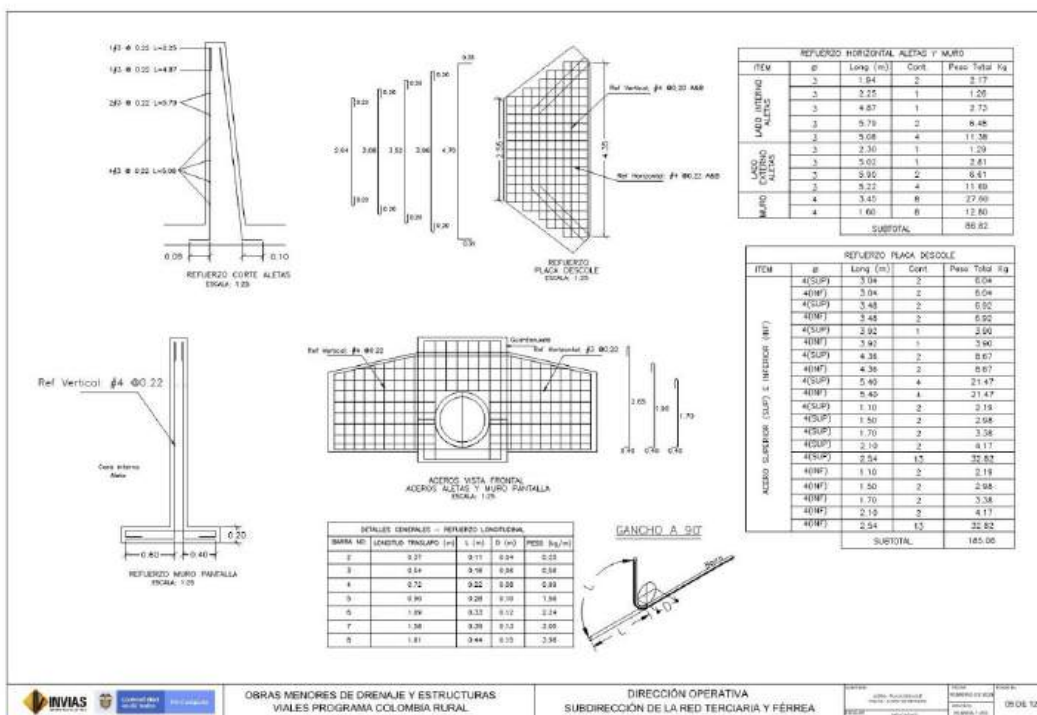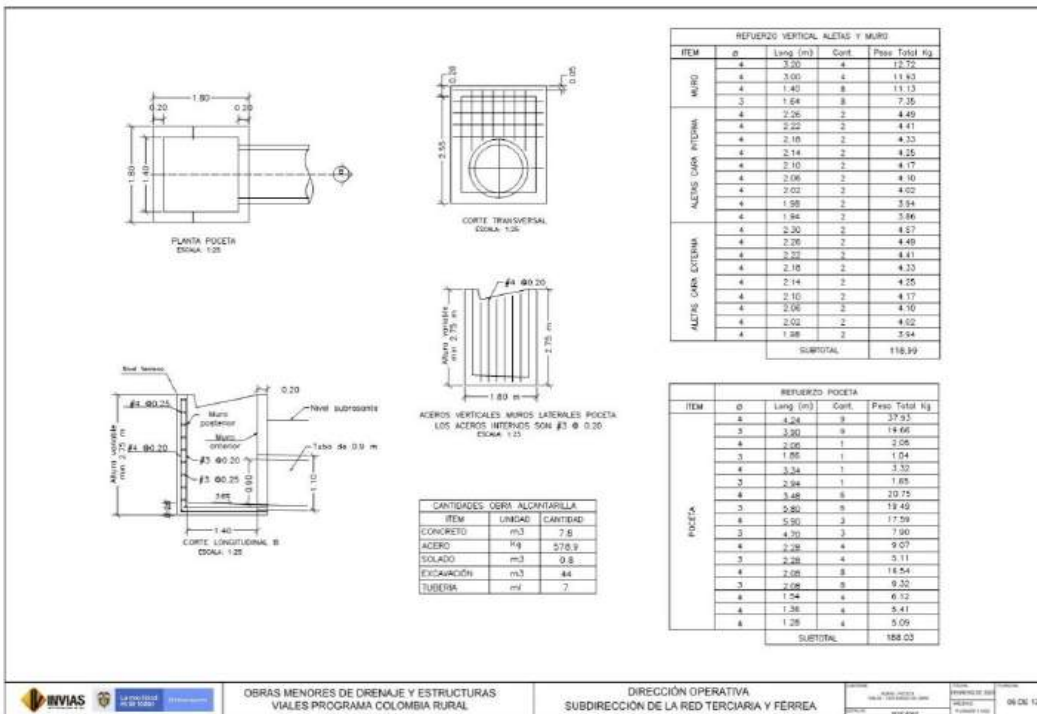


- **JAC CAMPOALEGRE (CS#4346 DE 2023)**



La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.



CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	PLACA HUELLA
	<ul style="list-style-type: none"> - Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	<ul style="list-style-type: none"> - Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

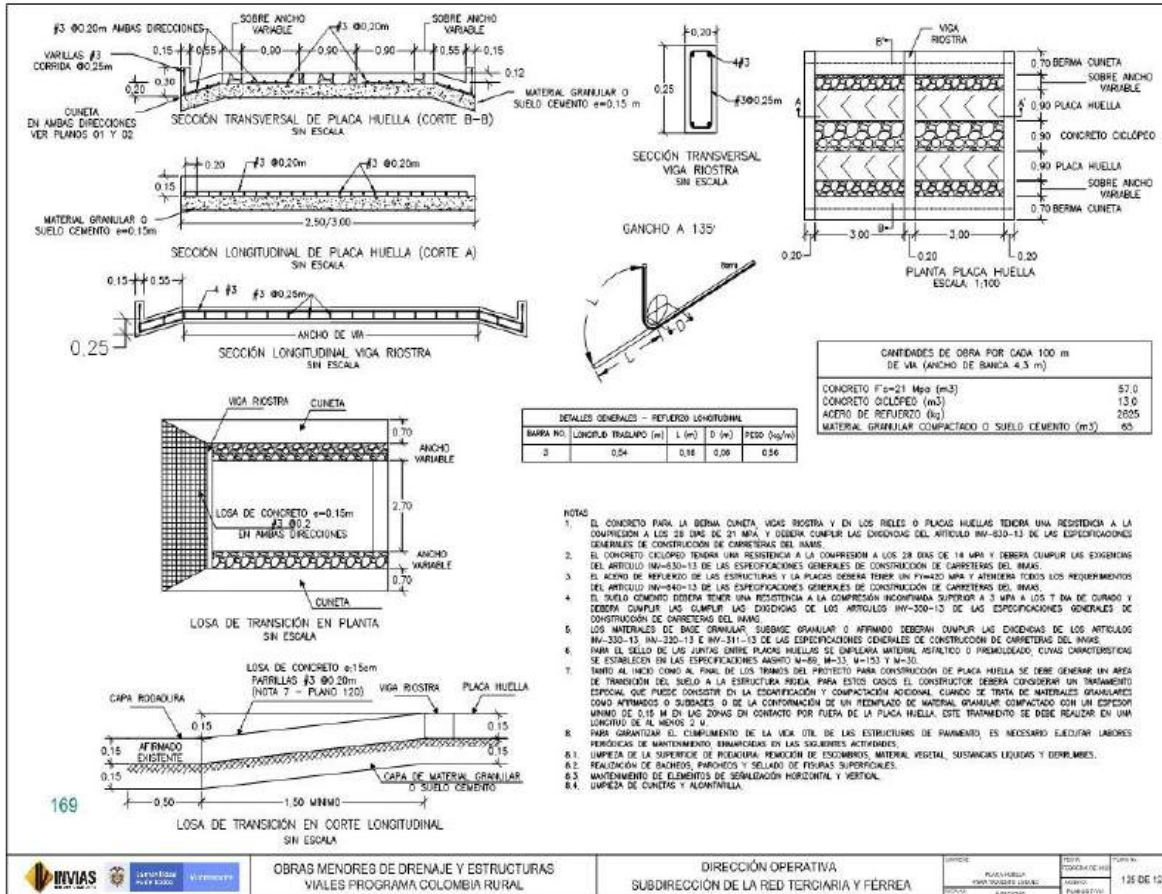

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

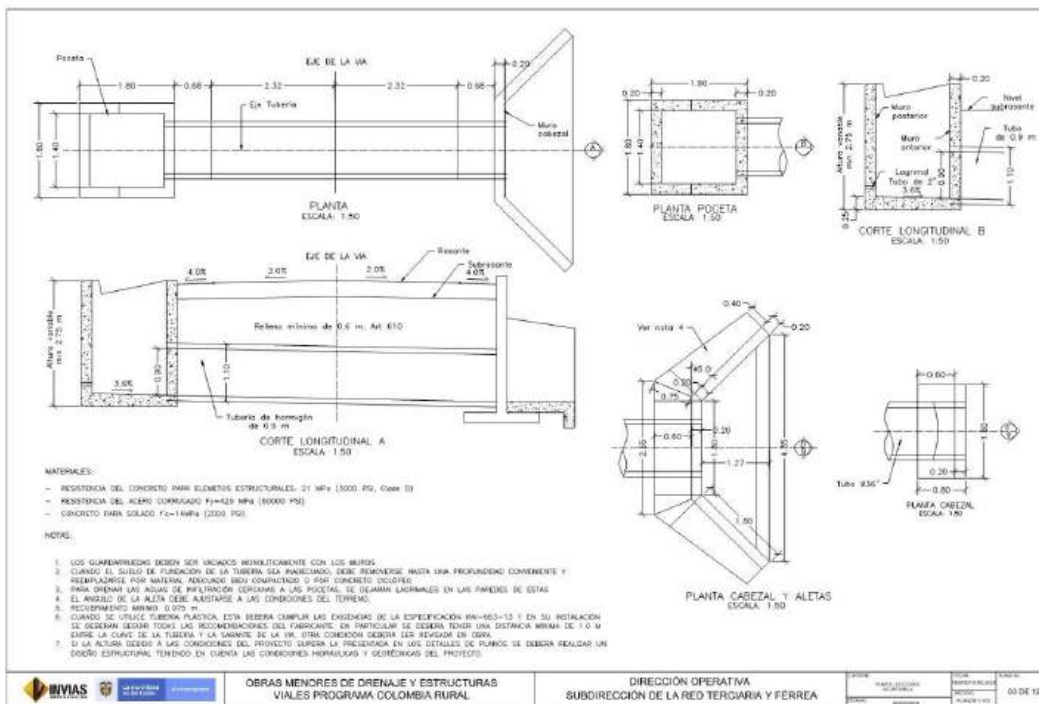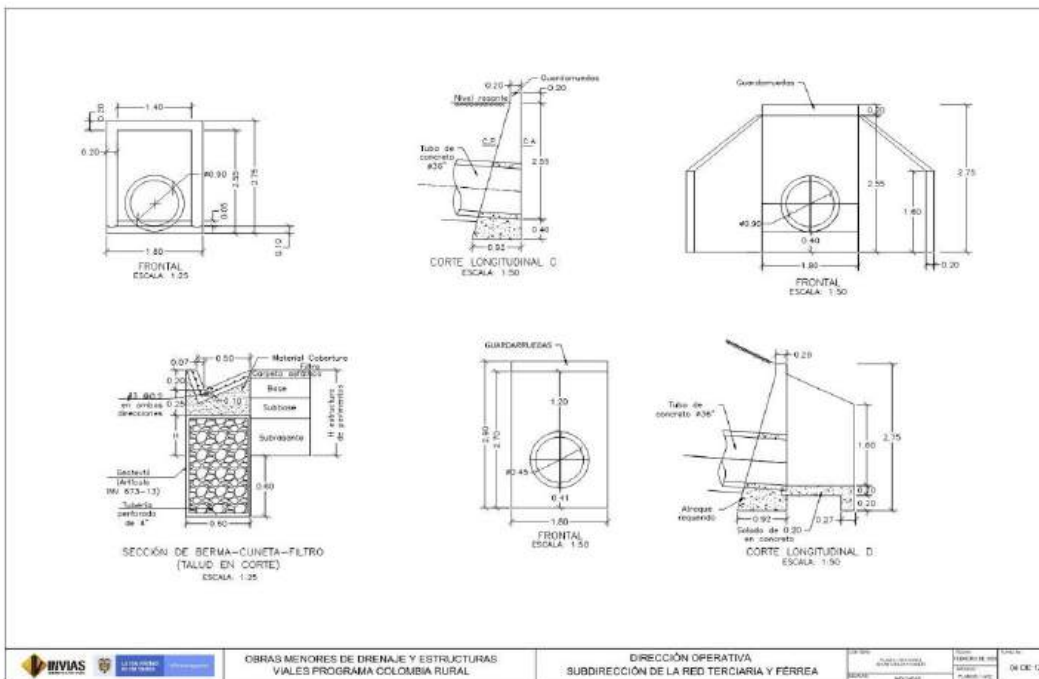

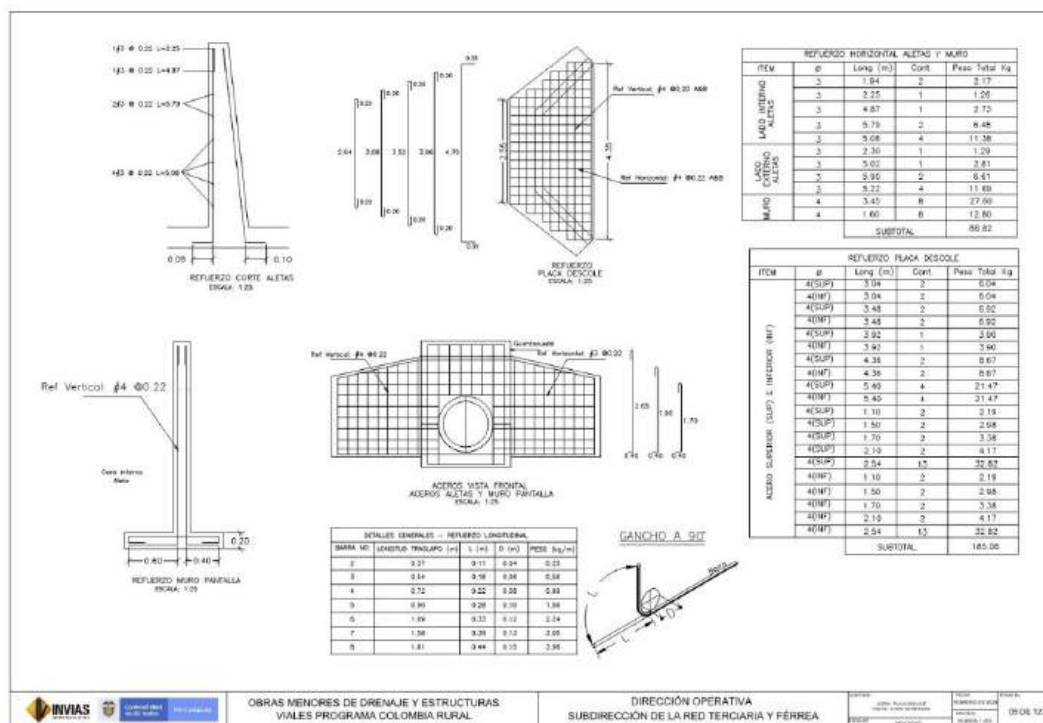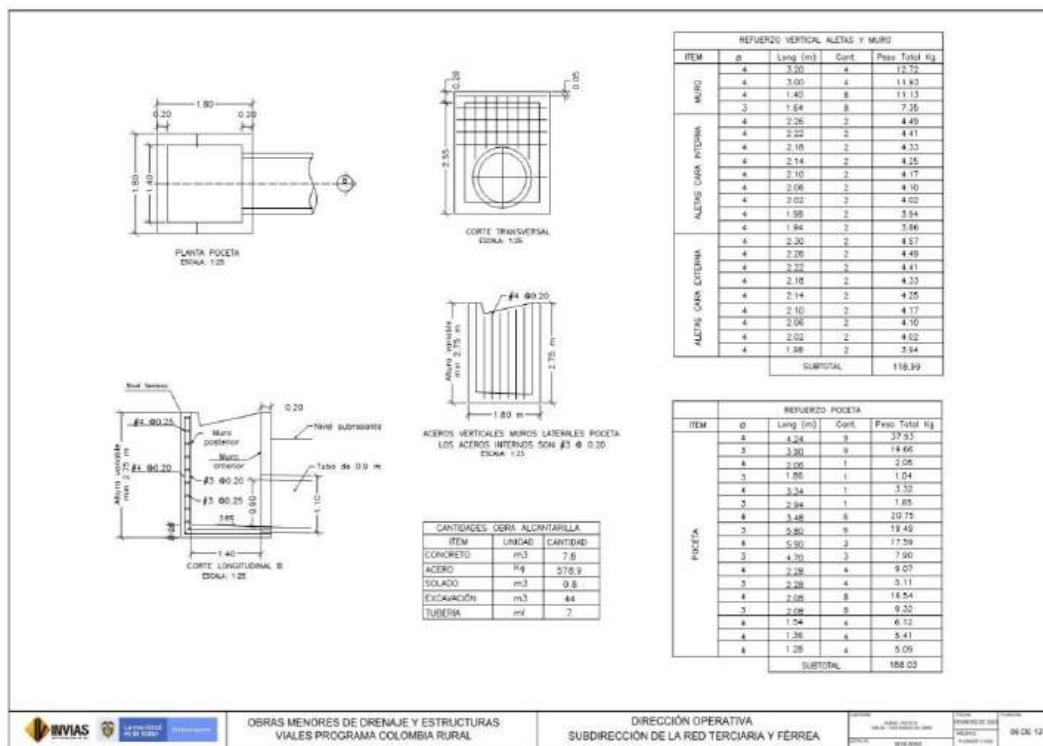


- **JAC CAMPOALEGRE (CS#4346 DE 2023)**



La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.



CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	PLACA HUELLA
	<ul style="list-style-type: none"> - Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	<ul style="list-style-type: none"> - Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

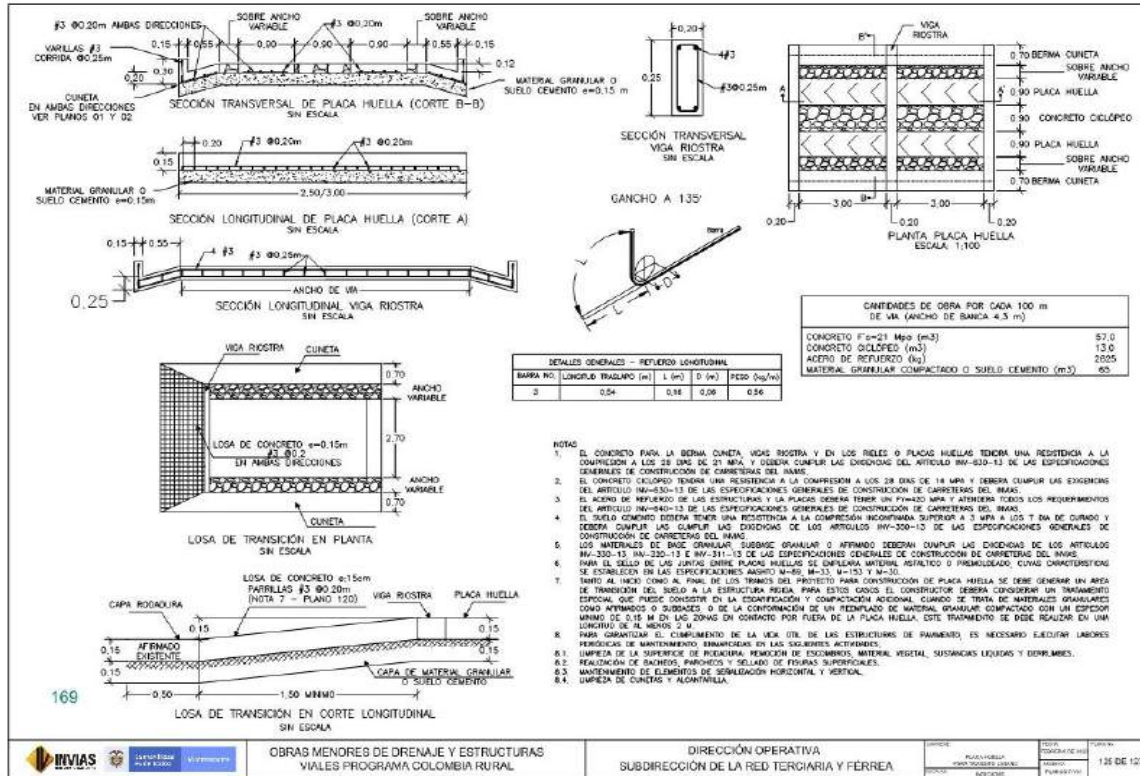

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

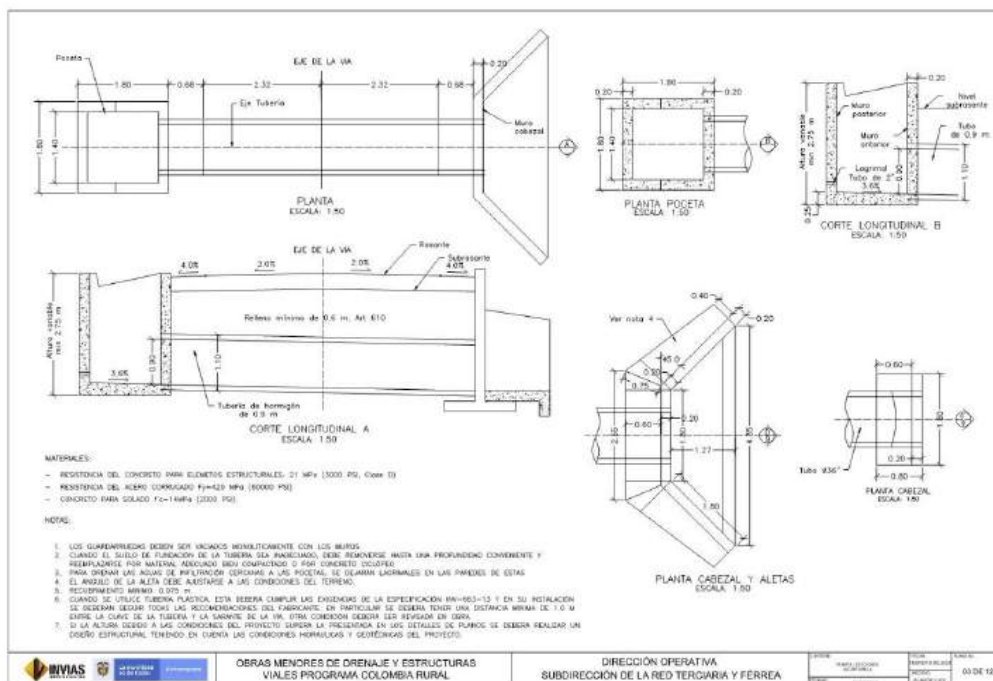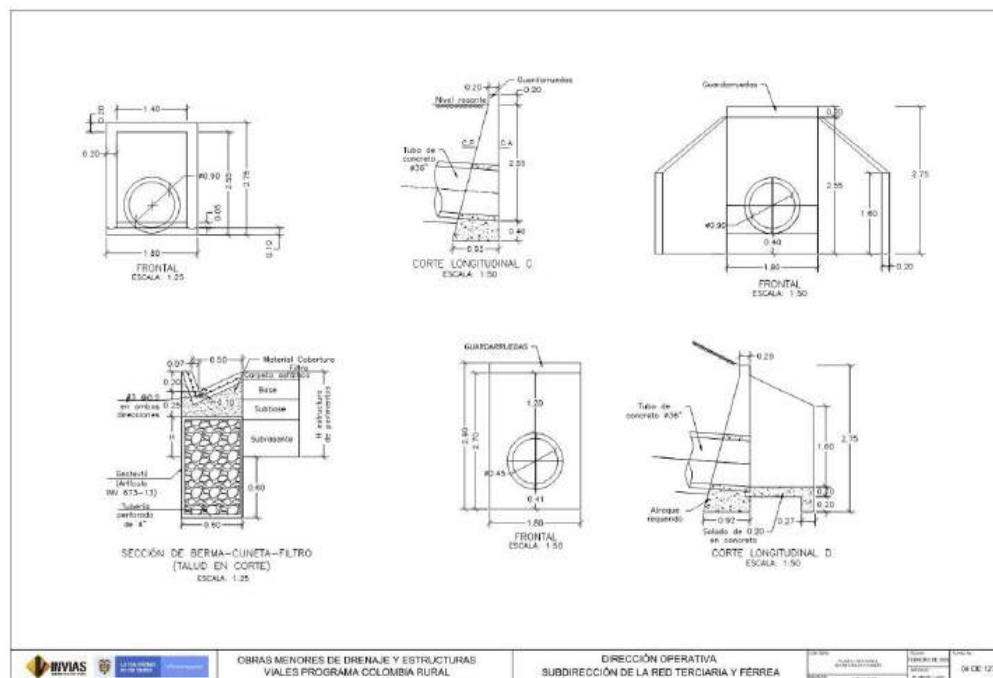

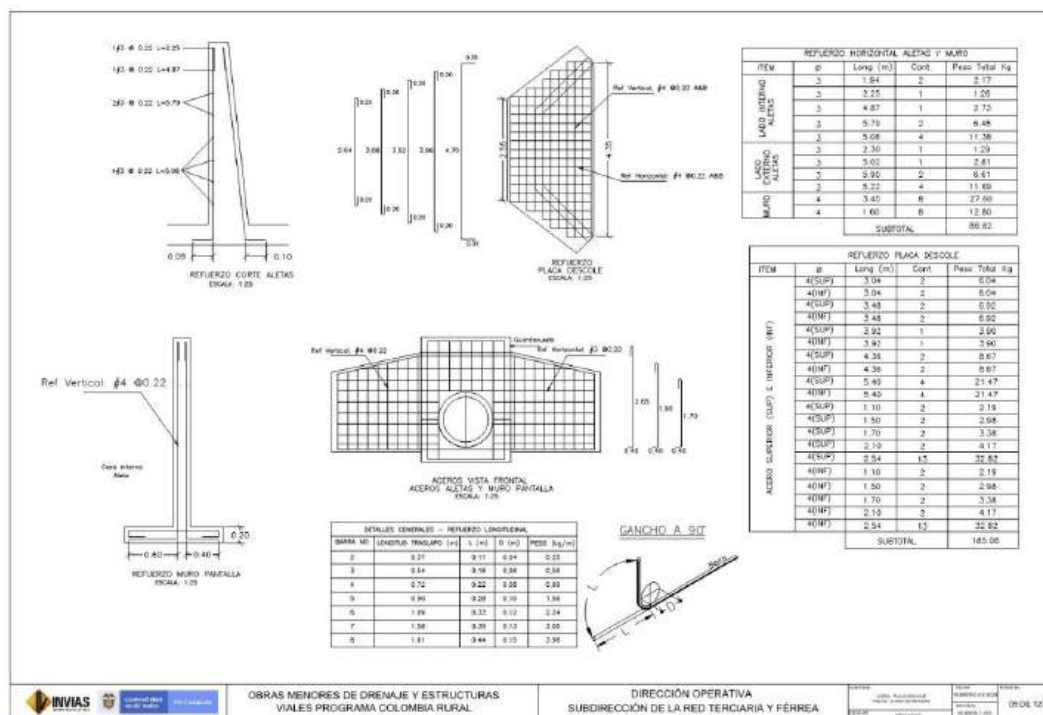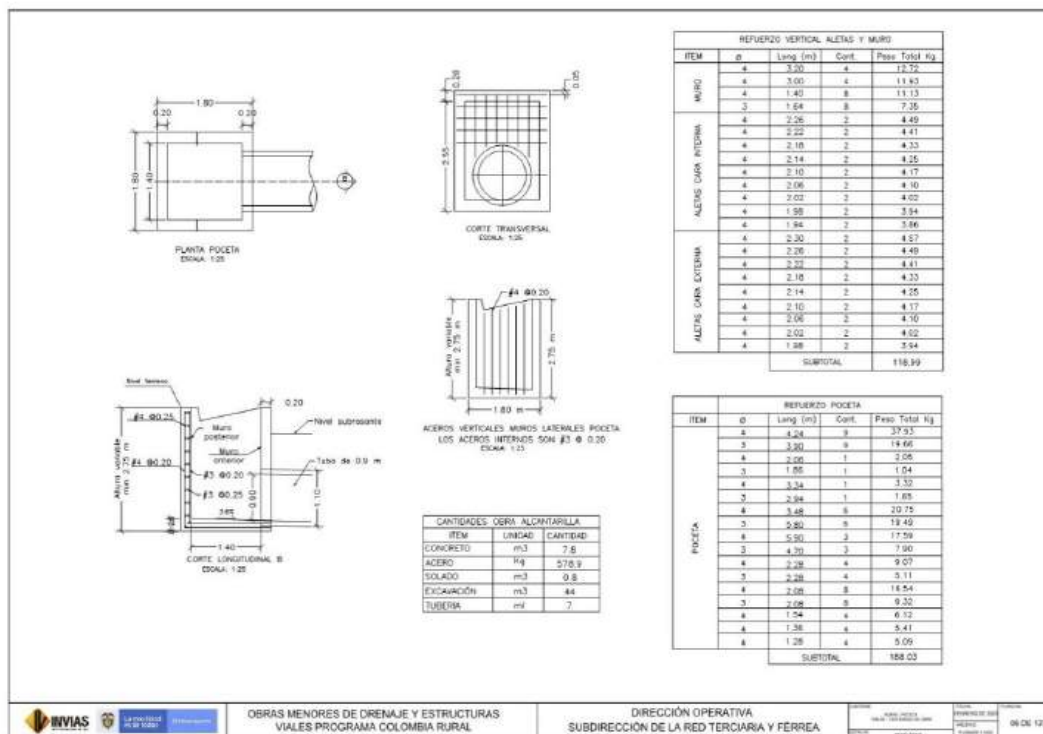

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

➤ CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4318 – 2023 se suscribió el día 17 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor BENITO OME MUÑOZ en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**\$197.378.598,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**\$196.378.598,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**\$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4318-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES
NIT:	900.553.557-8
REPRESENTANTE LEGAL:	BENITO OME MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	17.683.153 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 197.378.598,00 M/CTE	APORTE INVIAS
		\$ 196.378.598,00 M/CTE
		APORTE OAC
		\$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	FECHA DE FIRMADO:	EL 16 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	FECHA DE FIRMADO:	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 01 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	FECHA DE FIRMADO:	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4318-2023 se anuncia en el párrafo "La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023



de junio de 2024 un alcance físico de 102 ml de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

➤ CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4045 – 2023 se suscribió el día 24 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES**, por un valor del convenio de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**\$186.171.800,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**\$185.171.800,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**\$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4045-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
NIT:	900.128.460-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	17.684.267 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 186.171.800,00 M/CTE	APORTE INVIAS
		\$ 185.171.800,00 M/CTE
		APORTE OAC
		\$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	FECHA DE FIRMADO:	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	FECHA DE FIRMADO:	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	FECHA DE FIRMADO:	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO**;, del Convenio Solidario No. 4045-2023 se anuncia en el párrafo “*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como*



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023



se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio”, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de 5 alcantarillas, dos de ellas aleta por aleta y las otras tres caja-aleta. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879-2023



PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

									
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		ALCANTARILLAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA		BELEN DE LOS ANDAQUIES		ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS CABECERA MUNICIPAL		5,00		CAQUETÁ	19/06/2024
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO									
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO									
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE									
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	\$ 65.271,00	\$ 783.252,00	
SUB-TOTAL								\$ 783.252,00	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS									
2	200.2	200-13		Desmorte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	\$ 178.577,00	\$ 178.577,00	
SUB-TOTAL								\$ 178.577,00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS									
3	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	270,30	\$ 26.911,00	\$ 7.274.043,00	
4	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	67,60	\$ 56.658,00	\$ 3.830.081,00	
5	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	0,00	\$ 150.500,00	\$ -	
6	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	19,10	\$ 711.276,00	\$ 13.585.372,00	
7	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	50,90	\$ 1.080.948,00	\$ 55.020.253,00	
8	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3643,00	\$ 7.350,00	\$ 26.776.050,00	
9	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	76,30	\$ 151.961,00	\$ 11.594.624,00	
10	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	30,00	\$ 663.239,00	\$ 19.897.170,00	
SUB-TOTAL								\$ 137.977.593,00	
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 138.939.422,00	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.168.183,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 42.064.195,00	
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 185.171.800,00	

➤ CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4346 – 2023 se suscribió el día 14 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *JESUS OME RENTERIA* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$200.753.948,00) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$199.753.948,00) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000,00) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4346-2023
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE
NIT:	900.622.519-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS OME RENTERIA
IDENTIFICACIÓN:	17.631.475 DE FLORENCIA

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 200.753.948,00 M/CTE	APORTE INVIAS
		\$ 199.753.948,00 M/CTE
		APORTE OAC
		\$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	FECHA DE FIRMADO:	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	FECHA DE FIRMADO:	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	FECHA DE FIRMADO:	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO:**, del Convenio Solidario No. 4346-2023 se anuncia en el párrafo *"La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de ciento dos (102) ml de placa huella y una (1) alcantarilla. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

											
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL			LONGITUD DEL CORREDOR (m) Y ALCANTARILLAS (und)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA		MORELIA		JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE			102 ML Y 1 ALCANTARILLA		CAQUETÁ		19/06/2024
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN			UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2013	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE											
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm			ml	6,00	\$ 66.271,00	\$ 397.626,00	
									SUB-TOTAL		\$ 397.626,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS											
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas			Ha	1,00	\$ 176.561,00	\$ 176.561,00	
									SUB-TOTAL		\$ 176.561,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar			M3	3,43	\$ 28.211,00	\$ 96.764,00	
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C			M3	100,98	\$ 144.365,00	\$ 14.577.978,00	
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ			M3	62,08	\$ 1.040.558,00	\$ 64.597.841,00	
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)			M3	26,44	\$ 547.005,00	\$ 14.462.812,00	
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)			KG	2.807,19	\$ 8.610,00	\$ 24.169.906,00	
									SUB-TOTAL		\$ 117.905.301,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar			M3	56,20	\$ 28.211,00	\$ 1.585.458,00	
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco			M3	0,30	\$ 58.057,00	\$ 17.417,00	
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras			M3	3,58	\$ 151.900,00	\$ 543.802,00	
11	630.1.5	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ			M3	16,00	\$ 547.005,00	\$ 8.752.080,00	
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ			M3	11,10	\$ 1.040.558,00	\$ 11.550.194,00	
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa			KG	731,00	\$ 8.610,00	\$ 6.293.910,00	
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo			M3	22,20	\$ 21.976,00	\$ 487.867,00	
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado: 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior			M	6,00	\$ 559.565,70	\$ 3.357.394,00	
									SUB-TOTAL		\$ 32.588.122,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT											
									SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA		\$ 151.067.610,00
									PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ 4.532.028,00
									GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 44.154.310,00
									VALOR ESTIMADO CONVENIO		\$ 199.753.948,00

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

❖ CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 (LOS ALETONES)

El convenio solidario N° 4318-2023 que comprende una placa huella de 102 metros lineales por cinco metros de ancho, en la cual se han evidenciado diferentes actividades entre ellas el cajeo, conformación y compactación de la subrasante, instalación de la subbase y fundición de concretos con una resistencia de 2000 y 3000 PSI.

- **Excavaciones Varias sin Clasificar:** Durante el proceso constructivo se realizó la excavación de forma mecánica para el cajeo de la vía con una profundidad de 0.20 m. Además, se realizaron los cortes por los costados con el fin de ampliar la banca vial, posteriormente se realiza la conformación, perfilación y compactación de la subrasante. También se realizaron excavaciones manuales para la instalación del refuerzo en acero de las vigas riostras, es claro mencionar que todo este material de excavación fue retirado.



Imagen No. 1: Corte de talud.



Imagen No. 2: Conformación y nivelación subrasante.

- **Subbase Tipo C:** Posteriormente a la conformación de la subrasante se realizó la extendida y lleno de material con un espesor aproximadamente de 18 cm teniendo en cuenta los niveles de terminado de la placa huella. Esta actividad se ejecutó con la ayuda de maquinaria amarilla y perfilación de manera manual. Por último, se humedece el material y se procede a compactar con el vibro compactador, dando por finalizada la actividad se completa la estructura de la vía.



Imagen No. 3: Instalación de sub-base granular.



Imagen No. 4: Compactación de sub-base granular.

- **Concreto Ciclópeo Resistencia 14 Mapa:** Se realiza fundida de concreto tipo ciclópeo en la cinta central con una dimensión de 0,90 * 3 m y la cinta del costado izquierdo con medidas 0,45*3 m. Para la dosificación del concreto se tuvo en cuenta el diseño de mezclas el cual especifica la cantidad de material de grava, arena y agua por bulto de cemento. Es importante mencionar que el volumen total de los módulos equivale a un 60% de concreto con una resistencia de 14 Mpa y 40% en piedra con dimensiones no mayores a 4".



Imagen No. 5: Fundida de concreto ciclópeo en franja central.



Imagen No. 6: Fundida de concreto ciclópeo en sobreebancho.

- **Figurado de Acero de Refuerzo FY 4200 Kg/cm²:** Se realizaron actividades de instalación de acero teniendo en cuenta las especificaciones que estipula el diseño para bordillos, huellas, cunetas y vigas riostras. Es importante mencionar

que el refuerzo vertical y transversal es en acero N°3 y las vigas se seccionaron en dos con su respectivo traslapo de 0,54 m debido al método de proceso de constructivo de media placa huella adaptado con el fin de garantizar el tránsito vial en la zona. Para esta actividad se ocuparon todos los auxiliares de obra (05), un oficial de obra (01), dirigidos por el maestro de obra e ingeniero residente.



Imagen No. 7: Instalación de acero de refuerzo para huella.



Imagen No. 8: Instalación de acero de refuerzo para viga riostra.

- **Concreto Reforzado con Resistencia 21 Mpa:** Se realiza fundida de concreto con refuerzo en acero para las huellas, cunetas, bordillos y vigas riostras. Primeramente, se realiza la instalación de acero de forma transversal y longitudinal con unas respectivas panelas en concreto en las huellas, cunetas y vigas riostras con el fin de garantizar el recubrimiento del acero mayor a 5 centímetros. Para la dosificación se tuvo en cuenta el diseño de mezclas la cual especifica las cantidades de materiales de triturado, arena y agua por bulto de cemento para lograr una resistencia en el concreto de 21 Mpa. Posteriormente se dio acabado en espina de pescado por la cinta central y texturizado a través del método manual con escoba en las cunetas. Durante el periodo de tiempo del fraguado de concreto se ha aplicado agua en los módulos de los elementos ya fundidos con el fin de garantizar la humedad adecuada en el concreto.



Imagen No. 9: Fundida de huella en concreto 3000 PSI.



Imagen No. 10: Fundida de huella y viga riostra en concreto 3000 PSI.

❖ CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 (ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES)

El Convenio Solidario No. 4045-2023 comprende un total de cinco alcantarillas y actividades de mantenimientos de estructuras ya existentes sobre el corredor vial que conecta el municipio de Belén de los Andaquies y El Centro Poblado los Aletones.

- **Concreto reforzado resistencia 14 Mpa:**

Dentro del proceso constructivo de los elementos estructurales de las alcantarillas específicamente en la zapata, solera, dentellón y poceta se realizó la fundición de un solado de limpieza con el fin de crear una base a nivel para los cimientos y bases de las estructuras cuyo espesor es de 5 cm. La dosificación del concreto se preparó teniendo en cuenta el diseño de mezclas la cual especifica las cantidades de triturado y arena por bulto de cemento con el fin de garantizar la resistencia de 14 Mpa.



Imagen No. 11: Solado de limpieza para placa de poceta.

- Concreto reforzado resistencia 21 Mpa – Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa:**
 Durante el presente mes se evidenciaron actividades de fundición de los elementos estructurales en su totalidad en las tres alcantarillas. Inicialmente adaptaron el proceso constructivo de excavación e instalación de la tubería, con sus respectivos llenos, es importante mencionar que dos de éstas tiene un diseño de aleta-poceta y una aleta-aleta. En la alcantarilla con diseño de aleta por aleta se inició con la instalación del acero de forma longitudinal y transversal en varilla N°4 teniendo en cuenta las dimensiones y especificaciones estipuladas en el diseño, luego se procede a instalar formaleta para fundir con un espesor de 20 cm del elemento. Se continua con la instalación de acero de forma longitudinal teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y se instala la formaleta para muros aletas y realizar la fundida de éstas con una altura promedio de 2 metros por las aletas y el muro con guarda rueda de 2,75 como lo indican los planos. De igual manera se procede con la fundición de la solera realizando primeramente la instalación de acero y la preparación de la mezcla en sitio con una dosificación de 3000 psi, esta secuencia se repite de la misma forma por el otro costado teniendo en cuenta los diseños de alcantarilla de aleta por aleta. En la del diseño de aleta con caja poceta se adopta el mismo proceso constructivo, por el otro costado se procede a realizar la instalación, armado del acero y formaleta para fundir la placa contra piso con las dimensiones estipuladas en el plano. Se menciona que en cada una de estas fundidas se realizaron la toma de las muestras de concreto con el fin de garantizar y comprobar la resistencia de este.



Imagen No. 12: Instalación de acero de refuerzo.



Imagen No. 13: Instalación de acero de refuerzo.



Imagen No. 14: Instalación de acero de refuerzo.



Imagen No. 15: Instalación de acero de refuerzo.



Imagen No. 16: Fundida de poceta en concreto de 3000 PSI.



Imagen No. 17: Fundida de aletas en concreto de 3000 PSI.



Imagen No. 18: Fundida de poceta en concreto de 3000 PSI.



Imagen No. 19: Fundida de aletas en concreto de 3000 PSI.

❖ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 (CAMPOALEGRE)**

El convenio solidario N° 4346-2023 que comprende una placa huella de 102 metros lineales por cinco metros de ancho y la construcción de una alcantarilla de modalidad aleta-poceta, en la cual se han evidenciado diferentes actividades entre ellas el cajeo, conformación, compactación de la subrasante, instalación de la subbase y instalación de tubos de 36".

✓ **PLACA HUELLA:**

- **Excavaciones varias sin clasificar:** Posteriormente a la localización y replanteo de la obra, se inició con la excavación mecánica para el cajeo de la vía a una profundidad aproximada de 20 cm, de la misma manera se realizó la disposición de material a un punto autorizado. Se procedió con la compactación de la subrasante con el fin de verificar la estabilidad de esta.



Imagen No. 20: Corte de talud.



Imagen No. 21: Conformación y nivelación de subrasante.

- **Sub-base Granular:** Luego de haber realizado la compactación de la subrasante se inicia con la extendida y lleno de material de subbase granular tipo c con un espesor aproximado de 18 cm por toda el área que abarca la vía, se realiza la nivelación teniendo en cuenta los niveles de terminado de la placa huella. Por último, se procede a humedecer el material y compactar con el vibro compactador de rodillo.



Imagen No. 22: Instalación de sub-base granular.



Imagen No. 23: Compactación de sub-base granular.

✓ **ALCANTARILLA:**

- **Excavaciones varias sin clasificar:** Se procede a realizar la excavación mecánica para la instalación de tubería con un ancho promedio de 1.50 m una profundidad de 2,20 m y una longitud de 6 m. De igual manera se realizó la excavación de la poceta, zarpa, muros, solera y aletas teniendo en cuenta cada las dimensiones estipuladas en el diseño y el nivel de terreno. Por último, se procede a perfilar el desagüe de la alcantarilla para garantizar el correcto funcionamiento de esta.



Imagen No. 24: Excavaciones manuales para descole.



Imagen No. 25: Excavaciones mecánicas para instalación de tubos.

- **Excavación Roca en Seco:** Durante el proceso de excavación para la poceta, se presentaron algunas zonas de suelo rocoso la cual requirió la implementación de otras herramientas como el cincel, taladro y perfilación manual, este tipo de

actividades toman más tiempo que una excavación de terreno arcilloso, limoso, arenoso o de características diferentes.



Imagen No. 26: Excavaciones manuales de roca.

- **Concreto Reforzado Resistencia 14 Mpa:** Para el proceso constructivo de los diferentes elementos estructurales que componen las alcantarillas, se requiere realizar la fundición un solado de limpieza con el fin de crear una base a nivel para los cimientos o bases de esto. Este concreto se instala específicamente en la zapata, solera, dentellón y poceta. Durante la instalación de la tubería se requiere fundir una base como soporte de está y de igual forma un atraque por los costados con el fin de garantizar la estabilidad de los tubos. La dosificación del concreto se preparó teniendo en cuenta el diseño de mezclas la cual especifica las cantidades de triturado y arena por bulto de cemento con el fin de garantizar la resistencia de 14 Mpa.



Imagen No. 27: Atraque de tubería de 36" y solado de limpieza placa descole.

Imagen No. 28: Instalación de solado de limpieza para tubería.

- **Rellenos para Estructuras con Suelo:** Posteriormente a la instalación de la tubería, se procede a realizar el lleno de material con el fin de brindar una protección a esta y después la conformación del paso vial. Este relleno se realiza en capas de 20 cm y se realiza su debida compactación ya sea manual o de forma mecánica. Por último, se perfila y conforma a nivel de la rasante, es importante mencionar que es un material seleccionado con el fin de mantener y mejorar la estabilidad de la vía.



Imagen No. 29: Relleno con material seleccionado.



Imagen No. 30: Relleno con material seleccionado.

- **Tubería de Concreto Reforzado:** Posteriormente a la excavación realizada de manera mecánica, se procede a realizar la instalación de la tubería en concreto de 3000 psi y refuerzo en acero N°3 de 36". Está tubería se fija y se alinea teniendo en cuenta el centro de la poceta y el desagüe, se realizó el emboquille entre las juntas de los tubos. Posteriormente se le hace un atraque en concreto por los costados con el fin de garantizar la estabilidad de está.



Imagen No. 31: Instalación de acero de refuerzo para huella.



Imagen No. 32: Instalación de acero de refuerzo para viga riostra.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han presentado ítems no previstos en ninguno de los convenios establecidos ya que en uno de ellos no se ha ejecutado obra y en los otros dos convenios no se han encontrado hasta el momento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4879 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 4318–4045–4346 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la

etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.
7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de agosto – 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a la vereda de Los Aletones, La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies y en la vereda Campoalegre en el municipio de Morelia, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.
- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.
- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas previo inicio por parte de las JAC.
- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS".

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada uno de los convenios vinculados con Asojuntas Belén, Vereda los Aletones y Vereda Campoalegre.
- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella y alcantarillas.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora cuatro (4) informes semanales para cada uno de los convenios solidarios (JAC de la vereda Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies y JAC de la vereda Campoalegre), de los cuales se describen a continuación:

➤ Convenio Solidario No. 4318-2023 (**Los Aletones**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

(**Ver Anexo 8.4.1**).

➤ Convenio Solidario No. 4045-2023 (**Asojuntas Belén de los Andaquies**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

(**Ver Anexo 8.4.2**).

➤ Convenio Solidario No. 4346-2023 (**Campoalegre**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (**Ver Anexo 8.4.3**)

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados a cada uno de los convenios solidarios. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.5.1**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.5.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada uno de los convenios solidarios. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.6.1**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.6.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes de agosto de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.7.1**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.7.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de agosto de 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las juntas donde se ejecutan los convenios solidarios, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.8.1**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.8.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de agosto – 2024 sólo se han realizado ensayos de concreto de forma cilíndrica con los convenientes pertenecientes a los contratistas de Asojuntas Belén de los Andaquies y Los Aletones, estos han sido tomados durante el proceso constructivo de los diferentes elementos estructurales de las alcantarillas y placa huella. Actualmente estas muestras se encuentran en laboratorio y está a espera de los resultados. Por último el convenio realizado con Campoalegre no se ha tomado ninguna muestra debido a que no se evidencian actividades de concreto reforzado en la obra.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.9.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4318, correspondiente a la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.10.1**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4045, correspondiente a Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.10.2**).
- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4346, correspondiente a la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la “LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA”, No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

➤ SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este presente periodo del mes de agosto – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4318, JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.12.1**).
- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4045, Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.12.2**).
- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4346, JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.12.3**).

➤ SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies, Campoalegre). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente

periodo, donde se deja constancia el atraso o avance físico de cada una de las juntas para el presente periodo.

❖ Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Los Aletones.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES" CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,053%	0,000%	-0,053%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	35,597%	8,036%	-27,561%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	35,750%	38,523%	2,773%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	28,600%	-	-
TOTAL	100,000%	46,559%	-24,841%

Tabla 4. Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Los Aletones.

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 46,559% correspondiente a \$ 91.431.520,00 de pesos, contra un programado acumulado de 71,400% equivalente a \$ 140.214.318,97 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Los Aletones, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un - 24,841% que representa en valor de \$ 48.782.798,97 de pesos.

❖ Programado vs ejecutado acumulado – Asojuntas Belén de los Andaquies.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES" CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,260%	0,000%	-0,260%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	40,329%	35,239%	-5,090%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	37,674%	36,595%	-1,079
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	21,737%	-	-
TOTAL	100,000%	71,834%	-6,429%

Tabla 5. Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de Asojuntas Belén de los Andaquies.

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 71,834% correspondiente a \$ 133.016.746,00 de pesos, contra un programado acumulado de 78,263% equivalente a \$ 144.921.005,83 de pesos, lo que indica que Asojuntas Belén de los Andaquies, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un - 6,429% que representa en valor de \$ 11.904.259,83 de pesos.

❖ Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Campoalegre.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE" CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,044%	0,000%	-0,044%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	42,992%	7,895%	-35,097%

Agosto – 2024 Días del 01 al 31	30,872%	20,439%	-10,433
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	26,092%	-	-
TOTAL	100,000%	28,334%	-45,574%

Tabla 6. Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Campoalegre.

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 28,334% correspondiente a \$ 56.598.283,63 de pesos, contra un programado acumulado de 73,908% equivalente a \$ 147.634.147,89 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Campoalegre, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un - 45,574% que representa en valor de \$ 91.035.864,26 de pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el presente periodo del mes de agosto -2024, No se realizaron Actas de Comité de obra en ninguno de los convenios.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo del mes de agosto -2024, No se realizaron Actas de reunión en ninguno de los convenios.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4879 – 2023 se suscribió el día 07 de diciembre de 2023 entre el señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (**\$106.174.537,00**) M/CTE, equivalente a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4879-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 106.174.537,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN:	31 DE MARZO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	FECHA DE FIRMADO:	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	FECHA DE FIRMADO:	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	FECHA DE FIRMADO:	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA**. VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$106.174.537,00) M/CTE, equivalentes a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

CARGO / OFICIO	COSTOS	PRIMA	PARTICIPACIÓN	VALOR
	DE PERSONAL	REGIONAL	(h-mes)	PARCIAL (\$)
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2))*(3) = (4)
<u>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</u>				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoría	\$ 5.000.000,00		0,50	\$ 2.500.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.000.000,00		4,00	\$ 16.000.000,00
Profesional ambiental	\$ 2.800.000,00		0,40	\$ 1.120.000,00
Profesional social	\$ 2.800.000,00		0,40	\$ 1.120.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 3.000.000,00
Especialista en Estructuras	\$ 5.500.000,00			
Especialista en Vía y/o Pavimentos	\$ 5.500.000,00			
Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.500.000,00			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.500.000,00			
Especialista en diseño Geometrico	\$ 5.500.000,00			
Inspector	\$ 1.200.000,00		6,00	\$ 7.200.000,00
Inspector SST	\$ 1.200.000,00		0,50	\$ 600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				\$ 31.540.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				\$ 74.434.400,00

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR
		(\$)		PARCIAL (\$)
		(7)		(7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viáticos Director y/o Especialistas	Día	\$ 140.000,00	4,00	\$ 560.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	\$ 550.000,00	12,00	\$ 6.600.000,00
Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	\$ 2.800.000,00	2,00	\$ 5.600.000,00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	\$ 300.000,00	3,00	\$ 900.000,00
OTROS COSTOS				
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	\$ 176.200,00	2,00	\$ 352.400,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	\$ 80.000,00	3,00	\$ 240.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	\$ 140.000,00	3,00	\$ 420.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	\$ 38.500,00	3,00	\$ 115.500,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				\$ 14.787.900,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 89.222.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)				\$ 16.952.237,00
COSTO TOTAL = (C) + (D)				\$ 106.174.537,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se continúa realizando actividades de seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada una de las obras suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Acompañamiento y socialización del nuevo alcance de los proyectos de cada una de las juntas, que fueron ajustado por parte de los residentes de obra, posteriormente revisado, aprobado y avalado por esta interventoría. Esto debido a las alzas de los precios unitarios de los materiales de obra del año 2023 al presente año y ajuste de cantidades en algunos ítems o rubros del presupuesto, llegando de esta manera a disminuir la meta física.
- Revisión y aprobación de los materiales pétreos suministrados por los proveedores acordados por cada una de las juntas, donde se detalló los permisos o licencias ambientales y/o explotación minera, como también, que dichos materiales estén acordes a los materiales estipulados en los diseños de mezcla de 3.000 psi.
- Durante este periodo la interventoría realizó visitas a campo junto con los residentes de obra, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevan en las obras. Además, por parte del residente y director de interventoría realizaron recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de extenderse y compactarse el material sub-base granular. También la importancia del solado de limpieza y el atraque de concreto para la instalación de la tubería de 36”.
- Se realizó chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de la placa huella y alcantarillas.
- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella y alcantarillas. **(Ver Anexo 8.15).**

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. **(Ver Anexo 8.16).**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría para el presente periodo. **(Ver Anexo 8.17).**

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4879 – 2023 a la fecha del presente periodo. **(Ver Anexo 8.18)**

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

Se anexa formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. **(Ver Anexo 8.19).**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.
- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Aletones presenta para este periodo un programado acumulado del 71,400% correspondiente a \$ \$ 140.214.318,97 de pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 46,559% correspondiente a \$ 91.431.520,00 de pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -24,841% correspondiente a \$ 48.782.798,97 de pesos M/CTE.
- Que la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies presenta para este periodo un programado acumulado del 78,263% correspondiente a 144.921.005,83 de pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 71,834% correspondiente a \$ 133.016.746,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -6,429% correspondiente a \$ 11.904.259,83 pesos M/CTE.
- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre presenta para este periodo un programado acumulado del 73,908% correspondiente a \$ 147.634.147,89 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 28,334% correspondiente a \$ 56.598.283,63 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un -45,574% correspondiente a \$91.035.864,26 pesos M/CTE.
- Para este presente informe del mes de Agosto, Asojuntas Belén de los Andaquies tiene finalizado la construcción de tres alcantarillas de cinco totales. Para, la vereda los Aletones se tiene un carril terminado en cuanto a huella y cinta de concreto ciclópeo a falta de cunetas y bordillos. Por último, la vereda Campoalegre esta lista la estructura de la vía para iniciar con la cinta central de concreto ciclópeo.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

- 8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318
- 8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
- 8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

- 8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318
- 8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
- 8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

- 8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318
- 8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
- 8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.4. INFORMES SEMANALES

- 8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318
- 8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
- 8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- 8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318
- 8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
- 8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318

8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.14. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


8.15. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

**RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA
E INTERVENTOR INCLUYENDO
ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE
RECIBO**

ANEXO 8.1.1.


Relación de correspondencia generada entre
el interventor y la Vereda Los Aletones –
CS#4318

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
09/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe financiero CS No 4318 de 2023- JAC VEREDA ALETONES	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual julio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Acta de costos #01	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
16/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
31/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos 4 y 5	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.



034-4879

Florencia, 09 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenás

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Informe financiero CS No. 3318 de 2023 - JAC VEREDA ALETONES

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:


- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023



035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenás

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Informe mensual julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos #01

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, mi ▼

035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenas

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Acta de costos #01

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Hoja de ruta
- Acta de costos #01
 - Acta de costos
 - Factura
 - RUT
- Afectación presupuestal de obligaciones
- Identificación de ejecución contractual
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- Soporte de nómina electrónica
- Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social
 - Certificación
 - Planilla de autoliquidación de aportes
- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Actas de costos Recibidos x



Elkin D. Ramos M.
para Cristian, mi ▾

vie, 16 ago, 6:51 p.m.

Florencia, 16 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia - Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #1
- Acta de costos #2
- Acta de costos #3
- Acta de costos #4
- Acta de costos # 5

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos 4 y 5

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, ml

sáb, 31 ago, 8:00p.m. (hace 9 días)



Florencia, 31 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos 4 Y 5

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #4 Junio
- Acta de costos # 5 Julio

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre
el interventor y Asojuntas Belén de los
Andaquies – CS#4045

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
12/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe financiero mes: Julio 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO (REP. LEGAL ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES)
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual julio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Acta de costos #01	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
16/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
31/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos 4 y 5	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

IP 027 cto 4879 CS 4045 Informe financiero mes: Julio 2024

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para asojuntasbelencaqueta, maurossa1980, enikapaolagarcia4, Cristian, Ilrodriguez, mi

12 ago 2024, 8:05 a.m.



Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

Sr. Luis Elver Cantillo Patiño

Presidente y Representante Legal

asojuntasbelencaqueta@gmail.com

Ing. Oscar Mauricio Ossa Vargas

Ingeniero Residente

maurossa1980@gmail.com

Florencia – Caquetá

Referencia: Convenio Solidario No. 4045 de 2023

Asunto: Informe financiero mes: Julio 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL, que determina que "la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría contratada para tal fin", esta interventoría le solicita de manera urgente la presentación del informe financiero del mes de Julio de 2024.

Dicho informe debe contemplar la presentación de los siguientes formatos los cuales son de su conocimiento:


- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023



035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenás

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Informe mensual julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos #01

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, mi ▼

035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenas

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Acta de costos #01

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Hoja de ruta
- Acta de costos #01
 - Acta de costos
 - Factura
 - RUT
- Afectación presupuestal de obligaciones
- Identificación de ejecución contractual
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- Soporte de nómina electrónica
- Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social
 - Certificación
 - Planilla de autoliquidación de aportes
- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Actas de costos Recibidos x



Elkin D. Ramos M.
para Cristian, mi ▾

vie, 16 ago, 6:51 p.m.

Florencia, 16 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia - Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #1
- Acta de costos #2
- Acta de costos #3
- Acta de costos #4
- Acta de costos # 5

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos 4 y 5

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, ml

sáb, 31 ago, 8:00p.m. (hace 9 días)



Florencia, 31 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos 4 Y 5

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #4 Junio
- Acta de costos # 5 Julio

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.1.3.


Relación de correspondencia generada entre
el interventor y la Vereda Campoalegre –
CS#4346

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 – VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe mensual julio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Acta de costos #01	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
16/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)
31/08/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Actas de costos 4 y 5	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	CRISTIAN CAMILO SANZ GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.



035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenás

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Informe mensual julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos #01

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, mi ▼

035-4879

Florencia, 13 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenas

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Acta de costos #01

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Hoja de ruta
- Acta de costos #01
 - Acta de costos
 - Factura
 - RUT
- Afectación presupuestal de obligaciones
- Identificación de ejecución contractual
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- Soporte de nómina electrónica
- Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social
 - Certificación
 - Planilla de autoliquidación de aportes
- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Actas de costos Recibidos x



Elkin D. Ramos M.
para Cristian, mi ▾

vie, 16 ago, 6:51 p.m.

Florencia, 16 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia - Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #1
- Acta de costos #2
- Acta de costos #3
- Acta de costos #4
- Acta de costos # 5

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

IP 027 cto 4879 - Acta de costos 4 y 5

Recibidos x



Elkin D. Ramos M.

para Cristian, lkrodriguez, ml

sáb, 31 ago, 8:00p.m. (hace 9 días)



Florencia, 31 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá

Ing. Cristian Camilo Sanz González

Supervisor

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Actas de costos 4 Y 5

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y atendiendo las observaciones realizadas por el Ing. José Ricardo Burbano, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Acta de costos #4 Junio
- Acta de costos # 5 Julio

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Contratista de Interventoría

Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ALETONES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA:31/08/2024



FOTOGRAFÍA 1
(Corte de Talud)



FOTOGRAFÍA 2
(Corte de Talud)



FOTOGRAFÍA 3
(Corte de Talud)



FOTOGRAFÍA 4
(Corte de Talud)



FOTOGRAFÍA 5
(Nivelación y conformación de la subrasante)



FOTOGRAFÍA 6
(Instalación de sub-base granular)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ALETONES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA: 31/08/2024

	
<p>FOTOGRAFÍA 7 (Instalación de sub-base granular)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 8 (Compactación de la sub-base granular)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 9 (Compactación de la sub-base granular)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 10 (Compactación de la sub-base granular)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 11 (Fundida franja central concreto ciclópeo)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 12 (Fundida franja central concreto ciclópeo)</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ALETONES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA: 31/08/2024

	
<p>FOTOGRAFÍA 13 (Fundida franja central concreto ciclópeo)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 14 (Fundida de sobreancho en concreto ciclópeo)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 15 (Fundida de sobreancho en concreto ciclópeo)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 16 (Fundida de sobreancho en concreto ciclópeo)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 17 (Excavaciones manuales para viga riostra)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 18 (Instalación de acero de refuerzo de huella y viga riostra)</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ALETONES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA: 31/08/2024



FOTOGRAFÍA 19
(Instalación de acero de refuerzo de huella)



FOTOGRAFÍA 20
(Instalación de acero de refuerzo de viga riostra)



FOTOGRAFÍA 21
(Instalación de acero de refuerzo de huella)



FOTOGRAFÍA 22
(Fundida de sobreo en concreto ciclópeo)



FOTOGRAFÍA 23
(Fundida de huella y viga riostra en concreto 3000 PSI)



FOTOGRAFÍA 24
(Fundida de huella y viga riostra en concreto 3000 PSI)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de
obras de Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA: 31/08/2024



FOTOGRAFÍA 1
(Fundida de placa de descole 3000 PSI)



FOTOGRAFÍA 2
(Instalación de acero de refuerzo)



FOTOGRAFÍA 3
(Instalación de acero de refuerzo)



FOTOGRAFÍA 4
(Instalación de acero de refuerzo)



FOTOGRAFÍA 5
(Instalación de acero de refuerzo)



FOTOGRAFÍA 6
(Instalación de acero de refuerzo)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA:31/08/2024



FOTOGRAFÍA 7
(Fundida de poceta en concreto 3000 PSI)



FOTOGRAFÍA 8
(Fundida de poceta en concreto 3000 PSI)



FOTOGRAFÍA 9
(Fundida de poceta en concreto 3000 PSI)



FOTOGRAFÍA 10
(Instalación solado de limpieza en poceta)



FOTOGRAFÍA 11
(Instalación solado de limpieza en poceta)



FOTOGRAFÍA 12
(Fundida de aletas y cabezal en concreto 3000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA:31/08/2024



FOTOGRAFÍA 13
(Alcantarilla #1 aleta-poceta)



FOTOGRAFÍA 14
(Alcantarilla #1 aleta-poceta)



FOTOGRAFÍA 15
(Alcantarilla #2 aleta-poceta)



FOTOGRAFÍA 16
(Alcantarilla #2 aleta-poceta)



FOTOGRAFÍA 17
(Alcantarilla #3 aleta-aleta)



FOTOGRAFÍA 18
(Alcantarilla #3 aleta-aleta)

NOTA: Tres de las cinco alcantarillas se encuentran terminadas.

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA:31/08/2024



FOTOGRAFÍA 1
(Excavaciones mecánicas para tubería)



FOTOGRAFÍA 2
(Excavaciones mecánicas para tubería)



FOTOGRAFÍA 3
(Corte de talud)



FOTOGRAFÍA 4
(Excavaciones para aletas-poceta)



FOTOGRAFÍA 5
(Instalación del solado de limpieza)



FOTOGRAFÍA 6
(Instalación de 6 tubos de 36")

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA:31/08/2024



FOTOGRAFÍA 7
(Instalación de 6 tubos de 36")



FOTOGRAFÍA 8
(Atraque de tubería en concreto)



FOTOGRAFÍA 9
(Atraque de tubería en concreto y relleno con material seleccionado)



FOTOGRAFÍA 10
(Instalación sub-base granular)



FOTOGRAFÍA 11
(Instalación sub-base granular)



FOTOGRAFÍA 12
(Instalación sub-base granular)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

FECHA: 31/08/2024

	
<p>FOTOGRAFÍA 13 (Instalación de la sub-base granular)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 14 (Instalación de la sub-base granular)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 15 (Toma de niveles de la vía)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 16 (Compactación de la sub-base granular)</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA 17 (Compactación de la sub-base granular)</p>	<p>FOTOGRAFÍA 18 (Instalación de solado de limpieza placa de descole)</p>

ANEXO 8.3.

**COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL
MES CORRESPONDIENTE DEL
CONVENIO SOLIDARIO**

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los
Aletones – CS#4318

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5)
* Oficial de obra.
* Director de Interventoría.

(NOTA: D/O Jo)


(Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora)
(* Volqueta)

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga riostras.



Residente de obra



Residente de Interventoría

02/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco


Personal de Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra
- * Ayudante de Obra. (5).
- * Oficial de Obra
- * Director de Interventoría.


Maquinaria y equipos: *

- * Pulidora eléctrica.
- *

Actividades: Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga y losa.



Residente de Obra



Residente de Interventoría


03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal de Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de obra.
- * Maestro de obra.
- * Ayudante de obra. (5).
- * Oficial de obra.

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se finalizó labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga riostras.




Residente de Obra



Residente de Interventoría

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: Día dominical.



Residente de Obra




Residente de Interventoría


05/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seca.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudante de Obra. (5)
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora
* Volquete.

Actividades: Se realizó excavación mecánica del terreno de aprox 15 cm. Posteriormente se realizó corte de talud para nivelación y conformación de subrasante.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco:

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.
- * Maestro de obra.
- * Ayudante de Obra. (5)
- * Oficial de Obra.


Maquinaria y equipos: *

- * Retroexcavadora.
- * Pulidora eléctrica.
- * Volqueta.

Actividades: Se realizó figurado de acero de refuerzo para canchales y bordillos. Se continuó con el corte de talud para la nivelación y conformación de subrasante.




Residente de Obra




Residente de Interventoría

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día festivo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: *

- * Retroexcavadora.
- * Volqueta.

Actividades: Se continuo con el corte de talvód para la nivelación y conformación de subrasante.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

09/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra
- * Oficial de Obra
- * Ayudante de Obra (s).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:


- * Retroexcavadora.
- * Volqueta.
- * Vibrocompactador.

Actividades: Se realizó extendida y nivelación de la sub-base granular clase c en la longitud de la vía mecánica y manualmente. Posteriormente se realizó la compactación de la sub-base con maqui-

navia amarilla.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

10/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias intensas.


Personal en Obra:

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra
- * Agudante de Obra (5).


Maquinaria y equipos:

- * Retroexcavadora.
- * Vibrocompactador.

Actividades: Se continuó con la extendido y nivelación de la sub-base granular mecánica y manualmente. Posteriormente se realizó la compactación con el vibrocompactador en la longitud restante.



Residente de Obra




Residente de Interventoría


11/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias intensas.

NOTA: Día festivo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

12/08/2024


Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en obra:


- * Residente de Interventoría.
- * Residente de obra.
- * Maestro de obra.
- * Oficial de obra.
- * Ayudante de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Actividades: Se realizó fundido de concreto ciclópeo en la huella central.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

13/08/2024

Registro de Lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en la huella central.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

14/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.


* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (5).


* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concretos.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.



Residente de Obra



Residente de Interventoría


15/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvia Intensa.

Personal en obra:

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.



Residente de Obra




Residente de Interventoría


16/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.


Residente de Obra



Residente de Interventoría

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
 * Residente de Obra.
 * Maestro de Obra
 * Oficial de Obra.
 * Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de Concreto.

Actividades: Se continuó con la fundición de concreto ciclópeo en la franja central.




Residente de Obra




Residente de Interventoría

18/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Lluvia Intensa.
 Tarde: Lluvia Intensa.

NOTA: Día Dominical.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: *


- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudantes de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Actividades: Se realizó fundida de franja central y
sobrecancho de concreto ciclópeo en carril izquierdo.



Residente de Obra.



Residente de Interventoría.


21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se finalizó fundida de franja central y se continuó con la fundida de sobre ancho en carril izquierdo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

22/08/2024


Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: *


- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida del sobre uncho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

23/08/2024

Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.

- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida del sobre ancho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.


Actividades: Se continuó con la fundida del sobre ancho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (5).



Residente de Obra



Residente de Interventoría

25/08/2024

Registro de Lluvias : Mañana (Tarde) : Seco
Tarde: Seco.

Personal NOTA = Día dominical.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

26/08/2024

Registro de Lluvias : Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Personal en Obra : * Residente de Interventoría


* Residente de Obra.


* Maestro de Obra.

- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).

(27/08/2024) Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales, viga riostra posteriormente se realizó la instalación del acero de refuerzo en las boellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo. Se procedió a fundir en concreto 3.000 PSI.


Residente de Obra



Residente de Interventoría


27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostra, posteriormente se realizó la instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo teniendo en cuenta su respectivo traslape. Se procedió a fundir en concreto 3.000 PSI.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

28/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.


Personal en Obra:


- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostra, posteriormente se realizó la

instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga ríostre, cunetas y bordillos del carril izquierdo teniendo en cuenta su respectivo traslape. Se procedió a fundir concreto en 3.000 PSI.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *


- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Maginaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga ríostre, cunetas, bordillos. Posteriormente, se realizó la instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga ríostre, cunetas y bordillos del carril izquierdo.

teniendo en cuenta su respectivo traslapo. Se procedió a fundir en concreto de 3.000 PSI.


Residente de Obra


Residente de Interventoría


30/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Muestra de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostras, cunetas, bordillos. Posteriormente se realizó la instalación del acero de refuerzo en las buellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo. Se procedió a fundir en concreto de 3.000 PSI.



Residente de Obra



Residente de Interventoría


31/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personas en Obra:

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se fundió en concreto reforzado de 3000 Psi las huellas con su respectiva viga y los tres conetas y bordillos en carril izquierdo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de Asojuntas
Belén de los Andaquies – CS#4045

- * Maestro de obra.
- * Ayudante de obra. (5).
- * Oficial de obra.
- * Director de Interventoría.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.


01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

- (2)
- Personal de Obra:
- * Director de Interventoría.
 - * Residente de Interventoría.
 - * Residente de Obra.
 - * Maestro de obra.
 - * Oficial de obra.
 - * Ayudante de obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de refuerzo para aletas.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

02/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra: *


- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra. (5)
- * Director de Interventoría

Maquinaria y equipos: *

- * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de repuesto para aletas.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

(2) Actividades: Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de discos.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

- (2) Personal en Obra:
- * Residente de Interventoría.
 - * Residente de Obra.
 - * Maestro de Obra.
 - * Oficial de Obra.
 - * Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la primera alcantarilla. (Caletas - Poceta).


Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
: Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría,
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la segunda alcantarilla.. (oleas - poceta).

Residente de Obra -  Residente de Interventoría - 

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

(Personal) NOTA: Día festivo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

08/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra: *

* Residente de Interventoría

* Residente de Obra

* Maestro de Obra

* Oficial de Obra

* Ayudante de Obra (5)

* Director de Interventoría

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la tercera alcantarilla. (Caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

09/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco.

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.
- * Ayudante de Obra (5).
- * Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la puerta alcontravilla (Caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

10/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra
- * Ayudante de Obra (5)

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la quinta de antarrullo. (calefas - poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/08/2024

Registro de lluvia: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

12/08/2024

Registro de lluvias: * Mañana: Seco.
* Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la primera alcantarilla (caleta - poeta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

13/06/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

(At) Personal de obra: * Residente de Interventoría

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Ayudante de Obra (5).

* Oficial de Obra.

Actividades: Se continuó con la instalación de formaleta en la primera alcantarilla (caleta - poeta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con la instalación de formwork en la primera alcantarilla. (Caleta - Poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

15/08/2024. Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensa.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de Concreto.

Actividades: Se realizó la fundida in situ, de concreto 3.000 PSI en la primera alantarrilla de aleros, cabzal y placa de descole, con su respectivo solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/08/2024

Registro de Lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (5).

✱

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto 3.000 PSI en la primera alantarrilla de la poceta, con su solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventor

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros, etc. a la segunda alcantarilla.

Residente de Obra

Residente de Interventor

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Intensa.
(2) Tarde: Lluvia Intensa.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

(2) Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

- * Oficial de Obra (2)
- * Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la segunda alcantarilla (aleta - poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Actividades:

(Personal en Obra) Se continuó con la instalación de Formaleta en la segunda alcantarilla. (aleta - poceta)

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra

* Muestrero de Obra.

* Oficial de Obra. (2).

* Ayudante de Obra (5).

* Director de Interventoría.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

22/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: (Seco) Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.
Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de obra.

* Oficial de Obra (2)

* Ayudante de Obra (5).

* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto
5.000 psi en la segunda alcantarilla de alitas, cabzal y
placa de descole, con su respectivo solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

23/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra (2)

* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto de 3000 PSI en la segunda alcantarilla de la poceta con su solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.

Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: (* Mezcladora) N/A.

Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría.
- * Residente de Obra.
- * Maestro de obra.
- * Oficial de Obra. (2)
- * Ayudante de Obra (5).

(5) Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y
 (2) equipos como mezclador de concreto, herramientas menores,
 tableros etc. a la tercera alcantarilla.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

25/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
 Tarde: Seco.

NOTA: Día Dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla (Caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obras * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

- * Oficial de Obra (2)
- * Ayudante de Obra (5)

Actividades: Se continuó con la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla (caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

- (2) Personal de Obra:
- * Residente de Interventoría.
 - * Residente de Obra.
 - * Maestro de Obra.
 - * Oficial de Obra (2)
 - * Ayudante de Obra (5).
 - * Director de Interventoría.

Actividades: Se continuó con la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla (caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.
Personal de Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto
3000 PSI en la tercera alcantarilla de aletas, cabeza
y placa de descole con sus respectivos soldados de lim.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

30/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas. 130 l/RE
 Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.

(5) * Residente de Obra

(2) * Maestro de Obra.

* Oficial de Obra. (2)

* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto de 3000 PSI en la tercera alcantarilla de las aletas faltante cabecera y placa con sus respectivos solados de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

31/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal de obra: *

- * Residente de Interventor/a
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra. (2)
- * Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros, etc. a la cuarta alcantarilla.

Residente de Obra


Residente de Interventor/a

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria




Residente de obra




Residente de Interventoría

02/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensas

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria




Residente de obra




Residente de Interventoría

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra




Residente de Interventoría

NKA

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco:


Nota: Día dominical


Residente de obra


Residente de Interventoria

05/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensas


Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra


Residente de Interventoria

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra



Residente de Interventoria

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria


Día festivo



Residente de obra


Residente de Interventoría

08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra


Residente de Interventoría

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco


Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra


Residente de Interventoría

10/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra



Residente de Interventoria

11/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: (Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria)


Día Dominical



Residente de obra


Residente de Interventoria

12/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco


Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria


Residente de obra



Residente de Interventoria

13/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria




Residente de obra




Residente de Interventoria

14/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra




Residente de Interventoria

15/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria



Residente de obra




Residente de Interventoria

16/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria




Residente de obra



Residente de Interventoría

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensas.

Nota: Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria




Residente de obra




Residente de Interventoría

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Búsqueda de mano de obra (Día dominical)




Residente de obra




Residente de Interventoría

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Día festivo


Residente de obra


Residente de Interventoría

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana Seco
Tarde: Seco

(Nota) Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra
- * Oficial de Obra
- * Ayudante de Obra (1).


Maquinaria y equipos: *

- * Retroexcavadora
- * Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferretería
sobre costado de la vía. en



Residente de Obra



Residente de Interventoría

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría

* Residente de Obra.

* Maestro de obra.

* Oficial de Obra.

* Ayudante de Obra (1).

* Director de Interventoría.


Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

* Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferretería
sobre costado de la vía.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

22/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.

* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.


* Ayudante de Obra. (1)

* Director de Interventoría.


Maquinaría y equipos: * Retroexcavadora.

* Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferrería sobre costado de la vía.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

23/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Ayudantes de Obra (1).
- * Oficial de Obra.

Maquinaria y equipos: *

- * Retroexcavadora.
- * Volquete.

Actividades: Se continuó con el acopio de material pétreo y de ferretería sobre un costado de la vía.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

24/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra.


* Ayudante de Obra (1).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora,
* Volqueta.

Actividades: Se finalizó el acopio de material pétreo y de ferretería sobre un costado de la vía.



Residente de Obra.




Residente de Interventoría

25/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.





26/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

- * Oficial de Obra. Maquinaria y equipos:
- * Ayudante de Obra (2). * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizó corte de talud para nivelación y conformación de subrasante.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (2).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se continuó con el corte de talud para la nivelación y conformación de subrasante. Además se

realizaron excavaciones mecánicas para la poceta y
cabeza alitas.





28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de Obra. (2)
- * Ayudante de Obra. (3)
- * Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizó instalación, extendida y
nivelación mecánica y manual de sub-base granular.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco


Personal en Obra: *


- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra
- * Maestro de Obra
- * Oficial de Obra. (2)
- * Ayudante de Obra. (3)
- * Director de Interventoría

Maquinaria y equipos: *

- * Retroexcavadora
- * Vibrocompactador

Actividades: Se continuó con la instalación, extendida nivelación mecánica y manual de sub-base granular. Además se realizó la compactación de toda la vda. continuamente con el vibrocompactador.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

30/08/2024

Registro de Lluvias: Mañana: (Tarde) Seco.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra

- * Maestro de obra.
- * Oficial de obra. (2)
- * Ayudantes de obra. (3).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizó excavación mecánica para instalación de tubería. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atragüe por ambos costados a una altura equivalente a $3/4$ de la dimensión del tubo. Por último se realizó el relleno con material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.


Residente de Obra


Residente de Interventoría


31/08/2024 Registro de lluvias. Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.


Personal en Obra: *

- * Residente de Interventoría
- * Residente de Obra.
- * Maestro de Obra.
- * Oficial de obra. (2)
- * Ayudantes de obra. (3).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Instalación del solado de limpieza para placa de descole y porta.


Residente de Obra


Residente de Interventoría

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda Los Aletones –
CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3	
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1	
			FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA	SEMANA No.: 20 del 12/09/2024 al 18/08/2024, Último Informe Semanal SI L (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
CONVENIO No. 4318 de 2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023			
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 196.378.598,00		VALOR INICIAL: \$ 106.174.537,00			
VALOR ADICIONES: \$		VALOR ADICIONES: \$			
VALOR ACUMULADO: \$ 196.378.598,00		VALOR ACUMULADO: \$ 106.174.537,00			
		VALOR ANTICIPO: \$			
		VALOR AMORTIZADO: \$			
		VALOR POR AMORTIZAR: \$			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 196.378.598,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 108.181.042,07 55,088%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 67.632.095,00 34,440%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (40.548.947,07) -20,648%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 16.016.638,45 8,156%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 13.408.766,00 6,628%					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 55,088 Avance o Atraso Físico % -20,648					
Meta Física Ejecutada % 34,440					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
PLACA HUELLA ML 102					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 54,40 53,33%					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belén de los Andaquíes.					
TRAMO Y/O SECTOR 2: OBSERVACIONES:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE X NO					
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X					
VERTIMENTOS: SI NO N/A X					
EMISIONES: SI NO N/A X					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					
OBSERVACIONES:					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3																						
			VERSIÓN																							
			PÁGINA	1																						
			FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:																							
ESTADO: En Elaboración																										
V. GESTION SOCIAL																										
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td><td>12</td><td></td></tr></table>		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5		TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12		<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5																									
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12																									
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A																									
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																									
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A																									
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																									
OBSERVACIONES:																										
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																										
Fundida de huellas de concreto ciclópeo.																										
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																										
Continuar con la Fundida de huellas de concreto ciclópeo.																										
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																										
No refleja																										
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																										
<div></div>																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																										
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA																							
			<div></div> <div>FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div>																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3	
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1	
			FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA	SEMANA No.: 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024, Último Informe Semanal SI L (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
CONVENIO No. 4318 de 2023		INTEGRANTES: N/A			
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			
VALOR INICIAL: \$ 196.378.598,00		VALOR ADICIONES: \$ 106.174.537,00			
VALOR ADICIONES: \$ 196.378.598,00		VALOR ACUMULADO: \$ 106.174.537,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 196.378.598,00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 196.378.598,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 124.197.680,52 63,244%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 72.285.127,00 36,809%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (51.912.553,52) -26,435%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - 0%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 16.016.638,45 8,156%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.653.032,00 2,369%					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00 0%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERIODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: _____					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 63,244 Avance o Atraso Físico % -26,435					
Meta Física Ejecutada % 36,809					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
* PLACA HUELLA ML 102					
*					
*					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 61,20 60,00%					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belén de los Andaquíes.					
TRAMO Y/O SECTOR 2: _____					
OBSERVACIONES: _____					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA PERMISO MINERO: SI X NO DISPONIBLE					
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES: _____					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X					
VERTIMENTOS: SI NO N/A X					
EMISIONES: SI NO N/A X					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					
OBSERVACIONES: _____					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración			
V. GESTION SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA 12	INTER 7	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Fundida de huellas y sobrecanchos de concreto ciclópeo en carril izquierdo.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Continuar con la Fundida de huellas y sobre anchos de concreto ciclópeo en carril izquierdo e iniciar con la fundida de las huellas de concreto reforzado.			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
No refleja			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3							
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1							
			FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA	SEMANA No.: 22 del 26/09/2024 al 1/09/2024, Último Informe Semanal Si L: (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA									
CONVENIO No. 4318 de 2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023									
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024									
VALOR INICIAL: \$ 196.378.598,00		VALOR INICIAL: \$ 106.174.537,00									
VALOR ADICIONES: \$		VALOR ADICIONES: \$									
VALOR ACUMULADO: \$ 196.378.598,00		VALOR ACUMULADO: \$ 106.174.537,00									
		VALOR ANTICIPO: \$									
		VALOR AMORTIZADO: \$									
		VALOR POR AMORTIZAR: \$									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 196.378.598,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A								
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A								
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 196.378.598,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 140.214.318,97 71,400%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 91.431.520,00 46,559%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (48.782.798,97) -24,841%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - 0%											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 16.016.638,45 8,156%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 19.146.393,00 9,750%											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00 0%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 71,400 Avance o Atraso Físico % -24,841											
Meta Física Ejecutada % 46,559											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PLACA HUELLA	ML	102	Prog	68,00				66,67%	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
			Ejec	-				-			
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belén de los Andaquíes.			TRAMO Y/O SECTOR 2:			OBSERVACIONES:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA			PERMISO MINERO: SI X NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X					
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS			LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X					
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A X					
						EMISIONES: SI NO N/A X					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración			
V. GESTION SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA 12	INTER 7	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Excavaciones manuales para la instalación del acero de refuerzo de la viga riostra, huella, cuneta y bordillo en carril izquierdo. Fundida de la huella en carril izquierdo en concreto reforzado con su respectiva viga riostra.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Continuar con la Fundida de huellas, viga riostra, cunetas y bordillos en concreto reforzado en carril izquierdo.			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
No refleja			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-3	
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1	
			FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA	SEMANA No.: 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024, Último Informe Semanal SI L (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
CONVENIO No. 4318 de 2023		INTEGRANTES: N/A			
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			
VALOR INICIAL: \$ 196.378.598,00		VALOR ADICIONES: \$ 106.174.537,00			
VALOR ADICIONES: \$ 196.378.598,00		VALOR ACUMULADO: \$ 106.174.537,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 196.378.598,00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 196.378.598,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 92.164.403,61 46,932%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 54.223.328,00 27,612%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (37.941.075,61) -19,320%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 22.155.433,43 11,282%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 38.442.727,00 19,576%					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 46,932 Avance o Atraso Físico % -19,320					
Meta Física Ejecutada % 27,612					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
* PLACA HUELLA ML 102					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 47,60 46,67%					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
Prog - -					
Ejec - -					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belén de los Andaquíes.					
TRAMO Y/O SECTOR 2: OBSERVACIONES:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA PERMISO MINERO: SI X NO DISPONIBLE					
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X					
VERTIMENTOS: SI NO N/A X					
EMISIONES: SI NO N/A X					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					
OBSERVACIONES:					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-R-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración			
V. GESTION SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Se realizó corte del talud para posteriormente realizar la conformación y nivelación de subrasante. Extendida, nivelación y compactación de la sub-base granular en el ancho y largo de la vía.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Fundida de huellas de concreto ciclópeo.			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
No refleja			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA: 	
		NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON	
		Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de Asojuntas Belén de los
Andaquies – CS#4045

CALIMA

INVIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

1

FECHA

11/08/2024

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

SEMANA No.:

19 del 5/08/2024 al 11/08/2024

Último Informe Semanal SI I

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONVENIO No.

4045 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 185.171.800,00

CONTRATO No.

4879 DE 2023

VALOR INICIAL:

\$ 106.174.537,00

FECHA DE INICIO:

14/12/2023

VALOR ADICIONES:

N/A

FECHA DE INICIO:

14/12/2023

VALOR ADICIONES:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 185.171.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 106.174.537,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 185.171.800,00
\$ 96.256.005,08
\$ 93.113.476,00
\$ (3.142.529,08)
\$ -

51,982%
50,285%
-1,697%
%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -
\$ -
\$ -

%
%
%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 21.096.623,17
\$ 27.861.606,00

11,393%
15,046%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 106.174.537,00

%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

51,982

Avance o Atraso Físico %

-1,697

Meta Física Ejecutada %

50,285

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

* ALcantarillas

UND

5

Prog

2,33

46,7%

* Ejec

* Prog

* Ejec

* Prog

* Ejec

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belén de los Andaquíes.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

MORELIA CAQUETA

PERMISO MINERO:

SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI X NO

UBICACIÓN:

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS

PERMISO MINERO:

SI NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de acero de refuerzo en los distintos puntos de las alcantarilla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de elementos estructurales de la primera alcantarilla (aletas-poceta).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGU CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R. GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE BELÉN DE LOS ANDAQUES</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>MEPI-MN1-INV-15-FR-3</div> <div>1</div>		
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		SEMANA No.: 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI I (Numeración consecutiva)			
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUES		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
CONVENIO No. 4045 de 2023		INTEGRANTES: N/A			
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			
VALOR INICIAL: \$ 185.171.800,00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
VALOR ADICIONES: \$ 185.171.800,00		VALOR INICIAL: \$ 106.174.537,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 185.171.800,00		VALOR ADICIONES: \$ 106.174.537,00			
		VALOR ACUMULADO: \$ -			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 185.171.800,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 115.130.566,65 62,175%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 104.873.741,00 56,636%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (10.256.825,65) -5,539%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.874.561,57 10,193%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.760.264,00 6,351%					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00 %					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERIODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: _____					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 62,175 Avance o Atraso Físico % -5,539					
Meta Física Ejecutada % 56,636					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
ALCANTARILLAS	UND	5			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,67				53,3%
Ejec	1,00				20,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belén de los Andes.					
TRAMO Y/O SECTOR 2: _____					
OBSERVACIONES: _____					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO: SI X NO	DISPONIBLE			
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO				
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO				
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES: _____					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	X		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	X		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	X		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	X		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	X		
VERTIENTOS:	SI NO	N/A	X		
EMISIONES:	SI NO	N/A	X		
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	X		
OBSERVACIONES: _____					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:																					
ESTADO: En Elaboración																								
V. GESTIÓN SOCIAL																								
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>5</td><td></td></tr></table>		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5		<table><tr><td>Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>		Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5																							
Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A																							
Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																							
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A																							
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12																								
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																								
Fundida de placa de descole, aletas, cabezal y poceta de la primera alcantarilla, (aletas-poceta) con su respectivo solado de limpieza.																								
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																								
Fundida de elementos estructurales de la segunda alcantarilla (aletas-poceta).																								
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																								
No refleja																								
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																								
<div></div>																								
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																								
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA																					
			<div> FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div>																					
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																								

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundida de placa de descole, aletas, cabezal y poceta de la segunda alcantarilla, (poceta-aletas) con su respectivo solado de limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de elementos estructurales de la tercera alcantarilla, (aleta-aleta).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGU CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundida de placas de descole, aletas, cabezales de la tercera alcantarilla, (aleta-aleta) con su respectivo solado de limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de elementos estructurales de la cuarta alcantarilla, (aleta-aleta).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGOS CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.


Informe semanal de la Vereda Campoalegre –
CS#4346

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEPI-MN1-IN-15-FR-3 1					
						FECHA 11/08/2024 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		SEMANA No.: 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL		(Numeración consecutiva)							
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE				INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA							
CONVENIO No. 4346 de 2023				INTEGRANTES: N/A							
FECHA DE INICIO: 27/12/2023				CONTRATO No. 4879 DE 2023							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023				FECHA DE INICIO: 27/12/2023							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023							
VALOR INICIAL: \$ 199.753.948,00				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024							
VALOR ADICIONES: \$ 199.753.948,00				VALOR INICIAL: \$ 106.174.537,00							
VALOR ACUMULADO: \$ 199.753.948,00				VALOR ADICIONES: \$ 106.174.537,00							
				VALOR ACUMULADO: \$ -							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
				VALOR AMORTIZADO: \$ -							
				VALOR AMORTIZADO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/		VIGENCIA		2023		2024		2025		2026	
CONVENIO		RECURSOS POR VIGENCIA		N/A		\$ 199.753.948,00					
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA		N/A		N/A					
		SALDO DE VIGENCIA		N/A		N/A					
INTERVENTORÍA		RECURSOS POR VIGENCIA		N/A		\$ 106.174.537,00					
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA		N/A		N/A					
		SALDO DE VIGENCIA		N/A		N/A					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199.753.948,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 103.935.974,22 52,032%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 18.924.689,03 9,474%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (85.011.285,19) -42,558%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.969.865,16 8,996%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.153.879,00 1,579%											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 106.174.537,00 %											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA \$ - %											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 52,032 Avance o Atraso Físico % -42,558											
Meta Física Ejecutada % 9,474											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)											
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad											
PLACA HUELLA ML 102											
ALCANTARILLA UN 1											
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %											
Prog 47,60 46,67%											
Ejec - 46,67%											
Prog 0,47 46,67%											
Ejec - 46,67%											
Prog 46,67%											
Ejec 46,67%											
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaíso, en la vereda Campoalegre, Morelia.											
TRAMO Y/O SECTOR 2: OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES											
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE											
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO											
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO											
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO											
OBSERVACIONES:											
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL											
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X											
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X											
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X											
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X											
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X											
VERTIENTOS: SI NO N/A X											
EMISIONES: SI NO N/A X											
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X											
OBSERVACIONES:											

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		
ESTADO: En Elaboración					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
No refleja					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
			<div>FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGOS CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RVOAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3																																																																																	
			VERSIÓN																																																																																		
			PÁGINA	1																																																																																	
			FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																					
PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		SEMANA No.: 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL																																																																																			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO																																																																																					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.																																																																																					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE		INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA																																																																																			
CONVENIO No. 4346 de 2023		CONTRATO No. 4879 DE 2023																																																																																			
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		FECHA DE INICIO: 27/12/2023																																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024																																																																																			
VALOR INICIAL: \$ 199.753.948,00		VALOR INICIAL: \$ 106.174.537,00																																																																																			
VALOR ADICIONES: \$		VALOR ADICIONES: \$																																																																																			
VALOR ACUMULADO: \$ 199.753.948,00		VALOR ACUMULADO: \$ 106.174.537,00																																																																																			
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																					
CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 199.753.948,00																																																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A																																																																																		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00																																																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A																																																																																		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																					
<table><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>199.753.948,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>118.502.032,11</td><td>59,324%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>22.078.803,87</td><td>11,053%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(96.423.228,24)</td><td>-48,271%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>14.566.057,89</td><td>7,292%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>3.153.879,00</td><td>1,579%</td></tr></tbody></table>						CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199.753.948,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	118.502.032,11	59,324%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	22.078.803,87	11,053%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(96.423.228,24)	-48,271%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.566.057,89	7,292%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.153.879,00	1,579%																																
CONVENIO																																																																																					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199.753.948,00																																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	118.502.032,11	59,324%																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	22.078.803,87	11,053%																																																																																		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(96.423.228,24)	-48,271%																																																																																		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.566.057,89	7,292%																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.153.879,00	1,579%																																																																																		
<table><thead><tr><th colspan="4">INTERVENTORÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>106.174.537,00</td><td>%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO: _____</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: _____</td></tr></tbody></table>						INTERVENTORÍA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	106.174.537,00	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	-	%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>				SI	NO		X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____				PERIODO FACTURADO: _____				VALOR FACTURA: \$ -				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: _____																																			
INTERVENTORÍA																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	106.174.537,00	%																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	-	%																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%																																																																																		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>				SI	NO		X																																																																														
SI	NO																																																																																				
	X																																																																																				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____																																																																																					
PERIODO FACTURADO: _____																																																																																					
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																					
Observaciones: _____																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																																					
Meta Física Programada % 59,324 Avance o Atraso Físico % -48,271																																																																																					
Meta Física Ejecutada % 11,053																																																																																					
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																					
<table><thead><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>PLACA HUELLA</td><td>ML</td><td>102</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA</td><td>UN</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	PLACA HUELLA	ML	102	ALCANTARILLA	UN	1	<table><thead><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>54,40</td><td></td><td></td><td></td><td>53,33%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td>0,53</td><td></td><td></td><td></td><td>53,33%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	54,40				53,33%	Ejec	-					Prog	0,53				53,33%	Ejec	-					Prog						Ejec						<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>EQUIPO TOPOGRAFICO RTK</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>RETROEXCAVADORA</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>VOLQUETA</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>MEZCLADORA</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>		Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-	RETROEXCAVADORA	1	-	VOLQUETA	1	-	MEZCLADORA	1	-	Total	4	-
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																			
PLACA HUELLA	ML	102																																																																																			
ALCANTARILLA	UN	1																																																																																			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																
Prog	54,40				53,33%																																																																																
Ejec	-																																																																																				
Prog	0,53				53,33%																																																																																
Ejec	-																																																																																				
Prog																																																																																					
Ejec																																																																																					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																			
EQUIPO TOPOGRAFICO RTK	1	-																																																																																			
RETROEXCAVADORA	1	-																																																																																			
VOLQUETA	1	-																																																																																			
MEZCLADORA	1	-																																																																																			
Total	4	-																																																																																			
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																					
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.			TRAMO Y/O SECTOR 2: OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO																																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																		
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X																																																																																		
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X																																																																																		
			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X																																																																																		
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X																																																																																		
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X																																																																																		
			VERTIMENTOS: SI NO N/A X																																																																																		
			EMISIONES: SI NO N/A X																																																																																		
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X																																																																																		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																																																		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:				
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A				
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A				
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A				
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
Búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Continuar con la búsqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
No refleja				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGOS CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RIVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

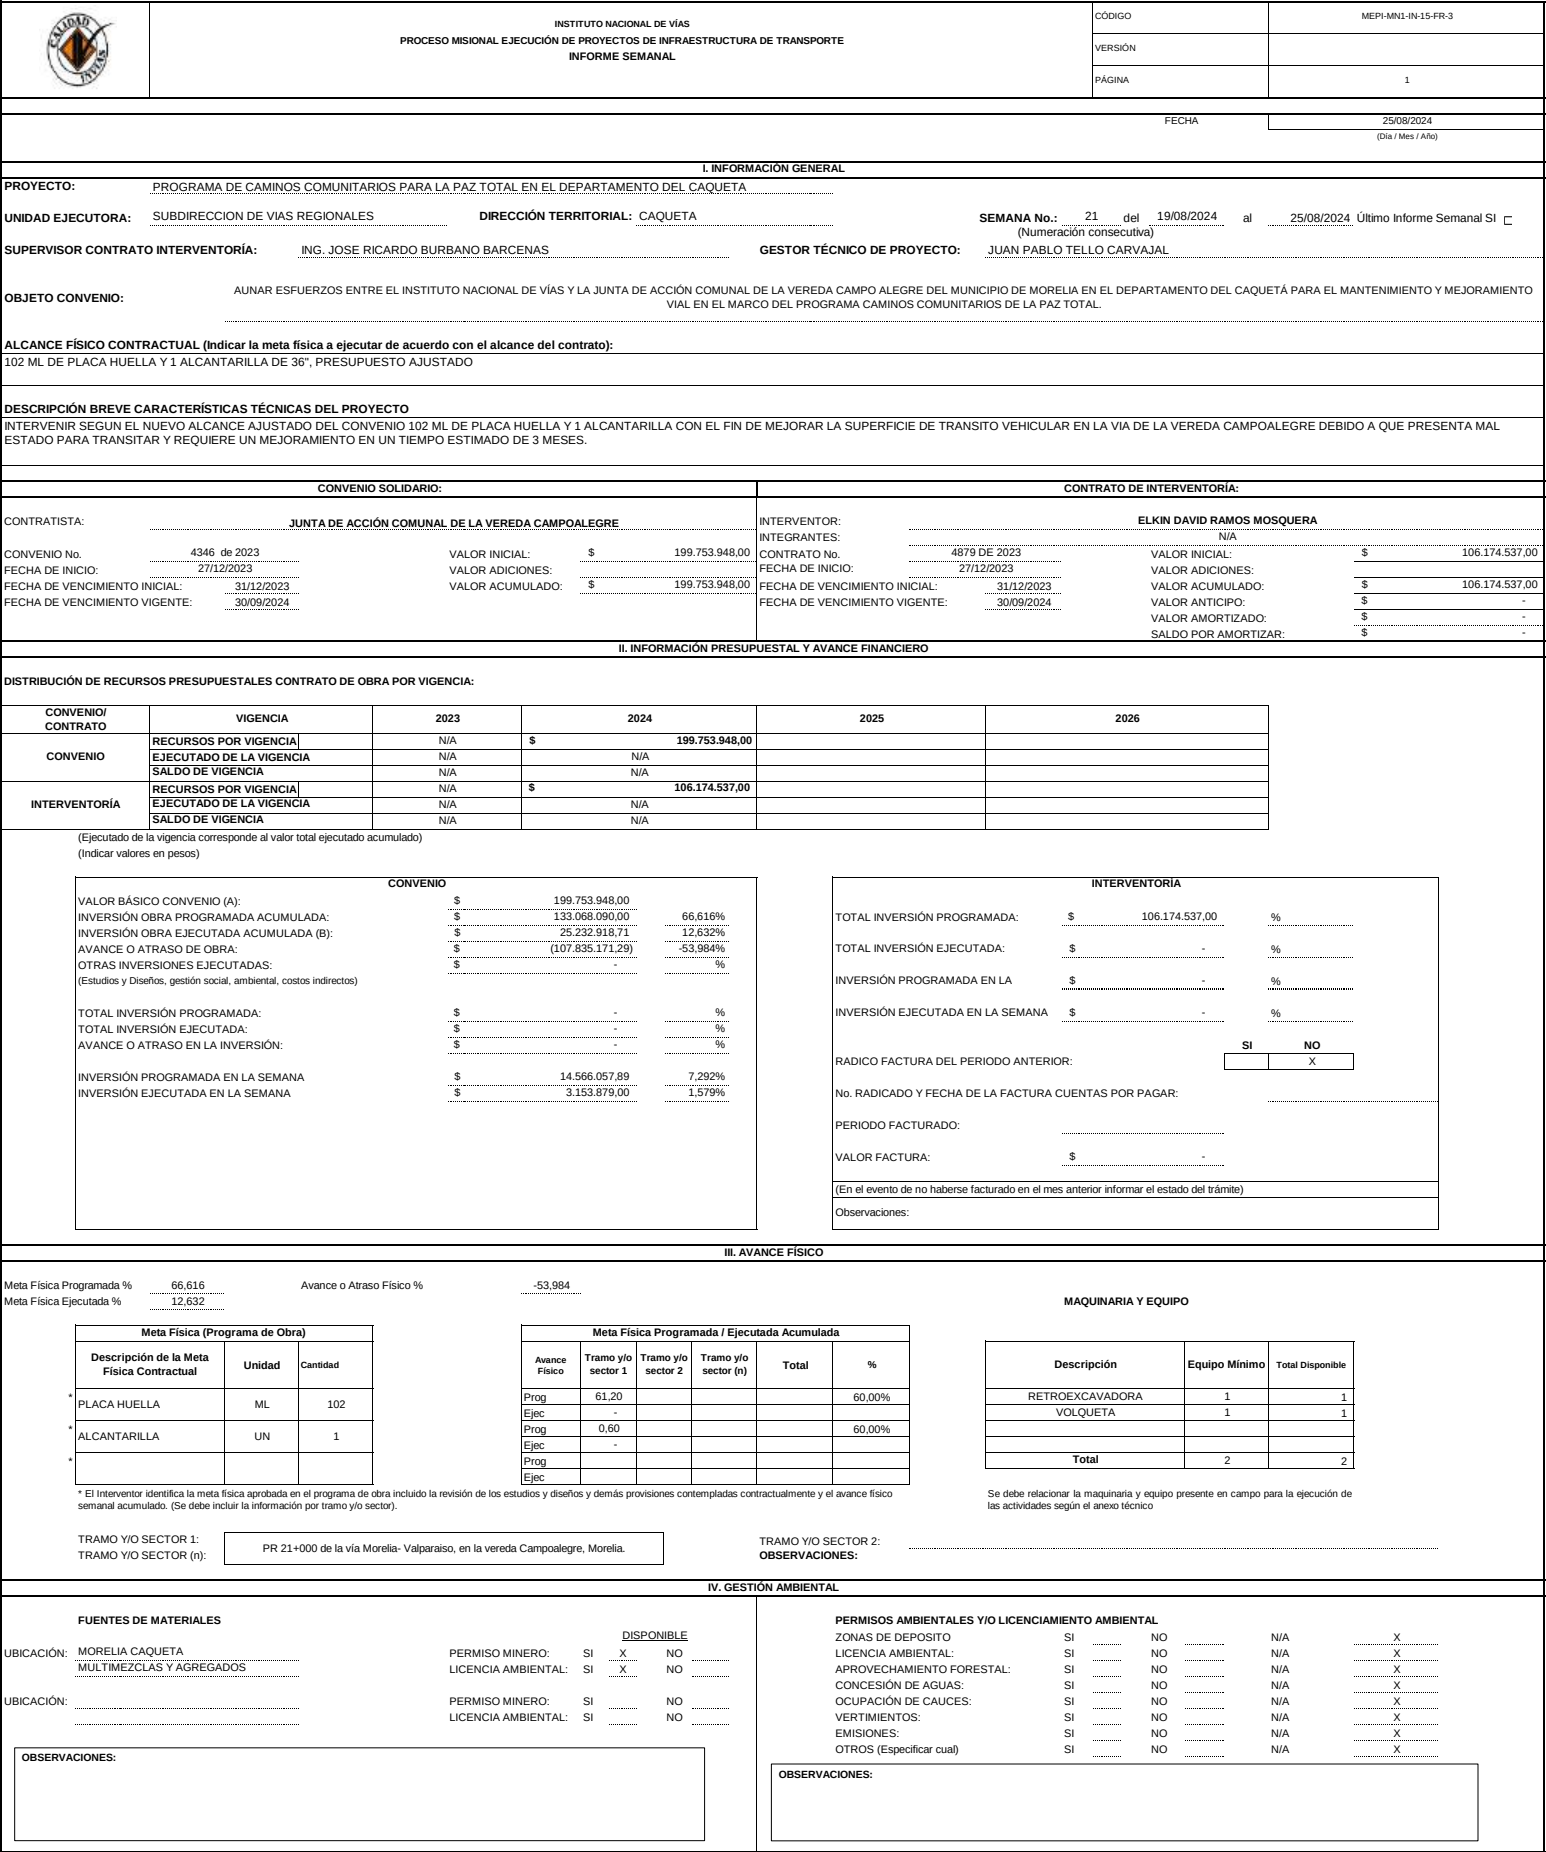

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		8	INTER	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		5		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
Se da inicio de obra realizando actividades como acopio de material pétreo y de ferretería sobre un costado de la vía.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Corte de talud para conformación y nivelación de subrasante.				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
No refleja				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
			<div> FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matricula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MNI-IN-15-FR-3

VERSION

PÁGINA

1

FECHA

1/09/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

SEMANA No.:

22

del

26/08/2024

al

1/09/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No.

4346

de

2023

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

VALOR INICIAL:

\$

199.753.948,00

VALOR ADICIONES:

\$

VALOR ACUMULADO:

\$

199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

INTEGRANTES:

N/A

CONTRATO No.

4879

DE

2023

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

VALOR INICIAL:

\$

106.174.537,00

VALOR ADICIONES:

\$

VALOR ACUMULADO:

\$

106.174.537,00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	\$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	147.634.147,89	73,908%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	56.598.283,63	28,334%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(91.035.864,26)	-45,574%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.566.057,89	7,292%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	31.365.695,00	15,702%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%

SI

NO

X

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

73.908

Avance o Atraso Físico %

-45.574

Meta Física Ejecutada %

28.334

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	102
ALCANTARILLA	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	68,00				66,67%
Ejec	-				
Prog	0,67				66,67%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VOLQUETA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

MORELIA CAQUETA

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

SI

X

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

X

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

X

EMISIONES:

SI

NO

N/A

X

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:	
ESTADO: En Elaboración				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		11	INTER	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		5		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		11		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
Corte de talud para conformación y nivelación de subrasante. Extendida y compactación de sub-base granular sobre la vía. Excavación mecánica e instalación del solado de limpieza. Posteriormente se instalaron 6 tubos de concreto de 36" con su respectivo atraque. Se realizó relleno con material seleccionado con el fin de proteger la tubería.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Fundida de huella y sobreanchos de concreto ciclópeo en carril izquierdo y derecho.				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
No refleja				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGOS CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda Los
Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PULIDORA ELECTRICA			LOS ALETONES	A	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA			LOS ALETONES	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA			LOS ALETONES	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR			LOS ALETONES	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA DE CONCRETO			LOS ALETONES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	0	2	3	0	2	3	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	5	3	2	5	3	2	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	32	20,65%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	123	79,35%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma



Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma



Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Residente de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de
los Andaquies – CS#4045

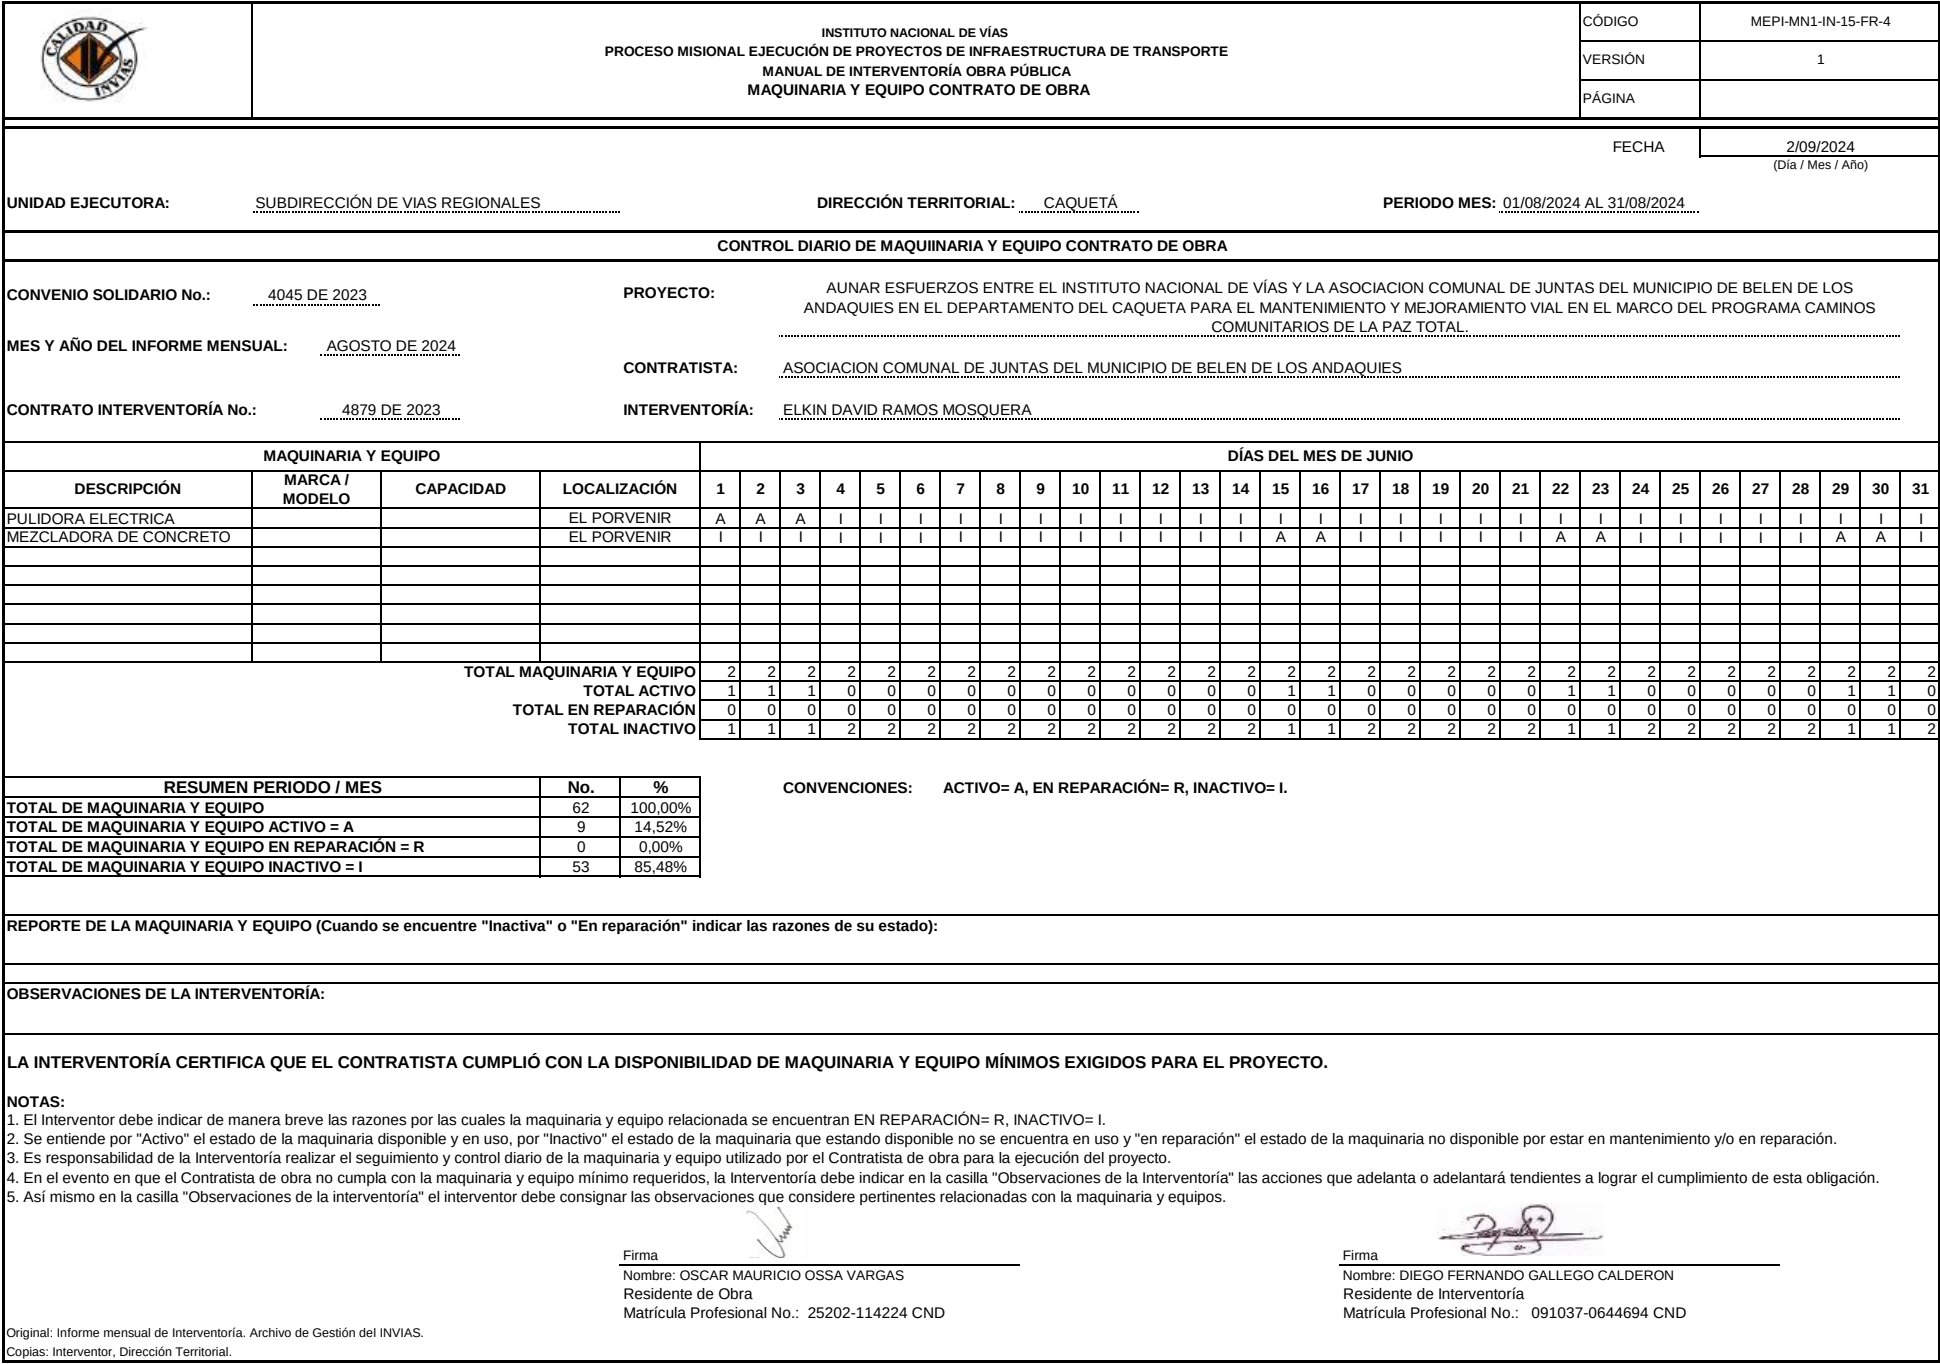

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																															
			VERSIÓN	1																															
			PÁGINA																																
			FECHA	2/08/2024 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																																
			PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024																																
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																			
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE																																
CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023			INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA																																
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RETROEXCAVADORA			CAMPOALEGRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I		
VOLQUETA			CAMPOALEGRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I		
VIBROCOMPACTADOR			CAMPOALEGRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPOALEGRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	1	1	1	2	2	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	3	3	3	2	2	3	
RESUMEN PERIODO / MES				No.	%		CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO				124	100,00%																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A				18	14,52%																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R				0	0,00%																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				106	85,48%																														
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																			
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																			
Firma Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND																																			
Firma Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE
CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA
1	FERNEY OYOLA GUEVERA	17684087	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 1.300.000	\$ 90.480	V	ASMET SALUD	80166683	\$ 162.500	COLPENSIONES	80166683	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000		
2	ULDARICO QUINTERO MOSQUERA	17684624	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 1.300.000	\$ 90.480	V	ASMET SALUD	80166683	\$ 162.500	PORVENIR	80166683	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000		
3	EMILIO CALDERON OME	17682547	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 1.300.000	\$ 90.480	V	NUEVA EPS	80166683	\$ 162.500	COLPENSIONES	80166683	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000		
4	KEVIN MAURICIO YELA QUINTERO	1006410126	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 1.300.000	\$ 90.480	V	NUEVA EPS	80166683	\$ 162.500	PORVENIR	80166683	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000		
5	JHON SEBASTIAN CANTILLO OME	1115791337	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 1.300.000	\$ 90.480	V	ASMET SALUD	80166683	\$ 162.500	PORVENIR	80166683	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000		
6	JHON FREDDY CUELLAR SALINAS	1119213244	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.415.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 566.000	\$ 98.484	V	NUEVA EPS	80166683	\$ 178.875	COLPENSIONES	80166683	\$ 228.400	\$ 58.600	\$ 28.300		
7	ARMANDO CALDERON ARYBUNDIAGA	17684181	MAESTRO DE OBRA	\$ 2.315.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 925.000	\$ 161.144	V	ASMET SALUD	80166683	\$ 289.375	COLFONDOS	80166683	\$ 370.400	\$ 92.600	\$ 46.300		
8																																															
9																																															
10																																															
11																																															
12																																															
13																																															
14																																															
15																																															
16																																															
17																																															
18																																															
19																																															
20																																															
21																																															
22																																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/09/2024 a la que se refiere la nota 6 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
 - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corres en la nómina electrónica cuando aplique.
 - En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
 - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
 - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad o prestadora del servicio.
 - El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Benito Ome M
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No: 63202-121075 OND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSK
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 1

[illegible]



ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT: 900.128.460-0



Florencia, 10 de septiembre de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenas

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4318 de 2023

Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:

Que el señor **BENITO OME MUÑOZ** identificado con CC # 17.683.153 expedida Belén de los Andaquíes Vicepresidente de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES** identificada con Nit 900.553.557-8 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, con corte a 31/Agosto/2024.


Atentamente,

Diana Milena Rivera
DIANA MILENA RIVERA LOZANO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 228928-TT

Benito ome
BENITO OME MUNOZ
C.C 17.683.153
Vicepresidente

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad
social de Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045




PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

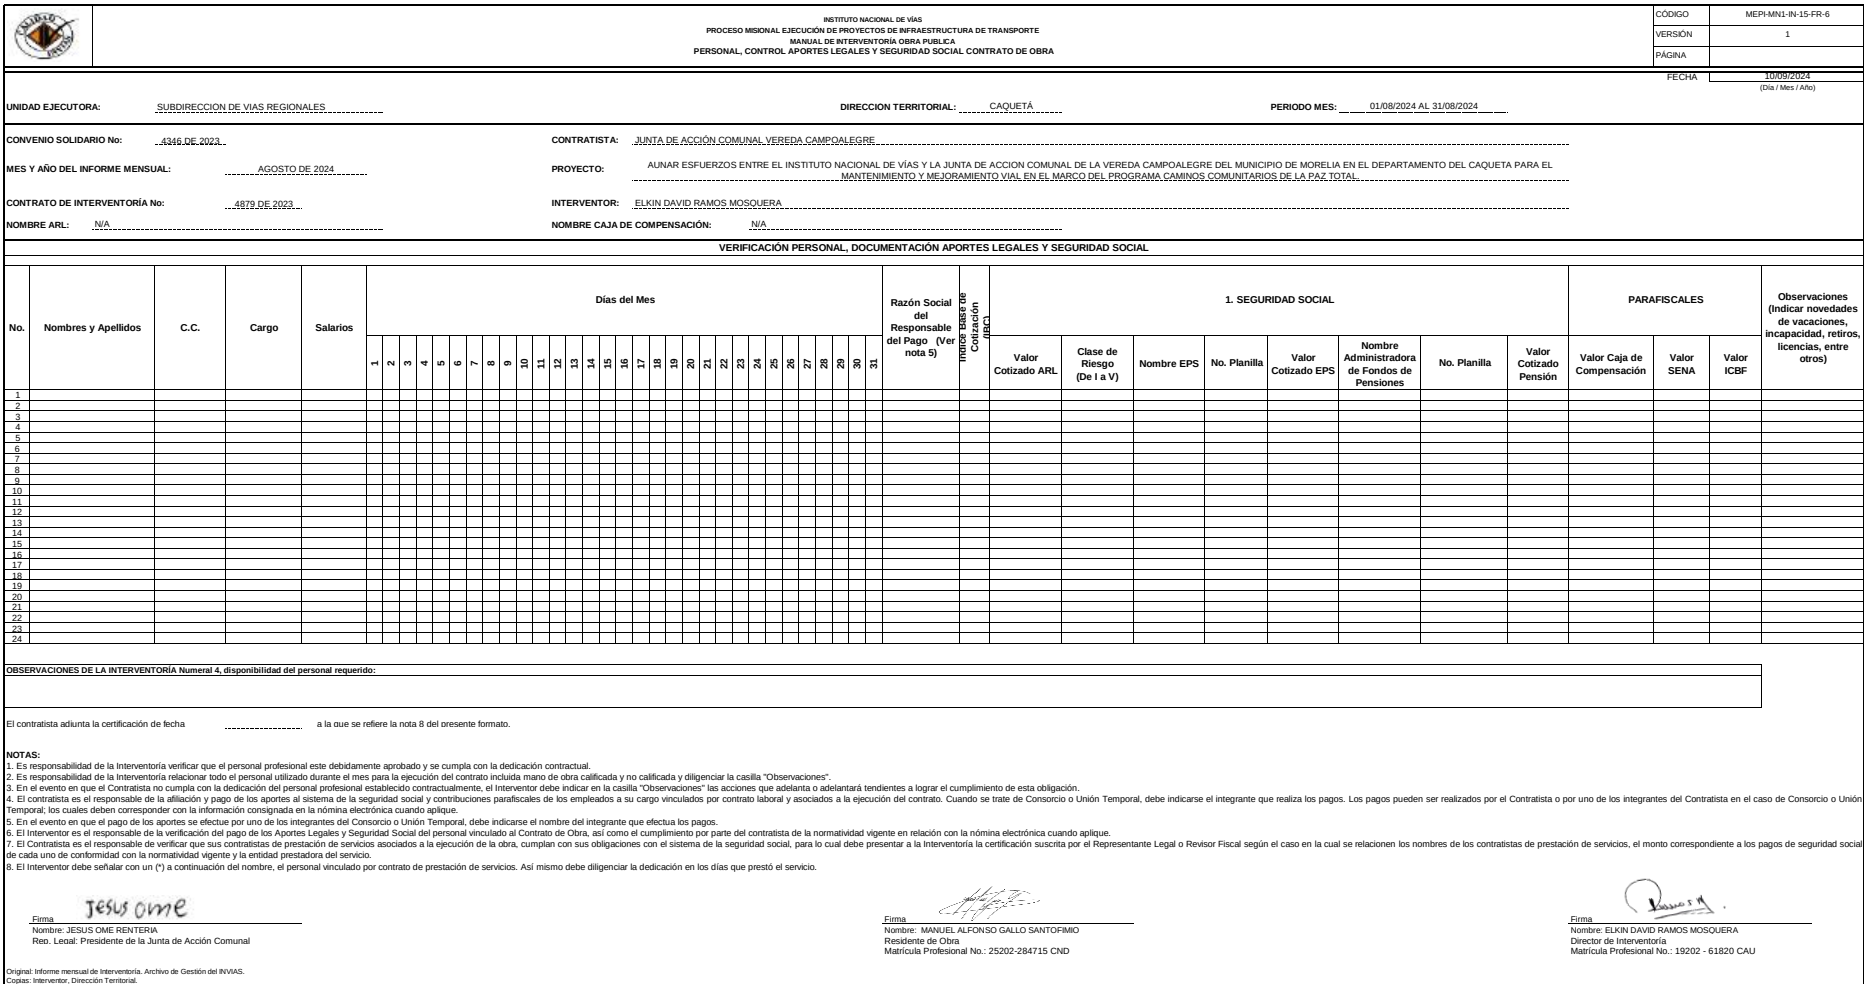

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la
Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024															
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	1298823		10	NACIÓN	4318-0	\$ 196.378.598,00	\$ -								
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 197.378.598,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		N/A											SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>																																								
		<div>FECHA</div> <div>2/09/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																								
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CAQUETÁ</div> <div>PERIODO MES:</div> <div>01/08/2024 AL 31/08/2024</div>																																										
<div>CONVENIO SOLIDARIO No.:</div> <div>4318 DE 2023</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES</div> <div>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:</div> <div>AGOSTO DE 2024</div> <div>PROYECTO:</div> <div>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>4879 DE 2023</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA</div>																																										
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div> <table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA</td><td>\$ 147.803.248,00</td><td></td><td>\$ 147.803.248,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.434.097,00</td><td></td><td>\$ 4.434.097,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.141.253,00</td><td></td><td>\$ 44.141.253,00</td></tr><tr><td>*</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 196.378.598,00</td><td></td><td>\$ 196.378.598,00</td></tr></table> <div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div></div>				VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 147.803.248,00		\$ 147.803.248,00	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.434.097,00		\$ 4.434.097,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.141.253,00		\$ 44.141.253,00	*	N/A			*	N/A			*	N/A			*	N/A			*	N/A			VALOR TOTAL	\$ 196.378.598,00		\$ 196.378.598,00
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL																																							
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 147.803.248,00		\$ 147.803.248,00																																							
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.434.097,00		\$ 4.434.097,00																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.141.253,00		\$ 44.141.253,00																																							
*	N/A																																									
*	N/A																																									
*	N/A																																									
*	N/A																																									
*	N/A																																									
VALOR TOTAL	\$ 196.378.598,00		\$ 196.378.598,00																																							

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de
Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024	
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023												CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024												PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023												INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	1219723		10	NACIÓN	4045-0	\$ 185.171.800,00	\$ -								
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 186.171.800,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		N/A											SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 138.939.422,00		\$ 138.939.422,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.168.183,00		\$ 4.168.183,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.064.195,00		\$ 42.064.195,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	\$ 185.171.800,00		\$ 185.171.800,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la
Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024	
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023												CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024												PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023												INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	1297423		10	NACIÓN	4346-0	\$ 199.753.948,00	\$ -								
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.753.948,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		N/A											SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

PERIODO MES:

01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No:

4346 DE 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4879 DE 2023

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 151.067.610,00		\$ 151.067.610,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.532.028,00		\$ 4.532.028,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.154.310,00		\$ 44.154.310,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	\$ 199.753.948,00		\$ 199.753.948,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la
Vereda Los Aletones – CS#4318

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de
Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024																											
CONVENIO SOLIDARIO No 4045 DE 2023			CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023			INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	19	24	21	24	24	24	22	19	20	24	21	24	21	24	21	15	20	24	20	21	24	21	24	22	22	23	24	21	24	684
Lluvias moderadas	0	1	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	2	2	1	0	0	0	24	
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	0	3	0	3	0	0	9	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	36	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la
Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024																											
CONVENIO SOLIDARIO No 4346 DE 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2024			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023			INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	20	23	24	21	24	16	22	22	20	24	24	21	20	21	24	21	20	24	24	20	21	24	21	20	19	22	16	24	24	20	670
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	8	2	2	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	3	3	0	0	4	4	2	4	0	0	0	45
Lluvias intensas	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	4	0	0	4	29
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND</div>																<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND</div>																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11				
						VERSIÓN	1				
						PAGINA					

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

PERIODO MES:

01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.:

4318 DE 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4879 DE 2023

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple NO	SI o	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA										

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de
Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11				
						VERSIÓN	1				
						PAGINA					

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

PERIODO MES:

01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.:

4045 DE 2023

CONTRATISTA:

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4879 DE 2023

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple NO	SI o	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA										

OBSERVACIONES:

SE ANEXA DISEÑO DE MEZCLAS DE 3.000 PSI DE CONCRETO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11				
						VERSIÓN	1				
						PAGINA					

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

PERIODO MES:

01/08/2024 AL 31/08/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.:

4346 DE 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4879 DE 2023

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple NO	SI o	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA										

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.


6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma



Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma



Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		2	9	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	PERIODO MES:	01/08/2024 AL 31/08/2024
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONVENIO SOLIDARIO No.	4318 DE 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO DE 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 197.378.598,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 197.378.598,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	\$ 39.475.719,60	Desde: 17/11/2023 Hasta: 31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.868.929,90	Desde: 17/11/2023 Hasta: 31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.213.579,40	Desde: 31/12/2023 Hasta: 31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100295255
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	118%	\$ 232.000.000	Desde: 17/11/2023 Hasta: 31/12/2023
Otros		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-100073005	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	9/11/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA					2	9	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de
Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		2	9	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	PERIODO MES:	01/08/2024 AL 31/08/2024
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONVENIO SOLIDARIO No.	4045 DE 2023	CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO DE 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 186.171.800,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 186.171.800,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento		\$ -	Desde: Hasta:
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ -	
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ -	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.:	
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ -	Desde: Hasta:
Otros		\$ -	Día Mes Año Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.:		OTRAS PÓLIZAS No.:	
Certificado de modificación o anexo No.:			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA					2	9	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
.....

PRÓRROGA No.:
.....

MODIFICACIÓN No.:
.....

SUSPENSIÓN No.:
.....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
.....

PRÓRROGA No.:
.....

MODIFICACIÓN No.:
.....

SUSPENSIÓN No.:
.....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:
NO EXISTE INFORMACION CARGADA EN LA PAGINA DEL SECOP SOBRE LAS POLIZAS DE ESTE CONVENIO.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		2	9	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	PERIODO MES:	01/08/2024 AL 31/08/2024
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONVENIO SOLIDARIO No.	4346 DE 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO DE 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 200.753.948,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.753.948,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 4.500.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.750.189,60</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.037.697,40</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.226.184,40</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.750.189,60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.037.697,40	Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.226.184,40	<table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">14/11/2023</td><td colspan="3">31/10/2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td colspan="3">14/11/2023</td><td colspan="3">31/12/2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td colspan="3">31/12/2023</td><td colspan="3">31/12/2028</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta			14/11/2023			31/10/2026			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	14/11/2023			31/12/2026			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31/12/2023			31/12/2028		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento	20%	\$ 40.750.189,60																																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.037.697,40																																																								
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -																																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.226.184,40																																																								
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
14/11/2023			31/10/2026																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
14/11/2023			31/12/2026																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
31/12/2023			31/12/2028																																																							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100296701
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	11/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																															
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>116%</td><td>\$ 232.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000	Otros		\$ -	<table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">17/11/2023</td><td colspan="3">31/12/2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta			17/11/2023			31/12/2023			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000																													
Otros		\$ -																													
VIGENCIA																															
Desde			Hasta																												
17/11/2023			31/12/2023																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																										

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-100073329	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	11/11/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA					2	9	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS					CÓDIGO	
						VERSIÓN	
						PÁGINA	
						FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 4318 de 2023 (Indicar número y año)				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES			
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)				INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	\$ 59.104.062,00	\$ 44.328.046,00	\$ 44.328.046,00		\$ 147.760.154,00	75,2%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ 4.432.805,00		\$ 4.432.805,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 17.674.255,00	\$ 13.255.692,00	\$ 13.255.692,00		\$ 44.185.639,00	22,5%
4							
5							
N							
	TOTAL	\$ 76.778.317,00	\$ 57.583.738,00	\$ 62.016.543,00		\$ 196.378.598,00	100,0%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica. 2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría. 3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio. 4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: Benito Ome M		Firma: Elkin David Ramos Mosquera					
Nombre: BENITO OME MUÑOZ		Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA					
Representante Legal o su Apoderado		Representante Legal o su Apoderado					
Contratista		Interventor					
		Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU					
Firma: Diana Milena RIVERA		Firma: Rene Orlando Sanchez Calderon					
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO		Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON					
Contador del contratista		Ingeniero Residente del Proyecto					
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica		Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica					
Tarjeta Profesional No.: 228928-T		Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND					
Contratista							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de
Asojuntas Belén de los Andaquies –
CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS					CÓDIGO	
						VERSIÓN	
						PÁGINA	
						FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 4045 de 2023 (Indicar número y año)				CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES			
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)				INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA			
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	\$ 55.575.768,00	\$ 41.681.827,00	\$ 41.681.827,00		\$ 138.939.422,00	75,0%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ 4.168.183,00		\$ 4.168.183,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 16.825.677,00	\$ 12.619.259,00	\$ 12.619.259,00		\$ 42.064.195,00	22,7%
4							
5							
N							
	TOTAL	\$ 72.401.445,00	\$ 54.301.086,00	\$ 58.469.269,00		\$ 185.171.800,00	100,0%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica. 2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría. 3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio. 4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: Luis Elver Cantillo P. Nombre: LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO Representante Legal o su Apoderado Contratista		Firma: Elkin David Ramos Mosquera Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU					
Firma: Erika Paola García Castro Nombre: ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO Contador del contratista Apoyo Administrativo Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Tarjeta Profesional No.: 279409-T Contratista		Firma: Oscar Mauricio Ossa Vargas Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS Ingeniero Residente del Proyecto Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la
Vereda Campoalegre – CS#4346

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>					
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ					
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No.	4346 de 2023 (Indicar número y año)						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE						
OBJETO DEL CONVENIO:							
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4879 DE 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA						
JUSTIFICACIÓN:							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	\$ 60.427.044,00	\$ 45.320.283,00	\$ 45.320.283,00		\$ 151.067.610,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ 4.532.028,00		\$ 4.532.028,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 17.661.724,00	\$ 13.246.293,00	\$ 13.246.293,00		\$ 44.154.310,00	22,1%
4							
5							
N							
	TOTAL	\$ 78.088.768,00	\$ 58.566.576,00	\$ 63.098.604,00		\$ 199.753.948,00	100,0%
NOTAS:							
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.							
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.							
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.							
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:							
Nombre:		JESUS OME RENTERIA					
Representante Legal o su Apoderado							
Contratista							
Firma:							
Nombre:		SÁNDRA PATRICIA PARRA TORRES					
Contador del contratista							
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica							
Tarjeta Profesional No.:		118739-T					
Contratista							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.							
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							
Firma:							
Nombre:		ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA					
Representante Legal o su Apoderado							
Interventor							
Matrícula Profesional No.:		19202 61820 CAU					
Firma:							
Nombre:		MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO					
Ingeniero Residente del Proyecto							
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica							
Matrícula Profesional No.:		25202-284714 CND					

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo
de desembolso de la Vereda Los Aletones –
CS#4318

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS

1 de 1

FECHA

31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.

1

MES: AGOSTO DE 2024

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

☐

CONVENIO No.

4318 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO:

100%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:

\$ 196.378.598,00

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (MCTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
14	2/08/2024	FERNEY OYOLA GUEVARA	Nomina	\$ 828.525,00	0	0	0	\$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
15	6/08/2024	JHO FREDY CUELLAR SALINAS	Nomina	\$ 893.452,00	0	0	0	\$ 893.452,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
16	2/08/2024	ARMANDO CALDERON ARTUNDUAGA	Nomina	\$ 1.401.577,00	0	0	0	\$ 1.401.577,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
17	2/08/2024	ULDARICO QUINTERO MOSQUERA	Nomina	\$ 828.525,00	0	0	0	\$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
18	2/08/2024	EMILIO CALDERON OME	Nomina	\$ 828.525,00	0	0	0	\$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
19	2/08/2024	KEVIN MAURICIO YELA QUINTERO	Nomina	\$ 828.525,00	0	0	0	\$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
20	2/08/2024	JHON SEBASTIAN CANTILLO OME	Nomina	\$ 828.525,00	0	0	0	\$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
21	16/08/2024	JUAN GABRIEL MOTTA NUÑEZ	Transporte material de ferreteria	\$ 3.200.000,00	0	32000	0	\$ 3.168.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
22	9/08/2024	LINDELIA SARRIAS CAMPOS	Alquiler de maquinaria	\$ 9.000.000,00	0	360000	0	\$ 8.640.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
23	13/08/2024	RENTACAT ZOMAC SAS	Transporte de maquinaria	\$ 2.000.000,00	0	5000	0	\$ 1.995.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
24	13/08/2024	DANIEL ALBERO GONZALEZ ARCILLA	Compra base granular	\$ 2.142.000,00	0	45000	0	\$ 2.097.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
25	15/08/2024	JUAN CARLOS MANRIQUE YEPES	Vibrocompactador	\$ 2.160.000,00	0	86400	0	\$ 2.073.600,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
26	15/08/2024	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	Transporte de materiales petróo	\$ 8.000.000,00	0	80000	0	\$ 7.920.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
27	15/08/2024	CARLOS ZAMBRANO CORTES	Servicios de excavacion	\$ 4.332.000,00	0	173280	0	\$ 4.158.720,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
28	20/08/2024	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA	COMPRA DE MATERIAL PETREO	\$ 1.963.000,00	0	41250	0	\$ 1.921.750,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
29	31/08/2024	DIAN	Retención en la fuente de Julio	\$ 585.000,00	0	0	0	\$ 585.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
30	28/08/2024	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA	COMPRA DE MATERIAL PETREO	\$ 2.891.700,00	0	60750	0	\$ 2.830.950,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
31	28/08/2024	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	Transporte de materiales petróo	\$ 6.000.000,00	0	60000	0	\$ 5.940.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
32	31/08/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100295255	\$ 1.619.200,00	0	0	0	\$ 1.619.200,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
33	31/08/2024	Banco de Occidente	Rendimientos financieros	\$ 461.658,30	0	0	0	\$ 461.658,30	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

\$ 50.792.212,30

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,


SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	\$ 147.803.248,00	\$ 51.533.139,00	\$ 48.711.354,00	\$ 100.244.493,00	\$ 47.558.755,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	\$ 4.434.097,00			\$ -	\$ 4.434.097,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.141.253,00	\$ 8.465.221,00	\$ 2.080.858,30	\$ 10.546.079,30	\$ 33.595.173,70
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 196.378.598,00			\$ 110.790.572,30	\$ 85.588.025,70

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME

(AGOSTO) :

\$

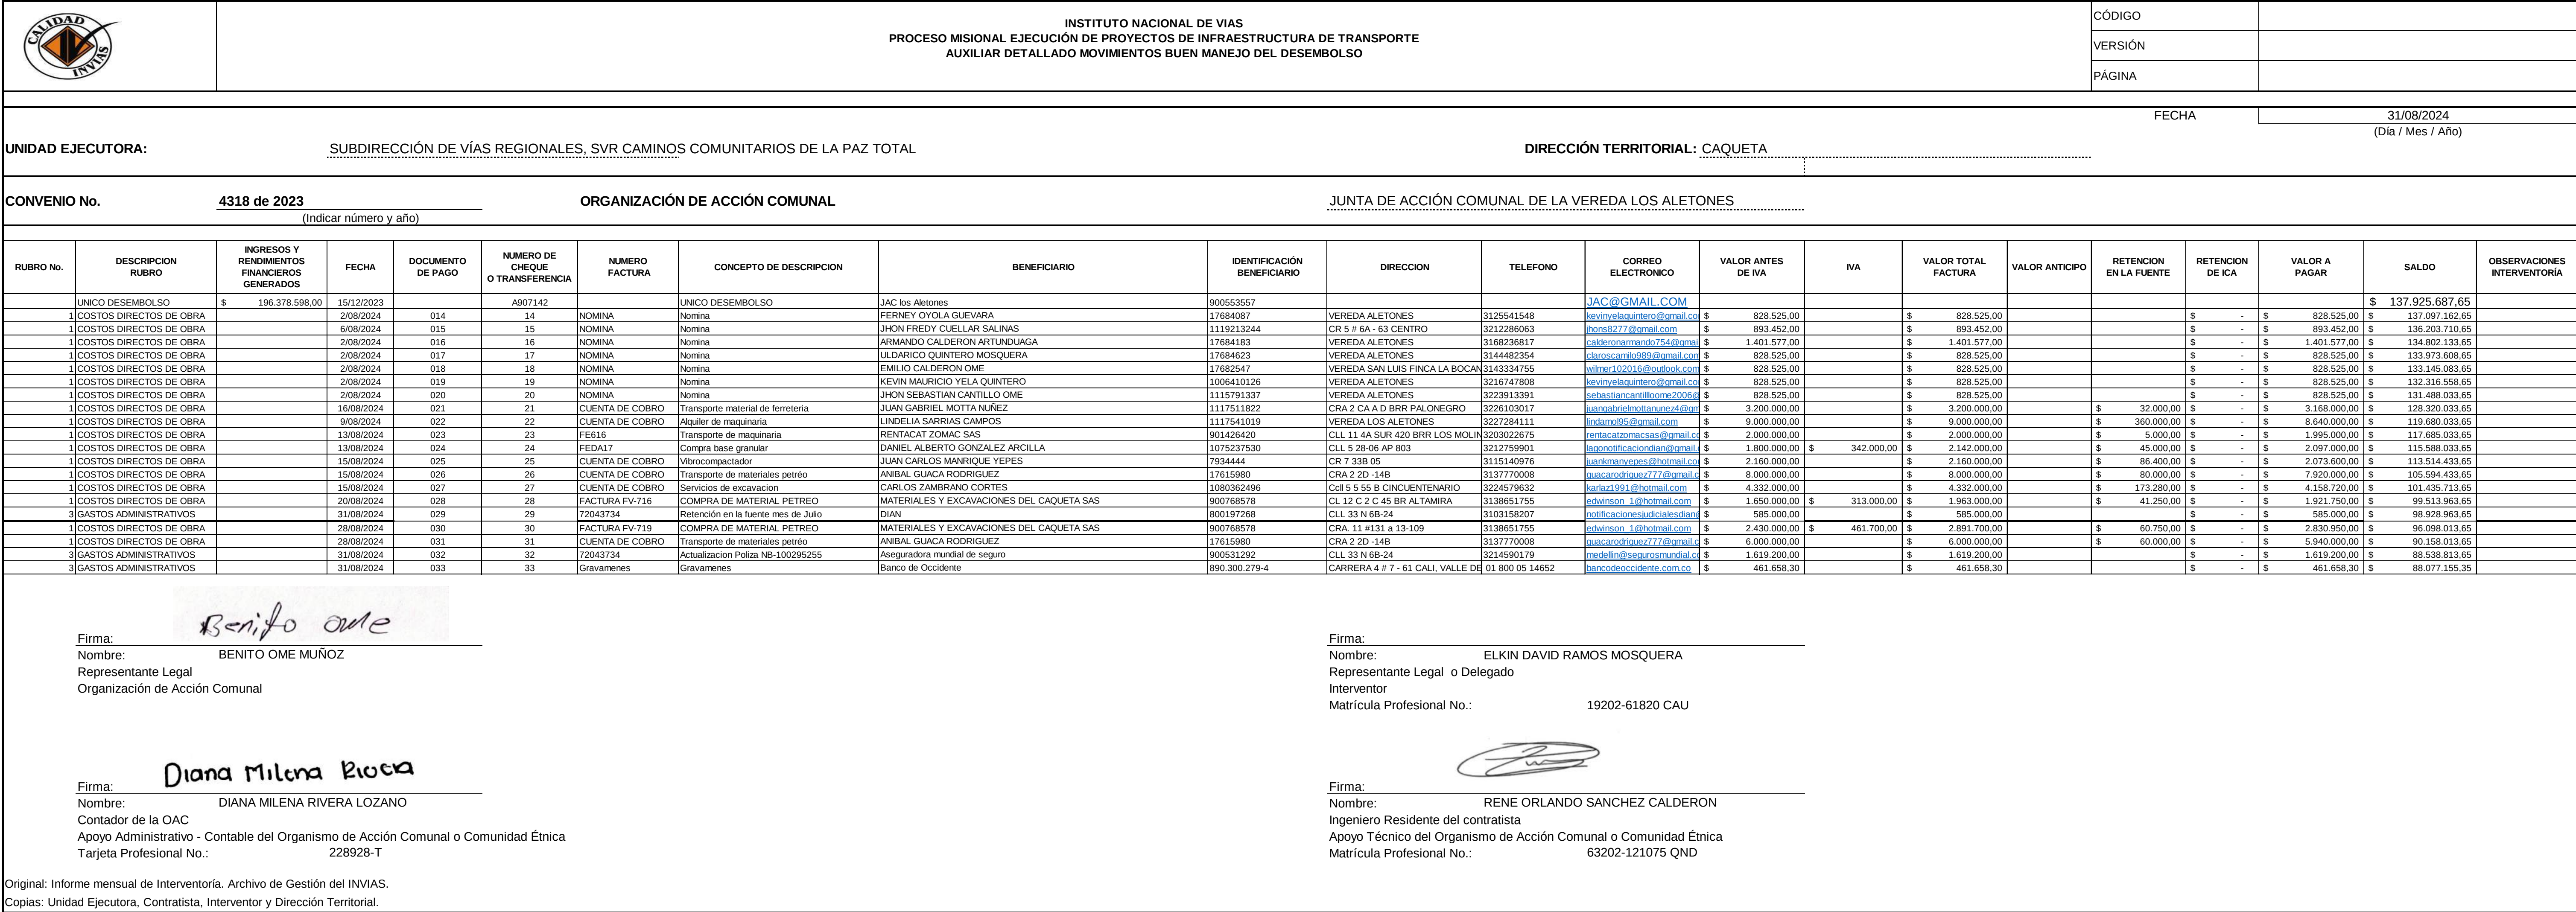

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo
de desembolso de Asojuntas Belén de los
Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. <u>1</u>		MES: <u>AGOSTO DE 2024</u>		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO <u>1</u>		
CONVENIO No. <u>4045 DE 2023</u> (Indicar número y año)						
DESEMBOLSO OTORGADO: <u>100 %</u>						
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: <u>\$ 185,171,800</u> CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (M/CTE)						
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
CONTRATISTA: <u>ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES</u>						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4879 DE 2023</u> (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: <u>ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA</u>						

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO): \$ (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Jesus Ome
Firma: _____
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Elkin David Ramos Mosquera
Firma: _____
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Manuel Alfonso Gallo Santofimio
Firma: _____
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma: _____
Nombre: _____
Contadora de la OAC
Matrícula Profesional No.: _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo
de desembolso de la Vereda Campoalegre –
CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA				
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA			
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1		MES:	AGOSTO DE 2024			
CONVENIO No. 4346 DE 2023 (Indicar número y año)		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO 7				
DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %						
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ 199,753,948		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (M/CTE)				
OBJETO DEL CONVENIO: UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica).						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : (Indicar el mes) \$ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)						
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPH-MN1-IN-2)						
OBSERVACIONES:						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica).						
Firma: Nombre: JESUS OME RENTERIA Representante Legal o Delegado Contratista	Firma: Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU					
Firma: Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO Ingeniero Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND	Firma: Nombre: Contadora de la OAC Matrícula Profesional No.:					

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023																		
BENITO OME MUÑOZ PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES																		
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA INTERVENTOR DE OBRA																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																		
ITEM	CAPITULOS	V/ PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	0,00																\$ 0,00
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	\$ 209.706,00	\$ 104.853,00	\$ 104.853,00														\$ 209.706,00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$ 4.769.706,00				\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60	\$ 476.970,60			\$ 4.769.706,00
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	\$ 30.687.601,00			\$ 6.137.520,20	\$ 6.137.520,20	\$ 6.137.520,20	\$ 6.137.520,20	\$ 6.137.520,20									\$ 30.687.601,00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	\$ 69.792.652,00					\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11	\$ 7.754.739,11			\$ 69.792.652,00
630.1.7	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	\$ 15.967.057,00						\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13	\$ 1.995.882,13			\$ 15.967.057,00
640.1	ACERO DE REFUERZO FY ^a =4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	\$ 26.333.390,00			\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00	\$ 2.633.339,00				\$ 26.333.390,00
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.432.803,00													\$ 1.773.121,20	\$ 1.773.121,20	\$ 886.560,60	\$ 4.432.803,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.185.683,00		\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 3.156.120,21	\$ 44.185.683,00
	TOTAL PROYECTO	\$ 196.378.598,00	\$ 104.853,00	\$ 3.260.973,21	\$ 11.926.979,41	\$ 12.403.950,01	\$ 20.158.689,13	\$ 22.154.571,25	\$ 22.154.571,25	\$ 16.017.051,05	\$ 16.017.051,05	\$ 16.017.051,05	\$ 16.017.051,05	\$ 16.017.051,05	\$ 15.156.833,25	\$ 4.929.241,41	\$ 4.042.680,81	\$ 196.378.598,00
PROGRAMADO		SEMANAL	0,053%	1,661%	6,073%	6,316%	10,265%	11,282%	11,282%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	7,718%	2,510%	2,059%	100,000%
		ACUMULADO	0,053%	1,714%	7,787%	14,103%	24,368%	35,650%	46,932%	55,088%	63,244%	71,400%	79,556%	87,712%	95,430%	97,940%	100,000%	
EJECUTADO		SEMANAL	0,000%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%	19,576%	6,828%	2,369%	9,750%						
		ACUMULADO	0,000%	1,607%	3,214%	4,821%	6,429%	8,036%	27,612%	34,440%	36,809%	46,559%						

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de Asojuntas
Belén de los Andaquies – CS#4045

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023

LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO

PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

INTERVENTOR DE OBRA







OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ITEM	CAPITULOS	V/ PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															TOTAL
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	\$ 783.252,00	\$ 391.626,00	\$ 391.626,00														\$ 783.252,00
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	\$ 178.577,00	\$ 89.288,50	\$ 89.288,50														\$ 178.577,00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$ 7.274.043,00			\$ 1.454.808,60	\$ 1.454.808,60	\$ 1.454.808,60	\$ 1.454.808,60	\$ 1.454.808,60									\$ 7.274.043,00
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	\$ 3.830.081,00			\$ 766.016,20	\$ 766.016,20	\$ 766.016,20	\$ 766.016,20	\$ 766.016,20									\$ 3.830.081,00
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	\$ 0,00	\$ 0,00															\$ 0,00
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	\$ 13.585.372,00				\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43	\$ 1.940.767,43						\$ 13.585.372,00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	\$ 55.020.253,00				\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44	\$ 6.113.361,44				\$ 55.020.253,00
640.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA	\$ 26.776.050,00			\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00	\$ 2.677.605,00				\$ 26.776.050,00
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	\$ 11.594.624,00				\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40	\$ 1.159.462,40			\$ 11.594.624,00
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	\$ 19.897.170,00				\$ 3.979.434,00	\$ 3.979.434,00	\$ 3.979.434,00	\$ 3.979.434,00	\$ 3.979.434,00								\$ 19.897.170,00
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.168.183,00													\$ 1.667.273,20	\$ 1.667.273,20	\$ 833.636,60	\$ 4.168.183,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.064.195,00		\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 3.004.585,36	\$ 42.064.195,00
	TOTAL PROYECTO	\$ 185.171.800,00	\$ 480.914,50	\$ 3.485.499,86	\$ 7.903.015,16	\$ 21.096.040,43	\$ 21.096.040,43	\$ 21.096.040,43	\$ 21.096.040,43	\$ 18.875.215,63	\$ 14.895.781,63	\$ 14.895.781,63	\$ 12.955.014,20	\$ 12.955.014,20	\$ 5.831.320,96	\$ 4.671.858,56	\$ 3.838.221,96	\$ 185.171.800,00
PROGRAMADO	SEMANAL	0,260%	1,882%	4,268%	11,393%	11,393%	11,393%	11,393%	11,393%	10,193%	8,044%	8,044%	6,996%	6,996%	3,149%	2,523%	2,073%	100,000%
	ACUMULADO	0,260%	2,142%	6,410%	17,803%	29,196%	40,589%	51,982%	62,175%	70,219%	78,263%	85,259%	92,259%	95,404%	97,927%	100,000%		
EJECUTADO	SEMANAL	0,000%	1,754%	7,277%	6,020%	18,177%	2,010%	15,046%	6,351%	7,203%	7,995%							
	ACUMULADO	0,000%	1,754%	9,031%	15,051%	33,228%	35,239%	50,285%	56,636%	63,839%	71,834%							


ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023																		
JESUS OME RENTERIA PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE																		
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA INTERVENTOR DE OBRA																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																		
ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															TOTAL
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 23 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 14 (30 SEP)	
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	\$ 397.626,00		\$ 397.626,00													\$ 397.626,00	
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	\$ 176.561,00	\$ 88.280,50	\$ 88.280,50													\$ 176.561,00	
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$ 96.764,00				\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40	\$ 9.676,40		\$ 96.764,00	
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	\$ 14.577.978,00			\$ 2.915.595,60	\$ 2.915.595,60	\$ 2.915.595,60	\$ 2.915.595,60	\$ 2.915.595,60								\$ 14.577.978,00	
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	\$ 64.597.841,00					\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89	\$ 7.177.537,89		\$ 64.597.841,00	
630.1.7	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	\$ 14.462.812,00						\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50	\$ 1.807.851,50		\$ 14.462.812,00	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	\$ 24.169.906,00			\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60	\$ 2.416.990,60			\$ 24.169.906,00	
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$ 1.585.458,00			\$ 792.729,00	\$ 792.729,00											\$ 1.585.458,00	
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	\$ 17.417,00			\$ 8.708,50	\$ 8.708,50											\$ 17.417,00	
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	\$ 543.802,00			\$ 543.802,00												\$ 543.802,00	
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	\$ 8.752.080,00				\$ 4.376.040,00	\$ 4.376.040,00										\$ 8.752.080,00	
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	\$ 11.550.194,00				\$ 3.850.064,67	\$ 3.850.064,67	\$ 3.850.064,67									\$ 11.550.194,00	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA	\$ 6.293.910,00			\$ 2.097.970,00	\$ 2.097.970,00	\$ 2.097.970,00										\$ 6.293.910,00	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	\$ 487.867,00							\$ 487.867,00								\$ 487.867,00	
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	\$ 3.357.394,00				\$ 3.357.394,00											\$ 3.357.394,00	
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.532.028,00												\$ 1.812.811,20	\$ 1.812.811,20	\$ 906.405,60	\$ 4.532.028,00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.154.310,00		\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 3.153.879,29	\$ 44.154.310,00	
	TOTAL PROYECTO	\$ 199.753.948,00	\$ 88.280,50	\$ 3.639.785,79	\$ 11.929.674,99	\$ 22.979.048,05	\$ 25.997.754,44	\$ 21.331.595,94	\$ 17.969.398,27	\$ 14.565.935,67	\$ 14.565.935,67	\$ 14.565.935,67	\$ 14.565.935,67	\$ 14.565.935,67	\$ 13.961.756,27	\$ 4.966.690,49	\$ 4.060.284,89	\$ 199.753.948,00
	PROGRAMADO	SEMANAL	0,044%	1,822%	5,972%	11,504%	13,015%	10,679%	8,996%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	6,989%	2,486%	2,033%	100,000%
		ACUMULADO	0,044%	1,866%	7,838%	19,342%	32,357%	43,036%	52,032%	59,324%	66,616%	73,908%	81,200%	88,492%	95,481%	97,967%	100,000%	
	EJECUTADO	SEMANAL	0,000%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	15,702%						
		ACUMULADO	0,000%	1,579%	3,158%	4,737%	6,316%	7,895%	9,474%	11,053%	12,632%	28,334%						

ANEXO 8.14.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA



MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1

FECHA

2/09/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONTRATO DE OBRA No. 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE OBRA No. 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO DE OBRA No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	2/09/2024
	(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

CAMIONETA: **MARCA:** MITSUBISHI **CILINDRAJE:** 2477 CC **MODELO:** 2015

MOTOCICLETA: **MARCA:** YAMAHA **CILINDRAJE:** 149 CC **MODELO:** 2024

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

- NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

 Libertad y Orden		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012318750					
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
HQX980	MITSUBISHI	L 200 2.5L	2015		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
2.477	PLATA COOL	PARTICULAR			
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ		
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5		
NUMERO DE MOTOR	RL	VIN			
4D56UCET7305	N	MMBJNKB40FD000188			
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG		
*****	N	MMBJNKB40FD000188	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN		
RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID			C.C. 7692245		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	134		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.		PUERTAS
882014000090224	I	11/07/2014		4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD				

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO		
29/07/2014	16/08/2016	*****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO				
STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE				
				
LT02004137760				



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10029905008

PLACA

NSI18G

MARCA

YAMAHA

LÍNEA

XTZ150-2 (XTZ150)

MODELO

2024

CILINDRADA CC

149

COLOR

NEGRO

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO

MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA

SIN CARROCERIA

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ

2

NÚMERO DE MOTOR

G3L1E105381

REG

N

VIN

9FKDG3619R2105381

NÚMERO DE SERIE

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9FKDG3619R2105381

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

GALLEGO CALDERON DIEGO FERNANDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1006524418

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE FECHA IMPORT.

PUERTAS

902023000136079

I 24/08/2023

0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.


FECHA VENCIMIENTO

31/08/2023

31/08/2023

ORGANISMO DE TRÁNSITO


DIR TTOYTTE DPTAL CAQUETA/BELEN DE LOS
ANDAQUIES



LT07002522416

ANEXO 8.15.

**PERSONAL, CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA**



FECHA	12/09/2024
	(Día / Mes / Año)

PERIODO MES: 01/08/2024 AL 31/08/2024

INTERVENITOR:	ELKIN DAVIN RAMOS MOSQUERA
PROYECTO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPDALEGRE
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFACA


[illegible]

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (finchado los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato la Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal contratado esté debidamente aprobado y se cumpla con la deducción contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la utilización y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
9. El Interventor debe ser responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Rector Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND



Florencia, 31 de agosto de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ing. José Ricardo Burbano Barcenás

Director Territorial Caquetá (E)

atencionciudadano@invias.gov.co

Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:

Que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, con corte a 31/agosto/2024.

Así mismo certifico que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha realizado el pago de manera oportuna en los últimos 8 meses.

Atentamente,

VIVIANA ARBOLEDA DURANGO

Contador Público Titulado

CC. 1.117.513.231

TP 247382 – T

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CC # 7.692.245 expedida Neiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.513.231
ARBOLEDA DURANGO
APELLIDOS
VIVIANA
NOMBRES

[Firma]

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1990
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
Q+ G.S RH
F SEXO

10-JUN-2008 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4400100-00138191-F-1117513231-20081217 0008203784A.1 25-467132

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

247382-T

VIVIANA
ARBOLEDA DURANGO
C.C. 1117513231
RES. INSCRIPCION 796
DEL 14/09/2018

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254892 274071

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

ANEXO 8.16.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
							FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023							INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA					
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024							PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 4318 DE 2023 CONVENIO SOLIDARIO # 4045 DE 2023 CONVENIO SOLIDARIO # 4346 DE 2023							CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE - MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior		
2023	1409123	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	NACION		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 106.174.537,00	\$ 58.404.521,70		
TOTAL									\$ 106.174.537,00	\$ 58.404.521,70		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 106.174.537,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jun-24	\$ 15.675.555,00	\$ 2.978.355,45	\$ 18.653.910,45	\$ -	\$ 18.653.910,45	\$ -		\$ 87.520.626,55	\$ 87.520.626,55		
2	jul-24	\$ 24.467.315,00	\$ 4.648.789,85	\$ 29.116.104,85	\$ -	\$ 29.116.104,85	\$ -		\$ 58.404.521,70	\$ 58.404.521,70		
3	ago-24	\$ 24.398.221,00	\$ 4.635.661,99	\$ 29.033.882,99	\$ -	\$ 29.033.882,99	\$ -		\$ 29.370.638,71	\$ 29.370.638,71		
TOTALES		\$ 64.541.091,00	\$ 12.262.807,29	\$ 76.803.898,29	\$ -	\$ 76.803.898,29	\$ -		\$ 29.370.638,71	\$ 29.370.638,71		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)		\$ 89.222.300,00				\$ 89.222.300,00						
IVA = 19% * (C) = (D)				\$ 16.952.237,00		\$ 16.952.237,00						
VALOR TOTAL		\$ 89.222.300,00		\$ 16.952.237,00		\$ 106.174.537,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div>Firma Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:19202 61820 CAI 19202 61820 CAU</div><div>Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

ANEXO 8.17.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		2/09/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4879 DE 2023	INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
--------------------------------	--------------	--------------	----------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
----------------------	--

FECHA DE INICIO:	26-dic-23
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/DIC/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30-sep-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 106.174.537,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 106.174.537,00 (Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 10.617.453,70</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 21.234.907,40</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 10.617.453,70</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40	Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">7/07/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">7/01/2027</td></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">7/07/2024</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			7/12/2023			7/07/2024			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	7/12/2023			7/01/2027			7/12/2023			7/07/2024		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40																																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
7/12/2023			7/07/2024																																																	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
7/12/2023			7/01/2027																																																	
7/12/2023			7/07/2024																																																	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CT-100003506
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	11-dic-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 10.617.453,70</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 21.234.907,40</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 10.617.453,70</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40	Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">26/07/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">26/01/2027</td></tr><tr><td colspan="3">7/12/2023</td><td colspan="3">26/07/2024</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			7/12/2023			26/07/2024			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	7/12/2023			26/01/2027			7/12/2023			26/07/2024		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40																																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
7/12/2023			26/07/2024																																																	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
7/12/2023			26/01/2027																																																	
7/12/2023			26/07/2024																																																	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CT-100003506
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
7/12/2023			3/11/2024		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7/12/2023			3/05/2027		
7/12/2023			3/11/2024		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
7/12/2023			3/01/2025		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7/12/2023			3/07/2027		
7/12/2023			3/01/2025		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506
Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
7/12/2023			3/03/2025		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7/12/2023			3/09/2027		
7/12/2023			3/03/2025		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506
Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		2/09/2024
		(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 10.617.453,70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 21.234.907,40
Calidad del servicio	30%	\$ 10.617.453,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
7/12/2023			3/06/2025		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7/12/2023			3/12/2027		
7/12/2023			3/06/2025		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU


Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

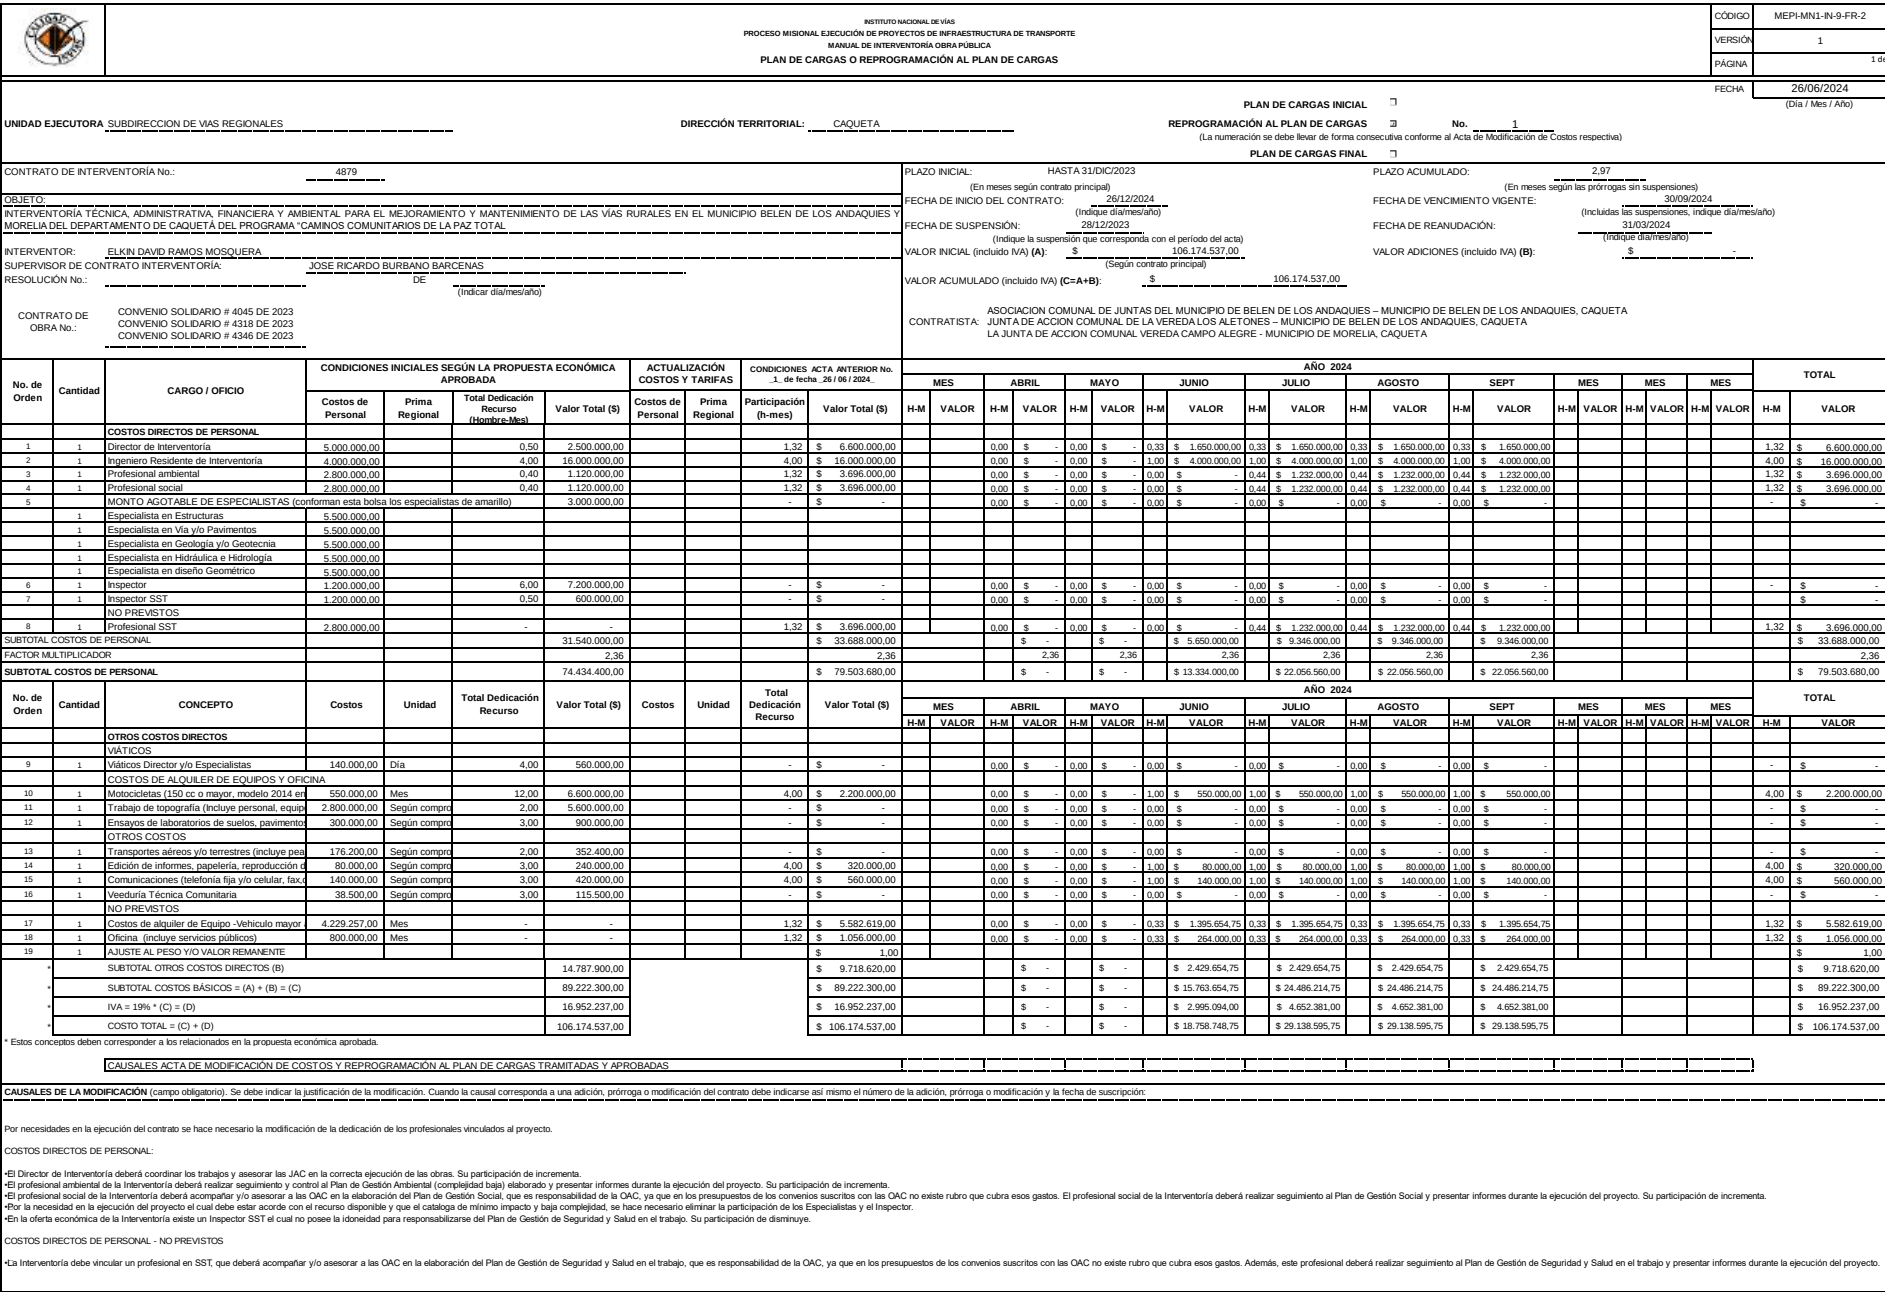

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

PLAN DE CARGAS INICIAL

FECHA26/06/2024
(Día / Mes / Año)

OTROS COSTOS DIRECTOS:

*Por la necesidad en la ejecución del proyecto el cual debe estar acorde con el recurso disponible y que se cataloga de mínimo impacto y baja complejidad, se hace necesario eliminar: 1) Viáticos de Especialistas, 2) Topografía y Ensayos de laboratorio, ya que estos costos están en el presupuesto de obra, 3) Transportes aéreos de Especialistas y 4) Veeduría técnica comunitaria.

OTROS COSTOS DIRECTOS – NO PREVISTOS

*El trabajo coordinado del Director y Residente con los profesionales Ambientales, Sociales, de SST, obligan a tener: 1) una oficina para el desempeño de sus obligaciones, 2) un vehículo para los desplazamientos a las obras. Estos serán de dedicación parcial.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Representante Legal o su Apoderado Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
