

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No.	4784-2023 4693-2023 4393-2023 4671-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Contrato de Interventoría No.	5006-2023	Interventoría:	CONSORCIO INTERVALES CAUCA

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No.	2	MES O PERIODO:	ENERO
---------------------	---	----------------	-------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		10
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		19
3.1	Información general del contrato		19
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Items no previstos		23
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		23
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		24
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	24
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	24
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	24
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	24
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	24
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	25
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	25
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		25
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	25
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		26
5.1	Información general del contrato		26
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	27
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	28
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		29
8	Anexos		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		33
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																																			
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION																																																			
			PÁGINA																																																			
			FECHA	5/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	PERIODO MES: ENERO																																																			
CONVENIO No.: 4784-2023		PLAZO INICIAL: 0.27 MESES	VALOR INICIAL : \$ 201,655,369.00																																																			
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 23/12/2023	VALOR ADICIONALES: \$																																																			
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00																																																			
		FECHA DE REANUDACIÓN:	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																			
		PRORROGA No. 1: Hasta 30/04/2024	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024																																																				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		PLAZO ACUMULADO: 1.47 MESES																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																		
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>105</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	105	Mejoramiento			Estructuras Alcantarillas	und	2	Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																				
Pavimentación Construcción	ml	105																																																				
Mejoramiento																																																						
Estructuras Alcantarillas	und	2																																																				
Muro de Contención																																																						
Mantenimiento Alcantarillas																																																						
Otros (Especificar cuales)																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																			
Pavimentación Construcción		0																																																				
Mejoramiento		0																																																				
Estructuras Alcantarillas		0																																																				
Muro de Contención		0																																																				
Mantenimiento Alcantarillas		0																																																				
Otros (Especificar cuales)		0																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																				
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,766,151.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,985.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,655,369.00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	\$ 152,766,151.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																										
	VALOR																																																					
OBRAS	\$ 152,766,151.00																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00																																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00																																																					
	VALOR	ACUMULADO																																																				
OBRAS	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																				
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																						
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																				
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																				
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																						
N/A		N/A																																																				
N/A		N/A																																																				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																						
<div></div> <div>Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																		
				VERSION																																																		
				PÁGINA																																																		
					FECHA	5/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: ENERO																																																		
CONVENIO No.: 4693-2023		PLAZO INICIAL: 0.3 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201,214,789.00																																																		
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 22/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$																																																		
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201,214,789.00																																																		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																		
		PLAZO ACUMULADO: 1.5 MESES																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																		
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>123</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>2</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento	123	Estructuras	Alcantarillas	und		Muro de Contención	2	Mantenimiento	Alcantarillas		Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0			Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0			Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																				
Pavimentación	Construcción	ml																																																				
	Mejoramiento	123																																																				
Estructuras	Alcantarillas	und																																																				
	Muro de Contención	2																																																				
Mantenimiento	Alcantarillas																																																					
Otros (Especificar cuales)																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																			
Pavimentación	Construcción	0																																																				
	Mejoramiento	0																																																				
Estructuras	Alcantarillas	0																																																				
	Muro de Contención	0																																																				
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																				
Otros (Especificar cuales)		0																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																			
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,338,404.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,540,152.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,214,789.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152,338,404.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,540,152.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,214,789.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																								
	VALOR																																																					
OBRAS	\$ 152,338,404.00																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,540,152.00																																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,214,789.00																																																					
	VALOR	ACUMULADO																																																				
OBRAS	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																				
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																						
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																			
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																						
N/A			N/A																																																			
N/A			N/A																																																			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																						
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																	
				VERSION																																																	
				PÁGINA																																																	
					FECHA	5/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: ENERO																																																	
CONVENIO No.: 4393-2023		PLAZO INICIAL: 0.3 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201,645,093.00																																																	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 22/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		FECHA DE SUSPENSIÓN: -		VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00																																																	
		FECHA DE REANUDACIÓN: -		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																	
		PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																	
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024																																																			
		PLAZO ACUMULADO: 1.5 MESES																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																	
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Relleno de alcantarillas</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas		Muro de Contención		Mantenimiento	Alcantarillas		Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und			1	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0		Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0		Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																			
Pavimentación	Construcción	ml																																																			
	Mejoramiento																																																				
Estructuras	Alcantarillas																																																				
	Muro de Contención																																																				
Mantenimiento	Alcantarillas																																																				
Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und																																																			
		1																																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																		
Pavimentación	Construcción	0																																																			
	Mejoramiento	0																																																			
Estructuras	Alcantarillas	0																																																			
	Muro de Contención	0																																																			
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																			
Otros (Especificar cuales)		0																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																		
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,756,175.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,685.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,645,093.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152,756,175.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																							
	VALOR																																																				
OBRAS	\$ 152,756,175.00																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00																																																				
	VALOR	ACUMULADO																																																			
OBRAS	\$ -	\$ -																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																			
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																					
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																		
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
N/A			N/A																																																		
N/A			N/A																																																		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																					
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO																																																		
			VERSION																																																		
			PÁGINA																																																		
			FECHA	5/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA																																																	
PERIODO MES:			ENERO																																																		
CONVENIO No.: 4671-2023																																																					
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA																																																					
PLAZO INICIAL: 16/01/2024																																																					
FECHA DE INICIO: 16/01/2024																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																					
FECHA DE REANUDACIÓN:																																																					
PRORROGA No. 1																																																					
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023																																																					
PLAZO ACUMULADO: 0,67 MESES																																																					
VALOR INICIAL : \$ 201.297.005,00																																																					
VALOR ADICIONALES: \$																																																					
VALOR ACUMULADO: \$ 201.297.005,00																																																					
DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																					
DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023																																																					
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA																																																					
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																		
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und 6</td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas	und 6		Muro de Contención		Mantenimiento	Alcantarillas		Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0			Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0			Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																			
Pavimentación	Construcción																																																				
	Mejoramiento																																																				
Estructuras	Alcantarillas	und 6																																																			
	Muro de Contención																																																				
Mantenimiento	Alcantarillas																																																				
Otros (Especificar cuales)																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																		
Pavimentación	Construcción	0																																																			
	Mejoramiento	0																																																			
Estructuras	Alcantarillas	0																																																			
	Muro de Contención	0																																																			
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																			
Otros (Especificar cuales)		0																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																		
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152.418.225,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.542.547,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.336.233,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201.297.005,00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152.418.225,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																								
	VALOR																																																				
OBRAS	\$ 152.418.225,00																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00																																																				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00																																																				
	VALOR	ACUMULADO																																																			
OBRAS	\$ -	\$ -																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																			
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																					
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
N/A			N/A																																																		
N/A			N/A																																																		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																					
<div></div> <div>Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div>																																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																					

 <p>CONSORCIO INTERVIALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

PERIODO:

1 AL 31 DE ENERO DE 2024

**CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
INTERVENTORÍA DE CONVENIO SOLIDARIO**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Claudia Lorena Valencia Calvo.	Directora de Interventoría	

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS.....	7
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	11
2.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	11
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS.....	14
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS	14
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	16
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....	18
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	18
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	19
4.1	INFORME SEMANAL	19
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO.....	19
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO	19
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO.....	19
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	19
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	19
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	20
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	20
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	20
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	21
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	21
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	21
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	21
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO	22
	DE INTERVENTORÍA	22
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ...	22
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
8	ANEXOS	25

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.....	8
Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.	8
Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.	9
Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.	10
Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.	10
Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.	11

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	 <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>
---	--	---	--

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio de Patia, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** por lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Patía.**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir, el número del convenio y valor que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CUATRO (4) convenios Solidarios que se suscribieron entre el INVIAS y las juntas de acción comunal del municipio de Patía

CONTRATISTA	CONVENIO No.	VALOR CONVENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS	4784-2023	\$ 201,655,369.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO	4693-2023	\$ 201,214,789.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL	4393-2023	\$ 201,645,093.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	4671-2023	\$ 201,297,005.00

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1 MUNICIPIO DE PATÍA

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de El Patía, ubicado aproximadamente a 95,6 kilómetros al sur de la capital del departamento del Cauca, Popayán. El municipio se encuentra a una altitud de alrededor de 910 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 28 °C.

Las coordenadas geográficas del municipio de Patía son:

Latitud: 2.114167

Longitud: -76.983056

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
<p align="right">Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>			



Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.

Específicamente, el proyecto se ejecutará en cuatro veredas: Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina.

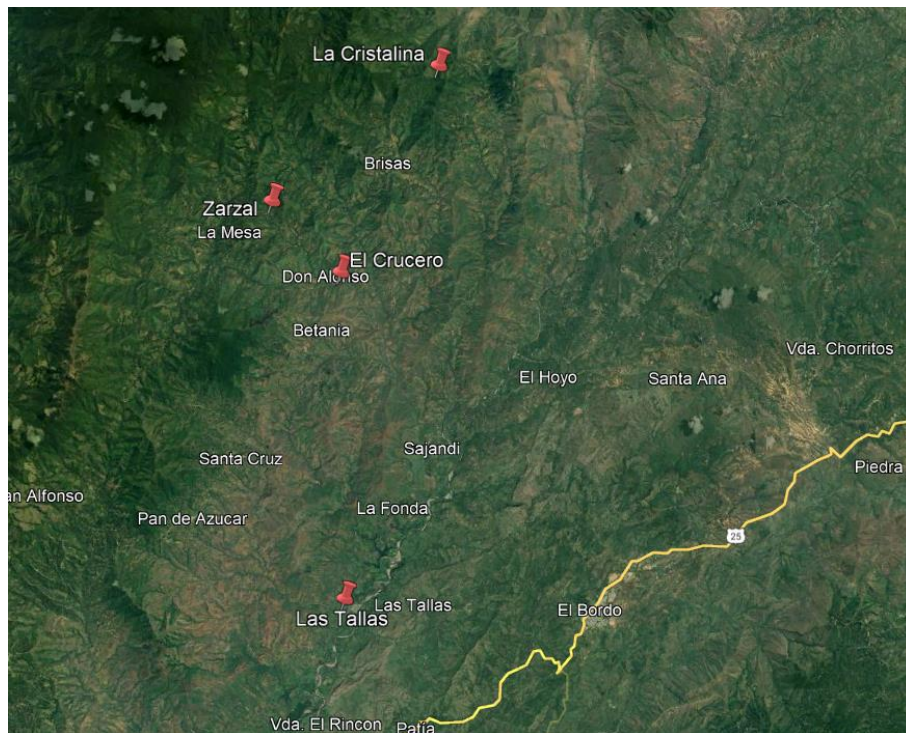


Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución de cuatro (4) convenios solidarios que se suscribieron en el municipio de *Patía*, departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”

CONVENIO No.	VEREDA	LONG(m)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	ALCANCE
4784-2023	LAS TALLAS	105	2.1410, -77.0716	2.1116, -77.0807	Construcción de 105 metros lineales de placa huella, y de 2 alcantarillas.
4693-2023	EL CRUCERO	123	2.2578,-77.1057	2.2623,-77.1041	Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla
4393-2023	EL ZARZAL	137	2.3082, -77.0300	2.2810, -77.0374	Construcción de 137m de placa huella, relleno para 1 alcantarilla.
4671-2023	LA CRISTALINA	0	2.3121, -77.0429	2.2896,-77.0630	Construcción de 6 alcantarillas

Los tramos postulados en cada vereda son:



Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
	Fecha de realización: Febrero 10 de 2024		

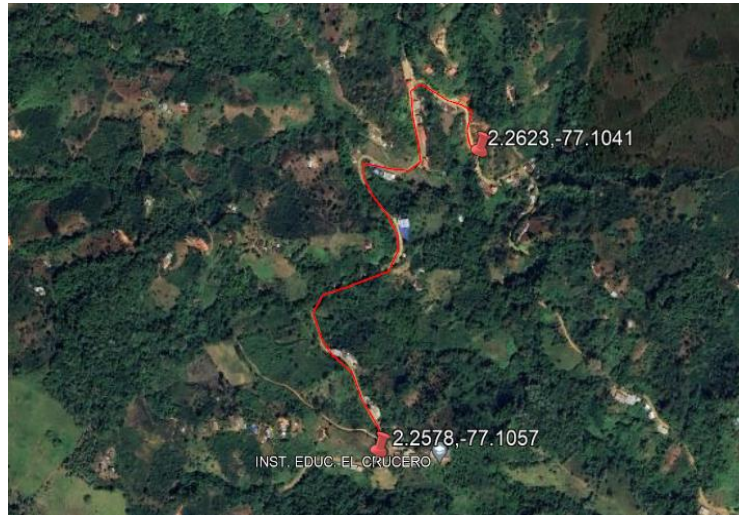


Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.

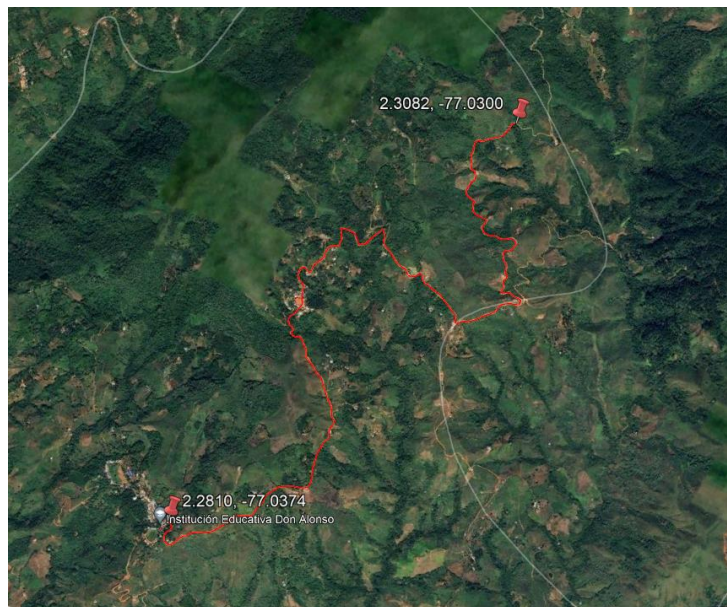


Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

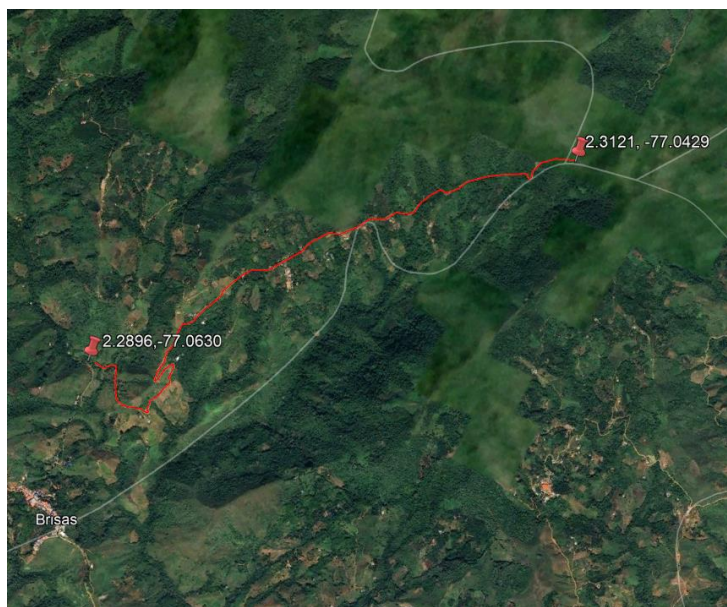


Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En términos generales, las vías identificadas en el proyecto muestran un estado regular. Aunque la superficie de rodadura está revestida con afirmado, se observan baches a lo largo de las mismas. Además, se nota una falta de conformación adecuada en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje. Algunas obras de drenaje existentes se encuentran en estado regular, mientras que otras están taponadas o colmatadas.

Con la firma de convenios con las juntas de acción comunal de las veredas Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina en el departamento del Cauca, el proyecto busca mejorar los corredores viales productivos, garantizando su transitabilidad y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

A continuación, se relacionan las obras que conformaran el proyecto:

2.3.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	

2.3.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 LAS TALLAS 4784

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4784-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,655,369.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
Nit	900663876-4
R.L	CRISTIAN DAVID MOSQUERA
CC. R.L	1.059.903.667
Suscripción convenio	1/12/2023
Fecha de Orden de inicio	21 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

3.1.2 EL CRUCERO 4693

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4693-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,214,789.00

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
Nit	900251089-6
R.L	DUVEL IVAN RUIZ
CC. R.L	76.175.146
Suscripción convenio	28/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

3.1.3 ZARZAL 4393

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4393-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,645,093.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
Nit	900661350-3
R.L	ZULDANY MEDINA CAMPO
CC. R.L	1.059.908.061
Suscripción convenio	21/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

3.1.4 LA CRISTALINA 4671

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4671-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,297,005.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Nit	901127925-2
R.L	HUBENER TROCHEZ QUIGUA
CC. R.L	76.236.290
Suscripción convenio	27/11/2023
Fecha de Orden de inicio	16/01/2024
Plazo inicial del convenio	Hasta el 31/12/2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS**. Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. En particular, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1 LAS TALLAS 4784

- Diligenciamiento y firma del formato MEPI, de la prórroga N 1 del convenio 4784
- Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°1 del convenio 4784
- Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

- El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVÍAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.
- Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

3.2.2 EL CRUCERO 4693

- Diligenciamiento y firma del formato MEPI, de la prórroga N 1 del convenio 4693
- Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°1 del convenio 4693
- Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVÍAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.
- Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

3.2.3 ZARZAL 4393

- Diligenciamiento y firma del formato MEPI, de la prórroga N 1 del convenio 4393
- Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°1 del convenio 4393
- Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVÍAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.
- Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	
--	---	--	---	--

3.2.4 LA CRISTALINA 4671

- A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.
- El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVÍAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.
- Hasta la fecha del presente informe, se encuentra en trámite de prorroga el convenio.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas. Esto se debió a que las juntas de acción comunal, acreedoras de los convenios solidarios asociados al presente contrato de interventoría, se encontraban realizando las gestiones necesarias para los estudios previos y la elaboración de los documentos administrativos requeridos.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p align="center">Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de enero de 2024, referentes a los convenios solidarios

Formato informe semanal

Se remite anexo 1. Los informes semanales del presente periodo.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de maquinaria y equipo.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de personal, control de aportes legales y seguridad social.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 inf fin y presupuestal obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

Formato seguimiento garantías convenio.

Se remite anexo 2, el formato correspondiente.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	5006-2023
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
Valor del contrato	\$ 105,790,989.00
Contratista	CONSORCIO INTERVALES CAUCA
Nit	901.780.463-0
R.L	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Suscripción convenio	16/12/2023
Fecha orden de inicio	21/12/2023
Prorroga No. 1	Hasta 30/04/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Fecha de terminación vigente	30/04/2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo no se realizan informes de especialistas.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se hizo uso de vehículos para el desplazamiento de las actividades. Puesto que los convenios solidarios, se encuentran recopilando la documentación necesaria requerida para inicio de obra. Una vez se requiera y se implemente equipos y vehículos se diligenciará formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para este periodo no se presenta el control de aportes legales y seguridad social ya que la factura se presenta en ceros.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio, la oferta económica adjudicada es:

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	(2)	(3)	(4)	((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	\$ 5,100,000.00		1.00	\$ 5,100,000.00
Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 3,100,000.00		3.00	\$ 9,300,000.00
Profesional Ambiental	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
Profesional Social	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 4,678,598.00
Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Estructuras	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5,000,000.00			
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	\$ 1,300,000.00		6.00	\$ 7,800,000.00
Inspector SST	\$ 1,300,000.00		3.00	\$ 3,900,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				\$ 33,478,598.00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2.36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				\$ 79,009,491.00

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR
		(\$)		PARCIAL (\$)
		(7)		(7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	\$ 80,000.00	10.00	\$ 800,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	\$ 320,000.00	12.00	\$ 3,840,000.00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y tmasporte)	Según comprobante por mes	\$ 1,800,000.00	2.00	\$ 3,600,000.00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	\$ 250,000.00	3.00	\$ 750,000.00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	3.00	\$ 300,000.00
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	2.00	\$ 200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, vídeos, etc.	Según comprobante por mes	\$ 50,000.00	3.00	\$ 150,000.00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	\$ 45,000.00	3.00	\$ 135,000.00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	\$ 38,500.00	3.00	\$ 115,500.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				\$ 9,890,500.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 88,899,991.00
IVA = 19% * (C) = (E)				\$ 16,890,998.00
COSTO TOTAL = (C) + (E)				\$ 105,790,989.00

Para este periodo no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT puesto a que el valor de la factura es de cero.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Se remite anexo 3, el formato correspondiente.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Febrero 10 de 2024	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista ha dado inicio al proceso de cotización de proveedores para la adquisición de material. El objetivo es evaluar opciones y seleccionar la más conveniente. Se recomienda obtener al menos 3 cotizaciones para garantizar una comparación adecuada y elegir la opción que mejor se ajuste al alcance del proyecto. Además, se ha enfatizado que el proveedor cuente con facturación electrónica.
- El 19 de enero de 2023, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del INVIAS para abordar varios temas relacionados con los convenios. Estos temas incluyeron el estado actual de los convenios, las prórrogas y contratos suspendidos, así como los lineamientos para el reinicio.
- Por otra parte, los acreedores de los convenios han iniciado el envío de hojas de vida de los profesionales requeridos. La contratación de profesionales adecuados garantizará la correcta ejecución de las actividades de obra.
- Conforme a los actos administrativos celebrados a la fecha, las Juntas de Acción Comunal no han realizado la actualización de las pólizas.
- Es importante mencionar que, hasta la fecha del presente informe, no se han iniciado las actividades en el sitio de la obra. Actualmente, el equipo se encuentra recopilando la parte documental.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2024</p>	

8 ANEXOS

Anexo 0. Formato informe general estado del proyecto

Anexo 1, Informe semanal

Anexo 2. Seguimiento garantías convenio

Anexo 3. Seguimiento garantías interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

8/01/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

2

del

29/12/2023

al

4/01/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN DAVID MOSQUERA

CONVENIO No. 4784-2023

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONTRATO No. 5006-2023

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,655,369.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Las Tallas

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	105
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	105.00			105.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorvibradora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado: Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A	
DISPONIBLE		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A	
PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A	
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A	
UBICACIÓN:		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A	
PERMISO MINERO: SI NO		VERTIMIENTOS: SI NO N/A	
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		EMISIONES: SI NO N/A	
OBSERVACIONES:		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica, dado que a la fecha del informe, no ha iniciado las actividades constructivas			
OBSERVACIONES:			
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA		INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		OBSERVACIONES:	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS			
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784			
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784			
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA			
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
		FIRMA
		NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
		Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

8/01/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

2

del

29/12/2023

al

4/01/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

DUVEL IVAN RUIZ

4693-2023

22/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

\$ 201.214.789.00

\$ -

\$ 201.214.789.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

5006-2023

21/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ 105.790.989.00

\$ -

\$ 105.790.989.00

\$ -

\$ -

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda El Crucero

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	123
Alcantarillas	UND	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	123.00			123.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica, dado que a la fecha del informe, no ha iniciado las actividades constructivas

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA		8/01/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	---

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:
Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 2 del 29/12/2023 al 4/01/2024 Último Informe Semanal No.:
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVALS CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULDANY MEDINA CAMPO			REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONVENIO No.	4393-2023	VALOR INICIAL:	\$ 201,645,093.00	CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	\$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 201,645,093.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 105,790,989.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)			PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	\$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,645,093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,645,093.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVIAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Zarzal

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	-	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	<div>SI NO</div> <div>X</div>	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A	N/A
PERIODO FACTURADO:	N/A	
VALOR FACTURA:	\$ N/A	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%
Meta Física Ejecutada %	0.00%		

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*Placa Huella	ML	137
*Relleno para alcantarillas	UND	1
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	137.00			137.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	1.00			1.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO N/A X

VERTIMIENTOS:

SI NO N/A X

EMISIONES:

SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

No aplica, dado que a la fecha del informe, no ha iniciado las actividades constructivas

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.:

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES			IV. GESTION AMBIENTAL		
		DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A
			APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A
			CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A
			EMISIONES:	SI NO	N/A
			OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		
ESTADO:	No aplica, dado que a la fecha del siguiente informe, no ha iniciado las actividades constructivas				
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS					
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784					
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784					
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA					
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica, dado que a la fecha del siguiente informe, no ha iniciado las actividades constructivas

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2

FECHA				15/01/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
-------	--	--	--	--	--

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAUCA SEMANA No.:3 del 5/01/2024 al 11/01/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:N/A

OBJETO CONVENIO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA			
REPRESENTANTE LEGAL: ZULDANY MEDINA CAMPO				REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA			
CONVENIO No. 4393-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,645,093.00		CONTRATO No. 5006-2023		VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -	
PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)				PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		VALOR AMORTIZADO: \$ -	
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,645,093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,645,093.00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	
<small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	
Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVIAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda Zarzal			

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A	
PERIODO FACTURADO:	N/A	
VALOR FACTURA:	\$ N/A -	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones:N/A		

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	137
* Relleno para alcantarillas	UND	1
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	137.00			137.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	1.00			1.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla. Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO N/A X

VERTIENTOS:

SI NO N/A X

EMISIONES:

SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

No aplica, dado que a la fecha del siguiente informe, no ha iniciado las actividades constructivas

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.:

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

22/01/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

4

del

12/01/2024

al

18/01/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

REPRESENTANTE LEGAL:

CRISTIAN DAVID MOSQUERA

CONVENIO No.

4784-2023

VALOR INICIAL:

\$

201,655,369.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

201,655,369.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALS CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$

105,790,989.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

105,790,989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201,655,369.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Las Tallas

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	105
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	105.00			0.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			0.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorvibradora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado:Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A	
DISPONIBLE		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A	
PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A	
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A	
UBICACIÓN:		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A	
PERMISO MINERO: SI NO		VERTIMIENTOS: SI NO N/A	
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		EMISIONES: SI NO N/A	
OBSERVACIONES:		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica.			
OBSERVACIONES:			
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA		INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		OBSERVACIONES:	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS			
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784			
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784			
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.			
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA			
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
		FIRMA
		NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
		Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

27/01/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

4

del

12/01/2024

al

18/01/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

REPRESENTANTE LEGAL:

DUVEL IVAN RUIZ

CONVENIO No.

4693-2023

FECHA DE INICIO:

22/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

\$

201.214.789.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

201.214.789.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:

\$

105.790.989.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

105.790.989.00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201.214.789.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda El Crucero

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	123
Alcantarillas	UND	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:





Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	123.00			0.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			0.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

FUENTES DE MATERIALES			IV. GESTION AMBIENTAL				
UBICACIÓN:		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
.....		PERMISO MINERO: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X			
.....		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X			
.....		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X			
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X			
.....				VERTIMIENTOS: SI NO N/A X			
.....				EMISIONES: SI NO N/A X			
.....				OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			
.....							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES:		
ESTADO: No aplica.							
.....							
V. GESTIÓN SOCIAL							
		OBRA		INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		0					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		0					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		0					
.....							
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS							
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693							
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693							
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.							
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA							
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.							
.....							
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
.....							
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS							
.....							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio							
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
N/A		N/A		N/A		N/A	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.							
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA			
.....							
.....				FIRMA:			
.....				NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO			
.....				Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	22/01/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 4 del 12/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA			
REPRESENTANTE LEGAL: ZULDANY MEDINA CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA			
CONVENIO No. 4393-2023	VALOR INICIAL: \$ 201.645,093.00	CONTRATO No. 5006-2023	VALOR INICIAL: \$ 105.790,989.00		
FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201.645,093.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 105.790,989.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -		
PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO: \$ -		
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.645,093			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105.790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105.790,989			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIOINTERVENTORÍA					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201.645,093.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda Zarzal					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda Zarzal					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Observaciones:Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					

IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
UBICACIÓN: _____		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO		SI	NO	_____	N/A	_____ X	
_____		PERMISO MINERO: SI		_____ NO	LICENCIA AMBIENTAL:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI		_____ NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI		_____ NO	CONCESIÓN DE AGUAS:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI		_____ NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
_____					VERTIMIENTOS:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
OBSERVACIONES:					EMISIONES:		SI	NO	_____	N/A	_____ X
					OTROS (Especificar cual)		SI	NO	_____	N/A	_____ X
					OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
ESTADO: No aplica.											
OBSERVACIONES:											
V. GESTIÓN SOCIAL											
		OBRA	INTER					OBSERVACIONES:			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		0		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		0									
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS											
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393											
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393											
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio.											
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA											
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA						
					FIRMA						
					NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO						
					Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.											
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																				
			VERSION																																																																				
			PÁGINA	1 DE 2																																																																			
			FECHA	23/01/2024 (Día / Mes / Año)																																																																			
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 1 del 16/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal N°: (Numeración consecutiva)																																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																							
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																							
Construcción de 6 alcantarillas																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																							
En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patia -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA																																																																					
REPRESENTANTE LEGAL: HUBENER TROCHEZ QUIGUA		REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA																																																																					
CONVENIO No. 4671-2023	VALOR INICIAL: \$ 201.297.005.00	CONTRATO No. 5006-2023	VALOR INICIAL: \$ 105.790.989.00																																																																				
FECHA DE INICIO: 16/01/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201.297.005.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 105.790.989.00																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																				
		PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																				
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.297.005																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.297.005																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105.790.989																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105.790.989																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201.297.005.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: Se suscribió orden de inicio, sin embargo, se encuentra en tramite la prorroga.</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td><div>SI NO</div><div>X</div></td><td></td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>						VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.297.005.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: Se suscribió orden de inicio, sin embargo, se encuentra en tramite la prorroga.			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	<div>SI NO</div> <div>X</div>		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A	PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.297.005.00																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																					
Observaciones: Se suscribió orden de inicio, sin embargo, se encuentra en tramite la prorroga.																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	<div>SI NO</div> <div>X</div>																																																																						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A																																																																					
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A																																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																							
Observaciones: N/A																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>6.00</td><td></td><td></td><td>6.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Alcantarillas	UND	6													Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	6.00			6.00	100.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%																														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																					
Alcantarillas	UND	6																																																																					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																		
Prog	6.00			6.00	100.0%																																																																		
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																		
<div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado Construcción de 6 alcantarillas</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2 : </div></div></div>																																																																							
<div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																												
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																					
Saltarín																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																							
Vibrocompactador																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																							
Vibrador de concreto																																																																							
Motoniveladora																																																																							
Total																																																																							

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: N/A					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X				
PERMISO MINERO: SI NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X				
VERTIENTOS: SI NO N/A X					EMISIONES: SI NO N/A X				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO: No aplica									
OBSERVACIONES:									
V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			0						
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
OBSERVACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS									
N/A									
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA									
*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.									
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio									
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO									
N/A			N/A			N/A			
N/A			N/A			N/A			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
					FIRMA NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU				
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																								
			VERSIÓN																																																								
			PÁGINA	1 DE 2																																																							
			FECHA	29/01/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 19/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal No. (Numeración consecutiva)																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																											
Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																											
En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALS CAUCA																																																									
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN DAVID MOSQUERA		REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA																																																									
CONVENIO No. 4784-2023	VALOR INICIAL: \$ 201,655,369.00	CONTRATO No. 5006-2023	VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00																																																								
FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																								
PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																								
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369																																																									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																											
<table><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201,655,369.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Las Tallas</td></tr></tbody></table>						CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,655,369.00			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Las Tallas					
CONVENIO																																																											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,655,369.00																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de accion comunal de la vereda Las Tallas																																																											
<table><thead><tr><th colspan="4">INTERVENTORÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ N/A</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></tbody></table>						INTERVENTORÍA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:						SI	NO				X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				PERIODO FACTURADO: N/A				VALOR FACTURA: \$ N/A				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																											
		SI	NO																																																								
			X																																																								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																											
PERIODO FACTURADO: N/A																																																											
VALOR FACTURA: \$ N/A																																																											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																											
Observaciones: N/A																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																											
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																											
<table><thead><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td>105</td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>* </td><td></td><td></td></tr><tr><td>* </td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	* Placa Huella	ML	105	* Alcantarillas	UND	2	*			*																																						
Meta Física (Programa de Obra)																																																											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																									
* Placa Huella	ML	105																																																									
* Alcantarillas	UND	2																																																									
*																																																											
*																																																											
<table><thead><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>105.00</td><td></td><td></td><td>105.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>2.00</td><td></td><td></td><td>2.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	105.00			105.00	100.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	2.00			2.00	100.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%																		
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																											
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																						
Prog	105.00			105.00	100.0%																																																						
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																						
Prog	2.00			2.00	100.0%																																																						
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																						
<table><thead><tr><th colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																													
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																											
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																									
Salitrín																																																											
Mezcladora de concreto																																																											
Vibrocompactador																																																											
Retroexcavadora sobre llantas																																																											
Vibrador de concreto																																																											
Motoniveladora																																																											
Total																																																											
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.																																																											
Ejecutado:																																																											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																											
Ejecutado:																																																											

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

OBRA

INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEP1, de la prorroga N°1 del convenio 4784

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

29/01/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

5

del

19/01/2024

al

25/01/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

DUVEL IVAN RUIZ

4693-2023

22/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

\$ 201.214,789.00

\$ -

\$ 201.214,789.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

5006-2023

21/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ 105,790,989.00

\$ -

\$ 105,790,989.00

\$ -

\$ -

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda El Crucero

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella

ML

123

Alcantarillas

UND

2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

123.00

123.00

100.0%

Ejec

0.00

0.00

0.0%

Prog

2.00

2.00

100.0%

Ejec

0.00

0.00

0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Salitrin

Mezcladora de concreto

Vibrocompactador

Retroexcavadora sobre llantas

vibrador de concreto

Motoniveladora

Total

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.




TRAMO Y/O SECTOR 2:

Ejecutado:

Programado:

Ejecutado:

<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>OBSERVACIONES:</div>		<div>IV. GESTION AMBIENTAL</div> <div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X</div> <div>VERTIMIENTOS: SI NO N/A X</div> <div>EMISIONES: SI NO N/A X</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X</div> <div>OBSERVACIONES:</div>
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica.</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>
<div>V. GESTIÓN SOCIAL</div> <div><div><div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0</div><div>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0</div><div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0</div><div>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0</div><div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0</div></div><div><div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div><div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div><div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</div><div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div></div><div>OBSERVACIONES:</div></div>		
<div>VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</div> <div>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</div> <div>*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693</div> <div>*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693</div> <div>*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.</div> <div>ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA</div> <div>*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.</div>		
<div>VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</div>		
<div>VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS</div>		
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>		
<div>XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</div> <div><div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>		
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div><div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div><div>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div><div>Matrícula Profesional No.: 19202-278496 CAU</div></div></div>		

IV. GESTION AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		ZONAS DE DEPOSITO		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
				VERTIMIENTOS:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
				EMISIONES:		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
				OTROS (Especificar cual)		SI _____ NO _____		N/A _____ X _____	
				OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO: No aplica.				OBSERVACIONES:					
V. GESTIÓN SOCIAL									
		OBRA	INTER					OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		0		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		0							
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS									
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393									
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393									
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.									
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA									
*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.									
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio									
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO									
									
N/A		N/A		N/A					
N/A		N/A		N/A					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA					
									
				FIRMA _____					
				NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO					
				Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAJ					
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial									

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matricula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																															
			VERSIÓN																																															
			PÁGINA	1 DE 2																																														
			FECHA	5/02/2024 (Día / Mes / Año)																																														
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																		
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 26/01/2024 al 1/02/2024 Último Informe Semanal No. (Numeración consecutiva)																																														
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																		
Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.																																																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																		
En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																		
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLES CAUCA																																																
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN DAVID MOSQUERA		REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA																																																
CONVENIO No. 4784-2023	VALOR INICIAL: \$ 201.655.369.00	CONTRATO No. 5006-2023	VALOR INICIAL: \$ 105.790.989.00																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -																																															
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201.655.369.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 105.790.989.00																																															
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -																																															
PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO: \$ -																																															
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																		
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																													
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.655.369																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.655.369																																																
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105.790.989																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105.790.989																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																		
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201.655.369.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr></table><div>Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda Las Tallas</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr></table><div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div>N/A</div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$ N/A</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: N/A</div></div></div>						VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.655.369.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.655.369.00																																																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																

IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784		
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topografico y estudio de suelos.		
*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.		
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA		
*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
		FIRMA: 
		NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
		Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

5/02/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

6

del

26/01/2024

al

1/02/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

REPRESENTANTE LEGAL:

DUVEL IVAN RUIZ

CONVENIO No.

4693-2023

FECHA DE INICIO:

22/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

\$

201.214.789.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

201.214.789.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:

\$

105.790.989.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

105.790.989.00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201.214.789.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones:Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentran pendiente los desembolsos del recurso por parte del INVÍAS y por ende limita a la junta la contratación de los estudios y diseños por los pocos recursos que dispone la junta de acción comunal de la vereda El Crucero

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	123
Alcantarillas	UND	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	123.00			123.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

X

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

X

EMISIONES:

SI

NO

N/A

X

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matricula Profesional No.:

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

UBICACIÓN: N/A

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBRA

INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

Hasta la fecha del presente informe, se encuentra en tramite de prorroga el convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA				5	2	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4784-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023
 PLAZO INICIAL: 31/12/2023
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 201,655,369.00
 VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento	20%	\$ 40,311,074.00	1	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,768.00	1	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,496,611.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	1	12	2023	31	12	2023
Otros	N.R							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-1000026253 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoria

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	5	2	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4693-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201,214,789.00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201,214,789.00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,242,958.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,060,739.50</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,364,437.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	28	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	28	11	2023	31	12	2023																																																			
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																									
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																									
			FECHA	5	2	2024																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																												
CONVENIO No. 4493-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL																																																												
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,645,093.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,329,020.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,082,255.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,493,530.00</td><td>21</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000.00</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	24	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	24	11	2023	31	12	2023																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoria

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

	FECHA	5	2	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: NO TIENE ORDEN DE INICIO
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 201,297,005.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201,297,005.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40,259,402.00	27	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,064,850.00	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,389,103.00	21	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	24	11	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoria

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																												
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	5/02/2024 (Día / Mes / Año)																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00 VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 10,579,098.90</td><td>16</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">30/06/2024</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>30%</td><td>\$ 31,737,296.70</td><td>16</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 31,737,296.00</td><td>16</td><td>12</td><td>2023</td><td>16</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 10,579,098.90	16	12	2023	30/06/2024			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	31	12	2026	Calidad del servicio	30%	\$ 31,737,296.00	16	12	2023	16	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento	10%	\$ 10,579,098.90	16	12	2023	30/06/2024																																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	31	12	2026																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 31,737,296.00	16	12	2023	16	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		5/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
-------	--	---	--	--

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES							
---	--	--	--	--	--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 10,579,098.90	16	12	2023	1/11/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	1	5	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:No.:19202-278490 CAU


Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
