

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No.

4784-2023
4693-2023
4393-2023
4671-2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

Contrato de Interventoría No.

5006-2023

Interventoría: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

Objeto Contrato de Obra:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No.

4

MES O PERIODO: MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		10
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		19
3.1	Información general del contrato		19
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Items no previstos		24
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		24
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		25
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	25
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	25
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	25
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	25
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	26
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		27
5.1	Información general del contrato		27
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		27
5.3	Informes especialistas y profesionales		27
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		28
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	28
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	28
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	28
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	29
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	29
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		30
8	Anexos		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		30
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																																		
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION																																																		
			PÁGINA																																																		
			FECHA	5/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	PERIODO MES: MARZO/2024																																																		
CONVENIO No.: 4784-2023		PLAZO INICIAL: 0.27 MESES	VALOR INICIAL : \$ 201,655,369.00																																																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 23/12/2023	VALOR ADICIONALES: \$																																																		
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00																																																		
		FECHA DE REANUDACIÓN:	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																		
		PRORROGA No. 1: Hasta 30/04/2024	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		PLAZO ACUMULADO: 3.47 MESES																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																	
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>105</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	105	Mejoramiento			Estructuras Alcantarillas	und	2	Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																			
Pavimentación Construcción	ml	105																																																			
Mejoramiento																																																					
Estructuras Alcantarillas	und	2																																																			
Muro de Contención																																																					
Mantenimiento Alcantarillas																																																					
Otros (Especificar cuales)																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																		
Pavimentación Construcción		0																																																			
Mejoramiento		0																																																			
Estructuras Alcantarillas		0																																																			
Muro de Contención		0																																																			
Mantenimiento Alcantarillas		0																																																			
Otros (Especificar cuales)		0																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																			
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,766,151.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,985.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,655,369.00</td></tr></tbody></table>			VALOR	OBRAS	\$ 152,766,151.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																									
	VALOR																																																				
OBRAS	\$ 152,766,151.00																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00																																																				
	VALOR	ACUMULADO																																																			
OBRAS	\$ -	\$ -																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																			
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																					
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																			
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
		N/A																																																			
Reunión municipio de Patia		N/A																																																			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																					
<div></div> <div>Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO																																																								
			VERSION																																																								
			PÁGINA																																																								
				FECHA	5/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: MARZO/2024																																																							
CONVENIO No.: 4693-2023		PLAZO INICIAL: 0.3 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201.214.789,00																																																							
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 22/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201.214.789,00																																																							
		FECHA DE REANUDACIÓN:		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																							
		PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																							
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024																																																									
		PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>123</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento	123		Estructuras	Alcantarillas	und	2		Muro de Contención			Mantenimiento	Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)				<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0			Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0			Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción	ml																																																									
	Mejoramiento	123																																																									
Estructuras	Alcantarillas	und	2																																																								
	Muro de Contención																																																										
Mantenimiento	Alcantarillas																																																										
Otros (Especificar cuales)																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción	0																																																									
	Mejoramiento	0																																																									
Estructuras	Alcantarillas	0																																																									
	Muro de Contención	0																																																									
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																									
Otros (Especificar cuales)		0																																																									
AVANCE FINANCIERO			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152.338.404.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.540.152.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.336.233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201.214.789.00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152.338.404.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.540.152.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.214.789.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																													
	VALOR																																																										
OBRAS	\$ 152.338.404.00																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.540.152.00																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233.00																																																										
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.214.789.00																																																										
	VALOR	ACUMULADO																																																									
OBRAS	\$ -	\$ -																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																									
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																									
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																											
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																											
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
			N/A																																																								
Reunión municipio de Patia			N/A																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																					
				VERSION																																																					
				PÁGINA																																																					
					FECHA	5/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: MARZO/2024																																																					
CONVENIO No.: 4393-2023		PLAZO INICIAL: 0.3 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201,645,093.00																																																					
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 22/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		PRORROGA No. 1 Hasta 30/04/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																					
		PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																					
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Relleno de alcantarillas</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas			Muro de Contención		Mantenimiento	Alcantarillas		Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und			1	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0			Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0			Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																							
Pavimentación	Construcción	ml																																																							
	Mejoramiento																																																								
Estructuras	Alcantarillas																																																								
	Muro de Contención																																																								
Mantenimiento	Alcantarillas																																																								
Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und																																																							
		1																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																						
Pavimentación	Construcción	0																																																							
	Mejoramiento	0																																																							
Estructuras	Alcantarillas	0																																																							
	Muro de Contención	0																																																							
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																							
Otros (Especificar cuales)		0																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																									
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,756,175.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,685.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,645,093.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152,756,175.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																											
	VALOR																																																								
OBRAS	\$ 152,756,175.00																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																								
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00																																																								
	VALOR	ACUMULADO																																																							
OBRAS	\$ -	\$ -																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																									
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																						
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																									
Reconocimiento del tramo			Socialización inicial en la vereda Zarzal																																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																									
<div></div> <div>Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																																							
				VERSION																																																																							
				PÁGINA																																																																							
					FECHA	5/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: MARZO/2024																																																																							
CONVENIO No.: 4671-2023		PLAZO INICIAL: 16/01/2024		VALOR INICIAL : \$ 201.297.005,00																																																																							
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES: \$																																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201.297.005,00																																																																							
		PRORROGA No. 1		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																																							
		FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																																							
		PLAZO ACUMULADO: 2,67 MESES																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>und</td><td>6</td></tr><tr><td> Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación			Construcción			Mejoramiento			Estructuras	und	6	Alcantarillas			Muro de Contención			Mantenimiento			Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td> Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td> Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td> Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación		0		Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras		0		Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento		0		Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																									
Pavimentación																																																																											
Construcción																																																																											
Mejoramiento																																																																											
Estructuras	und	6																																																																									
Alcantarillas																																																																											
Muro de Contención																																																																											
Mantenimiento																																																																											
Alcantarillas																																																																											
Otros (Especificar cuales)																																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																								
Pavimentación		0																																																																									
Construcción		0																																																																									
Mejoramiento		0																																																																									
Estructuras		0																																																																									
Alcantarillas		0																																																																									
Muro de Contención		0																																																																									
Mantenimiento		0																																																																									
Alcantarillas		0																																																																									
Otros (Especificar cuales)		0																																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152.418.225,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.542.547,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.336.233,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201.297.005,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152.418.225,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																													
	VALOR																																																																										
OBRAS	\$ 152.418.225,00																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00																																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00																																																																										
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00																																																																										
	VALOR	ACUMULADO																																																																									
OBRAS	\$ -	\$ -																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																																									
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																																									
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																																											
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																								
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																											
Reconocimiento del tramo			Socialización inicial en la vereda Cristalina																																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																											
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																																											

 <p>CONSORCIO INTERVIALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

PERIODO:

1 AL 31 DE MARZO DE 2024

**CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
INTERVENTORÍA DE CONVENIO SOLIDARIO**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	

INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
<p>Claudia Lorena Valencia Calvo.</p>	<p>Directora de Interventoría</p>	

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
Fecha de realización: Abril 10 de 2024			

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	7
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	11
2.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	11
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS	14
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS	14
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	16
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	19
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	19
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	20
4.1	INFORME SEMANAL	20
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	20
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO	20
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	20
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	20
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	20
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	21
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	21
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	21
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	22
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	22
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	22
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7.1	LAS TALLAS 4784	25
7.2	EL CRUCERO 4693	25
7.3	ZARZAL 4393	25
7.4	LA CRISTALINA 4671	26
8	ANEXOS	27
8.1	CORRESPONDENCIA	27

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.8

Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.8

Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.9

Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.10

Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.10

Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.11

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	
--	--	--	---	---

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio de Patia, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** por lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	
---	---	--	---	---

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Patía.**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVÍAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir, el número del convenio y valor que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CUATRO (4) convenios Solidarios que se suscribieron entre el INVÍAS y las juntas de acción comunal del municipio de Patía

CONTRATISTA	CONVENIO No.	VALOR CONVENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS	4784-2023	\$ 201,655,369.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO	4693-2023	\$ 201,214,789.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL	4393-2023	\$ 201,645,093.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	4671-2023	\$ 201,297,005.00

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1 MUNICIPIO DE PATÍA

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Patía, ubicado aproximadamente a 95,6 kilómetros al sur de la capital del departamento del Cauca, Popayán. El municipio se encuentra a una altitud de alrededor de 910 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 28 °C.

Las coordenadas geográficas del municipio de Patía son:

Latitud: 2.114167

Longitud: -76.983056

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
Fecha de realización: Abril 10 de 2024			



Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.

Específicamente, el proyecto se ejecutará en cuatro veredas: Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina.

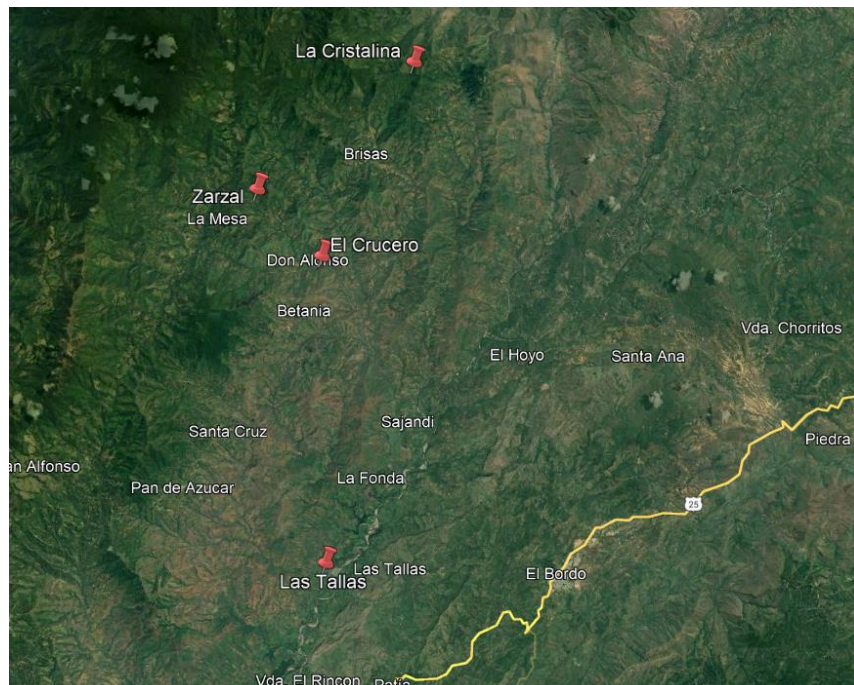


Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Abril 10 de 2024

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución de cuatro (4) convenios solidarios que se suscribieron en el municipio de *Patia*, departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”

CONVENIO No.	VEREDA	LONG(m)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	ALCANCE
4784-2023	LAS TALLAS	105	2.1410, -77.0716	2.1116, -77.0807	Construcción de 105 metros lineales de placa huella, y de 2 alcantarillas.
4693-2023	EL CRUCERO	123	2.2578,-77.1057	2.2623,-77.1041	Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla
4393-2023	EL ZARZAL	137	2.3082, -77.0300	2.2810, -77.0374	Construcción de 137m de placa huella, relleno para 1 alcantarilla.
4671-2023	LA CRISTALINA	0	2.3121, -77.0429	2.2896,-77.0630	Construcción de 6 alcantarillas

Los tramos postulados son:

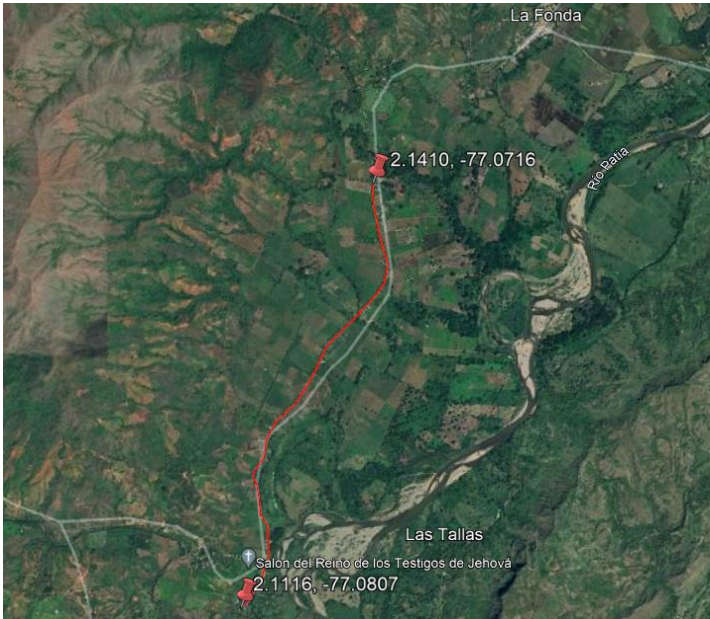


Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Abril 10 de 2024

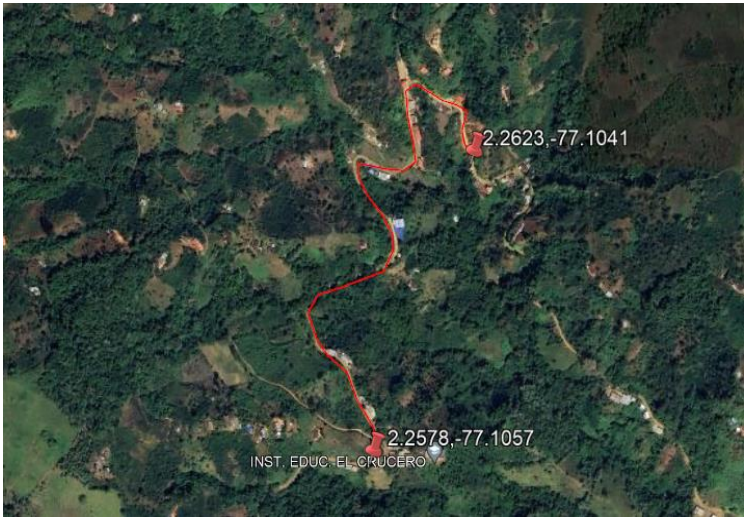


Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.

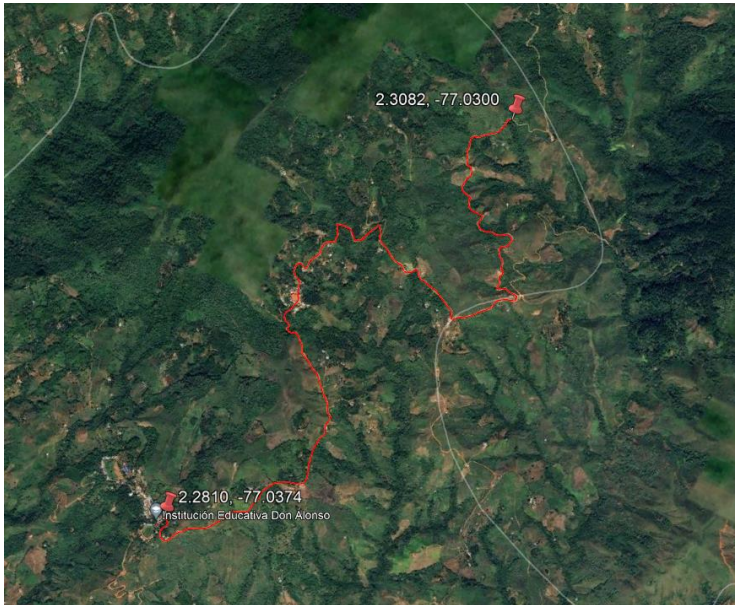


Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVIALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>		

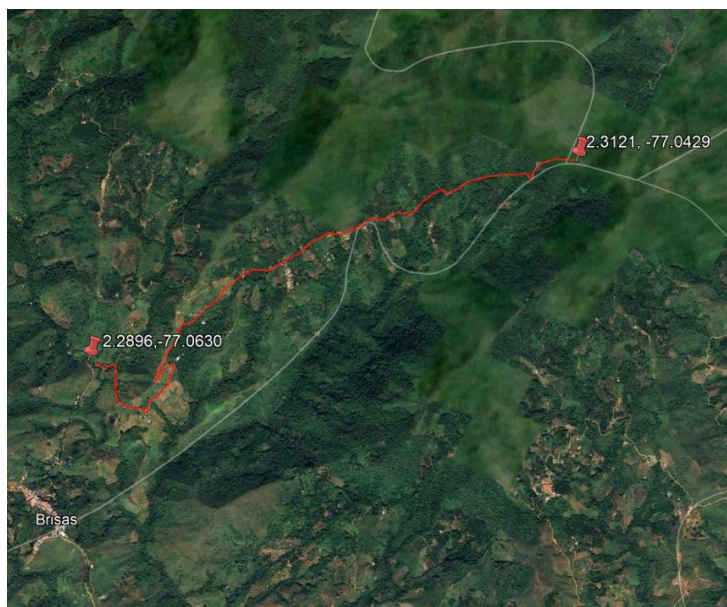


Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En términos generales, las vías identificadas en el proyecto muestran un estado regular. Aunque la superficie de rodadura está revestida con afirmado, se observan baches a lo largo de las mismas. Además, se nota una falta de conformación adecuada en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje. Algunas obras de drenaje existentes se encuentran en estado regular, mientras que otras están taponadas o colmatadas.

Con la firma de convenios con las juntas de acción comunal de las veredas Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina en el departamento del Cauca, el proyecto busca mejorar los corredores viales productivos, garantizando su transitabilidad y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

A continuación, se relacionan las obras que conformaran el proyecto:

2.3.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	
---	---	--	---	---

2.3.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 LAS TALLAS 4784

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4784-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,655,369.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
Nit	900663876-4
R.L	CRISTIAN DAVID MOSQUERA
CC. R.L	1.059.903.667
Suscripción convenio	1/12/2023
Fecha de Orden de inicio	21 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

3.1.2 EL CRUCERO 4693

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4693-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,214,789.00

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
Nit	900251089-6
R.L	DUVEL IVAN RUIZ
CC. R.L	76.175.146
Suscripción convenio	28/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

3.1.3 ZARZAL 4393

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4393-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,645,093.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
Nit	900661350-3
R.L	ZULDANY MEDINA CAMPO
CC. R.L	1.059.908.061
Suscripción convenio	21/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2024

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

3.1.4 LA CRISTALINA 4671

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4671-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,297,005.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Nit	901127925-2
R.L	HUBENER TROCHEZ QUIGUA
CC. R.L	76.236.290
Suscripción convenio	27/11/2023
Fecha de Orden de inicio	16/01/2024
Plazo inicial del convenio	Hasta el 31/12/2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS**. Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. En particular, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1 LAS TALLAS 4784

- El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVÍAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

- El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico
- El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas.
- El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro.
- El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado.
- Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo
- El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.
- El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.
- El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.
- El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

3.2.2 EL CRUCERO 4693

- El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.
- El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.
- El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se está a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro
- El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	
--	--	--	---	---

- El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.
- El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.
- El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.
- El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

3.2.3 ZARZAL 4393

- El 2 de marzo, se envía comunica pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.
- El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.
- El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico
- El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.
- El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se está a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro
- El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.
- El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.
- El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial
- El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.
- El día 30 de marzo, se hace reconocimiento del tramo.
- El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

3.2.4 LA CRISTALINA 4671

- El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.
- El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.
- El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- A la fecha del informe No. 9 ,el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificadorio para poder realizar la prórroga.
- Hasta la fecha del presente informe, las actividades en el sitio de obra aún no han comenzado debido a la falta de recursos en la cuenta de la junta.
- El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.
- El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial
- El día 27 de marzo, se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.
- El día 30 de marzo, se hace reconocimiento del tramo.
- El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas. Esto se debió a que las juntas de acción comunal, acreedoras de los convenios solidarios asociados al presente contrato de interventoría, se encontraban realizando las gestiones necesarias para los estudios previos y la elaboración de los documentos administrativos requeridos.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de marzo de 2024, referentes a los convenios solidarios

Formato: informe semanal

Se remite anexo 1. Los informes semanales del presente periodo.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de maquinaria y equipo.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de personal, control de aportes legales y seguridad social.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 inf fin y presupuestal obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	

comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

Formato seguimiento garantías convenio.

Se remite anexo 2, el formato correspondiente.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Se realiza la socialización inicial en las veredas de Zarzal y la Cristalina.

Se remite anexo 3. Actas de reunión

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	5006-2023
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
Valor del contrato	\$ 105,790,989.00
Contratista	CONSORCIO INTERVALES CAUCA
Nit	901.780.463-0
R.L	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Suscripción convenio	16/12/2023
Fecha orden de inicio	21/12/2023
Prorroga No. 1	Hasta 30/04/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Fecha de terminación vigente	30/04/2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe del director, respecto a informes de especialistas aun no se ha requerido.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este período, se utilizaron vehículos para llevar a cabo reuniones, desplazamientos destinados al reconocimiento del tramo y para realizar actividades de socialización

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT
Se remite anexo 4, el formato correspondiente.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se presenta el control de aportes legales y seguridad social.

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.
Se remite anexo 5, el formato correspondiente.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio, la oferta económica adjudicada es:

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	(2)	(3)	(4)	((2)+(3))* (4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	\$ 5,100,000.00		1.00	\$ 5,100,000.00
Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 3,100,000.00		3.00	\$ 9,300,000.00
Profesional Ambiental	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
Profesional Social	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 4,678,598.00
Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Estructuras	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5,000,000.00			
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	\$ 1,300,000.00		6.00	\$ 7,800,000.00
Inspector SST	\$ 1,300,000.00		3.00	\$ 3,900,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				\$ 33,478,598.00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2.36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				\$ 79,009,491.00

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR
		(\$)		PARCIAL (\$)
		(7)		(7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viáticos Director y/o Especialistas	Día	\$ 80,000.00	10.00	\$ 800,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	\$ 320,000.00	12.00	\$ 3,840,000.00
Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnsporte)	Según comprobante por mes	\$ 1,800,000.00	2.00	\$ 3,600,000.00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	\$ 250,000.00	3.00	\$ 750,000.00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	3.00	\$ 300,000.00
OTROS COSTOS				
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	2.00	\$ 200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	\$ 50,000.00	3.00	\$ 150,000.00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	\$ 45,000.00	3.00	\$ 135,000.00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	\$ 38,500.00	3.00	\$ 115,500.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				\$ 9,890,500.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 88,899,991.00
IVA = 19% * (C) = (E)				\$ 16,890,998.00
COSTO TOTAL = (C) + (E)				\$ 105,790,989.00

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

Se remite anexo 6, el formato correspondiente.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Se remite anexo 7, el formato correspondiente.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 LAS TALLAS 4784

Durante el período cubierto por este informe, no se han iniciado las actividades de obra. Se ha realizado la aprobación del levantamiento topográfico después de algunas observaciones, así como también la aprobación del estudio de suelos. Sin embargo, se está a la espera de la entrega del diseño geométrico y del estudio hidráulico e hidrológico, elementos clave para avanzar en la planificación de la obra. Por otra parte, se han aprobado las hojas de vida del personal, lo que ha llevado a la realización de una reunión virtual y asesoramiento telefónico para esclarecer los pasos a seguir en este proceso.

Además, se ha solicitado la realización de cotizaciones para poder elaborar el primer plan de compras, el cual debe contar con un mínimo de tres cotizaciones como soporte. Estos esfuerzos indican una preparación cuidadosa y una planificación detallada para garantizar el éxito en el inicio de las actividades de obra una vez se reciba la documentación restante.

7.2 EL CRUCERO 4693

Durante el mes de marzo, no se ha registrado actividad de obra. Se ha realizado la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y del contador. Sin embargo, hasta la fecha del presente informe no ha sido posible encontrar el profesional para el cargo de maestro debido a la ubicación remota de la vereda El Crucero, actualmente, se encuentran en la búsqueda.

Por otra parte, se ha completado la aprobación del estudio de suelos y del levantamiento topográfico, pero aún falta la entrega del diseño geométrico y del estudio hidráulico e hidrológico. Se han realizado diferentes asesoramientos a través de comunicaciones telefónicas debido a las dificultades de comunicación vía correo electrónico o mensajes de texto en esta vereda. Estos asesoramientos han estado orientados a la actualización de pólizas, a la búsqueda del maestro y cotizaciones.

7.3 ZARZAL 4393

Durante el período cubierto por este informe en la Vereda Zarzal, las actividades de obra aún no han comenzado. Se ha obtenido la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y del contador. Sin embargo, encontrar un profesional adecuado para el cargo de maestro ha sido un desafío debido a la ubicación remota de la vereda, y actualmente se está en proceso de búsqueda para cubrir esta posición.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	
--	--	--	---	---

se llevó a cabo el reconocimiento del tramo, donde se ubicaron las abscisas correspondientes. En este contexto, se realizó una socialización inicial, durante la cual se conformó el comité de participación comunitaria. Durante esta reunión, se abordaron las inquietudes de la comunidad, se proporcionó una explicación detallada sobre el presupuesto del convenio y se discutió el alcance del proyecto.

Además, se realizó la aprobación del estudio de suelos y del levantamiento topográfico, pero aún falta la entrega del diseño geométrico. Se llevó a cabo una reunión con el ingeniero residente, durante la cual se le solicitó la actualización del presupuesto, teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas, así como la presentación del primer plan de compras. Estos pasos reflejan un enfoque proactivo para avanzar en la planificación y preparación del proyecto, a pesar de los desafíos encontrados en la búsqueda de personal especializado.

7.4 LA CRISTALINA 4671

Durante el mes de marzo en la Vereda La Cristalina, aún no han comenzado las actividades en el sitio de la obra. Se está a la espera de la aprobación de un modificadorio de prórroga. Además, solo se ha obtenido la hoja de vida del contador, ya que esta vereda, siendo la más alejada de las cuatro del municipio del Patía, ha presentado dificultades para encontrar un ingeniero residente y un maestro adecuados. Hasta la fecha de este informe, se continúa en la búsqueda de estos profesionales.

Por otro lado, se ha aprobado el levantamiento topográfico, pero aún falta la entrega del diseño hidráulico e hidrológico. Se llevó a cabo un reconocimiento del tramo, registrando la ubicación de las alcantarillas de acuerdo con el alcance del convenio. Además, se realizó una socialización en compañía de la Junta de Acción Comunal (JAC) y la comunidad, durante la cual se resolvieron todas las inquietudes planteadas.

Finalmente, hasta la fecha de este informe, el convenio no cuenta con los recursos en la cuenta para poder iniciar las actividades.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2024	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 TALLAS 4784

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-4784-001-2024	Aprobación hv contador y maestro	14/03/2024
CIVC-5006-4784-002-2024	observaciones levantamiento topográfico	20/03/2024

8.1.2 CRUCERO 4693

FECHA	OBJETO	MEDIO
CIVC-5006-4693-001-2024	Aprobación hv contador	9/03/2024
CIVC-5006-4693-002-2024	aprobación hv ingeniero residente	19/03/2024

8.1.3 ZARZAL 4393

FECHA	OBJETO	MEDIO
CIVC-5006-4393-001-2024	Solicitud hojas de vida	2/03/2024
CIVC-5006-4393-002-2024	aprobación hv ing. Residente	19/03/2024

8.1.4 CRISTALINA 4671

FECHA	OBJETO	MEDIO
CIVC-5006-4671-001-2024	aprobación hv contador	10/03/2024

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2024</p>	

Anexo 0. Formato informe general estado del proyecto

Anexo 1. Informe semanal

Anexo 2. Seguimiento garantías convenio

Anexo 3. Actas de reunión

Anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT

Anexo 5.MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

Anexo 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

Anexo 7. Seguimiento garantías interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO N/A
.....	PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO N/A
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO N/A
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	Ocupación DE CAUCES:	SI NO N/A
OBSERVACIONES:		VERTIMIENTOS:	SI NO N/A
		EMISIONES:	SI NO N/A
		OTROS (Especificar cual)	SI NO N/A
		OBSERVACIONES:	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO: No aplica.		

V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	3	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3			

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784</p> <p>*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784</p> <p>*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.</p> <p>*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.</p> <p>*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.</p> <p>*Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello.</p> <p>*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT</p> <p>*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas.</p> <p>*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.</p> <p>*El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el framo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños.</p> <p>*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.</p> <p>*El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones.</p> <p>*El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador.</p> <p>*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.</p> <p>*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la que participaron el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.</p> <p>*El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico</p>	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio	

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
	N/A	N/A	N/A
Reunión con representante legal JAC	N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual</p> <p>*Entiré conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<p>FIRMA</p> <p>NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</p> <p>Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

11/03/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

11

del

1/03/2024

al

7/03/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

DUVEL IVAN RUIZ

4693-2023

22/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

\$ 201.214.789.00

\$ -

\$ 201.214.789.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

5006-2023

21/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ 105.790.989.00

\$ -

\$ 105.790.989.00

\$ -

\$ -

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella

ML

123

Alcantarillas

UND

2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

123.00

123.00

100.0%

Ejec

0.00

0.00

0.0%

Prog

2.00

2.00

100.0%

Ejec

0.00

0.00

0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Salitrin

Mezcladora de concreto

Vibrocompactador

Retroexcavadora sobre llantas

vibrador de concreto

Motoniveladora

Total

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Ejecutado:

Programado:

Ejecutado:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Cruceiro.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para pagar a la JAC.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la que participaron el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión con representante legal JAC

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

X

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

X

EMISIONES:

SI

NO

N/A

X

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.

*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.

ACTIVIDADES SREALIZADAS EN LA SEMANA

*El 2 de marzo, se envía comunica pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la que participaron el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Reunión con representante legal JAC

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la que participaron el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidraulico e hidrológico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Reunión con representante legal JAC



N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

Emilir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
				VERSIÓN																																																																																			
				PÁGINA	1 DE 2																																																																																		
					FECHA	18/03/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 12 del 9/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal N°: (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																							
Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS				CONSORCIO INTERVALLES CAUCA																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN DAVID MOSQUERA				REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA																																																																																			
CONVENIO No. 4784-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,655,369.00		CONTRATO No. 5006-2023		VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)				PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																	
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>201,655,369.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.</td></tr></tbody></table>							CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,655,369.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.																																
CONVENIO																																																																																							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,655,369.00																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td></td><td>SI</td><td>NO X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></tbody></table>							INTERVENTORIA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI	NO X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A	PERIODO FACTURADO:		N/A	N/A	VALOR FACTURA:	\$	-		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: N/A																																								
INTERVENTORIA																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI	NO X																																																																																				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A																																																																																				
PERIODO FACTURADO:		N/A	N/A																																																																																				
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td>105</td><td>Prog</td><td>105.00</td><td></td><td></td><td>105.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td>2</td><td>Prog</td><td>2.00</td><td></td><td></td><td>2.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	* Placa Huella	ML	105	Prog	105.00			105.00	100.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%	* Alcantarillas	UND	2	Prog	2.00			2.00	100.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%																											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																															
* Placa Huella	ML	105	Prog	105.00			105.00	100.0%																																																																															
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																															
* Alcantarillas	UND	2	Prog	2.00			2.00	100.0%																																																																															
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																															
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas. Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones.

*El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas.

*El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Crucero.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para poyar a la JAC.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emilir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matricula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

N/A

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO

N/A

X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO

N/A

X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO

N/A

X

VERTIMIENTOS:

SI NO

N/A

X

EMISIONES:

SI NO

N/A

X

OTROS (Especificar cual)

SI NO

N/A

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.

*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.

*El 2 de marzo, se envía comunica pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.

ACTIVIDADE SREALIZADAS EN LA SEMANA

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emite conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 6 de marzo, se realizó diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*A la fecha del informe No. 9, el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificatorio para poder realizar la prórroga.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

25/03/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

13

del

15/03/2024

al

21/03/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

REPRESENTANTE LEGAL:

CRISTIAN DAVID MOSQUERA

CONVENIO No.

4784-2023

VALOR INICIAL:

\$

201,655,369.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

201,655,369.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALLES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$

105,790,989.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

105,790,989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201,655,369.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	105
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	105.00			105.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorvibradora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado: Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el framo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones.

*El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas.

*El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado.

*Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

25/03/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

13

del

15/03/2024

al

21/03/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

REPRESENTANTE LEGAL:

DUVEL IVAN RUIZ

CONVENIO No.

4693-2023

VALOR INICIAL:

\$

201.214,789.00

FECHA DE INICIO:

22/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

201.214,789.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$

105.790.989.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

105.790.989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201.214,789.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	123
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	123.00			123.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Crucero.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para apoyar a la JAC.

*El 5 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIENTES: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.

*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.

*El 2 de marzo, se envía comunico pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

UBICACIÓN: N/A

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

Ocupación de CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*A la fecha del informe No. 9, el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificatorio para poder realizar la prórroga.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente informe, las actividades en el sitio de obra aún no han comenzado debido a la falta de recursos en la cuenta de la junta.

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

Emisión de conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

8/04/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

15

del

29/03/2024

al

4/04/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

REPRESENTANTE LEGAL:

CRISTIAN DAVID MOSQUERA

CONVENIO No.

4784-2023

VALOR INICIAL:

\$

201,655,369.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

201,655,369.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALLES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$

105,790,989.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

105,790,989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,655,369.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	105
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	105.00			105.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado: Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:



Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
<div> <div>UBICACIÓN:</div> <div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> </div> <div> <div>UBICACIÓN:</div> <div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> </div>					<div> <div>ZONAS DE DEPOSITO</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>VERTIENTOS:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>EMISIONES:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div> <div> <div>OTROS (Especificar cual)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N/A</div> </div>				
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
ESTADO:	No aplica.	

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
<p> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: </p>		
<p> OBSERVACIONES: </p>		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Diligenciamiento y firma del Formato MEPR, de la prorroga N°1 del convenio 4784 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784 *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el inicio. *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños. *Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello. *El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT. *El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas. *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar. *El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños. *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotécnica, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes. *El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones. *El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador. *El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 28 febrero se realiza estudio de suelos. *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría. *El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico *El 8 de marzo, serializa diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento *El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas. *El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro. *El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado. *Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente. *El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras. *El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes. *El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
 <p>Pieza comunicativa, socialización inicial</p>	 <p>N/A</p>	 <p>N/A</p>
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p>		
<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES</p> <p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<p>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</p>  <p>FIRMA _____</p> <p>NOMBRE: _____ CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</p> <p>Matrícula Profesional No.: _____ 19202-278490 CAU</p>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INMAAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Tecnológica</p>		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

8/04/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

15

del

29/03/2024

al

4/04/2024

Último Informe Semanal No.:

(Numeración consecutiva)

N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

REPRESENTANTE LEGAL:

DUVEL IVAN RUIZ

CONVENIO No.

4693-2023

VALOR INICIAL:

\$ 201.214,789.00

FECHA DE INICIO:

22/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 201.214,789.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MARUNGA GAVIRIA

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$ 105.790.989.00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 105.790.989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,214,789			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 201,214,789.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la entrega de los estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	123
Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	123.00			123.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Ejecutado:

Programado:

Ejecutado:

FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTION AMBIENTAL	
		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X VERTIENTOS: SI NO N/A X EMISIONES: SI NO N/A X OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0 3	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS			
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693			
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693			
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.			
*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.			
*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.			
*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT			
*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Cruceiro.			
*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.			
*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.			
*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVias Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.			
*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.			
*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos			
*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para apoyar a la JAC.			
*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVias y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.			
*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento			
*El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.			
*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro			
*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico			
*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.			
*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente.solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.			
*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico			
*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.			
*El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Cotización de los materiales de obra para que se actualice el presupuesto de obra			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
Pieza comunicativa, socialización inicial	N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual		FIRMA	
*Emisr conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.		NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO	
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		Matricula Profesional No.: 19202-278490 CAU	

FUENTES DE MATERIALES				IV. GESTION AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	DISPONIBLE				
		SI	NO				
		LICENCIA AMBIENTAL:					
		SI	NO				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:					
		SI	NO				
		LICENCIA AMBIENTAL:					
		SI	NO				
OBSERVACIONES:							
				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
				ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
				LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
				CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
				Ocupación de cauces:	SI	NO	N/A
				VERTIENTES:	SI	NO	N/A
				Emisiones:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							
ESTADO: No aplica.							
OBSERVACIONES:							
V. GESTIÓN SOCIAL							
		OBRA	INTER				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		0	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
OBSERVACIONES:		Se realiza la socialización del proyecto, en la cual participan los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC), miembros de la comunidad y trabajadores que estarán involucrados en el proyecto. Durante esta reunión se presenta y discute en detalle el alcance, los objetivos y los aspectos relevantes del proyecto. Además, se conforma el Comité de Participación Comunitaria.					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		3					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS							
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393							
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393							
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.							
*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.							
*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.							
*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT							
*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.							
*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.							
*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.							
*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.							
*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.							
*El 2 de marzo, se envía comunico pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.							
*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.							
*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.							
*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento							
*El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.							
*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro							
*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico							
*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.							
*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente,solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.							
*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial							
*El día 27 de marzo se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico							
*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.							
ACTIVIDAD SREALIZADAS EN LA SEMANA							
*El día 30 de marzo, se hace reconocimiento del tramo.							
*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.							
*El 2 de abril, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero residente para explicarle el proceso y los requisitos del plan de compras.							
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
* Cotización de los materiales de obra para que se actualice el presupuesto de obra							
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>Socialización vereda Zarzal</p>		 <p>Reconocimiento del tramo</p>		<p>N/A</p>			
 <p>Socialización vereda Zarzal</p>		 <p>Reconocimiento del tramo</p>		<p>N/A</p>			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA			
*Revisión de documentos administrativos para dar visibilidad a un proceso contractual *Enviar conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.				<div style="text-align: right;">  CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Matricula Profesional No.: 19202-278490 CAU </div>			
FIRMA				NOMBRE:			
NOMBRE:				Matricula Profesional No.:			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contrata, Interventor y Dirección Territorial.	

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realiza la socialización del proyecto, en la cual participan los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC), miembros de la comunidad y trabajadores que estarán involucrados en el proyecto. Durante esta reunión se presenta y discute en detalle el alcance, los objetivos y los aspectos relevantes del proyecto. Además, se conforma el Comité de Participación Comunitaria.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*A la fecha del informe No. 9, el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificatorio para poder realizar la prórroga.

*Hasta la fecha del presente informe, las actividades en el sitio de obra aún no han comenzado debido a la falta de recursos en la cuenta de la junta.

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

*El día 27 de marzo, se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 30 de marzo, se hace reconocimiento del tramo.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Cotización de los materiales de obra para que se actualice el presupuesto de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socializacion inicial vereda Zarzal



Reconocimiento del tramo



N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Entir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEP1, de la prórroga N°1 del convenio 4784

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°1 del convenio 4784

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones.

*El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro.

*El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado.

*Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

3

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

3

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Crucero.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para poyar a la JAC.

*El 5 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente,solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IV. GESTION AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
<div>UBICACIÓN:</div> <div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div>					<div>DISPONIBLE</div> <div> <div>ZONAS DE DEPOSITO</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>VERTIENTES:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>EMISIONES:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>OTROS (Especificar cual)</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div>				
<div>UBICACIÓN:</div> <div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div> <div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>---</div> <div>NO</div> <div>---</div> </div>					<div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div> <div> <div>N/A</div> <div>---</div> <div>X</div> </div>				
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

- *Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393
- *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393
- *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- *El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.
- *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.
- *El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT
- *El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.
- *El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.
- *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.
- *El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.
- *El 2 de marzo, se envía comunicando pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.
- *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.
- *El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.
- *El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- *El 12 de marzo, la presidencia expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.
- *El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se entra a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro
- *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

 <p>Pieza comunicativa, socialización inicial</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p>
--	-----------------------	-----------------------

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																							
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																							
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																							
			FECHA	10 4 2024 (Día) (Mes) (Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																								
CONVENIO No. 4784-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS																																																								
OBJETO DEL CONTRATO:																																																										
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																										
FECHA DE INICIO: 21/12/2023																																																										
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																										
VALOR INICIAL: \$ 201,655,369.00																																																										
VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00 (Incluye adiciones)																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																										
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,311,074.00</td><td>1</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,082,768.00</td><td>1</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,496,611.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,311,074.00	1	12	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,768.00	1	12	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,496,611.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
Cumplimiento	20%	\$ 40,311,074.00	1	12	2023	31/10/2024																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,768.00	1	12	2023	31	12	2026																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,496,611.00	31	12	2023	31	12	2028																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253																																																										
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																										
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																										
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																										
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>1</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	1	12	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	1	12	2023	31	12	2023																																																		
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583																																																										
OTRAS PÓLIZAS No.																																																										
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																										
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																										
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,311,074.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,768.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,496,611.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	12	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30/04/2027		
30	4	2024	30/04/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/04/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																									
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																									
			FECHA	10	4	2024																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																										
CONVENIO No. 4493-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL																																																										
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,645,093.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,329,020.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,082,255.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,493,530.00</td><td>21</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30/04/2027		
30	4	2024	30/04/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	10	4	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4693-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201,214,789.00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201,214,789.00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,242,958.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,060,739.50</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,364,437.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023																																																			
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Cumplimiento		20%		\$ 40,242,958.00		Desde			Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.R				30	12	2023	2/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%		\$ 10,060,739.50		Día	Mes	Año	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		30%		\$ 60,364,437.00		30	12	2023	30/04/2027
						30	4	2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Seguro		% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV		\$ 260,000,000.00		Desde			Hasta
Otros		N.R				28	11	2023	30 4 2024
						Día	Mes	Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

	FECHA	10 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: NO TIENE ORDEN DE INICIO
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 201,297,005.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201,297,005.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40,259,402.00	27	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,064,850.00	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,389,103.00	21	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	24	11	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoria

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

30/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4393-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA VEREDA EL ZARZAL

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socialización del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión de Socialización del convenio, con la bienvenida y presentación de los asistentes. Mediante una presentación se da informe a la comunidad, acerca del contrato de Interventoría, los Valores, Presupuestos y se informa de temas referentes a las metas Físicas, Aspectos del Área técnica; Aspectos Jurídicos, y Aspectos sociambientales, con una explicación clara para las personas asistentes; de cada uno de los temas tratados durante la presentación, donde se resaltó la importancia de la contratación de la mano de obra local, con inclusión social con perspectiva de género, dando una clara idea que el personal a contratar debe ser mano de obra calificada, se da claridad acerca de los gastos, los Presupuestos y su distribución, y se informa que los pagos se harán directamente a terceros. Se da un espacio para resolver inquietudes sobre los temas.



FECHA 30/003/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

a intervenir. y los tiempos para la ejecución de la obra; se socializa a los presentes sobre la importancia de la conformación del Comité de Participación comunitaria, sus funciones y las personas habilitadas para hacer parte del comité.

Se da un espacio para la elección de los candidatos y se procede con la conformación del comité de participación comunitaria de la Vereda zarzal, en el marco del Proyecto "Caminos comunitarios de la Paz Total", quedando conformado de la siguiente manera:

- Yesmy Lorena Hoyos cc. 1061600166
- Humberto Agredo C.C. 10694235.
- Luz Hermila Bolaños c.c. 34455254

Se da información a la comunidad acerca de la manera en como se llevara a cabo la apertura y cierre de vía del tramo a intervenir, para así habilitar ruta alterna.

Se Agradece a la comunidad y a las personas presentes por la asistencia a la reunión.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/03/2014
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Zuldani Medina.	Presidenta.	J.A.C El Zarzal.	Zuldani Medina
David Gomez		Zarzal	David Gomez
yuli carolina yasno		V. Zarzal.	yuli carolina yasno
Brayan Lopez			Brayan Lopez
Eli Jamid			Eli Jamid ordona
Lucely Duley.			LUSHIS
Eunice Navia			Eunice Navia
Dismer Tobar.			Dismer Tobar
Luis Ramirez.			Luis Ramirez
Over Hernando M.			Over Hernando M.
Efrén Paz.			EFREN PAZ
Faro Diaz			Faro Diaz
Luis Gomez.			Luis Gomez
Bernal Gomez.			Bernal Gomez
Hernando Tovar.			Hernando Tovar



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO

MEPLAN1 IN-14 FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/03/2024
(Día / Mes / Año)

Victoria mundillo

1116251866

Victoria M

Ypsela Navia

1002861094

Yisela Navia

Leonila Rivera

48650402

✓ Leonila

Yorman Medina

✓ Yorman Medina

Edifer Reyes

Edifer Reyes

Fabian Guerrero

Fabian Guerrero

Dora Nilsa Campo

Dora Nilsa Campo

Tomas Medina

✓ Tomas Medina

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez

Juliana Diaz

Juliana Diaz

Maria E. Gomez

Maria Elena Gomez

Gilder Melendez

Gilder A. Melendez

Andres Meneses

✓ ANDRES

Edifer Diaz

Edifer

Ana Maria Cortez

✓ Ana Maria Cortez

Ingrith A.

✓ Ingrith Ampudia

Derly Navia

✓ Derly Navia

Lorena Hoyos

✓ Lorena Hoyos

Maria Dianey

✓ M. Dianey

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO

MEP/MDT/0414/PR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/03/2024
(Día / Mes / Año)

Brayan Medina

Duvan Flor.

Humberto Agredo

Aleida Ordoñez.

Leidi Meneses.

Luz Ermila Bolaños

Sandra Tobar.

Jose Cortez.

Rocio Sanchez.

Andrea Gasmin N. Profesional Social

Interventoria.

BRAYAN A. MEDINA

DUVAN FLOR

HUMBERTO

ALEIDA ORDOÑEZ

LEIDI MENESSES

LUZ ERMILA BOLAÑOS

SANDRA TOBAR

JOSE ONARIO CORTES

ROCIO SANCHEZ

ANDREA J. H. I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSION PAGINA	MEPH-MI-IN-14-FR-2 1 1
			FECHA 30/03/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
	(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)		

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4671-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
 SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA VEREDA CRISTALINA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Socialización del convenio solidario

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de socialización, dando la bienvenida a los asistentes, luego se hace la presentación de del grupo de trabajo por parte de la interventoria que esta a cargo de la socialización. Mediante una presentación proyectada. Se da a conocer a la comunidad aspectos importantes del proyecto que es de gran importancia que se tenga clara información sobre el contrato de interventoria, entregando un informe detallado con referencia a temas de metas físicas, Aspectos del área técnica, aspectos jurídicos y socioambientales, se resalta la importancia de la contratación de la mano de obra local, con inclusión de género, se da una idea clara que el personal a contratar debe estar certificado para contar con mano



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

de obra calificada a cargo de la ejecución del Proyecto, se hace mención de como se llevará a cabo las actividades de cierre y apertura de vía; se da explicación clara acerca de los presupuestos y su manejo el cual con referencia a los pagos que estos se harán directamente a terceros.

La comunidad manifiesta que al ser su primera experiencia se encuentran con muchos requisitos que no habrían visto en proyectos, a lo que se da explicación clara por parte de la directora de obra.

Se menciona la importancia de la conformación del comité de Participación Comunitaria de la Vereda la Cristalina, en el marco del Programa "Caminos comunitarios de la Paz Total".

El comité se elige de manera democrática entre los asistentes, quedando conformado de la siguiente manera:

Monica Velasco Flor. c.c. 1061535342.

Paulino Rivera. c.c. 10698867

Edison Marquillo c.c. 1002862302

Se informa a la comunidad sobre el punto de atención al ciudadano y su ubicación.

Se finaliza el encuentro agradeciendo a la comunidad la asistencia y la atención prestada.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/03/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eteberto Zamarale	Vicepresidente J.A.C.	Vereda Cristalina	
Jair Campo	Tesorero J.A.C.	Vereda Cristalina	Jair Campi
Edinson Mangullo			EDINSON MA
Yohana Campo G.			Yohana campo G
Monica Velasco			Monica Velasco F.
Duvan Campo			
Hubener Trochez	Presidente de J.A.C.	Vereda Cristalina	
Yenni Malden Paz	Fiscal	Vereda Cristalina	yenny malden
Paulino Rivera			paulino
Andrea Yasmín N.	Prof. Social	Interventoría	Andrea J.H.F.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA31/03/2024(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:MARZO/2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No.5006-2023

CONVENIO No.4693-2023
4671-2023
4993-2023
4784-2023

PROYECTO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTORÍA:CONSORCIO INTERVALES CAUCA

CONTRATISTA:JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta RUH48G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEÍBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		10/04/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	5006-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
--------------------------------	-----------	--------------	-----------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO:	21/12/2023				
PLAZO INICIAL:	31/12/2023				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	105,790,989.00			
VALOR ACUMULADO:	\$	105,790,989.00 (Incluye adiciones)			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR				
---	-----------------------------	--	--	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 10,579,098.90	16	12	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	\$ 31,737,296.00	16	12	2023	16	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	435-47-994000055937				
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	21/12/2023				

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 10,579,098.90	16	12	2023	1/11/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	1	5	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 31,737,296.70	16	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	435-47-994000055937				
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:					

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: No.:19202-278490 CAU



Firma

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

24/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

5006-2023

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

MARZO/2024

PROYECTO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No.:

4693-2023
4671-2023
4393-2023
4786-2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ZARZAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

NOMBRE ARL:

POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF																		
1	Claudia Iorena Valencia Calvo	1061740409	Director de Interventoría	\$ 663,000					X					X						X									X		13%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	\$ 663,000	\$ 46,200	V	Sanitas	29843857	\$ 26,600	Colpensiones	29843857	\$ 106,100	\$ 26,600	\$ -	\$ -																								
2	Jhoan Cardenas Quintero	1061721705	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 1,085,000					X	X	X			X				X	X	X	X						X	X	X		35%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	\$ 1,085,000	\$ 75,600	V	Nueva EPS	29843857	\$ 43,400	Colfondos	29843857	\$ 173,600	\$ 43,400	\$ -	\$ -																								
3	Andrea Yasmin Motta Fiesco	1061778465	Profesional social	\$ 450,000														X		X	X	X						X		15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	\$ 450,000	\$ 31,400	V	Sanitas	29843857	\$ 18,000	Porvenir	29843857	\$ 72,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -																									
4																																																																				
5																																																																				
6																																																																				
7																																																																				
N																																																																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 2,198,000																																																																

El Interventor adjunta la certificación de fecha

24/05/2024

a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma

Nombre:EDWIN DELBET TROCHEZ ESCOBAR

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	
											FECHA	24/05/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023											INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA	
MES INFORME MENSUAL: MARZO/2024											PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONVENIO No: 4693-2023 4671-2023 4393-2023 4784-2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior		
2023	1398323	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 105,790,989	-		
TOTAL									\$ 105,790,989			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 105,790,989												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE/2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1398323;19/12/2023	\$ 105,790,989.00	\$ 105,790,989.00	-	-
2	ENERO/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1398323;19/12/2023	\$ 105,790,989.00	\$ 105,790,989.00	-	-
3	FEBRERO/2024	\$ 3,654,400	\$ 694,336	\$ 4,348,736	\$ -	\$ -	\$ -	1398323;19/12/2023	\$ 101,442,253.00	\$ 101,442,253.00	-	-
4	MARZO/2024	\$ 5,742,780	\$ 1,091,128.20	\$ 6,833,908	\$ -	\$ -	\$ -	1398323;19/12/2023	\$ 94,608,344.80	\$ 94,608,344.80	-	-
5	ABRIL/2024										-	-
TOTALES		\$ 9,397,180.00	\$ 1,785,464.20	\$ 11,182,644.20	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 94,608,344.80	\$ 94,608,344.80		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO			IVA		TOTAL					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		\$ 8,585,680.00			\$ 1,631,279.20		\$ 10,216,959.20					
OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 811,500.00			\$ 154,185.00		\$ 965,685.00					
VALOR TOTAL		\$ 9,397,180.00			\$ 1,785,464.20		\$ 11,182,644.20					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div></div><div>Firma Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula profesional No. 19202-218012 CAU</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												
