

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Convenio No.	4784-2023 4693-2023 4393-2023 4671-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Contrato de Interventoría No.	5006-2023	Interventoría:	CONSORCIO INTERVALES CAUCA

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No.	5	MES O PERIODO:	ABRIL
---------------------	---	----------------	-------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		10
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		19
3.1	Información general del contrato		19
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		22
3.3	Seguimiento Items no previstos		24
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		24
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		25
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	25
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	25
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	25
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	25
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	26
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		27
5.1	Información general del contrato		27
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		27
5.3	Informes especialistas y profesionales		27
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		28
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	28
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	28
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	28
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	29
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	29
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		30
8	Anexos		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																																		
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION																																																		
			PÁGINA																																																		
			FECHA	5/05/2024 (Día / Mes / Año)																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	PERIODO MES: ABRIL/2024																																																		
CONVENIO No.: 4784-2023		PLAZO INICIAL: 0.27 MESES	VALOR INICIAL : \$ 201,655,369.00																																																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 23/12/2023	VALOR ADICIONALES: \$																																																		
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	VALOR ACUMULADO: \$ 201,655,369.00																																																		
		PRORROGA No. 1	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																																		
		PRORROGA No. 2	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		PLAZO ACUMULADO: 4.47 MESES																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																			
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>105</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	105	Mejoramiento			Estructuras Alcantarillas	und	2	Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																			
Pavimentación Construcción	ml	105																																																			
Mejoramiento																																																					
Estructuras Alcantarillas	und	2																																																			
Muro de Contención																																																					
Mantenimiento Alcantarillas																																																					
Otros (Especificar cuales)																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																		
Pavimentación Construcción		0																																																			
Mejoramiento		0																																																			
Estructuras Alcantarillas		0																																																			
Muro de Contención		0																																																			
Mantenimiento Alcantarillas		0																																																			
Otros (Especificar cuales)		0																																																			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																			
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,766,151.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,985.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,655,369.00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	\$ 152,766,151.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																								
	VALOR																																																				
OBRAS	\$ 152,766,151.00																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,985.00																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,655,369.00																																																				
	VALOR	ACUMULADO																																																			
OBRAS	\$ -	\$ -																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																			
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																					
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																			
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
		N/A																																																			
SOCIALIZACION INICIAL VEREDA LAS TALLAS		N/A																																																			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																					
<div></div> <div>Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO																																																		
			VERSION																																																		
			PÁGINA																																																		
			FECHA	5/05/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA																																																	
			PERIODO MES:	ABRIL/2024																																																	
CONVENIO No.:	4693-2023		PLAZO INICIAL:	0.3 MESES																																																	
			FECHA DE INICIO:	22/12/2023																																																	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																		
			FECHA DE REANUDACIÓN:																																																		
			PRORROGA No. 1	Hasta 30/04/2024																																																	
			PRORROGA No. 2	30/04/2024 AL 30/06/2024																																																	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024																																																	
			PLAZO ACUMULADO:	4.5 MESES																																																	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		VALOR INICIAL :	\$ 201.214.789,00																																																	
			VALOR ADICIONALES:	\$ -																																																	
			VALOR ACUMULADO:	\$ 201.214.789,00																																																	
			DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ -																																																	
			DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	5006-2023		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVALES CAUCA																																																	
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																		
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>123</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>2</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento	123	Estructuras	Alcantarillas	und		Muro de Contención	2	Mantenimiento	Alcantarillas		Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	0			Mejoramiento	0		Estructuras	Alcantarillas	0			Muro de Contención	0		Mantenimiento	Alcantarillas	0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																			
Pavimentación	Construcción	ml																																																			
	Mejoramiento	123																																																			
Estructuras	Alcantarillas	und																																																			
	Muro de Contención	2																																																			
Mantenimiento	Alcantarillas																																																				
Otros (Especificar cuales)																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																		
Pavimentación	Construcción	0																																																			
	Mejoramiento	0																																																			
Estructuras	Alcantarillas	0																																																			
	Muro de Contención	0																																																			
Mantenimiento	Alcantarillas	0																																																			
Otros (Especificar cuales)		0																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																		
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152.338.404.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.540.152.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.336.233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201.214.789.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152.338.404.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.540.152.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.214.789.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																								
	VALOR																																																				
OBRAS	\$ 152.338.404.00																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.540.152.00																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233.00																																																				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.214.789.00																																																				
	VALOR	ACUMULADO																																																			
OBRAS	\$ -	\$ -																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																			
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																					
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																		
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
			N/A																																																		
SOCIALIZACION INICIAL VEREDA EL CRUCERO			N/A																																																		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																					
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																						
				VERSION																																																						
				PÁGINA																																																						
					FECHA	5/05/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: ABRIL/2024																																																						
CONVENIO No.: 4393-2023		PLAZO INICIAL: 0.3 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201,645,093.00																																																						
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 22/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																						
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00																																																						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		PRORROGA No. 1: Hasta 30/04/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																						
		PRORROGA No. 2: 30/04/2024 AL 30/09/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																						
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024																																																								
		PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																						
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td rowspan="2">ml</td><td rowspan="2">137</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Relleno de alcantarillas</td><td rowspan="2">und</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	137	Mejoramiento	Estructuras	Alcantarillas			Muro de Contención			Mantenimiento	Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und	1		<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción		0		Mejoramiento	Estructuras	Alcantarillas		0		Muro de Contención	Mantenimiento	Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)			0		
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																							
Pavimentación	Construcción	ml	137																																																							
	Mejoramiento																																																									
Estructuras	Alcantarillas																																																									
	Muro de Contención																																																									
Mantenimiento	Alcantarillas																																																									
Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und	1																																																							
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																						
Pavimentación	Construcción		0																																																							
	Mejoramiento																																																									
Estructuras	Alcantarillas		0																																																							
	Muro de Contención																																																									
Mantenimiento	Alcantarillas		0																																																							
Otros (Especificar cuales)			0																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																							
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152,756,175.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,552,685.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,336,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201,645,093.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152,756,175.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																												
	VALOR																																																									
OBRAS	\$ 152,756,175.00																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,552,685.00																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,336,233.00																																																									
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201,645,093.00																																																									
	VALOR	ACUMULADO																																																								
OBRAS	\$ -	\$ -																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																										
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																							
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
N/A			N/A																																																							
N/A			N/A																																																							
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
<div></div> <div>Firma: Claudia Lorena Valencia Calvo Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																																												
				VERSION																																																												
				PÁGINA																																																												
					FECHA	5/05/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: ABRIL/2024																																																												
CONVENIO No.: 4671-2023		PLAZO INICIAL: _____		VALOR INICIAL : \$ 201.297.005,00																																																												
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 16/01/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		FECHA DE SUSPENSIÓN: _____		VALOR ACUMULADO: \$ 201.297.005,00																																																												
		FECHA DE REANUDACIÓN: _____		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																												
		MODIFICATORIO No. 1 4 meses a partir de la orden de inicio		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																												
		FECHA DE VENCIMIENTO: 15/05/2024																																																														
		PLAZO ACUMULADO: 3,67 MESES																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																												
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>6</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas	und	6	Muro de Contención			Mantenimiento	Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras	Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento	Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)			0	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																													
Pavimentación	Construcción																																																															
	Mejoramiento																																																															
Estructuras	Alcantarillas	und	6																																																													
	Muro de Contención																																																															
Mantenimiento	Alcantarillas																																																															
Otros (Especificar cuales)																																																																
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																												
Pavimentación	Construcción		0																																																													
	Mejoramiento		0																																																													
Estructuras	Alcantarillas		0																																																													
	Muro de Contención		0																																																													
Mantenimiento	Alcantarillas		0																																																													
Otros (Especificar cuales)			0																																																													
AVANCE FINANCIERO																																																																
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 152.418.225,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.542.547,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.336.233,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 201.297.005,00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 152.418.225,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																		
	VALOR																																																															
OBRAS	\$ 152.418.225,00																																																															
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.542.547,00																																																															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.336.233,00																																																															
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 201.297.005,00																																																															
	VALOR	ACUMULADO																																																														
OBRAS	\$ -	\$ -																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																														
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																																
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																													
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																
N/A			N/A																																																													
N/A			N/A																																																													
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																
Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU																																																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																

 <p>CONSORCIO INTERVIALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

PERIODO:

1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

**CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
INTERVENTORÍA DE CONVENIO SOLIDARIO**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	

INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
<p>Claudia Lorena Valencia Calvo.</p>	<p>Directora de Interventoría</p>	

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA</p> <p>Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	7
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	11
2.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	11
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS	14
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS	14
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	17
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	19
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	19
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	20
4.1	INFORME SEMANAL	20
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	20
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO	20
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	20
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	20
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	20
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	21
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	21
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	21
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	22
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	22
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	22
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7.1	LAS TALLAS 4784	25
7.2	EL CRUCERO 4693	26
7.3	ZARZAL 4393	26
7.4	LA CRISTALINA 4671	27
8	ANEXOS	28
8.1	CORRESPONDENCIA	28

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.8

Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.8

Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.9

Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.10

Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.10

Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.11

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	
--	---	--	--	--

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio de Patia, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** por lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	
---	---	--	--	---

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Patía.**

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir, el número del convenio y valor que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CUATRO (4) convenios Solidarios que se suscribieron entre el INVIAS y las juntas de acción comunal del municipio de Patía

CONTRATISTA	CONVENIO No.	VALOR CONVENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS	4784-2023	\$ 201,655,369.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO	4693-2023	\$ 201,214,789.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL	4393-2023	\$ 201,645,093.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	4671-2023	\$ 201,297,005.00

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1 MUNICIPIO DE PATÍA

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Patía, ubicado aproximadamente a 95,6 kilómetros al sur de la capital del departamento del Cauca, Popayán. El municipio se encuentra a una altitud de alrededor de 910 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 28 °C.

Las coordenadas geográficas del municipio de Patía son:

Latitud: 2.114167

Longitud: -76.983056

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
Fecha de realización: Mayo 10 de 2024			



Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.

Específicamente, el proyecto se ejecutará en cuatro veredas: Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina.

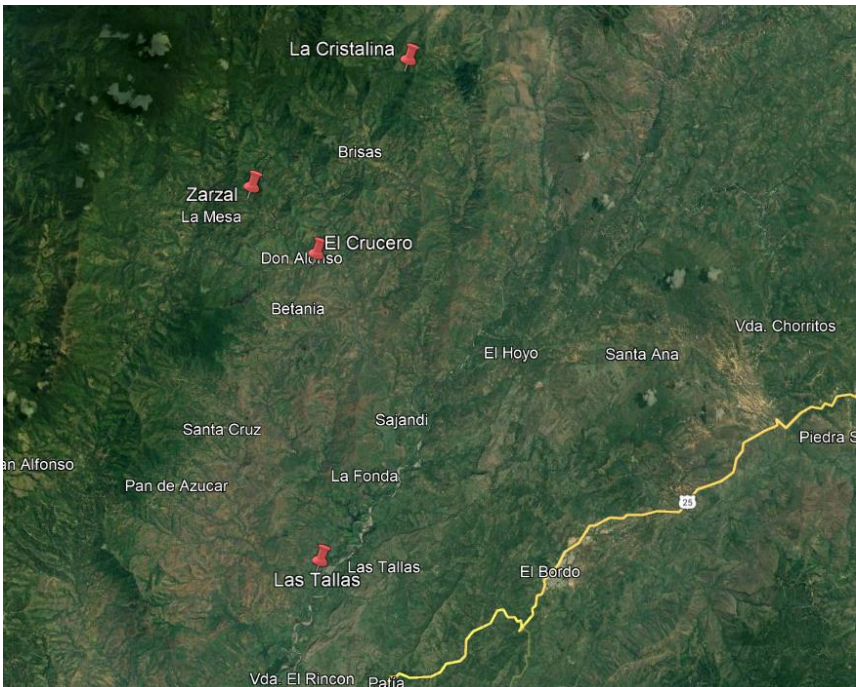


Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023		No. Copias Impresas: 1	
			Versión No.: 001	
	Fecha de realización: Mayo 10 de 2024			

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución de cuatro (4) convenios solidarios que se suscribieron en el municipio de *Patia*, departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”

CONVENIO No.	VEREDA	LONG(m)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	ALCANCE
4784-2023	LAS TALLAS	105	2.1410, -77.0716	2.1116, -77.0807	Construcción de 105 metros lineales de placa huella, y de 2 alcantarillas.
4693-2023	EL CRUCERO	123	2.2578,-77.1057	2.2623,-77.1041	Construcción de 123m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla
4393-2023	EL ZARZAL	137	2.3082, -77.0300	2.2810, -77.0374	Construcción de 137m de placa huella, relleno para 1 alcantarilla.
4671-2023	LA CRISTALINA	0	2.3121, -77.0429	2.2896,-77.0630	Construcción de 6 alcantarillas

Los tramos postulados son:



Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p align="right">Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>		

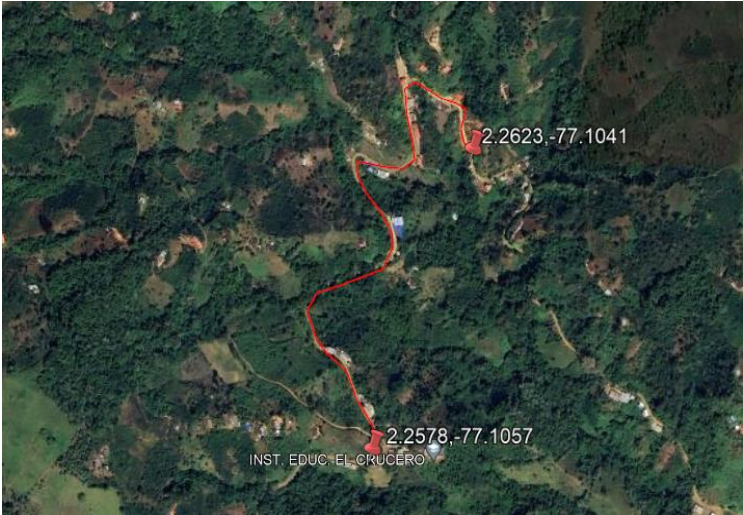


Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.

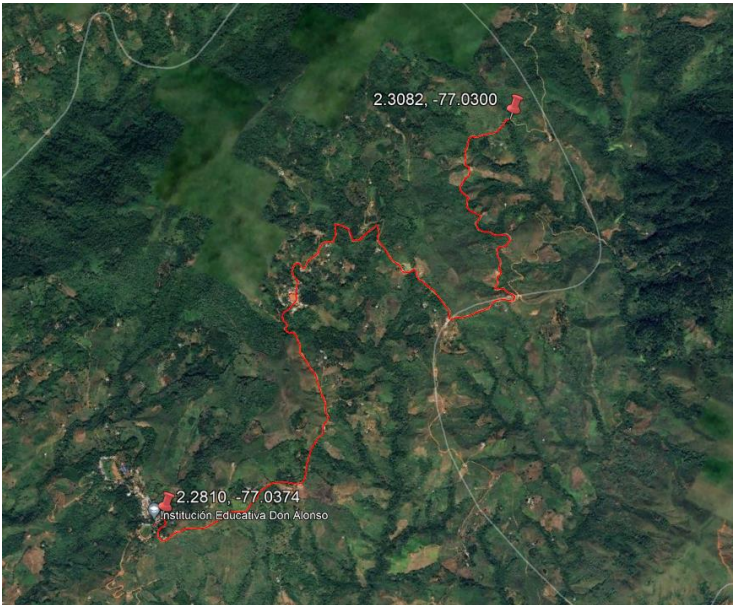


Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

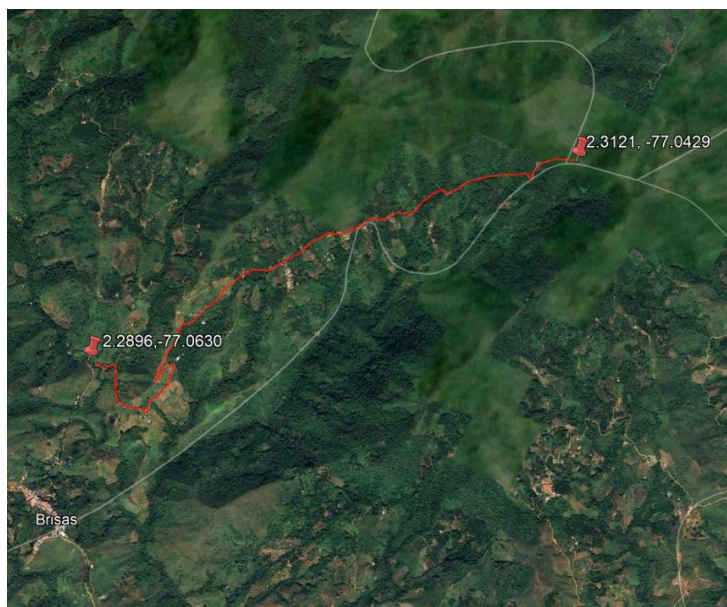


Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En términos generales, las vías identificadas en el proyecto muestran un estado regular. Aunque la superficie de rodadura está revestida con afirmado, se observan baches a lo largo de las mismas. Además, se nota una falta de conformación adecuada en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje. Algunas obras de drenaje existentes se encuentran en estado regular, mientras que otras están taponadas o colmatadas.

Con la firma de convenios con las juntas de acción comunal de las veredas Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina en el departamento del Cauca, el proyecto busca mejorar los corredores viales productivos, garantizando su transitabilidad y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

A continuación, se relacionan las obras que conformaran el proyecto:

2.3.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA</p> <p>Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

2.3.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 LAS TALLAS 4784

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4784-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,655,369.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
Nit	900663876-4
R.L	CRISTIAN DAVID MOSQUERA
CC. R.L	1.059.903.667
Suscripción convenio	1/12/2023
Fecha de Orden de inicio	21 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 al 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de junio de 2024

3.1.2 EL CRUCERO 4693

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4693-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

Valor del convenio	\$ 201,214,789.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
Nit	900251089-6
R.L	DUVEL IVAN RUIZ
CC. R.L	76.175.146
Suscripción convenio	28/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de junio de 2024

3.1.3 ZARZAL 4393

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4393-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,645,093.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
Nit	900661350-3
R.L	ZULDANY MEDINA CAMPO
CC. R.L	1.059.908.061
Suscripción convenio	21/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de junio de 2024

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

3.1.4 LA CRISTALINA 4671

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4671-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	\$ 201,297,005.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Nit	901127925-2
R.L	HUBENER TROCHEZ QUIGUA
CC. R.L	76.236.290
Suscripción convenio	27/11/2023
Fecha de Orden de inicio	16/01/2024
Plazo inicial del convenio	Hasta el 31/12/2023
Fecha de terminación inicial	15 de mayo de 2024

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS**. Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. En particular, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1 LAS TALLAS 4784

- El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial
- El 7 de abril de 2024, tras la revisión del estudio de suelos, se emite la aprobación.
- El 10 de abril de 2024, el contratista entrega el diseño geométrico, el cual es revisado y se emiten observaciones correspondientes
- El 11 de abril se comunica al presidente y al ingeniero residente la importancia de enviar con prontitud el plan de compras.
- El 13 de abril se lleva a cabo la socialización del proyecto en compañía de los representantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) y la comunidad.
- El 16 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1
- Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prórroga No. 2 del convenio
- Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°2 del convenio 4784
- Se realiza la aprobación del diseño geométrico
- No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se está a la espera de la entrega del plan de compras.
- Se aprueba el primer plan de compras.
- Se realiza asesoramiento con la contadora para los documentos que se deben enviar al banco, los cuales han tenido diferentes observaciones.

3.2.2 EL CRUCERO 4693

- El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial
- El 10 de abril, tras solventar las observaciones pertinentes, se ha aprobado el levantamiento topográfico, así como el estudio de suelos

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

- El 13 de abril se lleva a cabo la socialización del proyecto en compañía de los representantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) y la comunidad.
- El 15 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1.
- Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prórroga No. 2 del convenio
- Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°2 del convenio 4693
- No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.
- Se aprueba la hoja de vida del maestro
- A la fecha del presente informe, se están llevando a cabo correcciones del primer plan de compras, junto con las respectivas cotizaciones.

3.2.3 ZARZAL 4393

- El 2 de abril, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero residente para explicarle el proceso y los requisitos del plan de compras.
- El 5 de abril, se lleva a cabo una reunión virtual con el presidente, la contadora y el ingeniero residente. Durante la reunión, se solicita el envío del primer plan de compras, y se hace hincapié a la contadora en la urgencia de remitir los documentos necesarios al banco para iniciar las transferencias lo antes posible
- El 7 de abril, se envían observaciones para el levantamiento topográfico.
- Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prórroga No. 2 del convenio
- El 16 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1
- el 17 de abril se aprueba el levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°2 del convenio 4393
- No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se está a la espera de la entrega del plan de compras.
- Se aprueba el primer plan de compras
- Se realiza asesoramiento con la contadora para los documentos que se deben enviar al banco, los cuales han tenido diferentes observaciones

3.2.4 LA CRISTALINA 4671

- Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra
- Se aprueba el levantamiento topográfico
- Hasta la fecha del presente informe no se cuenta con el desembolso

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

- Se recibe plan de compras con cotizaciones.
- Teniendo en cuenta el modificadorio realizado se le pide al contratista la actualización de pólizas
- No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se está a la espera de la entrega del plan de compras.
- Se aprueba el plan de compras No. 1 sin embargo la JAC no cuenta con el desembolso

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas. Esto se debió a que las juntas de acción comunal, acreedoras de los convenios solidarios asociados al presente contrato de interventoría, se encontraban realizando las gestiones necesarias para los estudios previos y la elaboración de los documentos administrativos requeridos.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de abril de 2024, referentes a los convenios solidarios

Formato: informe semanal

Se remite anexo 1. Los informes semanales del presente periodo.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de maquinaria y equipo.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios se diligenciará el formato de personal, control de aportes legales y seguridad social.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 inf fin y presupuestal obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	

comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

Formato seguimiento garantías convenio.

Se remite anexo 2, el formato correspondiente.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Se realiza la socialización inicial en las veredas de Zarzal y la Cristalina.

Se remite anexo 3. Actas de reunión

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTERVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	5006-2023
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
Valor del contrato	\$ 105,790,989.00
Contratista	CONSORCIO INTERVALES CAUCA
Nit	901.780.463-0
R.L	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Suscripción convenio	16/12/2023
Fecha orden de inicio	21/12/2023
Prorroga No. 1	Hasta 30/04/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Fecha de terminación vigente	30/04/2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe del director, respecto a informes de especialistas aun no se ha requerido.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este período, se utilizaron vehículos para llevar a cabo reuniones, desplazamientos destinados al reconocimiento del tramo y para realizar actividades de socialización

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT
Se remite anexo 4, el formato correspondiente.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se presenta el control de aportes legales y seguridad social.

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.
Se remite anexo 5, el formato correspondiente.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio, la oferta económica adjudicada es:

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	(2)	(3)	(4)	((2)+(3))* (4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	\$ 5,100,000.00		1.00	\$ 5,100,000.00
Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 3,100,000.00		3.00	\$ 9,300,000.00
Profesional Ambiental	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
Profesional Social	\$ 3,000,000.00		0.45	\$ 1,350,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 4,678,598.00
Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Estructuras	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,000,000.00			
Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5,000,000.00			
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	\$ 1,300,000.00		6.00	\$ 7,800,000.00
Inspector SST	\$ 1,300,000.00		3.00	\$ 3,900,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				\$ 33,478,598.00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2.36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				\$ 79,009,491.00

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR
		(\$)		PARCIAL (\$)
		(7)		(7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viáticos Director y/o Especialistas	Día	\$ 80,000.00	10.00	\$ 800,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	\$ 320,000.00	12.00	\$ 3,840,000.00
Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	\$ 1,800,000.00	2.00	\$ 3,600,000.00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	\$ 250,000.00	3.00	\$ 750,000.00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	3.00	\$ 300,000.00
OTROS COSTOS				
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	\$ 100,000.00	2.00	\$ 200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	\$ 50,000.00	3.00	\$ 150,000.00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	\$ 45,000.00	3.00	\$ 135,000.00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	\$ 38,500.00	3.00	\$ 115,500.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				\$ 9,890,500.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 88,899,991.00
IVA = 19% * (C) = (E)				\$ 16,890,998.00
COSTO TOTAL = (C) + (E)				\$ 105,790,989.00

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT
Se remite anexo 6, el formato correspondiente.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Se remite anexo 7, el formato correspondiente.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 LAS TALLAS 4784

Durante el período cubierto por este informe, no se han iniciado las actividades de obra. Sin embargo, se han logrado varios avances importantes:

1. Aprobaciones Realizadas:

- levantamiento topográfico.
- estudio de suelos.
- diseño geométrico.
- Aún se espera la entrega del estudio hidráulico e hidrológico, elementos clave para avanzar en la planificación de la obra.

2. Reconocimiento y Socialización:

- Se llevó a cabo el reconocimiento del tramo, ubicando las abscisas correspondientes.
- Se realizó una socialización inicial, donde se conformó el comité de participación comunitaria.
- Durante esta reunión, se abordaron las inquietudes de la comunidad, se explicó detalladamente el presupuesto del convenio y se discutió el alcance del proyecto.

3. Prórroga del Convenio:

- Se ejecutó la prórroga No. 2 del convenio.

4. Plan de Compras:

- Se aprobó el primer plan de compras, cubriendo todo lo referente a estudios previos, pólizas y dotación para el personal.
- Se espera tener todas las cotizaciones necesarias para continuar con el plan de compras No. 2 en el próximo período.

5. Asesoramiento y Apoyo:

- Se brindó asesoramiento continuo respecto al personal contratado para la elaboración del PAGA, proporcionando la información necesaria.
- Se realizaron múltiples reuniones con la contadora, apoyándola en el proceso de envío de la documentación correcta al banco, verificando cada detalle.

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p align="center">Fecha de realización: Mayo 10 de 2024</p>	

7.2 EL CRUCERO 4693

Durante el mes de abril, no se ha registrado actividad de obra. Sin embargo, se cuenta con todo el personal necesario y se han logrado varios avances importantes:

1. **Aprobaciones Realizadas:**
 - se ha aprobado el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y el diseño geométrico.
 - Aún se espera la entrega del estudio hidráulico e hidrológico
2. **Reconocimiento y Socialización:**
 - Se llevó a cabo el reconocimiento del tramo, ubicando las abscisas correspondientes.
 - En este contexto, se realizó una socialización inicial donde se conformó el comité de participación comunitaria.
 - Durante esta reunión, se abordaron las inquietudes de la comunidad, se proporcionó una explicación detallada sobre el presupuesto del convenio y se discutió el alcance del proyecto.
3. **Plan de Compras:**
 - Se aprobó el primer plan de compras, que incluye la cancelación de todo lo referente a estudios previos, pólizas y dotación para el personal.
 - Se espera obtener todas las cotizaciones necesarias para continuar con el plan de compras No. 2 en el próximo período.
4. **Dificultades y Retrasos:**
 - A pesar de tener el plan de compras aprobado, la contadora requiere las firmas del representante legal de la JAC, cuya comunicación ha sido imposible, lo que retrasa los procesos de desembolsos.
 - La comunicación y programación de reuniones con el personal contratado y el representante de la JAC han sido complicadas debido a la ubicación remota de la vereda y la falta de señal telefónica, lo que ha dificultado los procesos.

7.3 ZARZAL 4393

Durante el período cubierto por este informe en la Vereda Zarzal, las actividades de obra aún no han comenzado. Sin embargo, se han logrado varios avances importantes:

1. **Aprobaciones de Personal y Estudios Previos:**
 - Se ha obtenido la aprobación de las hojas de vida del personal, superando las dificultades iniciales.
 - Se ha completado y aprobado todos los estudios previos necesarios.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

2. Plan de Compras:

- Se ha aprobado el primer plan de compras.
- Se está a la espera del envío de la documentación para remitir al banco.
- Se espera tener todas las cotizaciones necesarias en el próximo período para iniciar con el plan de compras No. 2.

3. Prórroga del Convenio:

- Se ha realizado la prórroga No. 2 del convenio, y se ha brindado apoyo en la gestión de la documentación necesaria.

7.4 LA CRISTALINA 4671

Durante el mes de abril en la Vereda La Cristalina, aún no han comenzado las actividades en el sitio de la obra. Sin embargo, se han logrado algunos avances importantes:

1. Plan de Compras:

- Se ha adelantado y aprobado el plan de compras No. 1.
- No se han podido iniciar las actividades en el sitio de la obra debido a que la JAC no cuenta con el desembolso necesario.

2. Modificación del Convenio:

- Fue aprobado un modificadorio que extiende el plazo del convenio hasta el 15 de mayo, 4 meses a partir de la orden de inicio
- Esta modificación se debió a problemas que la junta de acción comunal enfrentó para obtener y pagar la póliza, ya que no contaban con los recursos económicos necesarios.

3. Dificultades en la Comunicación:

- La comunicación con el representante legal de la JAC ha sido difícil debido a la ubicación remota del tramo y las frecuentes fallas eléctricas.

4. Estado del Convenio:

- Hasta la fecha de este informe, el convenio no cuenta con los recursos en la cuenta necesarios para iniciar las actividades.

<p align="center">CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p align="center">EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Mayo 10 de 2024

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 TALLAS 4784

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-4784-003-2024	Aprobación estudio de suelos	7/04/2024
CIVC-5006-4784-004-2024	observaciones diseño geométrico	10/04/2024
CIVC-5006-003-2024	aval prorroga No. 2	17/04/2024

8.1.2 CRUCERO 4693

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-4693-003-2024	aprobación levantamiento topográfico y estudio de suelos	10/04/2024
CIVC-5006-004-2024	aval prorroga No. 2	17/04/2024
CIVC-5006-4693-004-2024	aprobación hv maestro	28/04/2024

8.1.3 ZARZAL 4393

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-4393-003-2024	observaciones levantamiento topográfico	7/04/2024
CIVC-5006-4393-004-2024	aprobación levantamiento topográfico y estudio de suelos	17/04/2024
CIVC-5006-002-2024	aval prorroga No. 2	17/04/2024

8.1.4 CRISTALINA 4671

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-4671-002-2024	Aprobación del levantamiento topográfico	13/04/2024

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 CONSORCIO INTEVALES CAUCA Carrera 3 No. 11ª-11, Popayán. TELF. 311 3645440	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006 DE 2023	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2024	

Anexo 0. Formato informe general estado del proyecto

Anexo 1. Informe semanal

Anexo 2. Seguimiento garantías convenio

Anexo 3. Actas de reunión

Anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT

Anexo 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

Anexo 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

Anexo 7. Seguimiento garantías interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

<p>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ</p>	<p>EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

15/04/2024

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

16

del

5/04/2024

al

11/04/2024

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE Vías.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

CRISTIAN DAVID MOSQUERA

4784-2023

21/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA No. 1

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

5006-2023

21/12/2023

31/12/2023

30/04/2024

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

\$

201,655,369.00

\$

-

\$

201,655,369.00

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

\$

105,790,989.00

\$

-

\$

105,790,989.00

VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,655,369			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORÍA

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	105
* Alcantarillas	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	105.00			105.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	2.00			2.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado:Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

la JAC está elaborando el documento.

OBSERVACIONES:

El día 4 de abril se envía comunicado con la información pertinente para la entrega del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizan las fichas del plan de gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones.

*El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas.

*El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro.

*El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado.

*Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

*El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 7 de abril de 2024, tras la revisión del estudio de suelos, se emite la aprobación.

*El 10 de abril de 2024, el contratista entrega el diseño geométrico, el cual es revisado y se emiten observaciones correspondientes

*El 11 de abril, se comunica al presidente e ingeniero residente la importancia de enviar prontamente el plan de compras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA:

Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emite conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RMAAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contrata, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: la JAC está elaborando el documento.

OBSERVACIONES:El día 4 de abril se envia comunicado con la información pertinente para la entrega del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizo diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Crucero.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

*El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para pagar a la JAC.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizo diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente,solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 27 de marzo se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

*El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 10 de abril, tras solventar las observaciones pertinentes, se ha aprobado el levantamiento topográfico, así como el estudio de suelos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matricula Profesional No.: 19202-278490 CAJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

la JAC está elaborando el documento.

OBSERVACIONES:El día 4 de abril se envía comunicado con la información pertinente para la entrega del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realizan las fichas del plan de gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.

*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.

*El 2 de marzo, se envía comunica pidiendo a la JAC el envío de las hojas de vida del personal que estará en la obra.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El 22 de marzo se realiza reunion virtual con ingeniero residente,solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

*El día 30 de marzo, se realiza reconocimiento del tramo.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

*El 2 de abril, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero residente para explicarle el proceso y los requisitos del plan de compras.

ACTIVIDADE SREALIZADAS EN LA SEMANA

*El 5 de abril, se lleva a cabo una reunión virtual con el presidente, la contadora y el ingeniero residente. Durante la reunión, se solicita el envío del primer plan de compras, y se hace hincapié a la contadora en la urgencia de remitir los documentos necesarios al banco para iniciar las transferencias lo antes posible

*El 7 de abril, se envían observaciones para el levantamiento topográfico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar validez a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.:

19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL										
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: N/A		DISPONIBLE			ZONAS DE DEPOSITO		SI	NO	N/A	X
		PERMISO MINERO: SI			LICENCIA AMBIENTAL:		SI	NO	N/A	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI			APROVECHAMIENTO FORESTAL:		SI	NO	N/A	X
UBICACIÓN: N/A		PERMISO MINERO: SI			CONCESIÓN DE AGUAS:		SI	NO	N/A	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI			OCUPACIÓN DE CAUCES:		SI	NO	N/A	X
					VERTIENTOS:		SI	NO	N/A	X
					EMISIONES:		SI	NO	N/A	X
					OTROS (Especificar cual)		SI	NO	N/A	X
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)										
ESTADO: la JAC está elaborando el documento.					OBSERVACIONES:El día 4 de abril se envía comunicado con la información pertinente para la entrega del PAGA.					
V. GESTIÓN SOCIAL										
		OBRA	INTER	OBSERVACIONES:Se realizan las fichas del plan de gestión social.						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			4	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		4								
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS										
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS										
*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.										
*El día 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.										
*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT										
*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.										
*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.										
*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.										
*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.										
*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.										
*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.										
*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento										
*A la fecha del Informe No. 9 ,el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificatorio para poder realizar la prórroga.										
*Hasta la fecha del presente informe, las actividades en el sitio de obra aún no han comenzado debido a la falta de recursos en la cuenta de la junta.										
*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico										
*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.										
*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial										
*El día 27 de marzo, se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico										
*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.										
*El día 30 de marzo se realiza reconocimiento del tramo.										
*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra										
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA										
*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones										
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS										
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio										
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO										
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.										
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual					<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU</div>					
*Emitir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.										
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.										
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.										

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
				<u>DISPONIBLE</u>					
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:			SI	---	NO	---	N/A	X
-----	LICENCIA AMBIENTAL:			SI	---	NO	---	N/A	X
-----				SI	---	NO	---	N/A	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:			SI	---	NO	---	N/A	X
-----	LICENCIA AMBIENTAL:			SI	---	NO	---	N/A	X
-----				SI	---	NO	---	N/A	X
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Se apoya enviando la información necesaria del contratista.
ESTADO:	la JAC está elaborando el documento. *El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA	

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1

OBSERVACIONES:
 Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.
 Se realiza socialización inicial en compañía de los representantes de la JAC y comunidad.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693 *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 19 de enero del 2024 se realizó una reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio. *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños. *El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT *El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Crucero. *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar. *El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas. *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes. *El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 29 de febrero se realiza estudio de suelos. *El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para apoyar a la JAC. *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría. *El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento *El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro. *El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se está a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente. *El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras. *El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000. *El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes. *El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial *El 10 de abril, tras solventar las observaciones pertinentes, se ha aprobado el levantamiento topográfico, así como el estudio de suelos		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*El 13 de abril se realiza la socialización del proyecto *El 15 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1. *Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prorroga No. 2 del convenio		

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El esquema gráfico será definido por el loteanteur de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del consorcio.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
FIRMA _____	
NOMBRE: _____	CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Matrícula Profesional No.: _____	19202-278490 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

23/04/2024

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

14

del

12/04/2024

al

18/04/2024

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL. (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patia -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

REPRESENTANTE LEGAL: HUBENER TROCHEZ QUIGUA

CONVENIO No. 4671-2023

FECHA DE INICIO: 16/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/05/2024

Modificadorio No. 1 16/01/2024-15/05/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONTRATO No. 5006-2023

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR INICIAL: \$ 201,297,005.00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 201,297,005.00

VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00

VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,297,005			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,297,005			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,297,005.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe, no se ha dado inicio a las actividades en el sitio de la obra, debido a la falta de desembolsos por parte del INVIAS.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Alcantarillas	UND	6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6.00			6.00	100.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
				0.00	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 6 alcantarillas

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

la JAC está elaborando el documento.

ESTADO: *El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA

OBSERVACIONES: Se apoya enviando la información necesaria del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*A través del radicado No. 2024S-VBOG-001531 se ha emitido la orden de inicio el día 16 de enero de 2024 para el convenio. No obstante, actualmente estamos en proceso de tramitación para la prórroga del mismo.

*El 19 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de INVIAS, donde se discutió el tema de la prórroga con el apoyo jurídico. Durante la reunión, se informó que el proceso de prórroga se encuentra en trámite.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT.

*El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC La Cristalina.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 16 de febrero se aprobó cotización para realizar levantamiento topográfico.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo de 2024, se aprueba la cotización para realizar estudio hidráulico e hidrológico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

*A la fecha del Informe No. 9, el contrato se encuentra a la espera de la aprobación de un modificatorio para poder realizar la prórroga.

*Hasta la fecha del presente informe, las actividades en el sitio de obra aún no han comenzado debido a la falta de recursos en la cuenta de la junta.

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

*El día 27 de marzo, se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

*El día 30 de marzo se realiza reconocimiento del tramo.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se aprueba el levantamiento topográfico

*Hasta la fecha del presente informe no se cuenta con el desembolso

*Se recibe plan de compras con cotizaciones.

*Teniendo en cuenta el modificatorio realizado se le pide al contratista la actualización de pólizas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES				IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
		<u>DISPONIBLE</u>		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
_____				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
_____				VERTIENTES:	SI	NO	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Se apoya enviando la información necesaria del contratista.
la JAC está elaborando el documento.		
ESTADO:	*El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA *El 23 de abril, se emite la segunda solicitud del documento PAGA	

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPL, de la prorroga N°1 del convenio 4784 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784 *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 19 de enero del 2024 se realizó una reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio. *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños. *Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello. *El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT *El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas. *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar. *El 16 de febrero de 2024 se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad adyacente para realizar una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños. *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes. *El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones. *El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador. *El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría. *El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico *El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento *El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas. *El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro. *El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado. *Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente. *El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras. *El día 23 de marzo se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000. *El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes. *El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial *El 7 de abril de 2024, tras la revisión del estudio de suelos, se emite la aprobación. *El 10 de abril de 2024, el contratista entrega el diseño geométrico, el cual es revisado y se emiten observaciones correspondientes *El 11 de abril, se comunica al presidente e ingeniero residente la importancia de enviar prontamente el plan de compras. *El 13 de abril se realiza la socialización del proyecto *El 16 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1 *Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prorroga No. 2 del convenio			

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
 *Diligenciamiento y firma del Formato MEPL de la prorroga N°2 del convenio 4784
 *Se realiza la aprobación del diseño geométrico
 *No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.

<p align="center">VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</p>	
<p>*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones</p>	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
<p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</p>	

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES *Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA  FIRMA _____ NOMBRE: _____ CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Matrícula Profesional No.: _____ 19202-278490 CAU

FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	_____	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____
	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____
UBICACIÓN:	_____	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____
	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____
OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

la JAC está elaborando el documento.

ESTADO:

*El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA

*El 23 de abril, se emite la segunda solicitud del documento PAGA

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.




ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS


- *Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°1 del convenio 4693
- *Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°1 del convenio 4693
- *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- *El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórrogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.
- *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.
- *El día 7 de febrero del 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT
- *El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Cruzero.
- *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.
- *El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.
- *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.
- *El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.
- *El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos
- *El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para apoyar a la JAC.
- *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.
- *El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento
- *El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.
- *El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro
- *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.
- *El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.
- *El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico
- *El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.
- *El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.
- *El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial
- *El 10 de abril, tras solventar las observaciones pertinentes, se ha aprobado el levantamiento topográfico, así como el estudio de suelos
- *El 13 de abril se realiza la socialización del proyecto
- *El 15 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1.
- *Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prórroga No. 2 del convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- *Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°2 del convenio 4693
- *No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
 <p>N/A</p>	 <p>N/A</p>	 <p>N/A</p>

<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p align="center">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</p> <p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual *Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div> <div style="margin-top: 20px;"> FIRMA _____ NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU </div>
---	--

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>	<div>29/04/2024 (Día / Mes / Año)</div> <div>1 DE 2</div>																																																
<div>FECHA</div>																																																			
<div>L INFORMACIÓN GENERAL</div>																																																			
<div>PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</div>																																																			
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 15 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)</div>																																																			
<div>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A</div>																																																			
<div>OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>																																																			
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):</div>																																																			
<div>Construcción de 6 alcantarillas</div>																																																			
<div>DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO</div>																																																			
<div>En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patía -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.</div>																																																			
<div>CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div>																																																			
<div>CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLES CAUCA</div>																																																			
<div>REPRESENTANTE LEGAL: HUBENER TROCHEZ QUIGUA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA</div>																																																			
<div>CONVENIO No. 4671-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,297,005.00 CONTRATO No. 5006-2023 VALOR INICIAL: \$ 105,790,989.00</div>																																																			
<div>FECHA DE INICIO: 16/01/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</div>																																																			
<div>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,297,005.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 105,790,989.00</div>																																																			
<div>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/05/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -</div>																																																			
<div>Modificadorio No. 1 16/01/2024-15/05/2024 PRORROGA No. 1 01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses) VALOR AMORTIZADO: \$ -</div>																																																			
<div>SALDO POR AMORTIZAR: \$ -</div>																																																			
<div>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</div>																																																			
<div>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</div>																																																			
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 201,297,005</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 201,297,005</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 105,790,989</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 105,790,989</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,297,005				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,297,005				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989													
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																														
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,297,005																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,297,005																																																	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989																																																	
<div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div>																																																			
<div>CONVENIO INTERVENTORIA</div>																																																			
<div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,297,005.00</div>																																																			
<div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div>																																																			
<div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div>																																																			
<div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>Observaciones: Hasta la fecha del presente informe, no se ha dado inicio a las las actividades en el sitio de la obra, debido a la falta de desembolsos por parte del INVIAS.</div>																																																			
<div>INTERVENTORIA</div>																																																			
<div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div>																																																			
<div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div>																																																			
<div>RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div>																																																			
<div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div>																																																			
<div>PERIODO FACTURADO: N/A</div>																																																			
<div>VALOR FACTURA: \$ -</div>																																																			
<div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div>																																																			
<div>Observaciones: N/A</div>																																																			
<div>III. AVANCE FÍSICO</div>																																																			
<div>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</div>																																																			
<div>Meta Física Ejecutada % 0.00%</div>																																																			
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div>																																																			
<table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>6</td></tr></table>				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Alcantarillas	UND	6																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																	
Alcantarillas	UND	6																																																	
<div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div>																																																			
<table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>6.00</td><td></td><td></td><td>6.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	6.00			6.00	100.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%					0.00						0.00																			
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																														
Prog	6.00			6.00	100.0%																																														
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																														
				0.00																																															
				0.00																																															
<div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div>																																																			
<div>TRAMO Y/O SECTOR 1: programado:Construcción de 6 alcantarillas</div>																																																			
<div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div>																																																			
<div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>																																																			
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div>																																																			
<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>				Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motorveladora			Total																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																	
Salitrín																																																			
Mezcladora de concreto																																																			
Vibrocompactador																																																			
Retroexcavadora sobre llantas																																																			
vibrador de concreto																																																			
Motorveladora																																																			
Total																																																			
<div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>																																																			

FUENTES DE MATERIALES		
UBICACIÓN:	DISPONIBLE	
	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
OBSERVACIONES:		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO N/A
Ocupación de CAUCES:	SI	NO N/A
VERTIENTOS:	SI	NO N/A
EMISIONES:	SI	NO N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO N/A
OBSERVACIONES:		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
la JAC está elaborando el documento.		
ESTADO:	*El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA *El 23 de abril, se emite la segunda solicitud del documento PAGA *El 30 de abril, se envían observaciones del documento PAGA	
OBSERVACIONES:		

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLOS DIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	4	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
OBSERVACIONES: Se realiza socialización inicial en compañía de los representantes de la JAC y comunidad.		

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4784 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4784 *Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prórogas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio. *Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños. *Se llevó a cabo una conversación telefónica y asesoría con el presidente de la junta respecto al personal a contratar y los requisitos necesarios para ello. *El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT *El 12 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVias con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC Las Tallas. *El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar. *El 16 de febrero se llevó a cabo una visita de reconocimiento en el tramo en compañía de la comunidad, además se realizó una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) para explicarles el paso a seguir en relación con los estudios y diseños. *El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVias Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes. *El 20 de febrero se llevó a cabo una llamada telefónica con el representante legal de la JAC, donde se le brindó asesoramiento sobre la necesidad de actualizar las pólizas, considerando la prórroga del convenio. Durante la llamada, se explicó el proceso para realizar el pago de estas actualizaciones. *El 22 de febrero se aprueba hoja de vida del ingeniero residente, se envían observaciones para la hoja de vida del contador. *El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos. *El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos *El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVias y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría. *El 7 marzo de 2024, se aprueba cotización para realizar diseño geométrico y estudio hidráulico e hidrológico *El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento *El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero hidráulico, durante la cual presentó que el tramo carece de pendientes y expuso algunas soluciones para la evacuación de las aguas. *El 14 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contador y maestro. *El día 20 de marzo el contratista envía el levantamiento topográfico, para el cual se emiten algunas observaciones para poder ser aprobado. *Se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de esclarecer los pasos a seguir para iniciar la ejecución en el sitio de la obra, donde se enfatizó la importancia de contar con estudios previos completos y un equipo de trabajo *El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente. *El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras. *El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico *El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000. *El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes. *El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial *El 7 de abril de 2024, tras la revisión del estudio de suelos, se emite la aprobación. *El 10 de abril de 2024, el contratista entrega el diseño geométrico, el cual es revisado y se emiten observaciones correspondientes *El 11 de abril, se comunica al presidente e ingeniero residente la importancia de enviar prontamente el plan de compras. *El 13 de abril se realiza la socialización del proyecto *El 16 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1 *Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prorroga No. 2 del convenio *Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°2 del convenio 4784 *Se realiza la aprobación del diseño geométrico *No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		FIRMA NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVias.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FUENTES DE MATERIALES		<u>DISPONIBLE</u>	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		

UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		

OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Se apoya enviando la información necesaria del contratista.
la JAC está elaborando el documento.		
ESTADO:	*El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA *El 23 de abril, se emite la segunda solicitud del documento PAGA *El 30 de abril, se emite tercera solicitud del documento PAGA	

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Se realiza socialización inicial en compañía de los representantes de la JAC y comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4693

*"Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4693

"Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

"El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

"Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

"El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

"El día 7 de febrero de 2024, se realizó una reunión en el INVIAS con el apoyo jurídico, durante la cual se expresó la dificultad en la comunicación con el representante legal de la JAC El Cruceiro.

"El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

"El 16 de febrero se realizó una visita de reconocimiento en el tramo compañía de la comunidad y además se brindó asesoría al presidente respecto a algunas inquietudes presentadas.

"El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

"El 22 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

"El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos

"El día 2 de marzo de 2024, el presidente de la JAC expresa la dificultad para conseguir personal de trabajo debido a lo retirado que queda el tramo, por lo que se empieza en la búsqueda para pagar a la JAC.

"El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

"El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envío de la matriz de seguimiento

"El 9 de marzo, se aprueba la hoja de vida del contratador, la JAC manifiesta que hasta el presente informe no ha sido posible conseguir ingeniero residente y maestro.

"El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

"El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

"El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

"El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

"El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico

"El 28 de marzo, se comunica a las contratadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

"El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contratadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

"El 3 de abril se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

"El 10 de abril, tras solventar las observaciones pertinentes, se ha aprobado el levantamiento topográfico, así como el estudio de suelos

"El 13 de abril se realiza la socialización del proyecto

"El 15 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1.

"Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prorroga No. 2 del convenio

*"Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°2 del convenio 4693

"No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se aprueba la hoja de vida del maestro

"A la fecha del presente informe, se están llevando a cabo correcciones del primer plan de compras, junto con las respectivas cotizaciones.

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS

<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</p>	<p>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</p>						
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<div data-bbox="1172 2001 1279 2068" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="857 2068 1518 2111"> <table> <tr> <td>FIRMA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO</td> </tr> <tr> <td>Matrícula Profesional No.:</td> <td>19202-278490 CAU</td> </tr> </table> </div>	FIRMA	_____	NOMBRE:	CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO	Matrícula Profesional No.:	19202-278490 CAU
FIRMA	_____						
NOMBRE:	CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO						
Matrícula Profesional No.:	19202-278490 CAU						

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO N/A X

VERTIMIENTOS:

SI NO N/A X

EMISIONES:

SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

la JAC está elaborando el documento.

ESTADO:

*El día 16 de abril se emite la primera solicitud del documento PAGA

*El 23 de abril, se emite la segunda solicitud del documento PAGA

*El 29 de abril, se emiten observaciones al documento PAGA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°1 del convenio 4393

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°1 del convenio 4393

*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones para la realización del levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El día 19 de enero del 2024 se realizó reunión en las instalaciones de INVIAS para tratar los temas relacionados al estado actual del convenio, estados de las prorrugas y contratos suspendidos y lineamientos para el reinicio.

*Se realizó revisión de las cotizaciones presentadas por parte de la JAC para realizar los estudios y diseños.

*El día 7 de febrero de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico CCPT

*El 14 de febrero se aprobó la hoja de vida del contador. Se reitera la solicitud de envío de las hojas de vida del maestro e ingeniero residente, así como de los requisitos correspondientes.

*El 15 de febrero se aprobó la cotización para realizar levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*El 15 de febrero de 2024, se envió el anexo técnico del convenio junto con los requisitos para el personal que se debe contratar.

*El 19 de febrero de 2024 se asistió a una reunión en las instalaciones del INVIAS Territorial Cauca con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de actividades de los diferentes componentes, incluyendo el técnico (geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, diseño geométrico de PH, etc.), el social, el administrativo y otros aspectos pertinentes.

*El día 28 de febrero se realiza estudio de suelos.

*El 2 de marzo, se envía comunica pidiendo a la JAC el envió de las hojas de vida del personal que estará en la obra.

*El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Bordo, en la cual estuvieron presentes el presidente, la abogada del INVIAS y los ingenieros de apoyo, con el propósito de abordar y resolver el problema relacionado con la falta de comunicación de la JAC con la interventoría.

*El 7 de marzo se aprueba cotización para realizar el diseño geométrico.

*El 8 de marzo, se realiza diligenciamiento y envió de la matriz de seguimiento

*El 12 de marzo, la presidenta expuso la dificultad de conseguir personal, como por ejemplo maestros, debido a la lejanía del tramo, por lo que se encuentran en la búsqueda.

*El 19 de marzo se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se esta a la espera de conseguir el profesional que desempeñará el cargo de maestro

*El día 20 de marzo de 2024 se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico

*El 21 de marzo, se envía información sobre la solicitud de elaboración de valla, junto con el formato de valla correspondiente.

*El 22 de marzo se realiza reunión virtual con ingeniero residente, solicitando la actualización del presupuesto y la presentación del primer plan de compras.

*El día 23 de marzo se envía pieza comunicativa para la socialización inicial

*El día 27 de marzo se realizó diligenciamiento y envió de matriz de seguimiento técnico

*El 28 de marzo, se comunica a las contadoras la necesidad de enviar documento para solicitar la exoneración del impuesto del 4x1000.

*El día 30 de marzo, se realiza reconocimiento del tramo.

*El 30 de marzo, se emite un comunicado a los contadores solicitando el envío de los rendimientos financieros de las cuentas pertinentes.

*El 2 de abril, se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero residente para explicarle el proceso y los requisitos del plan de compras.

*El 5 de abril, se lleva a cabo una reunión virtual con el presidente, la contadora y el ingeniero residente. Durante la reunión, se solicita el envío del primer plan de compras, y se hace hincapié a la contadora en la urgencia de remitir los documentos necesarios al banco para iniciar las transferencias lo antes posible

*El 7 de abril, se envían observaciones para el levantamiento topográfico.

*Se envía la aprobación por parte de interventoría para la prorroga No. 2 del convenio

*El 16 de abril se realiza el primer comité en el que se envían observaciones del plan de compras No. 1

*el 17 de abril se aprueba el levantamiento topográfico y estudio de suelos.

*Diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°2 del convenio 4393

*No se han iniciado actividades en el sitio de la obra, se esta a la espera de la entrega del plan de compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se aprueba el primer plan de compras

*Se realiza asesoramiento con la contadora para los documentos que se deben enviar al banco, los cuales han tenido diferentes observaciones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Actualización de presupuesto teniendo en cuenta las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA

6/05/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

16

del

26/04/2024

al

2/05/2024

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patia -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVALLES CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL:

HUBENER TROCHEZ QUIGUA

REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

CONVENIO No.

4671-2023

VALOR INICIAL:

\$

201.297,005.00

CONTRATO No.

5006-2023

VALOR INICIAL:

\$

105.790.989.00

FECHA DE INICIO:

16/01/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

201.297,005.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

105.790.989.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

15/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/06/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

Modificadorio No. 1

16/01/2024-15/05/2024

PRORROGA No. 1

01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

PRORROGA No. 2

01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,297,005			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,297,005			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 105,790,989			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 105,790,989			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORÍA

Observaciones: Hasta la fecha del presente informe, no se ha dado inicio a las las actividades en el sitio de la obra, debido a la falta de desembolsos por parte del INVIAS.

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

programado:Construcción de 6 alcantarillas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			
			FECHA	10	5	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		
CONVENIO No.		4784-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		
OBJETO DEL CONTRATO:						
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
FECHA DE INICIO:		21/12/2023				
PLAZO INICIAL:		31/12/2023				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:		\$ 201,655,369.00				
VALOR ACUMULADO:		\$ 201,655,369.00 (Incluye adiciones)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO						
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		
Cumplimiento			20%	\$ 40,311,074.00		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N.R			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	\$ 10,082,768.00		
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%	\$ 60,496,611.00		
VIGENCIA						
			Desde		Hasta	
			1	12	2023	
			Día	Mes	Año	
			1	12	2023	
			31	12	2023	
			31	12	2026	
			31	12	2028	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)						
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023						
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO						
Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			200 SMMLV	\$ 232,000,000.00		
Otros			N.R			
VIGENCIA						
			Desde		Hasta	
			1	12	2023	
			Día	Mes	Año	
			31	12	2023	
			Día	Mes	Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583						
OTRAS PÓLIZAS No.						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)						
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A						
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,311,074.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,768.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,496,611.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	12	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30/04/2027		
30	4	2024	30/04/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583

OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/04/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																									
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																									
			FECHA	10	5	2024																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																										
CONVENIO No. 4493-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL																																																										
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,645,093.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,645,093.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,329,020.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,082,255.00</td><td>21</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,493,530.00</td><td>21</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,329,020.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,082,255.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,493,530.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30/04/2027		
30	4	2024	30/04/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493

OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	10	5	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4693-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 22/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201,214,789.00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201,214,789.00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,242,958.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,060,739.50</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,364,437.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	20%	\$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>28</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023																																																			
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Cumplimiento		20%		\$ 40,242,958.00		Desde			Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.R				30	12	2023	2/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%		\$ 10,060,739.50		Día	Mes	Año	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		30%		\$ 60,364,437.00		30	12	2023	30/04/2027
						30	4	2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Seguro		% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV		\$ 260,000,000.00		Desde			Hasta
Otros		N.R				28	11	2023	30 4 2024
						Día	Mes	Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

	FECHA	10 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: NO TIENE ORDEN DE INICIO
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 201,297,005.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201,297,005.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40,259,402.00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		27	11	2023	31/10/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,064,850.00	Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,389,103.00	27	11	2023	31	12	2026
			21	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000.00	Desde			Hasta		
Otros	N.R		24	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40,259,402.00	16	1	204	16/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,064,850.00	16	1	2024	16/05/2027		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,389,103.00	16	5	2024	16/05/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	27	11	2023	16	5	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma _____
 Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
 Director de interventoría
 Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

13/04/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4693-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA VEREDA EL CRUCERO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socializar el convenio Solidario 4693-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión de socialización en la Vereda el Crucero de la Vereda Crucero del municipio de Patia, donde se inicia el encuentro dando la bienvenida a los asistentes. Seguido de la presentación de las personas que hacen parte del Personal de Interventoría; mediante una presentación se da a conocer a la comunidad los temas referentes al Proyecto a ejecutar, como las metas físicas, Aspectos del Área técnica, Presupuesto, Aspectos Jurídicos, Sociambientales, tratando de brindar de forma clara una información de interés para la comunidad.

Se resalta la importancia de la contratación de la mano de obra y todos los requisitos a tener en cuenta, ya que se solicita certificación al Personal para garantizar mano de obra calificada, enfatizando que se pretende tener en cuenta a las personas calificadas que se encuentran en la comunidad, así mismo como contratar a mujeres o personas con necesidades especiales, que puedan desarrollar



Actividades. en la obra, Se aclara información acerca de como se van a realizar los pago y como se hara el proceso para que estos pagos se hagan directamente a terceros. resaltando a la comunidad que los proveedores persona a quienes se le hagan los pagos deberán contar con todos los requisitos que solicita el invias y la entidad bancaria.

Durante la reunion se da a conocer a la comunidad la importancia de la conformación del Comité de Participación comunitaria, se da explicacion de l Porque se conforma comité y no veedura ciudadana. Luego de ello se procede con la conformación del comité de manera democratica, eligiendo a las personas que lo conformaran, quedando conformado el comité de la siguiente manera.

- ✓ Saul Hernández C.C. 10697113
- ✓ Didier Hoyos C.C. 10695712.
- ✓ Adielia Gomez. C.C. 25606655.

Se da un espacio para la respuesta a inquietudes presentadas por la comunidad.

Se menciona que se hara la instalación del Punto de atención al ciudadano, a través de un buzón de sugerencias.

Se finaliza el encuentro agradeciendo a los presentes por la asistencia y atención prestada.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/04/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Duvel Ivan Ruiz	Plc	I.A.C. EL CRUCERO	Duvel Ivan Ruiz
Leidy Grajales			Leidy Grajales
Paola Ruiz			Paola Ruiz
Yaneth Garces			Yaneth Garces
Alejandra Espinosa			Alejandra Espinosa
Daniela Reyes			Daniela Reyes
Juan Carlos M.			Juan Carlos M.
Maicol Lopez			Maicol Lopez
Aldair Meneses			Aldair Meneses
Wilian Meneses			Wilian Meneses
Johan Hoyos			Johan Hoyos
Ivey Meneses		I.A.C. EL CRUCERO	Ivey Meneses
Walter Melendez		J.A.C. EL CRUCERO	Walter Melendez
Fernando Gomez			Fernando Gomez
Tito Montenegro			Tito Montenegro



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

Dadoson Nobortkts.

Dadoson N 2

FECHA

13/04/2014
(Día / Mes / Año)

Fabian Rengifo

Fabian Rengifo

Fernando solarie

Haider Solano

Haider Solano

Luis angel

Luis angel

Geison Gomez

Geison Gomez

Luis navia

Luis navia

Nilson Gomez

~~Nilson Gomez~~

Nelburtio Munoz

~~Nelburtio Munoz~~

Sael Hernandez

Sael Hernandez

Milena Muñoz

Milena Muñoz

Adiela gomez

Adiela gomez

Joscejary solarie

~~Joscejary solarie~~

Delmer Rengifo

Delmer Rengifo

Javier Cerón

Javier Cerón

Imer Muñoz

Imer Muñoz

Andrea Yasmín. Apoyo Social interu.

interventoria

Andrea Yasmín.F.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/04/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4784-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA VEREDA LAS TALLAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socializar el convenio Solidario 4784-2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión de socialización en la Vereda las Tallas del municipio de Patia, dando inicio con la Presentación del Personal de interventoría, quienes mediante una Presentación dan a conocer a la comunidad la información correspondiente al Proyecto, como son las metas físicas, los Aspectos técnicos a tener en cuenta para la obra ejecutar, los aspectos jurídicos, la distribución del Presupuesto, los aspectos sociambientales y lo referente a la contratación de la mano de obra; se brinda una información clara acerca de cada uno de los temas mencionados. Se hace total énfasis que la distribución del presupuesto se hará con ya está establecido, que la J.A.C no hará manejo de dineros ya que los pagos se harán directamente a terceros, como a los proveedores y demás entidades que se requieran, se resalta importancia en lo referente a la contratación de la mano de obra, que esta debe contar con todos los requisitos solicitados ya que de esta manera se puede garantizar una mano de obra calificada, que de igual manera se



FECHA

13/04/2024

(Día / Mes / Año)

debe tener en cuenta para estos procesos la vinculación de mujeres y población vulnerables, ya que el programa así lo requiere, teniendo un enfoque de inclusión social.

La comunidad manifiesta su preocupación en referencia al cierre de vía, ya que es la única con la que cuentan, a su mismo muestran su preocupación con la obra de una de las alcantarillas, para lo cual el residente de obra muestra todas las opciones posibles a tener en consideración para la diligencia de estas situaciones.

Se menciona la importancia de la conformación de un comité de participación comunitaria, se explica porque la conformación del comité y no veeduría ciudadana, mostrando las funciones del comité y el papel que cumple dentro de la ejecución del proyecto y la toma de decisiones, luego de ello se procede a conformar el comité, eligiendo a las personas de manera democrática, quedando conformado el comité de la siguiente forma.

- * Rodelfi Gonzalez. c.c. 86054745.
- * Abraham Alegria. c.c. 10440134
- * Delfi Castillo. c.c. 1059915898.

Se manifiesta a la comunidad que se instalara un punto de atención al ciudadano a través de un buzón de sugerencias. Se finaliza el encuentro, agradeciendo por la asistencia y la atención prestada.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/04/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Christian David Mosquera	Presidente	Junta	Christian David Mosquera
Rodolfo G. halo.			Rodolfo G.
Wili marcas tillo			Wili marcas tillo
Idex Becerra			Idex Becerra
Juan Carlos Castillo			Juan Carlos Castillo
Alvaro Heredia			Alvaro Heredia
Heydi Reyes secretaria		Junta.	Heydi Reyes
Deisy Elizac			Deisy Elizac
Monicela González C			Monicela González C
Fuervial Góngora			Fuervial Góngora
Abraham Alegría			Abraham Alegría
Paola Vargax			Paola Vargax
Elizac Lora y no Jo A			Elizac Lora y no Jo A
Andrea Yasmín M.F. Apoyo Social		Interventoria	Andrea Yasmín M.F.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA30/04/2024(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL/2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023

CONVENIO No. 4693-2023
4671-2023
4993-2023
4784-2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVALES CAUCA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Motocicleta RUH48G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGOMEPI-MNI-IN-15-FR-9</div> <div>VERSIÓN1</div> <div>PÁGINA</div>										
		<div>FECHA26/07/2024 (Día / Mes / Año)</div>										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLES CAUCA										
MES INFORME MENSUAL: ABRIL/2024		PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"										
CONVENIO No.: 4693-2023 4671-2023 4393-2023 4784-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS										
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	1398323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 105,790,989	-					
TOTAL						\$ 105,790,989						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 105,790,989										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE/2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1398323:19/12/2023	\$ 105,790,989.00	\$ 105,790,989.00	-	-
2	ENERO/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1398323:19/12/2023	\$ 105,790,989.00	\$ 105,790,989.00	-	-
3	FEBRERO/2024	\$ 3,654,400	\$ 694,336	\$ 4,348,736	\$ -	\$ -	\$ -	1398323:19/12/2023	\$ 101,442,253.00	\$ 101,442,253.00	-	-
4	MARZO/2024	\$ 5,742,780	\$ 1,091,128	\$ 6,833,908	\$ -	\$ -	\$ -	1398323:19/12/2023	\$ 94,608,345.00	\$ 94,608,345.00	-	-
5	ABRIL/2024	\$ 10,357,380	\$ 1,967,902	\$ 12,325,282	\$ -	\$ -	\$ -	1398323:19/12/2023	\$ 82,283,063.00	\$ 82,283,063.00	-	-
6	MAYO/2024											
7	JUNIO/2024											
TOTALES		\$ 19,754,560.00	\$ 3,753,366.00	\$ 23,507,926.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 82,283,063.00	\$ 82,283,063.00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 18,339,560.00			\$ 3,484,516.00			\$ 21,824,076.00					
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 1,415,000.00			\$ 268,850.00			\$ 1,683,850.00					
VALOR TOTAL	\$ 19,754,560.00			\$ 3,753,366.00			\$ 23,507,926.00					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div> Firma Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU</div><div> Firma Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula profesional No. 19202-218012 CAU</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial												
