



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06
Período: AGOSTO de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL
MUNICIPIO DE TIMANÁ



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023

**INTERVENTORÍA
CONSORCIO VALTOR**



INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

**PERIODO:
AGOSTO DE 2024**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

CUADRO DE ASPECTOS CONTRACTUALES

Contratista de obra:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA
convenio Solidario No.:	4811-2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Fecha de iniciación:	28 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 01:	Hasta el 20 enero de 2024
Suspensión No.1	29 de diciembre de 2023
Ampliación a suspensión No.1	17 de enero de 2024
Prórroga No. 01:	19 de enero de 2024
Prorroga No. 02:	26 de abril de 2024
Prórroga No. 03:	05 de julio de 2024
Prorroga No. 04:	26 de julio de 2024
Fecha de terminación actual:	Hasta el 15 de agosto de 2024

Interventor:	CONSORCIO VALTOR
Contrato Interventoría No:	4760 DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Fecha de inicio:	18 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2023
Suspensión No.1	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 2	17 de enero de 2024
Ampliación a suspensión No.1	28 de febrero de 2024
Reinicio No. 1	17 de enero de 2024

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

Reinicio No. 2	28 de febrero de 2024
Reinicio No. 3	21 de marzo de 2024
Prórroga No. 01:	21 de marzo de 2024
Prorroga No. 2:	26 de abril de 2024
Prórroga No. 03:	05 de julio de 2024
Prorroga No. 04:	26 de julio de 2024
Fecha de terminación actual:	Hasta el 15 de agosto de 2024

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente informe de Interventoría correspondiente al periodo de AGOSTO de 2024, se describen las actividades desarrolladas dentro del plazo de desarrollo del convenio No. 4811 de 2023 de acuerdo al programa caminos comunitarios de la paz total en colaboración con el INVIAS para el mantenimiento y mejoramiento vial, aumento de la velocidad comercial y comodidad al transitar la vía principal que da acceso a la vereda LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, departamento del Huila y en contemplación de lo siguiente:

- El Proyecto está a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
- El Ingeniero Wilder Orley Salazar Cuellar, fue designado como Supervisor del contrato de Interventoría.
- El Convenio No.: 4811 de 2023 se encuentra activo y cuenta con los recursos asignados en el banco AV Villas
- El contrato tiene como fecha de finalización del convenio el 15 de agosto de 2024.
- Que el presente Informe Mensual de Interventoría No.: 06, se elaboró atendiendo lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA del INVIAS y en él, se describen las principales actividades desarrolladas durante el periodo.

Esta interventoría se hace responsable de la información suministrada y el contenido del presente documento como el primer informe del convenio para reportar las actividades y en general el proceso de ejecución del proyecto de mejoramiento vial de la vía principal que da acceso a la vereda Buenos Aires mediante la construcción de pavimento rígido con la

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

longitud que nos entrará a determinar el presupuesto así como el alcance del convenio a presentar por el ingeniero residente de obra y de esta manera mejorar la red vial de la zona.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

Las actividades por ejecutar bajo el alcance del contrato de obra número 4811 de 2023 van a ser desarrolladas en un (01) tramo como se muestra a continuación:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de pavimento rígido y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

El tramo esta ubicados en la vereda Buenos Aires, municipio de Timaná en el departamento del Huila.

En la Figura 1 se presenta la localización del tramo:

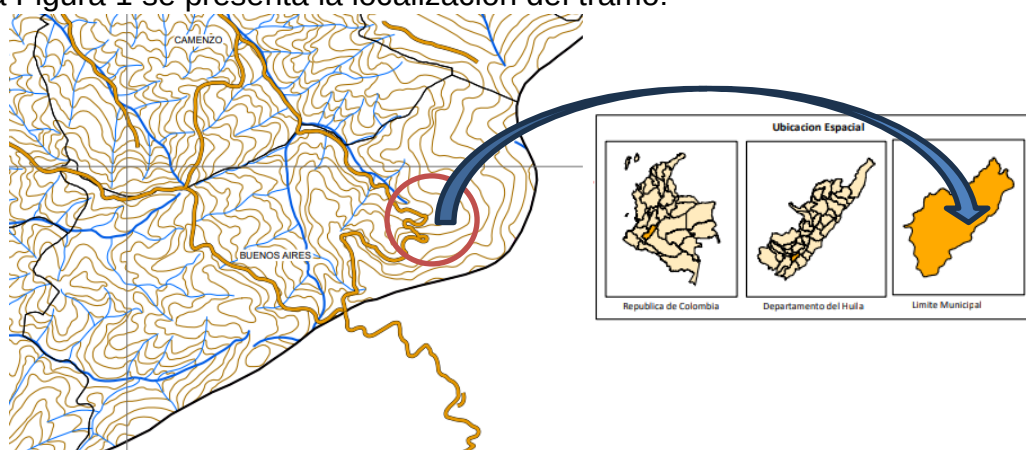


FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

TRAMO 1

Localización: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Timaná, departamento del Huila, en la vereda Buenos Aires del municipio de Timaná (H) y/o INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, de la vía denominada TIMANA - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A, identificada con el código 45HL10, con coordenadas inicial x: 796491,12 y: 704210,89 y final x: 798577,37 y: 704058,96 a su vez con la vía CARMENZO -BUENOS .AIRES, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila de INVIAS.

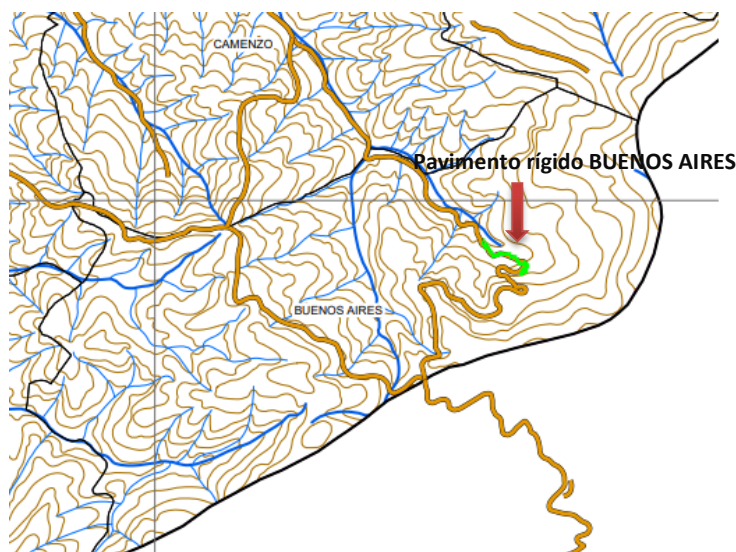


FIGURA 2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO TRAMO 1

Algunos beneficios:

- ☑ **Mejora de la accesibilidad:** El mejoramiento vial tipo pavimento rígido facilita el acceso a comunidades remota, permitiendo que los residentes y las empresas puedan desplazarse de manera más eficiente.
- ☑ **Incremento de la seguridad en la vía:** El mejoramiento de la vía tipo pavimento rígido puede ayudar a reducir los accidentes de tráfico y mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras.
- ☑ **Impulso al desarrollo económico:** Aumento de la conectividad entre diferentes áreas, mejora la velocidad comercial de la zona. Esto puede estimular el desarrollo económico local al fomentar el comercio, el turismo y la inversión en la región.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

- ☒ **Mejora de la calidad de vida:** Con una vía más transitable, los residentes locales pueden acceder con mayor facilidad a servicios básicos como atención médica, educación y mercados. Además, se reduce el tiempo de viaje y el desgaste de los vehículos, lo que contribuye a mejor calidad de vida para los habitantes del sector.

En resumen, el proyecto de mejoramiento vial tipo pavimento rígido puede traer una serie de beneficios significativos para el sector en la vereda Buenos Aires obteniendo de esta forma un impulso económico y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector.

2.2. Inventario y Estado Inicial de las vías

En la visita a la obra se realizó el análisis al tramo y se evidenció deterioro en el afirmado y en los drenajes por lo que es necesario el mejoramiento de la vía mediante la construcción del pavimento rígido para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad y de esta manera aportar a la velocidad comercial del sector.

ESTADO INICIAL DE LAS VIAS

A continuación, se encuentra el registro fotográfico de las condiciones iniciales del proyecto de construcción del pavimento rígido.

Tramo No.01

	
<p>Tramo 1, sector Buenos Aires, visita a el tramo</p>	<p>Tramo 1, sector Buenos Aires, inspección obras de drenaje</p>



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06
Período: AGOSTO de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL
MUNICIPIO DE TIMANÁ



Tramo 1, sector Buenos Aires, ALCANCE DEL
PROYECTO - INICIO



Tramo 1, sector Buenos Aires, ALCANCE DEL
PROYECTO - FIN

2.3. Características técnicas del proyecto.

Con relación al convenio No.: 4811 de 2023 en la construcción de aproximadamente ciento treinta y tres (73) metros lineales de pavimento rígido de acuerdo con el presupuesto inicial realizado por el INVIAS, las características técnicas reales del proyecto se van a dar a conocer cuando se tengan los resultados de los estudios y diseños.

A continuación, se encuentra el resumen de las obras programadas para ejecutar dentro del contrato:

DESCRIPCIÓN

- Base granular cumpliendo con INV 320-13, INV 300-13 y NT1
- Preparación del terreno para garantizar un excelente afirmado.
- Transporte de materiales de afirmado para la base.
- Topografía
- Estudio de suelos y laboratorios para estimar el CBR de diseño.
- Excavaciones varias sin clasificar.

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

- Mejoramiento y raspado de la rasante con motoniveladora
- Rocería
- Compactación del material granular con vibro compactador.
- Concreto Resistencia 21 Mpa tipo (E)
- Placas de concreto vaciada in situ.
- Cuneta de concreto vaciada in situ.
- Figurado de Acero de refuerzo $F_y=420$ Mpa.
- Bordillo de concreto vaciado in situ; No incluye la conformación de la superficie de apoyo
- Concreto Resistencia 21 Mpa para Alcantarilla y Concreto ciclópeo de 14 Mpa.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información General del Contrato.

Convenio Solidario No.:	4811-2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES NIT: 891.104.390 - 8
Dirección correspondencia:	Vereda Buenos Aires
Teléfono:	318-389 74 89
Correo electrónico:	veredabuenosaires098@gmail.com
Valor inicial del contrato incluido IVA:	\$ 190.506.336,00 COP
Fecha de inicio del contrato:	28 de diciembre de 2023
Plazo inicial del contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

Prórroga No. 1:	19 de enero de 2024
Prórroga No. 2:	26 de abril de 2024
Prórroga No. 3:	05 de julio de 2024
Prórroga No. 4:	26 de julio de 2024
Fecha de terminación actualizada:	15 de agosto de 2024
Programa de Inversiones vigente:	Sin programa de inversión
Póliza:	Compañía aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza: 100074157 Responsabilidad Civil.

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el presente mes, comprendido entre el 1 al 15 de AGOSTO de 2024, se realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

ESPERANDO LA NO OBJECCIÓN PARA INICIAR CON LA OBRA SOCIAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Se recibe oficio 2024S-VBOG-054915 Con la NO OBJECCION donde se aprobó el componente social - obra con participación comunitaria.

Se compra los materiales y se programa día de la actividad para el mantenimiento del salón comunal, cambio de puertas y pintura en general.

La comunidad se reunió para la obra social con participación comunitaria.

Se realizo la socialización final del proyecto.

SE RECIBE OBRA CON AVANCE FISICO DE 111m DE PLACA HUELLA CON SUS DENELLONES Y UNA ALCANTARILLA.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos:

A la fecha no hubo ningún imprevisto por lo que no se adjunta al informe mensual.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Convenio	Valor ejecutado básico	Porcentaje ejecutado (%)
4811-2023	\$ 255.791.647,00	134%

TABLA 1 AVANCE DE OBRA

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

A continuación, se detallan las gestiones realizadas por la Interventoría durante el periodo correspondiente al presente informe:

- ESPERANDO LA NO OBJECCIÓN PARA INICIAR CON LA OBRA SOCIAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA
- Se recibe oficio 2024S-VBOG-054915 Con la NO OBJECCION donde se aprobó el componente social - obra con participación comunitaria.
- Se compra los materiales y se programa día de la actividad para el mantenimiento del salón comunal, cambio de puertas y pintura en general.
- La comunidad se reunió para la obra social con participación comunitaria.
- Se realizo la socialización final del proyecto.
- SE RECIBE OBRA CON AVANCE FISICO DE 111m DE PLACA HUELLA CON SUS DENELLONES Y UNA ALCANTARILLA.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Informe Semanal

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-03, se registra de manera resumida las actividades y progreso del contrato de obra.

Se presenta copia del informe semanal, el original fue radicado en el INVIAS Territorial Cundinamarca y copia de los cuales se remitió al Gestor del contrato:

- ☒ Informe Semanal No. 20 periodo: 02 de AGOSTO de 2024 hasta 08 de AGOSTO de 2024
- ☒ Informe Semanal No. 21 periodo: 09 de AGOSTO de 2024 hasta 15 de AGOSTO de 2024
- ☒ Informe Semanal No. 22 periodo: 16 de AGOSTO de 2024 hasta 22 de AGOSTO de 2024

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, se registra el control diario para el periodo de la maquinaria y el equipo dispuesto en obra.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se registra el control diario de personal dispuesto en la obra en cumplimiento de previsto en el pliego de condiciones. formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, se presenta el informe financiero y presupuestal. De acuerdo con el contrato de obra, se pagará al contratista mediante actas de corte, revisadas y aprobadas por la Interventoría, previo anexo del programa de inversión del correspondiente mes y de la presentación de los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista.

4.5 Estado General del Tiempo

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se presenta el registro del estado general del tiempo imperante en la zona del proyecto durante el presente mes.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

No se proyecta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, la fecha no se ha hecho ningún ensayo de laboratorio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

se presenta el seguimiento de las garantías y seguros del contrato de obra, las cuales se encuentran vigentes a la fecha del presente informe. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Acta de aprobación de estudios y diseños

A la fecha el convenio no se ha realizado la aprobación oficial de estudios y diseños, las JAC no han radicado los productos suministrados por el profesional FABIAN.

4.9.2 Acta mensual pagos del convenio

Se relaciona en el ACTA PARCIAL DE PAGOS DEL CONVENIO.

4.9.3 Resumen mensual estado general del proyecto

formato suministrado por el INVIAS para el convenio “RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO”

4.9.4 Manejo de desembolso

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

4.9.4.A Informe inversión buen manejo desembolso

Se realiza seguimiento a al programa de inversiones formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

4.9.4.B Plan Inversión Desembolso Mensual

Se proyecta formato MEPI-MNIN-6-FR-1 para el programa de inversiones y la reprogramación de acuerdo a los desembolsos.

4.9.5 Actas de comité de obra.

- Actas de comité de operativo C5 y sus anexos

4.9.6 Actas de reunión.

No se llevaron a cabo las actas de reunión durante el periodo y se documentación va de acuerdo con el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 Información general del contrato.

Contrato de Interventoría No.:	4760 de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁEN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Contratista:	CONSORCIO VALTOR
Dirección correspondencia:	Carrera 48 #6-83 casa 107 NEIVA
Teléfono:	3114821018
Correo electrónico:	valtorcaminospaztotal@gmail.com
Valor del contrato incluido IVA:	\$ 83.623.321,00
Fecha de inicio del contrato:	18 de diciembre de 2023
Plazo inicial del contrato:	Hasta 31 de diciembre 2023
Fecha de terminación actual:	15 de AGOSTO de 2024
Pólizas:	Compañía aseguradora: Mundial de seguros N. 100011698

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

- Socialización de los convenios a la comunidad y JAC en compañía del personal de Invias Territorial Huila.
- Recorrido a tramo de la vía donde se va a realizar el mejoramiento vial con el fin de identificar los problemas en el sitio los cuales serán intervenidos con el convenio.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con el contratista
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras
- Elaboración de informes semanales
- Elaboración de informe mensual
- Medición y cuantificación de cantidades de obra
- Supervisión de ejecución de obras

5.3 Informe Especialistas

Durante el periodo NO se presentó informe del profesional Social

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría hace el respectivo seguimiento al convenio No.: 4811-2023 con el director e ingeniero Residente de Interventoría de acuerdo como se relaciona a continuación:

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se presenta el equipo utilizado por la Interventoría durante el periodo del presente informe.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría:

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, se presenta el plan de cargas del contrato de interventoría No.: 4760-2023

6.6.2 Acta de costos

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1, se presenta Acta de costos del contrato de interventoría No.: 4760-2023

6.6.3 Hoja de ruta y orden de pago contrato de interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2, se presenta Hoja de ruta y orden de pago del contrato de interventoría No.: 4760-2023

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

TRAMOS No. 01 VEREDA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ.

OBSERVACIONES

- ☒ El convenio No.: tiene pendiente la entrega de la obra social.

CONCLUSIÓN GENERAL:

La meta física del convenio, teniendo en cuenta el balance realizado por el ingeniero residente es del 134%, y con respecto a la meta física pasamos de 73 m a 111 m de pavimento rígido y una alcantarilla.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

- CVHUITIM-076-2023 - Neiva, 27 de agosto de 2024

	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.:06 Período: AGOSTO de 2024</p> <p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023 CONVENIO SOLIDARIO No.: 4811 de 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ</p>	
---	--	---

REF: Informe final de obra convenio 4811-2023 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.


8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras.

se anexa registro fotográfico.

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

No se anexa registro fotográfico y videos de las obras en los tramos correspondientes.

Atentamente,



DORA CRISTINA TORRES
 Director de Interventoría
 Contrato No.: 4760 de 2023

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ASPECTOS GENERALES DE INTERVENTORIA	
		FECHA:	15/08/2024 (Día / Mes / Año)
Convenio Solidario No.	4811-2022	Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES - TIMANA
Contrato de Interventoría No.	4785-2022	Interventoría:	CONVENIO VIAL TDR
Objeto Contrato de Obra: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
PLAZO INICIAL:	21/12/2023	VALOR INICIAL :	\$ 150.006.336,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONALES:	\$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 150.006.336,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 150.006.336,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES		
Objeto Contrato de Interventoría: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
PLAZO INICIAL:	21/12/2023	VALOR INICIAL :	\$ 85.673.371,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONALES:	\$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 85.673.371,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	17/01/2024	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES		

idóneo	WIFI-MG-04-20-FR-1
versión	1
plataforma	

Contrato de Obra No. 001-2021

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA
BLENOS ASES - TIBANA

Contrato de Interventoría No. 4760-2021

Interventoria: CONSTRUCCION DE LA CARPETA DE LA CALLE

Objeto Contrato de Obra

ANUAR ESPUEBROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 MES O PERÍODO: AGOSTO DE 2020

No.	CONSIGNACION	FECHARIO	PREROG.
	<p>1.1.1. Criterio de Clasificación por Orden Ministerial de Interventoría</p> <p>1.1.2. Criterio de Clasificación por Orden del Proponente</p>	<p>1.1.1.1. 18/11/2010-18/11/11</p> <p>1.1.1.2. 18/11/2010-18/11/11</p>	<p>1</p> <p>2</p>
1	INTRODUCCION		
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		
2.1	1.1.1.1. Descripción		
2.2	1.1.1.2. Descripción de la zona de influencia y determinación del tipo de actividad según parámetros		
2.3	1.1.1.3. Descripción y manejo de riesgo de la zona		
2.4	1.1.1.4. Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACION COMPLEMENTARIA DE OBRAS		
3.1	1.1.1.5. Información general del contrato		
3.2	1.1.1.6. Descripción de los actividades ejecutadas en la obra		
3.3	1.1.1.7. Descripción de la zona de influencia		
3.4	1.1.1.8. Estado de la zona y actividades a seguir por parte de la interventoría		
4	REPORTES E INFORMACION MINISTRAL, CONTRATO DE OBRAS		
4.1	1.1.1.9. Reportes	18/11/2010-18/11/11	
4.2	1.1.1.10. Reportes y mapas control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.3	1.1.1.11. Reportes y mapas de Afectos y/o Impactos y seguimiento control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.4	1.1.1.12. Reportes y seguimiento control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.5	1.1.1.13. Reportes control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.6	1.1.1.14. Reportes de Afectos y/o Impactos	18/11/2010-18/11/11	
4.7	1.1.1.15. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.8	1.1.1.16. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.9	1.1.1.17. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.10	1.1.1.18. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.11	1.1.1.19. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.12	1.1.1.20. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.13	1.1.1.21. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.14	1.1.1.22. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.15	1.1.1.23. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.16	1.1.1.24. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.17	1.1.1.25. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.18	1.1.1.26. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.19	1.1.1.27. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.20	1.1.1.28. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.21	1.1.1.29. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.22	1.1.1.30. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.23	1.1.1.31. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.24	1.1.1.32. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.25	1.1.1.33. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.26	1.1.1.34. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.27	1.1.1.35. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.28	1.1.1.36. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.29	1.1.1.37. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.30	1.1.1.38. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.31	1.1.1.39. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.32	1.1.1.40. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.33	1.1.1.41. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.34	1.1.1.42. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.35	1.1.1.43. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.36	1.1.1.44. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.37	1.1.1.45. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.38	1.1.1.46. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.39	1.1.1.47. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.40	1.1.1.48. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.41	1.1.1.49. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.42	1.1.1.50. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.43	1.1.1.51. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.44	1.1.1.52. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.45	1.1.1.53. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.46	1.1.1.54. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.47	1.1.1.55. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.48	1.1.1.56. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	
4.49	1.1.1.57. Reportes de Afectos y/o Impactos control de obra	18/11/2010-18/11/11	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al Decreto del mismo mes.

Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación no. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de intervención. Archivos de Gestión del INVUE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION	
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA		PERIODO MES: AGOSTO DE 2024	
					FECHA 15/08/2024 (Día / Mes / Año)	

CONVENIO No.: 4811-2023	PLAZO INICIAL: 31/12/2023	VALOR INICIAL : \$ 190.506.336,00
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONALES: \$ -
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES - TIMANA	FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023	
	FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 190.506.336,00
	FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 190.506.336,00
	PLAZO ACUMULADO: 6,5 meses	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4760-2023	INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Wilder Orley Salazar Cuellar


ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																																				
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>mL</td><td>73</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td>Rocería</td><td>Ha</td><td>1,56</td></tr><tr><td>Limpieza alcantarilla</td><td>UND</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	mL	73	Alcantarillas	UND	1	Estructuras	Muro de Contención						Mantenimiento	Rocería	Ha	1,56	Limpieza alcantarilla	UND	6				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>mL</td><td>111</td><td>111</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rocería</td><td>Ha</td><td>1,56</td><td>1,56</td></tr><tr><td>Limpieza alcantarilla</td><td>UND</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	mL	111	111	Estructuras	Alcantarillas	UND	1	1	Muro de Contención		0	0	Mantenimiento			0	0	Rocería	Ha	1,56	1,56	Limpieza alcantarilla	UND	6	6					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																					
Pavimentación	Mejoramiento	mL	73																																																																					
	Alcantarillas	UND	1																																																																					
Estructuras	Muro de Contención																																																																							
Mantenimiento	Rocería	Ha	1,56																																																																					
	Limpieza alcantarilla	UND	6																																																																					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																				
Pavimentación	Mejoramiento	mL	111	111																																																																				
Estructuras	Alcantarillas	UND	1	1																																																																				
	Muro de Contención		0	0																																																																				
Mantenimiento			0	0																																																																				
	Rocería	Ha	1,56	1,56																																																																				
	Limpieza alcantarilla	UND	6	6																																																																				

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	VALOR		ACUMULADO
OBRAS	\$ 142.483.672,61	OBRAS	\$ 208.768.588,00 \$ 208.768.588,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.211.487,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.211.487,00 \$ 4.211.487,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.811.572,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.811.572,00 \$ 47.023.059,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 189.506.731,61	VALOR EJECUTADO	\$ 255.791.647,00 \$ 260.003.134,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 189.506.731,61	MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 260.003.134,00	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	137,20%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

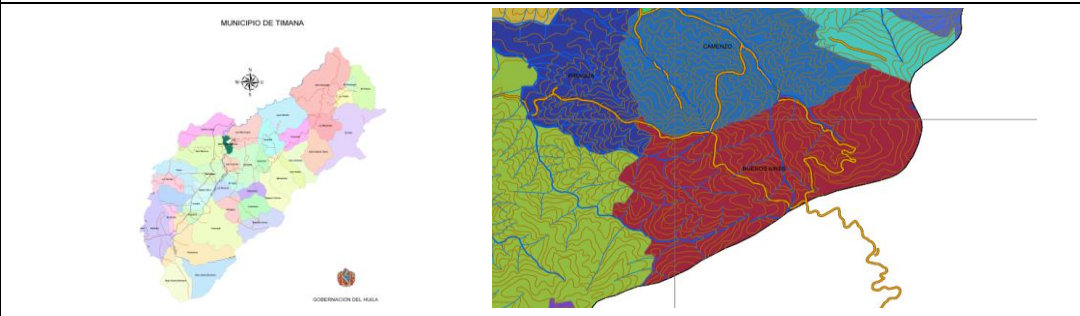

FOTOGRAFIA 1: MAPA DIVISIÓN VEREDAL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO



FOTOGRAFIA 2: VIA A INTERVENIR



FOTOGRAFIA 3: ALCANTARILLA



FOTOGRAFIA 4: TOMA DE MEDIDAS



FOTOGRAFIA 5: CORTE LOSAS




FOTOGRAFIA 6: ANTES Y DESPUES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

COMENTARIO. Se dio reinicio al contrato de interventoría el día 21/03/2024 desde entonces se inicio con la socialización del proyecto, solicitud del personal (residente de obra y contador)

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1

FECHA

15/08/2024
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BUENOS AIRES

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VALTOR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES - TIMANA

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	15/08/2024 (Día / Mes / Año)
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.			
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.			
<div>Firma Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND</div>		<div>Firma Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar Supervisor del Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.:</div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.


Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND


Firma
Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	#REF! (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA																																																								
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 83.623.321,00 VALOR ACUMULADO: \$ 83.623.321,00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 8.362.332,10</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 16.724.664,20</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 25.886.996,30</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.724.664,20	Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>6</td><td>2024</td></tr><tr><td>30</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>30</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	30	11	2023	30	6	2024	30	11	2023	31	12	2026	30	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.724.664,20																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
30	11	2023	30	6	2024																																																			
30	11	2023	31	12	2026																																																			
30	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/12/2023																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	#REF!
(Día / Mes / Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10	30	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.724.664,20	30	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30	30	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10	28	2	2024	5	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.724.664,20	28	2	2024	5	4	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30	5	4	2024	5	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10	21	3	2024	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.724.664,20	21	3	2024	6	6	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30	30	4	2024	30	4	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

#REF!
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

100011698

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

23/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	\$ 16.724.664,20
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	4	2024	19	2	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
26	4	2024	19	8	2027
15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

100011698

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.362.332,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	\$ 16.724.664,20
Calidad del servicio	30%	\$ 25.886.996,30

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	7	2024	19	2	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
8	7	2024	19	8	2027
31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

100011698

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)



Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

22/07/2024

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	#REF! (Día / Mes / Año)
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías			
 Firma		 Firma	
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND		Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MNL-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		15/08/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	HUILA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4760-2023 <small>(Indicar número y año)</small>
--------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTOR:	CONSORCIO VALTOR
--------------	------------------

FECHA DE INICIO:	18/12/2023 <small>(Indicar día, mes y año)</small>	PLAZO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
------------------	---	----------------	------------	-----------------------	---

CONTRATO DE OBRA No:	4811-2023 <small>(Indicar número y año)</small>
----------------------	--

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES - TIMANA
--------------	--

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:	SI	NO	---	X	APROBADO:	SI	N	---	VERSIÓN No.		FECHA DE VERSIÓN:	
-------------	----	----	-----	---	-----------	----	---	-----	-------------	--	-------------------	--

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI	NO	---	X	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	NO			No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:	SI	NO	---	X	APROBADO:	SI	NO	---	FECHA DE APROBACIÓN:	
-------------	----	----	-----	---	-----------	----	----	-----	----------------------	--

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
---	--	---	--

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI	NO	---	
--------------------------------------	----	----	-----	--

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	0

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MNL-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

15/08/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios


OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NOTA:


Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma




Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Firma



Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



I. INFORMACIÓN GENERAL

ACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ES DE DRENAJE 6 UND
E ZONAS NO BOSCOSAS 1,56 Ha
TO RIGIDO: 73 ml
NTARILLAS: 1 und

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES				CONSORCIO VALTOR			
ROVINSON SOLARTE CASTILLO				R/L JOSE LUIS VALDEMARIA VELASCO			
INTERVENIENTE:				INTERVENIENTE:			
CONTRATO No. _____				CONTRATO No. _____			
VALOR INICIAL: \$ _____				VALOR INICIAL: \$ _____			
VALOR ADICIONES: \$ _____				VALOR ADICIONES: \$ _____			
VALOR ACUMULADO: \$ _____				VALOR ACUMULADO: \$ _____			
PRÓRROGA No. 1: _____				PRÓRROGA No. 1: _____			
PRÓRROGA No. 2: _____				PRÓRROGA No. 2: _____			
PRÓRROGA No. 3: _____				PRÓRROGA No. 3: _____			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ _____				SALDO POR AMORTIZAR: \$ _____			

S PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$. 83.623.321.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$. 83.623.320.38	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$. -	-
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> X </div>
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$. -	-
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones:		

Meta Física Programada %	110%	Avance o Atraso Físico %	
Meta Física Ejecutada %	110%		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico	Tramo 1			%
Prog	6			100.0%
Ejec	6			100.0%
Prog	1.56			100.0%
Ejec	1.56			100.0%
Prog	114			156.2%
Ejec	114			156.2%
Prog	1			100.0%
				100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: via Camenzo - Buenos Aires

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retroexcavadora	1	
motoniveladora	1	
volquetas	2	
VIBROCOMPACTADOR	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	<u>ORITOGUAZ</u>	PERMISO MINERO:	SI <u>X</u> NO <u>---</u>	ZONAS DE DEPOSITO:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>	LICENCIA AMBIENTAL:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	LICENCIA AMBIENTAL:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>			APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
UBICACIÓN:	<u>PITALITO</u>	PERMISO MINERO:	SI <u>X</u> NO <u>---</u>	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>	LICENCIA AMBIENTAL:	SI <u>X</u> NO <u>---</u>	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>			VERTIENTOS:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>			EMISIONES:	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
	<u>-----</u>			OTROS (Especificar cual)	SI <u>---</u> NO <u>---</u>	N/A	<u>X</u>
OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE YUMA				OBSERVACIONES:			

OBSERVACIONES: SE RADICO ANTE EL INVIAS EL 12 DE JUNIO DE 2024

ESTADO: SE RADICO EN INVIAS EL 12 DE JUNIO DE 2024

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:


ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Buenos Aires

OBSERVACIONES:

ESPERANDO LA NO OBJECCIÓN PARA INICIAR CON LA OBRA SOCIAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

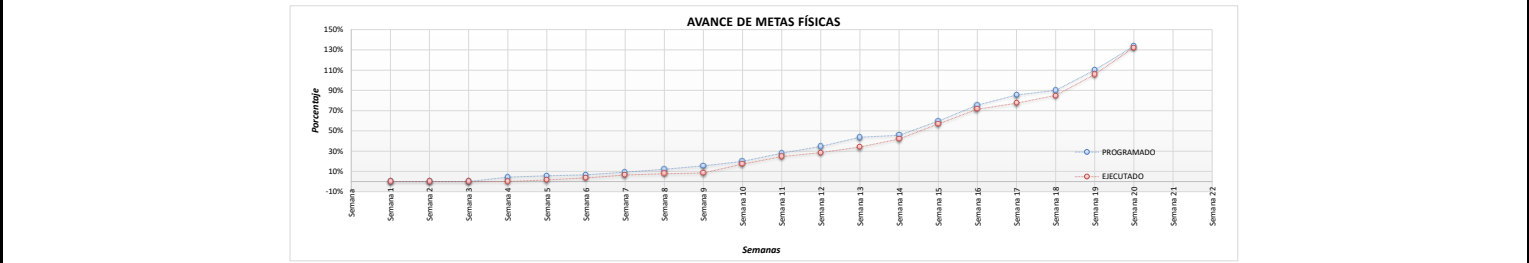


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASEO Y RECOLECCION RESIDUOS

ANTES


DESPUES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JAC CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIAS HASTA LA LIQUIDACIÓN.	<div> </div> <div> FIRMA _____ </div> <div> NOMBRE: <u>DORA CRISTINA TORRES MAZAREL</u> </div> <div> Matricula Profesional No.: <u>25202-160322 CND</u> </div>

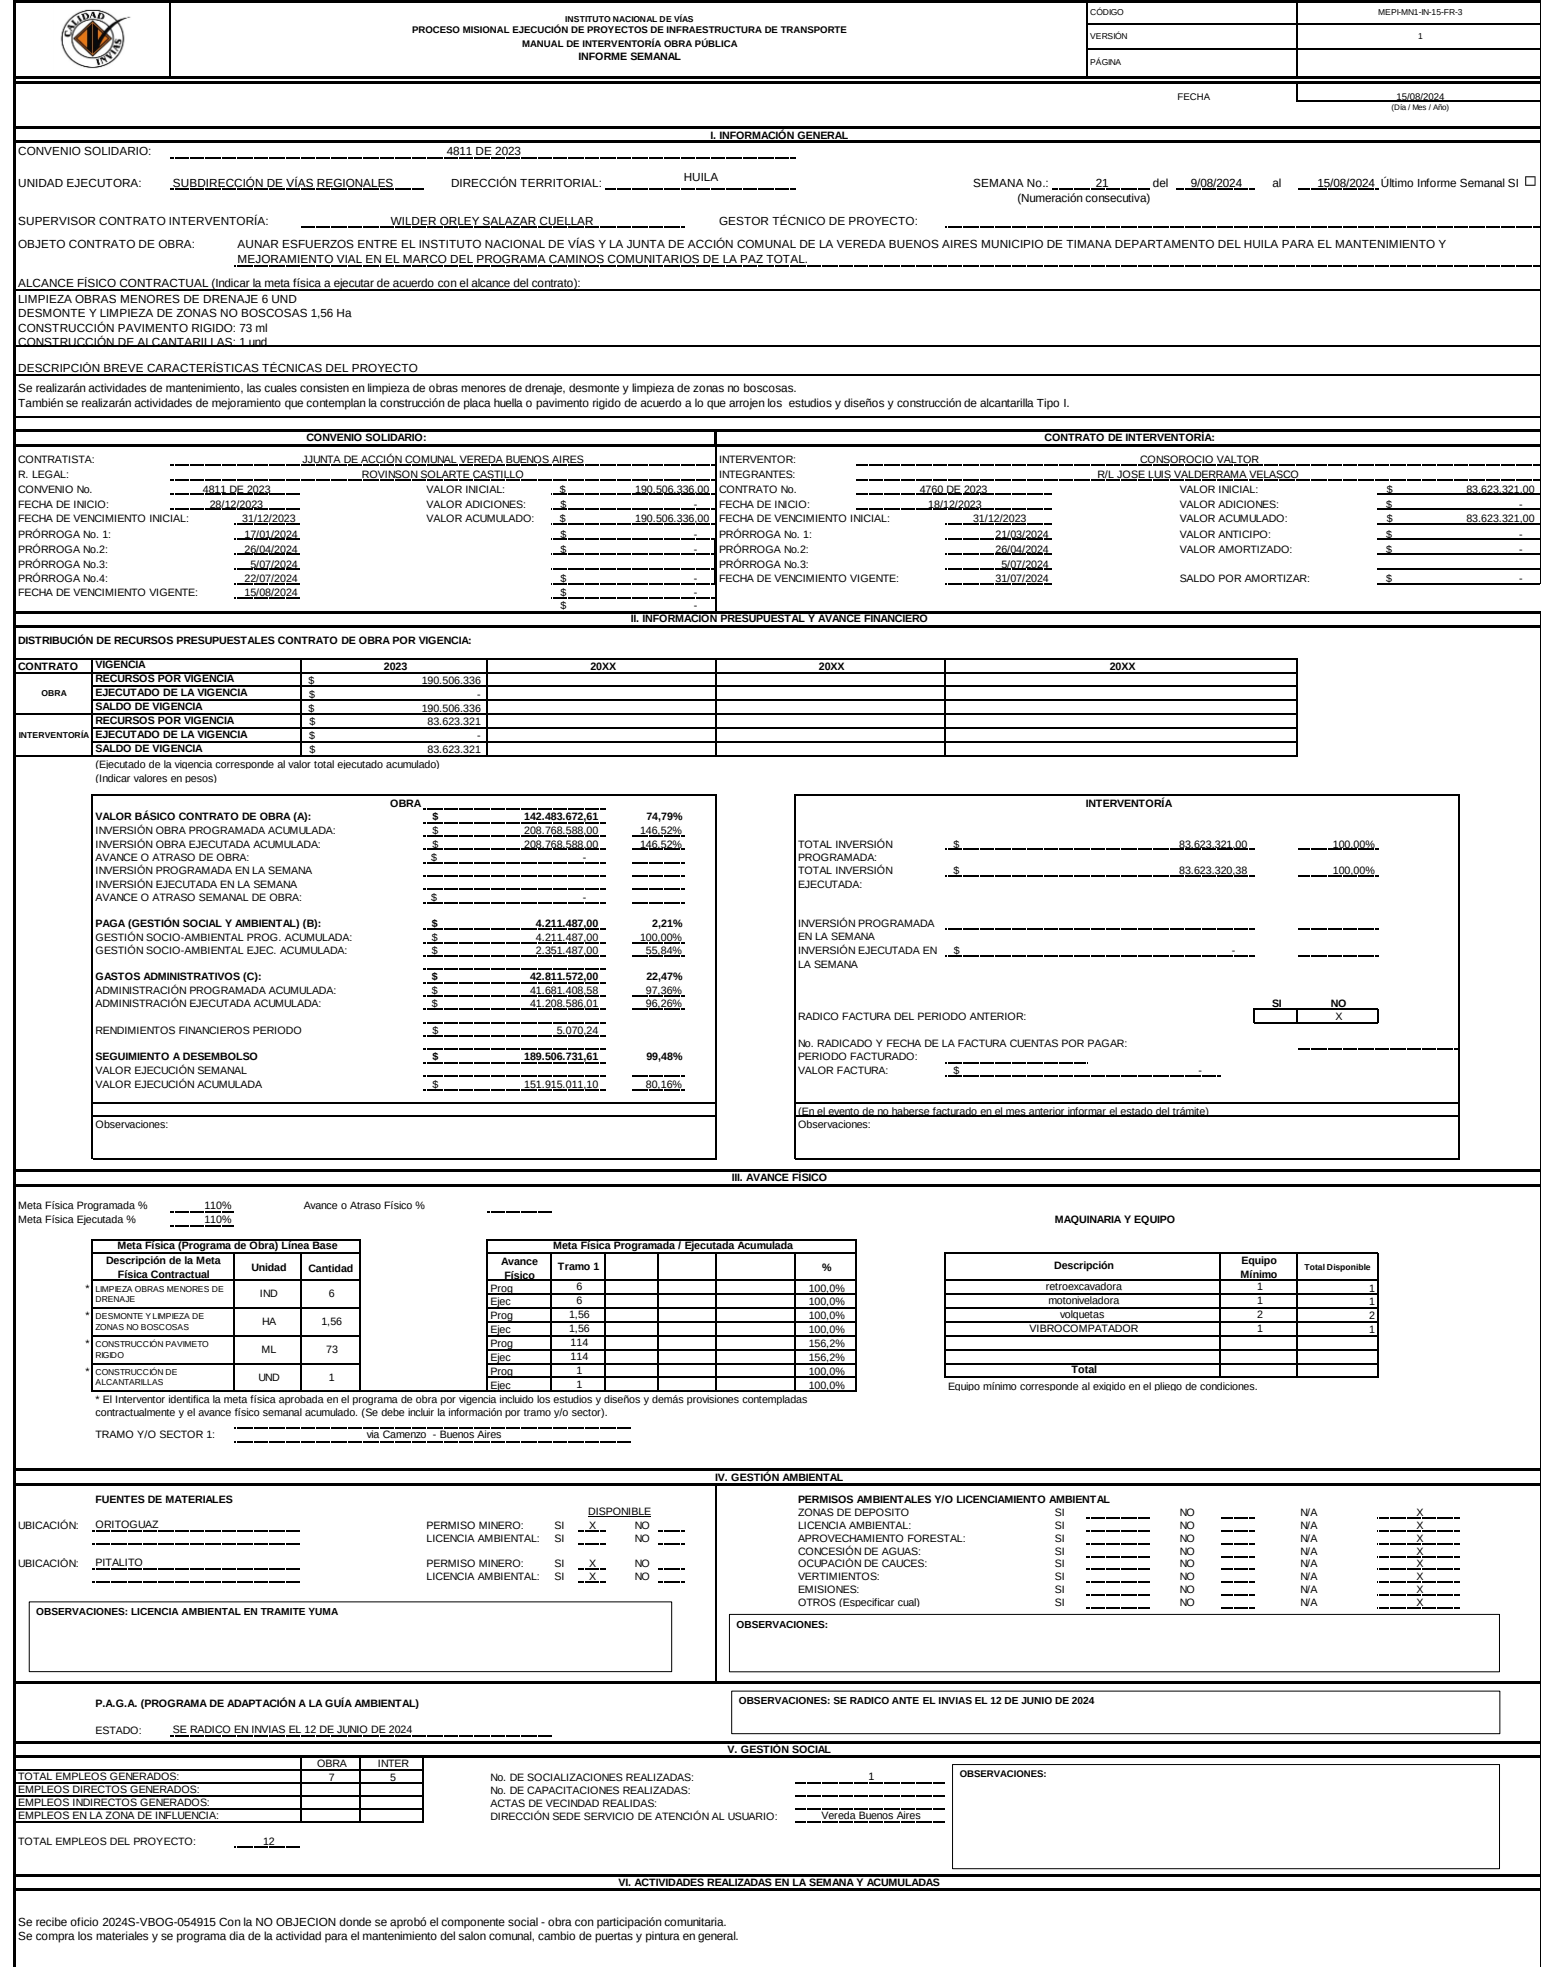

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Entrega de la obra social
Socialización del proyecto.

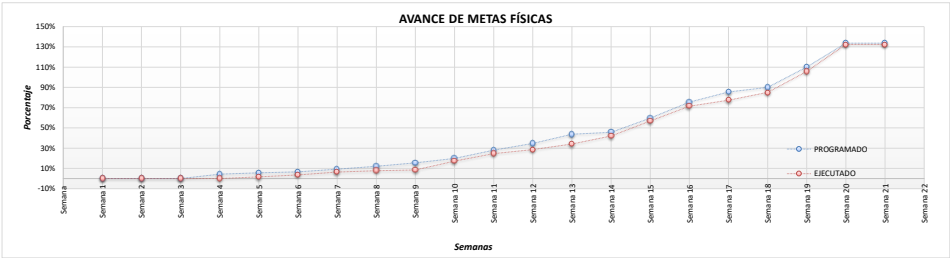

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



no objeción



plan de inversión aprobado



obra aprobada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


*VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JAC CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIAS HASTA LA LIQUIDACIÓN.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZAREL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

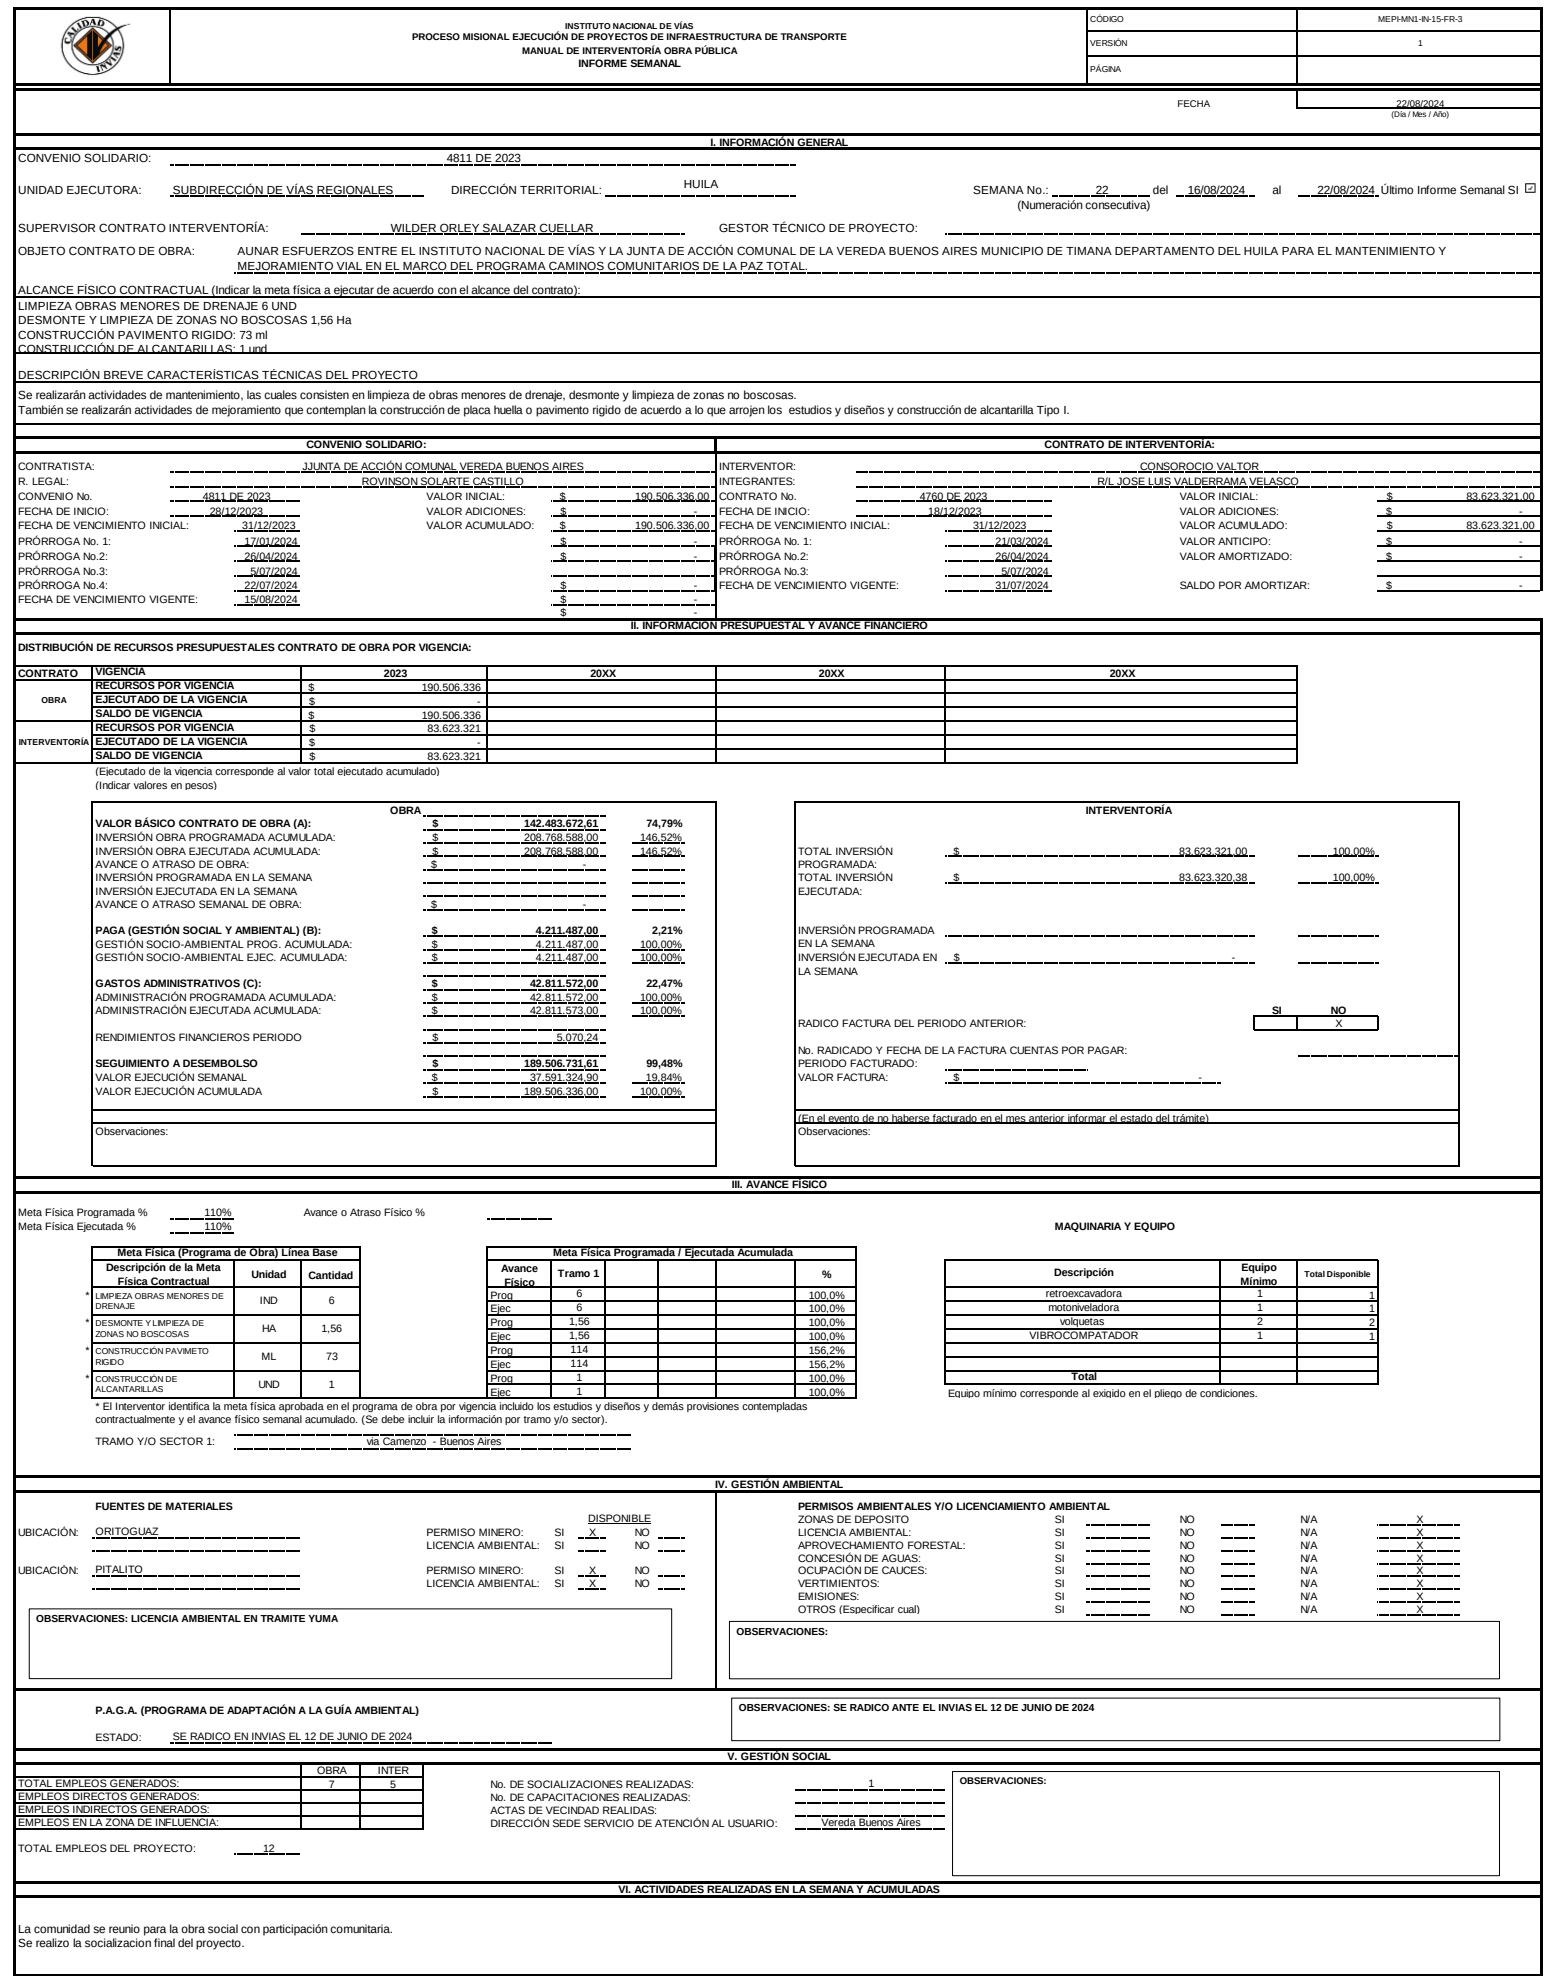

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																						
INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO																																																																						
<div>AVANCE DE METAS FÍSICAS</div> <table border="1"><thead><tr><th>Semanas</th><th>PROGRAMADO (%)</th><th>EJECUTADO (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Semana 1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 3</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 4</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 5</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 6</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 7</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 8</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 9</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 10</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 11</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 12</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 13</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 14</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 15</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 16</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 17</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 18</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 19</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 20</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 21</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Semana 22</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Semanas	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	Semana 1	0	0	Semana 2	0	0	Semana 3	0	0	Semana 4	0	0	Semana 5	0	0	Semana 6	0	0	Semana 7	0	0	Semana 8	0	0	Semana 9	0	0	Semana 10	0	0	Semana 11	0	0	Semana 12	0	0	Semana 13	0	0	Semana 14	0	0	Semana 15	0	0	Semana 16	0	0	Semana 17	0	0	Semana 18	0	0	Semana 19	0	0	Semana 20	0	0	Semana 21	0	0	Semana 22	0	0
Semanas	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)																																																																				
Semana 1	0	0																																																																				
Semana 2	0	0																																																																				
Semana 3	0	0																																																																				
Semana 4	0	0																																																																				
Semana 5	0	0																																																																				
Semana 6	0	0																																																																				
Semana 7	0	0																																																																				
Semana 8	0	0																																																																				
Semana 9	0	0																																																																				
Semana 10	0	0																																																																				
Semana 11	0	0																																																																				
Semana 12	0	0																																																																				
Semana 13	0	0																																																																				
Semana 14	0	0																																																																				
Semana 15	0	0																																																																				
Semana 16	0	0																																																																				
Semana 17	0	0																																																																				
Semana 18	0	0																																																																				
Semana 19	0	0																																																																				
Semana 20	0	0																																																																				
Semana 21	0	0																																																																				
Semana 22	0	0																																																																				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																						
<div></div> <div></div> <div></div>																																																																						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																					
*VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JAC CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIAS HASTA LA LIQUIDACIÓN.	<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: <u>DORA CRISTINA TORRES MAZAREL</u></div><div>Matricula Profesional No.: <u>25202-160322 CND</u></div></div>																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-S-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
ACTIVIDADES DE 01 AGOSTO A 15 DE AGOSTO 2024					FECHA ELABORACIÓN		15	8	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES - TIMANA	CONVENIO N°	4811-2023		MUNICIPIO		TIMANÁ		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VALTOR	CONTRATO N°	4760-2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
									
Descripción: ALCANTARILLA									
									
Descripción: MEDIDAS									
									
									
									
Descripción: DILATACIONES									
									
									
Descripción: ANTES Y DESPUES									
									
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									



CONSORCIO VALTOR

NIT: 901.776.441-3

CVHUITIM-076-2023

Neiva, 27 de agosto de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES

ROVINSON SOLARTE CASTILLO

Presidente y Representante Legal

Timaná – Huila

Atención a:

RICARDO GAMBOA

Residente de obra

CARMENZA MUÑOZ

Contadora

REF: Informe final de obra, Convenio 4811 -2023 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

Cordial saludo;

De acuerdo a los requerimientos del instituto nacional de vías - INVIAS y la información que se debe suministrar para la liquidación del convenio; la interventoría solicita se haga entrega de la información solicitada en los oficios anteriores de la parte administrativa, técnica y financiera del convenio.

Agradecemos que los documentos se entreguen lo antes posible.

Atentamente:



ING. GLORIA CONSUELO FIGUEROA
Residente de interventoría
CONSORCIO VALTOR
