

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023	
	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.	
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 1 de 25	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
Enero 17 al 30 de 2024

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA
MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
CONTRATO NO. 5042 DE 2023

Gv Ltda.
Nit. 825.002.653-1

G.V LTDA
Rep. legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual
E-mail: gelvanltda@outlook.com
Dirección: Calle 3 -10-04
Riohacha, Febrero 05 de 2024

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 2 de 25	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	<u>3099 - 2023</u>	Contratista:	<u>JAC Corregimiento de Carraipia</u>
	<u>3336 - 2023</u>		<u>JAC de la Vereda Garrapatero</u>
	<u>4752- 2023</u>		<u>Comuna No. 6 del Municipio de Maicao</u>
Contrato de Interventoría No.	<u>5042- 2023</u>	Interventoría:	<u>G.V. LTDA</u>

Objeto Contrato de Obra:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

INFORME MENSUAL No.	<u>02</u>	MES O PERIODO:	<u>Enero 2024</u>
---------------------	-----------	----------------	-------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2,4, Y 5
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		
2	CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023		
2.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1.1	Localización		
2.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.1.4	Características técnicas del proyecto		
2.2	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
2.2.1	Información general del contrato		
2.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
2.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
2.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
2.3	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
2.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
2.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
2.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
2.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023		
	“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 3 de 25		

2.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
2.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
2.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
2.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
2.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
3	CONVENIO SOLIDARIO 3336 DE 2023		
3.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
3.1.1	Localización		
3.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
3.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
3.1.4	Características técnicas del proyecto		
3.2	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.2.1	Información general del contrato		
3.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.2.3	Seguimiento ítems no previstos		
3.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
3.3	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
3.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
3.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
3.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
3.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
3.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
3.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
3.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
3.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
3.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
4	CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023		
4.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
4.1.1	Localización		

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023		
	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 4 de 25		

4.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
4.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
4.1.4	Características técnicas del proyecto		
4.2	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
4.2.1	Información general del contrato		
4.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
4.2.3	Seguimiento ítems no previstos		
4.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4.3	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	

	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0019 del 30 de enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 6 de 25	

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 2 del contrato No. 5042 de 2023 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" y corresponde a las actividades ejecutadas por el G.V. LTDA con el fin dar cumplimiento a los objetivos del contrato describiendo las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 17 al 30 de enero de 2024.

El presente informe contempla un resumen mensual del seguimiento realizado por G.V. LTDA a las actividades realizadas por el OAC de los siguientes Convenios:

- Convenio Solidario No. 3099 de 2023 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 4752 DE 2023 y cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3633 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias del INVIAS de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna y su contenido es acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión adoptado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS mediante Resolución 319 del 26 de enero de 2022. A continuación, se presenta informe mensual de las actividades de control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental efectuados por la interventoría a los Convenios solidarios durante el mes de enero de 2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 7 de 25	

2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de \$ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1.1. Localización


Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipía, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipía, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 8 de 25	

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.

Fuente:

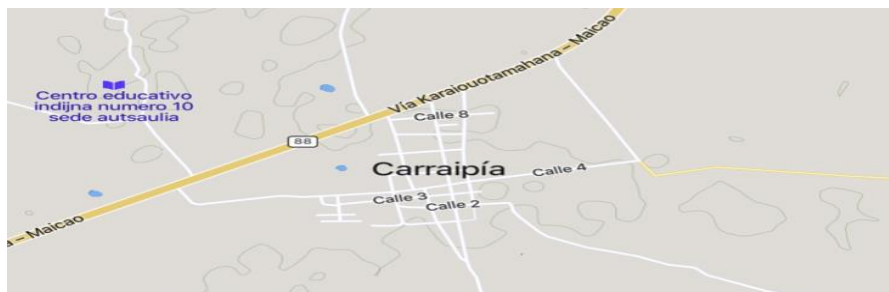

Mapa 2 . Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.

Fuente: Especificaciones técnicas

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

El corregimiento de Carraipía cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el transporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

A la fecha que abarca el presente informe no se realizó la indagación preliminar del estado de las vías antes de ser intervenidas.

2.1.4. Características técnicas del proyecto.

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

2.2.1. Información general del convenio

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023		
	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
	Desde 05 de Enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 9 de 25		

Convenio No.	3099	FECHA	04/09/2023	Modalidad de Contratación	DIRECTA	Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Corregimiento de Carraipia						NIT	900.266.341-3.
Rep. Legal	Clara Rosa Larrada Palacio						CC	32.736.609
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	18 días		Acta de Inicio		14/12/2023		Valor Inicial	191.049.980
Plazo Adicional	3.3 meses		Fecha Finalización		31/12/2023		Valor Adicional	N/A
Plazo Total	3.9 meses		Fecha finalización según suspensión 1		20/01/2024		Valor Total	191.049.980
Tiempo Transcurrido	0.9 meses		Fecha finalización según prórroga 1		30/04/2024		Valor del Anticipo	N/A
Actas de Suspensión	Número	Fecha		Actas de Reiniciación		Número	Fecha	
	1	29/12/2023				1	17/01/2024	
					Actas Parciales Suscritas			
					No.	Valor Acta	Valor Amortizado	Valor Pagado

Tabla 1: Información general del convenio
Fuente: Convenio Solidario

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 10 de 25	

2.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se adelantaron actividades técnicas, sociales ni ambientales por parte del OAC, las actividades realizadas corresponden a la revisión de la información.

2.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3099 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a revisión de la información del convenio y documentos técnicos.

2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

2.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales debido a que no adelantaron actividades de obra por parte del OAC.

2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social debido a que no se ha vinculado personal por parte del OAC.

2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

2.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 11 de 25	

2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo en el formato, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 12 de 25	

2.3.8. **Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.**

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

2.4. **Otros documentos seguimiento mensual.**

2.4.1. **Seguimiento a la inversión del anticipo.**

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

2.4.2. **Seguimiento programa de obra.**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 el OAC no ha entregado la programación de obra.

2.4.3. **Seguimiento programa de inversiones**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

2.4.4. **Actas de comité de obra**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo comités de obra.

2.4.5. **Actas de reunión.**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo reuniones entre las partes.

2.4.6. **Comité Operativo.**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo comités operativos.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 13 de 25	

3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3633 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de \$ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.


3.1.1. Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 14 de 25	

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 6. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente:

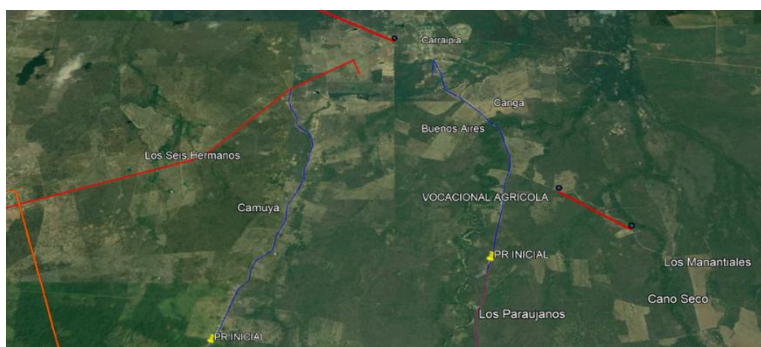

Mapa 4 . Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero
Fuente: Especificaciones técnicas

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el transporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

A la fecha que abarca el presente informe no se realizó la indagación preliminar del estado de las vías antes de ser intervenidas.

3.1.4. Características técnicas del proyecto.

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

3.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 1 C-5042/2023		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 15 de 25		

3.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	3633	FECHA	29/09/2023	Modalidad de Contratación	DIRECTA	Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda de Garrapatero						NIT	901.524.089-2
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						CC	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	16 días		Acta de Inicio		15/12/2023		Valor Inicial	191.913.876
Plazo Adicional	4 meses		Fecha Finalización		31/12/2023		Valor Adicional	N/A
Plazo Total	4.51 meses		Fecha finalización según suspensión 1				Valor Total	191.913.876
Tiempo Transcurrido	1.51 meses		Fecha finalización según prórroga 1		30/04/2024		Valor del Anticipo	N/A
Actas de Suspensión	Número	Fecha		Actas de Reiniciación		Número	Fecha	
					Actas Parciales Suscritas			
					No.	Valor Acta	Valor Amortizado	Valor Pagado

Tabla 2. Información del convenio

Fuente: Convenio Solidario

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 16 de 25	

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se adelantaron actividades técnicas, sociales ni ambientales por parte del OAC, las actividades realizadas corresponden a la revisión de la información.

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3633 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a revisión de la información del convenio y documentos técnicos.

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales debido a que no adelantaron actividades de obra por parte del OAC

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social debido a que no se ha vinculado personal por parte del OAC.

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

3.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 17 de 25	

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo en el formato, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

3.4.1. *Seguimiento a la inversión del anticipo.*

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

3.4.2. *Seguimiento programa de obra.*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 el OAC no ha entregado la programación de obra.

3.4.3. *Seguimiento programa de inversiones*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

3.4.4. *Actas de comité de obra*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo comités de obra

3.4.5. *Actas de reunión.*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo reuniones.

3.4.6. *Comité Operativo.*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se llevaron a cabo comités operativos.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 18 de 25	

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.

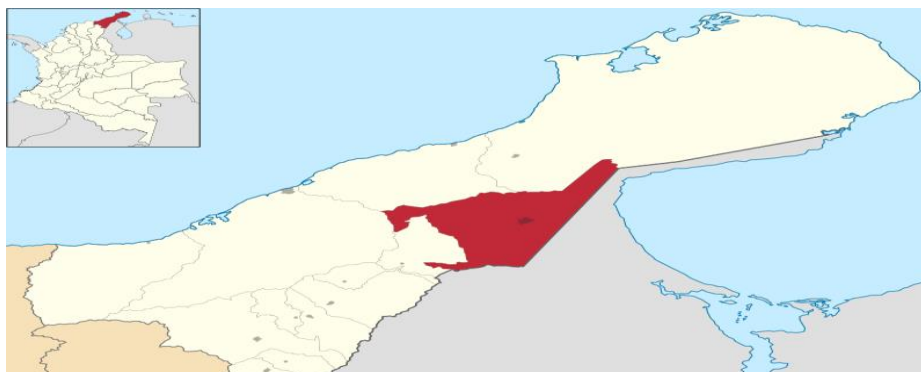


*Ilustración 5. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente:*

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de \$ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

4.1.1. Localización


Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 19 de 25	

Tabla 11: Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.

Fuente:

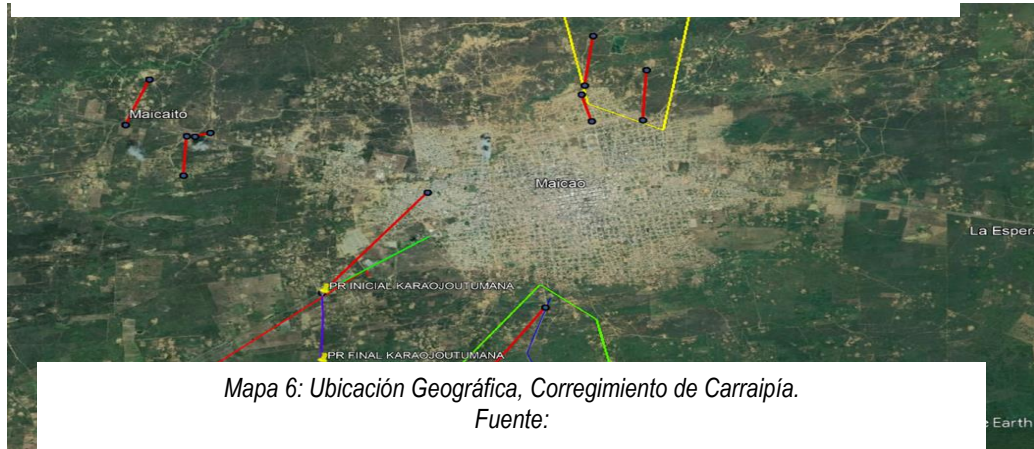

Mapa 6: Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.

Fuente:

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el transporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

A la fecha que abarca el presente informe no se realizó la indagación preliminar del estado de las vías antes de ser intervenidas.

4.1.4. Características técnicas del proyecto.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.

4.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.2.1. Información general del convenio

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 20 de 25		

Convenio No.	4752	FECHA	2/12/2023	Modalidad de Contratación	DIRECTA	Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao						NIT	901.702.605-7
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						CC	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	5 días		Acta de Inicio		27/12/2023		Valor Inicial	198.580.041
Plazo Adicional	3.3 meses		Fecha Finalización		31/12/2023		Valor Adicional	N/A
Plazo Total	3.4 meses		Fecha finalización según suspensión 1		20/01/2024		Valor Total	191.913.876
Tiempo Transcurrido	0.5 meses		Fecha finalización según prórroga 1		30/04/2024		Valor del Anticipo	N/A
Actas de Suspensión	Número	Fecha		Actas de Reiniciación		Número	Fecha	
	01	29/12/2023				01	17/01/2024	
					Actas Parciales Suscritas			
					No.	Valor Acta	Valor Amortizado	Valor Pagado

Tabla 3. Información del convenio
Fuente:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 21 de 25	

4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se adelantaron actividades técnicas, sociales ni ambientales por parte del OAC, las actividades realizadas corresponden a la revisión de la información.

4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3099 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a revisión de la información del convenio y documentos técnicos.

4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

4.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales debido a que no adelantaron actividades de obra por parte del OAC

4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social debido a que no se ha vinculado personal por parte del OAC.

4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

4.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 22 de 25	

4.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo en el formato, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.4.1. *Seguimiento a la inversión del anticipo.*

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

4.4.2. *Seguimiento programa de obra.*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 el OAC no ha entregado la programación de obra.

4.4.3. *Seguimiento programa de inversiones*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

4.4.4. *Actas de comité de obra*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se ha llevado a cabo comités de obra.

4.4.5. *Actas de reunión.*

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se ha llevado a cabo reuniones.

4.4.6. **Comité Operativo.**

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se llevaron a cabo comités operativos.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
	Desde 17 de enero hasta 30 de enero de 2024		
	Página 23 de 25		

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información del contrato

Convenio No.	5042	FECHA	21/12/2023	Modalidad de Contratación	Menor Cuantía	Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
Contratista	GV LTDA						NIT	825.002.653-1
Rep. Legal	Gelca Patricia Vanegas Mengual						CC	40.913.719
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías rurales en el municipio de la Maicao, departamento de La Guajira del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	5 días		Acta de Inicio		27/12/2023		Valor Inicial	\$71.922.529
Plazo Adicional	3.3 meses		Fecha Finalización		31/12/2023		Valor Adicional	N/A
Plazo Total	3.4 meses		Fecha finalización según suspensión 1		29/12/2023		Valor Total	\$71.922.529
Tiempo Transcurrido	0.43 meses		Fecha finalización según prórroga 1		30/04/2024		Valor del Anticipo	N/A
Actas de Suspensión	Número	Fecha		Actas de Reiniciación		Número	Fecha	
	01	29/12/2023					17/01/2024	
					Actas Parciales Suscritas			
					No.	Valor Acta	Valor Amortizado	Valor Pagado

Tabla 4: Información del contrato de iterventoría.
Fuente: Contrato interventoría

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 24 de 25	

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

5.3. Informe de especialistas

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se realizaron actividades por parte de los especialistas.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.5. Informe matriz de riesgos

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se cuenta con información del aplicativo que se deba gestionar.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con el Manual de interventoría INVIAS, a continuación, se relacionan los formatos de información de equipos, personal, financiero entre otros del contrato de interventoría.

6.1. Equipo contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se diligencia el MEPI-MN1-IN-15-FR-5 no se relaciona lo equipos debido a que a la fecha no se encuentran vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

6.2. Personal contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se relacionan en el formato MEPI-MN-IN-15-FR- 7, debido a que la interventoría no cuenta con profesional aprobado.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 C-5042/2023	
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	
	Desde 05 de enero hasta 30 de enero de 2024	
	Página 25 de 25	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se elabora informe de interventoría No. 2 del periodo comprendido entre el 17 al 30 de enero de 2024, en el cual no se llevaron acabado actividades por parte de los OAC, por lo que las actividades adelantadas por la interventoría correspondieron a revisión de la información técnica de los convenios.

En el período que abarca el presente informe, se estima que el objeto contractual de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" presenta un avance del 0% correspondiente al período que abarca el presente informe. G.V LTDA continúa tomando las medidas pertinentes para cumplir en el plazo contractual.

8. ANEXOS

8.1. Anexo de correspondencia enviada y recibida.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no existen correspondencias entre las partes.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024 no se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades técnicas.

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de 2024, no se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles

8.4. Bitácora de obra.

En el periodo comprendido del 17 al 30 de enero de, no se relaciona la bitácora, debido a que no se han iniciado las obras, por lo tanto, la bitácora no ha sido aperturada.
