

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	6
		Vigencia	29/07/2024

1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/10/2024	PERIODO REPORTADO DEL:	1/09/2024	AL:	30/09/2024
CONTRATO N°	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	CONTRATISTA	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.				
FECHA DE INICIO	29/07/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2024		
VALOR INICIAL	\$ 966.599.939,40	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0,00
		VALOR TOTAL	\$ 966.599.939,40		

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIO EL DIA 17 DE JULIO DE 2024, EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024. EL NUMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 3968280-1 DE SURAMERICANA Y LA DE RCE ES 0971121-9 DE SURAMERICANA. EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024. EL DIA 02/08/2024 SE REALIZA OTROSI ACLARATORIO, POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA ENCABEZADO, VIGENCIA FISCAL Y FECHA EN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL. EL DIA 27/08/2024 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER CORTE DE FACTURACIÓN Y SE AJUSTA LOS PAC DE ACUERDO A DIRECTRICES DE DIFIN EN PRIMER Y SEGUNDO CORTE DE EJECUCIÓN.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros	Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicación contractual	Dedicación ejecutada	Cumplió/ No cumplió	Observaciones	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	%	%	Si/ No	Detalle	
		Enchapes	800M2	Herramienta	1	Residente de obra	1	100	100	SI	
		Pintura	4 cuñetes			SISO	1	100	100	SI	
		Masilla	2 cuñetes			Maestro	1	100	100	SI	NO HA INGRESADO LA TOTALIDAD DEL PERSONAL YA QUE EL QUE SE ESTA REPORTANDO SON LOS ENCARGADOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES, SIN EMBARGO, LA EMPRESA YA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SE ENCUENTRAN APROBADOS, UNA VEZ EMPIECEN CON ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA INGRESARÁ ESTE PERSONAL.
		Cielo raso	30M2			Estucador-pintor	2	100	100	SI	
						Enchapador	3	100	100	SI	
						Ayudante	5	100	100	SI	
						TOTAL	13				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

4.1 PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	2,95%
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)	
Semana 6	3,80%
Semana 7	3,75%
Semana 8	4,00%
Semana 9	4,00%
Semana 10	

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)
18,50%		25,70%		-7,20%

4.2 GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

4.2.1 GRAFICO DE PORCENTAJES

AVANCE	TOTAL
PROGRAMADO	25,70%
EJECUTADO	18,50%

4.2.2 GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	55,45%
	EJECUTADO	5,00%
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,00%
3. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,01%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	10,71%
	EJECUTADO	0,20%
5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,00%
6. CIELO RASO	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	1,50%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	3,50%
8. PINTURA	PROGRAMADO	31,73%
	EJECUTADO	3,80%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	1,67%
10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	1,00%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	1,56%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	0,00%
14. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,30%



5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	135	64	71
Proyección	145	64	81

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
64	-10	20/12/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas en el periodo del 01 al 30 de septiembre son:

- Demolición de enchapes
- Enchape piso en porcelanato
- Instalación vinilo en muros.
- Instalación sanitarios.
- Instalación divisiones baños.
- Instalación cielo raso.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuye al contratista?		
Demoliciones de enchapes (PRELIMINARES)	SI	X	NO
Desmante unidades sanitarias (PRELIMINARES)	SI	X	NO
Estuco y pintura	SI	X	NO
Acabados e impermeabilizaciones	SI	X	NO

OBSERVACIONES: El porcentaje de atraso ha venido disminuyendo, se estima en las próximas semanas quedar en 0 con el atraso ya que se están ejecutando actividades de gran peso como enchapes de piso.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 966.599.939,40	\$ 966.599.939,40	\$ 178.820.988,79	18,50%	\$ 787.778.950,61	81,50%
Adiciones	N/A	\$ 0,00				
Reducciones		\$ 0,00				
TOTAL	\$ 966.599.939,40	\$ 966.599.939,40				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 966.599.939,40	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 0,00	Se tramitó primer pago por valor de \$147.507.264,41, pendiente expedición de factura por parte del contratista.
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA PEERSONAL VINCULADO AL CONTRATO	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACIONESTUDIOS DE SEGURIDAD	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El porcentaje de atraso ha venido disminuyendo, se estima en las próximas semanas quedar en 0 con el atraso ya que se están ejecutando actividades de gran peso como enchapes de piso.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):






Durante el periodo se reportaron lluvias prologadas, pero todas las actividades se realizan bajo techo.

ELABORO:

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ
Gerente Proyecto
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



02 Sep. 2024

Se retoman labores en las oficinas de la puerta aérea con las actividades de demolición de muros para ventanilla y sacado exterior de escombros.

Se continuaron actividades de remoción de pintura deteriorada en los muros.

- Talento humano

1 Ing. R.

1 Hse

1 Aux. ingeniería

1 Estrecode

1 Ayudante

Ing. Sánchez

- Estado del tiempo

Soleado, todos los trabajos se hacen bajo techo.

In. Residente.

Supervisores Contrato.

Martes 03. Sep. 2024

- Actividades

Se continuo en el Ap. 405 de flor amarilla con la instalación de la primera mano de los muros del apartamento.

líder

Se continuo con la enmuesillado de los muros de las oficinas del ESPEC y con los filos de la ventana.

- Talento humano

Inq. Residente

1 Ofc

1 Aux Inq


1 Maestro gral

1 Estucador

1 Aydonite

- Estado del tiempo

los trabajos se realizan bajo techo



Miercoles 4 Sep. 2024

- Actividad

Se hecho 2 mano de masillo en muros de las oficinas de la puerta aérea.
Se hecho primer mano de vinilo en las oficinas oporl. 405 de flor amarillo.

- Talento humano

1 Inq. R.

líder

1 Hse

1 Aux. Ing.


1 Maestro gral

1 Estucador

1 Ayudante.

Estado del tiempo

Solado todos los trabajos se hacen
bajo techo.


Ing. R

06-Sep-24

El contratista ingreso a laborar (1 oficial y 1 ayu-
dante), 01 residente y 01 aux, el dia 05 de
septiembre realizaron 06 estudios de seguridad,
faltando aún que incorporen mas personal, el
atraso aún persiste, al dia 05-09-24, ingreso
material de parcelación, es necesario reportar
los puentes para disminuir el personal.

M4 Sánchez Supervisor

Sabado 07-Sep-2024

- Actividad

Se estructuro para instalar el cableado
Se sacaron filos de ventilación. Se
enmalla muros de las habitaciones
Se fijó la malla instalada en
area social.

líder

Se instaló enchape en el apartamen-
to 405 de flor amarillo.

- Talento humano

1 Ing.

1 Aux. Ing.

1 Suro

1 Maestro

2 Enchapador

2 Ayudantes

- Estado del tiempo

Soleado, todos los trabajos se hacen
bajo techo.

Ing. R. →

Supervisor Contrato.

Domingo 08-Sep-2024

- Actividad

Se terminó de instalar estructura para
cielo raso PVC, y se inició a instalar
cielo raso en el área Social.

- Talento humano

1 Ing. R.

1 Suro

1 Aux. Ing.


1 Maestro gral

2 Ayudantes

líder

- Estado del tiempo

Boleado, todos los trabajos se realizan bajo techo.



Ing. R.O.

Supervisor Contrato.

Lunes 09-sep-2024

- Actividad.

Se continuo instalando cielo raso PVC,
Se continuo instalando enchape piso
Apto 405 Flr Amarillo y se inicio a
instalar enchape Apto 208 Flr Amarillo
Se retiro escombro de las oficinas. del espe

- Talento humano

1 Ing. R.

1 SUD

1 Aux Ing.

2 Enchopadores

2 Ayudantes

1 Maestro gral.

- Estado del tiempo

Boleado, todas las actividades se realizan bajo techo.



Ing. R.O

Supervisor Contrato.

Mar 10 - Sep - 2024

- Actividad

Se termino de instalar crebo rojo de las oficinas del ESDEE, se termino de instalar enchape piso del apartamento 405 y se continuo instalando enchape del apto 208 de flor Amarillo, se instalo pintura muro en las oficinas del Espec.

- Talento humano

1 Ing.

1 Hse

1 Aux Ing.


1 Hce tro

2 Ayudantes

2 Enchapadores

- Estado del tiempo

"Soleado" Toda las actividades se realizan bajo techo

 Ing. R. L.

Supervisor Contrato

Miercoles 11 - Sep - 2024

- Actividad

Se continuo enchapando apartamento

405-208 de Flor Amarillo, si continuo instalando celo rojo PVC en las oficinas del ESDEB, se desmontaron Ventanas.

Talento humano

1 Ing.

1 Aux. Ing.

1 ASE

2 Encargados

1 Maestro

2 Ayudantes

~~Ing. B.~~

Ing. B. Supervisor Contrato

Jueves 12 Sep. 2024

Actividad

Se desmontaron marcos de puertas, se termino de instalar cielo rojo en las oficinas del ESDEB y se instalo estuco, se encontro fuga de agua en las oficinas del ESDEB se reparo y se poneto muro, se continuo enchapando Aptos 405-208 de Flor Amarillo.

Talento humano

1 Ing. R.

1 Aux Ing.

1 ASE

líder

- 1 Maestro
- 2 Enchapadores
- 2 Ayudantes.

Estado del tiempo

"Soleado" Todos los trabajos se realizan bajo techo

~~Ingr. R.~~ + Supervisor Contrato

Viernes 13 Sep 2024

Actividad:

Se inicio a enchapar oficinas del BODEB
se continuo enchapando Apto
405 y 208 de flor Amarillo,
Nota: Se realizo comite de obra
(avance).

Talento humano:

- 1 Ing.
- 1 Aux Ing.
- 1 SWO
- 1 Maestro
- 2 Enchapadores
- 2 Ayudantes.

Sabado 14 Sep. 2024

Actividad:

Se continuo enchapando los pisos

de los Apto 405 y 208 de las oficinas del ~~EDER~~ Flor Amarillo, y se continuo enchapando los pisos de las oficinas del EDER.

Talento humano.

1 Ing.

1 Aux. Ing.

1 Svo

1 Muebro

2 Enchapadores

2 Ayudantes.

Estado del tiempo

Todas las Actividades se realizan bajo techo.

Ing. R.

Domingo 15 de sept. 2024

Lunes 16 Sep 2024.

Actividad.

Se continuo enchapando pisos de las oficinas del EDER, se continuo enchapando pisos de los Aptos 405 y 208 de Flor Amarillo, se instala vinilo en muros de Aptos y oficinas del EDER la primera mano.

Talento humano.

1 Ing. R.

1 Aux Ing.

1 Suo

1 Maestro

2 Ayudantes.

1 Estucador- Pintor.

Estado del tiempo

Todas las act. se hacen bajo techo

Ing. R.

1 Aux Ing.

1 Suo

1 Maestro

Ing. R. D

Martes 17 Sep. 2024

→ Actividad.

Se continuo instalando y termino pwo enchape de los Aptos 405 y 208 de flor Amarilla, Se continuo instalando enchape pwo de las opicinas del ESPER, Se hizo mantenimiento a los muebles de cocinas.

Talento humano

1 Ing.

1 Aux Ing.

1 Suo

líder

1 Maestro

2 Enchapadores

2 Ayudantes

1 Estucador - Pintor

Estado del tiempo

Se hacen todas las actividades se hacen bajo techo

Talento humano

1 Ing.

1 Aux ing.

1 Sivo

1 Maestro gral

2 enchapadores

2 Ayudantes

1 Pintor - Estucador.

Ing. B.

Miércoles 18 Sep 2024

Actividad.

Se inicio a enchapar baños de los Aptos 405-208 de la 1ra flor Amarillo, se continu instalando enchape pvv oficina del ESDEB, se instalo pintura muro segunda mano Apto 405 flor Amarillo. se instalaron sanitarios

- Talento humano

- 1 Ing.
- 1 Aux. Ing.
- 1 Sudo
- 1 Maestro
- 2 Enchapadores
- 2 Ayudantes
- 1 pintor - Estucador.

- Estado del tiempo

Soleado



Miércoles 19 sep 2024.

- Actividad

Se inicio enchapar baños oficinas del Eder, se continuo enchapando pro oficinas del Eder, se continuo enchapando baños. Apts 401-208 y la Ama-nillo. se instaló unido muro oficinas del Eder primera mano. se instalarán divisiones de baños y succiones de baño.

- Talento humano.

- 1 Ing.
- 1 Aux Ing.
- 1 Sudo
- 3 Enchapadores
- 1 Maestro gral.
- 3 Ayudantes

Estado del tiempo 15 de octubre

Soleado Todos los trabajos se realizan bajo techo.

Inq. R.

- Viernes, 20 Sep. 2024

- Actividad.

Se continuo enchapando baños oficinas del ESDEB, se embogullo pous oficinas del ESDEB, se continuo enchapando baños Aptos 405-208 floor Amarillo, se instalo vinilo nuevo Aptos floor Amari. recorrido por los frentes de trabajo avance obra.

Talento humano

1 Inq. R.

1 Aux. Inq.

1 Siso

3 Enchapadores

3 Ayudantes

1 Hualtro gral

1 Estucador - Pintor.

- Estado del tiempo 15 de octubre

Soleado Todos los trabajos se hacen bajo techo.

Inq. R.

Sábado 21 Sep. 2024

Actividad


Se continuo enchapando baños oficina del ESDEB, se instalaron sanitarios Aptus 405-208

Talento humano

- 1 Inq.
- 1 Aux. Inq.
- 1 SWO
- 1 Maestro qual
- 2 Enchapadores
- 2 Ayudantes

Estado del tiempo

Soleado Todos los trabajos se hacen bajo techo.



Domingo 22 sep 2024

Lunes 23 Sep. 2024

Se embagillo baño oficina del ESDEB, se inicio a enchapar baño #2 de las oficinas del ESDEB se instalaron accesorios baños Aptus 405-208 flw. Amcilla se demolio enchape A. 503 T. Leticia

- Talento humano

1 Inq.

1 Aux. Inq.

1 Siso


1 Maestro ojal

2 enchapadores

2 Ayudantes

- Estado del tiempo

Severo Todos los trabajos se hacen bajo techo.



Martes 24 Sep 2024

Se continuo enchapando baño + 2 opciones del EDER, se inicio a instalar cielo raso Apto T3-503 Torres de Leticia, se inicio a bajar escombros de demolición Torres de Leticia.

- Talento humano.

1 Inq.

1 Aux. Inq.

1 Siso

1 Maestro ojal

2 enchapadores

2 Ayudantes

NOTA Supervisión de paso

recpta junto con supervisión suplente

q se evidencia que en obra solo

estaba: 01 maestro, 01 enchapador,

02 ayudantes, 01 siso y 01 auxiliar

accidente, no estaba el residente de

obra. los apartamentos no han empezado

la ejecución. (02)

M. Sánchez

Supervisor.

- Estado del tiempo

Todos los trabajos se realizan bajo techo

líder

Viernes 25 Sep 2024

- Actividad

Se continuo instalando cielo raso Apto 503 Torres de Leticia, se termino de bajar escombro, se continuo instalando enchape opalina del ESDEB piso # 2

- Talento humano

1 Ing. B.

1 Aux. Ing.

1 Sudo

1 Maestro ojal

1 Enchapador

2 Ayudantes

- Estado del tiempo

Selecado Todos los trabajos se realizan al día bajo techo

Ing. B.

Sábado 26 Sep. 2024

- Actividad

Se continuo instalando cielo raso en Apto 503 Torres de Leticia, se realizó demolición en apartamento 502 torres de Leticia, se quitó pintura deteriorada para instalación de vitrinas

- Talento humano

1 Ing.

1 Aux. Ing.

1 Suo

1 Maestro qual

2 Ayudantes

1 Estucado-pintor

- Estado del tiempo

"Solado" todos los trabajos se hacen bajo
techo.

Ing. R.

Viernes 27 - Sep - 2024

- Actividad.

Se continuo raspando muros para quitar
pintura deteriorada Ap 503 T3 Torres
de letricia, Se bajo escombro del
Ap. 502 T2 Torres de letricia y se
inicio a raspar muro para remover
pintura deteriorada y estucar.

Nota: Se hizo Comite de obra.

- Talento humano

1 Ing. R.

1 Aux. Ing.

1 Suo

1 Maestro qual

- 1 Enchapador
- 2 Estucadores - pintores
- 2 Ayudantes.

Estado del tiempo

"Soleado" Todos los trabajos se realizan bajo techo.

Sábado 28-Sep-2024

→ Actividad


Se continuo reasando los muros de los Apt. 503 T₃ y 502 T₂ de Torre de leticia para enmasillar los muros, y se inicio a nivelar el piso del Ap. 503 T₃ de leticia.

→ Talento humano

- 1 Ing. R.
- 1 Aux. Ing.
- 1 Spso
- 1 Maestro gral
- 2 Enchapadores
- 2 Ayudantes
- 2 Estucadores - pintores

Estado del tiempo

"Soleado" Todos los trabajos se hacen bajo techo.


Ing. R.

Domingo 29-sep-2024

- Actividad.

- Lunes 30-sep-2024

Actividad.

Se continuo demoliendo Ap. 503 de torres de leticia. Se demolieron baño del Apto 708 de Flor amarillo.

- Talento humano.

1 Ing.

1 Aux Ing.

1 SUD

1 Maestro ojal.


2 Enchapadores

2 pintores

2 Ayudantes

- Estado del tiempo

Soleado. todos los trabajos se realizan bajo Techo.


Ing. R.

- Martes 01-oct-2024

Se termino de demoler enchape ap. 502 T leticia y se inicio a demoler

líder

INFORME DE OBRA N° 02

PERIODO: 29 de agosto de 2024 al 28 de septiembre de 2024.

CONTRATO DE OBRA N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024.



**NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS
NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**

CONTRATISTA: AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S

R/L: CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL

YOPAL, SEPTIEMBRE 2024

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. INTRODUCCION.....	3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	3
3. LOCALIZACION.....	6
3.1 LOCALIZACION GENERAL.....	6
.....	7
3.2 Localización Exacta.....	7
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	8
4.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	8
045-00-B-COFAC-BACOF-2024.....	8
5. COMPONENTE JURIDICO	8
5.1 4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA	8
GARANTIAS	8
6. COMPONENTE TECNICO.....	9
6.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO.	9
6.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS DEL PERIODO ¡Error! Marcador no definido.	
7. CURVA “S” PROGRAMA AVANCE:	20
8. RECURSOS DEL CONTRATISTA.....	21
8.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO.....	21
8.2 HERRAMIENTA Y EQUIPO	21
9. CONCLUSIONES	22

1. INTRODUCCION.

El presente documento, compila la información referente a las actividades realizadas en el mes de agosto-septiembre de 2024 en el desarrollo del contrato de obra N° **045-00-B-COFAC-BACOF-2024**, que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE**

Dentro del periodo del 29 de agosto al día 28 de septiembre de 2024, la empresa contratista realizo actividades de demoliciones de enchapes, alistados de pisos, enchapes de pisos, instalación de vinilos, instalación de unidades sanitarias, instalación de divisiones de baños, instalación de mármol, instalación de accesorios para baños y aseo y limpieza de los apartamentos 405 y 208 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB.

El día 08 de agosto de 2024 se dio inicio efectivo a las actividades de campo.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de obra comprende las adecuaciones y mejoras de los bienes muebles del Grupo Aéreo del Casanare, contemplando las siguientes capítulos y actividades:

PRELIMINARES:

DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA

DEMOLICIÓN MUROS

DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS

DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA

DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS m 32,00 1.1.8 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.

DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS

ESTRUCTURA

PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA

MAMPOSTERIA

MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR

MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS
LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO

COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS

PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS

CIELO RASO

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO

PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS

CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM

PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA

CARPINTERIA EN MADERA

Correo: administrativo@amcis.com.co

Página web: www.amcis.com.co

PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA

MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).

MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SANITARIO MANANTIAL BLANCO

MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))

PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.

VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CARPINTERIA METALICA

FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX

RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO) POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.

CUBIERTA

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

3. LOCALIZACION.

3.1 LOCALIZACION GENERAL

El proyecto está localizado dentro de la **ciudad de Yopal**, es uno de los 19 municipios del departamento de Casanare, en el oriente de Colombia.

Yopal es la Ciudad capital del departamento de Casanare el cual lo baña el rio Cravo sur, en el Piedemonte de la cordillera oriental, por su topografía el Municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1906 Km2, Medio 106 Km2, Frio 25 Km2.

Su jurisdicción tiene una extensión de 2.595 km², equivalente a un 5,79% de la superficie total de Casanare, y su población es de 181.548 habitantes y Así mismo se caracteriza por

Correo: administrativo@amcis.com.co

Página web: www.amcis.com.co

ser el municipio capital de departamento más joven con tan solo 77 años de vida jurídico-administrativa, conformado en: siete comunas las cuales se dividen en 124 barrios que conforman el área urbana en su parte rural por 11 corregimientos (El Charte, Mata de Limón, La Chaparrera, El Morro, El Taladro, Punto Nuevo, Quebrada seca, Morichal, Tacarimena, Tilodirán, Alcaraván la Niata) y 96 veredas.

La ganadería y la agricultura es la actividad principal que se desarrolla; sin embargo, el municipio también ve reflejado su potencial en el sector minero energético dada la explotación de hidrocarburos que allí se realiza.

*Ilustración 1 Localización General
(fuente google)*



3.2 Localización Exacta

El proyecto se encuentra localizado más exactamente en la zona urbana del municipio de Yopal Casanare, Instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare Yopal – Casanare. Dirección: Cl. 40 #19-45, Yopal, Casanare

	<p align="center">INFORME N°2 CONTRATO No. 045-00-B-COFAC-BACOF 2024</p>	
---	--	---

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

Contrato Número	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
Fecha de suscripción	17 de julio de 2024
Objeto	“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.”
Entidad contratante	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Contratista	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
Valor total inicial	\$ 966.599.939.40,00
Valor Total del Contrato	\$ 966.599.939.40,00
Plazo	cuatro (04) meses y trece (13) días
Fecha de inicio	29 de julio de 2024
Fecha de terminación	10 de diciembre de 2024
Teléfono	3132471470
E-mail	contrato.cofac.yopal@outlookl.com

5. COMPONENTE JURIDICO

5.1 4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS

ASEGURADORA: SURAMERICANA			PÓLIZA NO: 3968280–1	
TIPO DE AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	% Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	30/05/2025	\$ 289.979.982	30%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	16/07/2024	30/11/2027	\$ 48.329.997	5%

Correo: administrativo@amcis.com.co

Página web: www.amcis.com.co

	INFORME N°2 CONTRATO No. 045-00-B-COFAC-BACOF 2024	
---	---	---

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 50	30/11/2024	30/11/2027	\$ 483.299.970	50%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	16/10/2024	10/12/2024	\$260,000,000.00	

6. COMPONENTE TECNICO.

6.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO.

A continuación, se presenta cuadro anexo cantidades programadas vs ejecutadas para el mes de septiembre de 2024

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

1.1.1 DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA: Esta partida se refiere al desmonte de muebles de madera indicados por la supervisión del contrato, utilizando herramienta menor.

1.1.2. DEMOLICION DE MUROS e=0,15 M: Esta partida de trabajo consistió en la demolición de muros, para la ampliación de una ventana en las oficinas del ESDEB.

1.1.3 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS: Se refiere esta actividad al desmonte de puertas, ventanas con marco y tapa luces utilizando herramienta menor.

1.1. 4 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES: Consiste en la demolición y retiro de acabados de piso y paredes (baldosín, vinisol o cerámica) a sitio de acopio autorizado y alistados hasta de un espesor de 10 cm

1.1.5 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA: Este ítem se refiere al desmonte de cielo raso con su correspondiente estructura de soporte.

Correo: administrativo@amcis.com.co

Página web: www.amcis.com.co


1.1.6 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES: Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta previamente indicada por la supervisión

1.1.8 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA: Consiste en la demolición y retiro de acabados de guarda escoba a sitio de acopio autorizado y alistados hasta de un espesor de 10 cm, que se encuentran construidas en las diferentes áreas de las edificaciones

1.1.9 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS: Esta partida consiste en el desmonte de todas las divisiones de los baños, sanitarios y lavamanos de ellos alojamientos externos.

RAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO PRELIMINARES

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	55,45%
% EJECUTADO	5,00%

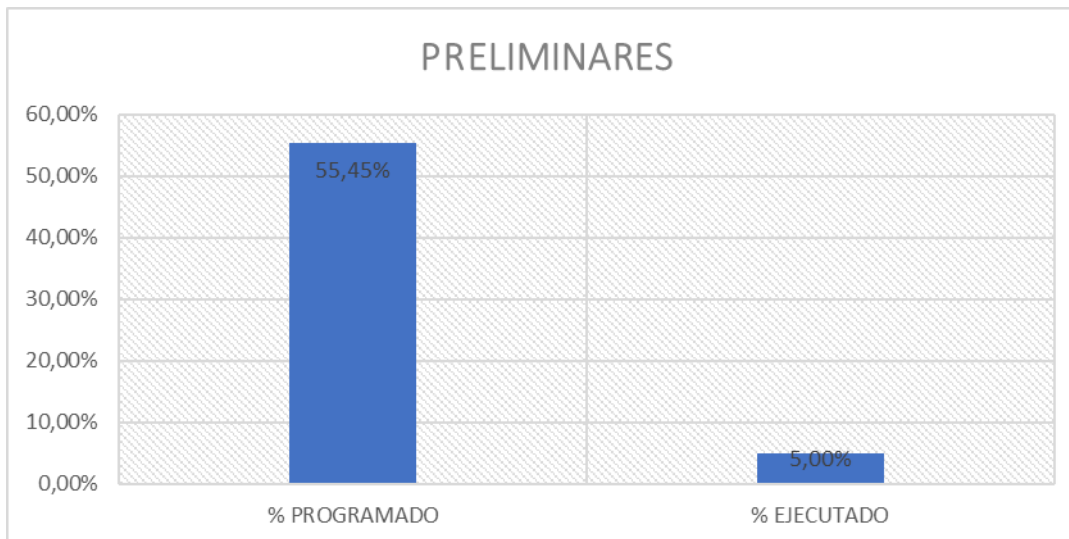


MANPOSTERIA: Esta actividad correspondió a la instalación de ladrillo tolete en la ventana de las oficinas del ESDEB

4.1.1 INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED: Esta partida de trabajo correspondió a la instalación y puesta en funcionamiento de luminarias LED cuadrada de 60x60, en las oficinas del ESDEB

4.1.4 LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI: Esta actividad correspondió en el suministro, instalación y puesta en servicio de bala LED redonda en los baños de las oficinas del ESDEB.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS


% PROGRAMADO	
ACUMULADO	10,71%
% EJECUTADO	0,20%

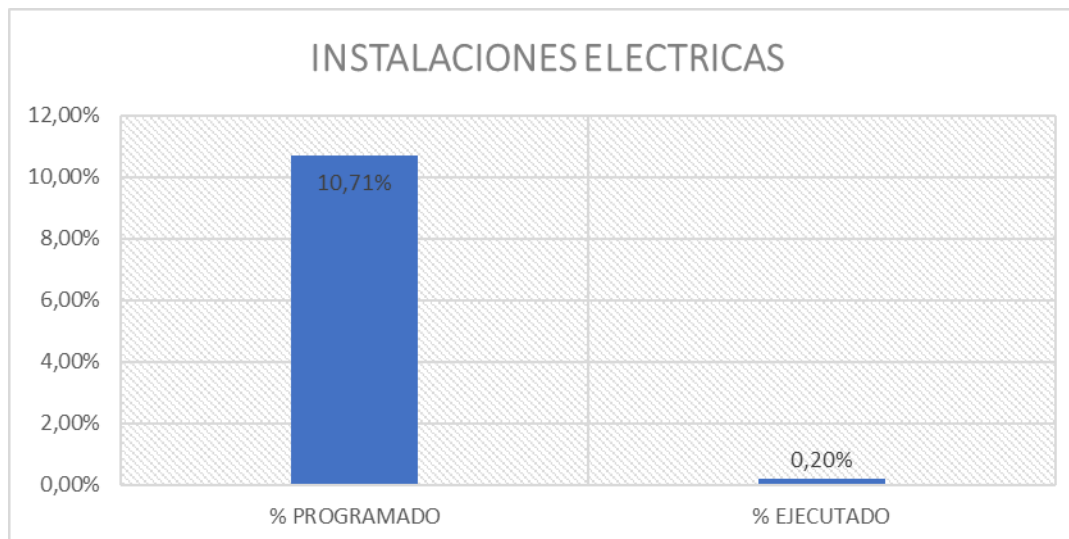

6.1.1 CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: Esta actividad correspondió a la instalación de cielo raso en PVC al apartamento 503 del Torres de Leticia.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO CIELO RASO

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	100,00%
% EJECUTADO	1,50%

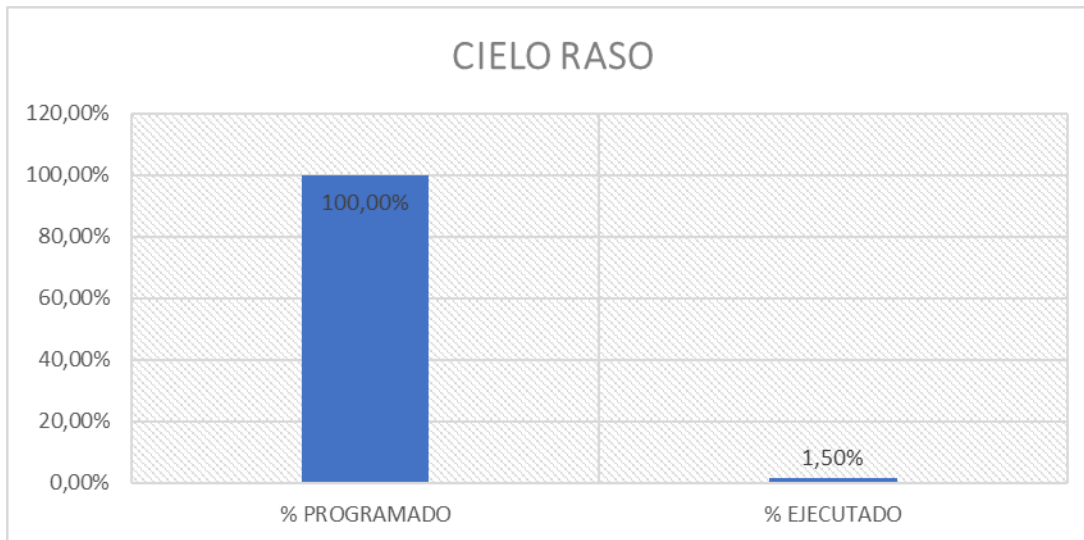

7.1.1 ALISTADO DE PISO 4CM – IMPERMEABILIZADO: Este ítem corresponde la instalación de morteros en las áreas que el supervisor indique.

7.1.2 PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM: Este ítem consiste en el suministro de porcelanato en los apartamentos 405-208 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la Fuerza Aérea.

7.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3: Este ítem consiste en la elaboración y aplicación de Pañete interior liso 1:3 en los muros siguiendo para ello las recomendaciones e indicaciones del cliente. (lugar de fijación del pañete)

7.1.4 CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

Este ítem correspondió al suministro e instalación de piso cerámico en el área de los sanitarios y la zona húmeda de las duchas de los apartamentos 405-208 T2 de flor Amarillo y las oficinas del ESEB.

7.1.5 CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:


Este ítem consistió en el suministro e instalación de cerámica estructurada en los muros de los baños de los apartamentos 405-208 de Flor amarillo y las oficinas del ESDEB.

7.1.6 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM:

Este ítem comprendido en el suministro e instalación de porcelanato para guarda escoba en los apartamentos 405-208 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la fuerza aérea.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES


% PROGRAMADO	
ACUMULADO	0,00%
% EJECUTADO	3,50%

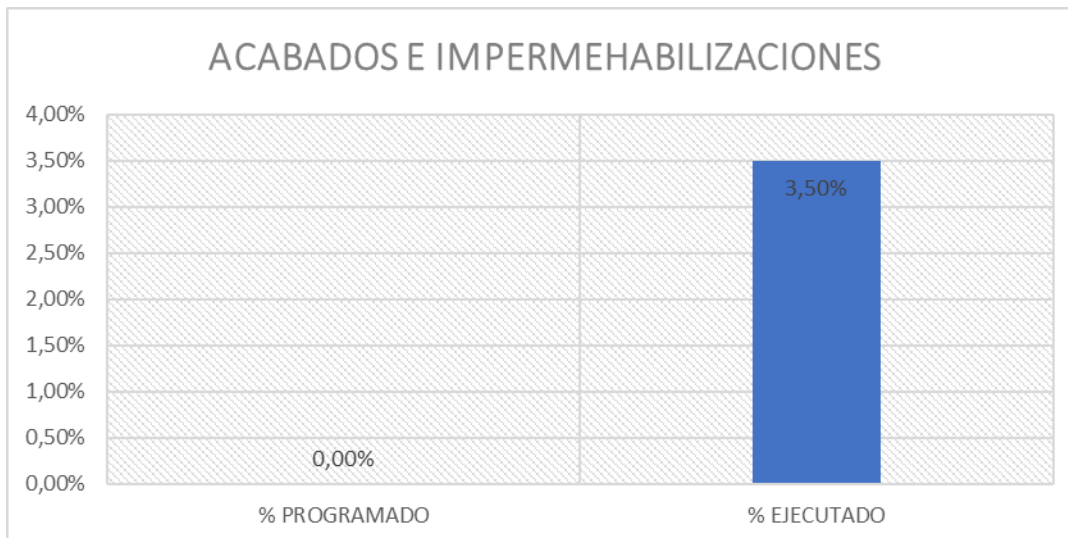

8.1.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES): Esta partida de trabajo correspondió a la instalación de estuco y pintura en los muros de los apartamentos 405-208 T2 de Flor Amarillo y ls Oficinas del ESDEB de la fuerza aérea.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO PINTURA

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	31,73%
% EJECUTADO	3,80%

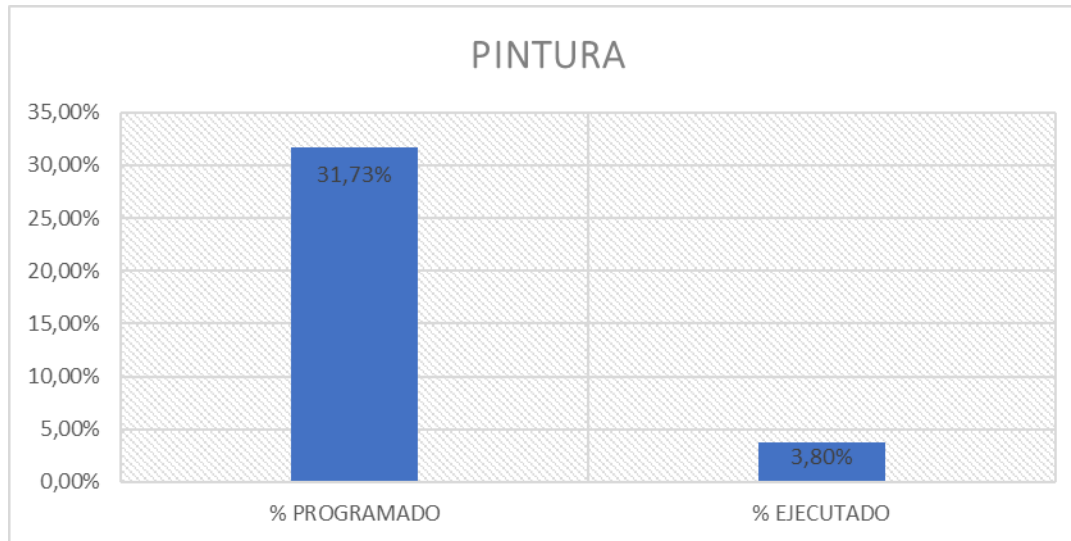

9.1.1 PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

Esta actividad correspondió al suministro e instalación de puertas en madera en las oficinas del ESDEB de la fuerza aérea.

9.1.2. MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA:


Esta actividad correspondió al suministro y cambio de meson existente por meson en granito con lavaplatos y mantenimiento al mueble en madera.

9.1.3 MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).

En esta actividad se realizo mantenimiento al mueble lato del meson del lavaplatos, (cambio de visagras, cremalleras, y piezas dañads)

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO CARPINTERIA EN MADERA

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	0,00%
% EJECUTADO	1,67%

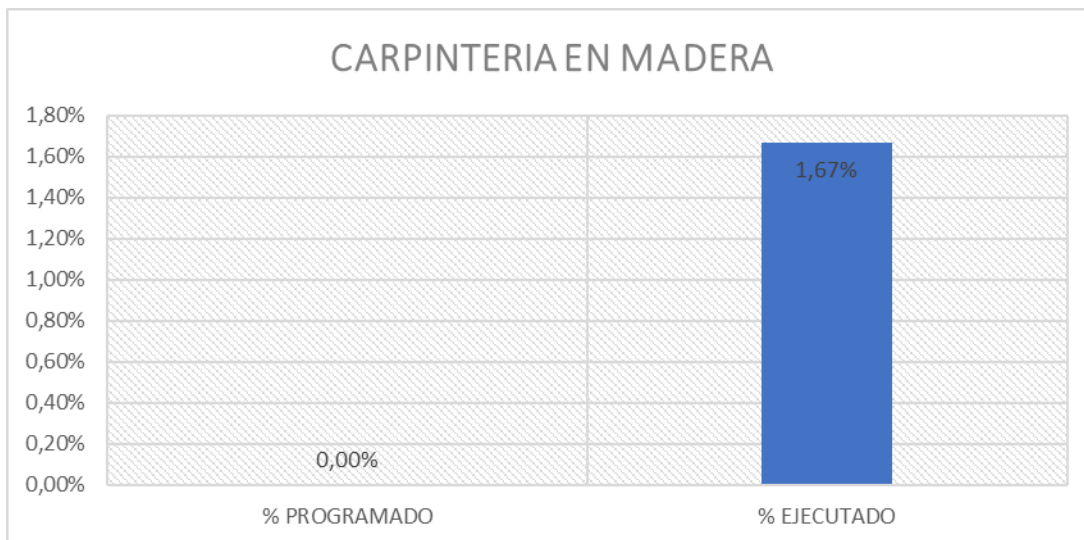

10.1.1 SANITARIO MANANTIAL BLANCO.

En esta actividad consistio en el suministro e instalacion de sanitario en los apartamentos 405-208 T2 de flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la Fuerza Aerea.

10.1.2 MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI:

Esta partida de trabajo correpondio al suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de lavamanos con mueble y griferia en los baños de las ofiicnas del ESDEB y los apartamentos 405-208 T2 de Flor Amarillo.

Correo: administrativo@amcis.com.co


Página web: www.amcis.com.co

10.1.3 ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN):

Esta partida de trabajo correspondió al suministro e instalación de accesorios de baño (taolleras, cepillera, javoneras, papelera) en los baños de los apartamentos 405-208 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la Fuerza Aérea.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	0,00%
% EJECUTADO	1,00%

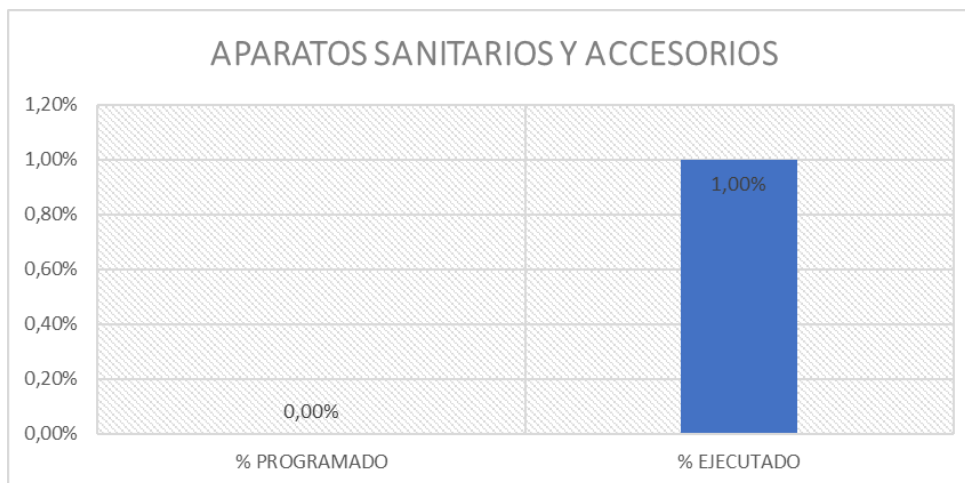

11.1.3 VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN


Esta actividad comprendió en el suministro e instalación de ventanearía en aluminio corrediza en las oficinas en las oficinas el ESDEB de la Fuerza Aérea.

11.1.4 DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Esta actividad correspondió al suministro e instalación de divisiones en vidrio en los baños de los apartamentos 405-208 de Flor Amarillo.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	0,00%
% EJECUTADO	1,56%

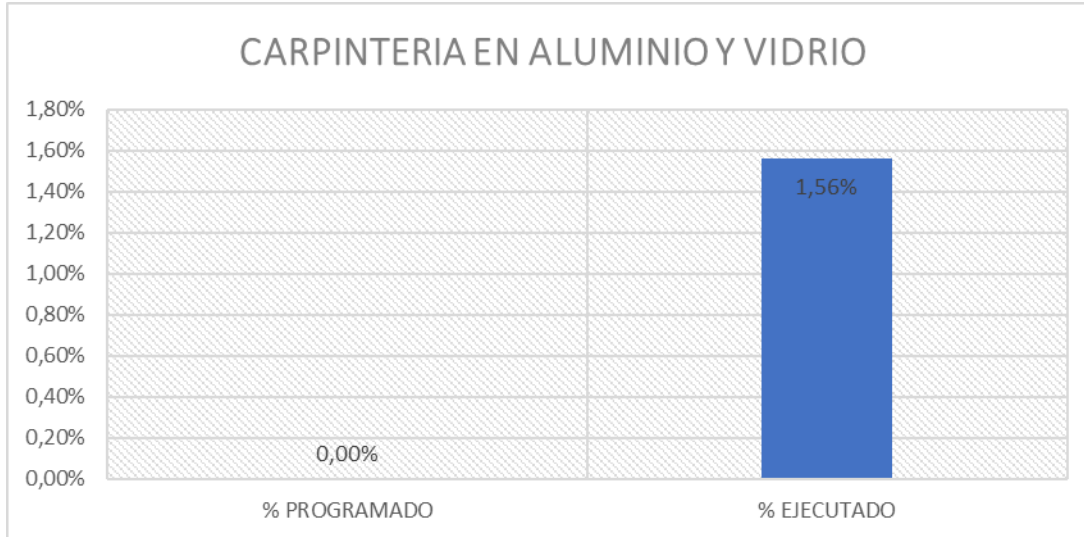

13.1.1 TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRANSPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.


Esta actividad corresponde al desmonte, suministro e instalación de teja en las instalaciones de Bomberos

13.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de estructura de soporte de teja para la guardia.

GRAFICO PROGRAMA – AVANCE CAPITULO CUBIERTA

% PROGRAMADO	
ACUMULADO	100,00%
% EJECUTADO	0,00%

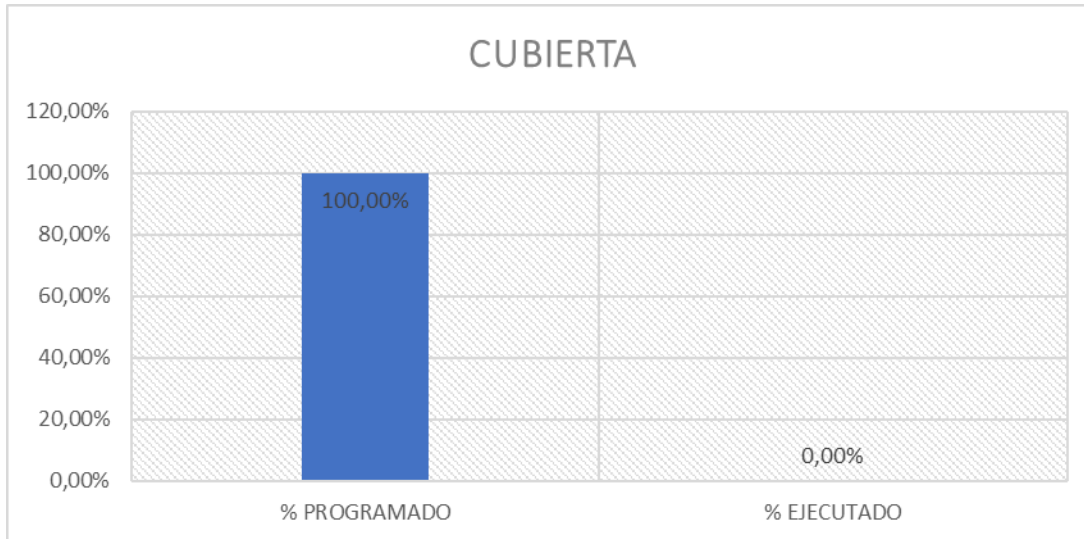


14.1.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

Esta actividad correspondió al aseo interior a los apartamentos después de ser intervenidos con el mantenimiento.

14.1.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD


Esta partida de trabajo consistió en el retiro de material de demolición fuera de la base de la Fuerza Aérea.

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	
% PROGRAMADAS	0,00%
% EJECUTADO	0,30%

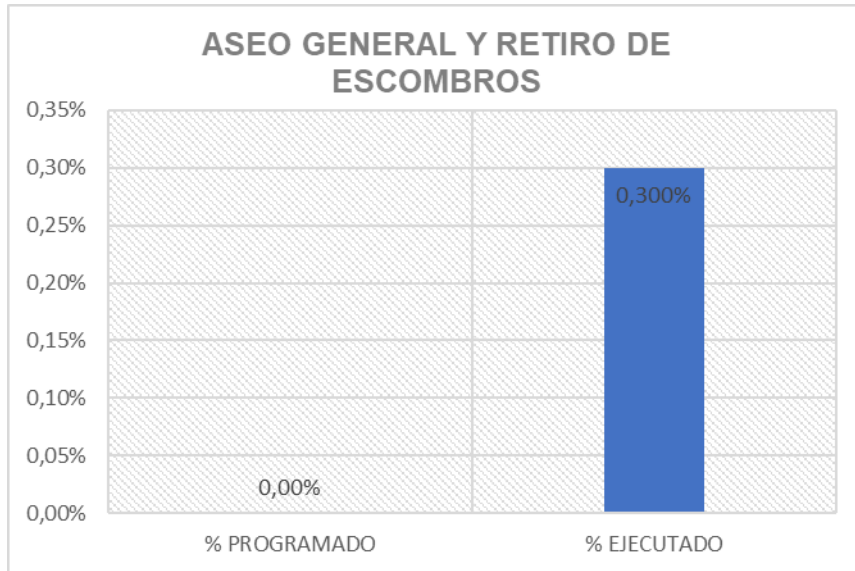

7. CURVA "S" PROGRAMA AVANCE DEL PROYECTO

Fecha de reporte	28-Sep-24
Avance programado:	25,70%
Avance real:	18,50%

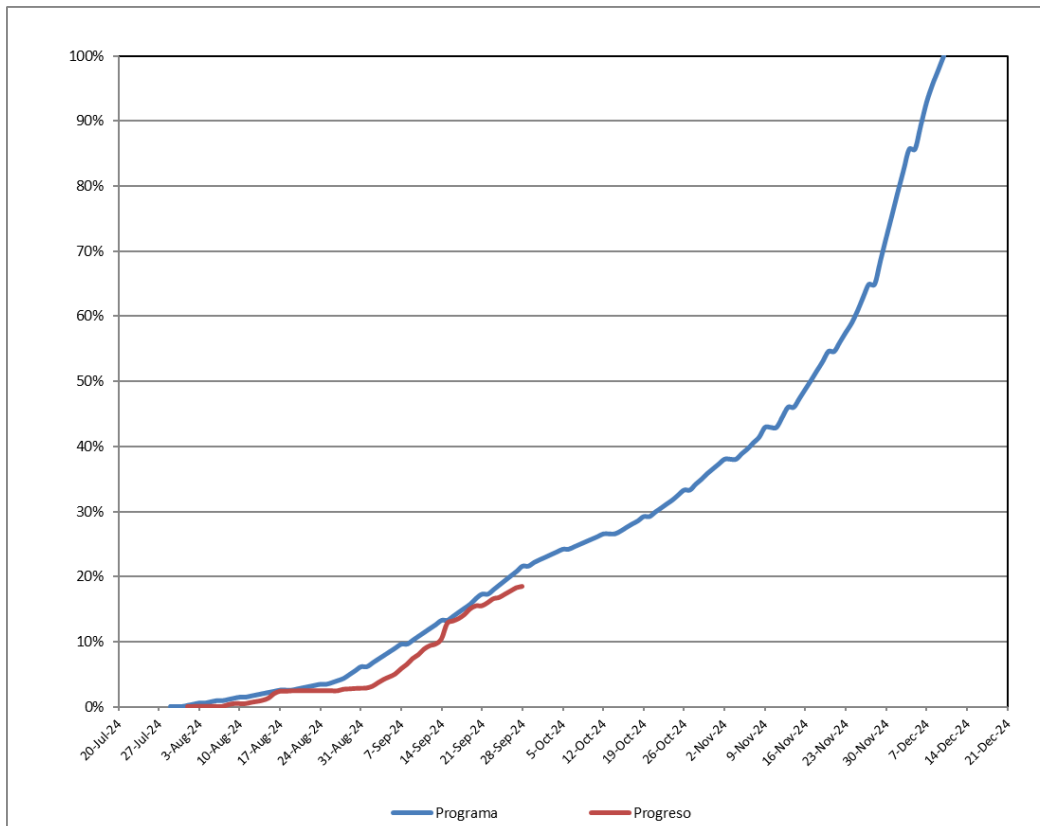

Se presenta un atraso del 7,20% del valor programado vs el ejecutado a la presente fecha, el atraso es debido al paro camionero ocurrido en el mes de septiembre de 2024, la demora por parte de los proveedores con la entrega del material.

8. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

8.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
1	Edgar Tomas Cabrera Otalora	74861357	Ing. Residente
2	Edwin Orlando Paez Roncancio	11447178	Ing. Residente
3	Sandra Jimena Mesa Cristancho	46383731	Residente SST
4	William Fabian Jacome	1693879	Maestro de obra
5	Jesus David Colina Garcia	1006450003	Ayudante de obra
6	Michel Angelo Bernal Parra	1118545678	Estucador
7	German Royá Baron	91472198	Enchapador
8	Gilber Yesid Mejia Ardila	1007598924	Ayudante de obra
9	Jair Archila Blanco	91495928	Enchapador
10	Carlos Andres Soto Roper	1065868764	Pintura
11	Jefferson Alexander Bernal Ramos	1007449099	Pintura
12	Carlos Joanny Nuñez Rojas	74186616	Enchapador
13	Diego Hernando Rodriguez	1118569627	Ayudante de obra

8.2 HERRAMIENTA Y EQUIPO


HERRAMIENTA Y EQUIPO		
ITEM	DESCRIPCION	CANT
11	Herramineta menor (mangyeras niveles, nivel de mano, chapulin, martillos, masetas, pulidora manual, taladro manual, metros, brochas, rodillos, lijas, valdes)	GI

9. CONCLUSIONES

1. la programación real es de 25,70% y el avance real es de 18,50%.
2. Podemos concluir que a la fecha del presente informe se presenta un atraso del 7,20% sobre el total programado.
3. El mantenimiento realizado asegura que las instalaciones se mantengan en condiciones óptimas, lo que contribuye a un ambiente más seguro y eficiente para el personal.
4. El mantenimiento corrigió problemas menores antes de volverse fallas peligrosas, complicadas y costosas.
5. Las actividades se han venido desarrollando de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

Anexo: Bitácora de obra.

Atentamente,



Christian Fabián Barrera Doncel.

CC 1.018.417.359

Cargo: Representante legal

Celular: 3132471470

Correo: administrativo@amcis.com.co

Página web: www.amcis.com.co



Panel led 60x60 oficinas ESDEB



Porcelanato Apartamento 208 Flor Amar.



Porcelanato Apartamento 405 Flor Ama.



Puertas oficinas ESDEB



Ventana aluminio oficinas ESDEB



Instalacion ventanas en aluminio



Enchape pared baño Apartamento 405



Lavamanos sanitario Apartamento 405



Accesorio baños Apto 208



Accesorio baños Apto 405



Mesón cocina Apartamento 208



Cielo raso oficinas ESDEB



Instalación enchape Apartamento 405



Demolición enchape baños



Desmonte unidades sanitarias



Cielo raso y panel LED oficinas ESDEB



Emboquillada enchape



Demolición enchape piso.

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 1 de 13

INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
AMCIS
INGENIEROS Y ASOCIADOS

Periodo:
01 al 30 de septiembre de 2024

Elaborado:

SST

CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES:
MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES
INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS

2024

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 2 de 13

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control en cumplimiento a lo establecido a los aspectos de Seguridad y salud en el Trabajo, en el Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir actividades de SST que se realizaron durante el periodo estimado, las cuales ya se encuentran establecidas en el programa SST de la organización.
- Generar registros de evidencias en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las actividades correspondientes al SST.
- Verificar y validar de todas las actividades SST, establecidas cumplan según el contrato y normatividad legal vigente a la seguridad y salud en el trabajo.
- Verificar el cumplimiento de los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal que se encuentre vinculado al contrato.

2. ALCANCE

El alcance de este documento es para el personal involucrado en el contrato, para evidencia y seguimiento, de esta manera garantizar la implementación y el cumplimiento del SST en pro de la seguridad y salud de los trabajadores y el entorno.

3. INTRODUCCIONES

En el presente informe evidencia la gestión, seguimiento e implementación, divulgación, gestión y seguimiento del SG SST con el fin de preservar la seguridad integral de cada colaborador, así como su salubridad, las actividades están siendo divulgadas, implementadas y ejecutadas para el contrato. Durante la gestión, se han efectuado acciones de implementación, acciones de divulgación y acciones de seguimiento de las actividades desarrolladas, y han sido verificadas las herramientas de control, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones previstas y determinadas, para el contrato de obra mencionado y el del SG-SST; para esto, se efectúa la supervisión diaria de estas actividades, con el personal profesional idóneo de la Firma Contratista y se evidencia en

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 3 de 13

registros físicos u anexos digitales, comprobando las acciones de ejecución, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 ASPECTOS BASICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores

4.1.1 Proceso de Planificación y Liderazgo de Alta Dirección

AMCIS diseño y estructuro el SG SST, para el contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estad de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

Realiza la verificación e implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de la obra en el periodo presente informe.

4.1.2 Relación del Personal

Durante la ejecución del presente contrato se registra el siguiente personal, el cual cuenta con afiliación y pago de seguridad social del personal activo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
1	Edgar Tomas Cabrera Otalora	74861357	Ing. Residente
2	Edwin Orlando Paez Roncancio	11447178	Ing. Residente
3	Sandra Jimena Mesa Cristancho	46383731	Residente SST
4	William Fabian Jacome	1693879	Maestro de obra
5	Jesus David Colina Garcia	1006450003	Ayudante de obra
6	Diego Hernando Rodriguez Otalora	1118569627	Ayudante de obra
7	Michel Angelo Bernal Parra	1118545678	Resane/Pintura
8	Jairo Alejandro Gomez Bernal	1121817054	Resane/Pintura

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 4 de 13

9	German Royá Barón	91472198	Enchapador
10	Carlos Andrés Soto Roper	1065868764	Pintura
11	Jefferson Alexander Bernal Ramos	1007449099	Pintura
12	Jair Archila Blanco	91495928	Enchapador
13	Gilber Yesid Mejía Ardila	1007598924	Ayudante de obra

4.1.3 Soportes Parafiscales

 compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	50037803-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS	Calle 72 10 07 OF 1107	3008886766	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE EUCURRAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAOS UPC
2024-08	2024-07	E	09/09/2024	80141374	\$661.400

DETALLE POR COTIZANTE																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD		RESERVA LABORALES				CCF		PARAFISCALES						
No.	Tip.	No. de identificación	Apellidos y Nombres	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA	CELESTRA
1	CC	030909017	MESA CORREA ROBINSON JANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	107071744	LAMAZO RODRIGUEZ JOHN FREDY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	11447176	PAEZ RONCANCIO EDWIN ORLANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	4030701	MESA CRISTIAN RO SANCIA JIMENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	14001207	CARRERA OTALORA EDOYAR TONAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

 <div>AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL</div>	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 5 de 13




PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	902979409-9	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS	Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		EMPLEADOS		SPC	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		2024-09	2024-09	E	09/09/2024	80141268	TOTAL A PAGAR	
SUCURSAL	C - MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI						\$2.020.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Tipo	No. de manifestación	Apellidos y Nombres	E	PENSION												SALUD		RESERVA LABORALES		CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					C	D	I	S	P	R	O	T	A	M	N	Cot. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de sobrevivencia	Cot. EPS	IBC EPS	Cotización Valor SPC	Cot. ARL	IBC ARL	Cotización	Código	IBC CCF	Aporte CCF	IBC aporte pafisc	Aporte CCF	Aporte EPS	Aporte EPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	CC	100888917	MEJIA CORREA ROBINSON JAIR	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

 <p>AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL</p>	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 6 de 13

 compensar | miplanilla.comPAG 2 de 2

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	OPS
					10	5
PERIODO SALUB	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	16/09/2024	80252047	\$2.335.400	

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 7 de 13

5. MATRIZ

Se cuenta con una matriz de riesgos aplicada a la industria, los procesos y labores de acuerdo a las obras q se van a ejecutar.

Riesgos:

- Biológico
- Físico
- Químico
- Biomecánico
- Condiciones de seguridad
- Psicosocial
- Fenómenos naturales

Para estos se busca controlar y mitigar los riesgos a los que nos encontramos expuestos en las labores realizadas.

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Dando cumplimiento al cronograma de inspecciones planeadas de acuerdo a los requerimientos.

- ✓ Inducción
- ✓ Inspecciones de Seguridad
- ✓ Inspección de EPP
- ✓ Locativa y puestos de trabajo

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 8 de 13

✓ Entrega de EPP

7. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST

Se programan capacitaciones acordes a las labores a ejecutar, se dejan evidencia física y fotográfica.

INSPECCIONES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	PLANEADA	EJECUTADA
Inducción	Residente SST	Ocasional		1
Charlas de Seguridad	Residente SST	Diaria	24	24
Locativa	Residente SST	Semanal	4	4
EPP's	Residente SST	Mensual	1	1
Orden y Aseo	Residente SST	Semanal	4	4
Herramientas	Residente SST	Semanal	4	4

CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS DE SST				
ACTIVIDAD		CHARLA 5 MIN		
N°	TEMA	sep-24		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
		REALIZADA		
		SI	NO	
1	Riesgo Biológico (picadura)	✓		Sandra Jimena Mesa C
2	Cuidado de pies	✓		Sandra Jimena Mesa C
3	Notificación de accidentes	✓		Sandra Jimena Mesa C
4	Levantamiento de cargas	✓		Sandra Jimena Mesa C
5	Manipulación manual	✓		Sandra Jimena Mesa C
6	Golpes de calor	✓		Sandra Jimena Mesa C
7	Charla motivacional	✓		Sandra Jimena Mesa C
8	Ergonomía	✓		Sandra Jimena Mesa C
9	Trabajo en equipo	✓		Sandra Jimena Mesa C
10	Uso de herramientas manuales	✓		Sandra Jimena Mesa C
11	Principios generales de trabajo seguro	✓		Sandra Jimena Mesa C
12	Conductas laborales	✓		Sandra Jimena Mesa C
13	Uso de EPP's	✓		Sandra Jimena Mesa C
14	Horarios de trabajo	✓		Sandra Jimena Mesa C
15	Exceso de confianza	✓		Sandra Jimena Mesa C
16	Concejos de seguridad	✓		Sandra Jimena Mesa C
17	La cooperación	✓		Sandra Jimena Mesa C
18	Condiciones inseguras	✓		Sandra Jimena Mesa C
19	Contar con lo inesperado	✓		Sandra Jimena Mesa C

 AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS <small>INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL</small>	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 9 de 13

20	Lesiones pequeñas	✓		Sandra Jimena Mesa C
21	Inspecciones de seguridad	✓		Sandra Jimena Mesa C
22	Hoy no es lo mismo de ayer	✓		Sandra Jimena Mesa C
23	Charla motivacional	✓		Sandra Jimena Mesa C
24	Conservar lo que tenemos	✓		Sandra Jimena Mesa C

8. REPORTES DE ACIDENTES, INCIDENTES, ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS

REGISTRO DE LABORES						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	INCIDENTES	ACCIDENTES
1	Edgar Tomas Cabrera Otalora	Ing. Residente	0	0	0	0
2	Edwin Orlando Paez Roncancio	Ing. Residente	0	0	0	0
3	Sandra Jimena Mesa Cristancho	Residente SST	0	0	0	0
4	William Fabian Jacome	Maestro de obra	0	0	0	0
5	Jesus David Colina Garcia	Ayudante de obra	0	0	0	0
6	Diego Hernando Rodriguez Otalora	Ayudante de obra	0	0	0	0
7	Michel Angelo Bernal Parra	Estucador	0	0	0	0
8	German Roy Barón	Enchapador	0	0	0	0
9	Gilber Yesid Mejia Ardila	Ayudante de obra	0	0	0	0
10	Jair Archila Blanco	Enchapador	0	0	0	0

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 10 de 13

			ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	INCIDENTES	ACCIDENTES
11	Jhosseft Nicolas Nuñez Rodriguez	Enchape	0	0	0	0
12	Carlos Joanny Nuñez Rojas	Enchapador	0	0	0	0
13	Diego Hernando Rodriguez	Ayudante	0	0	0	0

8.1 INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD Y SOPORTES

Durante el mes de septiembre no se reporta ningún tipo de accidente y/o incidente laboral

TOTAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES	0	0	0	0
TOTAL ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	0	0	0	0
TOTAL COLABORADORES	13	DIAS LABORADOS		24

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 11 de 13

$$TA = \frac{0 \text{ TA}}{13 \text{ colaboradores}} \cdot 100$$

$$TA = 0\%$$

8.2 REPORTE RUAF

No se realiza el reporte respectivo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

8.3 INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES

Para el periodo correspondiente al mes de septiembre no se reporta accidentes por lo que

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION		COMO SE MIDE		
RESULTADO	Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período		TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES * 100		
FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	DIVULGACION
SG-SST	Residente SST	Mensual	Porcentaje	Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan X accidentes en el período.	0%	100%

no se realiza investigación de accidentes.

8.4 INCAPACIDAD MEDICAS

Para el periodo correspondiente al mes de septiembre no se presentan incapacidades médicas.

8.5 LECCIONES APRENDIDAS

Para el periodo correspondiente al mes de septiembre no aplica.

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 12 de 13

8.6 REGISTRO DE FORMATOS DE CASI INCIDENTES

Durante el periodo correspondiente al mes de septiembre no se presentan casi incidentes.

9. ENTREGA DE DOTACION

En cumplimiento a lo establecido en los reglamentos, se realiza entrega, cambio e inspección de dotación y EPP's a los colaboradores.

10. PERMISOS DE TRABAJO

Se realizan los permisos de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollan.

10.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS

- ❖ Se realiza programación de personal según las actividades y sitios de trabajo.
- ❖ Se cumplen con las normas establecidas por la empresa AMCIS y sus políticas.
- ❖ El personal cumple con el adecuado uso y cuidados de los EPP's

11. GESTION AMBIENTAL

En cumplimiento a la gestión ambiental, el personal durante la inducción, charlas y actividades se les da a conocer lo correspondiente al manejo y separación de los residuos y materiales que se presentan durante los trabajos realizados en obra, esto con el fin de promover buenas acciones sobre el medio ambiente, como lo son: clasificación de residuos, actividades de orden y aseo, almacenamiento de materiales, recolección, transporte y disposición final de los desechos y escombros generados. Estas tareas son esenciales para evitar contaminación y garantizar el manejo de los recursos naturales.

Durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente a septiembre se realizan las siguientes acciones:

- Recepción de materiales
- Charlas e indicaciones referentes al tema ambiental
- Puntos de acopio temporales de material
- Manejo y disposición de residuos
- Actividades de orden y aseo

12. CONCLUSIONES

AMCIS en cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas y ratificando su

	AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Código: AI-HSEQ-FO-03
	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: 01
	CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024	Fecha: 30/08/2024
	INFORME MENSUAL SST	Página 13 de 13

responsabilidad en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, hacen cumplir la normatividad legal vigente establecidas y practicas adecuadas en pro de mejorar en materia de SST y la de sus colaboradores, presentamos el siguiente informe, en efecto de analizar las practicas que se vienen realizando en cuanto a SST, donde se pueden identificar el compromiso por parte de la organización para su verificación

Elaboro:



Sandra Jimena Mesa Cristancho
Residente SST
AMCIS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-071854-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,06-09-2024
----------------------	----------------------	---------------	------------------------

Asunto	Comité de obra No 5 contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	14:00 HORAS	Hora Finalización	15:00 HORAS
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, la señora MY LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor T1 ARIAS MOLINA FERNANDO Supervisor Suplente, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se encuentran actividades atrasadas de acuerdo a la nueva reprogramación de obra, desmonte de aparatos sanitarios, estuco y pintura, pintura estructura metálica, desmonte de cubierta e instalación de cubierta en bomberos.
- La Gerencia de proyecto informa el incumplimiento con la entrega de la totalidad de los estudios de seguridad, el compromiso de acuerdo al acta anterior de entrega era el día lunes 02 de septiembre y no cumplieron con este compromiso, radicaron apenas 06 estudios de seguridad, el día 05 de septiembre de 2024, faltando la mayoría de estos formatos.
- También incumplieron con la entrega de material ya que no llegó el día lunes como se había comprometido la empresa contratista, material de porcelanato llegó el día 05 de septiembre de 2024.
- La Gerencia del proyecto reitera el incumplimiento con los compromisos pactados en los diferentes comités de obra y que la empresa contratista no cumple.
- El día de hoy 06 de septiembre, la empresa contratista tenía el compromiso de entregar los 02 apartamentos que están interviniendo y las oficinas del ESDEB, situación que tampoco cumplieron.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

- El contratista solicita ingreso de material de cielo raso el día de hoy a la Unidad e ingreso a laborar los días 07 y 08 de septiembre de 2024, solicitudes que son autorizadas por el Segundo Comandante de la Unidad.
- La supervisión reitera que se realizó un modificadorio cambiando la fecha de corte el cual estaba para el día 20 de agosto y se modificó para ejecutar mínimo el 15% con corte 20 de septiembre y a la fecha apenas va de ejecución el 3.91%, faltando el 11.09% para cumplir con mencionado corte.
- La Gerencia del Proyecto ordena a la supervisión del contrato informar las novedades a la aseguradora, con los incumplimientos que hemos venido teniendo con la empresa contratista, para que ésta esté informada y a un futuro tener los soportes de llegado el caso se produzca un posible incumplimiento.
- La supervisión del contrato informa que con 02 trabajadores que tienen actuemlmente en la pobra no van a cumplir con el corte del 20 de septiembre.
- La Gerencia del Proyecto informa que para él y la supervisión del contrato es responsabilidad hacer cumplir lo descrito en la miniuta contractual.
- Como soporte se cuenta con las actas de los comités de obra, los registros en la bitacora de obra y el informe de supervisión.
- Si el trabajo no se cumple bien, tanto la Supervisión del contrato, como la Gerencia del Proyecto no van a dar el recibo a satisfacción de las obras.
- El contratista se comprometió en entregar los 02 apartamentos y las oficinas del ESDEB el día 13 de septiembre de 2024.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	COMITE 06
-------------	-----------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Fecha - Hora	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Lugar	
--------------	--------------------------	-------	--

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones



Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / INSTA





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: DE-SEMEP-FR-006

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Versión: 4

Vigencia: 21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de obra No 5

OFICINA PRODUCTORA: ESAD - EDINS

LUGAR Y FECHA: 06 septiembre 2024

HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Mayana D	SECOM	ESMAY	71507	Felixmayana@gmail.com	
2	M4	Jorge Roberto Sanchez Reyes	Supervisor	ESAD	312519569	jorge.sanchez@for.mil.co	
3	M4	WZ YENNIFER GARCIA ROCHA	COMANDANTE ESAD - 306	ESAD	31070205	y.garcia@for.mil.co	
4	PO-4	Yennifer A. Cornejo A.	Profesional en Planeacion	ESMAY	71511	yennifer.cornejo@for.mil.co	
5		Tomás Colmenares	Ing.	AMCIS	310735	eto27@hujm.gil	
6		SANDRA JIMENA ALESA C	Asistente JISO	AMCIS	342226121	jimenamesa@gmail.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-075655-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,13-09-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Asunto	COMITÉ DE OBRA 06		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	15:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, la señora MY LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor T1 ARIAS MOLINA FERNANDO Supervisor Suplente, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se encuentran actividades atrasadas de acuerdo a la nueva reprogramación de obra, desmonte de aparatos sanitarios, demolición guarda escoba, desmonte de cubierta bomberos, estuco y pintura, pintura estructura metálica, desmonte de cubierta de bomberos.
- Según el contratista el porcentaje proyectado para la otra semana es del 22%
- El gerente de proyecto informa que el compromiso era que el día de hoy se entregaban los 02 apartamentos que se están interviniendo y las oficinas del ESDEB.
- La supervisión del contrato informa que el día miércoles 11 de septiembre nos entregaron los últimos 07 estudios de seguridad.
- El contratista informa que tiene dos ítems que son críticos como es la ventanería en aluminio y los mesones en mármol.
- Las puertas de las oficinas las mandaron a hacer el día miércoles 11 de septiembre.
- El próximo comité de obra va a ser en campo el día 20 de septiembre y se medirán las actividades ejecutadas para el correspondiente corte de obra.
- La gerencia informa que de las obras que se están ejecutando no hay ninguna que se este haciendo a la intemperie, para que existan atrasos en su ejecución.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

- La supervisión informa que tuvieron una demora en la sacada de los escombros y casi la unidad se gana una multa debido a este inconveniente.
- Necesitamos que nos estentreguen los apartamentos para poder entregarles los demás.
- El día lunes 16 de septiembre se entregará un apartamento en Torres de Leticia.
- Están autorizados a trabajar de noche.
- Tiene que pasar el reporte de la gente que va a trabajar en horario extendido y fines de semana.
- Por parte de le Entidad tenemos toda la voluntad para que el contrato continúe sin novedades, cumpliendo con todos los parámetros de SST y por parte de los apartamentos externos nos acoplamos a los parámetros que estén establecidos por propiedad horizontal.
- La gerencia informa que el problema es que el contratista no ha demostrado tener la solvencia económica y se ve preocupada por el flujo de caja del contrato.
- Se les recuerda que el nivel de riesgo para trabajos en la Unidad es nivel 5.
- En 8 días nos entregan los 02 apartamentos y se haría una revista de campo.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024





Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / INSTA



		FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	4
						Vigencia:	21/03/2024
TEMA REUNIÓN: Comité de obra 6							
OFICINA PRODUCTORA: EJAIO - ESIDS							
LUGAR Y FECHA: GACAS, 13-09-2024							
HORA: 14:00							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Morqueza P.	SECOM	ESMAY	71507	Felix.morquezapaulo@fca.mil.co	
2	MM	LU YENNIFER GARCIA ACOSTA	COMANDANTE ECOM 306	ESALO	507607705	lu.garcia@fca.mil.co	
3	MY	Jorge Roberto Sánchez	Supervisor	ESALO	3175193689	jorge.sanchez@fca.mil.co	
4		SANDRA JIMENA NEZA C	RESIDENTE SISO	AMCIS	342226121	dimenajimena@gmail.com	
5		TOMAS Calderon	AMCIS. Ingenieros	Ing.	310785392	etcozi@hotmail.co	
6		Edwin Orlando Paez	Aux Ing	AMCIS	315650494	Orion.t.Paez@hotmail.co	
7	TI	Arios Molina Fernando	Tec. Esp. Servicio Publico	ESALO	3104280553	Fernandoarios@fca.mil.co	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-080096-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,27-09-2024
----------------------	----------------------	---------------	------------------------

Asunto	Comité de obra No. 07 contrato 045		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	15:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:
Avances y requerimiento contrato 045

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad,el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor T1 ARIAS MOLINA FERNANDO Supervisor Suplente, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, para tratar temas relacionados con el Contrato de ObraNo.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DELOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se encuentran actividades atrasadas de acuerdo a la nueva reprogramación de obra, estuco y vinilo, pisos, enchapes, cubierta y cielo raso.
- La supervisión informa que el porcentaje programado a la fecha es de 26.10% y el porcentaje ejecutado es del 17.5\$, lo que equivale a un atraso de 8.6%
- La gerencia de proyecto informa que la Entidad le entregó 03 apartamentos mas y el compromiso del contratista era entregar los 02 apartamentos que estaban en ejecución, lo cual el contratista informa que hubo un pequeño retraso por las divisiones de baño y la terminación de 1 baño.
- El contratista informa que estos apartametos serán entregados a mas tardar el día 30 de septiembre.
- El día de hoy se encuentran en actividades de resane y pintura en apartamentos de Torres de Leticia.
- El contratista informa que los otros 3 apartamentos se entregados en 2 semanas.
- La gerencia le informa al contratista de ir evaluando los tiempos y necesitamos que vayan avanzando y que sean agiles con el tema de los apartamentos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

- Cuando el contratista entregue 01 apartamento nosotros le entregamos otro mas y así sucesivamente.
- Para el próximo comité de obra deberán presentar un atraso inferior al 8%, el plan de contingencia no se ha visto reflejado por parte de la empresa contratista.
- El contratista informa que el tema de la cubierta ya está pedida para luego ingresar e instalarla en bomberos.
- La gerencia informa que el otro corte de obra es el 20 de octubre, si no avanzan se podrían ver disminuidos en el flujo de caja.
- Si no se disminuye el atraso, no llegaremos a cumplir con el plazo contractual, es importante disminuir este atraso.
- La supervisión del contrato le solicita al contratista la entrega de la factura junto con los documentos soporte, para poder agilizar el primer pago.
- El contratista manifiesta que le van a dar prioridad al tema de los apartamentos.

Actividades a Realizar


Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	
Fecha - Hora	Lugar

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024



Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / INSTA



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA					Versión:	4
						Vigencia:	21/03/2024
TEMA REUNIÓN: Comité de obra							
OFICINA PRODUCTORA: ESACB - ESADCS							
LUGAR Y FECHA: Bogotá 27/09/2024							
HORA: 14:00							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Marquez O.	SECOM	71507	CSMAY	Felix.marquez@fuerzaaerea.mil.co	
2	MY	Jorge Roberto Sánchez Rojas	Supervisor	71583	ESADCS	jorge.sanchez@fuerzaaerea.mil.co	
3		Tomas Cabrera	Amcis	24861357	3107353925	etozto@hotmail.com	
4		Edwin Orlando Paez Rencencia	AMCIS.	11447178	3156504411	Orion.t.Paez@hotmail.com	
5	TI	Arles Orlan Fernando	Tec. Esp. Servicios publicos	ESADCS	3104280553	fernando.arias@fuerzaaerea.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
