



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - PORTADA

Código.: SIVEYC.FTO.35-1

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

PERIODO: 01/09/2024 AL 30/09/2024

San Juan de Pasto, octubre de 2024

	GOBERNACION DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS		Código: SNEVC.FTO.35-2	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		Versión: 0.0	
			Vig: 23/05/2016	

FECHA DE PRESENTACION:	2/10/2024	CON CORTE:	30/09/2024
------------------------	-----------	------------	------------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
PROCESO CONTRACTUAL:	GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023
REGISTRO No.:	2023061065	FECHA:	26/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA - BERRUECOS - SAN LORENZO - (CRUCE TAMINANGO) - LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO - LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) - TAMINANGO - SANTA CECILIA - LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACIÓN No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	Detalle: Ajuste de cláusulas, sin afectar alcance, valor o plazo de ejecución.	
MODIFICACIÓN No.:	2 DEL 28 de noviembre de 2023	Detalle: Prórroga hasta el 31 de julio de 2024	
MODIFICACIÓN No.:	3 DEL 31 de julio de 2024	Detalle: Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024	
CONTRATISTA DE OBRA:	CAMINAR INGENIERÍA S.A.S		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ		
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Lorena Élixa Arturo Delgado		
META FISICA	22 alcantarillas		
VALOR DEL CONVENIO:	657.016.814,72		
APORTE DEPARTAMENTO	655.016.814,72		
APORTE MUNICIPIO	2.000.000,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 19 de julio de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
MODIFICACIÓN 2	martes, 28 de noviembre de 2023		
MODIFICACIÓN 3	miércoles, 31 de julio de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MOD 3:	martes, 31 de diciembre de 2024		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	\$ 262.006.725,89		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	262.006.725,89		
GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
POLIZA No.:	436-47-994000059011		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	80,18%	% EJECUTADO: 76%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	88,11%	% EJECUTADO 40,00%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	15	

	<p style="text-align: center;">GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p> <p style="text-align: center;">FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO</p>	Código: SIVEYC.FTO.35-3
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.

La meta física es la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.

El convenio inicia suscribe acta de inicio el día 19 de julio de 2023, teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.

El día 8 de agosto, se suscribe el modificadorio 1, el cual realiza un ajuste a las cláusulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.

Actualmente el municipio cuenta con los contratos derivados de obra e interventoría adjudicados.

El contrato de obra por medio de la LP003-2023 es adjudicado el día 24 de noviembre de 2023.

El contrato de interventoría por medio del CMA003-2023 es adjudicado el día 28 de noviembre de 2023.

de acuerdo a solicitud del municipio, el cual manifiesta requerir el plazo para la ejecución física de la obra una vez se establezca orden de inicio. el día 28 de noviembre de se suscribe modificadorio 2, el cual prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.

El contrato de obra actualmente ha detenido su ejecución física a espera de aprobación del balance de cantidades contractuales, obra de mas, obra de menos e ítems no previstos correspondientes a disipadores y mejoramiento de cimentación en concreto ciclópeo.

El proyecto presenta una ejecución física del 64%, según información del Municipio.

Los contratos derivados se encuentran suspendidos hasta definir la aprobación del balance de obra sin afectar el valor del contrato.

Se suscribe acta de modificación 3 el día 31 de julio de 2024 prorrogando el convenio hasta el 31 de diciembre de 2024. Se solicita al municipio actualización de póliza y cargue a secop 2.

Una vez solucionado los motivos que llevaron a suscribir el acta de suspensión, se programa el reinicio para el 2 de septiembre de 2024.

Se realiza comité técnico con participación del municipio, contratista de obra, interventoría y supervisión del convenio.

El municipio hace la reposición de los recursos embargados de la cuenta bancaria, asegurando los recursos del anticipo desembolsados por el departamento.

El municipio actualiza la póliza según modificadorio 3 de 31 de julio de 2024.


Se reinicia los contratos derivados el 16 de septiembre de 2024.

Se realiza las actividades de excavación, relleno, fundición concreto clase F e instalación de tubería 36" en las alcantarilla No. 17, figurado de acero de refuerzo para fundición de caja de encofe y descole.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código.: SIVEYC.FTO.35-3 Versión: 0.0
	<p>ASPECTOS FINANCIEROS : El Departamento hace el desembolso del anticipo el día 15 de abril de 2024 mediante comprobante de egreso Número 2024001841. El municipio a la fecha no ha girado recursos al Contratista de obra.</p> <p>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023. Fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 1: 8 de agosto de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 2: 28 de noviembre de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 3: 31 de julio de 2024.</p> <p>ASPECTOS LEGALES : Convenio legalizado 24 de julio de 2023. Modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023. Modificatorio 2 legalizado 19 de febrero de 2024. Modificatorio 3 legalizado 10 de septiembre de 2024</p>	
<p>3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>Una vez solucionado el percance con el embargo de recursos de la cuenta del convenio, el Municipio suscribe acta de reinicio para los contratos derivados. Continúa con normalidad la construcción de alcantarillas.</p>		



Proyectó: Lorena Elixarturo Delgado
Contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD



Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño



Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.35-4
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - REGISTRO FOTOGRÁFICO		

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

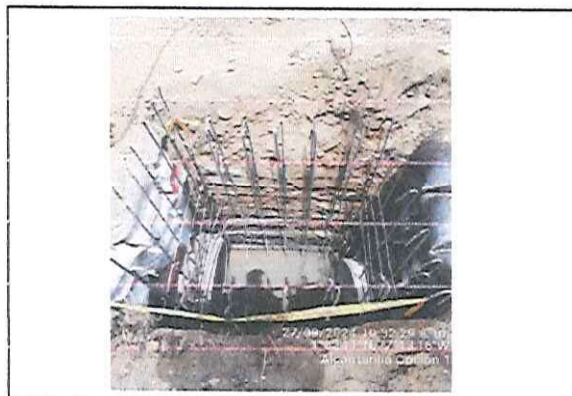


Foto1: armado acero de refuerzo encofe alcantarilla

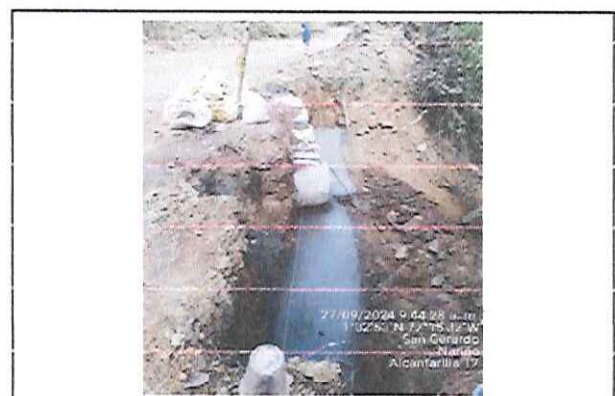


Foto2: solado muro alcantarilla No 17



Foto3: Excavación y perfilado cimentación



Foto4: Excavación y perfilado cimentación aletas alcantarilla



Foto 5: Instalación de tubería



Foto 6: Instalación de tubería

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		Código: SINEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23.05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	GI 3253-2023
---------------	--------------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	CJM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/04/2024	\$ 262.006.725,89	\$ 262.006.725,89	0 \$	262.006.725,89	\$ 262.006.725,89	\$ 0,00	2024001841	15/04/2024
TOTAL		\$ 262.006.725,89		\$ 0,00	262.006.725,89		\$ 0,00		

% AVANCE FÍSICO EN OBRA	76%
% AVANCE FINANCIERO	40%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL PÓLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.35-6
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL PÓLIZAS

CONTRATO No	GN 3253-2023
-------------	--------------

GARANTÍAS:	Aseguradora solidaria
------------	-----------------------

Póliza No.:	436-47-994000059011
-------------	---------------------

ANEXO 0 -CONVENIO			FECHA APROBACIÓN	24-jul-23	FECHA EXPEDICIÓN	7/07/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 196.505.044	30%	25-jun-23	25-jun-24	Póliza inicial	● (103)
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726	40%	25-jun-23	25-jun-24	Póliza inicial	● (103)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACIÓN	26-jul-23	FECHA EXPEDICIÓN	26/07/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 196.505.044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Inicio	● (79)
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Inicio	● (79)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 2			FECHA APROBACIÓN	22/01/2024	FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificadorio 2	● 117
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificadorio 2	● 117

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 3 - MODIFICATORIO 3			FECHA APROBACIÓN	5-sep-24	FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2024
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificadorio 3	● 267
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificadorio 3	● 267

	<p style="text-align: center;">GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p> <p style="text-align: center;">FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - BALANCE: CONTRATACIÓN VS EJECUCIÓN</p>	<p>Código: SIVEYC.FTO.35-7</p> <p>Versión: 0.0</p> <p>Vig: 23/05/2016</p>
---	---	---

7. BALANCE CONTRATACIÓN VS EJECUCIÓN

CONTRATO No.:	GN 3253-2023
---------------	--------------

CAP.	ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1,1	Excavaciones a máquina incluye retiro de material a una distancia max de 5 km.	\$ 32.888.592,00	\$ 30.383.100,00	\$ (2.505.492,00)	-8%
1	1,2	Relleno con material de adición	\$ 55.202.977,85	\$ 48.418.503,79	\$ (6.784.474,06)	-12%
1	1,3	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	\$ 134.695.963,00	\$ 95.768.640,00	\$ (38.927.323,00)	-29%
1	1,4	Concreto Clase F(2000 PSI)	\$ 20.424.497,28	\$ 15.376.627,20	\$ (5.047.870,08)	-25%
1	1,5	Tubería Concreto Reforzado 900 mm Diámetro interior	\$ 118.441.620,00	\$ 107.849.280,00	\$ (10.592.340,00)	-9%
1	1,6	Concreto Clase D(3000 PSI)	\$ 159.757.290,00	\$ 112.191.255,00	\$ (47.566.035,00)	-30%
NP	NP1	Concreto Ciclopeo para mejoramiento de suelo	\$ 12.560.874,48	\$ 9.332.012,84	\$ (3.228.861,64)	
NP	NP2	Demolición estructura de concreto	\$ 1.471.893,36	\$ -	\$ (1.471.893,36)	
NP	NP3	Disipador de energía	\$ 24.385.022,34	\$ -	\$ (24.385.022,34)	
NP	NP4	Excavación a mano material húmedo	\$ 3.636.887,10	\$ 2.134.435,33	\$ (1.502.451,72)	
NP	NP5	Excavación a mano material común	\$ 1.171.980,48	\$ 1.171.980,43	\$ -	
2	2,1	Plan de manejo ambiental	\$ 12.657.672,67	\$ 10.849.742,84	\$ (1.307.929,83)	-14%
3	3,1	Plan de manejo de tránsito	\$ 22.428.063,10	\$ 19.837.584,55	\$ (2.590.478,55)	-12%
		COSTO TOTAL	\$ 599.723.341,66	\$ 453.313.162,03	\$ (146.410.179,58)	-24%

