

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5



REPUBLICA DE COLOMBIA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 4925 de 2023

**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN
EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”**

INFORME MENSUAL No. 5

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES


ABRIL DE 2024

ORIGINAL V. 0

ESTADO DE APROBACIÓN

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

TITULO DE DOCUMENTO		INFORME MENSUAL No.5	
APROBACION	NUMERO DE REVISION	VERSION 0.0	
	Elaborado y revisado por: Director de consultoría	Nombre	Ing. Samuel Fernando Homez
		Firma	
		Fecha	5 de mayo de 2024
	Aprobado por: Director de interventoría.	Nombre	Ing. Fabio Ernesto Villamil Páez
		Firma	
		Fecha	1 de abril de 2024

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

CONTENIDO

	Pág.
1. GENERALIDADES	5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL	7
4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.....	7
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.....	9
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024	10
7. AVANCE FÍSICO POR VOLÚMENES	12
8. CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN	13
9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	15
9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA	15
9.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA	16
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	16

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

INDICE DE FIGURA

	Pág.
Ilustraciones 1. Rio San Juan	6
Ilustraciones 2. Reunión para la presentación de la metodología a emplear en el componente social.....	11
Ilustraciones 3. Cronograma de actividades	13
Ilustraciones 4. Plan de inversión	14

INDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Datos generales del contrato de consultoría e interventoría.....	9
Tabla 2. Avance físico.....	12
Tabla 3. Correspondencia enviada.....	15
Tabla 4. Correspondencia recibida.....	16

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 5 – DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024

El presente documento contiene el informe mensual de consultoría No.5 del contrato No. 4925 de 2023 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”

1. GENERALIDADES

El proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”, tienen un alcance a nivel Fase II. Los estudios objeto de esta consultoría se realizarán en el tramo navegable del río San Juan en una longitud de 180 kilómetros, la mayor parte del tramo navegable se encuentra principalmente en el departamento de Chocó y un tramo antes de su desembocadura en el pacífico, conforma la frontera entre el Chocó y el Valle del Cauca, los estudios contemplan identificación, diagnóstico y estudios y diseños de las obras de protección más adecuadas en los sitios críticos priorizados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial que amenazan la correcta navegabilidad del río San Juan, a fin de garantizar la conectividad, continuidad y seguridad del transporte fluvial y beneficio y seguridad de las poblaciones ribereñas del río San Juan.

En este sentido, el MINISTERIO DE TRANSPORTE, de la mano de INVIAS, ha iniciado la estructuración del Programa Colombia Fluvial con el fin de realizar la ejecución de infraestructura fluvial, que se ha identificado con base en las solicitudes de las entidades territoriales y la información identificada en los programas articulados con las diferentes entidades del gobierno nacional, el cual tiene como objetivo principal, generar un transporte fluvial equitativo, competitivo, sostenible y seguro.

Adicionalmente, en el Plan Plurianual de Inversiones, se destacan los Proyectos Estratégicos de impacto regional, dentro de los cuales se encuentra: Priorización e intervención de terminales y corredores fluviales en todos los departamentos del país, lo anterior en pro del Derecho humano a la alimentación; Seguridad humana y justicia social.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Consultoría se desarrollará en los diferentes puntos de la red fluvial del Río San Juan en el departamento del Chocó y Valle del Cauca.

El río San Juan nace en el cerro, en la cordillera occidental de Los Andes, en el departamento de Antioquia desembocando en el Océano Pacífico a través del delta de 200 km² denominado “siete bocas” a 60 km noroeste del Puerto de Buenaventura, después de discurrir por los departamentos de Risaralda donde se ubica su cuenca alta, Chocó donde está la mayoría de sus aguas y finalmente por el departamento del Valle del Cauca.

Tiene una longitud de 380 km de los cuales 180 km son navegables, drena una cuenta de 15.000 m² y va en dirección opuesta 180 al Río Atrato. Este río es considerado navegable debido a que las precipitaciones son abundantes en esta región, en la cual hay dos períodos de inundación: en mayo y junio y octubre y noviembre y sus puertos principales son Istmina y Andagoya; este río es uno de los más importantes del país y una arteria fluvial de gran importancia en la zona de comercio.

Ilustraciones 1. Río San Juan



3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL

De otra parte, se informa que el Instituto Nacional de Vías a través del Contrato de Consultoría No. 1034 de 2020 suscrito entre el INVIAS y la firma CONSORCIO ESTUDIOS SMF desarrolló los estudios y diseños con objeto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL RÍO SAN JUAN”, el cual obtuvo como resultado los siguientes volúmenes:

- Volumen viabilidad social y ambiental.
- Volumen Ejecutivo Final.
- Volumen canal navegable.
- Volumen Hidráulica e Hidrología.
- Volumen Geología y Geotecnia.
- Volumen Topografía.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los **“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”**, a nivel de **FASE II**.

Los estudios objeto de esta consultoría se realizarán en el tramo navegable del rio San Juan en una longitud de 180 kilómetros, la mayor parte del tramo navegable se encuentra principalmente en el departamento de Chocó y un tramo antes de su desembocadura en el pacífico, conforma la frontera entre el Chocó y el Valle del Cauca.

Para la elaboración de los estudios se cuenta con especialistas en diferentes modalidades de los cuales se enumeran a continuación y se describe el alcance general de los componentes los cuales serán unificados para dar la mejor solución técnica al sitio crítico antes mencionado y serán realizados en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes, dando claridad que para la entrega definitiva se hará por volúmenes separados:

- **VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**
- **VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**
- **VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**
- **VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**

- **VOLUMEN V** ESTUDIO DE ESTRUCTURAS
- **VOLUMEN VI** ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO
- **VOLUMEN VII** ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL
- **VOLUMEN VIII** ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- **VOLUMEN IX** ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
- **VOLUMEN X** EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- **VOLUMEN XI** INFORME FINAL EJECUTIVO

Los estudios contemplan identificación, diagnóstico y estudios y diseños de las obras de protección más adecuadas en los sitios críticos priorizados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial que amenazan la correcta navegabilidad del río San Juan, a fin de garantizar la conectividad, continuidad y seguridad del transporte fluvial y beneficio y seguridad de las poblaciones ribereñas del río San Juan.

Para la elaboración de los productos, se deberán desarrollar entre otras, las siguientes actividades:

- Recopilación de información secundaria (Adquisición de Cartografía y toda aquella documentación técnica de tipo secundario), previo al inicio de las actividades de campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito de los estudios y/o diseños según el área y de acuerdo con el respectivo modo de transporte.
- Realizar la toma de información primaria mediante la ejecución de los trabajos de campo tales como: levantamientos topográficos, campaña geotécnica, monitoreos, batimetrías, ensayos de laboratorio, gestiones ambientales y sociales y prediales, según particularidad.
- Realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental vigente que incida en la realización de cada estudio y/o diseño, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requeridos para la elaboración del componente ambiental y social.
- En el componente ambiental y social, el Consultor de estudios, no solo será responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, de realizar las gestiones pertinentes ante las Autoridades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.
- El consultor deberá elaborar y entregar todos los Volúmenes técnicos solicitados por el INVIAS

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

A continuación, se presenta la información general del contrato de consultoría No. 4925 de 2023 y el contrato de interventoría No. 4922 de 2023.

Tabla 1. Datos generales del contrato de consultoría e interventoría

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
INTEGRANTES:	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS - INPROTEKTO LIMITADA
CONTRATO No.	4925-2023
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
VALOR INICIAL:	\$ 1.743.524.155
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2024
INTERVENTORÍA	INCOPLAN IN SAS
CONTRATO No.	4922-2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL INVIAS	ING. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PLAZO FINAL	6 MESES
GESTOR TECNICO INVIAS	ING. YERIJHAAR GIL PASTRANA MORA

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante oficio radicado No. 2024-IN012-0741 del 1 de abril de 2024 desde la interventoría da respuesta comunicado CVI-OP-2023-4925-035. Entrega metodologías preliminares.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-042 del 2 de abril de 2024 desde la consultoría se realiza la Remisión Informe Mensual No.3.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-043 del 5 de abril de 2024 la consultoría se realiza la Remisión de Acta de costos No. 4 del contrato de referencia.
- Mediante oficio radicado No 2024S-VBOG-019504 del 8 de abril de 2024 el INVIAS realiza la ratificación hojas de vida contrato 4925 de 2023
- Mediante oficio radicado No CVI-OP-2023-4925-044 del 8 de abril de 2024 la consultoría realiza la Remisión Informe semanal No 14 y 15.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-045 del 8 de abril de 2024 la consultoría se realizó la Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan a la alcaldía municipal de Istmina.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-046 del 8 de abril de 2024 la consultoría se realizó la Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan a la alcaldía municipal de Medio San Juan – Chocó.
- Mediante oficio radicado CVI-OP-2023-4925-047 del 8 de abril de 2024 la consultoría se realizó la Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan a la alcaldía municipal de El Litoral del San Juan.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-048 del 08 de abril de 2024, la consultoría se realizó la Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan al Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-049 del 15 de abril de 2024, la consultoría realizó la Remisión Informe semanal No 16.
- Mediante oficio radicado No 2024S-VBOG-021496 del 15 de abril de 2024 el INVIAS realiza la ratificación hojas de vida contrato 4925 de 2023
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-050 del 22 de abril de 2024, la consultoría realizó el seguimiento Social con la Junta Directiva del Concejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-051 del 22 de abril de 2024, la consultoría realiza el seguimiento Acta de costos No. 1 y No2 del contrato de referencia.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-052 del 22 de abril de 2024, la consultoría realiza Remisión Informe semanal No 17.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-053 del 29 de abril de 2024, la consultoría presenta alcance al radicado No. 2024-IN012-0384 Concepto hojas de vida.


CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-054 del 29 de abril de 2024, la consultoría realiza la Remisión Informe semanal No 18.

El día 12 de abril se realiza una reunión en compañía de los profesionales de la interventoría, supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del INVIAS y profesionales de la consultoría. Se tuvo como objeto presentar a la profesional social de la consultoría, junto con la metodología a emplear para tener un adecuado acercamiento con la comunidad del área de influencia del proyecto

Ilustraciones 2. Reunión para la presentación de la metodología a emplear en el componente social

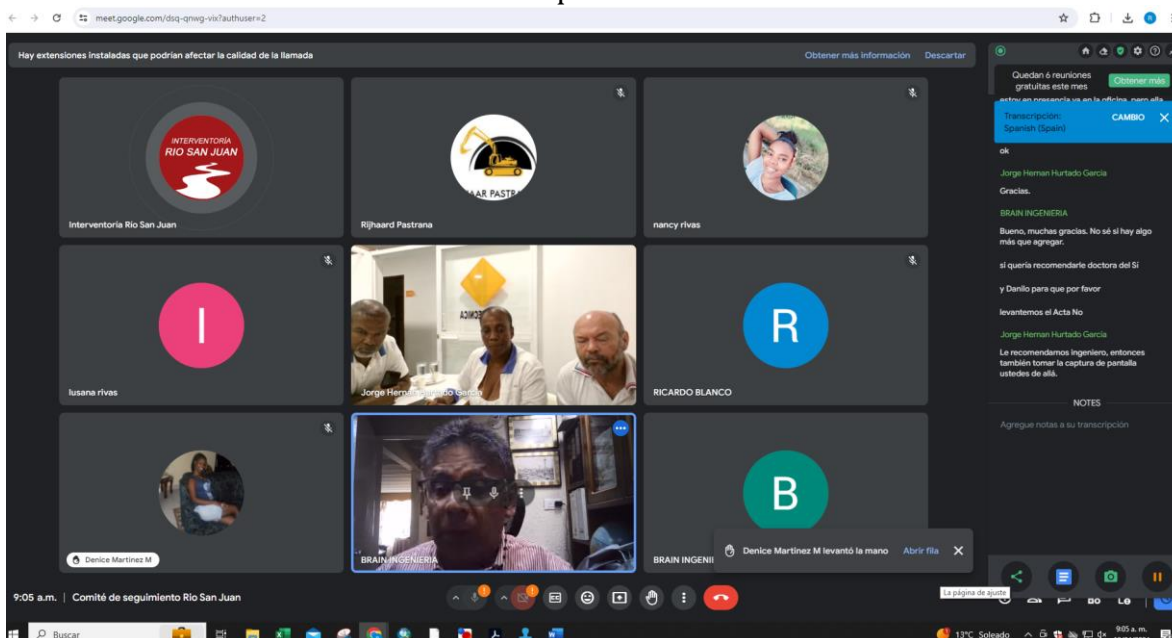

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Componente: Informe mensual No.5

7. AVANCE FÍSICO POR VOLUMENES

En la Tabla 2 se presentan los avances físicos por cada volumen contratado para la Consultoría


Tabla 2. Avance físico

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	AVANCE	
		PESO % VOLUMEN	EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS		
	Análisis de la información y antecedentes	9.64%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.42%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA		
	Metodología aprobada por Interventoría	12.85%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA		
	Metodología aprobada por Interventoría	13.92%	20,00%
	Estudio Hidrológico aprobado		
	Estudio Hidráulico aprobado		
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.		
	Metodología aprobada por Interventoría	20.34%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.		
	Metodología aprobada por Interventoría	7.49%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.		
	Metodología aprobada por Interventoría	10.71%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.85%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.42%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA		
	Metodología aprobada por Interventoría	5.35%	20,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
11	INFORME FINAL EJECUTIVO		
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría	0.00%	
	TOTAL	100.00%	

8. CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN

En las siguientes imágenes se presenta el cronograma y plan de inversión entregado a la interventoría para su respectiva revisión:

Ilustraciones 3. Cronograma de actividades

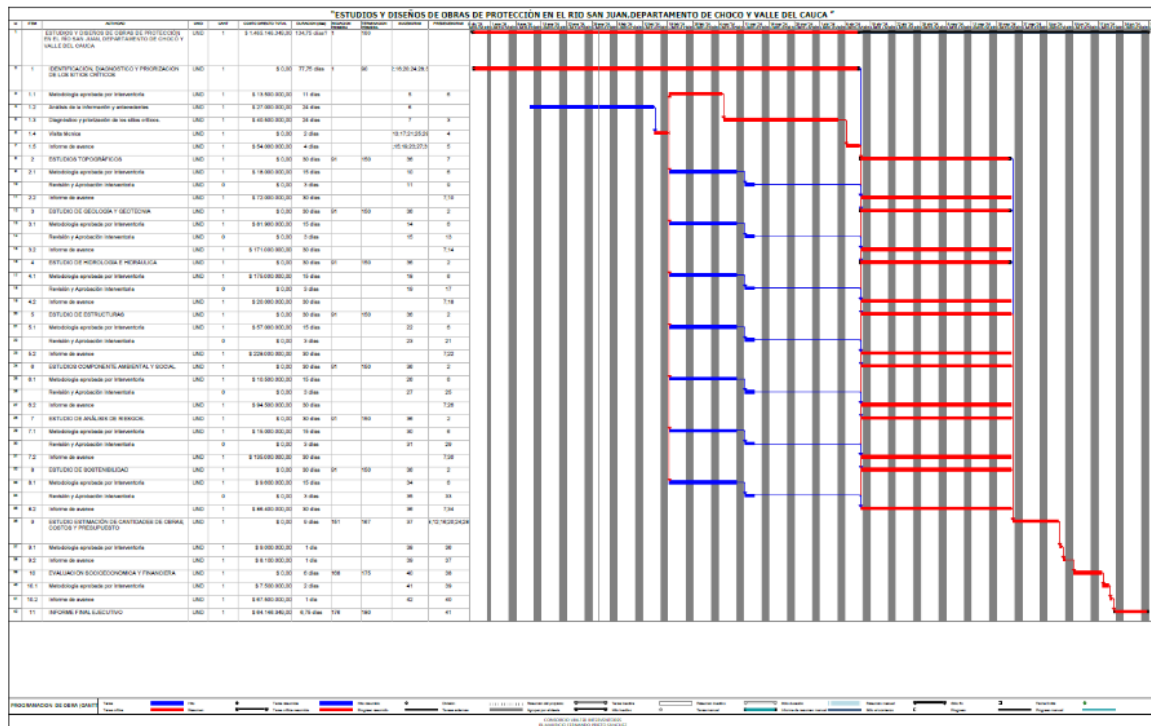

Ver Anexo 1. Cronograma

Componente: Informe mensual No.5

[illegible]

Ver Anexo 2. Plan de inversión formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O
REPROG PROG INV

9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Para el presente capitulo se mencionan cada uno de los oficios radicados enviados y recibidos del contrato de consultoría No 4925-2023.

9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 3. Correspondencia enviada

No.	Número de Radicado	Estado	Asunto	Dirección	Fecha de radicación
1	CVI-OP-2023-4925-042	Enviada	Remisión Informe Mensual No.3	Incoplan	2 de abril de 2024
2	CVI-OP-2023-4925-043	Enviada	Acta de costos No. 4 del contrato de referencia	Incoplan	5 de abril de 2024
3	CVI-OP-2023-4925-044	Enviada	Remisión Informe semanal	Incoplan	8 de abril de 2024
4	CVI-OP-2023-4925-045	Enviada	Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan	Municipio Istmina – Chocó	8 de abril de 2024
5	CVI-OP-2023-4925-046	Enviada	Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan.	Municipio de Medio San Juan – Chocó	8 de abril de 2024
6	CVI-OP-2023-4925-047	Enviada	Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan.	Municipio de El Litoral del San Juan – Chocó	8 de abril de 2024
7	CVI-OP-2023-4925-048	Enviada	Solicitud Información obras de protección en el Río San Juan.	Gobernación del Chocó	8 de abril de 2024
8	CVI-OP-2023-4925-049	Enviada	Remisión Informe semanal.	Incoplan	16 de abril de 2024
9	CVI-OP-2023-4925-050	Enviada	Seguimiento Social con la Junta Directiva del Concejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN.	Incoplan	22 de abril de 2024
10	CVI-OP-2023-4925-051	Enviada	Seguimiento Acta de costos No. 1 y No2 del contrato de referencia.	Incoplan	22 de abril de 2024
11	CVI-OP-2023-4925-052	Enviada	Remisión Informe semanal	Incoplan	22 de abril de 2024
12	CVI-OP-2023-4925-053	Enviada	Alcance al radicado No. 2024-IN012-0384 Concepto hojas de vida.	Incoplan	29 de abril de 2024
13	CVI-OP-2023-4925-054	Enviada	Remisión Informe semanal.	Incoplan	29 de abril de 2024

9.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 4. Correspondencia recibida

No.	Número de Radicado	Asunto	Dirección	Fecha de radicación
1	2024-IN012-0741	Respuesta de comunicado CVI-OP-2023-4925-035. Entrega metodologías preliminares.	Incoplan	1 de abril de 2024
2	2024S-VBOG-019504	RATIFICACION HOJAS DE VIDA CTO 4925 DE 2023	INVIAS	08 de abril de 2024
	2024S-VBOG-021496	RATIFICACION HOJAS DE VIDA CTO 4925 DE 2023	INVIAS	15 de abril de 2024

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 12 de abril se realiza una reunión en compañía de los profesionales de la interventoría, supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del INVIAS y profesionales de la consultoría. Se tuvo como objeto presentar a la profesional social de la consultoría, junto con la metodología a emplear para tener un adecuado acercamiento con la comunidad del área de influencia del proyecto
- Durante el periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril se radicaron para posterior revisión y aprobación por parte de la Interventoría los informes semanales No 14, 15, 16 y 17 con el objeto de presentar las actividades ejecutadas hasta la fecha. Asimismo, se remitió el informe mensual No 3 para posterior revisión y aprobación por parte de la Interventoría con el objeto de dar cumplimiento al contrato de consultoría No 4925 de 2023.
- Continuamos gestiones con el apoyo de Acadesan, Consejo Comunitario General del San Juan, para que las comunidades de los centros poblados a la ribera del río San Juan, permitan llevar a cabo en cada una de ellas la socialización del proyecto, y así adelantar las actividades de campo en las áreas de: Topo batimetría, Geotecnia, Hidráulica e hidrología y ambiental.
- En comunicación remitida a Interventoría y copiada al Instituto Nacional de Vías, CVI-OP-2023-4925-050 Cajicá, del 22 de abril de 2024, se relaciona la trazabilidad desde el área social al Consejo Comunitario General del San Juan-ACADESAN, quien realiza los acercamientos con diferentes actores y/o comunidades en el territorio del río San Juan, las cuales son paulatinas y/o espaciales, entre otras, por la dificultad tanto geográfica, como por otro medio de comunicación que se utiliza (vía celular, radio y otros), por lo que se hemos solicitado una reunión presencial en el territorio para la semana del 22 al 27 de abril de 2024, con el propósito de reiterar la importancia de permitir el ingreso del personal y equipos de la Consultoría para desarrollar la visita técnica y posteriormente los trabajos de campo.

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME CONSULTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No.	4925 DE 2023	Consultor:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Contrato de Interventoría No.	4922 DE 2023	Interventoría:	INCOPLAN IN SAS

Objeto Contrato de Consultoría:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No.	4	MES O PERIODO:	1/04/24 al 30/04/24
---------------------	---	----------------	---------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra		
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado		
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
 Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

FECHA

3/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO	PERIODO MES:	01/04/24 AL 30/04/24
-------------------	---	------------------------	-------	--------------	----------------------

CONTRATO DE CONSULTORIA No.:	4925 DE 2023	PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.743.524.155,00
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 1.743.524.155,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
CONSULTOR:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE JUNIO 2024	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO:	6 MESES		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	4922 DE 2023	INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
----------------------------	--------------	--------------	--------------------	---	-----------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y diseños</td><td>GLOBAL</td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Estudios y diseños	GLOBAL		<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GLOBAL</td><td>\$ 57.485.568,00</td><td>\$ 129.211.604,00</td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GLOBAL	\$ 57.485.568,00	\$ 129.211.604,00
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y diseños	GLOBAL																																																																															
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GLOBAL	\$ 57.485.568,00	\$ 129.211.604,00																																																																													


AVANCE FINANCIERO					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRAS					
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.465.146.348,74	\$ 278.377.806,26	\$ 1.743.524.155,00		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 48.307.200,00	\$ 9.178.368,00	\$ 57.485.568,00	57.485.568,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

		FECHA		3/05/2024 (Día / Mes / Año)
INVERSIÓN EN CONSULTORIA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES		
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 591.691.274,50	MANO DE OBRA CALIFICADA:	4	
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 129.211.604,00	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:		
AVANCE DE CONSULTORIA EN % (B/A):	21,84%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

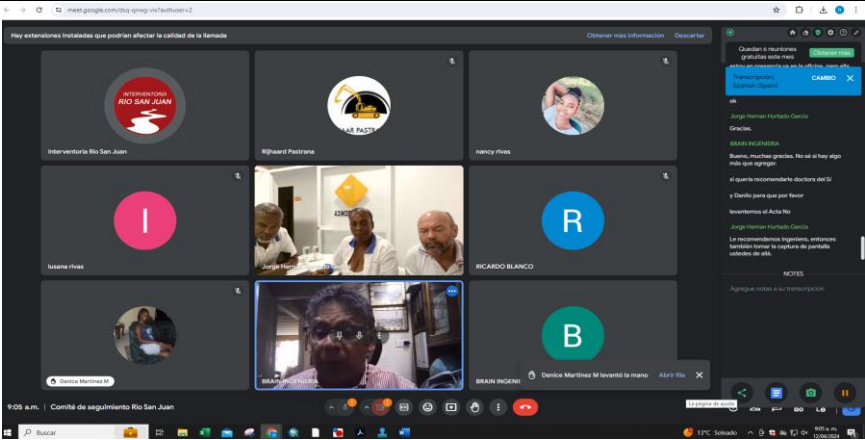

REVISION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	ELABORACION METODOLOGIA GENERAL Y MATRIZ MULTICRITERIO
--------------------------------------	--

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME SEMANAL MEPI-MN1-IN-15-FR-3



[illegible]

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Durante la semana del 25/03/24 al 31/03/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-5467 del 27 de marzo de 2024, se remitió oficio refutación visita técnica a la Junta Directiva del Consejo Comunitario General del San Juan - ACADESAN. 2. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-5467 del 27 de marzo de 2024, se remitió informe semanal No. 13 correspondiente a la semana (Del 18/03/2024 al 24/03/2024).		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Actividades programadas para semana del 10/04/24 al 16/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Remisión informe semanal No. 14 de la consultoría periodo comprendido entre el 1 al 7 de abril. 2. Remisión informe mensual No. 3 de la consultoría periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo. 3. Remisión informe acta de costos No. 4 de la consultoría periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo. 4. Reunión presencial 02-abr-2024 RIVIAS-Bogotá. 5. Reunión interna de trabajo especialidades geotécnica, hidráulica y geología, 03-abr-2024.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MIPR-MNU 30.15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>
NOTA: Los cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div>FORMA: </div> <div>CMISRE: <u>SAMUEL ESPINOSA MONTECUBO</u></div> <div>Matrícula Profesional No.: <u>25030-27988 CNE</u></div>
<small>Original: Informe mensual del Interventor, Archivo de Gestión del BICMG. Copias: Unidad Ejecutora (Subdirección de Sostenibilidad), Coordinada, Monitoreo y Dirección Técnica</small>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO EDICIÓN PÁGINA	REP.VI-02-19-078.3 1	
FECHA 2025/02/24 (dd/mm/aaaa)					
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDUARDO GIL PASTRANA MORALES			
OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:					
- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS - VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS - VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA - VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS - VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO - VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS - VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD - VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA - VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
INTERGENTES: CONSORCIO VALDES INTERVENIORES INSTITUTO LIMITADA Y SEAN INGENIERIA VALDES S.A.S.		INTERGENTES: INCOMPLAN S.A.S. INCOMPLAN S.A.S.			
CONTRATO No. 495 DE 2024		CONTRATO No. 6992 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 01/12/2024		FECHA DE INICIO: 01/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 1.745.524.000,00		VALOR INICIAL: \$ 300.000.000,00			
VALOR ADICIONES: \$ 0,00		VALOR ADICIONES: \$ 0,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.745.524.000,00		VALOR ACUMULADO: \$ 300.000.000,00			
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00		VALOR ANTICIPO: \$ 0,00			
VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00		VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0,00		SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0,00			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	FECHA	2024	2024	2024	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONSULTORIA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A): \$ 1.455.146.240,00 9,93%					
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 141.008.400,00 9,66%					
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 29.959.292,00 2,06%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 111.049.108,00 7,60%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 0,00 0,00%					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 141.008.400,00 9,66%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 29.959.292,00 2,06%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 111.049.108,00 7,60%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ 0,00					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ 0,00					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
III. AVANCE FÍSICO					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
Fuentes de Materiales					
Ubicación: N/A					
Permiso Minero: SI					
Licencia Ambiental: SI					
Observaciones: NO APLICA					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA CLIMA AMBIENTAL)					
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: CONSULTORIA INTER					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA: _____					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A					
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A					
EVALUOS APROBADOS: N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					

<p align="center">VB. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACTIVIDADES</p> <p>Durante la semana del 15/04/24 al 19/04/24 se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado No. CVI-CP-2023-4825-042 del 2 de abril de 2024, se remitió informe informe mensual No. 3 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024. Mediante comunicado No. CVI-CP-2023-4825-043 del 5 de abril de 2024, se remitió acta de control No. 4 de la consultoría, periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024. El día 2 de abril de 2024 se realizó reunión presencial en INVIAS que conto con la presencia de la supervisión por parte del Invia, interventoría y la Consultora (Temas tratados: Visita técnica, recopilación información (imágenes satelitales) Se realizó mesa de trabajo interna de la Consultoría el día 3 de abril de 2024. (Nota Técnica y Recopilación de información) En comunicación del 02-abr-2024, el Consejo Comunitario General del San Juan- ACADESAN, informa acerca que la visita técnica y actividades de campo, no son favorables, por lo tanto, los tiempos determinados para el desarrollo de esta fase, por dinámicas (situación humanitaria) del territorio hacen que los tiempos establecidos se prolonguen. 				
<p align="center">IK. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</p>				
<p>Actividades programadas para semana del 09/04/24 al 14/04/24 se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Remisión informe semanal No. 14 y 15 de la consultoría periodo comprendido entre 24 y 31 de marzo y el 1 al 7 de abril.</p>				
<p align="center">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</p>				
<p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-RJ-15 del Manual de Interventoría.</p>				
<p align="center">XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 200px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">FOTO 1</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">FOTO 2</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">FOTO 3</td> </tr> </table>		FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor.</p>				
<p align="center">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p>	<p align="center">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p>			
<p>Original: Informe mensual de Interventoría, Activa de Gestión del INVIAS. Archivo: Informe Mensual de Interventoría de la Consultoría de Asesoría y Promoción Ambiental</p>	<p>Firma: </p> <p>NOMBRE: <u>SAMUEL ESTEBAN HERNÁNDEZ LÓPEZ</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>20000-21988-CHP</u></p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA	REPORTE IN-19-078.3 1	
FECHA			CONTRATO		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ		SEMANA No. 36 del 04/05/2024 al 10/05/2024, Último Informe Semanal Si (Numeración Ordinaria)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDUARDO GIL PASTRANA MORALES			
OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:					
- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS - VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS - VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA - VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS - VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO - VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS - VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD - VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA - VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
INTERGENTES: CONSORCIO VALDES INTERVENIORES INFORME DE LA OBRA Y SERVICIOS TÉCNICOS		INTERGENTES: INCOMPLAN S.A.S. INCOMPLAN S.A.S.			
CONTRATO No. 005 DE 2024		CONTRATO No. 002 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 01/05/2024		FECHA DE INICIO: 01/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 1.745.524.000,00		VALOR INICIAL: \$ 300.000.000,00			
VALOR ADICIONES: \$ 0,00		VALOR ADICIONES: \$ 0,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.745.524.000,00		VALOR ACUMULADO: \$ 300.000.000,00			
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00		VALOR ANTICIPO: \$ 0,00			
VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00		VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	FECHA	2024	2024	2024	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONSULTORIA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A): \$ 1.455.146.340,00 40,38%					
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 281.000.272,00 19,52%					
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 281.000.272,00 19,52%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 0,00 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 0,00 0,00%					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 562.000.544,00 32,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 562.000.544,00 32,00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ _____					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ _____					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
III. AVANCE FÍSICO					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
Fuentes de Materiales					
UBICACIÓN: N/A					
UBICACIÓN: N/A					
OBSERVACIONES: NO APLICA					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA CLIMA AMBIENTAL)					
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: CONSULTORIA INTER					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA: _____					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A					
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A					
EVALUOS APROBADOS: N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Durante la semana del 8/04/24 al 14/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-544 del 8 de abril de 2024, se remiten los informes semanales No. 14 y No. 15 correspondiente al periodo del 25 al 31 de marzo de 2024 del 1 al 7 de abril, respectivamente. 2. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-545 del 8 de abril de 2024, se remite oficio a la Alcaldía Municipal de Toluca solicitando información de obras de protección en el Río San Juan. 3. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-546 del 8 de abril de 2024, se remite oficio a la Alcaldía Municipal de Medio San Juan solicitando información de obras de protección en el Río San Juan. 4. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-547 del 8 de abril de 2024, se remite oficio a la Alcaldía Municipal el Ajusco de San Juan solicitando información de obras de protección en el Río San Juan. 5. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-548 del 8 de abril de 2024, se remite oficio al Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - Chocó solicitando información de obras de protección en el Río San Juan. 6. El día 12 de abril de 2024 se realizó reunión virtual y presencial en INVIAS territorial Chocó y contó con la presencia de la supervisión de la intervención por parte del núcleo, interventoría y la Consultoría (Temas tratados: Visita técnica y componente social (acercamiento con los centros poblados)). 7. Se realizó mesa de trabajo interna de la Consultoría el día 10 de abril de 2024. (Recopilación de información - Fotografías aéreas)		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Actividades programadas para semana del 15/04/24 al 21/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Remisión informe semanal No. 16 de la consultoría periodo comprendido entre el 8 al 14 de abril. 2. Asistir a Reunión presencial el día 17 de abril de 2024 en las instalaciones del INVIAS.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/AMU-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL DIA 12-04-2024</p>	 <p>REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL DIA 12-04-2024</p>	 <p>REUNION PRESENCIAL Y VIRTUAL DIA 12-04-2024</p>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FORMA</div><div>NO. MISRE: <u>SAMUEL FERNANDO HERNÁNDEZ LOPEZ</u></div><div>Matrícula Profesional No.: <u>25000-27988 CNE</u></div></div>
<small>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Seguridad, Comandante, Operador y Dirección Técnica</small>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO EDICIÓN PÁGINA	REPORTE IN-19-078.3 1	
FECHA			CONTRATO		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ		SEMANA No. 37 del 2009 del 2009, n.º 21060200, Último Informe Semanal Si (Numeración Obra)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDUARDO GIL PASTRANA MORALES			
OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:					
- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS - VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS - VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA - VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS - VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO - VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS - VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD - VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA - VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
INTERGENTES: CONSORCIO VALDES INTERVENIORES INFORME DE LA OBRA, Y SEAN INGENIERIA VALDES		INTERGENTES: INCOMPLAN S.A.S. INCOMPLAN S.A.S.			
CONTRATO No. 405 DE 2009		CONTRATO No. 4002 DE 2009			
FECHA DE INICIO: 01/10/2009		FECHA DE INICIO: 01/10/2009			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2010		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2010			
VALOR INICIAL: \$ 1.745.524.000,00		VALOR INICIAL: \$ 300.000.000,00			
VALOR ADICIONES: \$ 0,00		VALOR ADICIONES: \$ 0,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.745.524.000,00		VALOR ACUMULADO: \$ 300.000.000,00			
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00		VALOR ANTICIPO: \$ 0,00			
VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00		VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	FECHA	2009	2009	2009	2009
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONSULTORIA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A): \$ 1.455.146.340,00 40,30%					
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 264.000.000,00 18,35%					
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 264.000.000,00 18,35%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 0,00 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 0,00 0,00%					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 500.000.000,00 28,35%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 264.000.000,00 18,35%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 0,00 0,00%					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ _____					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____					
PERÍODO FACTURADO: _____					
VALOR FACTURA: \$ _____					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite)					
Observaciones: _____					
III. AVANCE FÍSICO					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
Fuentes de Materiales					
UBICACIÓN: N/A					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES: NO APLICA					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: CONSULTORIA INTER					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____					
EMPLEOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA: _____					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A					
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A					
EVALUOS APROBADOS: N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Durante la semana del 15/04/24 al 21/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-548 del 16 de abril de 2024, se remiten los informes semanales No. 16 correspondiente al periodo del 8 al 14 de abril. 2. El día 17 de abril de 2024 se realizó reunión presencial en INAVAS y con la presencia de la supervisión de la Interventoría por parte del Invas, Interventoría y la Consultoría (Temas tratados: Vista técnica y componente social (acercamiento con los centros poblados) 3. Se realizó mesa de trabajo interna de la Consultoría el día 19 de abril de 2024. (Recopilación de información - Fotografías aéreas)		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Actividades programadas para semana del 22/04/24 al 28/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Remisión informe semanal No.17 de la consultoría periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril.		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MMI-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		<div>FIRMA</div> <div>_____ NOMBRE: SAMUEL FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ Matrícula Profesional No.: 25850-27988 CHD</div>


Original: Monitoreo mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INAVAS.

Copie: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Construcción, Mantenimiento y Dirección Técnica


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA	REPORTE IN-19-078.3 1	
FECHA			2024/05/20 (dd/mm/aaaa)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		SEMANA No. 38 del 22/05/2024, al 29/05/2024, Último Informe Semanal Si (Numeración Ordinaria)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDUARDO GUZ PASTRANA MORALES			
OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:					
• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS • VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS • VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA • VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA • VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS • VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO • VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL • VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS • VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD • VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA • VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
INTERGENTES: CONSORCIO VALDES INTERVENIORES INPROYECTO LIMITADA Y SERVICIOS INGENIERIA VALDES S.A.S.		INTERGENTES: INCOMPLAN S.A.S. INCOMPLAN S.A.S.			
CONTRATO No. 405 DE 2024		CONTRATO No. 6092 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 01/02/2024		FECHA DE INICIO: 01/02/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/02/2025		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/02/2025			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 1.745.524.000,00		VALOR INICIAL: \$ 300.000.000,00			
VALOR ADICIONES: \$ 0,00		VALOR ADICIONES: \$ 0,00			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.745.524.000,00		VALOR ACUMULADO: \$ 300.000.000,00			
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00		VALOR ANTICIPO: \$ 0,00			
VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00		VALOR AMORTIZADO: \$ 0,00			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0,00		SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0,00			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	FÍSICA	2024	2024	2024	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONSULTORIA		INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A): \$ 1.455.146.340,00 40,30%		TOTAL INVERSIÓN \$ 36 36			
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 993.693.272,00 68,30%		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 36 36			
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA: \$ 230.000.000,00 15,79%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ 36 36			
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 0,00 0,00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 36 36			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 0,00 0,00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 36 36			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 993.693.272,00 68,30%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 230.000.000,00 15,79%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0,00 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 36 36					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 36 36					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO		RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ 0,00		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ 0,00			
PERÍODO FACTURADO: \$ 0,00		PERÍODO FACTURADO: \$ 0,00			
VALOR FACTURA: \$ 0,00		VALOR FACTURA: \$ 0,00			
En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite.		En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informe al estado del trámite.			
Observaciones:		Observaciones:			
ANTICIPOS		INDICADOR IC		ANTICIPOS	
Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$	
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$	
Saldo \$				Saldo \$	
III. AVANCE FÍSICO					
No.	VOLUMEN TÉCNICO ENTREGABLE	PESES % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO	
1	CRÍTICOS				
	Estudios de identificación y priorización de los sitios críticos	9,64%	20%	16,00%	
	Estudios de identificación y priorización de los sitios críticos		20%	30,00%	
	Estudios de identificación y priorización de los sitios críticos		20%	5,00%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS				
	Estudios de topografía por itinerario	6,42%	50%	20%	
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA				
	Estudios de geología y geotecnia por itinerario	12,80%	50%	20%	
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA				
	Estudios de hidrología e hidráulica por itinerario	13,92%	50%	20%	
5	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL				
	Estudios de componente ambiental y social por itinerario	20,34%	50%		
6	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS				
	Estudios de análisis de riesgos por itinerario	7,40%	50%	20%	
7	ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD				
	Estudios de sostenibilidad por itinerario	10,71%	50%	20%	
8	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA				
	Evaluación socioeconómica y financiera por itinerario	6,89%	50%		
9	INFORME FINAL EJECUTIVO				
	Informe final ejecutivo por itinerario	6,42%	50%	20%	
10					
		5,35%	50%	20%	
11					
		100,00%			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PRIMARIOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI	NO	SI	SI	NO
UBICACIÓN: N/A	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	SI	SI	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI	NO	SI	SI	NO
UBICACIÓN: N/A	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	SI	SI	NO
OBSERVACIONES: NO APLICA				OBSERVACIONES: NO APLICA	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA CLIMA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA	
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: CONSULTORIA INTER		No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
EMPLEOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA: _____					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____		OBSERVACIONES: _____			
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____					
EVALUOS APROBADOS: _____					
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
Durante la semana del 22/04/24 al 28/04/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-580 del 22 de abril de 2024, se remitió oficio Seguimiento Social con la Junta Directiva del Consejo Comunitario General del San Juan - ACADESAN. 2. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-581 del 22 de abril de 2024, se remitió oficio Seguimiento Acta de costo No. 1 y Nud del contrato de referencia. 3. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4825-582 del 22 de abril de 2024, se remitió los informes semanales No.17 correspondiente al periodo del 15 al 21 de abril. 4. El día 25 de abril de 2024 se realizó reunión presencial en el INVIAS y con la presencia de la supervisión por parte del Invas, Interventoría y la Consultoría (Temas tratados: Visita técnica y componente social (acercamiento con los centros poblados, trabajos de campo y alternativas)		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Actividades programadas para semana del 29/04/24 al 05/05/24 se realizaron las siguientes actividades: 1. Remisión informe semanal No.18 de la consultoría periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril. 2. Remisión acta de costo No.5 de la consultoría periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril.		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MMI-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente registro, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		<div>FIRMA</div> <div>NOVIEMBRE - <u>SAMUEL FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ</u></div> <div>Matrícula Profesional No.: <u>25350-27988 CHB</u></div>
<small>Original: Módulo Manual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Gerencia, Control, Seguimiento y Dirección Técnica</small>		

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-4

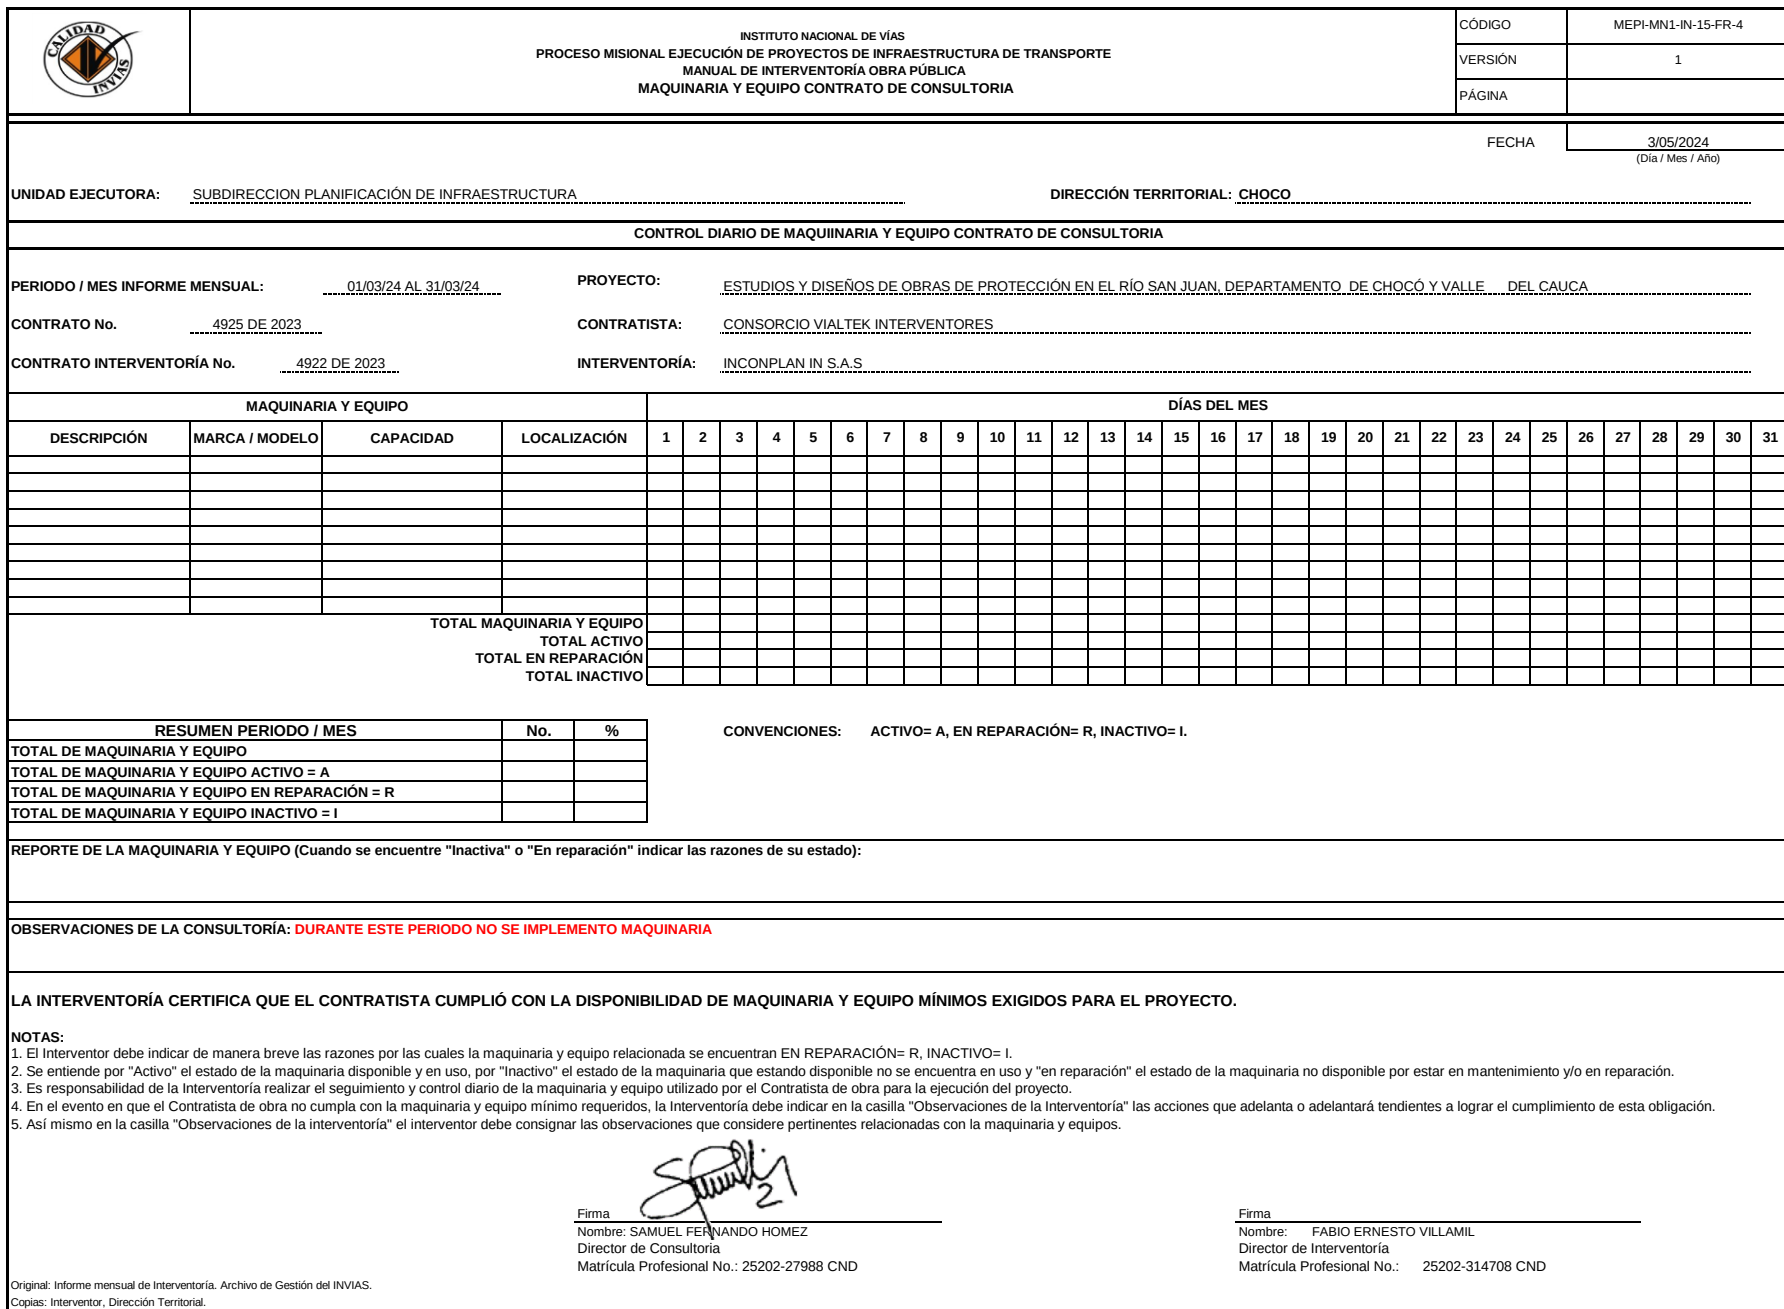

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y
SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
CONSULTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-6**



FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

CONTRATO DE CONSULTORIA No: ..4925 DE 2023..	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAITEK INTERVENTORES
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ..MARZO DE 2024..	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOQUÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ..4922 DE 2023..	INTERVENIOR: INCONPLAN IN S.A.S
NOMBRE ARL: SURA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha mar-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOT AS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que creó el servicio.


Firma _____
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-314708 CND

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA										CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8			
										VERSIÓN	1				
										PÁGINA					
										FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO					
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023										CONTRATISTA: CONSORCIO VALTEK INTERVENTORES					
MES INFORME MENSUAL: ABRIL										PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023										INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02		11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.043.524.155,00					
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02		10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00					
TOTAL									\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.743.524.155,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	\$ 16.775.460,00	\$ 3.187.337,00	\$ 19.962.797,00	\$ -	\$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00	\$ -	\$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.671.798.119,00	\$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	\$ 48.307.200,00	\$ 9.178.368,00	\$ 57.485.568,00	\$ -	\$ 57.485.568,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.614.312.551,00	\$ 1.614.312.551,00				
TOTALES			\$ 108.581.180,00	\$ 20.630.424,00	\$ 129.211.604,00	\$ -	\$ 129.211.604,00	\$ -		\$ 1.614.312.551,00	\$ 1.614.312.551,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*Estudios y diseños			\$ 108.581.180,00		\$ 20.630.424,00		\$ 129.211.604,00								
*															
*															
VALOR TOTAL			\$ 108.581.180,00		\$ 20.630.424,00		\$ 129.211.604,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div> Firma Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND</div><div> Firma Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO																																
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre: SAMUEL HERNANDO HOMEZ Director Consultoría Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND</div><div> Firma Nombre: FABIO ERNESTO VILAMIL Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO									
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023 CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE CONSULTORIA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma					Firma				
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ					Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL				
Director de Consultoría					Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND					Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		3	5	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO	
-------------------	---	------------------------	-------	--

CONTRATO DE OBRA No.	4925 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	
----------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.				

FECHA DE INICIO:	27/12/2023			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	1.743.524.155,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	1.743.524.155,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4922 DE 2023	INTERVENTOR:	INCOPLAN IN SAS	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	\$ 174.352.415,50	12	12	2023	30	6	2024	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 732.573.175,00	12	12	2023	30	6	2024	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 348.704.831,00	12	12	2023	31	12	2026	
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 523.057.246,50	31	12	2023	31	12	2028	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ -							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	M-100217762
Certificado de modificación o anexo No.:	2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)									
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		3	5	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:
MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 174.352.415,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 732.573.175,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 348.704.831,00
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 523.057.246,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ -

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	12	2023	30	6	2024
12	12	2023	30	6	2024
12	12	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100217762

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:
MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO MEPI-MN-IN-2-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1	
					VERSIÓN	1 1 de 1	
					PÁGINA		
					FECHA	03/05/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 0 <small>(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)</small>							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4925 DE 2023 <small>(Indicar número y año)</small>					CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4922 DE 2023 <small>(Indicar número y año)</small>					INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S		
JUSTIFICACIÓN: <small>(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)</small>							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceputar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:  Nombre: Mauricio Fernando Prieto Representante Legal o su Apoderado Consultor Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC				Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: _____			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN-IN-6-FR-1

ACTAS DE REUNIÓN MEPI-MN-IN-14-FR-2

CRONOGRAMA

[illegible]

ACTA DE COSTOS No. 1 CONSULTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO	FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No.	1 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		PERIODO MES:	27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ -

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	19-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE CONSULTORIA No.:	4925 DE 2023		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ (Indicar el ordenador del pago)		
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ - VALOR EN LETRAS: CERO PESOS		
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	1 DEL PERIODO 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.		
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copies: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-6-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 19/02/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 1 ACTA FINAL --		VALOR BÁSICO ACTA: \$		PERIODO: 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONSULTOR: CONSORCIO VALTEK INTERVENTORES						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$							
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																			
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO																			
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
3	2	Técnicos en Ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 60.155.000,00						\$ -		\$ -					
FACTOR MULTIPLICADOR						2,4						\$ -	2,4	\$ -					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 144.372.000,00													
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																			
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,85%	100,00%	\$ 60.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-8-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
FECHA 19/02/2024 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				ACTA No. 1 ACTA FINAL		VALOR BÁSICO ACTA: \$		PERIODO: 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023			
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONSULTOR: CONSORCIO VALTEK INTERVENTORES						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$					
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00					
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR			
11	1	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	VI	7,49%	100,00%	\$ 35.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 31.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
12	1	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	VII	10,71%	100,00%	\$ 50.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 5.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 45.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
13	1	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	VIII	6,85%	100,00%	\$ 32.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.200.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 28.800.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
14	1	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	IX	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 27.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
15	1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	X	5,35%	100,00%	\$ 25.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 2.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 22.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
16	1	INFORME FINAL EJECUTIVO	XI	0,00%	100,00%	\$ -											
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	\$ -				0,00	\$ -	0,00	\$ -				
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)						\$ 467.000.000,00					\$ -		\$ -				
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																	
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	(\$)	UTILIZACIÓN	PARCIAL (\$)											
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 200.000,00	90,00	\$ 18.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	\$ 699.000,00	25,00	\$ 17.475.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
20	1	Georeferenciación (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mágenes en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-8-FR-1			
												VERSIÓN	1			
												PÁGINA				
														FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: \$ PERIODO: 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ACTA FINAL -																
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONSULTOR: CONSORCIO VALTEK INTERVENTORES						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00										
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatemetrías y Batimetrías (S/comprobante) (incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	MI	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	MI	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc.))(S/comprobante de pago. Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (S/comprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS													
											CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-8-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA			
											FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)		
											27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: \$ PERIODO:														
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023 PLAZO INICIAL: 0.13 MESES PLAZO ACUMULADO: 0.13 MESES														
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024														
CONSULTOR: CONSORCIO VIALETEK INTERVENTORES FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A														
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$														
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00														
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombres - Meses)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
31	1	Educación de Informes Finales de todos los volúmenes, (Si/comprobante) Incluye impresión, ploteo de plancheros original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
Ajuste por Acta de modificación														
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)						\$ 853.774.349,00						\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)						\$ 1.465.146.349,00						\$ -		\$ -
IVA = 19% * (D) = (E)						\$ 278.377.806,00						\$ -		\$ -
COSTO TOTAL = (D) + (E)						\$ 1.743.524.155,00						\$ -		\$ -
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.														
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.														
Valor Anticipo Otorgado			Valor	%	VALOR BÁSICO PRESENTE MES									
Valor Amortizado Presenta Acta			\$ -	-	IVA									
Valor Amortizado Acumulado			\$ -	-	TOTAL PRESENTE MES									
Valor Saldo por Amortizar			\$ -	-										
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -														
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ -														
Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo														
VALOR EN LETRAS: CERO PESOS														
OBSERVACIONES														
NOTAS:														
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse														
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.														
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.														
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.														
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.														
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,														
Firma: Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ Representante Legal o su Apoderado Consultoria Matricula Profesional No.: 1113-10656 CPITV														
Firma: Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoria Matricula Profesional No.: 25202-40972 CND														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.														



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE CONSULTORIA	<input checked="" type="text" value="X"/>	27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	\$	-
TOTAL							\$	

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 4925 DE 2023 Contratista CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						
Objeto del Contrato						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No.: 1 Valor basico \$ - Período 27 al 31 de Diciembre de 2023						
Valor Incluido Iva \$ -						
VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		\$ -		\$ -
2						
3						
		TOTALES		\$ -		\$ -
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1	ISTMINA	\$ -	\$ -		
	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	\$ -	\$ -		
	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		\$ -	\$ -		
TOTAL			\$ -	\$ -		
<div> MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores Matrícula No. 01113-10656 CPITVC</div> <div> SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula No. 25202-40972 CND</div>						

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>													
		<div>FECHA</div> <div>19/02/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>													
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</div>		<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CHOCO</div>													
<div>CONTRATO DE CONSULTORIA No.:</div> <div>4925 DE 2023</div>		<div>CONTRATISTA:</div> <div>CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div>													
<div>MES INFORME MENSUAL:</div> <div>dic-23</div>		<div>PROYECTO:</div> <div>ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA</div>													
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>4922 DE 2023</div>		<div>INTERVENTOR:</div> <div>INCOPLAN IN SAS</div>													
<div>RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA</div>															
<div>Vigencia Fiscal</div>	<div>Registro No.</div>	<div>Programa-Subprograma-Proyecto</div>	<div>Recurso No.</div>	<div>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</div>	<div>Contrato Principal / Adicional No.</div>	<div>Valor</div>	<div>Saldo del Acta Anterior</div>								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.043.524.155,00								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00								
TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00								
<div>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</div> <div>\$ 1.743.524.155,00</div>															
<div>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>															
<div>Acta No.</div>	<div>Tipo de Acta</div>	<div>Mes/Año de Ejecución</div>	<div>Valor Acta sin IVA</div>	<div>Valor IVA</div>	<div>Valor Total Ejecutado</div>	<div>Anticipo Amortizado Acta</div>	<div>Valor Total Pagado Descontando</div>	<div>Saldo Anticipo por Amortizar</div>	<div>No. de Registro y fecha</div>	<div>Saldo Registro Presupuestal</div>	<div>Saldo del Contrato</div>	<div>No. y Fecha de Radicación Cuentas</div>	<div>Indicar pago según</div>		<div>Observaciones</div>
1		27/01/23 AL 31/12/23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO	
TOTALES															
<div>Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.</div>															
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div>															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*Estudios y diseños			\$ -		\$ -		\$ -								
*															
*															
VALOR TOTAL			\$ -		\$ -		\$ -								
<div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div>															
<div>NOTA:</div> <div>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.</div>															
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ</div><div>RIL CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div><div>Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-20541</div></div></div>															
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>															

[illegible]

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Diciembre de 2023.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de diciembre de 2023, y a los sistemas de salud por el mes de diciembre de 2023, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de DICIEMBRE de 2023.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHagiraldo ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1404823	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.743.524.155,00	Saldo x Obligar:	1.743.524.155,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901778797	Razón Social:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	510845951	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA				Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4925/2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-12-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.									
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF									
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
					2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00						
					Total:		1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00			

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974784429				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901778797				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá			
41. Dirección principal CL 25 # 8 E 161								
42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com								
43. Código postal				44. Teléfono 1 3176574703		45. Teléfono 2 3134084392		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 20231020	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 714485255								
07- Retención en la fuente a título de rent								
14- Informante de exogena								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
				57. Modo				
				58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14960528681



(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 7 9 2 0 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico

administracion@brainingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

45. Teléfono 2

6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 2 1 0 7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14844666361



(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 3 2 4 8 6

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico

inprotektolimitada@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 0 7 8 3

45. Teléfono 2

6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 5, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 2 3

Otras actividades

1

6 8 1 0, 4 1 1 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES identificado con el **NIT 901.778.797-9** se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No. **510-84595-1** denominada: **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,



Darin Jhuliana Quelal Fernandez

Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente

Escríbeme por Teams dquelal

Email: dquelal@bancodeoccidente.com.co

www.bancodeoccidente.com.co

¡Síguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente



Del lado
de los que hacen.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 7 8 7 9 7	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 # 8 E 161					
25. País Colombia		26. Departamento Cundinamarca		27. Municipio Cajicá	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 / 1 2 : 5 9 : 5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social


CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

34. Tipo solicitud	Cód.
AUTORIZACIÓN	1

ACTA DE COSTOS No. 2 CONSULTORIA

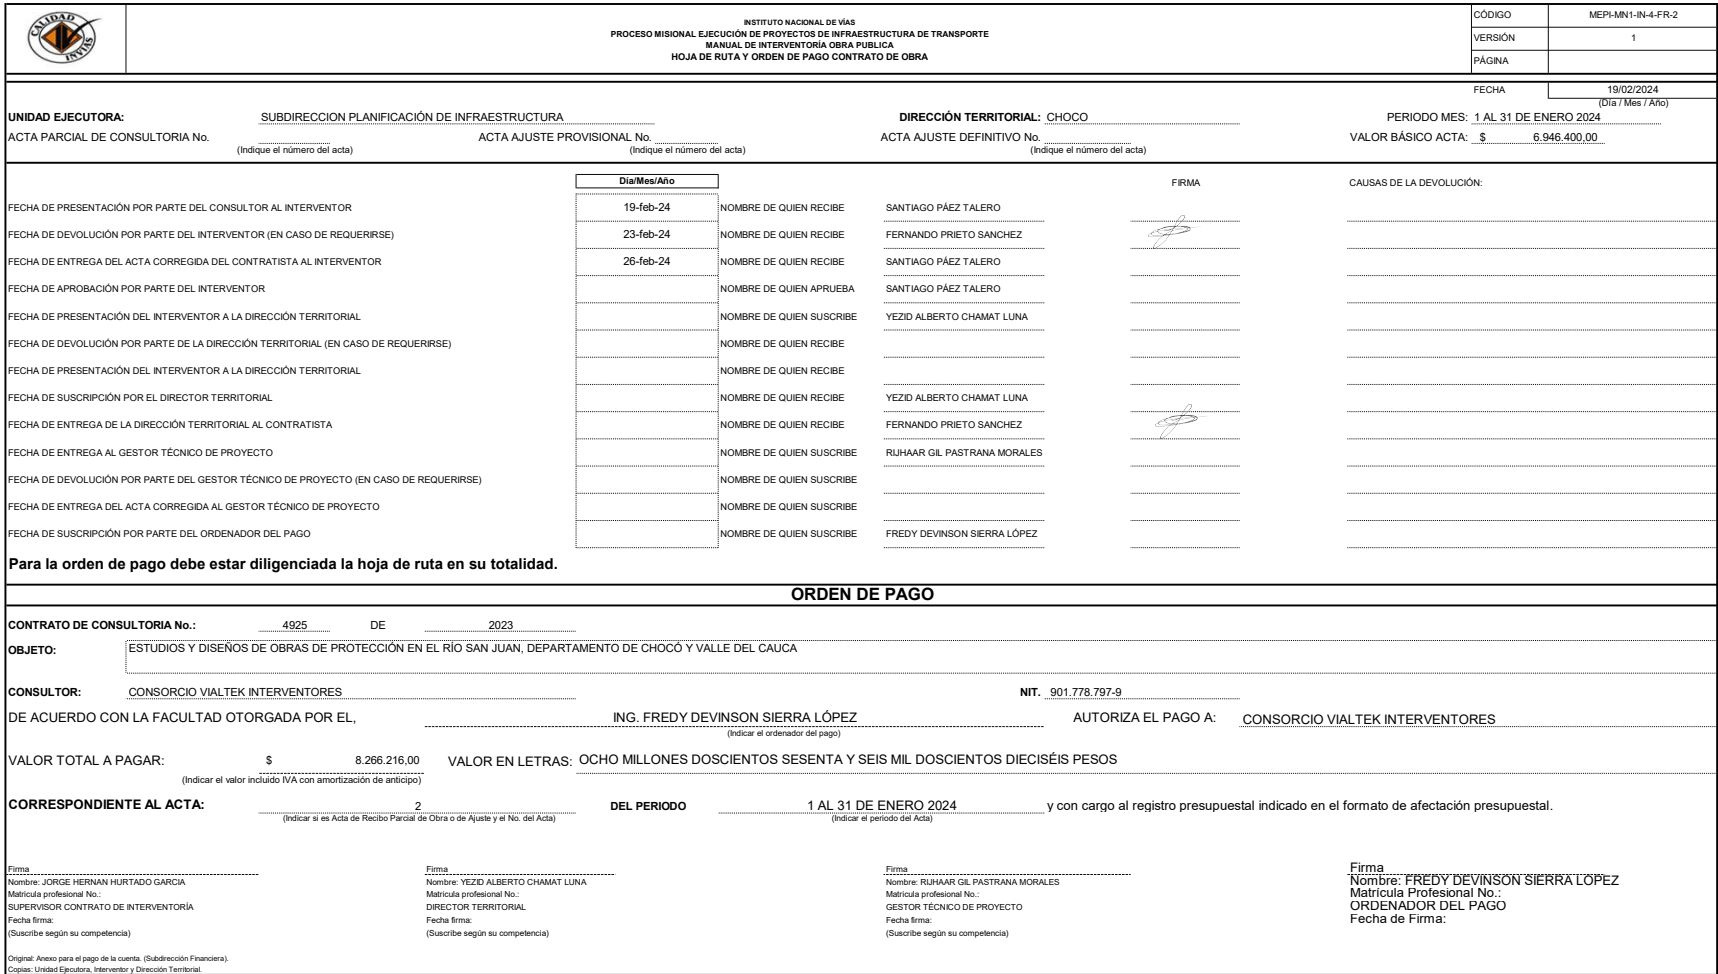

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-8-FR-1		
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA		
												FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO												ACTA No.	2	
												ACTA FINAL	☐	
												VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 6.946.400,00	
												PERIODO:	1 AL 31 DE ENERO 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL:	0.13 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27/12/2023 (Indique día/mes/año)	
												FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)	
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023												VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ -	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):												\$ 1.743.524.155,00		
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO														
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,30	\$ 2.811.000,00	0,30	\$ 2.811.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 60.155.000,00							\$ 2.811.000,00	\$ 2.811.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,4								2,4
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 144.372.000,00							\$ 6.746.400,00	\$ 6.746.400,00
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES														
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,85%	100,00%	\$ 60.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP1-MN1-IN-8-FR-1									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA									
FECHA 19/02/2024 (Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				ACTA No. 2		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.946.400,00		PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO 2024							
						ACTA FINAL ☐															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)											
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -											
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00															
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023															
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*														ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR							
11	1	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	VI	7,49%	100,00%	\$ 35.000.000,00															
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 31.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
12	1	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	VII	10,71%	100,00%	\$ 50.000.000,00															
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 5.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 45.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
13	1	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	VIII	6,85%	100,00%	\$ 32.000.000,00															
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.200.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 28.800.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
14	1	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	IX	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00															
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 27.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
15	1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	X	5,35%	100,00%	\$ 25.000.000,00															
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 2.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 22.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16	1	INFORME FINAL EJECUTIVO	XI	0,00%	100,00%	\$ -															
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	\$ -				0,00	\$ -	0,00	\$ -								
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)						\$ 467.000.000,00						\$ -		\$ -							
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	(\$)	UTILIZACIÓN	PARCIAL (\$)															
17	1	Viajeros Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 200.000,00	90,00	\$ 18.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -							
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	\$ 699.000,00	25,00	\$ 17.475.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -							
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -							
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -							
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-8-FR-1				
											VERSIÓN	1				
											PÁGINA					
											FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO											ACTA No.	2				
											ACTA FINAL	☐				
											VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 6.946.400,00				
											PERIODO:	1 AL 31 DE ENERO 2024				
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023											PLAZO INICIAL:	0.13 MESES (En meses según contrato principal) 27/12/2023				
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	30/06/2024 (Indique día/mes/año)				
											FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES											FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023											VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ -				
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 1.743.524.155,00				
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00		
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
26	1	Perforaciones en Suelos (Incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc) (S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regalías, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS				CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-8-FR-1								
					VERSIÓN	1								
					PÁGINA									
					FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO		ACTA No. 2 ACTA FINAL ☐	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.946.400,00	PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO 2024					
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023				PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)		PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)								
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -								
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00										
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023										
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (Sicomprobante) Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)				\$ 853.774.349,00					\$ 200.000,00		\$ 200.000,00	
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)				\$ 1.465.146.349,00					\$ 6.946.400,00		\$ 6.946.400,00	
		* IVA = 19% * (D) = (E)				\$ 278.377.806,00					\$ 1.319.816,00		\$ 1.319.816,00	
		* COSTO TOTAL = (D) + (E)				\$ 1.743.524.155,00					\$ 8.266.216,00		\$ 8.266.216,00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.														
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.														
Valor Anticipo Otorgado		Valor	%		VALOR BÁSICO PRESENTE MES									
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ -			IVA									
Valor Amortizado Acumulado		\$ -			TOTAL PRESENTE MES									
Valor Saldo por Amortizar		\$ -												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -														
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 8.266.216,00					VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS									
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)														
OBSERVACIONES														
NOTAS:														
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse														
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.														
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.														
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.														
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.														
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,														
Firma:  Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV														
Firma: _____ Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.														



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE CONSULTORIA	☒	1 AL 31 DE ENERO DE 2024
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	8.266.216,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	\$	-
TOTAL							\$	8.266.216,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 4925 DE 2023 Contratista CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Objeto del Contrato						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No.: <u>2</u> Valor basico \$ 6.946.400,00 Período 1 al 31 de Enero de 2024 Valor Incluido Iva \$ 8.266.216,00						
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		\$ 8.266.216,00		\$ 8.266.216,00
2						
3						
TOTALES				\$ 8.266.216,00		\$ 8.266.216,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1		CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1		ISTMINA	\$ 1.499.777,59	\$ 1.260.317,30	
	MUNICIPIO 2		MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	\$ 2.999.555,17	\$ 2.520.634,60	
	MUNICIPIO 3		SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	\$ 3.766.883,24	\$ 3.165.448,10	
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 8.266.216,00	\$ 6.946.400,00	
NIT	DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
	MUNICIPIO 2			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 2				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 3				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 4			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 4				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 5			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 5				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 6			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 6				\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 8.266.216,00	\$ 6.946.400,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores Matrícula No. 01113-10656 CPITVC </div> <div> SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula No. 25202-40972 CND </div> </div>						

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>																																																																
		<div>FECHA</div> <div>19/02/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</div>		<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CHOCO</div>																																																																
<div>CONTRATO DE CONSULTORIA No.:</div> <div>4925 DE 2023</div> <div>MES INFORME MENSUAL:</div> <div>ene-24</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>4922 DE 2023</div>		<div>CONTRATISTA:</div> <div>CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div> <div>PROYECTO:</div> <div>ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>INCOPLAN IN SAS</div>																																																																
<div>RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA</div> <table><tr><th>Vigencia Fiscal</th><th>Registro No.</th><th>Programa-Subprograma-Proyecto</th><th>Recurso No.</th><th>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</th><th>Contrato Principal / Adicional No.</th><th>Valor</th><th>Saldo del Acta Anterior</th></tr><tr><td>2023</td><td>1404823</td><td>C-2406-0600-6-0-2406039-02</td><td>11</td><td>NACIÓN</td><td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>\$ 1.043.524.155,00</td><td>\$ 1.043.524.155,00</td></tr><tr><td>2023</td><td>1404823</td><td>C-2406-0600-6-0-2406039-02</td><td>10</td><td>NACIÓN</td><td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>\$ 700.000.000,00</td><td>\$ 700.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>\$ 1.743.524.155,00</td><td>\$ 1.743.524.155,00</td></tr></table> <div>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</div> <div>\$ 1.743.524.155,00</div>			Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.043.524.155,00	2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00	TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00																																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior																																																											
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.043.524.155,00																																																											
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00																																																											
TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00																																																											
<div>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div> <table><tr><th>Acta No.</th><th>Tipo de Acta</th><th>Mes/Año de Ejecución</th><th>Valor Acta sin IVA</th><th>Valor IVA</th><th>Valor Total Ejecutado Acumulado Acta</th><th>Anticipo Amortizado Acta</th><th>Valor Total Pagado Descontando Anticipo</th><th>Saldo Anticipo por Amortizar</th><th>No. de Registro y fecha</th><th>Saldo Registro Presupuestal</th><th>Saldo del Contrato</th><th>No. y Fecha de Radicación Cuentas</th><th colspan="2">Indicar pago según</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>27/01/23 AL 31/12/23</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td><td>REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20</td><td>\$ 1.743.524.155,00</td><td>\$ 1.743.524.155,00</td><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>1/01/24 AL 31/01/24</td><td>\$ 6.946.400,00</td><td>\$ 1.319.816,00</td><td>\$ 8.266.216,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 8.266.216,00</td><td></td><td>REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-21</td><td>\$ 1.735.257.939,00</td><td>\$ 1.735.257.939,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>\$ 6.946.400</td><td>\$ 1.319.816</td><td>\$ 8.266.216</td><td>\$ -</td><td>\$ 8.266.216</td><td></td><td></td><td>\$ 1.735.257.939</td><td>\$ 1.735.257.939</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</div>			Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según		Observaciones	1		27/01/23 AL 31/12/23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO		2		1/01/24 AL 31/01/24	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-21	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00					TOTALES			\$ 6.946.400	\$ 1.319.816	\$ 8.266.216	\$ -	\$ 8.266.216			\$ 1.735.257.939	\$ 1.735.257.939				
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según		Observaciones																																																			
1		27/01/23 AL 31/12/23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO																																																				
2		1/01/24 AL 31/01/24	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-21	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00																																																							
TOTALES			\$ 6.946.400	\$ 1.319.816	\$ 8.266.216	\$ -	\$ 8.266.216			\$ 1.735.257.939	\$ 1.735.257.939																																																							
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div> <table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>*Estudios y diseños</td><td>\$ 6.946.400,00</td><td>\$ 1.319.816,00</td><td>\$ 8.266.216,00</td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 6.946.400,00</td><td>\$ 1.319.816,00</td><td>\$ 8.266.216,00</td></tr></table> <div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div>				VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	*Estudios y diseños	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	*				VALOR TOTAL	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00																																																
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL																																																															
*Estudios y diseños	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00																																																															
*																																																																		
VALOR TOTAL	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00																																																															
<div>NOTA:</div> <div>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ</div><div>R/L CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div><div>Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPTVC</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-20541</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div></div>																																																																		



FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL. DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha feb-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación contractual establecida contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y contribuciones parafiscales de sus empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben estar respaldados por el pago de los aportes correspondientes.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado a Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Interventor debe diligenciar la casilla "Observaciones" en cada una de las entregas de servicios, al momento de recibirlos, cumpliendo con lo establecido en la Orden de Compra, el cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de ellos y el valor de los servicios prestados.
8. El Interventor debe señalar con un (*) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que presé el servicio.

Firma _____
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matricula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Enero de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de enero de 2023, y a los sistemas de salud por el mes de febrero de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de ENERO de 2023.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHagiraldo ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	1404823	Fecha Registro:	2023-12-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.743.524.155,00		Saldo x Obligar:	1.743.524.155,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	901778797	Razón Social:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	510845951	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4925/2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-12-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00							
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00					

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974784429				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901778797				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá			
41. Dirección principal CL 25 # 8 E 161								
42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com								
43. Código postal				44. Teléfono 1 3176574703		45. Teléfono 2 3134084392		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 20231020	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 714485255								
07- Retención en la fuente a título de rent								
14- Informante de exogena								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14960528681



(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 7 9 2 0 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico

administracion@brainingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

45. Teléfono 2

6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 2 1 0 7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14844666361



(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 3 2 4 8 6

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico

inprotektolimitada@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 0 7 8 3

45. Teléfono 2

6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 5, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 2 3

Otras actividades

1

6 8 1 0, 4 1 1 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES identificado con el **NIT 901.778.797-9** se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No. **510-84595-1** denominada: **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,



Darin Jhuliana Quelal Fernandez

Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente

Escríbeme por Teams dquelal

Email: dquelal@bancodeoccidente.com.co

www.bancodeoccidente.com.co

¡Síguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente



Del lado
de los que hacen.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 7 8 7 9 7	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 # 8 E 161					
25. País Colombia		26. Departamento Cundinamarca		27. Municipio Cajicá	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 / 1 2 : 5 9 : 5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

ACTA DE COSTOS No. 3 CONSULTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN 1			
		PÁGINA			
		FECHA 05/03/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		
ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 3 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	PERIODO MES: 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 16.775.460,00		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	7/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RUHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA					
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES NIT. 901.778.797-9					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 19.962.797,00 VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 DEL PERIODO 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.					
Firma Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA Matricula profesional No.: SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matricula profesional No.: DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES Matricula profesional No.: GESTOR TECNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP/MN1-IN-8-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA				
												FECHA 05/03/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 16.775.460,00 PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO 2024																
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) 27/12/2023 (Indique día/mes/año)		PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00				
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO																
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,30	\$ 2.811.000,00	0,60	\$ 5.622.000,00		
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					0,40	\$ 2.248.000,00	0,40	\$ 2.248.000,00		
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,12	\$ 688.800,00	0,12	\$ 688.800,00		
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 60.155.000,00						\$ 5.747.800,00		\$ 8.558.800,00		
FACTOR MULTIPLICADOR						2,4						2,40		2,40		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 144.372.000,00						\$ 13.794.720,00		\$ 20.541.120,00		
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00										
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00										
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,85%	100,00%	\$ 60.000.000,00										
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00										
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00										
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPMN-IN-6-FR-1	
												VERSIÓN 1	
												PÁGINA	
FECHA 05/03/2024 (Día / Mes / Año)													
1 AL 29 DE FEBRERO 2024													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 16.775.460,00 PERIODO: 2024													
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023 PLAZO INICIAL: 0.13 MESES PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES													
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024													
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A													
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -													
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00													
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*													
ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS													
CONDICIONES ACTUALIZADAS													
Acta de Modif. No. de fecha													
PRESENTE ACTA													
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA													
No. de Orden													
Cantidad													
CONCEPTO													
Costo Mensual													
Prima Regional													
Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)													
Valor Total													
Costo Mensual													
Prima Regional													
Total Dedicación Recurso													
VALOR													
DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD													
VALOR													
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO													
VALOR													
11													
1													
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.													
VI													
7,49%													
100,00%													
\$ 35.000.000,00													
10,00%													
\$ 3.500.000,00													
90,00%													
\$ 31.500.000,00													
12													
1													
ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.													
VII													
10,71%													
100,00%													
\$ 50.000.000,00													
10,00%													
\$ 5.000.000,00													
90,00%													
\$ 45.000.000,00													
13													
1													
ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.													
VIII													
6,85%													
100,00%													
\$ 32.000.000,00													
10,00%													
\$ 3.200.000,00													
90,00%													
\$ 28.800.000,00													
14													
1													
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD													
IX													
6,42%													
100,00%													
\$ 30.000.000,00													
10,00%													
\$ 3.000.000,00													
90,00%													
\$ 27.000.000,00													
15													
1													
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA													
X													
5,35%													
100,00%													
\$ 25.000.000,00													
10,00%													
\$ 2.500.000,00													
90,00%													
\$ 22.500.000,00													
16													
1													
INFORME FINAL EJECUTIVO													
XI													
0,00%													
100,00%													
\$ -													
100,00%													
\$ -													
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)													
\$ 467.000.000,00													
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS													
No. de ORDEN													
CANT.													
CONCEPTO													
UNIDAD													
(\$)													
UTILIZACIÓN													
PARCIAL (\$)													
17													
1													
Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)													
Día													
\$ 200.000,00													
90,00													
\$ 18.000.000,00													
18													
1													
Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)													
Tiquete ida y vuelta													
\$ 699.000,00													
25,00													
\$ 17.475.000,00													
19													
1													
Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)													
Global													
\$ 50.000.000,00													
1,00													
\$ 50.000.000,00													
20													
1													
Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)													
Global													
\$ 10.000.000,00													
1,00													
\$ 10.000.000,00													
21													
1													
Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago													
Global													
\$ 7.000.000,00													
1,00													
\$ 7.000.000,00													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP/ANN-18-FR-1		
		VERSIÓN 1										PÁGINA		
FECHA 05/03/2024 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				ACTA No. 3		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 16.775.460,00		PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO 2024				
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023		PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)										
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)										
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -										
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00										
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (Sicomprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					1,00	\$ 200.000,00	2,00	\$ 400.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	MI	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	MI	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (Sicomprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc.) (Sicomprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, registros, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (Sicomprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (sicomprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEP4MN1-IN-6-FR-1	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		
											FECHA	05/03/2024 (Día / Mes / Año)	
											1 AL 29 DE FEBRERO 2024		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 16.775.460,00 PERIODO: 2024													
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023 PLAZO INICIAL: 0.13 MESES PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES													
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA													
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES													
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA													
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023													
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*											CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS											Acta de Modif. No. de fecha		
PRESENTE ACTA											EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
No. de Orden											Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)		
Cantidad											Valor Total		
CONCEPTO											Costo Mensual		
Costo Mensual											Prima Regional		
Prima Regional											Valor		
Global											\$ 10.000.000,00		
1											1,00		
Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)											\$ 10.000.000,00		
Ajuste por Acta de modificación													
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)											\$ 853.774.349,00		
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)											\$ 1.465.146.349,00		
* IVA = 19% * (D) = (E)											\$ 278.377.806,00		
* COSTO TOTAL = (D) + (E)											\$ 1.743.524.155,00		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.													
VALOR Anticipo Otorgado													
VALOR Amortizado Presenta Acta													
VALOR Amortizado Acumulado													
VALOR Saldo por Amortizar													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 19.962.797.00											VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)													
OBSERVACIONES													
NOTAS:													
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de													
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.													
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.													
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.													
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.													
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.													
7. Las dedicciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.													
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,													
Firma:											Firma:		
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ											Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO		
Representante Legal o su Apoderado											Representante Legal Interventoría		
Consultoría											Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND		
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).													
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.													



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE CONSULTORIA	<input checked="" type="text" value="X"/>	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		OTRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CUAL? _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 19.962.797,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL						\$	19.962.797,00

Gestor Técnico de Proyecto
g. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 4925 DE 2023 Contratista CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Objeto del Contrato						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No.: <u>3</u> Valor basico \$ 16.775.460,00 Período 1 al 29 de febrero de 2024 Valor Incluido Iva \$ 19.962.797,00						
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		\$ 19.962.797,00		\$ 19.962.797,00
2						
3						
TOTALES				\$ 19.962.797,00		\$ 19.962.797,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1		CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
891.680.067-2	MUNICIPIO 1		ISTMINA	\$ 3.621.942,07	\$ 3.043.648,86	
818001206-2	MUNICIPIO 2		MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	\$ 7.243.884,14	\$ 6.087.297,72	
818000002-2	MUNICIPIO 3		SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	\$ 9.096.970,78	\$ 7.644.513,42	
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 19.962.797,00	\$ 16.775.460,00	
NIT	DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
	MUNICIPIO 2			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 2				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 3				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 4			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 4				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 5			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 5				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 6			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 6				\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 19.962.797,00	\$ 16.775.460,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores Matrícula No. 01113-10656 CPITVC</p> </div> <div> <p>SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula No. 25202-40972 CND</p> </div> </div>						

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA										CÓDIGO	MEPI/MN1-IN-15-FR-8			
										VERSIÓN	1				
										PÁGINA					
										FECHA	5/03/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO					
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023										CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024										PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023										INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.035.257.939,00								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00								
TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.735.257.939,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.743.524.155,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según		Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO	Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,0000	\$ 8.266.216,0000	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	\$ 16.775.460,00	\$ 3.187.337,00	\$ 19.962.797,00	\$ -	\$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00				
TOTALES			\$ 23.721.860,00	\$ 4.507.153,00	\$ 28.229.013,00	\$ -	\$ 28.229.013,00	\$ -		\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*Estudios y diseños			\$ 16.775.460,00		\$ 3.187.337,00		\$ 19.962.797,00								
*															
* VALOR TOTAL			\$ 16.775.460,00		\$ 3.187.337,00		\$ 19.962.797,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma Nombre: FERNANDO PRÉTO SANCHEZ R.L. CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC															
Firma Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-20541															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															



PÁGINA	
--------	--

FECHA	5/03/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/03/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato indicando mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En caso en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido en el contrato, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adopta o pretende adoptar para lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información que se realice en el contrato.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Febrero de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de febrero de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de marzo de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de FEBRERO de 2023.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de marzo de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHagiraldo ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	1404823	Fecha Registro:	2023-12-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.743.524.155,00		Saldo x Obligar:	1.743.524.155,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	901778797	Razón Social:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	510845951	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4925/2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-12-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF										
					2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00							
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00					

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974784429				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901778797				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá			
41. Dirección principal CL 25 # 8 E 161								
42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com								
43. Código postal				44. Teléfono 1 3176574703		45. Teléfono 2 3134084392		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 20231020	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 714485255								
07- Retención en la fuente a título de rent								
14- Informante de exogena								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14960528681



(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 7 9 2 0 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico

administracion@brainingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

45. Teléfono 2

6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 2 1 0 7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14844666361



(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 3 2 4 8 6

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico

inprotektolimitada@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 0 7 8 3

45. Teléfono 2

6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 5, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 2 3

Otras actividades

1

6 8 1 0, 4 1 1 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES identificado con el **NIT 901.778.797-9** se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.510-84595-1 denominada: **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,



Darin Jhuliana Quelal Fernandez

Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente

Escríbeme por Teams dquelal

Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co

www.bancodeoccidente.com.co

¡Síguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente



Del lado
de los que hacen.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 7 8 7 9 7	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 # 8 E 161					
25. País Colombia		26. Departamento Cundinamarca		27. Municipio Cajicá	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 / 1 2 : 5 9 : 5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

34. Tipo solicitud	Cód.
AUTORIZACIÓN	1

ACTA DE COSTOS No. 4 CONSULTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO	PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO 2024
ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 4 <small>(Indique el número del acta)</small>	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. <small>(Indique el número del acta)</small>	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. <small>(Indique el número del acta)</small>	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 36.552.120,00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	5/04/2024	SANTIAGO PÁEZ TALERO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		FERNANDO PRIETO SANCHEZ			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		SANTIAGO PÁEZ TALERO			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		SANTIAGO PÁEZ TALERO			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		FERNANDO PRIETO SANCHEZ			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		RUHAAR GIL PASTRANA MORALES			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		SIRLEY DABEIBA MERCHAN			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.


ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA			
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	NIT. 901.778.797-9		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO <small>(Indicar el ordenador del pago)</small> AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 43.497.023,00 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS PESOS M/CTE <small>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)</small>			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 <small>(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)</small>	DEL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. <small>(Indicar el periodo del Acta)</small>		
Firma Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA Matricula profesional No.: SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	Firma Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matricula profesional No.: DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	Firma Nombre: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES Matricula profesional No.: GESTOR TECNICO DE PROYECTO Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	Firma Nombre: ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO Matricula Profesional No.: ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:
<small>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</small>			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP/MN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 05/04/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 36.552.120,00		PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023							PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)					PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00												
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS							CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023												
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombres-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO																		
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,30	\$ 2.811.000,00	0,90	\$ 8.433.000,00					
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					0,75	\$ 4.012.500,00	0,75	\$ 4.012.500,00					
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					1,00	\$ 5.620.000,00	1,40	\$ 7.868.000,00					
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,30	\$ 1.722.000,00	0,42	\$ 2.410.800,00					
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL											\$ 14.165.500,00		\$ 22.724.300,00					
	FACTOR MULTIPLICADOR											2,40		2,40					
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)											\$ 33.997.200,00		\$ 54.538.320,00					
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
	GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																		
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,85%	100,00%	\$ 60.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 05/04/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 36.552.120,00		PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
11	1	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	VI	7,49%	100,00%	\$ 35.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 31.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
12	1	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	VII	10,71%	100,00%	\$ 50.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 5.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 45.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
13	1	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	VIII	6,85%	100,00%	\$ 32.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.200.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 28.800.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
14	1	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	IX	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 27.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 05/04/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 36.552.120,00		PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023							PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS							CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00					
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
15	1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	X	5,35%	100,00%	\$ 25.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 2.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 22.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
16	1	INFORME FINAL EJECUTIVO	XI	0,00%	100,00%	\$ -													
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	\$ -				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)						\$ 467.000.000,00						\$ -		\$ -					
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																			
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	(\$)	UTILIZACIÓN	PARCIAL (\$)													
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 200.000,00	90,00	\$ 18.000.000,00					2,00	\$ 400.000,00	4,00	\$ 800.000,00					
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	\$ 699.000,00	25,00	\$ 17.475.000,00					1,08	\$ 754.920,00	2,34	\$ 1.635.660,00					
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,03	\$ 1.500.000,00					
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojoneros en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					1,00	\$ 200.000,00	3,00	\$ 600.000,00					
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					1,00	\$ 1.200.000,00	1,00	\$ 1.200.000,00					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1								
												VERSIÓN 1								
												PÁGINA								
												FECHA 05/04/2024 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 36.552.120,00		PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024		
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023							PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS							CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00						
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA							
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR						
25	1	Apiques (incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc (S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -						
Ajuste por Acta de modificación																				
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)						\$ 853.774.349,00						\$ 2.554.920,00		\$ 5.735.660,00						
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)						\$ 1.465.146.349,00						\$ 36.552.120,00		\$ 60.273.980,00						
* IVA = 19% * (D) = (E)						\$ 278.377.806,00						\$ 6.944.903,00		\$ 11.452.056,00						
* COSTO TOTAL = (D) + (E)						\$ 1.743.524.155,00						\$ 43.497.023,00		\$ 71.726.036,00						
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																				

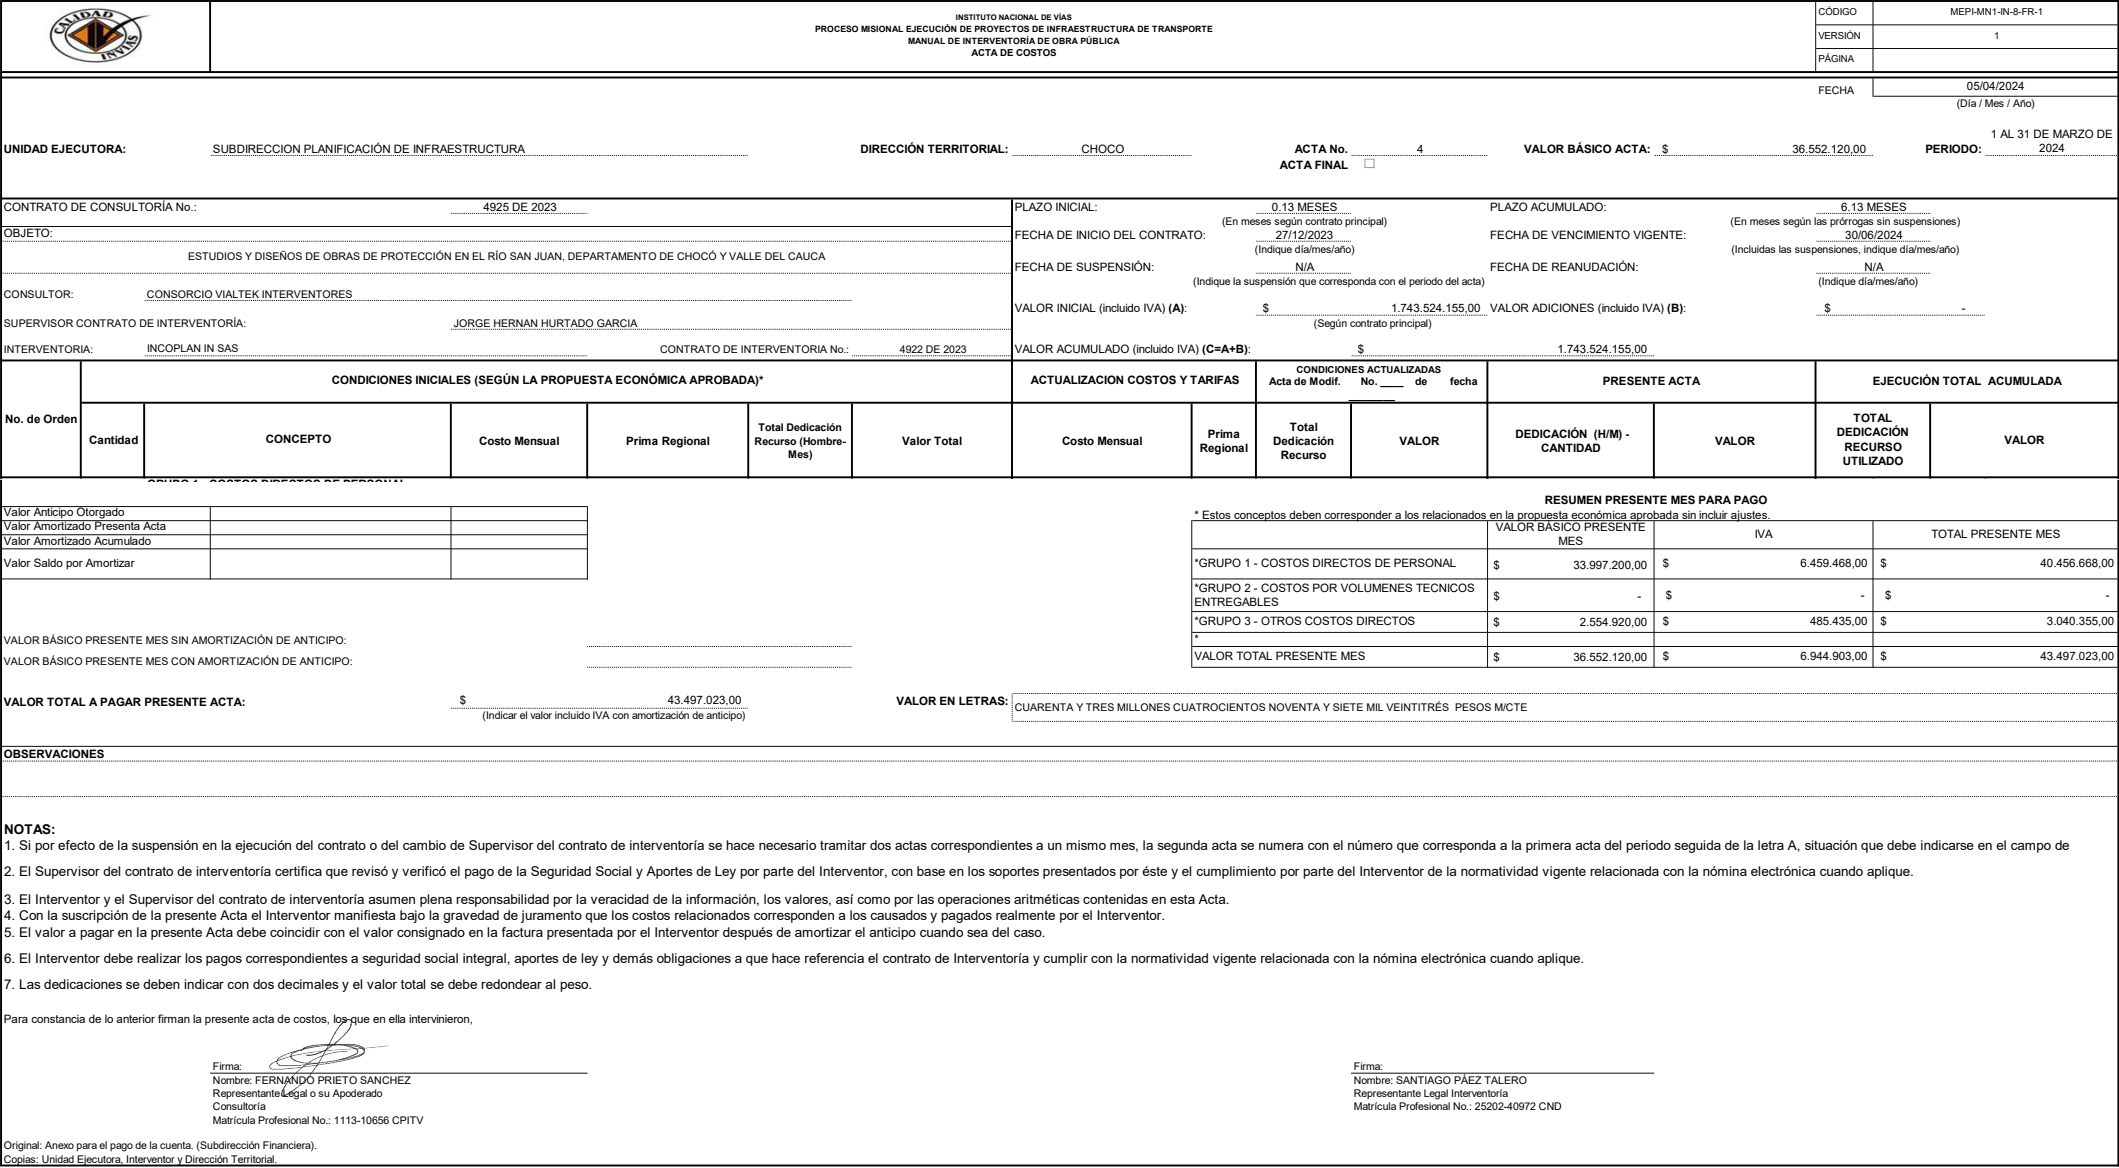



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE CONSULTORIA	X	1 AL 31 DE MARZO DE 2024
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		OTRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CUAL? <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 43.497.023,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	<input type="text"/>
TOTAL						\$	43.497.023,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	4925 DE 2023	Contratista	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES			
Objeto del Contrato						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No.:	4	Valor basico	\$ 36.552.120,00			
		Período	1 al 31 de marzo de 2024			
Valor Incluido Iva		\$	43.497.023,00			
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		\$ 43.497.023,00		\$ 43.497.023,00
2						
3						
		TOTALES		\$ 43.497.023,00		\$ 43.497.023,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	\$ 7.891.864,93	\$ 6.631.819,24		
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	\$ 15.783.729,86	\$ 13.263.638,48		
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	\$ 19.821.428,20	\$ 16.656.662,28		
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 43.497.023,00	\$ 36.552.120,00		
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		\$ -	\$ -		
NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA		
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		\$ -	\$ -		
TOTAL			\$ 43.497.023,00	\$ 36.552.120,00		

 MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores Matrícula No. 01113-10656 CPITVC	 SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula No. 25202-40972 CND
---	---

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

5/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No:

4925 DE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL:

MARZO DE 2024

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4922 DE 2023

INTERVENTOR:

INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.015.295.142,00
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00
TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.715.295.142,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 1.743.524.155,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	\$ 16.775.460,00	\$ 3.187.337,00	\$ 19.962.797,00	\$ -	\$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00	\$ -	\$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.671.798.119,00	\$ 1.671.798.119,00				
TOTALES			\$ 60.273.980,00	\$ 11.452.056,00	\$ 71.726.036,00	\$ -	\$ 71.726.036,00	\$ -		\$ 1.671.798.119,00	\$ 1.671.798.119,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

FECHA: 5/04/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	\$ 2.811.000,00	X									X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
 - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada.
 - En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
 - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
 - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la
 - El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9


CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Marzo de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Marzo de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Abril de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de MARZO de 2023.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Abril de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHagiraldo ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	1404823	Fecha Registro:	2023-12-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.743.524.155,00		Saldo x Obligar:	1.743.524.155,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	901778797	Razón Social:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	510845951	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES							
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4925/2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-12-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF										
					2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00							
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00					

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974784429			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901778797				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá			
41. Dirección principal CL 25 # 8 E 161							
42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3176574703		45. Teléfono 2 3134084392	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 20231020	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14960528681



(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 7 9 2 0 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico

administracion@brainingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

45. Teléfono 2

6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 2 1 0 7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14844666361



(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 3 2 4 8 6

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico

inprotektolimitada@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 0 7 8 3

45. Teléfono 2

6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 5, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 2 3

Otras actividades

1

6 8 1 0, 4 1 1 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES identificado con el **NIT 901.778.797-9** se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No. **510-84595-1** denominada: **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,



Darin Jhuliana Quelal Fernandez

Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente

Escríbeme por Teams dquelal

Email: dquelal@bancodeoccidente.com.co

www.bancodeoccidente.com.co

¡Síguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente



Del lado
de los que hacen.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 7 8 7 9 7	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 # 8 E 161					
25. País Colombia		26. Departamento Cundinamarca		27. Municipio Cajicá	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 / 1 2 : 5 9 : 5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

34. Tipo solicitud	Cód.
AUTORIZACIÓN	1

ACTA DE COSTOS No. 5 CONSULTORIA


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
		VERSIÓN 1																																																																							
		PÁGINA																																																																							
		FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO																																																																							
ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 5 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)																																																																							
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																							
		PERIODO MES: 1 AL 30 DE ABRIL 2024																																																																							
		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR</td><td>3/05/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>SANTIAGO PÁEZ TALERO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>FERNANDO PRIETO SANCHEZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>SANTIAGO PÁEZ TALERO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>SANTIAGO PÁEZ TALERO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>FERNANDO PRIETO SANCHEZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>RUHAAR GIL PASTRANA MORALES</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>SIRLEY DABEIBA MERCHAN</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RUHAAR GIL PASTRANA MORALES		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ																																																																						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO																																																																						
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ																																																																						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RUHAAR GIL PASTRANA MORALES																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023																																																																									
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA																																																																									
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES NIT. 901.778.797-9																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES (Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 57.485.568,00 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
Firma Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA Matricula profesional No.: SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matricula profesional No.: DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.		Firma Nombre: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES Matricula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																																							
		Firma Nombre: ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO Matricula Profesional No.: ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP/MN1-IN-8-FR-1		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA		
FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				ACTA No. 5 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00				PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024		
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)				
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00								
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023								
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombres-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,30	\$ 2.811.000,00	1,20	\$ 11.244.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					1,00	\$ 5.350.000,00	1,75	\$ 9.362.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					1,00	\$ 5.620.000,00	2,40	\$ 13.488.000,00
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,30	\$ 1.722.000,00	0,72	\$ 4.132.800,00
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 60.155.000,00						\$ 15.503.000,00		\$ 38.227.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 144.372.000,00						\$ 37.207.200,00		\$ 91.745.520,00
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,88%	100,00%	\$ 60.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CHOCO		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
ACTA FINAL																	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023						PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS						CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00					
No. de Orden		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
		Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
11	1	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	VI	7,49%	100,00%	\$ 35.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 31.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
12	1	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	VII	10,71%	100,00%	\$ 50.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 5.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 45.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
13	1	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	VIII	6,85%	100,00%	\$ 32.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.200.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 28.800.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
14	1	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	IX	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00											
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 27.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-MN1-IN-8-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				ACTA No. 5 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00				PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023							PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS							CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00	
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
15	1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	X	5,35%	100,00%	\$ 25.000.000,00									
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 2.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -		
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 22.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16	1	INFORME FINAL EJECUTIVO	XI	0,00%	100,00%	\$ -									
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	\$ -				0,00	\$ -	0,00	\$ -		
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)						\$ 467.000.000,00					\$ -		\$ -		
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS															
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	(\$)	UTILIZACIÓN	PARCIAL (\$)									
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 200.000,00	90,00	\$ 18.000.000,00					1,00	\$ 200.000,00	5,00	\$ 1.000.000,00	
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	\$ 699.000,00	25,00	\$ 17.475.000,00					0,00	\$ -	2,34	\$ 1.635.660,00	
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,14	\$ 7.000.000,00	0,17	\$ 8.500.000,00	
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojoneros en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					1,00	\$ 200.000,00	4,00	\$ 800.000,00	
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					1,00	\$ 1.200.000,00	2,00	\$ 2.400.000,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS												CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00			
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
26	1	Perforaciones en Suelos (Incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (Incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc (S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,05	\$ 2.500.000,00	0,05	\$ 2.500.000,00					
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchales original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
Ajuste por Acta de modificación																			
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)						\$ 853.774.349,00						\$ 11.100.000,00		\$ 16.835.660,00					
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)						\$ 1.465.146.349,00						\$ 48.307.200,00		\$ 108.581.180,00					
* IVA = 19% * (D) = (E)						\$ 278.377.806,00						\$ 9.178.368,00		\$ 20.630.424,00					
* COSTO TOTAL = (D) + (E)						\$ 1.743.524.155,00						\$ 57.485.568,00		\$ 129.211.604,00					
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																			

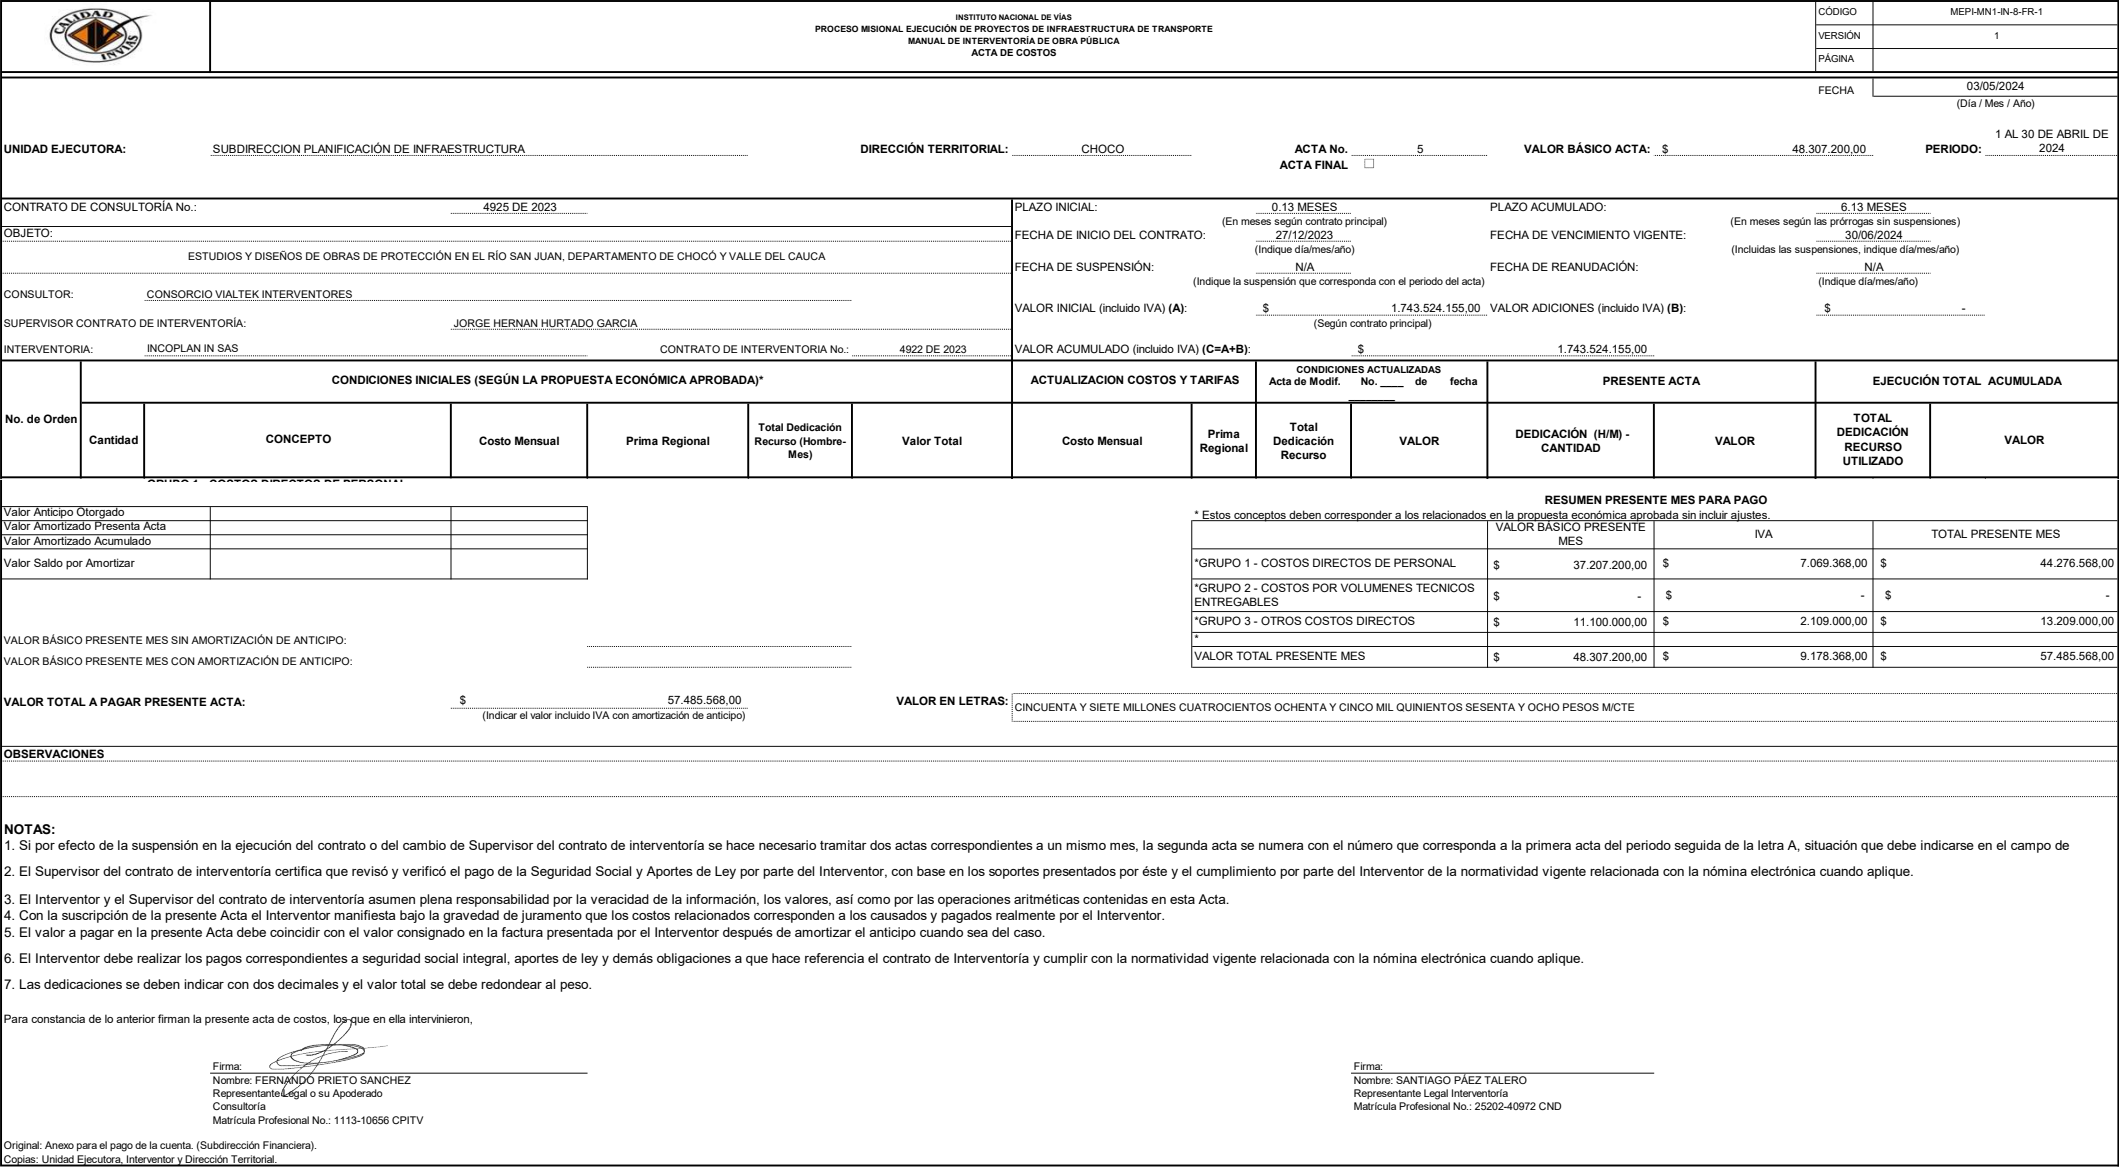



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE CONSULTORIA	X	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 57.485.568,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
TOTAL						\$	57.485.568,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 4925 DE 2023 Contratista CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Objeto del Contrato						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No.: <u>5</u> Valor basico \$ 48.307.200,00 Período 1 al 30 de abril de 2024 Valor Incluido Iva \$ 57.485.568,00						
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		\$ 57.485.568,00		\$ 57.485.568,00
2						
3						
TOTALES				\$ 57.485.568,00		\$ 57.485.568,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1		CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
891.680.067-2	MUNICIPIO 1		ISTMINA	\$ 10.429.870,99	\$ 8.764.597,47	
818001206-2	MUNICIPIO 2		MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	\$ 20.859.741,97	\$ 17.529.194,94	
818000002-2	MUNICIPIO 3		SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	\$ 26.195.955,04	\$ 22.013.407,59	
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 57.485.568,00	\$ 48.307.200,00	
NIT	DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
	MUNICIPIO 2			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 2				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 3				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 4			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 4				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 5			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 5				\$ -	\$ -	
NIT	DEPARTAMENTO 6			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1			\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 6				\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 57.485.568,00	\$ 48.307.200,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores Matrícula No. 01113-10656 CPITVC</p> </div> <div> <p>SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula No. 25202-40972 CND</p> </div> </div>						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO				
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023											CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES				
MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024											PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023											INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02		11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 1.043.524.155,00	\$ 971.798.119,00					
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02		10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00					
TOTAL									\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.671.798.119,00					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.743.524.155,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI NO		Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	\$ 16.775.460,00	\$ 3.187.337,00	\$ 19.962.797,00	\$ -	\$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00	\$ -	\$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.671.798.119,00	\$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	\$ 48.307.200,00	\$ 9.178.368,00	\$ 57.485.568,00	\$ -	\$ 57.485.568,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.614.312.551,00	\$ 1.614.312.551,00				
TOTALES			\$ 108.581.180,00	\$ 20.630.424,00	\$ 129.211.604,00	\$ -	\$ 129.211.604,00	\$ -		\$ 1.614.312.551,00	\$ 1.614.312.551,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL						
*Estudios y diseños			\$ 108.581.180,00			\$ 20.630.424,00			\$ 129.211.604,00						
*															
*															
VALOR TOTAL			\$ 108.581.180,00			\$ 20.630.424,00			\$ 129.211.604,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma:															
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ R/L CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC															
Firma:															
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-20541															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

FECHA: 3/05/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	\$ 2.811.000,00	X									X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 03/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
 - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada.
 - En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
 - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
 - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la
 - El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Abril de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Abril de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Mayo de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de ABRIL de 2023.

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de Mayo de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHagiraldo ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-2:24 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	1404823	Fecha Registro:	2023-12-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.743.524.155,00		Saldo x Obligar:	1.743.524.155,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	901778797	Razón Social:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	510845951	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES							
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4925/2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2023-12-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF										
					2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00							
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00					

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974784429			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497478442 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 7 8 7 9 7		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá		1 2 6	
41. Dirección principal CL 25 # 8 E 161							
42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 7 6 5 7 4 7 0 3		45. Teléfono 2 3 1 3 4 0 8 4 3 9 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 1 0 2 0	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO 985. Cargo Representante legal Certificado			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14960528681



(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 7 9 2 0 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico

administracion@brainingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

45. Teléfono 2

6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 3

Otras actividades

50. Código

1

2

4 2 1 0 7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14844666361



(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 3 2 4 8 6

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico

inprotektolimitada@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 0 7 8 3

45. Teléfono 2

6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 5, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 2 3

Otras actividades

1

6 8 1 0, 4 1 1 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo


BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES identificado con el **NIT 901.778.797-9** se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No. **510-84595-1** denominada: **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,



Darin Jhuliana Quelal Fernandez

Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente

Escríbeme por Teams dquelal

Email: dquelal@bancodeoccidente.com.co

www.bancodeoccidente.com.co

¡Síguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente



Del lado
de los que hacen.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 7 8 7 9 7	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 # 8 E 161					
25. País Colombia		26. Departamento Cundinamarca		27. Municipio Cajicá	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento


997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 / 1 2 : 5 9 : 5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063534269



(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
