

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

CONVENIO 4398 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



INFORME MENSUAL No. 6

MAYO DEL 2024

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Convenio de Obra No. 4398-2023

Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA

Contrato de Interventoría No. 4804-2023

Interventoría: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Convenio de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6

MES O PERIODO: MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	INTRODUCCIÓN		7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	20
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	21
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	21
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	22
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	23
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		23
5.1	Información general del contrato		23
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	25
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	26
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	30
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		30
8	Anexos		31
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Informe mensual 06 – mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

CONTROL DE APROBACIÓN

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 6
Código del documento:		
Versión:	1	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	Fecha	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	10/05/2024	Gabriel Vesga	
Revisión	10/05/2024	Jesús Orlando Vivas	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	Cargo	Organización
Mauricio Hoyos	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	Fecha	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
1	10/05/2024	Envío de informe para aprobación y revisión
2		

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
2.1	LOCALIZACIÓN.....	7
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	7
2.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	8
3.	INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA.....	10
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	10
3.1.1	Información contractual.....	10
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	11
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	12
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	12
3.4.1	Modificaciones y adiciones al contrato.....	12
3.4.2	Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.	12
3.4.3	Estado de pólizas.....	12
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	13
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	13
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	17
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA.....	18
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA... ..	19
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....	20
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	21
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	22
6.	ANEXOS	28

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato	10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento	12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual	13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría	31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría	32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.	34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida	37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada	44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto	8
-------------------------------------	---

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo	37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras	58

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

1. INTRODUCCIÓN

El abandono de la vía en la estación Pita de Puerto Triunfo, Antioquia es una problemática que afecta a esta comunidad y a los municipios aledaños. Esta vía es una de las principales arterias de comunicación y transporte de la región, ya que conecta diferentes localidades y facilita el flujo de mercancías, vehículos y personas.

Sin embargo, a lo largo de los años, la vía ha sufrido un grave deterioro y falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Esto ha llevado al abandono de la infraestructura de la carretera, lo que se traduce en problemas de movilidad, incomodidades para los habitantes de la zona y dificultades para el desarrollo económico de la región.

El mal estado de la vía en la estación Pita de Puerto Triunfo se manifiesta en la presencia de hundimientos, derrumbes y falta de señalización adecuada. Estas condiciones representan un peligro para los conductores y transeúntes que transitan por esta carretera, poniendo en riesgo su integridad física y la seguridad vial.

Para darle prioridad a estos lugares apartados, el instituto nacional de vías - INVIAS en conjunto con el gobierno nacional y las juntas de acción comunal desarrollaron el proyecto de caminos comunitarios para la paz total donde Estación Puerto Pita será beneficiada mediante el convenio solidario 4398-2023 suscrito el 15 de noviembre de 2023 con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el plazo contractual es de 3 meses donde se construirá 181 metros lineales de vía en concreto rígido que espera poder suplir las necesidades actuales mínimas de esta vereda.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN



Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en el corregimiento de estación puerto pita. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía terciaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Estación Puerto Pita se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

ANTES



AHORA



2.2.1 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Desde hace mucho tiempo se viene utilizando esta vía por la cual pasan vehículos de carga liviana que con el pasar del tiempo, las lluvia y escorrentías de las mismas han deteriorado este cruce.

Esta vía comunica las fincas aledañas con la vía principal de estación pita que esta a su vez se comunica con Santiago Berrio y estación Cocorná, este proyecto disminuirá los costos de viaje y los tiempos de viaje que venían siendo afectados de una gran manera.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	


El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 181 metros en Estación puerto Pita, municipio puerto triunfo. Estas vías internas se encuentran en mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.

El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en el corregimiento de Estación Pita y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

No se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA) porque no aplica debido a que las obras realizadas son de bajo impacto por lo que se hace Plan de Gestión Ambiental.

Ilustración 2. Estructura de pavimento propuesta

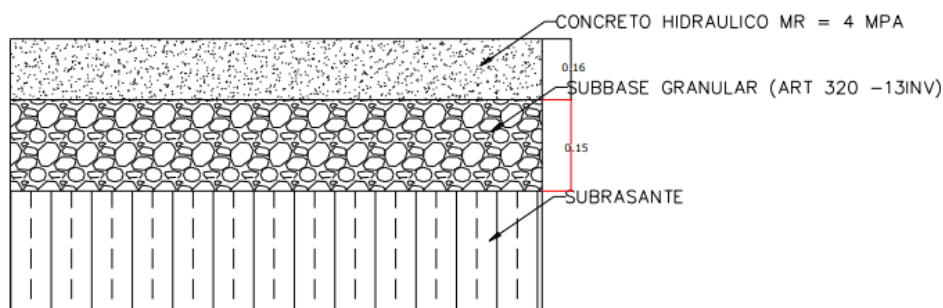

FUENTE: Ilustración propia

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

CONVENIO No. - FECHA	4398 de 2023
TIPO DE CONVENIO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JAC ESTACIÓN PUERTO PITA, MPIO PTO TRIUNFO
C.C. o N.I.T.	901588158-7
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ DAMARIS LUJÁN SEPÚLVEDA
C.C. o N.I.T	43.634.306
OBJETO DEL CONVENIO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”(código BPIN No. 202300000000001)”
VALOR DEL CONVENIO	\$200.174.397,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/11/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31/12/2023
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: “Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más”.
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO TRIUNFO – ESTACIÓN PTO PITA
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia.
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE SUSCRIPCION	13/09/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA 31/12/2023

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

FECHA PRORROGA 01	HASTA 30/04/2024
FECHA PRORROGA 02	HASTA 15/05/2024
FECHA DE TERMINACION	10/05/2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01 al 10 de mayo de 2024 en ejecución del contrato 4804 de 2023. El Contratista JAC Estación Puerto Pita, realizó las siguientes actividades administrativas.

- Se adelantan procesos administrativos para el desarrollo de las solicitudes de transferencias.
- Se realiza el envío de la solicitud de transferencia #6 y #7 para revisión y aprobación de interventoría.
- Se realiza socialización con el invias e interventoría para finiquitar el proceso de prorroga y de desembolsos para liquidar proveedores y nómina.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- Se realizó la construcción de las rampas de acceso al pavimento rígido en concreto reforzado y detalles finales de obra.



	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo analizado, el contrato de obra se encuentra en la etapa de culminación de actividades de obra, con un avance del 100%.

La interventoría reitera al Contratista el adecuado uso de los implementos de protección personal, esto para evitar futuros accidentes laborales.

La interventoría les solicita el acompañamiento constante del residente de obra, ya que en ocasiones no se encuentra en el sitio de trabajo haciendo de esto un problema para el desarrollo y avance de la obra en temas de calidad y tiempos.

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se realizó un cambio de diseño de placa huella a concreto rígido, donde se realizó el ajuste del presupuesto sin modificar el valor aprobado para el convenio, se realiza una prórroga hasta el 10 de mayo teniendo en cuenta la proyección hecha por la JAC.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100293911, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	\$ 40.034.880,00	30/04/2024	15/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.008.720,00	30/04/2024	15/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.052.320,00	15/05/2024	15/05/2029

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100072490, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A, y aprobada por la gobernación de Antioquia. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	15/11/2023	15/05/2024

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 al 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°21 (03 al 10 de mayo de 2024)

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INFORME MENSUAL No. 6

CONTRATO No. 4804 DEL 2023

VERSIÓN: 01

FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

10/05/2024

(Día Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

SEMANA No.:

21

del

3/05/2024

al

10/05/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

MAURICIO HOYOS SIERRA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

NIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizarán 181 mts lineales de concreto rígido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 181 mts lineales de concreto rígido con un espesor de 16 cm por ancho de vía de 4 mts en estación puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

INTERVENTOR:

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

CONVENIO No.:

4398 - 2023

VALOR INICIAL:

\$

200.174.397,00

CONTRATO No.:

4804 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

57.596.402,00

FECHA DE INICIO:

12/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

14/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

200.174.397,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

57.596.402,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

10/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

10/05/2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.174.397			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 180.263.606,97	-		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.174.397			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 57.596.402			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

100%

Avance o Atraso Físico %

100%

Meta Física Ejecutada %

100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramienta menor	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Vibrador de concreto eléctrico de aguja	1	1
Total		3

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

La meta física contractual era de 192 ml de placahuella

TRAMO Y/O SECTOR 1: El alcance físico total, fue de 172 ml de pavimento con devolución de \$19.910.790,30 no ejecutados

TRAMO Y/O SECTOR (n): No se hizo más pavimento debido a que la vereda solamente tiene dos (2) calles y otras actividades se salen del objeto del convenio

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Informe mensual 06 – mayo de 2024



4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo en el periodo comprendido entre 01 al 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado anexo “Maquinaria y Equipo Del Contratista”.

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

LUZ DAMARIS LUJAN SEPULVEDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.634.306 de Medellín en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO en el departamento de ANTIOQUIA identificada con el NIT 901.588.158-7, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por Junta de Acción Comunal durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en PUERTO PITA, a los doce (12) días del mes de mayo de 2024.

LUZ Damaris L.S.

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]



4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 01 al 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”.



Jesús Vivas <interventoria4843.2023@gmail.com>

Respuestas Radicado2

1 mensaje

Contacto No-Reply <contacto-no-reply@ideam.gov.co>

25 de octubre de 2024, 4:57 p.m.

Para: "interventoria4843.2023@gmail.com" <interventoria4843.2023@gmail.com>

Respetado(a) usuario(a)

Su solicitud ha sido recibida, radicada con el Número: 20249910120474 y asignada al área técnica correspondiente.

Usted podrá realizar seguimiento a esta solicitud, ingresando al link: "CONSULTA RADICADO WEB ORFEO" a través de la página web del IDEAM link: "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA", para la consulta requiere utilizar el PIN: 3118

IDEAM 	Radicado: 20249910120474 Fecha: 2024-10-25 15:53 Radico: RADICADOR4 Destino: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Rem/Des : Asunto : SOLICITUD INFORME PLUVIOMETRICO
---	---

Favor no contestar este correo

Gracias por contar con nosotros.



GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Ventanilla de Correspondencia

contacto@ideam.gov.co

Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204

Linea nacional 018000 110 012

Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C

www.ideam.gov.co



	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																											
		ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		VERSIÓN	1																											
				PÁGINA																												
					FECHA	10/05/2024 (Día / Mes / Año)																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																											
CONVENIO No: 4398 - 2023					CONTRATISTA: JAC DE PUERTO PITA, VEREDA PUERTO TRIUNFO																											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24					PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023					INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																											
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																						240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																						240
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: El registro del IDEAM no contiene informacion aun del mes en mension. Hasta el momento en el IDEAM no se encuentran registros para el rango de mayo de 2024																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: Sergio Amaury Durango Zora Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: Gabriel Mario Vesga Residente de Interventoria Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 10 de mayo de 2024, se realizó la toma de muestras para el ensayo de densidades y Proctor modificado, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11			
						VERSIÓN 1			
						PAGINA			
FECHA 10/05/2024 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA									
CONVENIO DE OBRA No.: 4399-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-24 PROYECTO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804-2023 INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	21/03/2023	ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO	(MVE 001B-P) ENSAYO DE PESO UNITARIO EN EL TERRENO (N.T.C 1667)	MATERIAL DE CANTERA DE SITIO	2	>95%	102.3 - 103	SI	Se toman dos muestras, una por cada tramo de intervencion.
2	21/03/2024	ENSAYO PROCTOR	(ASTM D1557-91)	MATERIAL DE CANTERA DE SITIO	3		W : 9% - Desea: 2.18gr/cm3	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma Nombre: EDGAR ALVARO MACIAS QUINTANA Presidente JAC Numero de C.C. No. 7.252.077					Firma Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoria Matricula Profesional No.: 54202-35679 NTS				
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01	
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024	
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA					10	5	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4398-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ESTACIÓN PUERTO PITA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 200.174.397,00
VALOR ACUMULADO: \$ 200.174.397,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	\$ 40.034.880,00	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.008.720,00	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.052.320,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293911
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2023

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
			Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			15/11/2023	31/12/2023	
Predio, labores y operaciones.	10%	\$ 232.000.000,00	15/11/2023	31/12/2023	
Patronal					
Vehiculos propios y no propios					
Contratistas y subcontratistas					

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072490 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____ MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____ 15/11/2023

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES | | | | | |

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	\$ 40.034.880,00	30/04/2024	15/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.008.720,00	30/04/2024	15/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.052.320,00	15/05/2024	15/05/2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NB-100293911

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____ MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____ 10/05/2024

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6		FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023		


SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
ADICIONAL No.: _____		PRÓRROGA No.: <u>2</u>	MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	260.000.000,00	Desde: 15/11/2023 Hasta: 15/05/2024
Predio, labores y operaciones.			
Patronal			
Vehiculos propios y no propios			
Contratistas y subcontratistas			
PÓLIZA DE SEGURO RCE NB- 100072490 OTRAS PÓLIZAS No. _____			
Certificado de modificación o anexo No. <u>2</u> (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)			
Razón Social Compañía Aseguradora: _____ MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____ 12/03/2024			
OBSERVACIONES:			
NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
Firma 			
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera			
Director de Interventoría			
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

4.8 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo al cronograma de obra, hemos finalizado el 100% de la proyección para el convenio en la instalación de 172 metros lineales de concreto rígido, cumpliendo con la meta física establecida.

Las metas físicas contractuales son



	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

5. ANEXOS

Anexo 5.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”					
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESDE EL 01 al 10 de mayo DE 2024					
FECHA	CORREO	REMITENTE	ENTIDAD	DESTINATARIO	ASUNTO

Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”				
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL 01 al 10 de mayo DE 2024				
FECHA	No DE OFICIO	DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO

Con el fin de no saturar el documento los correos fueron adjuntados en la entrega mensual en la carpeta CORREOS valga la redundancia, para su mejor visualización a la hora de la revisión en sus respectivas tablas.

5.2 Registro de la bitácora

Se anexa registro de bitácora en la carpeta del informe

	JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSIÓN: 01
	INFORME MENSUAL No. 6	FECHA: Del 01 al 10 de mayo de 2024
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Anexo 5.3 Registro fotográfico del avance de las obras



JRWZ

Nombre: **JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS
