


 <p>aguas del huila ...llevamos más que agua</p>	<p>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</p>	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	<p>INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0</p>	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 212 DE 2023



CONSULTOR:
CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS
NIT. 901.769.634 – 9



INFORME DE CONSULTORÍA CONSOLIDADO 22 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE

**“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL
SALADO, EL RECREO, SAN CALIXTO, (SECTOR LOMA GORDA) DEL MUNICIPIO DE SUAZA –
DEPARTAMENTO DEL HUILA”**

OCTUBRE– 2024

...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

 aguas del huila <i>...llevamos más que agua.</i>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U-C (Certification)

INFORME PARCIAL CONSOLIDADO DE CONSULTORÍA

☐

FINAL

☒

PARCIAL No 8

PERIODO DEL INFORME: 22 de junio de 2024 al 15 de octubre de 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	212 DE 2023
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL SALADO, EL RECREO, SAN CALIXTO, (SECTOR LOMA GORDA) DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 314.559.840) M/CTE
PLAZO	DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS (240) DÍAS U OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS
ANTICIPO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 125,823,936.00) M/CTE
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS
SUPERVISOR	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CONTRATANTE	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO	22 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)  ISO 14001 U.C. (Certification)  OHSAS U.C. (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	

Tabla 1. Relación de Pólizas – Acta de inicio

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	PÓLIZA	EXPEDICIÓN
ANEXO 0						
Cumplimiento	30	29/12/2023	30/12/2024	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	10/01/2024
Buen Manejo del Anticipo	40	29/12/2023	30/12/2024	\$125,823,936.00	560-47 994000173733	10/01/2024
Prestaciones Sociales	20	29/12/2023	30/08/2027	\$ 62,911,968.00	560-47 994000173733	10/01/2024
Calidad del Servicio	30	30/08/2024	30/08/2029	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	10/01/2024
Responsabilidad Civil	177SMLV	29/12/2023	30/08/2024	\$ 260,000,000.00	560-74 994000031853	10/01/2024
ANEXO 1						
Cumplimiento	30	22/02/2024	01/03/2025	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	01/03/2024
Buen Manejo del Anticipo	40	22/02/2024	01/03/2025	\$125,823,936.00	560-47 994000173733	01/03/2024
Prestaciones Sociales	20	22/02/2024	31/10/2027	\$ 62,911,968.00	560-47 994000173733	01/03/2024
Calidad del Servicio	30	30/10/2024	30/10/2029	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	01/03/2024
Responsabilidad Civil	177SMLV	30/08/2024	30/10/2024	\$ 260,000,000.00	560-74 994000031853	01/03/2024
ANEXO 2						
Cumplimiento	30	22/02/2024	25/05/2025	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	14/06/2024
Buen Manejo del Anticipo	40	22/02/2024	25/05/2025	\$125,823,936.00	560-47 994000173733	14/06/2024
Prestaciones Sociales	20	22/02/2024	25/01/2028	\$ 62,911,968.00	560-47 994000173733	14/06/2024
Calidad del Servicio	30	30/10/2024	30/01/2030	\$ 94,367,952.00	560-47 994000173733	14/06/2024
Responsabilidad Civil	177SMLV	22/02/2024	30/10/2024	\$ 260,000,000.00	560-74 994000031853	01/03/2024
ANEXO 3						
Responsabilidad Civil	177SMLV	30/10/2024	30/11/2024	\$ 260,000,000.00	560-74 994000031853	14/06/2024

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este periodo comprende las actividades desarrolladas desde el mes de junio de 2024, donde se realizó la evaluación, selección y socialización de alternativas. A partir de allí se desarrollaron los estudios y diseños definitivos correspondientes a:

1. Hidráulica
2. Hidrología
3. Topografía
4. Geotécnica
5. Estructuras
6. Eléctrico
7. Planos
8. Presupuesto
9. Especificaciones técnicas

 aguas del huila ...llevamos más que agua	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U.C. (Certification)

Una vez se obtuvieron la totalidad de los productos con el respectivo aval de la interventoría, la consultoría procede a realizar la formulación de la documentación requerida para el cargue del proyecto a la plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dando así inicio al proceso de viabilización. Este proceso requirió de disposición de las partes: Alcaldía, consultoría, interventoría, comunidad y demás actores que requirieran emitir comunicaciones para poder dar cumplimiento a la totalidad de requisitos establecido en la resolución 0661 de 2019. El resultado fue la estructuración del proyecto en 7 componentes:

1. Documental
2. Legal
3. Institucional
4. Técnico
5. Financiero
6. Ambiental
7. Predial

Es de aclarar que el responsable de la estructuración de esta documentación es la alcaldía, siendo responsabilidad del consultor entregar los insumos técnicos para tal fin. El consultor en cumplimiento de las obligaciones contractuales brinda asesoría y acompañamiento en el proceso, sin embargo, debido a que la mayoría de la documentación debe ser emitida por la oficina de la alcaldía municipal de los municipios beneficiados, no se le puede achacar responsabilidad en las demoras que se puedan llegar a presentar. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con los plazos pactados en el cronograma de consultoría, por lo cual el día 09 de octubre se realiza el cargue del proyecto a la plataforma del MVCT.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Firma Contrato	29/12/2023			
Iniciación	22/02/2024			21/10/2024
Otro si 1	11/06/2024	110		21/10/2024
Otro si No. 2	10/10/2024	231		21/10/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final) **DE CONSULTORÍA**

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de consultoría	1	22/02/2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.....	\$ 314.559.840,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO.....	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....	\$ 314.559.840,00
VALOR DEL ANTICIPO.....	\$ 125,823,936.00
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....	40 %

AVANCE FÍSICO REAL

Avance Físico Mensual..... 45.00%

 <p>aguas del huila ...llevamos más que agua.</p>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U-C (Certification)

Avance Físico Acumulado..... 95.00%

AVANCE FÍSICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

Las actividades realizadas a la fecha se encuentran acordes a la planificación.

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

Según cronograma se presenta un retraso del 00.00 %

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total Transcurrido 236 días

Avance Porcentual según plazo total 95.00 %

AVANCE FINANCIERO

Inversión contratada..... \$ 314.559.840,00

Inversión Ejecutada en el Periodo..... \$ 188.735.904.00

Porcentaje Ejecutado en el Periodo..... 60.00 %

Inversión Total Ejecutada..... \$ 188.735.904.00

Porcentaje Total Ejecutado..... 60.00 %

1.4. Estado de cronograma de consultoría

Subsanación recomendaciones de interventoría	10 días	dom 12/05/24	lun 20/05/24	13
▶ Producto 1B. Diseño preliminar de la alternativa escogida como la mas viable, técnica, ambiental y económica	80 días	lun 20/05/24	mar 30/07/24	4
▶ Producto 2. Estudios y diseños definitivos de los sistemas de acueducto	20 días	mié 31/07/24	sáb 17/08/24	25,15
▶ Producto 3. Formulación de los proyectos y presentación ante el MVCT o mecanismo de financiación departamental o aprobación municipal.	10 días	sáb 17/08/24	lun 26/08/24	33,27
Elaboración, Estructuración para radicación al MVCT de los diseños	5 días	sáb 17/08/24	jue 22/08/24	
Revisión de interventoría	5 días	jue 22/08/24	lun 26/08/24	36
▶ Producto 4. Viabilización y/o concepto técnico favorable.	10 días	lun 26/08/24	mié 4/09/24	37,35
Consolidación documental según mecanismo de financiación definido	2 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24	
Apoyo a la entidad territorial para la radicación del proyec	2 días	mié 28/08/24	vie 30/08/24	39
Mesas de trabajo de mecanismo de financiación	6 días	vie 30/08/24	mié 4/09/24	40
Producto 5. Liquidación.	20 días	mié 4/09/24	dom 22/09/24	41,38

1.5. Recomendaciones y Conclusiones

Durante el proceso de diagnóstico y recolección de datos de campo, la comunidad manifiesta de forma reiterada la posibilidad de conectar al servicio otros usuarios de veredas aledañas a lo cual la consultoría manifiesta no es posible durante esta etapa, debido al alcance contractual. Sin embargo, las estructuras se plantearán con una capacidad excedente que facilite la conexión futura de dichos usuarios.

Se recomienda agilizar el proceso de obtención de documentación correspondiente al operador del sistema.

Si bien las etapas y actividades del contrato se ejecutaron dentro de los plazos del cronograma, las actividades correspondientes al producto 4 Viabilización y/o concepto técnico favorable únicamente

 aguas del huila	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U-C (Certification)

se pueden atender en su totalidad tan pronto se tenga respuesta por parte del MVCT, exponiendo esta situación la consultoría realizo la solicitud de suspensión del contrato.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado financiero del proyecto

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo	04/03/2024	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125,823,936.00
Acta Parcial 1	10/07/2024	\$ 188.735.904	\$ 75.494.362	\$ 113.241.542.00
TOTALES			\$ 75.494.362	\$ 113.241.542.00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 314.559.840,00	N/A	\$ 314.559.840,00	\$ 188.735.904	\$ 125.823.936.00

2.2. Informe de ejecución y correcta inversión del anticipo

La totalidad del anticipo fue empleado en la ejecución de labores del primer mes, tal como se reportó en el informe mensual de dicho periodo.

2.3. Personal propuesto y empleado en el periodo

El personal que laboró en el presente periodo de reporte correspondió a:

PROFESIONALES					
NOMBRE	CARGO	JUL	AGO	SEP	OCT
Julio Cesar Rico Molano	Especialista Hidráulico	X	X	X	X
Javier Ignacio Ojeda López	Director de consultoría	X	X	X	X

2.4. Materiales y equipos utilizados durante el periodo del contrato

Materiales	Equipos
Documentación técnica	Computadoras con software CAD y de análisis hidráulico
Información geoespacial (planos)	Software de modelado hidráulico y de tratamiento de aguas residuales
Equipo de topografía tipo GNSS Hi Target 300	Software de análisis topográfico Hi Target
Computador	Software de modelación – Software de análisis Geográfico

2.5. Estado del cumplimiento de los planes y programas requeridos para la ejecución del proyecto

De acuerdo con el plan de trabajo, y tal como se describió en los numerales previos, las actividades previstas para desarrollar en el periodo corresponden a:

Figura 1. Actividades a Desarrollar durante el periodo

Subsanación recomendaciones de interventoría		10 días	dom 12/05/24	lun 20/05/24	13
▶ Producto 1B. Diseño preliminar de la alternativa escogida como la mas viable, técnica, ambiental y económica	80 días		lun 20/05/24	mar 30/07/24	4
▶ Producto 2. Estudios y diseños definitivos de los sistemas de acueducto	20 días		mié 31/07/24	sáb 17/08/24	25,15
▶ Producto 3. Formulación de los proyectos y presentación ante el MVCT o mecanismo de financiación departamental o aprobación municipal.	10 días		sáb 17/08/24	lun 26/08/24	33,27
Elaboración, Estructuración para radicación al MVCT de los diseños	5 días		sáb 17/08/24	jue 22/08/24	
Revisión de interventoría	5 días		jue 22/08/24	lun 26/08/24	36
▶ Producto 4. Viabilización y/o concepto técnico favorable.	10 días		lun 26/08/24	mié 4/09/24	37,35
Consolidación documental según mecanismo de financiación definido	2 días		lun 26/08/24	mié 28/08/24	
Apoyo a la entidad territorial para la radicación del proyecto	2 días		mié 28/08/24	vie 30/08/24	39
Mesas de trabajo de mecanismo de financiación	6 días		vie 30/08/24	mié 4/09/24	40
Producto 5. Liquidación.	20 días		mié 4/09/24	dom 22/09/24	41,38

Fuente: Consultoría, 2024.

De acuerdo con el plan de trabajo, y tal como se describió en los numerales previos, las actividades previstas para desarrollar durante este periodo corresponden a:

✓ **Producto 3. Estudios y diseños definitivos de los sistemas de acueducto**

De acuerdo con el análisis y selección de alternativas se procedió a realizar los diseños definitivos de acuerdo con el siguiente plan de obras:

1. Estructura de captación (Bocatoma)
2. Desarenador
3. Línea de aducción
4. Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP de tipo compacta
5. Tanque de almacenamiento
6. Redes de distribución (Matriz, secundaria y acometidas domiciliarias)

✓ **Producto 4. Formulación de proyectos y presentación ante el MCTV o mecanismo de financiación departamental o aprobación municipal:**

A partir de la información proporcionada por la consultoría, se procede a la generación de los formularios y certificados correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0661 de 2019 con el fin de obtener el concepto técnico viable.

El día 09 de octubre de 2024 se realiza el cargue del proyecto a la plataforma del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Numero de radicado: 2024ER0159873

Fecha de radicado: octubre 9 de 2024 23:16

 <p>aguas del huila ...llevamos más que agua.</p>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 <small>www.iso.org</small> U.C. (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 <small>www.iso.org</small> U.C. (Certification)

i.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp

i Resultados

Señor(a) **MUNICIPIO DE SUAZA** su solicitud fue guardada correctamente, agradecemos su participación y esperamos dar una respuesta clara a su necesidad

Radicado: 2024ER0159873
 Fecha de radicación : Octubre 9 de 2024 23:16

Conserve su número de radicado para realizar consultas posteriores

11 Consultar una solicitud

2.6. Correspondencia suscrita y recibida durante el período
2.6.1. Correspondencia enviada
No hay correspondencia recibida durante este período.
2.6.2. Correspondencia recibida
No hay correspondencia recibida durante este período.
3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1. Modificaciones realizadas en los diseños respecto del periodo anterior
a la fecha no ha dado inicio la fase de diseños
3.2. Problemas y soluciones adoptadas
<p>Durante el proceso de diagnóstico y recolección de datos de campo, la comunidad manifiesta de forma reiterada la posibilidad de conectar al servicio otros usuarios de veredas aledañas a lo cual la consultoría manifiesta no es posible durante esta etapa, debido al alcance contractual. Sin embargo, las estructuras se plantearán con una capacidad excedente que facilite la conexión futura de dichos usuarios.</p> <p>Se recomienda agilizar el proceso de obtención de documentación correspondiente al operador del sistema.</p> <p>Si bien las etapas y actividades del contrato se ejecutaron dentro de los plazos del cronograma, las actividades correspondientes al producto 4 Viabilización y/o concepto técnico favorable únicamente se pueden atender en su totalidad tan pronto se tenga respuesta por parte del MVCT, exponiendo esta situación la consultoría realizó la solicitud de suspensión del contrato.</p>
3.3. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones
Se han acogido los lineamientos dispuestos en los documentos precontractuales y contractuales respecto a las actividades a realizar y obligaciones del contratista.
4. CONTROL DE CALIDAD
4.1. Cuadro resumen de pruebas de laboratorio
A la fecha no se han adelantado pruebas de laboratorio
4.2. Resultado de ensayo y pruebas de laboratorio
4.2.1 Resultados de laboratorio de calidad del agua
A la fecha no se han adelantado pruebas de laboratorio
4.2.2 Resultados de pruebas de geotecnia
A la fecha no se han adelantado pruebas de geotecnia
4.3. Comentarios y conclusiones

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U-C (Certification)

Las obras sobre la cuales se desarrolló la ingeniería de detalle son:

7. Estructura de captación (Bocatoma)
8. Desarenador
9. Línea de aducción
10. Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP de tipo compacta
11. Tanque de almacenamiento
12. Redes de distribución (Matriz, secundaria y acometidas domiciliarias)

En este sentido, la consultoría desarrollo el componente técnico del proyecto organizado en los siguientes componentes:

1. Hidráulica
2. Hidrología
3. Topografía
4. Suelos
5. Estructural
6. Eléctrico
7. Planos

Cada uno de estos componentes consta de un informe técnico y sus respectivos anexos que incluyen entre otras cosas:

1. Memorias de calculo
2. Modelos en formato que puede ser ejecutado en software libre
3. Información secundaria
4. Registros
5. Datos crudos de posicionamiento
6. Carteras de campo
7. Archivos de dibujo en formato dwg
8. Memoriales de responsabilidad

Durante el proceso de acompañamiento y asesoramiento se estructuraron junto con la alcaldía 7 carpetas con los diferentes requisitos que solicita la resolución 0661 de 2019 para la presentación del proyecto ante el MVCT, que corresponden a:

1. Documental
2. Legal
3. Institucional
4. Técnico
5. Financiero
6. Ambiental
7. Predial

Si bien las etapas y actividades del contrato se ejecutaron dentro de los plazos del cronograma, las actividades correspondientes al producto 4 Viabilización y/o concepto técnico favorable únicamente se pueden atender en su totalidad tan pronto se tenga respuesta por parte del MVCT, exponiendo esta situación la consultoría realizó la solicitud de suspensión del contrato

4.4. Comités técnicos

 <p>aguas del huila ...llevamos más que agua.</p>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE CONSULTORÍA VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U-C (Certification)

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
27/06/2024	Escuela Recreo	Aprobación de la fuente de la quebrada Emaya para iniciar los estudios y diseños definitivos.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones ambientales

No se identificaron impactos ambientales negativos ocasionados por las actividades realizadas durante el periodo.

5.2 Evaluación de daños y perjuicios a terceros

No se identifican daños o perjuicios a terceros ocasionados por las actividades realizadas en el periodo del informe

6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial


Durante el presente periodo no se realizaron trabajos en campo.


6.2. Pagos de la seguridad integral y otros

Se anexan las planillas de pago de seguridad social del personal que desarrollo actividades durante el periodo del presente informe

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realizo socialización con la comunidad el día 27 de junio donde se hizo énfasis en las alternativas analizadas, explicando las dificultades y ventajas que conlleva cada una. Se explicaron las etapas del proyecto y su alcance.

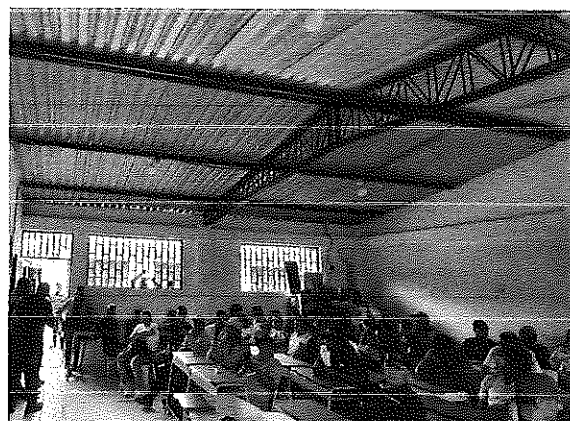

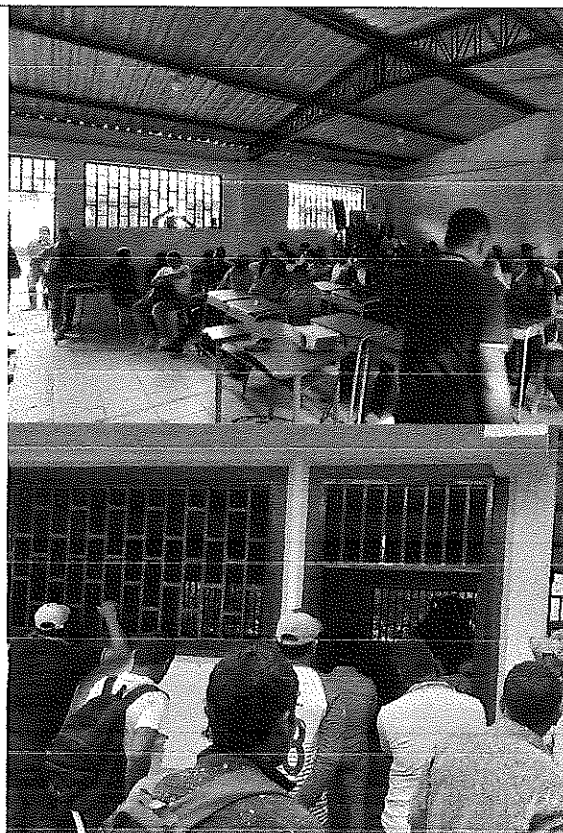

<div>  <div> <p>ACTA DE SOCIALIZACIÓN</p> <p>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL SALADO, EL RECREO, SAN CALIXTO, (SECTOR LOMA GORDA) DEL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> </div>  </div>				
NOMBRE	CEDULA	TELEFONO DE CONTACTO	VEREDA	FIRMA
Hernando Pardo	34938376	3229097022	Los Salados	
Erberto F. Fierro	83242002	3204612246	Paraiso	Erberto F.
Hernán Pardo	4939138	3194583390	Loma gorda	Hernán Pardo
Kelly Dorcas Portillo	1004301758	3115025015	Loma gorda	Kelly Dorcas
John Jairo Pardo	1082125010	3115025015	Loma gorda	John Jairo P.
owilson sanchez	1004583378	3212728806	EL RECREO	owilson sanchez
Walterito Ortiz	73239452	2209745364	EL COSMOS	Walterito Ortiz
ARISTOTELES	77634666	313432259	Paraiso	ARISTOTELES
Edibey Portillo	832397734	3118111382	Paraiso	Edibey Portillo
Oscar Emilio Pardo	7080361174	3161975514	Loma gorda	Oscar Emilio Pardo
Daniel Alberto	1000365336	3208783606	Loma gorda	Daniel Alberto
Luis Daniel Cárdenas	608130634	311813284	Luis Daniel Cárdenas	Luis Daniel Cárdenas
Napoléon Vargas	416690418	3196313876	Maestranza Vargas	Napoléon Vargas
Emmanuel Vargas	7050361744	3205546835	El Salado	Emmanuel Vargas
Juan Pablo Vargas		3139106612	El Salado	Juan Pablo Vargas
José Arcechillo	83 238980	3126367192	Salado	José Arcechillo
Diego Alarcón	57025955	3914043977	Paraiso	Diego Alarcón
Fernán Alarcón	17704585	3133982869	Paraiso	Fernán Alarcón
Luis Figueroa	4938960	3167059249	Paraiso	Luis A. Figueroa
Anibal Aguilar	832397147	3209669720	Paraiso	Anibal Aguilar
Israel Audó	4938969		Paraiso	Israel Audó

	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL SALADO, EL RECREO, SAN CALIXTO, (SECTOR LOMA GORDA) DEL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	

NOMBRE	CEDULA	TELÉFONO DE CONTACTO	VEREDA	FIRMA
Lisandro Cuchu	8316841	206893032	San Calixto	Lisandro C.B.
Herminio Plá	83239428	317705802	San Calixto	Herminio Plá
Gerardo Sánchez	4939305	314455050	El Carmen	Gerardo Sánchez
Donal Anzor	4938632	312896744	Paraíso	Donal Anzor
Eduardo Ortiz	4939179	3153220547	Loma Gorda	Eduardo Ortiz
Luis Murillo	7186963	3127823501	Paraíso	Luis Murillo
Gilberto Huder	4939446	3127104901	Recreo	Gilberto Huder
Osvaldo Yañez	704259748	3209677987	El Carmen	Osvaldo Yañez
Wilson Fierro	79889849	313239222	Loma Gorda	Wilson Fierro
Olimpio	8223222		Salados	Olimpio
Hernán A.	26575569	3203391319	Salados	Hernán A.
Jolanda Pérez	26575745	3212040220	San Calixto	Jolanda Pérez
Diego Pérez	700396659	372394400	Salado	Diego Pérez
Hugo Prado	7079470149	3186938176	Loma Gorda	Hugo Prado
Ana Fernanda Alarcón	100710087	3134641167	Recreo	Ana Fernanda Alarcón
Carax de Alarcón	8323857	3107900299	Recreo	Carax de Alarcón
Trilberto	4938357	X	X	X
Pedro Suárez	8323857	X	X	X
Juan Pablo	1080265914	3102369419		Juan Pablo
Gerardo Correa	79731036	3167196420	Salado	Gerardo Correa
Hernán Pardo	83239029	3133100999	Los Sabalos	Hernán Pardo
ARDEY Quintana	1007186671	3103095123	Recreo	ARDEY Quintana
Luis Caviédes	83057252	32048709	El Salado	Luis Caviédes
Yimex Alvarado	1007186671	5214880476	El Paraíso	Yimex Alvarado
Juan Pablo A.	1080363731	3214836674	El Paraíso	Juan Pablo A.
Hernán Alarcón	83239539	3217465104	El Paraíso	Hernán Alarcón
MARTICA FLORES	301590733	3155151373	El Paraíso	MARTICA FLORES
Samuel Figueroa	83239074	3005897169	El Paraíso	Samuel Figueroa
Nelson Sánchez	83239452	3114111186	El Recreo	Nelson Sánchez
PARO ENRIQUE	26576000	3204430946	El Salado	PARO ENRIQUE
GIVAR NOBUSTO	17651971	319511977	SALADITO	GIVAR NOBUSTO

[illegible]


MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS
REPRESENTANTE LEGAL

interventoria.
