

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 2	Dependencia: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	Fecha (dd/mm/aaaa): 25/11/2024
------------	---------------------------------------	-----------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

JUAN MANUEL HOYOS MORA - Coordinador Grupo de Infraestructura PNN
 EMANUELE VIRZÍ – Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN
 ANGELICA XIMENA PEDRAZA VARGAS – Representante PyP Obras electrónicas S.A.S.
 CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA - Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.
 JUAN CARLOS RONCANCIO RONCANCIO – Ingeniero electricista Grupo de Infraestructura PNN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

COMITÉ DE OBRA #2 – CONTRATO DE OBRA NC-CO-351-2024 – PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS SEDE ADMINISTRATIVA
 MOCOA – PYP OBRAS ELECTRONICAS CIVILES SAS

TEMAS A TRATAR:

1.	Revisión compromisos acta anterior.
2.	Socialización del inicio de obra y actividades
3.	Actualización Cronograma de Obra y cambio especificaciones Aires Acondicionados
4.	Seguimiento de la obra

RESUMEN TEMAS TRATADOS:


No. Tema	Resumen
1.	Se revisaron los compromisos del acta anterior: los APUs de los Ítems No previstos y el cronograma actualizado fueron enviados el 18/11, el balance actualizado el 23/11. El envío de la cotización para el trámite ante la empresa prestadora de servicio y el cambio del medidor y cableado de la acometida fue enviado el 15/11. Se solicita por parte de la supervisión el envío del Acta de Comité #1 firmada, la cual fue enviada el 08/11: el contratista se compromete a enviarla el 25/11.
2.	El contratista manifiesta inicio de obra el día de hoy (25/11) con la actividad de mortero impermeabilizado en canal e instalación de bajantes de agua lluvia en pvc tipo Pavco Rango cuadrada blanca. Se solicita por parte del contratista la posibilidad de gestionar unos días adicionales de prórroga: la supervisión manifiesta la imposibilidad en este momento del requerimiento a causa de la ausencia de actividades ejecutadas en obra, por lo cual el comité de contratación no podría respaldar la solicitud. Se suspende el comité y se reanuda en horas de la tarde con el fin de que pueda asistir el residente de obra y pueda socializar la logística de la mañana.
3.	En horas de la tarde se reanuda comité y se manifiesta por parte del Residente de obra que la producción de la carpintería metálica puede demorarse unos días más respecto a los 8 días inicialmente evaluados y el aire acondicionado puede tener una fecha de entrega de aprox. 10 días. Dado lo anterior se procede en el comité a elaborar conjuntamente el cronograma actualizado, el cual se anexa a la presente Acta. En el comité el residente de obra manifiesta que los aires acondicionados contratados son unos modelos obsoletos que funciona a 110V, lo cual generaría un problema de funcionamiento en un futuro cambio de acometida: en evaluación con el ingeniero electricista de PNN se decide hacer el cambio de la especificaciones por un modelo de aire acondicionado de 220V, los cuales serán entregados

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023


funcionantes y garantizarían no tener inconvenientes con el cambio de acometida: el residente de obra ve viable el cambio de especificaciones y manifiesta poder tener la actividad No Prevista con sus respectivas 3 cotizaciones para el 26/11.

Actividad	25/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	30/11/2024	01/12/2024	02/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	07/12/2024	08/12/2024
1 Obra Civil														
10 días														
2 Aire acondicionado														
10 días														
3 Carpintería metálica y madera														
13 días														
4 Aseo														
2 días														
5 retiro de escombros														
2 días														

4. Se acuerda entre las parte un estricto seguimiento de la obra durante su ejecución por medio de comunicación directa, conocimiento de las actividades desarrolladas en obra y respaldo reciproco finalizado al cumplimiento del objeto contractual según cronograma acordado.

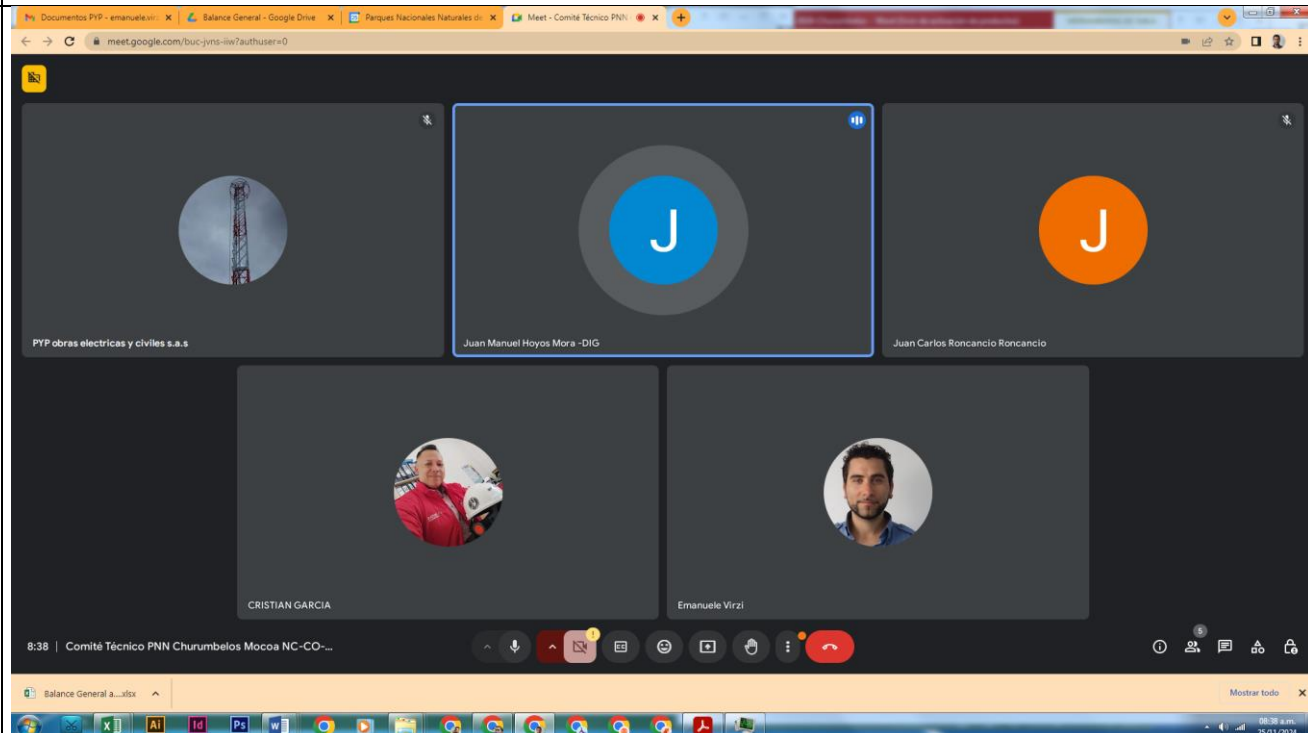

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

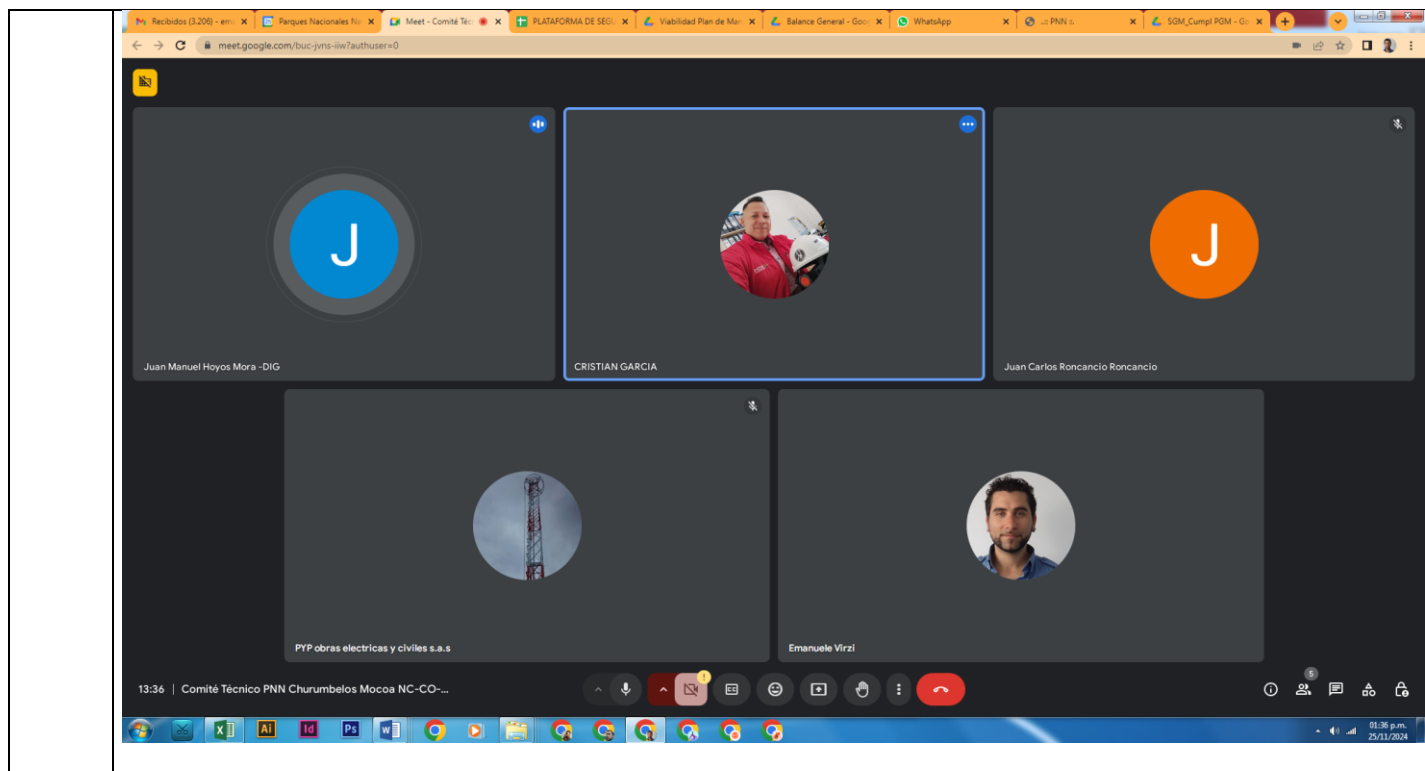

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Envío Acta de comité #1 firmada	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	25/11/2024
2. Envío APU No previstos de los Aires Acondicionados 220V con respectivas 3 cotizaciones.	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	26/11/2024
3. Envío Acta de comité	EMANUELE VIRZÍ - PNN	26/11/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Envío APUs Ítems No previstos de la obra civil y respectivas cotizaciones	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	12/11/2024	Finalizado 18/11/2024
2. Envío balance de obra actualizados	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	12/11/2024	Finalizado 23/11/2024
3. Envío cronograma de obra actualizados	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	12/11/2024	Finalizado 18/11/2024
4. Envío cotización para el trámite ante la empresa prestadora de servicio y el cambio del medidor y cableado de la acometida.	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	13/11/2024	Finalizado 15/11/2024
5. Envío Acta de comité	EMANUELE VIRZÍ - PNN	08/11/2024	Finalizado 08/11/2024

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
EMANUELE VIRZÍ	Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN	virtual
JUAN MANUEL HOYOS MORA	Coordinador Grupo de Infraestructura PNN	virtual
ANGELICA XIMENA PEDRAZA VARGAS	Representante PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA	Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
JUAN CARLOS RONCANCIO RONCANCIO	Ingeniero electricista Grupo de Infraestructura PNN	virtual

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

N/A
