



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

4/12/2023

AL

18/12/2023

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449.985.033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

1

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0000%	0.0000%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.0000%	0.0000%
4	BARAYA	0.06%	0.0000%	0.0000%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.0000%	0.0000%
7	ISNOS	0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.0000%	0.0000%
9	LA PLATA	0.29%	0.0000%	0.0000%
10	NATAGA	0.01%	0.0000%	0.0000%
11	PAICOL	0.03%	0.0000%	0.0000%
12	PALESTINA	0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO	0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0000%	0.0000%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.0000%	0.0000%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	0.0000%	0.0000%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		0.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	0.00%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	0.00%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.00%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.00%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN		98.18%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	0.00%	0.00%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
La interventoría realizó la proyección y suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría el día 04 de diciembre de 2023, solicitó al contratista la actualización de las vigencias de las pólizas conforme a la fecha de suscripción de la misma y verificó las afiliaciones del personal propuesto por el contratista.					
Así mismo, realizó comité técnico con supervisión y contratista para socializar el alcance del proyecto, establecer parámetros para la entrega de información recolectada en campo y definir aspectos técnicos importantes para el desarrollo del mismo y solicitó el cronograma de obra para revisión y aprobación.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Afiliaciones personal profesional y técnico.				
2	Inducción al personal técnico.				
3	Asistencia a comité técnico.				
<div> LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		30/01/2024	AL 12/02/2024	
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
5				
ÍTEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0194%	0.0000%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.0516%	0.0258%
4	BARAYA	0.06%	0.0317%	0.0223%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.0604%	0.0000%
7	ISNOS	0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1045%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.1925%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0047%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0200%
12	PALESTINA	0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO	0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0000%	0.0000%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.0587%	0.0059%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	0.6749%	0.3756%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		20.59%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	0.00%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	0.00%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.00%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.00%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	0.67%	0.38%
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA				
* La interventoría realiza visitas de verificación en campo de las novedades reportadas por el contratista en la etapa de sensibilización, revisa documentación entregada por el mismo para una vez verificada, remitir a la Corporación para que se procedan a efectuar los cambios.				
* En comité técnico del día 07 de febrero de 2024, se informó que en el listado oficial aparecen algunos sectores que no registran como veredas, por lo que en estos casos el personal en campo mediante certificación del presidente de la Junta de Acción Comunal de la respectiva vereda, hará la aclaración para evitar inconvenientes futuros.				
* Se remite a la supervisión con corte a 31 de enero de 2024, el reporte de avance de verificación de sitios de construcción de acuerdo a parámetros técnicos establecidos en la etapa de sensibilización, de 200 beneficiarios ubicados en los municipios de La Argentina y La Plata.				
* Se inicia verificación de las actividades contempladas para la etapa de sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya, Nataga, Paicol y continúa la verificación en los municipios de La Plata y La Argentina.				

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENO		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	El contratista inicia visitas etapa sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya, Nátaga, Paicol y Santa María.				
2	Continúan visitas etapa de sensibilización en el municipio de La Plata.				
3	Una vez verificada la documentación que soporta las novedades encontradas en campo, el contratista realiza el reporte respectivo a la interventoría.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Baraya		Municipio de Nátaga		Municipio de Nátaga	
					
Municipio de Paicol		Municipio de Paicol		Municipio de Paicol	
					
Municipio de Santa María		Municipio de Santa María		Municipio de Santa María	
 LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

19/12/2023

AL

1/01/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

2

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0000%	0.0000%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.0000%	0.0000%
4	BARAYA	0.06%	0.0000%	0.0000%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.0000%	0.0000%
7	ISNOS	0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.0000%	0.0000%
9	LA PLATA	0.29%	0.0000%	0.0000%
10	NATAGA	0.01%	0.0000%	0.0000%
11	PAICOL	0.03%	0.0000%	0.0000%
12	PALESTINA	0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO	0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0000%	0.0000%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.0000%	0.0000%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	0.0000%	0.0000%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		0.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	0.00%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	0.00%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.00%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.00%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN		98.18%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	0.00%	0.00%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
<p>* Se realizó comité técnico el día 20 de diciembre de 2023, donde el contratista informó que viene realizando acercamiento telefónico con los beneficiarios, verificando nombres, números de documentos de identidad y ubicación de los mismos, con el fin de identificar posibles cambios.</p> <p>* Interventoría programa capacitación para el personal técnico de obra e interventoría respecto al correcto diligenciamiento de los formatos, registro fotográfico que se debe aportar de cada visita, toma de coordenadas, etc. Así mismo y una vez revisado el cronograma de obra y el formato de acta de visita etapa de sensibilización, se realizó aprobación de los mismos.</p> <p>* Debido a las festividades de fin de año, no fue posible realizar visitas ya que los beneficiarios contactados manifestaron disponibilidad a partir del mes de enero de 2024, razón por la cual se programa inicio de actividades a partir de dicho mes.</p>					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Contacto telefónico con los beneficiarios para verificación de nombres, números de documento de identidad y ubicación de los mismos, con el fin de identificar posibles cambios.				
2	Entrega formato de acta de visita etapa de sensibilización para aprobación de interventoría.				
<div> LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		12/03/2024	AL	25/03/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				8
ÍTEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0141%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.0916%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0540%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.0810%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0387%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1232%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2312%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0070%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0235%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.0599%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.0505%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0282%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.0880%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0282%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.3322%	0.9190%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		50.39%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.38%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	1.01%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.62%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	1.18%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.22%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	1.84%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	4.26%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.12%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.43%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.69%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.99%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.23%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	1.15%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN		98.18%	12.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	13.31%	0.92%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
* Se realizó la aprobación del cambio de algunos maestros y ayudantes para dar inicio a la etapa de construcción en los municipios de Algeciras, La Argentina, La Plata y Santa María.					
* De manera conjunta se revisó la documentación entregada por el contratista, la cual soporta los cambios encontrados por el personal en campo.					
* Mediante oficio No. CO-2023-414-020 del 15 de marzo de 2024, se realizó aprobación de 116 beneficiarios de los municipios de Iquira, Aipe y Saladoblanco, los cuales cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el contrato y por lo tanto, se puede construir la hornilla ecoeficiente.					
* El 18 de marzo de 2024, se realizó reunión de seguimiento para revisar avance etapas del contrato.					
* Continúen visitas etapa de sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palestina, Pitalito, Santa María y Suaza.					
* El 20 de marzo del año en curso se realizó comité técnico , la interventoría informó que solicitó a las Secretarías de Planeación de los municipios de Aipe, Iquira y La Plata, certificar nombre de las veredas existentes, con el fin de tener certeza de la ubicación de éstas ya que la división veredal se encuentra desactualizada.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	16
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Avanzan las visitas etapa de sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya, Isnos, La Argentina, La Plata, Palestina, Pitalito, Santa María y Suaza.				
2	Continúa entrega de material en los municipios de La Argentina y La Plata.				
3	Inicia etapa de construcción de hornillas en los municipios de Algeciras, La Argentina, La Plata y Santa María.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Baraya		Municipio de Isnos		Municipio de Isnos	
					
Municipio de La Argentina		Municipio de La Argentina		Municipio de La Argentina	



Municipio de Palestina



Municipio de Palestina



Municipio de Palestina



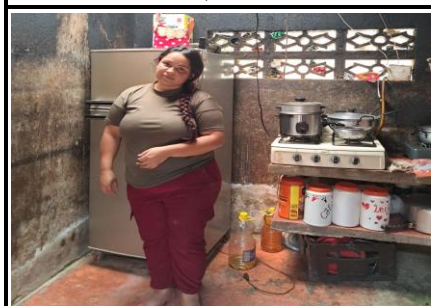
Municipio de Pitalito



Municipio de Pitalito



Municipio de Santa María



Municipio de Santa María



Municipio de Suaza



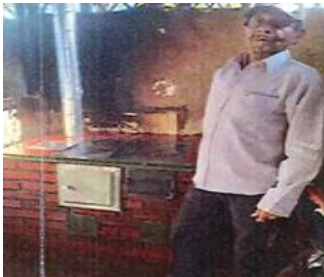
Municipio de Suaza

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023			
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		2/01/2024	AL	15/01/2024	
A. DATOS GENERALES					
PROYECTO			DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"			HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:		NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.		900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:		NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023		901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN		PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96		4/12/2023	3/10/2024		10 MESES
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					3
ITEM	ACTIVIDAD		(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN					
1	ACEVEDO		0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE		0.04%	0.0000%	0.0000%
3	ALGECIRAS		0.10%	0.0000%	0.0000%
4	BARAYA		0.06%	0.0000%	0.0000%
5	GUADALUPE		0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA		0.12%	0.0000%	0.0000%
7	ISNOS		0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA		0.13%	0.0628%	0.0117%
9	LA PLATA		0.29%	0.1450%	0.0000%
10	NATAGA		0.01%	0.0041%	0.0000%
11	PAICOL		0.03%	0.0147%	0.0000%
12	PALESTINA		0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO		0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO		0.05%	0.0000%	0.0000%
15	SANTA MARIA		0.12%	0.0000%	0.0000%
16	SUAZA		0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO			1.82%	0.2265%	0.0117%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN			0.64%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN					
1	ACEVEDO		12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE		2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS		5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA		3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE		5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA		6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS		2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA		6.76%	0.00%	0.00%
9	LA PLATA		15.60%	0.00%	0.00%
10	NATAGA		0.44%	0.00%	0.00%
11	PAICOL		1.58%	0.00%	0.00%
12	PALESTINA		7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO		10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO		2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA		6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA		8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION			98.18%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION			0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			100.00%	0.23%	0.01%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
<p>* Se realizó comité técnico el día 5 de enero de 2024, donde el contratista manifestó que se encuentra diseñando los formatos de actas de visita de sensibilización y construcción para ser presentados para aprobación; así como el diseño ajustado para las tapas de los hornos.</p> <p>* Se realizó capacitación al personal técnico tanto de obra como de interventoría el día 12 de enero de 2024, se expusieron inquietudes por parte del mismo y se plantearon posibles situaciones que se pueden presentar en campo.</p> <p>* En comité técnico realizado el 15 de enero de 2024, interventoría informó que fue aprobado el folleto que se entregará a cada beneficiario y se acordó que las novedades de cambios encontradas por los técnicos en campo, serían reportadas de manera oficial por el contratista los días miércoles y sábados de cada semana a la interventoría, quienes a su vez remitirán la misma a la supervisión para que ésta realice los trámites pertinentes. De igual forma, se solicitó que la entrega de la información se realice de manera oportuna para que surta los trámites de revisión y aprobación, en caso de ser necesario.</p>					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Diseño formatos de actas de visita de sensibilización y construcción.				
2	Diseño tapa de los hornos para aprobación.				
3	Inician visitas de sensibilización en el municipio de La Argentina.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de La Argentina			Municipio de La Argentina		
					
Municipio de La Argentina			Municipio de La Argentina		
 LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		22/10/2024	AL	25/10/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	25/10/2024	10 MESES Y 22 DÍAS	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				24
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	12.067%	12.067%
2	AIPE	2.085%	2.085%	2.085%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.560%	5.560%
4	BARAYA	3.412%	3.412%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	5.939%	5.939%
6	IQUIRA	6.507%	6.507%	6.507%
7	ISNOS	2.401%	2.401%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.760%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.605%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.579%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	7.581%	7.581%
13	PITALITO	10.930%	10.930%	10.930%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.527%
15	SANTA MARIA	6.318%	6.318%	6.318%
16	SUAZA	8.466%	8.466%	8.466%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	98.176%	98.176%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		100.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	100.00%	100.00%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Finaliza la etapa de recibo de obra en los municipios de Acevedo y Pitalito. El contratista ejecutó el 100% de las actividades contractuales, siendo recibidas a satisfacción.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Consolidación información para desembolso final y liquidación del contrato				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	
<div> EDINSON SUÁZ A HÉND E Z RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

16/01/2024

AL

29/01/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

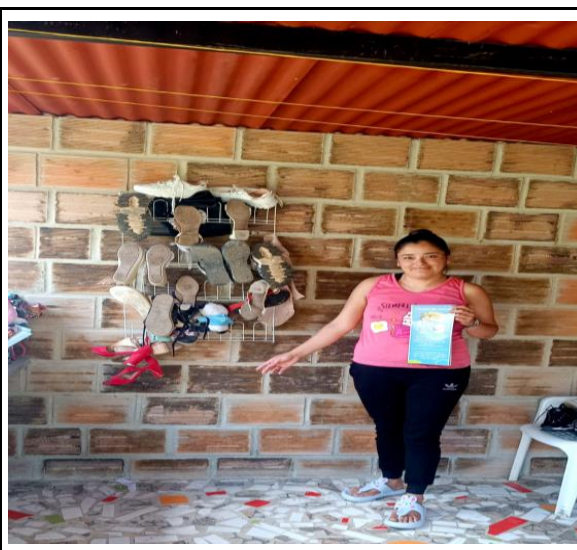
4

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0000%	0.0000%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.0000%	0.0000%
4	BARAYA	0.06%	0.0000%	0.0000%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.0000%	0.0000%
7	ISNOS	0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1045%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.1162%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0000%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0000%
12	PALESTINA	0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO	0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0000%	0.0000%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.0000%	0.0000%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	0.4531%	0.2207%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		12.10%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	0.00%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	0.00%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.00%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.00%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	0.45%	0.22%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
<p>* El día 22 de enero de 2024, se realizó comité técnico para socializar al contratista las directrices dadas en reunión con DNP respecto a las novedades de cambio encontradas en campo.</p> <p>* Se realiza seguimiento a las novedades presentadas en campo, las cuales fueron evaluadas con la supervisión.</p> <p>* Se da inicio a las visitas de la etapa de sensibilización en los municipios de La Argentina y La Plata.</p> <p>* Se realizó verificación documental a las actas suscritas por el contratista, generando así control al avance del contrato de obra No. 418 de 2023.</p>					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúan visitas de sensibilización en el municipio de La Argentina.				
2	Continúan visitas de sensibilización en el municipio de La Plata.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA			MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		
					
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA			MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		



MUNICIPIO DE LA PLATA



MUNICIPIO DE LA PLATA



MUNICIPIO DE LA PLATA



MUNICIPIO DE LA PLATA

Luis Germán

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

27/02/2024

AL

11/03/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN:	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
7				
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0141%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.0751%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0340%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.0810%
7	ISNOS	0.04%	0.0223%	0.0000%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1127%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2066%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0070%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0235%
12	PALESTINA	0.14%	0.0704%	0.0000%
13	PITALITO	0.20%	0.1015%	0.0000%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0235%	0.0282%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.0763%
16	SUAZA	0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.1145%	0.6585%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		36.10%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.19%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	0.51%	0.00%
4	BARAYA	3.41%	0.31%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	0.59%	0.00%
7	ISNOS	2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	1.23%	0.00%
9	LA PLATA	15.60%	2.84%	0.00%
10	NATAGA	0.44%	0.08%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.29%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	0.57%	0.00%
16	SUAZA	8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	6.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	7.14%	0.66%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
* Interventoría continúa con visitas etapa de sensibilización en los municipios de Aipe, Iquira, La Plata, Nátaga y Saladoblanco.					
* Se revisa de manera conjunta con el contratista, los soportes entregados por los técnicos de campo para los beneficiarios que cumplen y no cumplen conforme a la visita de la etapa de sensibilización.					
* El día 9 de marzo de 2024, se aprobó el cambio de 6 ayudantes de obra y 3 maestros constructores, los cuales inician la etapa de construcción de las hornillas ecoeficientes.					
* Se realizó comité técnico de fecha 28 de febrero del año en curso, donde el contratista informó que debido a la situación de orden público presentada en el municipio de La Argentina, coordinó con los beneficiarios la entrega del material en una zona de fácil acceso y así dar inicio a la etapa de construcción.					
* El 05 de marzo de 2024 se informó en el comité técnico que se hará entrega del listado de cambios, para que el contratista realice visitas de verificación de cumplimiento de requisitos técnicos y posterior entrega de soportes de las mismas a Interventoría.					
* Se realizó reunión de seguimiento con el apoyo a la supervisión el día 08 de marzo, para revisar avance de cada etapa del contrato.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	16
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúan con las visitas etapa de sensibilización en los municipios de Aipe, Algeciras, Iquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol y <u>Saladoblanco</u> .				
2	Entrega de materiales en los municipios de Algeciras, La Argentina y La Plata.				
3	Inician visitas de verificación a los posibles beneficiarios aprobados por la CAM (cambios) en los municipios de La Argentina y Algeciras.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Aipe		Municipio de Aipe		Municipio de Algeciras	
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Iquira		Municipio de Iquira	
					
Municipio de La Argentina		Municipio de La Argentina		Municipio de La Plata	



Municipio de La Plata



Municipio de Nátaga



Municipio de Nátaga



Municipio de Paicol



Municipio de Paicol



Municipio de Saladoblanco



Municipio de Saladoblanco



Entrega de materiales



Entrega de materiales

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

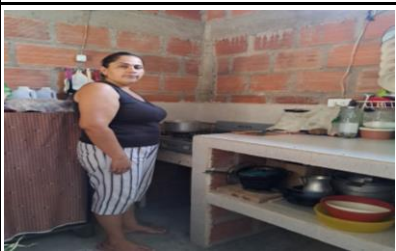
13/02/2024

AL

26/02/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO			DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"			HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:		NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.		900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:		NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO HORNILLAS 2023		901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN:	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96		4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				6	
ITEM	ACTIVIDAD		(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN					
1	ACEVEDO		0.22%	0.0000%	0.0000%
2	AIPE		0.04%	0.0387%	0.0012%
3	ALGECIRAS		0.10%	0.1033%	0.0669%
4	BARAYA		0.06%	0.0634%	0.0340%
5	GUADALUPE		0.11%	0.0000%	0.0000%
6	IQUIRA		0.12%	0.1209%	0.0516%
7	ISNOS		0.04%	0.0000%	0.0000%
8	LA ARGENTINA		0.13%	0.1256%	0.1045%
9	LA PLATA		0.29%	0.2899%	0.1925%
10	NATAGA		0.01%	0.0082%	0.0047%
11	PAICOL		0.03%	0.0293%	0.0200%
12	PALESTINA		0.14%	0.0000%	0.0000%
13	PITALITO		0.20%	0.0000%	0.0000%
14	SALADOBLANCO		0.05%	0.0000%	0.0211%
15	SANTA MARIA		0.12%	0.1174%	0.0763%
16	SUAZA		0.16%	0.0000%	0.0000%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO			1.82%	0.8967%	0.5728%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN			31.40%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN					
1	ACEVEDO		12.07%	0.00%	0.00%
2	AIPE		2.08%	0.00%	0.00%
3	ALGECIRAS		5.56%	0.00%	0.00%
4	BARAYA		3.41%	0.00%	0.00%
5	GUADALUPE		5.94%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA		6.51%	0.00%	0.00%
7	ISNOS		2.40%	0.00%	0.00%
8	LA ARGENTINA		6.76%	0.61%	0.00%
9	LA PLATA		15.60%	1.42%	0.00%
10	NATAGA		0.44%	0.04%	0.00%
11	PAICOL		1.58%	0.14%	0.00%
12	PALESTINA		7.58%	0.00%	0.00%
13	PITALITO		10.93%	0.00%	0.00%
14	SALADOBLANCO		2.53%	0.00%	0.00%
15	SANTA MARIA		6.32%	0.00%	0.00%
16	SUAZA		8.47%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION			98.18%	2.2%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION			0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			100.00%	3.11%	0.55%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
* La interventoría continúa realizando visitas de verificación etapa de sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya y Santa María e inicia visitas en los municipios de Aipe, Iquira y Saladoblanco.					
* En comité técnico realizado el día 19 de febrero de 2024, se avaló el inicio de la etapa de construcción con la aprobación de 380 beneficiarios de los municipios de Algeciras, Baraya, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol y Santa María, los cuales cumplen con los requisitos técnicos.					
* De manera conjunta interventoría-contratista realizan verificación de documentación recolectada en campo con novedades de cambio.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL		1		PERSONAL TÉCNICO	
		4		PERSONAL NO CALIFICADO	
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ÍTEM		DESCRIPCIÓN			
1		El contratista continúa con las visitas de la etapa de sensibilización en los municipios de Algeciras, Baraya y Santa María.			
2		Inician visitas etapa de sensibilización en los municipios de Aipe, Iquira y Saladoblanco.			
3		Una vez recolectada la información en campo, el contratista verifica y remite a la interventoría para que se realicen los cambios pertinentes.			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Baraya		Municipio de Santa María		Municipio de Santa María	
					
Municipio de Aipe		Municipio de Aipe		Municipio de Iquira	



Municipio de Iquira



Municipio de Salado blanco



Municipio de Salado blanco

EDINSON SUAZA H  NDEZ
RL EMC2 INGENIER   S.A.S.



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

9/04/2024

AL

22/04/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN:	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

10

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.1362%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0164%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1021%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0599%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.0728%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.0810%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0387%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1232%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2805%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0235%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1268%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.1315%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0282%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1056%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1139%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.4484%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		79.41%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	2.19%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.76%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	2.02%	3.41%
4	BARAYA	3.41%	1.24%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	1.08%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	2.37%	2.97%
7	ISNOS	2.40%	0.65%	0.25%
8	LA ARGENTINA	6.76%	3.07%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	7.09%	9.79%
10	NATAGA	0.44%	0.20%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.72%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	2.07%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	2.98%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.69%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	2.30%	3.35%
16	SUAZA	8.47%	1.54%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	27.1%	21.61%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		22.01%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	28.96%	23.05%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
<p>* De manera conjunta se revisó la documentación entregada por el contratista, la cual soporta los cambios encontrados por el personal en campo.</p> <p>* Mediante oficio No. CO-2023-414-036 del 19 de abril de 2024, se realizó aprobación de 260 beneficiarios de los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Guadalupe, La Plata, Palestina, Pitalito y Suaza, los cuales cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el contrato y por lo tanto, se procede a la construcción de la hornilla ecoeficiente.</p> <p>* Continúan visitas etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Guadalupe, La Plata, Nátaga, Palestina, Pitalito y Suaza.</p> <p>* Se realiza acompañamiento durante el proceso de construcción asegurando que se cumplan con los parámetros técnicos.</p> <p>* En comité técnico realizado el día 10 de abril de 2024, se informa que vienen realizando el recibo de las hornillas construidas en los municipios de Algeciras, La Argentina y La Plata, con un total a la fecha de 356 hornillas recibidas a satisfacción.</p>					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	5	PERSONAL NO CALIFICADO	16
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Avanzan visitas etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Guadalupe, La Plata, Nátaga, Palestina y Suaza.				
2	Continúa entrega de material en los municipios de Iquira, Palestina y Santa María.				
3	En la etapa de construcción se presenta avance en los municipios de Iquira, Isnos, La Plata y Santa María.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Aipe		Municipio de Algeciras	
					
Municipio de Guadalupe		Municipio de La Plata		Municipio de Palestina	
					
Municipio de Suaza		Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras	



Municipio de Iquira



Municipio de Iquira



Municipio de Isnos



Municipio de Isnos



Municipio de La Plata



Municipio de La Plata



Municipio de Santa María



Municipio de Santa María



Municipio de Santa María


EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

26/03/2024

AL

8/04/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ	
CONTRATISTA OBRA	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

9

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.1121%	0.0000%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0141%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.0916%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0599%
5	GUADALUPE	0.11%	0.0552%	0.0563%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.0810%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0387%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1232%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2312%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0070%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0235%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.0599%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.1315%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0282%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1056%
16	SUAZA	0.16%	0.0786%	0.0798%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.5781%	1.1315%
AVANCE PORCENTUAL DE SENSIBILIZACIÓN		62.03%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	1.10%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.57%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	1.52%	3.41%
4	BARAYA	3.41%	0.93%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	0.54%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	1.77%	0.95%
7	ISNOS	2.40%	0.44%	0.00%
8	LA ARGENTINA	6.76%	2.46%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	5.67%	9.48%
10	NATAGA	0.44%	0.16%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.57%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	1.38%	0.00%
13	PITALITO	10.93%	1.99%	0.00%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.46%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	1.72%	0.32%
16	SUAZA	8.47%	0.77%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	19.6%	19.02%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN		19.37%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	21.13%	20.15%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
<p>* De manera conjunta se revisó la documentación entregada por el contratista, la cual soporta los cambios encontrados por el personal en campo.</p> <p>* Mediante oficio No. CO-2023-414-024 del 02 de abril de 2024, se realizó aprobación de 159 beneficiarios de los municipios de Aipe, La Argentina, La Plata, Palestina, Pitalito, Isnos y Santa María, los cuales cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el contrato y por lo tanto, se procede a la construcción de la hornilla ecoeficiente.</p> <p>* Avanza visitas de sensibilización en los municipios de Baraya, Guadalupe, La Plata, Pitalito, Santa María y Suaza.</p> <p>* Se realiza acompañamiento durante el proceso de construcción asegurando que se cumplan con los parámetros técnicos; se da inicio a las visitas en el municipio de La Argentina.</p> <p>* En comité técnico realizado el día 02 de abril de 2024, interventoría informa que a partir del 4 de abril del año en curso, dará inicio al recibo de las hornillas construidas y reportadas por el contratista en los municipios de Algeciras, La Plata y La Argentina.</p> <p>* Con oficio No. CO-2023-414-031 del 08 de abril de 2024, se remitió a la Corporación el listado de 146 cambios encontrados en campo para que sean realizados los trámites pertinentes para postulación de nuevos potenciales beneficiarios.</p>					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Avanzan las visitas etapa de sensibilización en los municipios de Baraya, Guadalupe, Pitalito, Santa María y Suaza.				
2	Continúa entrega de material en los municipios de Algeciras, La Plata, La Argentina y Santa María.				
3	Continúa etapa de construcción de hornillas en los municipios de Algeciras, Iquira, La Argentina, La Plata y Santa María.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Baraya		Municipio de Baraya		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Guadalupe		Municipio de Guadalupe		Municipio de Guadalupe	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	



Municipio de Santa María



Municipio de Santa María



Municipio de Santa María



Municipio de Suaza



Municipio de Suaza



Municipio de Suaza



Hornilla Algeciras



Hornilla Algeciras



Hornilla Algeciras



Hornilla La Plata



Hornilla La Plata



Hornilla La Plata



Hornilla La Argentina



Hornilla La Argentina



Hornilla La Argentina

EDINSON SUAZA H  NDEZ
RL EMC2 INGENIER   S.A.S.

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		27/08/2024	AL	9/09/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				20
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	8.593%	8.466%
2	AIPE	2.085%	1.895%	0.000%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.105%	5.496%
4	BARAYA	3.412%	3.205%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	4.431%	3.159%
6	IQUIRA	6.507%	5.916%	3.412%
7	ISNOS	2.401%	2.073%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.606%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.179%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.508%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	5.669%	6.002%
13	PITALITO	10.930%	8.843%	9.729%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.464%
15	SANTA MARIA	6.318%	5.829%	3.601%
16	SUAZA	8.466%	6.413%	7.265%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	84.234%	79.792%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		81.27%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	86.06%	81.62%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Acevedo, Paicol, Pitalito y Suaza.					
Continúa revisión de documentación entregada por el contratista respecto a la etapa de sensibilización.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa la construcción de hornillas en los municipios de Acevedo, Iquira, La Argentina, La Plata, Paicol, Pitalito, Santa María y Suaza.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Iquira	
					
Municipio de Iquira		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	
					
Municipio de Santa María		Municipio de Suaza		Municipio de Suaza	
 EDINSON SUAZA HÉNDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

23/04/2024

AL

6/05/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901759999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN:	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

11

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.1455%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0305%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0622%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.0845%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1092%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0434%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2840%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1279%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.1608%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0446%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1139%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1326%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.6057%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		88.03%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	3.29%	0.00%
2	AIPE	2.08%	0.95%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	2.53%	3.54%
4	BARAYA	3.41%	1.55%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	1.62%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	2.96%	2.97%
7	ISNOS	2.40%	0.87%	1.90%
8	LA ARGENTINA	6.76%	3.69%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	8.51%	9.98%
10	NATAGA	0.44%	0.24%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	0.86%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	2.76%	2.40%
13	PITALITO	10.93%	3.97%	0.38%
14	SALADOBLANCO	2.53%	0.92%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	2.87%	3.35%
16	SUAZA	8.47%	2.31%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN		98.18%	34.7%	26.34%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN		26.83%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	36.54%	27.95%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
De manera conjunta se revisó la documentación entregada por el contratista, la cual soporta los cambios encontrados por el personal en campo.					
Se realiza acompañamiento durante el proceso de construcción asegurando que se cumplan con los parámetros técnicos, se reciben hornillas a satisfacción en los municipios de Algeciras, Iquira, La Plata y Santa María.					
Dentro de las labores propias de interventoría, se realizan comités técnicos de seguimiento a la ejecución del proyecto.					
Continúan visitas sensibilización en los municipios de Acevedo, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Paicol, Palestina, Pitalito, Saladoblanco y Suaza.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Paicol, Pitalito, Saladoblanco, Santa María y Suaza.				
2	El contratista viene ejecutando la etapa de construcción de hornillas en los Municipios de Algeciras, Isnos, La Plata, Palestina y Pitalito.				
3	Continúa entrega de material en los Municipios de Palestina y Pitalito.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Isnos	
					
Municipio de Isnos		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	
 EDINSON SUAZA HÉNDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		7/05/2024	AL	20/05/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN:	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				12
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACIÓN				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.1455%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0305%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0622%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.0845%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1092%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0434%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2840%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1279%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.1608%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0446%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1139%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1326%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.6057%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		88.03%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	4.39%	0.00%
2	AIPE	2.08%	1.14%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	3.03%	3.54%
4	BARAYA	3.41%	1.86%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	2.16%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	3.55%	2.97%
7	ISNOS	2.40%	1.09%	1.90%
8	LA ARGENTINA	6.76%	4.30%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	9.93%	9.98%
10	NATAGA	0.44%	0.28%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	1.01%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	3.45%	3.10%
13	PITALITO	10.93%	4.97%	2.40%
14	SALADOBLANCO	2.53%	1.15%	0.00%
15	SANTA MARIA	6.32%	3.45%	3.35%
16	SUAZA	8.47%	3.08%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	48.8%	32.41%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		33.01%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	50.65%	34.02%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
De manera conjunta se revisa la documentación entregada por el contratista.					
Se realiza acompañamiento durante el proceso de construcción asegurando que se cumplan con los parámetros técnicos, se reciben hornillas a satisfacción en los municipios de Algeciras, Isnos, La Plata, Palestina y Pitalito.					
Dentro de las labores propias de interventoría, se realizan comités técnicos de seguimiento a la ejecución del proyecto y verificación de seguridad social del personal vinculado al mismo.					
Continúan visitas etapa de sensibilización en los municipios de Pitalito, Santa María y Suaza.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa la etapa de verificación etapa de sensibilización en los municipios de Baraya, Iquira, La Plata, Pitalito, Santa María y Suaza.				
2	El contratista viene ejecutando la etapa de construcción de hornillas en los municipios de Palestina y Pitalito.				
3	Continúa entrega de material en el municipio de Pitalito.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Palestina		Municipio de Palestina		Municipio de Palestina	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	
<div> EDINSON SUAZA HÉNDENZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

21/05/2024

AL

3/06/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENIDOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ	
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENIDOR:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

13

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.1725%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0164%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1021%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1080%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1150%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1526%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.7395%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		95.37%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	5.48%	0.51%
2	AIPE	2.08%	1.33%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	3.54%	3.54%
4	BARAYA	3.41%	2.17%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	2.70%	0.00%
6	IQUIRA	6.51%	4.14%	2.97%
7	ISNOS	2.40%	1.31%	1.90%
8	LA ARGENTINA	6.76%	4.92%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	11.35%	9.98%
10	NATAGA	0.44%	0.32%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	1.15%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	4.14%	3.10%
13	PITALITO	10.93%	5.96%	6.89%
14	SALADOBLANCO	2.53%	1.38%	0.63%
15	SANTA MARIA	6.32%	4.02%	3.35%
16	SUAZA	8.47%	3.85%	1.26%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	57.7%	39.30%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		40.03%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	59.57%	41.04%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
De manera conjunta continúa revisión de documentación entregada por el contratista.					
Se realiza acompañamiento durante el proceso de construcción asegurando que se cumplan con los parámetros técnicos, se reciben hornillas a satisfacción en los municipios de Isnos y Palestina.					
Dentro de las labores propias de interventoría, se realizan comités técnicos de seguimiento a la ejecución del proyecto y verificación de seguridad social del personal vinculado al mismo. Así mismo, se realiza verificación de nombres y números de documentos de identidad, para minimizar errores en las actas de recibo.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Se realiza entrega de materiales en los municipios de Acevedo y Suaza.				
2	Avanza la etapa de construcción en los municipios Pitalito y Saladoblanco.				
3	Consolidación documentación recolectada en campo para entregar a interventoría para revisión.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Pitalito	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Saladoblanco		Municipio de Saladoblanco	
					
Municipio de Suaza		Municipio de Suaza		Municipio de Suaza	
 EDINSON SUAZA HÉNDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

18/06/2024

AL

1/07/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL:	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

15

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	7.679%	3.727%
2	AIPE	2.085%	1.706%	0.000%
3	ALGECIRAS	5.560%	4.549%	3.538%
4	BARAYA	3.412%	2.791%	0.000%
5	GUADALUPE	5.939%	3.779%	2.906%
6	IQUIRA	6.507%	5.324%	2.969%
7	ISNOS	2.401%	1.746%	1.895%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.145%	5.180%
9	LA PLATA	15.605%	14.186%	10.930%
10	NATAGA	0.442%	0.402%	0.000%
11	PAICOL	1.579%	1.436%	0.000%
12	PALESTINA	7.581%	5.514%	3.096%
13	PITALITO	10.930%	7.949%	6.949%
14	SALADOBLANCO	2.527%	1.838%	0.632%
15	SANTA MARIA	6.318%	5.169%	3.348%
16	SUAZA	8.466%	5.387%	5.496%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	75.599%	50.667%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		51.61%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	77.42%	52.49%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Se realiza visitas de la etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Aipe, Guadalupe, Iquira y Suaza, dando por terminada dicha etapa con la visita a los 1554 beneficiarios.					
En comité técnico realizado el día 25 de junio de 2024, el contratista informó que el rendimiento en las 2 últimas semanas de junio ha disminuido, debido a que los beneficiarios manifestaron que por las festividades de San Juan y San Pedro no recibirían materiales, generando así retrasos en la etapa de construcción y por lo tanto, afectando las metas propuestas. Interventoría reiteró la necesidad de entregar un plan de contingencia que permita nivelar el atraso y dar cumplimiento al plazo contractual (3 de octubre de 2024).					
Se realizan visitas de recibo de obra en los municipios de Acevedo, Guadalupe, Salado blanco y Suaza.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Finaliza la etapa de sensibilización con visitas en los municipios de Aipe y Guadalupe.				
2	Avanza etapa de construcción en los municipios de Guadalupe, La Plata y Suaza.				
3	Entrega de materiales en los municipios de Baraya, Guadalupe y Palestina.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Guadalupe		Municipio de Guadalupe		Municipio de La Plata	
					
Municipio de La Plata		Municipio de Suaza		Municipio de Suaza	
<div> EDINSON SUAZA HÉNDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		4/06/2024	AL	17/06/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	3/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				14
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0270%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1080%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8099%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		99.23%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.07%	6.58%	3.73%
2	AIPE	2.08%	1.52%	0.00%
3	ALGECIRAS	5.56%	4.04%	3.54%
4	BARAYA	3.41%	2.48%	0.00%
5	GUADALUPE	5.94%	3.24%	1.07%
6	IQUIRA	6.51%	4.73%	2.97%
7	ISNOS	2.40%	1.53%	1.90%
8	LA ARGENTINA	6.76%	5.53%	5.18%
9	LA PLATA	15.60%	12.77%	10.23%
10	NATAGA	0.44%	0.36%	0.00%
11	PAICOL	1.58%	1.29%	0.00%
12	PALESTINA	7.58%	4.82%	3.10%
13	PITALITO	10.93%	6.96%	6.95%
14	SALADOBLANCO	2.53%	1.61%	0.63%
15	SANTA MARIA	6.32%	4.59%	3.35%
16	SUAZA	8.47%	4.62%	3.92%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.18%	66.7%	46.56%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		47.43%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	68.50%	48.37%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Continúan visitas de verificación etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Algeciras, Baraya, Guadalupe, Palestina, Pitalito, Saladoblanco y Santa María.					
Se realiza acompañamiento en verificación y recibo de obra en los municipios de Pitalito, Saladoblanco y Suaza.					
Se realizó comité técnico el día 11 de junio de 2024 para revisar avance del contrato.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Entrega de materiales en los municipios de Suaza y Acevedo.				
2	Continúa visitas etapa de sensibilización en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Santa María y Suaza.				
3	Avanza etapa de construcción en los municipios de Acevedo, Guadalupe, La Plata, Pitalito y Suaza.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Guadalupe	
					
Municipio de Guadalupe		Municipio de La Plata		Municipio de La Plata	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Suaza		Municipio de Suaza	
<div> EDINSON SUAZA HÉNDENZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

2/07/2024

AL

15/07/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDÉZ	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

16

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	7.734%	3.917%
2	AIPE	2.085%	1.706%	0.000%
3	ALGECIRAS	5.560%	4.549%	3.538%
4	BARAYA	3.412%	2.843%	0.695%
5	GUADALUPE	5.939%	3.837%	3.159%
6	IQUIRA	6.507%	5.324%	2.969%
7	ISNOS	2.401%	1.746%	1.895%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.145%	5.180%
9	LA PLATA	15.605%	14.186%	11.372%
10	NATAGA	0.442%	0.402%	0.000%
11	PAICOL	1.579%	1.436%	0.000%
12	PALESTINA	7.581%	5.514%	3.538%
13	PITALITO	10.930%	7.998%	6.949%
14	SALADOBLANCO	2.527%	1.838%	0.632%
15	SANTA MARIA	6.318%	5.169%	3.348%
16	SUAZA	8.466%	5.387%	5.496%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	75.813%	52.689%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		53.67%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	77.64%	54.51%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Se realiza acompañamiento al contratista para el recibo de hornillas en los municipios de Acevedo, Guadalupe y Suaza.					
Se avanza en la revisión conjunta de la papelería parcial entregada por el contratista de la etapa de sensibilización.					
Se realiza comité de seguimiento el día 05 de julio de 2024 en compañía del apoyo a la supervisión para revisar avance del contrato y en comité técnico del día 09 de julio de 2024, el contratista hizo entrega del plan de seguimiento y control al plan de contingenci y solicitó al contratista entregar cronograma ajustado conforme a lo propuesto en el plan de contingencia para realizar el control y reporte sobre el mismo en el aplicativo gesproy.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Se avanza en la etapa de construcción de hornillas en los municipios de Acevedo, Baraya, Guadalupe, La Plata y Palestina.				
2	Entrega plan de seguimiento y control al plan de contingencia.				
3	Consolidación papalería etapa de sensibilización para revisión.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Baraya		Municipio de Guadalupe		Municipio de Guadalupe	
					
Municipio de La Plata		Municipio de Palestina		Municipio de Palestina	
<div> EDINSON SUAZA HÉNDZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

16/07/2024

AL

29/07/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

17

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	7.788%	3.917%
2	AIPE	2.085%	1.706%	0.000%
3	ALGECIRAS	5.560%	4.549%	4.422%
4	BARAYA	3.412%	2.895%	0.695%
5	GUADALUPE	5.939%	3.945%	3.159%
6	IQUIRA	6.507%	5.324%	2.969%
7	ISNOS	2.401%	1.746%	1.895%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.197%	5.180%
9	LA PLATA	15.605%	14.186%	12.951%
10	NATAGA	0.442%	0.402%	0.000%
11	PAICOL	1.579%	1.436%	0.000%
12	PALESTINA	7.581%	5.514%	3.538%
13	PITALITO	10.930%	8.048%	6.949%
14	SALADOBLANCO	2.527%	1.838%	0.632%
15	SANTA MARIA	6.318%	5.169%	3.348%
16	SUAZA	8.466%	5.387%	5.496%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	76.129%	55.153%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		56.18%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	77.95%	56.98%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Se realizan visitas para el recibo de obra en los municipios de La Plata y Palestina.					
Se realizó comité de seguimiento el día 24 de julio de 2024 con el apoyo a la supervisión para revisar el avance del contrato. Se le reiteró al contratista el cumplimiento del plan de contingencia para la terminación dentro del plazo contractual.					
Continúa la revisión de documentación entregada parcialmente por el contratista respecto a la etapa de sensibilización.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Contiúa la construcción de hornillas, en el presente período se trabaja en los municipios de Algeciras y La Plata.				
2	Avanza consolidación documentación etapa sensibilización para ser entregada a la interventoria para su revisión.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras	
					
Municipio de La Plata		Municipio de La Plata		Municipio de La Plata	
<div> EDINSON SUAZA HÉNDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023			
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		30/07/2024	AL	12/08/2024	
A. DATOS GENERALES					
PROYECTO		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS EFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA		ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :			
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ			
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :			
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN		PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024		10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					18
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	
ETAPA SENSIBILIZACION					
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%	
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%	
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%	
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%	
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%	
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%	
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%	
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%	
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%	
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%	
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%	
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%	
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%	
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%	
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%	
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%	
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%	
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%			
ETAPA CONSTRUCCIÓN					
1	ACEVEDO	12.067%	7.843%	3.917%	
2	AIPE	2.085%	1.706%	0.000%	
3	ALGECIRAS	5.560%	4.549%	4.675%	
4	BARAYA	3.412%	2.946%	3.096%	
5	GUADALUPE	5.939%	4.053%	3.159%	
6	IQUIRA	6.507%	5.324%	2.969%	
7	ISNOS	2.401%	1.746%	2.401%	
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.248%	5.370%	
9	LA PLATA	15.605%	14.186%	12.951%	
10	NATAGA	0.442%	0.402%	0.000%	
11	PAICOL	1.579%	1.436%	0.126%	
12	PALESTINA	7.581%	5.565%	4.928%	
13	PITALITO	10.930%	8.098%	6.949%	
14	SALADOBLANCO	2.527%	1.838%	2.401%	
15	SANTA MARIA	6.318%	5.169%	3.348%	
16	SUAZA	8.466%	5.490%	5.496%	
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	76.598%	61.786%	
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		62.93%			
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	78.42%	63.61%	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
En comité técnico realizado el día 30 de julio de 2024, el contratista informó que se han presentado dificultades con algunos beneficiarios y solicitó a la Corporación realizar acercamiento con el personal presente en la zona para que pudieran realizar la construcción de la hornilla.					
El día 12 de agosto de 2024, se realizó comité técnico donde la interventoría informó que algunas hornillas presentan observaciones que deben ser subasadas por el contratista a la menor brevedad posible.					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Algeciras, Baraya, La Plata, Palestina y Saladoblanco.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa la construcción de hornillas en los municipios de Algeciras, Baraya, Isnos, La Argentina, Paicol, Palestina y Saladoblanco.				
2	Se realiza consolidación de documentación etapa de sensibilización para entrega y posterior revisión.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Algeciras		Municipio de Baraya	
					
Municipio de Baraya		Municipio de Isnos		Municipio de Isnos	
					
Municipio de La Argentina		Municipio de La Argentina		Municipio de Paicol	



Municipio de Palestina



Municipio de Palestina



Municipio de Palestina



Municipio de Saladoblanco



Municipio de Saladoblanco



Municipio de Saladoblanco


EDINSON SUAZA H  NDEZ
RL EMC2 INGENIER   S.A.S.



INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

13/08/2024

AL

26/08/2024

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ	
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :	
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

19

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	7.898%	7.392%
2	AIPE	2.085%	1.706%	0.000%
3	ALGECIRAS	5.560%	4.650%	5.496%
4	BARAYA	3.412%	2.998%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	4.161%	3.159%
6	IQUIRA	6.507%	5.324%	2.969%
7	ISNOS	2.401%	1.746%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.299%	5.875%
9	LA PLATA	15.605%	14.328%	15.036%
10	NATAGA	0.442%	0.402%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.436%	1.453%
12	PALESTINA	7.581%	5.617%	6.002%
13	PITALITO	10.930%	8.147%	6.949%
14	SALADOBLANCO	2.527%	1.941%	2.464%
15	SANTA MARIA	6.318%	5.169%	3.348%
16	SUAZA	8.466%	5.646%	5.496%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	77.468%	71.895%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		73.23%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	79.29%	73.72%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
En comité técnico realizado el día 20 de agosto de 2024, el contratista informó que hizo entrega a la interventoría de la documentación para su respectiva revisión, en dos(2) carpetas que contienen las actas de recibo de obra, las cuales hacen parte del acta parcial de obra No. 2.					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Algeciras, Baraya, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Palestina y Saladoblanco.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa la construcción de hornillas en los municipios de Acevedo, Algeciras, Baraya, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palestina y Saladoblanco.				
2	Entrega para revisión 2 AZ con las actas de recibo de obra para el corte 2.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Algeciras	
					
Municipio de Algeciras		Municipio de Baraya		Municipio de Baraya	
					
Municipio de La Argentina		Municipio de La Argentina		Municipio La Plata	



Municipio de La Plata



Municipio de Nátaga



Municipio de Nátaga



Municipio de Paicol



Municipio de Paicol



Municipio de Palestina


EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		10/09/2024	AL	23/09/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	03/10/2024	10 MESES	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				21
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	10.330%	10.235%
2	AIPE	2.085%	2.085%	0.505%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.560%	5.496%
4	BARAYA	3.412%	3.412%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	5.210%	3.159%
6	IQUIRA	6.507%	6.507%	6.507%
7	ISNOS	2.401%	2.401%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.760%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.605%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.579%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	6.995%	6.949%
13	PITALITO	10.930%	9.886%	9.729%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.464%
15	SANTA MARIA	6.318%	6.318%	5.433%
16	SUAZA	8.466%	7.439%	7.265%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	93.055%	87.941%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		89.58%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	94.88%	89.77%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Iquira, La Argentina, La Plata y Santa María.					
Continúa revisión de documentación entregada por el contratista respecto a la etapa de sensibilización.					
En comité técnico del 11 de septiembre de 2024, el contratista manifestó que tuvo inconvenientes con la entrega de material debido al paro camionero presentado, ya que de la ciudad de Bogotá venía materia prima que no pudo llegar a la planta de producción a tiempo y esto generó retrasos en el cronograma de producción y por lo tanto, en la entrega de material. Adicionalmente, han surgido varias novedades en campo al momento de la entrega de material y/o de la construcción, que impidieron dar cumplimiento con los plazos acordados en el plan de contingencia.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Continúa la construcción de hornillas en los municipios de Acevedo, Aipe, Iquira, Palestina y Santa María.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Aipe	
					
Municipio de Aipe		Municipio de Iquira		Municipio de Iquira	
					
Municipio de Palestina		Municipio de Palestina		Municipio de Santa María	
<div> EDINSON SUAZA HÉNQUEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

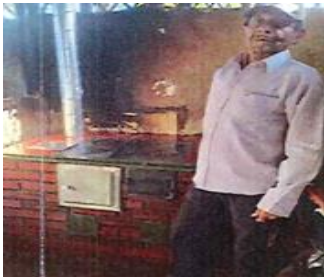
		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		24/09/2024	AL	7/10/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	25/10/2024	10 MESES Y 22 DÍAS	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				22
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	10.909%	10.235%
2	AIPE	2.085%	2.085%	2.085%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.560%	5.560%
4	BARAYA	3.412%	3.412%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	5.453%	5.054%
6	IQUIRA	6.507%	6.507%	6.507%
7	ISNOS	2.401%	2.401%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.760%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.605%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.579%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	7.191%	7.076%
13	PITALITO	10.930%	10.234%	9.982%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.527%
15	SANTA MARIA	6.318%	6.318%	6.318%
16	SUAZA	8.466%	7.782%	8.466%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	94.762%	94.006%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		95.75%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	96.59%	95.83%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Iquira, Palestina y Salado blanco.					
Continúa revisión de documentación entregada por el contratista respecto a la etapa de sensibilización.					
En comité técnico del 27 de septiembre de 2024, el contratista informó que mediante oficio de fecha 25 de septiembre de 2024, solicitó adición en plazo de veintidós (22) días; siendo; razón por la cual la interventoría recomendó dicha adición.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Consolidación información para desembolso final y liquidación del contrato				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Aipe		Municipio de Algeciras		Municipio de Guadalupe	
					
Municipio de Palestina		Municipio de Pitalito		Municipio de Salado blanco	
					
Municipio de Santa María		Municipio de Santa María		Municipio de Suaza	
<div> EDINSON SUAZA HENDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		8/10/2024	AL	21/10/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDEZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	25/10/2024	10 MESES Y 22 DÍAS	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				23
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	11.488%	12.067%
2	AIPE	2.085%	2.085%	2.085%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.560%	5.560%
4	BARAYA	3.412%	3.412%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	5.696%	5.939%
6	IQUIRA	6.507%	6.507%	6.507%
7	ISNOS	2.401%	2.401%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.760%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.605%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.579%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	7.386%	7.581%
13	PITALITO	10.930%	10.582%	10.930%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.527%
15	SANTA MARIA	6.318%	6.318%	6.318%
16	SUAZA	8.466%	8.124%	8.466%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	96.469%	98.176%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		100.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	98.29%	100.00%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Avanza el recibo de obra en los municipios de Guadalupe, Palestina, Pitalito, Santa María y Suaza.					
Continúa revisión de documentación entregada por el contratista respecto a la etapa de sensibilización.					
En comité técnico del 16 de octubre de 2024, el contratista informó que están en construcción las 2 estufas pendientes en el municipio de Suaza para cumplir con la totalidad de estufas del presente contrato. De igual forma manifestó que, están siendo subsanadas las observaciones presentadas por interventoría.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Finaliza etapa de construcción en los municipios de Acevedo, Guadalupe, Palestina y Suaza.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Guadalupe	
					
Municipio de Guadalupe		Municipio de Palestina		Municipio de Palestina	
					
Municipio de Suaza		Municipio de Suaza		Municipio de Suaza	
<div> EDINSON SUAZA HENDEZ RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					

		INFORME QUINCENAL CONTRATO DE OBRA 418 DE 2023		
INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		22/10/2024	AL	25/10/2024
A. DATOS GENERALES				
PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".		HUILA	ACEVEDO, AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, SUAZA	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	EDINSON SUAZA HÉNDENZ		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CONSORCIO HORNILLAS 2023	901.759.999-9	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:	
\$449,985,033.96	4/12/2023	25/10/2024	10 MESES Y 22 DÍAS	
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				24
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE QUINCENA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA SENSIBILIZACION				
1	ACEVEDO	0.22%	0.2242%	0.2242%
2	AIPE	0.04%	0.0387%	0.0387%
3	ALGECIRAS	0.10%	0.1033%	0.1033%
4	BARAYA	0.06%	0.0634%	0.0634%
5	GUADALUPE	0.11%	0.1103%	0.1103%
6	IQUIRA	0.12%	0.1209%	0.1209%
7	ISNOS	0.04%	0.0446%	0.0446%
8	LA ARGENTINA	0.13%	0.1256%	0.1256%
9	LA PLATA	0.29%	0.2899%	0.2899%
10	NATAGA	0.01%	0.0082%	0.0082%
11	PAICOL	0.03%	0.0293%	0.0293%
12	PALESTINA	0.14%	0.1408%	0.1408%
13	PITALITO	0.20%	0.2031%	0.2031%
14	SALADOBLANCO	0.05%	0.0469%	0.0469%
15	SANTA MARIA	0.12%	0.1174%	0.1174%
16	SUAZA	0.16%	0.1573%	0.1573%
AVANCE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		1.82%	1.8240%	1.8240%
AVANCE PORCENTUAL DE LA SENSIBILIZACIÓN		100.00%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	ACEVEDO	12.067%	12.067%	12.067%
2	AIPE	2.085%	2.085%	2.085%
3	ALGECIRAS	5.560%	5.560%	5.560%
4	BARAYA	3.412%	3.412%	3.412%
5	GUADALUPE	5.939%	5.939%	5.939%
6	IQUIRA	6.507%	6.507%	6.507%
7	ISNOS	2.401%	2.401%	2.401%
8	LA ARGENTINA	6.760%	6.760%	6.760%
9	LA PLATA	15.605%	15.605%	15.605%
10	NATAGA	0.442%	0.442%	0.442%
11	PAICOL	1.579%	1.579%	1.579%
12	PALESTINA	7.581%	7.581%	7.581%
13	PITALITO	10.930%	10.930%	10.930%
14	SALADOBLANCO	2.527%	2.527%	2.527%
15	SANTA MARIA	6.318%	6.318%	6.318%
16	SUAZA	8.466%	8.466%	8.466%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		98.176%	98.176%	98.176%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		100.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	100.00%	100.00%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA					
Finaliza la etapa de recibo de obra en los municipios de Acevedo y Pitalito. El contratista ejecutó el 100% de las actividades contractuales, siendo recibidas a satisfacción.					
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
No se registran situaciones críticas.					
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA					
BUENA	X	REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL TÉCNICO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Consolidación información para desembolso final y liquidación del contrato				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo		Municipio de Acevedo	
					
Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito		Municipio de Pitalito	
<div> EDINSON SUÁZ A HÉND E Z RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.</div>					
