



FORMATO

Página: 1 de # 1

13/06/2020

13/06/2020

15,00
BOME

MARISOL PUENTES ROMERO

REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE – ADECUACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Evaluación	<u>Porcentaje Adelanto</u>		<u>3.00%</u>
	<u>Valor Adelanto</u>		<u>\$ 2.457.602.460,00</u>

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista:	Grupo Metro Colombia S.A.S.
Contrato No:	19001423 H3 de 2019
Valor Inicial:	\$ 2.549.676.150
Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 0
Valor actualizado 2:	\$ 0
Plazo inicial:	Treinta (30) meses
Plazo actualizado:	Treinta (30) meses
Fecha de iniciación:	30-ene-20
Fecha de vencimiento:	30-jul-22
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	\$ 2.549.676.150

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Con el oficio GMC-117-218-2020 la interventoría hace entrega de la hoja de vida de la Auxiliar de Ingeniería Darlyn Yusney Gómez a la Aeronáutica civil debidamente revisada y aprobada por esta interventoría.

OBRAS LADO AIRE

4.1. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL). Durante esta semana se continua con la actividad de rocería en la franja de seguridad del costado occidental realizando 13650m2, el material se dispone en costales de gran tamaño y se almacena para cuando exista una cantidad considerada, llevar al sitio de disposición final.

OBRAS LADO TIERRA

No se presentan actividades en el lado tierra

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 13/06/2020

Página: 1 de # 1

AVANCE DE OBRA

Se continua con la actividad de fresado y pavimentación de la primera capa de mezcla asfáltica en la pista.
Se continua con la fundición de las losas en concreto en la calle de rodaje Charlie.
Se avanza con el mantenimiento del lado aire mediante rocería en la franja de seguridad costado este.

FINANCIERO:

Mediante oficio GMC-117-219-2020 del 10 de junio de 2020 se remitió a la Aerocivil alcance a la solicitud del CONSORCIO YARIGUÍES M&C sobre la modificación del Plan de Inversión del Anticipo.
Mediante oficio GMC-117-223-2020 del 11 de junio de 2020 se remitió el formato ajustado del Acta No. 2 de pago del contrato de obra.
Mediante oficio GMC-117-226-2020 del 13 de junio de 2020, se ajustó el acta No. 4 de Interventoría correspondiente al periodo del 16 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020 en el formato proporcionado por la entidad con el desglose del 40% y 60% por un valor de \$64.111.614

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 13/06/2020

Página: 1 de # 1

AMBIENTAL:

Actividades desarrolladas en obra durante la semana del 07 al 13 de junio de 2020.

* Se realizan recorridos de inspección ambiental de la obra, para garantizar el cumplimiento del contratista a las fichas ambientales.

* Se solicitó al contratista la ubicación en sitio adecuado para uso de los trabajadores en obra de los baños portátiles, no se cumplió a cabalidad, dado que se cuenta con un promedio de 35 trabajadores en los turnos de los NOTAM y solo disponen de un baño en el área el cual no cuenta con buena higiene para su uso.

* En cuanto a la ubicación de punto ecológico y puntos de hidratación, orden y aseo, el contratista atendió las observaciones realizadas por la interventoría.

* Se realizó seguimiento a actividad de rocería y recolección del material vegetal, el cual fue almacenado temporalmente en el campamento del contratista mientras es entregado a la empresa Veolia para su disposición final.

* Se envía al Consorcio Yariquies oficio con requerimientos para la presentación de los informes ambientales, donde debe hacer entrega de los soportes y cumplimiento de los indicadores de las fichas ambientales.

Observaciones

* El Consorcio Yariquies no ha dado respuesta al oficio enviado desde la semana anterior donde se le solicitaba atender varias observaciones de incumplimiento al PMA del proyecto respecto al área de almacenamiento temporal de los materiales sobrantes de excavación, escombros y material de fresado, igualmente en la conformación del carretable.

* El Contratista no ha enviado las evidencias de cumplimiento a los compromisos del acta del recorrido del 27 de mayo de 2020.

SISO.

Durante la semana de corte se realizaron las siguientes observaciones en campo para poder ser corregidas inmediatamente por el contratista:

-Se evidencio que los baños se encuentran en muy malas condiciones de aseo y no es agradable ni higiénico hacer uso de ellos. Se recomienda realizar acompañamientos a la empresa prestadora del servicio de aseo para verificar que lo hagan de la manera correcta y estos queden en buenas condiciones para su uso.

-Se evidencio en campo la instalación de un contenedor el cual no fue aterrizado eléctricamente para evitar descargas y no fue posicionado en polines para garantizar su estabilidad. Se recomienda hacer uso de polines para dar estabilidad y aterrizaje.

-Se evidencio trabajador realizando actividad de limpieza con compresor de aire sin protección visual para evitar caída de material particulado en su vista. Se recomienda brindar careta con acetato transparente para evitar futuras lesiones en la visión del trabajador ejecutante de la labor.

-Se evidencio tramos de la obra sin iluminación necesaria para la realización de las actividades. Se recomienda mas instalación de planta estadio para garantizar la iluminación adecuada al personal y logren ejecutar sus actividades de manera cómoda y sin esforzar su vista.

-Se evidencio a un trabajador tomando agua en la tapa del termo de hidratación de todo el personal. Se recomienda realizar charlas o capacitaciones de la importancia de la higiene con los puntos de hidratación para así evitar contagios de enfermedades común como la gripe o el covid 19.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad para la prevención del covid-19 se han venido siguiendo a cabalidad por parte del contratista y de la Interventoría y se han presentado los respectivos informes diarios y semanales de dichos protocolos.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


Personal de Interventoría	11
Personal del Contratista	44
Total Personal en Obra	55

Personal de obra



En el **gráfico número 1**, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

Personal Operativo

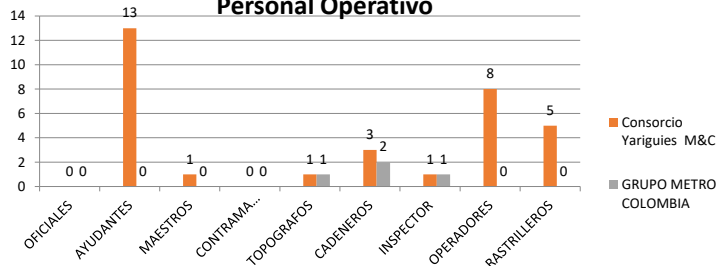

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo.

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 13/06/2020

Página: 1 de # 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
ESTACION	X		NIKON NPL-352 SERIAL #031166
NIVEL DE PRECISION	X		TOPCON AT-N
COMPACTADOR DE LLANTAS	X		CATERPILLAR PS150C
FINISHER	X		CATERPILLAR AP355F
RETRO ORUGA	X		EC140BLC
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	X		DYNAPAC CA150
RETRO DE LLANTAS	X		CATERPILLAR 426 F2
MARTILLO	X		CATERPILLAR B8
MINI CARGADOR	X		NEW HOLLAND L218
BARREDORA	X		BP 15B
FRESADORA	X		CATERPILLAR PM102
IRRIGADOR	X		MARMITA LEE BOY L-250
MINI CARGADOR	X		CATERPILLAR 236 D3
SOPLADORA	X		STHIL
PLANTAS ELECTRICAS	X		HUSQVARNA
VIBROCOMPACTADOR GRANULARES	X		CATERPILLAR CB534D
CAMIONETA GUÍA	X		JEK 768 FORD RANGE
LUMINARIAS	X		HILIGHT ATLAS COPCO X 350 W
GUADARA	X		HUSQVARNA MOD 143 RII
CAMIONETA INTERVENTORIA	X		MITSUBISHI
VOLQUETA	X		KENWORTH mod 2015- WFC202
VOLQUETA	X		KENWORTH WFC990
VIBROCOMPACTADOR	X		WACKER
Total Maquinaria	23		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 108.648.605,00		Valor Total Contrato Obra
2	16 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 136.626.500,00		\$ 25.476.606.360,00
3				Valor facturado Contrato Obra
4				\$ 245.275.105,00
5				% Avance facturado Acumulado
6				0,96%
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Acumulado		\$ 245.275.105,00		

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1	30 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020	\$ 42.420.574,00		Valor Total Contrato interventoría
2	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 123.471.130,00		\$ 2.549.676.150,00
3	16 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020	\$ 122.730.699,00		Valor facturado Contrato Interventoría
4	16 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 64.111.614,00		\$ 352.734.018,00
5				% Avance facturado Acumulado
6				13,83%
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Acumulado		\$ 352.734.018,00		

FORMATO				
<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div> <div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div>				
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 13/06/2020	Página: 1 de # 1
OBSERVACIONES			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			ING. CESAR FERNANDO LOSADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1
10/06/2020

Fresado en la pista.



Foto No. 2
10/06/2020

Se realizo riego de imprimacionen la pista.



Foto No. 3
10/06/2020

Se realizo la colocacion y compactacion de la primera capa de mezcla asfaltica desde la abcsisa.



Foto No. 4
11/06/2020

Se realizo la señalizacion provisional horizontal en la pista.



Foto No. 5
05/06/2020

Instalación y compactación de la subbase en la calle de rodaje charlie



Foto No. 6
06/06/2020

Instalacion de acero de refuerzo y de transferencia(dovelas).



Foto No. 7
06/06/2020
Fundicion de las placas de concreto en la calle de rodaje charlie.



Foto No. 9
06/06/2020
Toma de densidades en campo de la capa de sub-base de la calle de rodaje charlie.

