



INFORME MENSUAL No 02
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1262-24




Secretaría de
Infraestructura

INFORME No. 02

PERIODO: 17 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**CONTRATO DE OBRA No. 1262-2024 DE "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	
---------------------	-----------------------------------	---

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

829000757-4

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Contenido

1.	INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL.....	3
2.	FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA:.....	5
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	5
3.	CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA.....	6
4.	DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA	7
5.	LOCALIZACIÓN.....	7
6.	DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO:.....	8
7.	MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO	8
8.	SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO	8
9.	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES	10
10.	REGISTO FOTOGRAFICO	11
11.	AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO	14
11.1	Avance físico	14
11.2	Avance en tiempo	14
11.3	Avance financiero:.....	15
12.	REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO:.....	15
13.	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	16
13.1	GESTION SST DEL MES:	17
14.	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO	26
14.1.	COMPONENTE AMBIENTAL	26
14.2.	REGISTRO FOTOGRAFICO	27
15.	SEGUIMIENTO SOCIAL	28
16.	INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	28
17.	ACTAS DE LA INTERVENTORIA	29
18.	POLIZAS DE LA INTERVENTORIA.....	29
19.	ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA.....	30
20.	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL	31
21.	ACTAS DE COMITÉ O REUNION.....	31

22.	CORRESPONDENCIA ENVIADA	31
23.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....	31
24.	RELACION PERSONAL INTERVENTORIA	31
25.	ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO	31
23.1.	FORMA DE PAGO	32
26.	RESUMEN BALANCE FINANCIERO	32
27.	CURVA DE AVANCE FISICO.....	33
28.	CONCLUSIONES	33
29.	ANEXOS.....	34

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El Distrito de Barrancabermeja Santander mediante la adjudicación del **contrato de obra pública No. 1261-24** a la empresa contratista **UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA**. Se procede a la ejecución del proyecto cuyo objeto es la **“CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.”**, por un valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$965.704.038)**, con un plazo de ejecución de **SEIS (06) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La realización del proyecto se lleva a cabo a través de la construcción de la línea de conducción de agua potable en diámetros 3” y 4” desde la línea de conducción de 10” en material PVC del acueducto La Fortuna hasta la vereda la Cascajera del corregimiento La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, con el fin de garantizar el servicio de agua potable, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

Dentro del objeto contractual se Incluyen las siguientes actividades principales:

Preliminares: Comprende las actividades de Localización y replanteo acueducto, retiro de material sobrante forma manual, bombeo y manejo de agua, excavación y descapote manual.

Movimiento de Tierra: Comprende las actividades de excavación manual y relleno. Concretos, pavimentos y andenes: comprende la actividad de concreto para atraque. Suministro e instalación tubería de acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de tubería.

Suministro e instalación accesorios acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de TEE, reducción, codo, tapón, uniones de reparación y adaptador brida.

Elementos hidráulico acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de válvulas y collarines.

Actividades Complementarias: Comprende las actividades de empalme de tubería, instalación de acometida domiciliaria incluye medidor, caja plástica y tapa de seguridad, y kit de contra bridas, tornillos, tuercas, arandelas y empaque.

En el siguiente informe se detalla a manera descriptiva las actividades establecidas mediante ítems de pago realizadas en el periodo comprendido entre el día **DIECISIETE (17) de AGOSTO de 2024 al DIECISEIS (16) SEPTIEMBRE de 2024** y se exponen los lineamientos de tipo administrativo, ambiental y financiero.

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	1261-24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA
NIT	901819149-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
IDENTIFICACION	C. C. 63.507.675 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPO-009-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$965.704.038)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaria de Planeación el 20 de septiembre de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-09556 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.013.226.098); Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 5523 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091, Fuente: Nación, por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.013.226.098).
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02970 DEL 3 DE MAYO DE 2024 SGR - 324 del 2024-05-03
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14452851 CO1.WRT.14452698 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 CO1.WRT.144824497 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPPA No.	8784 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Se adjuntan pólizas iniciales, pólizas del adicional N.1 en plazo y pólizas después de suspensión y reinicio. (VER ANEXOS)

Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2025	\$193,140,807.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/01/2028	\$96,570,403.80
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2030	\$193,140,807.60
Predios, labores y operaciones	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Vehículos propios y no propios	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00


Responsabilidad civil cruzada	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00
Gastos médicos	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	\$260,000,000.00

4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en la vereda La Cascajera situada en el corregimiento de la Fortuna, zona rural de Barrancabermeja.

5. LOCALIZACIÓN

Corregimiento La Fortuna noreste del Distrito de Barrancabermeja, Santander.

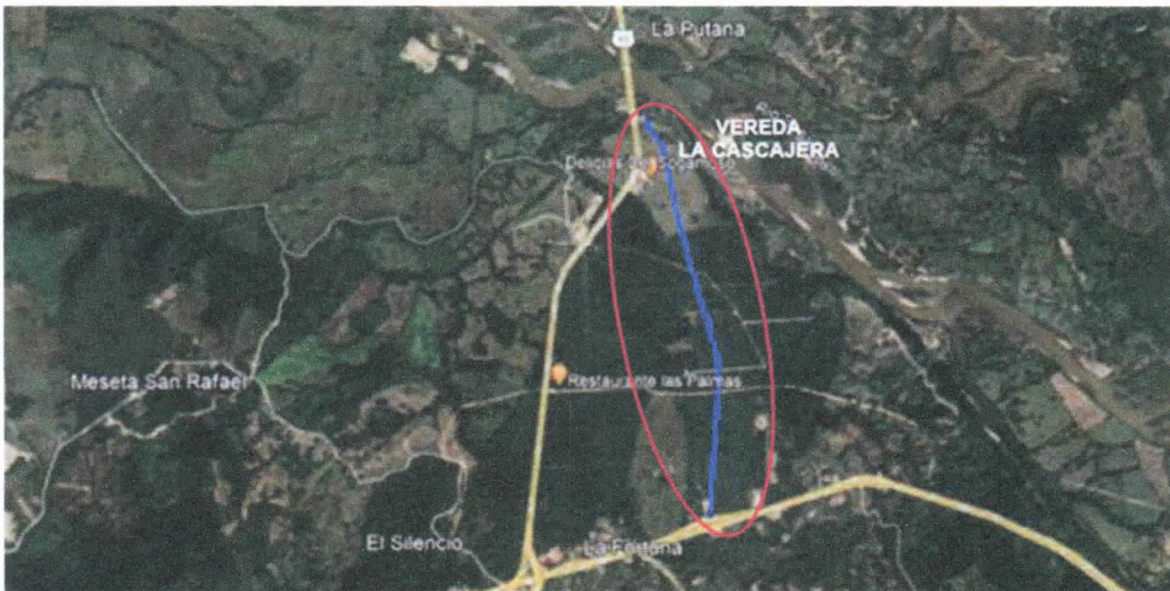


MATERIALES

Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

6. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se localizará el Corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja.

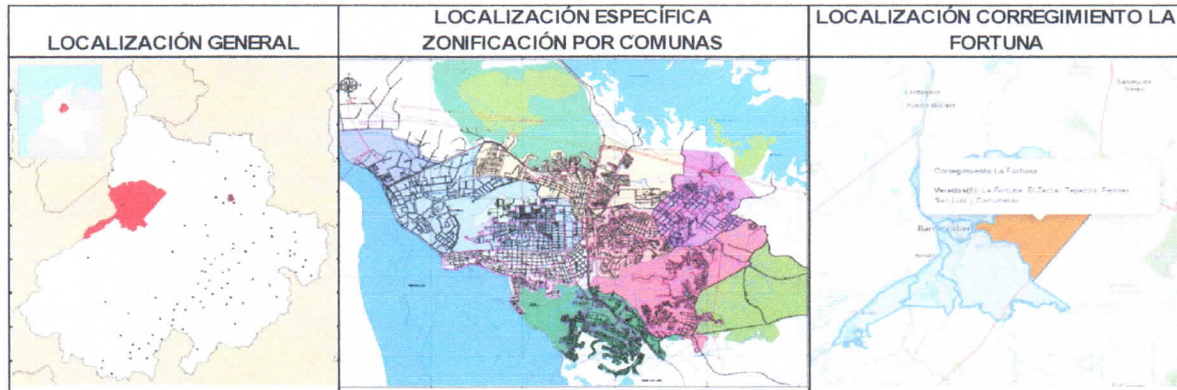

7. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

8. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este periodo se realizaron trabajos de localización y replanteo del trazado siguientes a la ejecución del mes 1, por donde se planteó realizar la instalación de tubería, posteriormente se realizó la señalización de las áreas a intervenir. En el mismo sentido y en congruencia a la ejecución del proyecto, se procedió con actividades de excavación manual hasta cota requerida para nivel de cama de arena, instalaciones de tuberías en diámetro de 2", 3" y 4", y por consiguiente a este proceso con el recubrimiento en arena y relleno con material proveniente de excavación.

Según la necesidad del relieve topográfico fue necesario instalar una serie de accesorios hidráulicos como: codos, uniones, así mismo como accesorios tipo Tee para las correspondientes derivaciones hacia sistema de purga y venteo.

Las actividades realizadas durante el mencionado periodo se detallan a continuación:

▪ Localización y replanteo acueducto:

Esta actividad continua con la localización del trazado para la instalación de la línea de conducción de agua potable hacia la Vereda La Cascajera. Luego del levantamiento topográfico inicial, se procede a realizar replanteo de la longitud a ejecutar durante el periodo del mes 2.

▪ Descapote manual

Se realizan actividades de descapote y desmalezado manual con la finalidad de contar con un trazado libre de áreas verdes que permitan la mejor ejecución de actividades consecuentes.

▪ **Excavación manual:**

Las labores referentes a excavación manual se realizaron para la instalación de tuberías según diámetros estipulados por ingeniería de diseño. Esta actividad se realizó luego de contar con el terreno descapotado, a través de personal de mano de obra no calificada durante el trazado contemplado desde el corregimiento La Fortuna hacia la vereda la Cascajera. Estas actividades se realizan mediante personal de mano de obra local.

▪ **Relleno tipo 1 (arena de río):**

Se realizó el suministro e instalación de relleno de tuberías instaladas a través de material de arena de río como cama de arena y recubrimiento del perímetro exterior del tubo instalado.

▪ **Relleno tipo 3 (material proveniente de excavación)**

Esta actividad corresponde al relleno hasta nivel de terreno existente con el mismo material proveniente de las actividades de excavación. Este procedimiento se realiza de forma manual a través de mano de obra no calificada local.

▪ **Suministro e instalación de tuberías PVC Dn= 2", 3" y 4".**

Las instalaciones de tuberías se realizaron según planimetrías de diseño y especificaciones técnicas donde la resistencia de presión para acueducto estipulada RDE 21 cuyo sistema de acople se realiza a través de unión mecánica con personal idóneo para su correspondiente instalación.

- ✚ Longitud tubería PVC Dn= 2" para habilitación de sistemas de purga.
- ✚ Longitud tubería PVC Dn= 3" para construcción de sistemas de purga o limpieza.
- ✚ Longitud tubería PVC Dn= 4" correspondiente a línea principal de conducción hacia la Vereda Cascajera.

▪ **Suministro e instalación de accesorios de acueducto.**

De acuerdo al relieve topográfico y necesidades propias del sistema de acueducto se requirió la instalación de una serie de accesorios y elementos hidráulicos con la finalidad de obtener el adecuado funcionamiento del acueducto. En este sentido se instalaron los siguientes accesorios:

- ✚ Tee 4"x2" PVC : 2 unidades para sistema de venteo.
- ✚ Tee 4"x3" PVC: 1 unidades para sistema de purgas
- ✚ Codo PVC 11.25x4": 2 unidades
- ✚ Codo PVC 22.5x4": 2 unidades
- ✚ Codo PVC 45x4": 1 unidad

▪ **Actividades Seguridad y salud en el trabajo:**

De acuerdo con el cumplimiento SST del proyecto, se contempló la gestión y desarrollo de diferentes actividades buscando las buenas prácticas enfocadas a la seguridad y salud en el trabajo mediante diferentes actividades durante la ejecución del contrato.

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1000	PRELIMINARES		
1001	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO	MTS	829,00
1007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MANUAL	M3	248,10
1018	DESCAPOTE MANUAL	M2	1662,00
2000	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2001	EXCAVACION MANUAL	M3	352,25
2015	RELLENO TIPO 1 (ARENA DE RIO)	M3	192,00
2017	RELLENO TIPO 3 (MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACION)	M3	153,77
3000	CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ANDENES		
3026	CONCRETO (3000 PSI) PARA ATRAQUE DE ACCESORIOS 3" Y 4" Y VALVULAS CON SIKASET L Y PLASTOCRETE DM	UND	8,00
4000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACUEDUCTO		
4001	SUM. E INST. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 2"	MTS	0,80
4003	SUM. E INST. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	MTS	6,00
4004	SUM. E INST. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 4"	MTS	822,00
5000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACUEDUCTO		
5004	SUM. E INST. TEE 4"X2" PVC	UND	2,00
5005	SUM. E INST. TEE 4"X3" PVC	UND	1,00
5152	SUM. E INST. DE CODO PVC 11.25 X 4"	UND	2,00
5155	SUM. E INST. DE CODO PVC 22.5 X 4"	UND	2,00
5158	SUM. E INST. DE CODO PVC 45 X 4"	UND	1,00
	PRESUPUESTO SST & AMBIENTAL		
1	BARRERA CON CINTA PLASTICA (Incluye base en madera)	MTS	487,04
3	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MES	1,00
6	SUMINISTROS DE HIGIENE PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA.	MES	1,00

10. REGISTRO FOTOGRAFICO




- Localización y Replanteo Acueducto



- Descapote Manual




- Excavación Manual

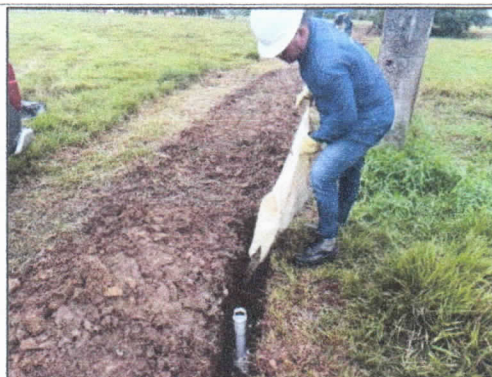

- Relleno Tipo 1 (Arena de Río)



- Relleno tipo 3 (material proveniente de excavación)

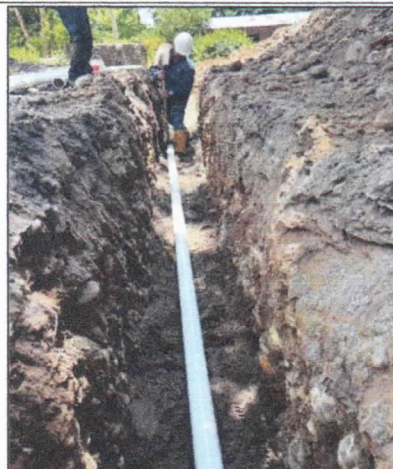

- Suministro e instalación de tuberías PVC Dn= 2", 3" y 4".



- Suministro e instalación de accesorios de acueducto.





- Actividades Seguridad y salud en el trabajo:


11. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

11.1 Avance físico

En función de la ejecución del proyecto relacionado con la planeación proyectada tenemos lo siguiente:

El Contrato tiene un avance total del 41,06 %, sobre un 29,31 % programado.

PROGRAMADO VS EJECUTADO

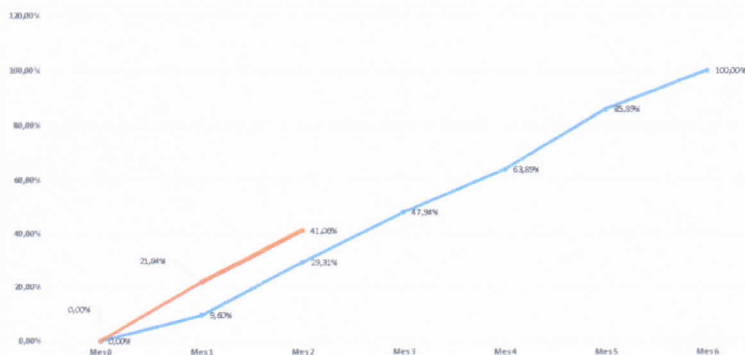

11.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES	2 MESES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL TIEMPO DEL CONTRATO	33,33 %


11.3 Avance financiero:


Durante el segundo mes, no se cobrará acta, por tanto, no hay avance financiero.

ACTA PARCIAL 01		FECHA
CONTRATISTA	\$ 210.897.958,00	16-ago-24
INTERVENTOR	\$ 15.289.681,68	16-ago-24

12. REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO:


A continuación, se relaciona reporte del tiempo correspondiente al periodo comprendido entre los días 17 de agosto 2024 hasta 16 de septiembre 2024.

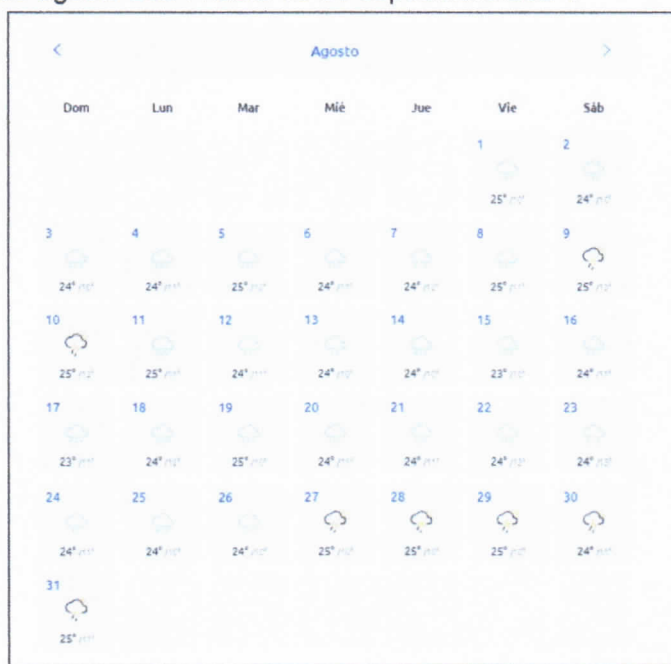

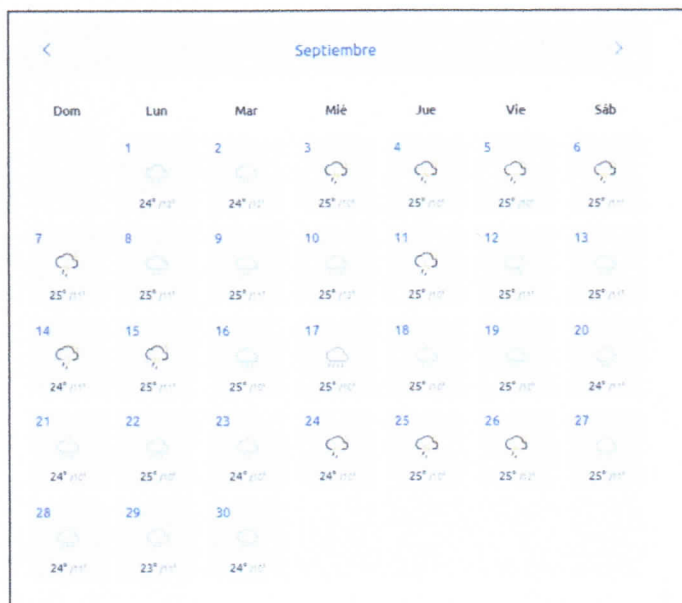

En este sentido, se observa la proporción del estado del tiempo en función de los días lluviosos, destacándose que durante este periodo predominan los días con lluvia.

ESTADO DEL TIEMPO

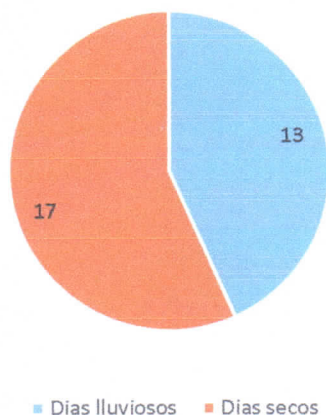

13. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

13.1 GESTION SST DEL MES:

- **ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP**

Durante este mes la interventoría ha realizado seguimiento al contratista para velar por el cumplimiento del uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 5 (*reposición de epp*)

- **CHARLAS DIARIAS HSE**

La interventoría hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y SST operativo.

ANEXO 6 (*Charlas de seguridad*)

- **INSPECCION DE HERRAMIENTAS**

También se hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.

ANEXO 1 (*Inspección de herramientas*)

- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

La interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado

ANEXO 8 (*Pago de planillas*)

- **RELACION PERSONAL DE OBRA**

ITEM	NOMBRES	ID	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PENSION	SALUD	ARL	CAJA COMPEN
1	ELIBERTO ARDILA BENAVIDES	91136061	OBRAERO	13/08/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA

2	LUIS MIGUEL PINTO GONZALEZ	1005179335	OBRERO	13/08/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
3	EDUIN ENRIQUE ANGARITA S.	15452121	OBRERO	13/08/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
4	MOISES MAYO SALAS	11807347	OBRERO	16/08/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
5	JHON JAIRO SUAREZ GARCIA	1099373820	OBRERO	29/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
6	SERGIO ANDRES VEGA MUÑOZ	1102722733	OBRERO	29/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
7	ELKIN MANUEL LOBO GUERRA	85166845	OBRERO	29/07/2024		COLPENSI ONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
8	ESNEIDER JESUS VEGA ANGARITA	1118826262	OBRERO	25/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
9	JULIETH NATALIA BONILLA HERNANDEZ	1005259986	HSE	25/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
10	EUDY ARENIS DURAN	1098788036	OBRERO	25/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
11	JHON FREDDY SISA JAIMES	1102387771	OBRERO	25/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
12	JAIDER ENRIQUE SEGURA LUNA	10903175	OBRERO	25/07/2024		COLPENSI ONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
13	ONOFRE PEREZ CARRASCAL	91427387	OBRERO	25/07/2024		COLPENSI ONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
14	CAMILO VALDIVIESO MUÑOZ	1096192986	OBRERO	25/07/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
15	JULIETH MARCELA OLIVEROS FRANCO	1096207694	AUXILIA R HSE	15/07/2024		PORVENIR	SANITAS	COLPATRIA	CAFABA
16	ELKIN FABIANO VERGEL PEREZ	88282070	RESIDEN TE	15/07/2024		PORVENIR	SALUD MIA	COLPATRIA	CAFABA
17	MARBIE ROSSANA VEGA RUIZ	1096205115	SOCIAL	15/07/2024		PROTECCI ON	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
18	JHON HENRY VALDERRAMA ALARCON	13850736	AMBIEN TAL	15/07/2024		COLPENSI ONES	SANITAS	COLPATRIA	CAFABA
19	JAIME HERNAN MARTINEZ	1098712774	DIRECT OR	21/05/2024		PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
20	FABIAN MAURICIO ROJAS VARGAS	91489847	SUPERVI SOR	24/05/2024		PROTECCI ON	FAMISANAR	COLPATRIA	CAFABA

• **PERSONAL RETIRADO**

ITEM	NOMBRES	ID	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PENSION	SALUD	ARL	CAJA COMPENSACION
1	ELIBERTO ARDILA BENAVIDES	91136061	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
2	LUIS MIGUEL PINTO GONZALEZ	1005179335	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
3	EDUIN ENRIQUE ANGARITA SANCHEZ	15452121	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
4	JHON JAIRO SUAREZ GARCIA	1099373820	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
5	SERGIO ANDRES VEGA MUÑOZ	1102722733	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA

6	ELKIN MANUEL LOBO GUERRA	85166845	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
---	--------------------------	----------	--------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	--------

• AUSENTISMO LABORAL

Durante este período no se presentó ausentismo laboral

• ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales

• REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS

Durante este periodo se generaron 2820 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

No de Semana	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	MES	ACUMULADO
N° TRABAJADORES	19,0	19,0	11,0	11,0	0,0	19,0	19,0
H.H. TRABAJADAS	893,0	893,0	517,0	517,0	0,0	2.820,0	2.820,0
TOTAL H.H	893,0	893,0	517,0	517,0	0,0	2.820,0	2.820,0

• REPORTE DE HORAS CAPACITACION

Durante este periodo se generaron 12.5 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

No de Semana	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	MES	ACUMULADO
H.H. CAPACITACIÓN	3,0	3,0	1,8	1,8	0,0	9,6	9,6
AUDITORIAS Y VISITAS DE SEGURIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSPECCIONES	2,0	4,0	4,0	4,0	0,0	14,0	44,0
ACCIDENTES E INCIDENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACCIDENTES/ INCIDENTES AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SOCIALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD X EFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD CON OCASIÓN AL TRABAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES**

VISITA TECNICA Y DE LA COMUNIDAD



CHARLAS ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES



INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO



SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS

CL 51 # 12 40 B CINCUENTENARIO. Celular: 311 422 6323

Correo Electrónico: interventoriaici.ltda@gmail.com

Barrancabermeja (Santander)



REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS


CL 51 # 12 40 B CINCUENTENARIO. Celular: 311 422 6323

Correo Electrónico: interventoriaici Ltda@gmail.com

Barrancabermeja (Santander)



REPOSICION DE EPP

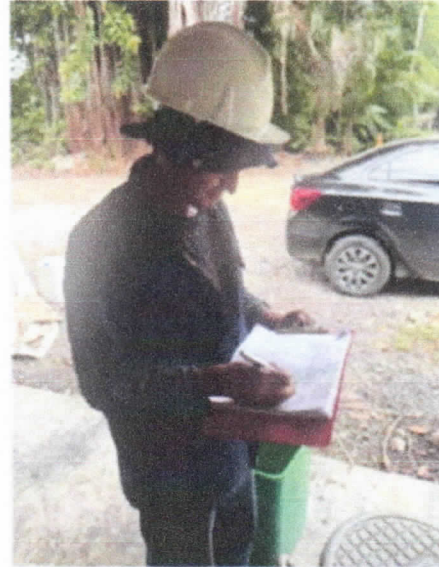

14. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

14.1. COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista realiza las actividades de la obra, cumpliendo con el cuidado del medio ambiente.

Se realizó continuo seguimiento para este periodo la reposición de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores del proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 5** (Inspección y entrega de EPP) del ítem de SST al inicio de este informe.

- **INSPECCIÓN Y ENTREGA DE EPP**

Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

- **EXCAVACIÓN**

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

- **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS**

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
<i>Quejas de ruido = N0quejas por ruido en el mes</i>
<i>Quejas de ruido = 0</i>

14.2. REGISTRO FOTOGRAFICO

ELEMENTOS DE EMERGENCIA



PUNTO ECOLOGICO



Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

15. SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento de todas las actividades sociales, reuniones con la comunidad.

16. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	1262-24
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
INTERVENTOR	:	
CONTRATISTA	:	ICI LTDA
NIT.	:	829000757-4
REP LEGAL	:	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	:	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	:	calle 42 21-79.
TELÉFONO	:	311 4226323
CORREO ELECTRÓNICO	:	interventoriaici.ltda@gmail.com
LOCALIZACIÓN	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FETCHER
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	:	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	17 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SEIS (6) MESES

RUBRO PRESUPUESTAL	:	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: \$76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023
CEPAA	:	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	:	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	:	16 DE ENERO DEL 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	33,33 %
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°1	:	NO SE COBRA ACTA PARCIAL EN EL PERÍODO
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	:	\$ 54.718.018,32

17. ACTAS DE LA INTERVENTORIA

En el presente período no se presenta Acta de Interventoría

18. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)	VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)
Cumplimiento	\$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2025
Salarios y Prestaciones sociales	\$ 7.000.770,00	17/07/2024	17/01/2028
Calidad del servicio	\$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2030

Se adjuntan pólizas iniciales (VER ANEXOS)

19. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 1261-2024.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.1261-2024.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente a calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos

para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

20. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

21. ACTAS DE COMITÉ O REUNION

Durante este periodo no se realizaron actas de seguimiento.

22. CORRESPONDENCIA ENVIADA

16/09/2024: 004-24: SOLICITUD INFORME TECNICO DE AVANCE, INFORME HSE Y AMBIENTAL CON SUS ANEXOS

23. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

17/08/2024: UT-CAS-05-24: ENTREGA PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL E INFORMES DE CONTRATO DE OBRA NO. 1261-24.

24. RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

N o.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JESSICA PAOLA FORERO AVILA	1.096.226.065	ING RESIDENTE

25. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de SETENTA MILLONES SIETE MIL SETESCIENTOS PESOS CON M/CTE (\$ 70.007.700,00) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

23.1. FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

- a. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- b. Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del distrito.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.


En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

26. RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha se ha presentado un cobro de interventoría, por el valor de \$ 15.289.681,68.
Durante el período no se cobró Acta.

27. CURVA DE AVANCE FISICO

PROGRAMADO VS EJECUTADO

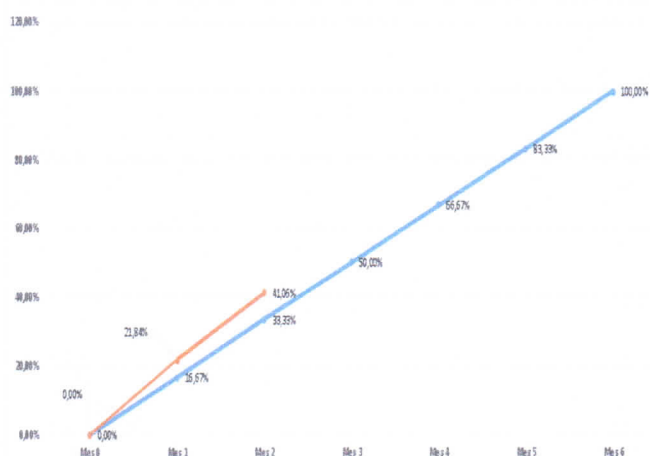

PROGRAMADO EJECUTADO

28. CONCLUSIONES

- Durante este segundo mes se presenta un avance físico del 41,06 % vs un programado del 33,33 %. Se presenta un avance a favor.
- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría.

JUAN PABLO CASTELLANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

29. ANEXOS

- Anexo 1: pago seguridad social interventoría
- Anexo 2: pago seguridad social contratista
- Anexo 3: bitácora de obra
- Anexo 4: oficios enviados y recibidos
- Anexo 5: anexos HSE contratista

- Anexo 1: pago de seguridad social interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CIUDADANO/MUNICIPIO	NIT: 83000757	NÚMERO PLANILLA: 794215927	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BARRANCA BERMÉJIA	DEPARTAMENTO: SANTANDER	PERIODO AÑO: 2024	MES: septiembre
CALLE 42-21-79 BARRANCA BERMÉJIA	BL/MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 3
TIPO EMPLEADOR: PRIVADA	CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA		
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO	ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES E INGENIERIA Y OTRAS		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		SOLIDARIDAD		COTIZACIÓN		MORA	
CÓDIGO	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR
23501	23501-PORVENIR	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 500
SUBTOTAL:								\$ 208.000	\$ 500

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR
EP502	EP502-SALUD TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 200
SUBTOTAL:								\$ 200	\$ 200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR
HL11	HL11-ARL SURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 200
SUBTOTAL:								\$ 200	\$ 200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD RP		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR
ECF36	ECF36-CAFABA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 200
SUBTOTAL:								\$ 200	\$ 200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL					PENSION				
VOLUNTARIOS		FSP		SOLIDARIDAD		COTIZACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR
23501	23501-PORVENIR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 500
SUBTOTAL:								\$ 500	\$ 500

TOTAL \$ 369.700

- Anexo 2: pago de seguridad social contratista.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90181914-9	3	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 66 28 43	BARROQUICERMEJA-SANTANDER	3175994534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2024-08	2024-09	27636-664	9407153688	E	2024/09/11	2024/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	2		\$11,527,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte						
1	CC 15463121	ANGARITA SANCHEZ EDWIN ENRIQUE	220301	17	\$738,667	\$117,900	EP3037	17	\$738,667	\$92,100	CF38	17	\$738,667	\$29,500	14-1	17	\$738,667	\$91,300	17	\$738,667	\$37,800						
2	CC 91136461	AROLA BENAVIDES ELIBERTO	220301	17	\$738,667	\$117,900	EP3037	17	\$738,667	\$92,100	CF38	17	\$738,667	\$29,500	14-1	17	\$738,667	\$91,300	17	\$738,667	\$37,800						
3	CC 1098780036	ARBON DURAN ELIO	220301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP3037	29	\$1,256,667	\$157,100	CF38	29	\$1,256,667	\$50,200	14-1	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$1,256,667	\$43,000						
4	CC 1005259966	BONILLA HERNANDEZ ALEJETH NATALIA	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
5	CC 63507075	CAMARGO CAMACHO ZILMA MARIA	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	MAN002	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
6	CC 91405837	JAMES RALA	220301	1	\$43,334	\$7,000	EP3037	1	\$43,334	\$5,500	CF38	1	\$43,334	\$1,800	14-1	1	\$43,334	\$3,100	1	\$43,334	\$2,300						
7	CC 85164846	LOBO GUERRA ELIUN MARCELO	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EP3041	29	\$1,256,667	\$157,100	CF38	29	\$1,256,667	\$50,200	14-1	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$1,256,667	\$43,000						
8	CC 1098712774	MARTINEZ PLATA JANE HERNAN	220301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP3037	30	\$3,000,000	\$375,000	CF38	30	\$3,000,000	\$120,000	14-1	30	\$3,000,000	\$708,000	30	\$3,000,000	\$150,000						
9	CC 11807247	MAVO SALAS MORALES	220301	1	\$43,334	\$7,000	EP3037	1	\$43,334	\$5,500	CF38	1	\$43,334	\$1,800	14-1	1	\$43,334	\$3,100	1	\$43,334	\$2,300						
10	CC 1098627894	OLIVEROS FRANCO ALEJETH MARCELA	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3006	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
11	CC 91407287	PEREZ CARRASCOLO ONOFRE	25-14	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3041	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
12	CC 1008179335	PINTO GONZALEZ LUIS MIGUEL	220301	17	\$738,667	\$117,900	EP3037	17	\$738,667	\$92,100	CF38	17	\$738,667	\$29,500	14-1	17	\$738,667	\$91,300	17	\$738,667	\$37,800						
13	CC 91489847	ROJAS VARGAS FADIAN MAURICIO	220201	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3017	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
14	CC 10903175	SEGURA LUNA ALDER ENRIQUE	220201	29	\$1,256,667	\$201,100	EP3037	29	\$1,256,667	\$157,100	CF38	29	\$1,256,667	\$50,200	14-1	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$1,256,667	\$43,000						
15	CC 1162327771	SESA JAMES JACIN FREDY	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
16	CC 1099373820	SUAREZ GARCIA JACIN JACIN	220301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP3037	29	\$1,256,667	\$157,100	CF38	29	\$1,256,667	\$50,200	14-1	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$1,256,667	\$43,000						
17	CC 13850736	VALDERAMA ALARCON JHON HENRI	25-14	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3006	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
18	CC 1096192986	VALDIVIESO MAJOL CAMILO	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
19	CC 1118826262	VEGA ANGARTIA ENRIQUE JESUS	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
20	CC 1096395115	VEGA RUIZ MARIEE ROSANA	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
21	CC 1162722733	VEGA MAJOL SERGIO ANDRES	220301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP3037	29	\$1,256,667	\$157,100	CF38	29	\$1,256,667	\$50,200	14-1	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$1,256,667	\$43,000						
22	CC 88320706	VERGEL PEREZ ELIUN FAJANO	220301	20	\$1,300,000	\$208,000	EP3046	20	\$1,300,000	\$162,500	CF38	20	\$1,300,000	\$52,000	14-1	20	\$1,300,000	\$90,500	20	\$1,300,000	\$45,000						
Total				\$25,880,004				\$4,141,200				\$25,880,004				\$3,225,200				\$25,880,004				\$1,035,600			
Afiados(22)				\$25,880,004				\$4,141,200				\$25,880,004				\$3,225,200				\$25,880,004				\$1,035,600			

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
ARP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	\$4,141,200	\$6,300	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$617,100	\$1,000	\$0
FORREXIR	230301	800,224,808	8	16	\$2,907,000	\$4,300	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$617,100	\$1,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,801,900	\$2,700	\$0
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	\$1,801,900	\$2,700	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,035,600	\$1,600	\$0
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	22	\$1,035,600	\$1,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	\$3,235,300	\$5,000	\$0
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$300	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$162,500	\$300	\$0
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	15	\$2,103,200	\$3,100	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$319,600	\$500	\$0
SALUD MIA EPS	EP5046	900,914,254	1	1	\$162,500	\$300	\$0
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$325,000	\$500	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$777,400	\$1,200	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PALCBF	899,999,239	2	22	\$777,400	\$1,200	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$518,200	\$800	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$518,200	\$800	\$0
TOTAL				22	\$11,509,600	\$17,600	\$0
							\$11,527,200

- Anexo 3: bitácora de obra

Se realizó relleno con arena y material proveniente de excavación.
Se inició apique para construcción de Cop Ventosa #2
Se funde muest de cop de Paga #2

prime yf. J. H. T. H.

17 Agosto 2024

Se realizó excavación manual para instalación de tubería D=4" desde K1+680 hasta K1+720.
Se realizó relleno con arena y material proveniente de excavación.

prime yf. J. H. T. H.

20 Agosto 2024

Se realizó excavación manual para instalación de tubería D=4" desde K1+720 hasta K1+800.
Se continuó con relleno y formateo manual.
Se realizó construcción de cop de Paga #3

prime yf. J. H. T. H.

21 Agosto 2024

Se realizó excavación manual para instalación de tubería D=4" desde K1+800 hasta K1+900.
Se realizaron relleno con arena y material proveniente de excavación.
Se continuó con construcción de cop de Paga #3.

prime yf. J. H. T. H.

22 Agosto 2024

Se continuó con formateo y relleno manual.
Se instaló tubería de D=4" desde K1+900 hasta K1+986.

prime yf. J. H. T. H.

23 Agosto 2024

Se continuó con excavación manual para la

24 Agosto 2024
 Se continúa con instalación de tubería Dn=4 desde K1+986 hasta K2+090.
 Se instala accesorio válvula #2 de corte dn=4 en K2+090.
 Se instala accesorio Redución 4x3 HD en K2+090.
 Se realiza relleno con arena y material proveniente de excavación.

24 Agosto 2024
 Se realiza relleno con arena y material proveniente de excavación.
 Se continúa con construcción de caja Ventosa #6.

26 Agosto 2024
 Se continúa con instalación de tubería Dn=3"
 Se realiza excavación manual para instalación de tubería.
 Se procede relleno con arena y material proveniente de excavación.
 Accesorios: Tee HD 70x4" = 1UN
 Uniones HD 70" = 2UN
 Union HD 4" = 1UN
 Esto ocurrencia se coordina a través de personal de la empresa de Manufactura para el corte del liguro.

27 Agosto 2024
 Se continúa con excavación manual para instalación de tubería Dn=3" desde K2+360 a K2+430.
 Se procede a la colocación de Faso de Caja Ventosa #2.
 Se realiza relleno con arena y material proveniente de excavación.

28 Agosto 2024
 Se continúa con excavación manual para instalación de tubería Dn=4" en K0+003.
 Se instala válvula HD Dn=4" en K0+003.
 Se funda muros de Caja Ventosa HD Dn=4" #1.

010

Se realiza desmoldado y vaciado manual sobre formado
Se aplican rellenos en arena y material fino de excava-
ción

Jaime H.

29 Agosto 2024

Se continúa excavación manual para instalación de
tubería DN=3" desde K2+480 a K2+506
Se continúa con colocación y reblandec.
Se realiza desmoldado y vaciado manual sobre formado
Se realiza relleno en arena y material proveniente de
excavación

Jaime H.

30 Agosto 2024

Se continúa con excavación manual para instalación de
tubería DN=3" desde K2+506 a K2+529
Se realiza relleno en arena y material proveniente de
excavación

Jaime H.

02 Septiembre 2024

Se continúa con desmoldado manual y vaciado sobre la
Se continúa con la instalación de tubería DN=3"
Se realizan rellenos con arena y material proveniente
de excavación

Jaime H.

03 Septiembre 2024

Se continúa con la excavación manual para instala-
ción de tubería de DN=3" desde K2+529 hasta K2
Se realizan rellenos con arena y material proveniente
de excavación

Jaime H.

04 Septiembre 2024

Se continua excavación manual para la instalación de tubería DN=3"

Se realizan rellenos con arena y material proveniente de excavación

Jaime M.

05 Septiembre 2024

Se realiza empalme en red principal Kotaco aguas de instalación de Tce 10x4 HD.

Se realiza empalme de Collium 10x4 para sistema de Ventosa #1

Jaime M.

06 Septiembre 2024

Se continúa con excavación manual para instalación de tubería DN=3"

Se realizan rellenos con arena y material proveniente de excavación

Jaime M.

07 Septiembre 2024

Se procede con la instalación de Tubería Ventosa #1 en abs Kotaco.

Jaime M.

09 Septiembre 2024

Se continúa con la instalación de tubería de DN=3"

en el fozado existente

Se continúa con demolición manual sobre fozado de coleccion rellenos con arena y material procedente de excavación.

Jaime M.

10 Septiembre 2024

Se continúa con excavación manual para la instalación de tubería DN=3"

Se realiza relleno con arena y material proveniente

de excavación.

Jaime M.

11 Septiembre 2024

Se continúa con excavación manual para instalación de tubería DN=3"

Se realiza relleno de fibra con arena y material para

de excavación.

Jaime M.

12 Septiembre 2024

Se continúa con excavación manual para instalación de tubería DN=3"

Se realiza relleno con arena y material para

de excavación.

Jaime M.

13 Septiembre 2024

Se continúa con demolición y relleno manual.

Se realiza excavación manual para instalación de fibra en DN=3"

Se realiza relleno con arena y material proveniente de excavación.

Jaime M.

16 Septiembre 2024

Se realiza excavación manual para instalación de fibra en DN=3"

Se continúa con relleno de arena y material para

de excavación.

Jaime M.

17 Septiembre 2024

Se continúa con excavación manual para instalación de fibra

Se realiza relleno con arena y material proveniente de

Jaime M.

- Anexo 4: oficios enviados y recibidos

Barrancabermeja, 6 de agosto del 2024

002-24

Señores

UT LINEA CASCAJERA.
ZULMA MILENA CAMARGO
CAPACHO

Ciudad,


Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEDIA
SANTANDER.

Asunto: solicitud seguridad social

Cordialmente,

Se solicita el pago de la seguridad social de los trabajadores, y personal mínimo del contrato
No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEDIA,
SANTANDER, del mes de julio del 2024.

Atentamente,



JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN
Representante legal.

Recibido: f/km lbgc/
06/08/24

Barrancabermeja, 16 de agosto del 2024

003-24

Señores

UT LINEA CASCAJERA.
ZULMA MILENA CAMARGO
CAPACHO

Ciudad,

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEDIA
SANTANDER.

Asunto: SOLICITUD INFORME TECNICO DE AVANCE, INFORME HSE
Y AMBIENTAL CON SUS ANEXOS

Cordialmente,

Se solicita informe técnico de avance de obra, del periodo comprendido entre el 17 de julio
del 2024 al 16 de agosto del 2024, igualmente el informe de actividades ejecutadas de
seguridad y salud en el trabajo y ambiental junto con sus anexos.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ

C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN

Representante legal.

Recibido
16/08/24

Barrancabermeja, 16 de septiembre del 2024

004-24

Señores

UT LINEA CASCAJERA.

ZULMA MILENA CAMARGO

CAPACHO

Ciudad,

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

Asunto: SOLICITUD INFORME TECNICO DE AVANCE, INFORME HSE Y AMBIENTAL CON SUS ANEXOS

Cordialmente,

Se solicita la siguiente documentación:

- 1) pago de la seguridad social de los trabajadores, y personal mínimo del contrato No. 1261-24
- 2) informe técnico de avance de obra, del periodo comprendido entre el 17 de agosto del 2024 al 16 de septiembre del 2024, igualmente el informe de actividades ejecutadas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental junto con sus anexos.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN
Representante legal.

Recibido: Jorge Molina
16-Sep-2024



Barrancabermeja 17 de Agosto de 2024

UT-CAS-05-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja


REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega pago planilla seguridad social e informes de Contrato de obra No. 1261-24

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No. 1261-24 se permite realizar entrega informe técnico y HSE junto a sus anexos. Del mismo modo, soporte de la seguridad social correspondiente al personal que laboró para el contrato en referencia durante el mes de julio del 2024.

Atentamente,


ZULMA MILENA CAMACHO
Representante legal

Anexo 5: anexo hse contratista

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-F-33
VERSION: 2
PAGINA: 1

LUGAR: Alcaldia Caxapita
PERIODO: DEL 19-08 AL 29-08 DE 2014
CONTRATO: 3264-24

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS																
		3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)																
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas																
Barras	Estado general																
Pisones	Base, altura																
Palanques	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes																
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remiendos), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)																
Punzon	Recto, adecuado																
Martillos, portes	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas																
Serruchos	Mango (ajuste, quebrado)																
Macetas	Mango, filo, instalación																
Carrutillas	Mango, filo, funda																
Alcancas	Armazon (fuerte y recto), velds, llanta, mangos, ruedas (aseguradas al armazon)																
Destornilladores	Aislamiento, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas																
Resacas	Mango (fondo suelto), punta (desgastado), doblado																
Cuchillos	Estado fisico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro																
Extensores	Guardas, mangos, fundas																
Limas	Tornes, estado de cables																
Tijeras	Cabo cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																
Llaves (tubo, expansivas)	Estado general																
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)																
Cortafusos	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)																
Cables hidráulicos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																
Tarrazas	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)																
Basculadoras	Dados, dientes																
Diferenciales	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, pifon																
Poleas	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte																
Cizalla	Rodamiento y engranaje																
Porcheadores	Ajuste y filo de cuchilla																
Leas:	Ajuste hidráulico																
Otro:	Deschuchaduras, cortes, desgastes, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas																

OBSERVACIONES:

Natalia Bonilla
Firma quien realiza la inspección

UT
Código de
línea

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-F-33
VERSION: 2
PAGINA: 1

CONTRATO: 2261-24

LUGAR: GUAYMA GUAYMA
PERIODO: DEL 26-08 AL 31-08 DE 2021

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Palas	Mango (ajuste, quebrado, sellado, flojo) pala (rota)	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Picaz	Mango (ajuste, quebrado, sellado, flojo), puntas desgastadas	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barras	Estado general	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pisones	Base, altura																
Paladras	Mangos (ajuste, quebrado, sellado, flojo), resortes, ejes																
Cincelos, punteros	Estado (fisuras, remendos), afilados, sin cabeza tipo horngo (con rebaba)																
Punzon	Recto, adecuado																
Martillos, portes	Mango (ajuste, quebrado, sellado, flojo), caras, bordes, antichapas																
Serruchos	Mango, dientes (trabados)																
Sequetras	Mango, hoja, instalacion																
Machetes	Mango, filo, funda	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carretillas	Armazon (fuerte y recto), yalde, lanta, mangos, ruedas (asegurada al amazon)																
Alicates	Aislamiento, mandibulas no eritriticas correctamente, metlas, estrías desgastadas																
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado																
Resacas	Estado fisico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro																
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas																
Extensores	Tomos, estado de cables																
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remendos)	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tijeras	Estado general																
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remendos), dientes (desgastados)																
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remendos), aristas (desgastadas)																
Cortabombos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), tujas (soltas)																
Tarrajes	Dados, dientes																
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, pñon																
Diferenciales	Pin de fuerza, estado de las tuercas y cadena, soporte																
Poleas	Rodamiento y engranaje																
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																
Punchadora	Ajuste hidráulico																
Leaos:	Deschuchaduras, cortes, desgarras, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas																
Otros:																	

OBSERVACIONES:

notable b. villa
Firma quien realiza la inspección

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-F-33
VERSION: 2
PAGINA: 1

LUGAR: ALBERTO CAJOPIPO

CONTRATO: 226-24

PERIODO : DEL 02-04 AL 04-04 DE 2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)																
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas																
Barra	Estado general																
Picarones	Base, altura																
Palaclayras	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, etc																
Cincoles, punteros	Estado (fisuras, remendado), alillados sin cabeza tipo hongo (con rebaba)																
Punzon	Recto, adecuado																
Martillos, portas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichapas																
Serruchos	Mango, dientes (trabados)																
Saqueles	Marco, hoja, instalación																
Machetes	Mango, filo, funda																
Carrillitas	Amazon (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al amazon)																
Alcates	Astamamiento, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas																
Desarmilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado																
Razaches	Estado fletco de los dedos, funcionamiento de mecanismo de giro																
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas																
Extensores	Tomos, estado de cables																
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																
Tijeras	Estado general																
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)																
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)																
Contrabucos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)																
Tarjetas	Dados, dientes																
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, pihon																
Diferenciadas	Pin de fuerza, estado de las tuercas y cadena, soporte																
Portas	Rodamiento y engranaje																
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																
Portachapas	Ajuste hidráulico																
Lazos	Deschachaduras, cortes, desgarras, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas																
Otros:																	

OBSERVACIONES:

NATALIA BORTILA
Firma quien realiza la inspección

UT Cascajara

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-F-33
VERSION: 2
PAGINA: 1

LUGAR: QUEVEDO CAYAPA

PERIODO : DEL 09-04 AL 13-04 DE 2024

CONTRATO: 3263-24

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

REVISION O CONDICIONES INSEGURAS

HERRAMIENTA	MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DICI		TOTAL	
	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Pallas																						
Picas																						
Barras																						
Pisones																						
Pedestales																						
Cincoles, punteros																						
Purzon																						
Martillos, porras																						
Serruchos																						
Seguetas																						
Machetes																						
Carretillas																						
Alicates																						
Destornilladores																						
Resaches																						
Cuchillos																						
Extensiones																						
Limas																						
Tijeras																						
Llaves (tubo, expansivas)																						
Llaves fijas, de golpe																						
Contatuos																						
Gatos hidráulicos																						
Tanques																						
Basidadoras																						
Diferenciales																						
Poleas																						
Cizalla																						
Ponchadora																						
Lisos:																						
Otros																						

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Natalio Bonilla



**"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

ANEXO 2. INSPECCIONES DE OBRA E HIGIENE Y SEGURIDAD



UT Línea	INSPECCIONES DE OBRA	CODIGO:	HSE-F-31
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

Fecha de Inspección 26 / 09 / 24 Inspección No. 3
 Proyecto: Acueducto Vereda la Cascajera
 Zona y/o cuadrilla a Inspeccionar obra acueducto
 Nombre Inspector Natalia B

CONDICIONES A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
1. SEGURIDAD				
Disponibilidad de espacio	X			
Estado de los pisos es buen estado	X			
Almacenamiento de productos correctamente	X			
Orden y aseo en el sitio de trabajo	X			
Extintores suficientes y adecuados	X			
Utilización de E.P.P de acuerdo con el factor de riesgo	X			
Botiquín de primeros auxilios	X			
Salidas de emergencia	X			
Existe procedimientos para el desempeño de las labores	X			
Se expiden permisos de trabajo	X			
El trabajador posee la capacitación idónea.	X			
2. QUÍMICAS				
Productos químicos con etiquetas y rotulos adecuados	X			
Vehiculos con rotulacion adecuada	X			
Gases comprimidos asegurados			X	
Fichas técnicas de seguridad	X			
3. FÍSICAS				
Exposición a ruido con proteccion	X			
Exposición a temperaturas extremas (frío o calor)	X			
Iluminación en el puesto de trabajo adecuada			X	
4. MEDIO AMBIENTE				
Servicios sanitarios	X			
kít para control de derrames	X			
Recipientes para disposicion de residuos industriales	X			
Comportamiento seguro frente ha hse	X			
Observaciones:				
Firma: <u>Natalia Bontita</u>				

UT Línea Cascajera	INSPECCIONES DE OBRA	CODIGO:	HSE-F-31
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

Fecha de Inspección <u>09/09/24</u>		Inspección No. <u>4</u>		
Proyecto: <u>Acueducto Vereda la Cascajera</u>				
Zona y/o cuadrilla a Inspeccionar <u>Obra acueducto</u>				
Nombre Inspector <u>Natalia Bonilla</u>				
CONDICIONES A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
1. SEGURIDAD				
Disponibilidad de espacio	X			
Estado de los pisos es buen estado	X			
Almacenamiento de productos correctamente	X			
Orden y aseo en el sitio de trabajo	X			
Extintores suficientes y adecuados	X			
Utilización de E.P.P de acuerdo con el factor de riesgo	X			
Botiquín de primeros auxilios	X			
Salidas de emergencia	X			
Existe procedimientos para el desempeño de las labores	X			
Se expiden permisos de trabajo	X			
El trabajador posee la capacitación Idónea.	X			
2. QUÍMICAS				
Productos químicos con etiquetas y rotulos adecuados	X			
Vehículos con rotulación adecuada	X			
Gases comprimidos asegurados			X	
Fichas técnicas de seguridad	X			
3. FÍSICAS				
Exposición a ruido con protección	X			
Exposición a temperaturas extremas (frío o calor)	X			
Iluminación en el puesto de trabajo adecuada			X	
4. MEDIO AMBIENTE				
Servicios sanitarios	X			
Kit para control de derrames	X			
Recipientes para disposición de residuos industriales	X			
Comportamiento seguro frente ha hse	X			
Observaciones:				
Realizado: <u>Natalia Bonilla</u>				

	INSPECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD			CODIGO: HSE-F-31	
				VERSION: 1	
				PAGINA: 1	
AREA: Acueducto Vereda la Casajera					
FECHA DE INSPECCION: 28-08-2024					
INSPECTOR: Julieth Natalia Bontila					
PROYECTO: Construcción de la línea de agua potable					
CRITERIOS HA VERIFICAR		SI	NO	N/A	RECOMENDACIONES
LOCALES					
las señales de seguridad estén visibles y correctamente distribuidas		☒	☐	☐	
los extintores estén en su lugar de ubicación y visible		☒	☐	☐	
el sistema de iluminación esté mantenido de forma eficiente y limpia		☒	☐	☐	
espacios desorganizados y atestados		☒	☐	☐	
PASILLOS Y SUELOS					
los pasillos y zonas de tránsito estén libres de obstáculos		☒	☐	☐	
los suelos estén limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario		☒	☐	☐	
ALMACENAJE					
las áreas de almacenamiento de materiales estén señalizadas		☒	☐	☐	
los materiales estén apilados en su sitio sin invadir zonas de paso		☒	☐	☐	
los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada		☒	☐	☐	
cosas innecesarias guardadas		☒	☐	☐	
estantes sobrecargados		☐	☒	☐	
lugares de almacenamiento sucios		☐	☒	☐	
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
se encuentran limpios y libres de todo material innecesario		☒	☐	☐	
se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceite y grasas		☒	☐	☐	
poseen los dispositivos de seguridad en funcionamiento		☒	☐	☐	
RESIDUOS					
los contenedores estén accesibles a los lugares de trabajo		☒	☐	☐	
existan los medios de limpieza a disposición del personal de área		☒	☐	☐	
se evita el reboso de los contenedores		☒	☐	☐	
falta de recipientes adecuados para basura		☒	☐	☐	
rincones con basura		☐	☒	☐	
existe kit para derrames de líquidos		☒	☐	☐	
PERSONAL					
usan los elementos de protección personal		☒	☐	☐	
limpieza de los lugares de trabajo		☒	☐	☐	
conocen los riesgos a los que están expuestos		☒	☐	☐	
conocen las rutas de evacuación		☒	☐	☐	
conocen la política de HSEQ		☒	☐	☐	
previenen la contaminación en la realización de las actividades		☒	☐	☐	
realizan trabajo con actos seguros		☒	☐	☐	
AREA EN GENERAL					
hay permisos de trabajo en los frentes		☒	☐	☐	
está el inspector de seguridad en los frentes de trabajo		☒	☐	☐	
no se efectúan derrames de combustible		☐	☒	☐	
existe extintor en el área		☒	☐	☐	
suministro de agua potable		☒	☐	☐	
avisos de señalización		☒	☐	☐	
HERRAMIENTAS					
se guardan limpias de aceite y grasa		☒	☐	☐	
las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado		☒	☐	☐	
están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas.		☒	☐	☐	
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE INSPECCION		Natalia B.			
		VoBo			

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD			CODIGO:	HSE-F-21
				VERSION:	1
				PAGINA:	1

AREA: <u>Anexo Vereda la Cascajera</u>					
FECHA DE INSPECCION: <u>03/09/2024</u>					
INSPECTOR: <u>Willem Natalia Bonilla H</u>					
PROYECTO: <u>Construcción de la línea de agua potable.</u>					
CRITERIOS HA VERIFICAR	SI	NO	N.A	RECOMENDACIONES	
LOCALES					
las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	X				
los extintores están en su lugar de ubicación y visible	X				
el sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia	X				
espacios desorganizados y atestados	X				
PASILLOS Y SUELOS					
los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	X				
los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario	X				
ALMACENAJE					
las áreas de almacenamiento de materiales están señalizadas	X				
los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso	X				
los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada	X				
cosas innecesarias guardadas	X				
estantes sobrecargados		X			
lugares de almacenamiento sucios		X			
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
se encuentran limpios y libres de todo material innecesario	X				
se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceite y grasas	X				
poseen los dispositivos de seguridad en funcionamiento	X				
RESIDUOS					
los contenedores están accesibles a los lugares de trabajo	X				
existen los medios de limpieza a disposición del personal de área	X				
se evita el reboso de los contenedores	X				
falta de recipientes adecuados para basura	X				
rincones con basura		X			
existe kit para derrames de líquidos	X				
PERSONAL					
usan los elementos de protección personal	X				
limpieza de los lugares de trabajo	X				
conocen los riesgos a los que están expuestos	X				
conocen las rutas de evacuación	X				
conocen la política de HSEQ	X				
previenen la contaminación en las realizaciones de las actividades	X				
realizan trabajo con actos seguros	X				
AREA EN GENERAL					
hay permisos de trabajo en los frentes	X				
está el inspector de seguridad en los frentes de trabajo	X				
no se efectúan derrames de combustible		X			
existe extintor en el área	X				
suministro de agua potable	X				
aviso de señalización	X				
HERRAMIENTAS					
se guardan limpias de aceite y grasa	X				
las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado	X				
están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas.	X				
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE INSPECCION <u>Natalia Bonilla</u> VoBo _____					

UT Linea Cascajera	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CODIGO:	HSE-F-17
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: aeropuerto Cascajera
ENCARGADO DE INSPECCIÓN: Julieth Natalia Bonilla M.
FECHA: 13-05-2014

CONDICIONES A EVALUAR	CRITERIO		LUGAR	TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES
	S	NO			
Están limpias y ordenadas todas las áreas de trabajo?	X				
Hay basura o líquidos derramados en el suelo?	X				
Están los pasillos o sala de evacuación libres de cajas, contenedores de basura, sillas u otros obstáculos que puedan impedir el tráfico?	X				
Están los cables en lugar seguro para evitar que alguien se pueda tropezar o enredar?	X				
Se encuentran los contenedores oficina y almacenes limpios y ordenados?	X				
Están todas las herramientas y equipo siendo utilizados por los empleados en sus áreas de trabajo en buenas condiciones?	X				
Se encuentra el termo con agua y los vasos desechables en un lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores?	X				
Hay disposición alguna de recipientes para los desechos?	X				
Se encuentran en buen estado higiénico los sanitarios, baños, comedores y fuentes de agua potable disponibles para los empleados?	X				
En bodega los elementos están ordenados, debidamente rotulados, ubicados en estantes apropiados?	X				
Se tiene adecuada señalización en las diferentes áreas, la papelería nueva y de reciclaje está bien organizada?	X				
Se observa o se siente la presencia de polvos en el sitio (recintos cerrados-oficina)?	X				

TIPO DE ACCIÓN (A) INMEDIATA (30 días), (B) PRONTA (15 días), (C) POSTERIOR (30 días)

OBSERVACIONES GENERALES:					
No	SEGUIMIENTO	FECHA	RESPONSABLES	ESTADO	OBSERVACIONES

Natalia Bonilla M.
 FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN



***"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER"***

ANEXO 3. INSPECCIÓN DE EPP



CODIGO	MSE-A-19
VERSION	1
PAGINA	1

line:
in

PROYECTO Construcción de la línea de conducción y red de distribución de gases foliar "Coxajera"

[illegible]

Q: Now as to the A's doing an exercise in its (B) equity:

RESERVACIONES:

Wobalia Bantla

CARGO AMBIKOR ITSE.

**INSPECCION DE ELEMENTO DE PROTECCION
PERSONAL**

UT
Linea

CODENO	MSF-A-10
VERSION	1
PAGINA	1

PROYECTO (CON)STRUCCIÓN DE O LINEA DE CONSTRUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "CAYAMA"

[illegible]

quons en la ley a lo que se dispone en la ley segun

OBSERVACIONES:

SENDO NABAHIA B



***"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER"***

ANEXO 4. REPOSICIÓN DE EPP



UT Caceres
Linea

REPOSICION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO: H884-30
VERSION: 1
PAGINA: 1

PROYECTO: Construcción de la línea de conducción y red de distribución de agua potable

No	NOMBRE	CARGO	FECHA	CANTIDAD																					TOTAL
				CAJAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	NOTAS DE SEGURIDAD	
1	elberto ardila	obrero	28/08/24																						
2	Camilo M.	obrero	28/08/24																						
3	Onofre Perez	obrero	28/08/24																						
4	John Sica	obrero	28/08/24																						
5	Camilo M.	obrero	28/08/24																						
6	Onofre Perez	obrero	28/08/24																						
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									

UT Cuacajalán Línea		REPOSICION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL			FORMA: 1
		CODIGO: 1000-7-02	VERSION: 1	PAGINA: 1	

PROYECTO: Construcción de la línea de conducción y red de distribución de agua potable

Nº	NOMBRE	CARGO	FECHA	CANTIDAD																						FIRMA
				CASO DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	NOTAS DE RESERVA	
1	Jaiden Segura	obrero	10/08/24																							<i>Jaiden Segura</i>
2	Elkin Garcia	obrero	10/08/24																							<i>Elkin Garcia</i>
3	Onofre Perez	obrero	11/08/24																							<i>Onofre Perez</i>
4	Sergio Vega	obrero	11/08/24																							<i>Sergio Vega</i>
5	Jhon Jara	obrero	11/08/24																							<i>Jhon Jara</i>
6	Budy Arenas	obrero	12/08/24																							<i>Budy Arenas</i>
7	Jhon Sierra	obrero	22/08/24																							<i>Jhon Sierra</i>
8	Jaiden Segura	obrero	21/08/24																							<i>Jaiden Segura</i>
9	Budy Arenas	obrero	21/08/24																							<i>Budy Arenas</i>
10	Jhon Sierra	obrero	21/08/24																							<i>Jhon Sierra</i>
11	Onofre Perez	obrero	22/08/24																							<i>Onofre Perez</i>
12	Luis Pinto	obrero	22/08/24																							<i>Luis Pinto</i>
13																										
14																										



**"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

ANEXO 5. INDUCCIONES Y CHARLAS DIARIAS



UT Linea	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 11/08/2024	Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla H.	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:30
Temas: Charla Sobre Riesgo biológico	Obra: acueducto coxajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	9142783	obrero	Onofre Perez
2. Jhon Siza	110238771	obrero	J. Siza
3. Camilo Valdivia	1096192985	obrero	Camilo Valdivia
4. Sergio Vega	1102722733	obrero	Sergio
5. Ekin lobo aerra	85166845	obrero	Ekin
6. Luis miguel P.	1003179335	obrero	Luis
7. Edwin Enrique	15452121	obrero	Edwin
8. Aliberto ardia	91136061	obrero	Aliberto
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 9	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 20-08-2024		Lugar:
Expositor: Julietth Natalia Bonilla It		Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 1:25
Temas: Charla Sobre Riesgo Psicológico		Obra: anexo cascojero

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Eder Arenis	109838026	obrero	Eder Arenis
2. Onofre Perez	9142783	obrero	Onofre Perez
3. Jaider Segura	10903175	obrero	Jaider Segura
4. Sergio Vega	1102722733	obrero	Sergio Vega
5. Jhon Jairo Suarez	1094313826	obrero	Jhon Jairo
6. Ramiro Valdivieso	1096792886	obrero	Ramiro
7. Edwin Enrique	15452121	obrero	Edwin Enrique
8. Luis Miguel Pinto	1005779335	obrero	Luis Miguel Pinto
9. Eliberto Arévalo	91136061	obrero	Eliberto Arévalo
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 9	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

UT Linea	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 21/08/2024		Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla H		Hora Inicio: 7:15 Hora Final: 7:45
Temas: Charla Sobre Riesgo ergonomico.		Obra: adeducto cascadera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Enche Perez	9141787	obrero	Enche Perez
2. Jaida Segura	10903175	obrero	Jaida Segura
3. Sergio Vega	1102722733	obrero	Sergio Vega
4. Eliberto Ardila	91136061	obrero	Eliberto Ardila
5. Edgar Enrique	15452721	obrero	Edgar Enrique
6. Camilo Vilduiro	1096792886	obrero	Camilo Vilduiro
7. Luis miguel Pinto	1005799335	obrero	Luis miguel Pinto
8. Jhonairo Suarez	1094373826	obrero	Jhonairo Suarez
9. Jhon F. Sierra	1102387771	obrero	Jhon F. Sierra
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 9	Firma del Expositor (es): Natalia
Conclusiones:	

UT Linea	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: G.F-1
		VERSION:
		PAGINA:

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 22/10/2024	Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla H.	Hora Inicio: 7:10 Hora Final: 3:35
Temas: Riesgo ergonomico posturas inadecuadas	Obra: acueducto carajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	9142787	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Jander Segura	10903175	obrero	Jander Segura
3. Camilo Valdivia	1096192886	obrero	Camilo
4. Eudy Arenis	1098788036	obrero	EUDY A.
5. Jhon Siza	1702387777	obrero	J.F. Siza
6. Jhon Jairo Saret	1094373826	obrero	Jhon Jairo
7. Edwin Anganta	15452121	obrero	Edwin
8. Eliberto Ardila	91136081	obrero	Eliberto
9. Sergio Vega	1102722933	obrero	Sergio
10. Luis Miguel Anio	1005179335	obrero	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 10 Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla

Conclusiones:

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re Inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	Cual?				
Fecha: 23/08/2024			Lugar:		
Expositor: Lidian Natalia Bonilla			Hora Inicio: 7:00	Hora Final: 7:30	
Temas: Realización de pausas activas			Obra: 90 metros carrizos		
PARTICIPANTES					
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA		
1. Onofre Perez	9142787	obrero			
2. Edwin Angulo	15482121	obrero			
3. Camilo Valdivia	1046192886	obrero			
4. Jhon Siza	1102387771	obrero			
5. Sergio Vega	1102722733	obrero			
6. Jhonairo Suarez	1094373826	obrero			
7. Eudy Arenis	1098788036	obrero			
8. Luis Miguel Arto	1005779335	obrero			
9. Elberto Ardila	91136061	obrero			
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
Número Total de Participantes: 10		Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla			
Conclusiones:					

UT Línea Casajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 24/08/2024		Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla		Hora Inicio: 7:05 Hora Final: 7:35
Temas: Charla Consecuencia Visual		Obra: conductor casajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	9142187	obrero	Onofre Perez
2. Camilo Laiduego	1096192886	obrero	Camilo Laiduego
3. Edwin Angarita	15452121	obrero	Edwin Angarita
4. Jhon Freddy Soto	1102387771	obrero	J.F. Soto
5. Sergio Vega	1102722733	obrero	Sergio Vega
6. Jhon Jairo Suarez	1094373826	obrero	Jhon Jairo Suarez
7. Eudy Arenis	1098788036	obrero	Eudy Arenis
8. Luis Miguel Pinto	100579335	obrero	Luis Miguel Pinto
9. Alberto Ardiola	91136061	obrero	Alberto Ardiola
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 10	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
--	--

Conclusiones:

UT Linea Cuacajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 26-08-2024	Lugar:
Expositor: Lisseth Natalia Bonilla	Hora Inicio: 7:30 Hora Final: 7:40
Temas: manejo de herramientas manuales	Obras: aseo de cuacajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	9142782	obrero	Onofre Perez
2. Jaider Segura	10903175	obrero	Jaider Segura
3. Camilo Urdinola	1096192880	obrero	Camilo Urdinola
4. Jhon Siza	110238771	obrero	Jhon Siza
5. Sergio Vega	1102722733	obrero	Sergio Vega
6. Jhon Jairo Lopez	1094373926	obrero	Jhon Jairo Lopez
7. Eudy Arenas	1098188036	obrero	Eudy Arenas
8. Euberto Ardila	91136067	obrero	Euberto Ardila
9. Edwin Anguita	75452121	obrero	Edwin Anguita
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 9	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 22/08/2014	Lugar:
Expositor: Jhon Atalla Bonilla	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:30
Temas: Charla de explicación de procedimientos operativos	Obra: acueducto Cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Sergio Vega	1102387771	obrero	Sergio
2. Onofre Perez	9142387	obrero	Onofre Perez
3. Eddy Arenas	1098788036	obrero	Eddy Arenas
4. Jhon Jairo Jairo	1094373826	obrero	Jhon Jairo
5. Luis Miguel Pinto	1005119335	obrero	Luis Miguel Pinto
6. Eliberto Ardila	91136061	obrero	Eliberto Ardila
7. Jaidier Segura	10903775	obrero	Jaidier Segura
8. Jhon Seta	1102387771	obrero	Jhon Seta
9. Camilo Velazquez	1096192800	obrero	Camilo Velazquez
10. Edwin Angarita	15452771	obrero	Edwin Angarita
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 11	Firma del Expositor (es): Jhon Atalla Bonilla
--	--

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 28/08/24		Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla		Hora Inicio: 7:30 Hora Final: 7:45
Temas: importancia del cuidado del medio ambiente.		Obra: audio cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	[Firma]
2. Amilo valderez	1096192986	obrero	[Firma]
3. Eddy Arenu	1048788036	obrero	[Firma]
4. Jhon Saino Suarez	1099393820	obrero	[Firma]
5. Jhon Pedro Sosa	1102337771	obrero	[Firma]
6. Luis miquel anto	1005779535	obrero	[Firma]
7. Eliberto Cardillo	91136061	obrero	[Firma]
8. Eddy Argente	15452121	obrero	[Firma]
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 8	Firma del Expositor (es): Julieth Bonilla
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 29/08/24	Lugar:
Expositor: Natalia Bonilla	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:30
Temas: Recolección y clasificación de residuos	Obra: acueducto casajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. OMAR PEREZ	91427387	obrero	OMAR PEREZ
2. JHON FREDDY SISA	1102387771	obrero	Jh F. Sisa
3. CAMILO VAIDILUEZO	1096192986	obrero	CAMILLO VAIDILUEZO
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
---	--

Conclusiones:

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☒
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 30/08/24	Lugar:
Expositor: Natalia Bonilla	Hora Inicio: 10:00 Hora Final: 12:35
Temas: charla informativa sobre el riesgo eléctrico	Obra: acueducto cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Juan Freddy Silva	1102387771	obrero	J.F. Silva
3. Camilo Valdivia	1096792986	obrero	CAMILIO VALDIVIA
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
----------------------------------	---

Conclusiones:

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 31/08/24	Lugar:
Expositor: Natalia Bonilla H	Hora Inicio: 7:20 Hora Final: 7:50
Temas: Charla Sobre el riesgo Químico, material particulado, polvos, gases	Obra: actividades casera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	Onofre Perez
2. Jhon Freddy Sica	7102387771	obrero	J.F. Sica
3. Camilo Velazquez	7096192986	obrero	Camilo Velazquez
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla H
---	--

Conclusiones:

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 02/09/24	Lugar:
Expositor: Julián Natalia Bonilla H.	Hora Inicio: 7:10 Hora Final: 7:45
Temas: Charla sobre identificación de peligros, evacuación y control de riesgos	Obra: acueducto Cascajera

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Oñofre Perez	91427389	obrero	Oñofre Perez
2. Camilo Valdivieso	1096192986	obrero	Camilo Valdivieso
3. John Fredy Sierra	4102387771	obrero	John Fredy Sierra
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expósito(r)es: Natalia Bonilla
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	☐	Charla Seguridad	☒	Charla Técnica	☐
Re inducción	☐	Inducción	☐	Reunión Informativa	☐
Otro	☐ Cual?				

Fecha: 03/09/24	Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:30
Temas: accidentes, incidentes y enfermería profesional	Obra: acaeduto Cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427382	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo Valdivia	1096192986	obrero	CAMILIO VALDIVIA
3. Jhon Freddy Sisa	1102387771	obrero	JHON FREDDY SISA
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	☐	Charla Seguridad	☒	Charla Técnica	☐
Re inducción	☐	Inducción	☐	Reunión Informativa	☐
Otro	☐	Cual?			

Fecha: 04/09/24	Lugar:
Expositor: Natalia Bonilla Hernandez	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:25
Temas: Charla sobre actos inseguros	Obra: acueducto cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91421382	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo Valdivieso	1096192986	obrero	Camilo Valdivieso
3. Jonh Freddy Silva	1102387771	obrero	Jonh Freddy Silva
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 05/09/24		Lugar:
Expositor: Wilber Valdeia Bontia H		Hora Inicio: 7:15 Hora Final: 4:45
Temas: Charla sobre Señalización		Obra: Circuito Cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Monfre Perez	91427382	obrero	MONFRE PEREZ
2. Camilo Valdivieso	1096192986	obrero	Camilo Valdivieso
3. John Freddy Sux	110238777	obrero	John Freddy Sux
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Wilber Valdeia Bontia
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 06/09/24	Lugar:
Expositor: Juleth Natalia Bonilla H.	Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:40
Temas: charla sobre riesgos mecánicos	Obra: acueducto cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Ocho Perez	91423387	obrero	OCHOPEPES
2. Camilo Valdivia	1096192986	obrero	Camilo Valdivia
3. John Freddy Sisa	1102387771	obrero	John Freddy Sisa
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

UT
Línea

FORMATO ASISTENCIA

CODIGO: GR-F-19
VERSION: 2
PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐ Charla Seguridad ☐ Charla Técnica ☐
Re inducción ☐ Inducción ☐ Reunión Informativa ☒
Otro ☐ Cual?

Fecha: 07-09-24 Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:25
Temas: Charla informativa, contenido y usos de elementos de botica y familia Obra: aseo de curajero

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	914273837	obrero	Onofre Perez
2. Camilo Celdrueso	1096792986	obrero	Camilo Celdrueso
3. Jhon Aedu Sosa	1102387771	obrero	Jhon Aedu Sosa
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3 Firma del Expositor (es): Julieth Natalia Bonilla

Conclusiones:

UT Línea	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☐
Re Inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☒
Otro ☐ Cual?		
Fecha: 09/09/24		Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla		Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 7:30
Temas: Charla Inspección y partes del extintor		Obra: acueducto casagaya

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	Onofre Perez
2. Camilo Valdivia	1046192986	obrero	Camilo Valdivia
3. Jhon Fredy Sosa	1102387771	obrero	Jhon Fredy Sosa
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
----------------------------------	---

Conclusiones:

UT Linea <i>Caxajera</i>	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☒
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐	Cual?	

Fecha: <i>10/09/24</i>	Lugar:
------------------------	--------

Expositor: <i>Wliah Natalia Bonilla</i>	Hora Inicio: <i>7:00</i>	Hora Final: <i>7:30</i>
---	--------------------------	-------------------------

Temas: <i>Sensibilización Orden y aseo en las áreas de trabajo</i>	Obra: <i>acueducto caxajera</i>
--	---------------------------------

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Pape	91427387	obrero	<i>[Firma]</i>
2. Camilo Ucidruoso	1096191986	obrero	<i>[Firma]</i>
3. John Freddy Silva	11623577-71	obrero	<i>[Firma]</i>
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: <i>3</i>	Firma del Expositor(es): <i>Natalia Bonilla</i>
---	---

Conclusiones:

UT Linea	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 11/09/24
 Lugar:

Expositor: Wilsh Natalia Bonilla

 Hora Inicio: 7:00
 Hora Final: 7:25

Temas: almacenamiento de sustancias químicas
 Obra: acueducto casajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91477387	obrero	[Firma]
2. Camilo Valduero	1096192986	obrero	[Firma]
3. John Freddy SUA.	1102387771	obrero	[Firma]
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3
 Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla

Conclusiones:

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☐	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 12/09/29	Lugar:
Expositor: Juleith Natalia Bonilla	Hora Inicio: 7:45 Hora Final: 7:26
Temas: Divulgación de fichas de seguridad (que es, para que sirve y su contenido)	Obra: acueducto cascajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91479387	Obrero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo Valdinesu	109692986	Obrero	CAMILLO M
3. Jhon Fredy Sir	102387771	Obrero	Jh. Fredy Sir
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 13/09/24	Lugar:
Expositor: Jilith Natalia Bonilla H.	Hora Inicio: Hora Final:
Temas: Divulgación folletos alusivos al cuidado y protección del medio ambiente	Obra: acueducto casajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo valdiviso	1096197986	obrero	CAMILLO M
3. Jhon fredy SUG	1102387771	obrero	Jhon Fredy SUG
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
---	--

Conclusiones:

	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 13/09/24	Lugar:
Expositor: Jilith Natalia Bonilla H.	Hora Inicio:
Temas: Divulgación falleres alusiva al cuidado y protección del medio ambiente	Hora Final:
Otra: acaeducto casajera	

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	obrero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo valdiviso	1096197986	obrero	CAMILLO M
3. Jhon fredy SUG	1102387771	obrero	Jhon Fredy SUG
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
---	--

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO: GR-F-19
		VERSION: 2
		PAGINA: 1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 14/09/24	Lugar:
------------------------	---------------

Expositor: Julieth Natalia Bonillo	Hora Inicio: 7:00	Hora Final: 7:25
---	--------------------------	-------------------------

Temas: Charla sobre estilos de vida saludable	Obra: arquitectura cascajera
--	-------------------------------------

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91427387	donero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo Valdineso	1096192986	donero	camilo Munez
3. Jhon f. Sise	1102387771	donero	Jhon F. Sise
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonillo
---	--

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento ☐	Charla Seguridad ☒	Charla Técnica ☐
Re inducción ☐	Inducción ☐	Reunión Informativa ☐
Otro ☐ Cual?		

Fecha: 16/09/24	Lugar:
Expositor: Julieth Natalia Bonilla	Hora Inicio: 7:10 Hora Final: 7:35
Temas: Charla sobre prevención consumo de alcohol, drogas y tabaquismo	Obra: acrílico casajera

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Onofre Perez	91422387	donero	ONOFRE PEREZ
2. Camilo Valdivieso	1096192986	donero	CAMILLO M. VALDIVIESO
3. Jhon Siso	1102387771	donero	Jhon T. Siso
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	Firma del Expositor (es): Natalia Bonilla
Conclusiones:	
