

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. II MES DE JUNIO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALIJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"	0			

ANEXO No. 5

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES DE JUNIO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONTRATO INTERVENTORIA No 4233000-730-2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONTRATO CONTRATISTA No 4233000-731-2019
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2020

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL- CALLE 11 SUR No 1 -60 ESTE



FOTO No 1: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el concreto de limpieza en la zapatas Z-4 ubicadas en el Eje 3 entre Ejes Q-R.



FOTO No 2: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 continúe con la instalación de malla de puesta a tierra subestación con 4 varillas coperweld 5/8" X 2.44 mts, cámaras de inspección 30X30 CM, 54 mts de cable cobre 2/0 desnudo, 8 soldaduras cable varilla y 4 cable-cable correspondiente a la actividad eléctrica del ítems 3.6.0.15.



FOTO No 3: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice relleno en recebo B400 en áreas intervenidas para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación) del área de producción revisa y verifica la compactación mecánica mediante el equipo RANA.



FOTO No 4: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice corte y figurado de acero de refuerzo de 6000 PSI en las zapatas Z-4 Eje 3P y zapata Z-6 Eje 3 Q.



FOTO No 5: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice amarre de acero de refuerzo de 6000 PSI en las zapatas Z-4 Eje 3 P y zapata Z-6 Eje 3 Q ubicadas en el área de producción.



FOTO No 6: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice perforaciones para anclajes de vigas aéreas VG-3, revisa y verifica la profundidad de las perforaciones la cual debe cumplir lo exigido en planos de diseño RE-23.



FOTO No 7: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice amarre de acero de refuerzo de 6000 PSI en viga aérea VG-3 la cual está conformada por seis varillas N°6(3/4") y flejes N°3 (3/8") cada 15 cm.



FOTO No 8: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 termine con el amarre de acero de refuerzo de 60000 PSI en los siguientes elementos estructurales en las zapata Z-4 Eje 3P, zapata Z-6 Eje 3Q y viga de cimentación Eje Q entre Ejes 3 y 5..



FOTO No 9: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice relleno en recebo B400 en áreas intervenidas para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación) del área de producción revisa y verifica la compactación mecánica mediante el equipo RANA.



FOTO No 10: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el retiro de material producto de las excavaciones que se realizaron en la cimentación zapata Z-4 Eje 3P, zapata Z-6 Eje 3Q y viga de cimentación Eje Q entre Ejes 3 y 5.



FOTO No 11: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el encofrado de la viga aérea VG-3 con formaleta metálica teniendo en cuenta el recubrimiento en concreto y dimensiones exigidas en plano RE-21, lo cual es de 0.30 m de altura * 0.25 de ancho con recubrimiento lateral de 4cm, recubrimiento inferior de 6cm y recubrimiento superior de 5 cm.



FOTO No 12: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice aseo permanente a las diferentes áreas de ejecución de actividades de obra.



FOTO No 13: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el ensayo de asentamiento al concreto de 4000 PSI elaborado en obra y con la finalidad de ser vaciado en la Zapata z-4 Eje 3P, zapata Z-6 Eje 3Q y viga de cimentación Eje Q entre Ejes 3 y 5. Este ensayo se realiza con el fin de controlar la dosificación de la relación entre agua - cemento, lo cual en el diseño de mezcla entregado y avalado por la interventoría exige un asentamiento entre 5 a 6 pulgadas más o menos l.



FOTO No 14: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el ensayo de asentamiento al concreto de 4000 PSI elaborado en obra y con la finalidad de ser vaciado en la Zapata z-4 Eje 3P, zapata Z-6 Eje 3Q y viga de cimentación Eje Q entre Ejes 3 y 5. Este ensayo se realiza con el fin de controlar la dosificación de la relación entre agua - cemento, lo cual en el diseño de mezcla entregado y avalado por la interventoría exige un asentamiento entre 5 a 6 pulgadas más o menos l.



FOTO No 15: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice ensayo de compresión (NTC 673) al concreto de 4000 PSI elaborado en obra con el fin de realizar el vaciado en la zapata Z-4 Eje 3p, zapata Z-6 Eje 3Q y viga de cimentación Eje Q entre Ejes 3 y 5, los cuales serán ensayados a los 7, 14 y 28 días de edad con el fin de garantizar la resistencia exigida en planos de diseño. Esta interventoría también tomó muestras para realizar contramuestra a los 28 días de edad y de esta manera verificar con el resultado entregado por el contratista de obra.



FOTO No 16: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 continúe con la compactación de recebo B400 en áreas intervenidas por el reforzamiento estructural de la cimentación en el área de producción.



FOTO No 17: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 continúe con la compactación de recepto B400 en áreas intervenidas por el reforzamiento estructural de la cimentación en el área de producción.



FOTO No 18: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el vaciado de concreto de 4000 psi en la zapata Z-4, zapata Z-6 y viga de cimentación Eje Q entre Ejes de 3 y 5.



FOTO No 19: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad de suministro e instalación de tubería MIC de 6" x 6 Mts incluye unión, curva, y cinta acero inoxidable vandy 3/4 " para remplazo de afloramiento existente, incluye retiro de tubería de 3 ".



FOTO No 20: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad de suministro e instalación de tubería MIC de 6" x 6 Mts incluye unión, curva, y cinta acero inoxidable vandy 3/4 " para remplazo de afloramiento existente, incluye retiro de tubería de 3 ".



FOTO No 21: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad de suministro e instalación de tubería MIC de 6" x 6 Mts incluye unión, curva, y cinta acero inoxidable vandy 3/4 " para remplazo de afloramiento existente, incluye retiro de tubería de 3 ".



FOTO No 22: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad de suministro e instalación de tubería MIC de 6" x 6 Mts incluye unión, curva, y cinta acero inoxidable vandy 3/4 " para remplazo de afloramiento existente, incluye retiro de tubería de 3 ".



FOTO No 23: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el ensayo de densidad del material afirmado B400 para garantizar el proctor exigido del 95% de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.



FOTO No 24: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el ensayo de densidad del material afirmado B400 para garantizar el proctor exigido del 95% de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.



FOTO No 25: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la excavación manual incluye retiro para construir el pozo de inspección.



FOTO No 26: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la reinstalación de la tubería EMT de " en el área de bodega general.



FOTO No 27: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad pañete 1:4 (1 cantidad de cemento por 4 de arena.) sobre las vigas aéreas VG-7 y vg-8.



FOTO No 28: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 continúe con la compactación de material recebo B400 ejecutado para la conformación de la placa de contrapiso intervenida por el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.



FOTO No 29: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la actividad de aseo general en el área de producción.



FOTO No 30: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la reparación del embalaje de las maquinas del área de producción.



FOTO No 31: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la reparación del embalaje de las maquinas del área de producción.



FOTO No 32: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el maquillado de vigas aéreas VG-5, VG-6 y VG-4 localizadas en el área de producción.



FOTO No 33: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 ingrese a la sede IMPRENTA DISTRITAL el material vigas en madera de ABARCO con fines de realizar el reforzamiento de la estructura de la cubierta en madera del área de producción.



FOTO No 34: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 ingrese a la sede IMPRENTA DISTRITAL el material vigas en madera de ABARCO con fines de realizar el reforzamiento de la estructura de la cubierta en madera del área de producción.



FOTO No 35: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el apuntalamiento de la cubierta existente para garantizar la estabilidad en el proceso constructivo del cambio de piezas en madera de acuerdo a planos de diseño RE23 y RE 24.



FOTO No 36: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica en conjunto con el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 la cercha I3, para diagnosticar que elementos en madera se deben reemplazar por que presentan deterioro por gorgojo.



FOTO No 37: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice actividades correspondientes al ítem de reemplazo de elementos en madera deteriorados. Se consideran piezas de madera de 10x18 cms, especial para estructuras de madera, esta actividad se realizó en la CERCHA 13 ubicada en el Eje H entre Ejes 2 y 14 en área de producción.



FOTO No 38: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice actividades correspondientes al ítem de reemplazo elementos de madera deteriorados. Se consideran piezas de madera de 10x18 cms, especial para estructuras de madera, esta actividad se realizó en la CERCHA 13 ubicada en el Eje H entre Ejes 2 y 14 en área de producción.

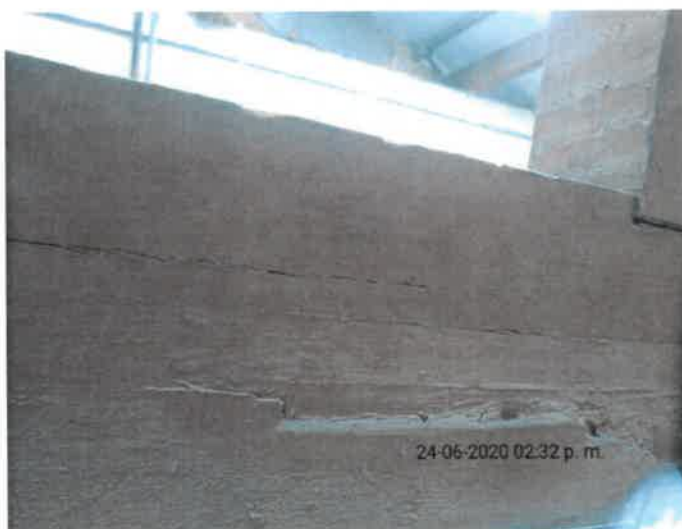


FOTO No 39: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice actividades correspondientes al ítem de reemplazo de elementos en madera deteriorados. Se consideran piezas de madera de 10x18 cms, especial para estructuras de madera, esta actividad se realizó en la CERCHA 13 ubicada en el Eje H entre Ejes 2 y 14 en área de producción.



FOTO No 40: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 ingrese cemento con fines de elaborar concreto de 4000 PSI para la placa de contrapiso intervenida por el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.



FOTO No 41: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA reviso y verifico la profundidad de la perforaciones numero 6 (3/4") de longitud de 0.22m ejecutados para realizar columnetas de confinamiento en el vano de la puerta de la subestación eléctrica.



FOTO No 42: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA reviso y verifico la profundidad de la perforaciones numero 6 (3/4") de longitud de 0.22m ejecutados para realizar columnetas de confinamiento en el vano de la puerta de la subestación eléctrica.



FOTO No 43: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 utilice el inmunizante de madera DWT aprobado por la interventoría para realizar el proceso de inmunización de las vigas en madera de abarco las cuales van a remplazar ya que están afectadas por gorgojo y son referenciadas para cambio exigidos mediante los planos de diseño RE 23 y RE24 que componen la estructura en madera de la cubierta del área de producción.



FOTO No 44: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 utilice el inmunizante de madera DWT aprobado por la interventoría para realizar el proceso de inmunización de las vigas en madera de abarco las cuales van a remplazar ya que están afectadas por gorgojo y son referenciadas para cambio exigidos mediante los planos de diseño RE 23 y RE24 que componen la estructura en madera de la cubierta del área de producción.



FOTO No 45: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la inmunización por el método de inmersión, el inmunizante DWT se puede aplicar por tres (3) métodos brocha, aspersión o inmersión.



FOTO No 46: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la inmunización por el método de inmersión, el inmunizante DWT se puede aplicar por tres (3) métodos brocha, aspersión o inmersión.



FOTO No 47: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de acero de refuerzo de 60000 PSI para conformar columnetas de confinamiento de la puerta del cuarto de subestación.



FOTO No 48: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 verifique los niveles del cielo raso planta segundo nivel área administrativa quedando de acuerdo a una altura de 2.32 metros de altura en el espacio denominado oficinas abiertas.



FOTO No 49: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la instalación de tubería 12 mm para rociadores o boquillas de la red contraincendios de acuerdo a la altura del cielo raso.



FOTO No 50: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el retiro de material productos de excavaciones y demoliciones del reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.



FOTO No 51: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la reparación del embalaje de las máquinas de impresión de la sede imprenta distrital ubicadas en el área de producción.



FOTO No 52: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la prueba de presión a la red de distribución del sistema contraincendios de la planta del primer nivel área administrativa.



FOTO No 53: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES D4 realice la prueba de presión a la red de distribución del sistema contraincendios de la planta del primer nivel área administrativa.



FOTO No 54: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES D4 realice la prueba de presión a la red de distribución del sistema contraincendios de la planta del primer nivel área administrativa



FOTO No 55: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES D4 realice la reinstalación de la tubería EMT de " en el área de bodega general.



FOTO No 56: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES D4 realice actividades correspondientes al ítem de reemplazo elementos de madera deteriorados.

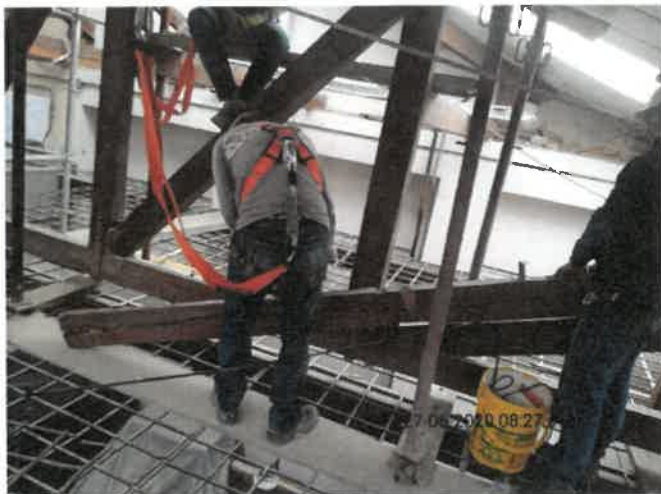


FOTO No 57: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el desmonte de las vigas en madera afectadas por el estudio fitosanitario de la consultoría.



FOTO No 58: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el corte de madera en ABARCO con sus respectivas cajas y cantos de acuerdo a la estructura en madera existente que no va ser intervenida de acuerdo al estudio fitosanitario de la consultoría.



FOTO No 59: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la instalación de la malla electrosoldada Q4 (6mm) de 15*15 como refuerzo de la placa de contrapiso del área de la planta eléctrica.



FOTO No 60: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica cada vez que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la instalación de la malla electrosoldada cumpla con su respectivo recubrimiento de concreto en el costado inferior.



FOTO No 61: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica cada vez que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 instale malla electrosoldada 04 cumpla con la especificación técnica y planos de diseño cumplan con las dimensiones de 0.15m*0.15m.



FOTO No 62: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica en conjunto con el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 los elementos en madera de la cercha numero 12 (CERCHA 12) para determinar el cambio según su deterioro ya y lo expuesto en planos de consultoría



FOTO No 63: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la demolición del muro de mampostería del área de recolección de desechos peligrosos ubicado en el área de producción.



FOTO No 64: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista de obra realice la reparación del embalaje de las maquinas ubicadas en el área de producción.



FOTO No 65: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalacion de tubería 12mm par red contra incendios zona administrativa I nivel



FOTO No 66: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalacion de tubería 12mm par red contra incendios zona administrativa I nivel.



FOTO No 67: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalacion de tubería 12mm par red contra incendios zona administrativa I nivel



FOTO No 68: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalacion de tubería 12mm par red contra incendios zona administrativa I nivel.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. II MES DE JUNIO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"	0			

ANEXO No. 6

CONTROL DE CLIMA



ARQUITECTURA URBANA LTDA

VIGENCIA A PARTIR DE
05/04/2016

VERSION
1

CONVENCIONES

Dominical
día festivo

CONTROL DEL CLIMA INFORMACION GENERAL

MES DE JUNIO DEL 2020

CONTRATISTA: PRUMI SEDES 04

CONTRATO No.4233000-731 DEL 2019

INTERVENTORIA: ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONTRATO No.4233000-730 DEL 2019

CLIMA DIAS - IMPRENTA DISTRITAL

CONDICIONES CLIMATICAS	jun-20																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MAÑANA																														
SOLEADO																														
DESPEJADO																			1	2										
NUBLADO	5	5														5	5	4	4	3			2	2	5	5	5			5
LLUVIA LEVE																		1					3	3						
LLUVIA FUERTE																														
TARDE																														
SOLEADO																														
DESPEJADO																							2	2	2					
NUBLADO	3	3														4	2	4	4				2	2	2	4				2
LLUVIA LEVE	1	1															2						2	2						2
LLUVIA FUERTE																														

TOTALES

PORCENTAJE			
SOLEADO	0%	0	HRS
DESPEJADO	8%	9	HRS
NUBLADO	76%	83	HRS
LLUVIA LEVE	16%	17	HRS
LLUVIA FUERTE	0%	0	HRS

GRAFICA DEL CLIMA



Fernando Aguilar
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

ABELINO VARGAS
INSPECTOR DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. II MES DE JUNIO DE 2020 <small>"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"</small>	0			

ANEXO No. 7

CONTROL DEL PERSONAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4233000-730-2019

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

4233000-730 DE 2019

FECHA:

JUNIO DEL 2020

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	PORCENTAJE DEDICACIÓN	EXAMEN OCUPACIONAL	FECHA ÚLTIMO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	Hernando Daza Berrio	18.939.369	Director de Interventoría	Positiva	Cruz Blanca	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
2	Paula Fernanda Morales Sanchez	52.959.003	Coordinadora de Interventoría	Positiva	Compensar	Porvenir	100%	SI	04/06/2020
3	Diana Catherine Morales Velasquez	1026.572.178	Residente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	Positiva	Famisanar	Porvenir	100%	SI	16/06/2020
4	Fernando Aguirre Medina	7.182.768	Residente de Interventoría	Positiva	Compensar	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
5	Juan Carlos Briceño	79.389.138	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Positiva	Salud Total	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
6	Jose Abelino Vargas Tenjo	1.057.463.178	Inspector de Interventoría	Positiva	Medimas	Porvenir	100%	SI	16/06/2020
7	Eyson Fernando Zambrano	8.092.810	Conductor	Positiva	Compensar	Proteccion	100%	SI	16/06/2020
8	Katty Andrea Farfan Arias	1.031.146.000	Profesional de Ingeniería Civil de apoyo	Positiva	Sanitas	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020

"Dentro de los procesos de licitación Pública y concursos de Méritos, tener un trato preferencial con las personas discapacitadas así: "En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema preferencial con personas con discapacidad, la entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal, de la persona jurídica, según corresponda, certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección".

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, presenta la documentación del personal con discapacidad siendo: certificado de vinculación del trabajador con discapacidad, el formato de constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad emitida por la entidad MINISTERIO DE TRABAJO, y el soporte de seguridad social del trabajador con discapacidad, del señor: HERMANO OAZA BERRIO, identificado con cedula de ciudadanía No 18939069 de Agustín Godazzi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		NT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DE IDENTIFICACIÓN	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	IDENTIFICACIÓN	11111111111111111111
NOMBRE A FAVOR SOCIAL	CLINICA FLORENCIA S.P.A.	NOMBRE A FAVOR SOCIAL	CLINICA FLORENCIA S.P.A.
CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ
IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111	IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111
TÍTULO APORTANTE	ACTIVIDAD ECONOMICA	TÍTULO APORTANTE	ACTIVIDAD ECONOMICA
NOMBRE A FAVOR SOCIAL	UNICO	NOMBRE A FAVOR SOCIAL	UNICO
CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ
IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111	IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111
TÍTULO APORTANTE	REFORMA TRIBUTARIA	TÍTULO APORTANTE	REFORMA TRIBUTARIA
NOMBRE A FAVOR SOCIAL	SENAE (SISTEMA DE REGISTRO DE APORTES A SALUD)	NOMBRE A FAVOR SOCIAL	SENAE (SISTEMA DE REGISTRO DE APORTES A SALUD)
CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUADRUPOLO MUNICIPIO	BOGOTÁ
IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111	IDENTIFICACIÓN	01111111111111111111

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

[illegible]TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
1617600000000[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NÚMERO	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES	APORTES	IMPORTE	IMPORTE PAGO
0724	CFE-CA COMPENSAR		7	\$ 559.700	\$ 7	\$ 559.700
TOTALES:				\$ 559.700	\$ 0	\$ 559.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL \$ 1.671.300

105

TOTAL **\$ 1,532,400**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ADMINISTRADORA	NÚMERO PLANILLA	PERÍODO COTIZACIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL
TOTAL APORTES A PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 TOTAL APORTES A PENSIÓN: \$ 0.00				TOTAL APORTES A SALUD APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 TOTAL APORTES A SALUD: \$ 0.00			
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES: \$ 0.00				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: \$ 0.00			

TOTAL \$ 1.786.600

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. II MES DE JUNIO DE 2020 <small>"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"</small>	0			

ANEXO No. 8

BITACORA DE OBRA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 MES DE JUNIO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"	0			

IMPRENTA DISTRITAL

(B/A/A/ ~~Procto~~) Teniendo en cuenta la visita del día 28/05/2020 realizada por el especialista estructural para dar concepto técnico a las anteriores observaciones, no se han recibido conceptos ni observaciones por parte del especialista de interventoría, actividades que no se han iniciado por falta de dichas observaciones y/o conceptos técnicos.

De igual manera se solicita a la Interventoría no retirar la Bitácora de Obra de la Obra (proyecto) debido a que se dejan de realizar las anotaciones diarias en el Libro de Obra, que son de gran importancia para la ejecución de las Actividades.

Abigona B
Residente Técnico Puro

01/06/2020

Clima: Mañana: Nublado Tarde: lluvia

Personal de obra:

1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes, 1 asero, 4 electricos y 3 administrativos.

Actividades en ejecución:

- Perforación zapata 2-4 y 26
- Figurada y amarre de acero zapatas 2-4 y 26
- Concreto pobre para zapatas 2-4 y 26
- Demolicion de piso y contrapiso para relleno con B-400
- Rellenos en recebo B-400 en la zona de producción
- Descimbrado de vigas aéreas V6-7 y V6-8
- Montaje de canalera eléctrica
- Montaje de lámpara de emergencia
- Continua instalación de malla puesta a tierra.
- Inicia y termina las soldaduras exotermica.
- Maquillaje de concreto a la vista (vigas aéreas y columnas)
- Se continuo con la actividad puesta en tierra (malla) actividad que fue aprobada por la especialista eléctrica de interventoría la Ingeniera Dada Reges.

A la fecha no se ha recibido por parte de la Interventoría la aprobación ~~de~~ recomendación de la propuesta realizada por el Ing. Especialista Estructural del Consorcio Puni Seales 04, a cerca de la construcción del piso de la Planta Eléctrica. Actividad que no se ha podido iniciar.

Alejandra P. Residente técnico

02/06/2020

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal de obra:

1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes, 1 asco, 3 electricos y 3 administrativos.

Actividades en ejecución:

- Figurado y amarre de zapatas 2-4 y 26 (Subestación)
- Figurado y amarre de viga aérea (Nueva) en la zona de producción Viga V6-3
- Continúa la instalación de malla puesta a tierra
- Maquillaje de concreto a la vista (columnas y vigas)
- Descimbrado de vigas aéreas V6-7 y V6-8.
- Continúa rellenos en recebo B-400 en la zona de producción (cimentación)
- Termina instalación de canal eléctrica en la zona Kodak


Alejandra P.

El día de hoy se realizó reunión técnica virtual del componente Eléctrico con los Diseñadores (Consultoría P&D) Interventoría Arquitectura Urbana y Consorcio Puni Seales 04, para tratar temas correspondientes a la ubicación de la transferencia y tablero de las bombas RCI.

Como contratistas quedamos a la espera de que nos informen y/o den respuestas a las inquietudes expuestas en dicha reunión, para constancia se levanta Acta de reunión.

Alejandra P.
Residente técnico

Respecto al tema eléctrico, solicitamos la entrega del plano actualizado Serie 3, según lo que informó la consultora, y de esta manera continuar con las actividades pendientes red eléctrica.

Atentamente 

16 de Junio / 2020.

El día de hoy se reanuda actividades de obra teniendo en cuenta q' desde el día 03/ Junio/ 2020 no fue permitida el ingreso a la Sede Impenta Distrital para la Ejecución de Actividades de Obra, según cronograma aprobado.

* El día 12 y 13 de Junio solo se permitió el ingreso de 4 personas a la obra, personal q' no era el idóneo para poder continuar con actividades que están en ejecución, teniendo en cuenta q' eran ayudantes de Obra.

Se solicita a la Interventoría de la manera más atenta

resolver, aclarar y/o recomendar que proceso constructivo se debe seguir según las observaciones realizadas por el especialista Estructural del Consorcio Puri sales ca, Juan Jacobo Pinilla. correspondiente a:

- Refuerzo placa eléctrica Planta.
- Refuerzo. Rampas

* Estas observaciones y/o recomendaciones se realizó el día 28 de Mayo de 2020 y a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Interventoría, esta actividad se encuentra suspendida y o atrasada.

* Por otra parte se solicita de manera prioritaria realizar una reunión en obra con los eléctricos contratista e Interventoría para revisar y/o aclarar las cantidades de cable

y tubencia a instalar en el tramo hister.
red contra incendios del cuartito de Bombas EPU

Alejandro 138

Residente Técnico

16-05-20

Profesional Ambiental y SST interventora

Se realiza verificación de personal de obra, así como el protocolo ingreso a las 7:00 am, donde el profesional SST del contrato realiza la toma de temperatura y desinfección de elementos así como el diligenciamiento del formato de condiciones de S&O. El contratista realizó la desinfección de las áreas antes e impregnar con amoníaco cuaternario e hipoclorito de sodio. Se realiza la reunión antes de iniciar con las labores, de se informa al personal de las medidas a implementar.

En el recorrido de obra realizado por la interventora se evidencian el siguiente personal en obra:

1 maestro electricista / 1 Almacenista / 3 oficiales + 3 ayudante electricista realizan reinstalación de puntos electricos en el area de produccion, / 1 oficial + 2 ayudantes realizan amarrado de cables de fuerza en vigas de cimentacion y Zutatas Z-4 en area de produccion, 1 ayudante realiza ASCO, 1 oficial + 2 ayudantes realizan distribución de concreto grueso para viga area v3-3 adicional para contraincendio distal al guerra con muro m5 y m6. para un total de 14 personas día de hoy.

Se hace entrega a interventoria Certificados de calidad, e Sistema puesta a tierra (CH) (HDBR) (no se da dato de calidad), Certificado de calidad y remisión de materiales pétreos de la cantera EL VINCULO.

Se realiza recorrido de obra con el inspector de intendencia y profesional SSTA, frente al cumplimiento y estado del plástico de cada equipo de la sede.

ZONA DE PRODUCCIÓN

- 1) Impresora de pliego y tores: el embalaje se encuentra con material particulado (polvo), en la parte posterior hay que realizar el cambio del plástico y limpiar el elemento.
Se deberá realizar una limpieza y en su defecto al cambio de embalaje que este en mal estado.
- 2) Puntmaster bicolor: el embalaje se encuentra con material particulado (polvo), se deberá realizar limpieza, así como el control de mando y la planta eléctrica.
- 3) GTO 2P Bicolor: Se deberá realizar el cambio de bimpel en las partes que están en mal estado, como la limpieza del material particulado (polvo)
- 4) Impresora Fuji: Se deberá realizar limpieza del unipol como del plástico, ya que tiene material particulado (polvo)
- 5) Alisadora vertical: Se deberá realizar limpieza del unipol y/o remplazo del que este en mal estado, por material particulado (polvo)
- 6) Alisadora Horizontal: Se deberá realizar limpieza de unipol y/o remplazo del que este en mal estado, por material particulado
- 7) Encartuladora BA 460: Se deberá reusar una pieza que no esta bien embalada, las demás piezas se deberán realizar la limpieza de las mismas, y reusar el estado del unipol que esta en mal estado y/o plástico, por material particulado
- 8) Impresora mastersped bicolor: Se deberá realizar el cambio y limpieza del unipol y plástico de mal estado, así como limpieza del mismo y retiro de elementos, teniendo en cuenta que algunas partes, esta expuesta la máquina.
- 9) Embuchadora coseadora-25: Se deberá realizar limpieza del material de embalaje y/o remplazo del mismo, por desperfecto así como limpieza del material particulado.
- 10) Coseadora: se deberá realizar limpieza del material del embalaje, así como cambiarlo en zonas que esta expuesta la máquina, por material particulado.

- 11) Coseadora: se deberá reusar y cambiar el embalaje en la parte expuesta, así como limpiar para el retiro de material particulado.
 - 12) Prensa: se deberá reusar y cambiar el embalaje por desgaste, así como limpieza para retiro de material particulado.
 - 13) Plegadora Heidelberg: reusar y cambiar el embalaje por desgaste, así como ventilar las zonas descubiertas, y como limpieza por material particulado.
 - 14) Plegadora MBO: reusar y cambiar embalaje que está en mal estado, y limpiar por material particulado.
 - 15) Guillotina original: cambiar embalaje que está en mal estado por crecimiento de paloma, y limpiar por material particulado.
 - 16) Guillotina Polack 115: cambiar embalaje por mal estado y limpiar por material particulado.
- Se deberá realizar un aseo general de la zona, ya que se evidencio mucho material particulado en el piso, y el embalaje de las máquinas, así como organizar material que se encuentra en la zona, como tuberías, cables entre otros, de manera inmediata.

ZONA ADMINISTRATIVA.

- 1) Cuarto fotomecánica pre prensa: se deberá embalar la máquina desde abajo, ya que por ahí puede pasar el material particulado, y limpiar la misma por el polvo.
- 2) Cuarto Máquina Kodak - step (plancha): se deberá embalar el tablero principal, así como realizar la limpieza del mismo por material particulado.
- 3) Cuarto de velado (filmadora y procesadora CTP): se deberá realizar limpieza de embalaje por material particulado.

Para la zona se deberá realizar limpieza en el área, por material particulado, ya que este afecta a las máquinas y el ambiente de trabajo, de manera inmediata.

Diana C. Urbani *[firma]*

En respuesta a las observaciones realizadas a el cubrimiento de las máquinas, se solicita amablemente a la Interventoría realizar un recorrido en conjunto con el contratista para tener claridad de la forma de medición y cuantificación de este ítem, teniendo en cuenta que el ítem queda por ínt y está incluido en el Balance y/o Adición de Obra. De esta manera se tiene claridad de las cantidades, y se evitan reprocesos. Quedamos atentos para realizar lo más pronto posible el recorrido y proceder con la actualización de protección de máquinas y equipos.

Alejo A. J.
Representante E.O. Obra.

17 de Junio 2020.

Clima: Mañana = Nublado y lluvioso Tarde = Lluvioso.

Personal de obra:

1 maestro, 1 oficiales, 1 asero, 3 ayudantes, 4 electricos y 3 administrativos.


Actividades en ejecución:

- Figurado y amarra de acero para zapatas #4 y #6
- Encofrado y pundido de zapatas #4 y #6
- Continúan rellenos con B-400 en la zona de producción (cementación)
- Continúa el maquillaje de concreto a la vista (muros, vigas y columnas)
- Inicia instalación de tubería eléctrica 3/4" y conexión de lámparas en la zona de producción (almacen)

Se hace entrega de remisión de material petro (Arena) de la cantera "EL VINCULO"

Pozo de Inspección

Se adjunta plano del diseño del pozo de inspección, que debe ser construido para la conexión del predio con la red principal. Se solicita a la Interventoría aprobar o imprimir si este es el diseño a aplicar. Quedamos atentos a estas observaciones.

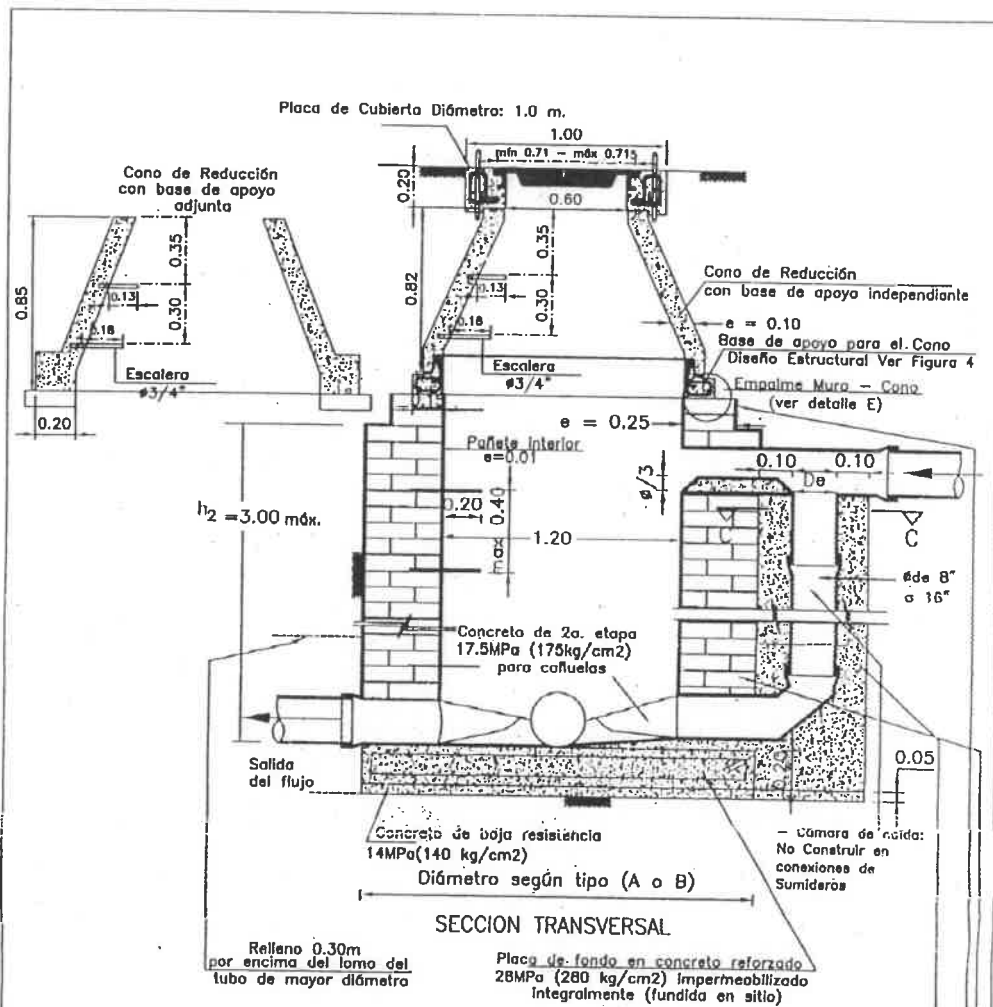

NOTAS

- Todas las dimensiones en metros
- Espesor Pared Cono de Reducción Prefabricado: $e=0.10\text{m}$
- Resistencia del Concreto $f'c = 28 \text{ Mpa}$
- Aplicación en Pavimentos Rígidos (en Vías Diferentes a Transmilenio) y Flexibles




NORMALIZACIÓN TÉCNICA

POZO DE INSPECCION CON CONO DE REDUCCION PREFABRICADO	ESTADO: VIGENTE
CONTIENE: PERFIL POZO PARA PAVIMENTOS RIGIDO (VIAS DIFERENTES A TRANSMILENIO) Y FLEXIBLES	VERSION: 3.4
FECHA: MARZO/2016	RESPONSABLE: ACUEDUCTO
ESCALA: SIN	ARCHIVO: NS-029-2v.3.4
	FIGURA No: 2 DE 16

*Documento controlado, su reproducción está sujeta a previo permiso por escrito a la EAAB

profesionales de Interventoría Higuita Urdaneta
Inspector SST Interventoría Juan Carlos Bincón

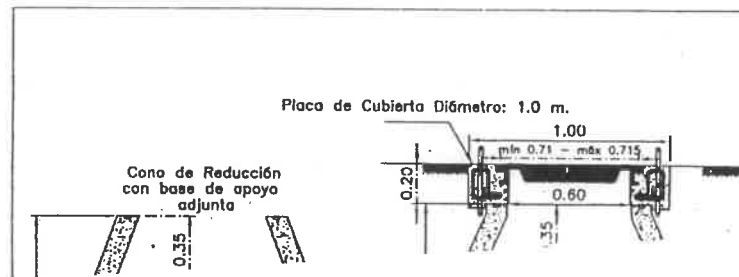

17-06-2020 Se realiza inspección para el cumplimiento de COVID-19 al contratista consorcio Piumi - Sede 4 y al personal de la interventoría Arquitectura Urbana LTDA donde se verifica.

- Desinfección de Zapatos
- Toma de Temperatura
- Repaso de Condiciones de Salud.
- lavado de Manos.

Se realiza recorrido de obra con el profesional SST del contratista William Fonseca. se verifica entrega de EPP pagos de la seguridad. Socraf. recolección de balsas de cemento para disposición al gestor. se repasan a la obra 20 personas (17 Trabajadores del Piumi Sede 4 y 3 profesionales de interventoría Arquitectura Urbana LTDA) Inspector SST interventoría Juan Carlos Buncer

18 de junio del 2020

Estado del tiempo: Nublado

En el recorrido realizado el día de hoy por la interventoría arquitectura urbana EPA se evidencio el siguiente personal en obra:

1 maestro cerrajero

1 almacenista

- componente reforzamiento estructural

2 oficiales y 4 ayudantes realizan relleno y recebo compactado en áreas intervenidas para el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.

1 oficial realiza curado de concreto.

1 ayudante realiza aseo

→ componente eléctrico

3 oficiales y 1 ayudante realizan instalación de cable para la red eléctrica provisional.

El día de hoy se inició con la actividad eléctrica item 3.6.0.14 "Suministro e instalación de tubería MTC de 6" x 6 mts incluye union, curva y cinta acero inoxidable Vandy 3/4" para completo apilamiento existente, incluye retiro de tubería 3".

Una vez se inicia con la actividad de desmonte de la tubería existente de 3" se encontró que una línea del cable XLPE aluminio, está perforada en un tramo, lo que no permite garantizar la continuidad de la actividad.

Como contratistas recomendamos retirar los puntos y/o premoldados de cada una de las líneas para realizar un corte de 4.50 mts desde los premoldados hasta donde se encontró la perforación del cable, para reanudar los 4.50 mts se debe hacer la acometida utilizando los Bucleos existentes en las

Ing. electricista
Interventor

cameras de inspección.

Para realizar esta actividad se consulto con la Ing. Paola Reyes, Abogada electricista de la interventoria, quien estuvo de acuerdo con la intervención de esta actividad, teniendo en cuenta que lo debe ejecutar a la mayor brevedad por la exposición de los elementos eléctricos que representan un valor económico significativo.

Se hace entrega de certificados de calidad de los siguientes elementos:

- 1) Tubos de 6" IMC
- 2) Cable desnudo #2/0

NOTA: LA INTERVENTORIA SOLICITA ANALISIS TECNICO Y FINANCIERO (ANALISIS UNITARIO DE ACTIVIDAD, incluye 3 COTIZACIONES COMO MINIMO, INCLUYENDO LOS INSUMOS DEL PREMOLENDIDO NUEVO Y EL COSTO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD).

LA PROPUESTA DEBE SER AXIADA POR LOS ESPECIAL ELECTRICISTAS DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, FINALMENTE EL CONTRATISTA DEBEN INFORMAR AL COMITE DE OBRA DEBE GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO EN DISTANCIA DE LA ACOMETIDA MEDIDA.

ATENSION DESDE TRANSFORMADOR EXTERNO A CUARTO DE SUB-E

EN RECORRIDO DE OBRA LA INTERVENTORIA EVIDENCIA LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y OBRAS RECORRIDO EN COMPANIA DE LA SUPERVISION DEL CONTRATE

① CONTINUA ACTIVIDAD RECEBO B-400 ALTA CIMENTACION PRODUCCION.

② INSTALACION TUBERIA IMC 6" ϕ PARA ACOMETIDA EN POSTE EXTERIOR.

NOTA: LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SDE OY INFORMAR LA ENTREGA DE ESPACIOS Y A CONSOLIDADOS EN AREA DE ADMINISTRACION COMPROMISO ADQUIRIDO EN COMITE OBRA NO 35. Y A LA FECHA NO SE HA CUMPLIDO


LA INTERVENTORIA SOLICITA DUE Celeridad. EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA REFERENTES A: TERMINACIÓN DE RED CONTRA INCENDIOS SEGUNDO PISO CON SU ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SE PRECEDEN DE ESTA ACTIVIDAD COMO LO ES LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO Y EL MONTAJE DE CIELO RASO ASÍ COMO LA RED DE DETECCIÓN INCENDIOS.

SE EVIDENCIAN ELEMENTOS ELÉCTRICOS EN ALGUNAS DE PRODUCCIÓN DESPROTEGIDOS (CABINETS) LA INTERVENTORIA SOLICITA LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS. CUALQUIER EXISTENCIA (DAÑO ACABADOS ELEMENTOS) DEBERÁ SER ASUMIDA POR EL CONTRATISTA CONSERVIDO PRIMERA SEDE 04.

* LA INTERVENTORIA SOLICITA EL PISO ESTRUCTURAL PARA REFUERZO ESTRUCTURAL MEDIANTE INSTALACIÓN DE TUBOS METÁLICOS PARA PROCEDER A DEMOLICIÓN DE MURO UBICADO ENTRE EJES 2 ENTRE EJES NO 13 Y 14. LO ANTERIOR PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS INTERVENTORIA.

* LA SUPERVISIÓN DE LA ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ SOLICITA DEMOLICIÓN DE MURO UBICADO ENTRE EJES M-H Y EJES NO 12 Y 13. EN CONSTRUCCIÓN.

* SE EVIDENCIA ASCANTAMIENTO DE ESTRUCTURA EN ALGUNAS EN ADORQUIN CONCRETO COSTADO SUR. PRODUCTO DE FALTA COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR 3-600, SE SOLICITA HACER LA INTERVENCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES INFORMANDO POR EL FIN DE HACER EL LUGAR A SATISFACCIÓN FINAL DE LAS MISMAS.


FERNANDO AGUILAR
RESIDENTE INTERVENTOR

19/06/2020

Clima: Matana:

* Así mismo se evidencia en el área de producción el no empaque adecuado de los elementos (materiales), como de máquinas, haciendo claridad que esto fue resuelto en las horas de obra al contratista de obra el día 16 de junio del 2020. aclarando que se evidencia vinil en mal estado, plástico en mal estado como a algunos materiales se encontraba el empaque solo de un sector.

y otros notan en protección. ~~FF~~

Responiendo a las observaciones realizadas por la Interventoría se menciona lo siguiente:

1. La actividad eléctrica de instalación de tubería IMC 6" se continua realizando con el personal idóneo para elevar la actividad bajo la supervisión del Ing. Carlos Valencia asesor eléctrico del Consorcio Pruni sales OA. que se quien recomendó lo expuesto anteriormente.
2. Como consorcio Pruni Sales OA. no nos hemos comprometido a entregar ningún espacio, la programación de obra aprobada al 20 de Abril es muy clara y fue aprobada para suscribir la adición y prórroga del contrato de obra, a la fecha ninguna de las actividades anterior/ mencionadas ha iniciado dentro de la programación que se encuentra en firme.
3. La propuesta para instalación de perfiles metálicos en la cubierta ya se encuentra lista.

----- Forwarded message -----

De: JUAN JACOBO PINILLA <jjpinnacle@cycciviles.com>
Date: jue., 18 jun. 2020 a las 9:57
Subject: Memorias Perfil Cubierta
To: <imprensa.pruni@gmail.com>

Buenos días Arquitecta Alejandra,

Con respecto a lo solicitado, para la demolición del muro en cuestión es necesario soportar adecuadamente las correas de cubierta antes de proceder con la demolición. Para esto fue calculado un perfil en acero laminado enfriado tipo Perlín Doble C, con especificación 2P-9-12, este perfil debe ser protegido mediante pintura anticorrosiva o mediante galvanizado. Para el anclaje de dicho perfil se deberá disponer una platina de acero A36 $e=3/16"$ y cuatro varillas roscadas de $1/2"$ en acero A36 ancladas con epóxico al sustrato.

Una vez instalado el perfil se podrá proceder a demoler el muro de mampostería, esta demolición deberá ser controlada y monitoreando la estabilidad del refuerzo de cubierta. En caso de presentarse arrancamiento de los anclajes epóxicos o cualquier otra situación adversa deberá apuntalarse todo el sistema y avisar de inmediato para realizar el reconocimiento de la situación.

Adjunto se encuentra la memoria de cálculo del perfil metálico.

Atentamente,



Consultoría y
Construcciones
Civiles Ltda.

Juan Jacobo Pinilla Rodríguez.
IC MSc en Ingeniería - Estructuras UNAL
Esp en Patología de la Construcción - USTA
Esp en Gerencia de Proyectos - EAN
Representante Legal
Tel: +57 (1) 926 17 76



Memorias de cálculo
Vigas en Perlines

Fecha
junio 18 / 2020

Proyecto
Viga cubierta Imprenta Distrital


Aprobó

Material

Módulo de cortante G (kg/cm ²):	791000
Esfuerzo último F_u (kg/cm ²):	4550
Esfuerzo de fluencia F_y (kg/cm ²):	3500
Módulo de elasticidad acero E (kg/cm ²):	2040000

Dimensiones del Perfil

Tipo de sección:	Perlí
Perfil:	2P-9
Altura A (cm):	22.8
Base B (cm):	6.35
Pestaña C (cm):	1.90
Espesor e (cm):	0.25

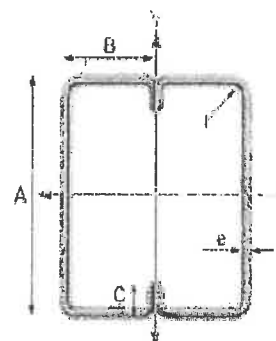

Menrula y/o platinas

Solicitaciones últimas

Momento actuante último en x (kg-m):	1728
Momento actuante último en y (kg-m):	0.00
Cortante máximo último (kg):	1440
Cortante en zona de máximo momento (kg):	0.00
Longitud no arrojada L_b (m):	4.8
Longitud de la viga (m):	4.8

CORPACERO S.A. - Corpasoft 3 - 2020
Bogotá: Cra. 68 #23-52 / PBX: 57(1) 446 4100 / Fax: 57(1) 446 4140 - corpasoft@corpacero.com

1 de 3

NOTA: Estas memorias de cálculo deben ser revisadas y aprobadas por un Ingeniero Calculista.

las obras en las zonas exteriores para proceder a hacer las adecuaciones.



Memorias de cálculo
Vigas en Perlines

Fecha
junio 18 / 2020

Proyecto
Viga cubierta Imprenta Distrital


Aprobó

Material

Módulo de cortante G (kg/cm ²):	791000
Esfuerzo último F_u (kg/cm ²):	4550
Esfuerzo de fluencia F_y (kg/cm ²):	3500
Módulo de elasticidad acero E (kg/cm ²):	2040000

Dimensiones del Perfil

Tipo de sección:	Perlí
Perfil:	2P-9
Altura A (cm):	22.8
Base B (cm):	6.35
Pestaña C (cm):	1.90
Espesor e (cm):	0.25

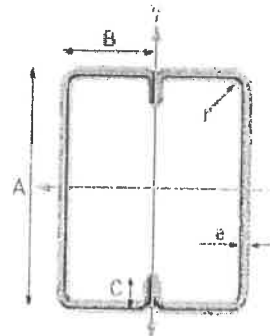

Solicitaciones Últimas

Momento actuante último en x (kg-m):	1728
--	------

Mentruke y/o pluvina

Esta propuesta fue enviado al correo electrónico de la Interventoría para que sea validada. Quedamos atentos a las observaciones, para proceder a realizar el APU y ejecutar la actividad de Oba.

4. La actividad de nivelación de Adoquín de concreto se realizará una vez se hayan terminado todas las obras en las zonas exteriores para proceder a hacer las adewaciones.

5 Solicitamos nuevamente a la Interventoria ~~que~~ resolver, avalar y/o aprobar las propuestas realizadas por el Ing. Juan Jacobo Pinilla - asesor estructural del consorcio Puntos 04, que desde el 28 de Mayo, realizó visita de obra y deo varias propuesta y/o observaciones que a la fecha no han sido resueltas o respondidas por la Interventoria, lo que implica atraso en la ejecución de las actividades.

- Diseño de piso para planta eléctrica
- Diseño de rampas para acceso.

6. Adicionalmente se solicita a la Interventoria informar si el ~~piso~~ de alcantarillado propuesto en la pagina 74 de este libro, es que se debe proceder a ejecutar.

7. Complementando lo escrito de la parte eléctrica, ^{en la pag 75} ~~del~~ anexo que dicha acometida no es una parte contratada por lo que la ~~actuación~~ es solo el ~~desmante~~ y reinstalación de cable existente, no podemos garantizar la integridad de la propiedad eléctrica del cable, ya que es un cable este.

R. Ing. Eléctrico Interventoria
Asesor eléctrico
Carlos Velasco

En el día de hoy en el recorrido realizado por la Interventoria se evidencian el siguiente personal en obra:

1 maestro Serral

1 Almacenero

1 componente representante estructural.

1 oficial + 1 ayudante realizan peralte en vías accesos V3-7 y V6-8.

1 oficial y 1 ayudante realizan muestras de ~~para~~ ~~los~~ ~~basalto~~ sobre muros.


2 ayudante realicen asco

1 oficial y 2 ayudante continua con relleno en vacíos contractados B400 en áreas interconexiones para el reforzamiento estructural de la cimentación en el área de producción.
→ componente eléctrico.

4 oficiales y 2 ayudante izaje de tubería para afloramiento de la acometida de media tensión.
para un total de 74 personas el día de hoy.

Personal administrativo: 1 residente de obra / 1 residente SST del contratista / 1 residente técnico de la interventoría / 1 residente SST de interventoría / 2 inspectores de interventoría.

RESULTADOS DENSIDADES GRANULAK B-400


FERNANDO AGUILAR

SOLICITUD lab		REGISTRO DE DENSIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO EN EL 1 MET			
MEDICIÓN CONFIABLE		INV E-164-2013 ☐			
Reconido	Fecha de Ensayo				
11334	200014				
COMPANIA: <u>Alcanceo Pura S de RL</u>		OBRA: <u>Impresora Di</u>			
Ensayo No.	Tipo de Material	LOCALIZACIÓN	Método*		Profundidad (cm)
			BS	TD	
1	B400	ETE 11 ETE P-Q Ullima Spa	X		15
2	"	ETE 11 ETE L-M	X		15
3	"	ETE 7 ETE O-P	X		15
4	"	ETE 7 ETE R-S	X		15
5	"	ETE 12-15 ETE Q-R	X		15
					

se respondió como interviniente, que la actividad nueva es solo de canalización a tubería IMC, el cableado y está entre los ítem contractuales aprobados en el último balance y se maneja por mayor cantidad.

José Abel
Interventor

FERNANDO AGUIRRE

Arq. Residente abm

3) En obra se evidenciará la ejecución de la malla de puesta a tierra, en plano aprobado serie 3 se proponía instalar en la zona donde costado sur, pero en esta zona pasa la tubería de aguas lluvia y urgas de eliminación que dificultará la ejecución de esta actividad. Entre el área eléctrica de contratista e interviniente se determina mover la ~~traza~~ malla de puesta a tierra a la zona verde frente a arborescencia conservando las dimensiones, características y especificación del diseño, solo se incrementa el cable de conexión entre la malla de puesta a tierra y sub estación.

La malla se evidencia en buen estado, con conexiones entre cable es apropiada, las conexiones entre cable y la varilla de puesta a tierra, están en buen estado, y el cable en su recorrido se evidencia en buen estado y sus hilos unidos de forma correcta. Se recuerda que esta actividad debe estar acompañada de un certificado de resistencia pendiente de entrega por el contratista.

Se aprueba la actividad y se autoriza la ejecución de relleno de material seleccionado proveniente de la excavación, se solicita restaurar el área intervenida, con grava y ladrillo donde se requiera.

FERNANDO AGUIRRE

José Abel
Interventor

Arq. Residente



- 4) Se ordena la ejecución de instalación de tubería IHB de 6" para la bajante de la acometida, tiene su marcación tipo naranja mayor a 10cm, se deja inclinado con el ángulo del poste existente, esta pendiente la instalación del capote y ya que instalado lo corra
- 5) Se solicita mayor presencia del asesor eléctrico, para las actividades que se inician según cronograma.
- Ing. Eleonora
Interventora

Sábado 20 de Junio del 2020

estado del clima en la mañana: nublado
personal administrativo

- 1 residente de obra, 1 arquitecta residente de obra
- 1 arquitecto residente de interventoría
- 1 residente asst de obra
- 1 residente asst de interventoría
- 1 asistente

→ 1 Inspector de Interventoría

Sección de Personal: 1 maestro electricista / 1 almagrista de obra / 1 ayudante electricista / 3 oficiales civiles / 4 ayudantes civiles / 3 oficiales electricistas / 1 ayudante electricista, para un total de 14 personas el día de hoy.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN EJECUCIÓN.

- (1) INICIAR EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE INSPECCIÓN DIÁMETRO 1.20.
- (2) PASEO VIGA AEREA V67 Y V68
- (3) CONTINUAR ACTIVIDAD REINSTALACIÓN TUBERÍA ENT 3/4" PARA REINSTALACIÓN DE CILINDROS ILUMINACIÓN BODEGA GENERAL
- (4) SE HACE ORDEN Y MED.

Profesional Ambiental: Acorde con el recorrido realizado con el Ing. Mauricio Polido, Doc. Vidona Torero de la Entidad, se solicitó al contratista realizar el embalaje y protección de todos los equipos y elementos (mobiliario) de la zona de producción, hasta el día jueves 25 de junio del 2020, como fecha última de plazo para la ejecución de la actividad.

En recorrido diario realizado por la interventoría, se realizó revisión y verificación de uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores así como el uso obligatorio de tapaboca, se verificó permisos de trabajo en alturas. Diana C. Morales y ~~SE~~.

Martes 23 de Junio 2020

Estado del tiempo mañana: lluvia leve

Personal administrativo

1 asistente residente de obra.

- 1 Ing residente de obra
- 1 residente SST de obra
- 1 arquitecto residente de intervención
- 1 Inspector SST de intervención
- 1 Inspector Técnico de Interventoría.

En el recorrido realizado por la interventoría se evidencian el siguiente personal en obras:

- 1 maestro general / 1 almacenera / 1 ayudante realiza ascó / 2 oficiales y
- 2 ayudante continúan con relleno y compactación de relleno Budo / 1
- oficial + 1 ayudante realizan reparación de empaque de maquinaria en el
- área de producción. / 1 oficial continúa con faena en zona norte
- U.S.

Componente eléctrico:

- 3 oficiales + 1 ayudante continúan con instalación de tubería
- ent de 3/4" para circuitos de alumbrado en el área de producción
- área administrativa.

23-06-2020. Se revisa y verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad covid 19. establecido en la Resolución 0666 y Resolución 01, el cumplimiento al plan de movilidad.


- Se da cumplimiento tema de temperatura,
- Desinfección de zapatos, prendas, maletas,
- Se reparte las credenciales de Salud de cada trabajador.
- Se solicita al personal SST del contratista censurero
- Prun 04 realizar inspecciones periódicas al armado de
- los andamios.

Se solicita realizar el mantenimiento de las máquinas y la protección de las máquinas del área de producción "cambio de plástico y to amarras, cambio de vinipel y se amerita, cambio del aceite y se encuentra defectuoso."

Se autoriza el ingreso del siguiente personal:
 Empresa Hidrimco. Luis Miguel Acevedo Molina cc. 1066.529.508 - Emmanuel Castellanos Cortes. P.E. 1001.329.032
 Nicolas Yanpool Ortega Anzola cc. 1023.937.343
 Oscar Andres Obando Reyes cc. 103062235.

Empresa Carlisaval Construcciones S.A.S. David Solari
 Hoyos CC. 1037.472.861, Luis Eduardo Muñoz Manjarez
 CC. 1.123.730.397, Jorge Rene Castro Rojas CC. 1098.
 703.052. Inspector Juan Carlos Buitaño 557

23/09/2020

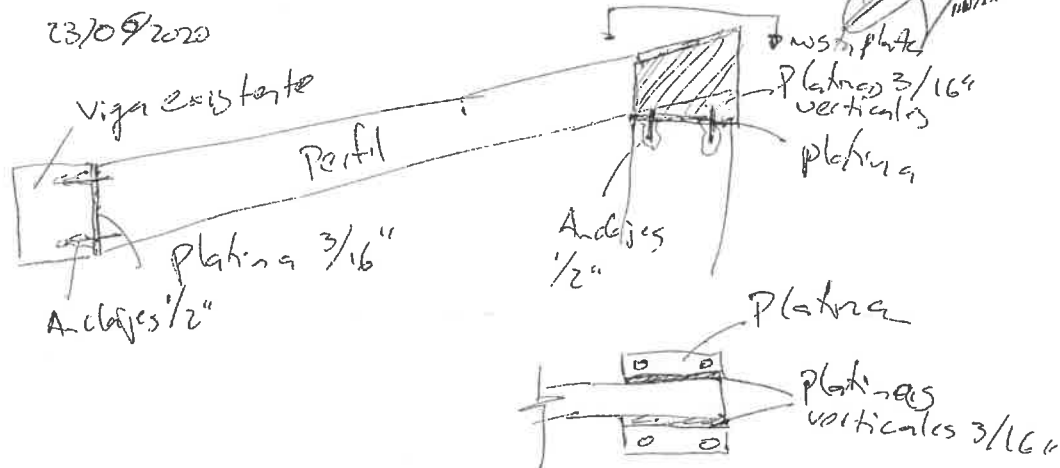

Las platinas deben ser soldadas al perfil con E60XX

J. J. M. especialista estructural CONDICO P. J. J.

DE ACUERDO A VISITA DE OBRA SE ACUERDA UTILIZAR LA CONEXION PROPUESTA POR PED PARA EMPALMAR LOS BUCHILLOS SUPERIORES E INFERIORES DE LAS CERCAS.

PARA LA CONEXION DE DIAGONALES Y PARALES VERTICALES DE LA CERRA, SE CONSULTARÁ A P&D SI PERMITE EMPLEAR LA CONEXION EXISTENTE DE PLATINAS EN "P" PERNADAS AL PARAL VERTICAL.

CON RESPECTO A LA PLACA CONTRAPISO. UBICADA EN AREA DE GENERADOR ELECTICO, SE AVISA LA PROPUUESTA EMITIDA POR EL INGENIERO JUAN JOSE P. J. J. MEDIANTE LIBRO BITACORA OBRA CON FECHA 28 JUNIO 2020, SE HACE CLARIDAD QUE LA JUNTA DEBE HACERSE CADA 2.00 mts.

Miércoles 24 de Junio del 2020

Tiempo: Nublado en la mañana

Personal administrativo.

- 1 arquitecta residente de obra
- 1 Ingeniero auxiliar de obra
- 1 arquitecto residente de Interventoría
- 1 residente SST de obra
- 1 Inspector SST de Interventoría
- 1 Inspector técnico de Interventoría.

En el recorrido realizado por la interventoría se evidenció el siguiente personal en obra:

Componente reforzamiento estructural.

- 1 maestro general / 1 almacenera / 1 ayudante realiza acero,
- 2 oficiales y 2 ayudantes continúan con relleno en recibo B400 en el área de producción.
- 1 oficial continúa maquinaje de vigas aceros.

Componente eléctrico

- 3 oficiales y 1 ayudante realizan reinstalación de tubería EMT 3/4 para realizar columnetas y viga cinta para puesta de sub estación eléctrica.

Componente red contra incendios.

- 3 oficiales continúan con instalación de tubería 12mm en área administrativa segundo nivel.

Reforzamiento estructura en madera

- 3 oficiales y 2 ayudantes inician realizando empalme y uso herramienta para dar inicio a esta actividad.
- Hay un total de 22 personas en el área (administrativa) etc

Se le recomienda al contratista de obra entregar los resultados del ensayo de compresión de los concretos vaciados los días 23 de junio a los 28 días de edad, 29 de junio a los 74 días de edad y el día 14 de junio a los 7 días de edad las fechas que enuncie son las fecha de toma de muestra.

Se le recomienda al contratista de obra entregar a la interventoría remisión de materiales, certificando de calidad de los mismos antes de iniciar las actividades de obra.

El día de hoy se dio inicio a la actividad de reforzamiento de la estructura en madera de la cubierta del área de producción. Se le solicita al contratista entregar remisión de la madera, certificando de calidad del material con el cual se va a inmunizar y se debe señalar una inspección visual entre las partes obra e interventoría antes de ser instalada e inmunizada.

Se hace entrega de certificado de calidad y Remisión de maderas "el amigo" de maderas que se utilizaron en la actividad de cambio de elementos de madera en el área de producción.

Alfonso B.
Residente de Obra.

LA INTERVENTORIA HACE RECORRIDO OBRA EVIDENCIANDO:

- ① SE OBSERVAN EXCAVACIONES EXPUESTAS LOCALIZADAS EN POZO INSPECCIÓN, SE SOLICITA DAR Celeridad en la ejecución de esta actividad, lo anterior con el fin de evitar socavación de terreno.
- ② SE EVIDENCIA FALTA DE PERSONAL EN EJECUCIÓN DE PLACA CONTRA PISO ÁREA GENERADOR ELÉCTRICO, SE SOLICITA DAR Celeridad a la ejecución de la actividad.
- ③ SE EVIDENCIA FALTA PERSONAL EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD. INSTALACIÓN DE FALSO TECHO PVC SEGUNDO PISO ÁREA ADMINISTRATIVA SE SOLICITA DAR Celeridad en la ejecución de la actividad.

NOTA: LA INTERVENTORA SOLICITA ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS PARA CONEXION DE ACOMETIDA MEDIA TENSION Y PERFILES TUBULARES PARA REFUERZO DE CORREAS METALICAS UBICADAS EN EJE 2 ENTRE EJES 12-13 PARA RESPECTIVO AVA1, Y POSTERIOR CONSTRUCCION.

FERNANDO ABUIER
RESIDENTE INTERVENTO.

24-06-2020 Se revisa y verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad Covid 19. de acuerdo a la Resolucion 0666 y Resolucion 01. donde se verifica el cumplimiento del manual del Torno de Temperatura, desinfeccion de zapatos, prendas de vestir, maletas, cuadernos de Salud de cada trabajador.

- Se inspecciona el armado de andamios y las primas de trabajo en altura.
- Se le solicita a la residente del comercio Prans Gede y Arquitecta Ingisth Alejandra Bolaños y Al preferencial SST del contratista William Fenera Vargas las Fichas tecnicas de los productos que se utilizaron para la inmunizar la madera de la cubierta de la Imprenta Distrito.
- Se verifica y revisa la documentacion del personal de la obra.
- Se revisa y verifica el cambio del vinipel, carton y la limpieza de las plasticas de las maquinas del area de produccion. Las SST Interventora Juan Carlos Biceña

Las Interventora
Arquitecta Urbana.

Se hace entrega de la Ficha tecnica del inmunizante para los elementos de madera a reemplazar.

Inmunizante Durban WT.

Maranda
Residente tecnica.

Respondiendo a las observaciones realizadas por la Intervent

en las páginas 89 y 90.

1. Se procedió a realizar Limpieza al piso, una vez fue aprobado el diseño a ejecutar, se retiró tubería de gas existente. Se está en el proceso de consecución de materiales para la ejecución de esta actividad, se está retirando el agua para evitar emporamiento y sobreexcavación.
2. Hasta el día 23 de junio (ayer), fue avalado la propuesta realizada por este Consejo para ejecutar esta actividad. Se está realizando programación con personal para iniciar con la ejecución el día 26 de junio.
3. Se le recuerda a la Interventoría que la actividad de instalación de estructura de cielo raso en Segundo Piso Administración está programada, para el mes de Agosto, por lo tanto no se encuentra en atraso, el día de hoy se inició con y/o continuó con la instalación de Red contra incendio en Administración 1er y 2do Piso. Se tiene programado iniciar con la instalación de cielo raso la otra semana.

Alexandra B.
Residente Obra.

El día de hoy se dio inicio de las actividades correspondientes a:


- Aseo y colocación de inmunizante en la madera
- Reemplazo de elementos en madera.

Se realizó un recorrido con el Residente de Interventoría Arq. Fernando Aquino, para identificar todos los elementos a reemplazar, desde que este y cerca se dará inicio la ejecución.

Se aprobó por parte de la Interventoría realizar el cambio y/o reemplazo de los elementos de la Cerceta 13 este tt.

Debe mencionarse que este elemento no estaba

incluido dentro de lo contractual, entregado por la
consultoria. P&D.
Se anexa plano

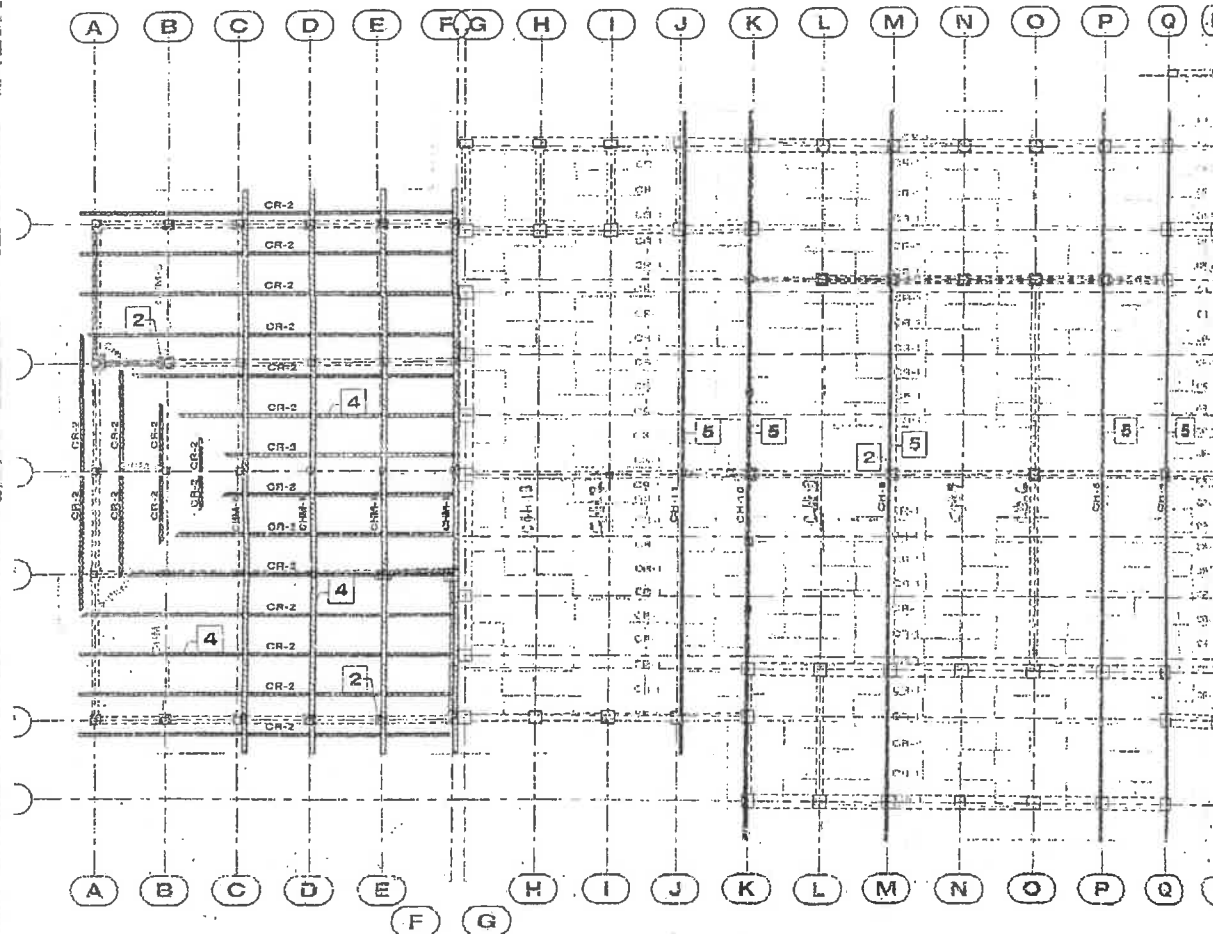


Elementos a Reemplazar
por la Consultoria

PLANTA CUBIERTA

ESC: 1:250

Diagnostico Realiza por
el consorcio Puni.



El 10 elemento por donde se inicio la actividad.
una vez avalado por la Interventoria.

Alexander. P.

en la sede impresa distrital se relaciona el siguiente personal en obra:

1 albañilista / 1 maestro General.

Componente reforzamiento estructural.

1 obrero y 1 ayudante continúan con relleno en rebozo constructivo B 400 / 2 ayudantes realizan asco / 1 obrero y 1 ayudante realizan martillado de concreto en viga acero VS-5 - VS-6.

Componente (reforzamiento) red contraincendios.

3 operarios realizan instalación de tubería en acero inoxidable de 12mm en el área administrativa segundo nivel.

Componente estructura en madera de la cubierta del área producción.

3 operarios y 2 ayudantes inician con la laminación de madera.

Componente eléctrico.

4 operarios y 1 ayudante continúan con instalación de tubería EMT de 3/4" para un total de 23 personas del día de hoy.

Personal administrativo.

1 area residente de obra.

1 BMS auxiliar.

1 residente SST de obra.

1 area residente de interventoría.

1 Inspector SST de interventoría.

2 Inspectores técnico de interventoría.

25-06-2020. Se revisa y verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad Covid 19. Reclutaron OGGO y Reclutaron OI.


-Se realiza recorrido con el profesional SST William Romero donde se verifica el cumplimiento del mantenimiento de la protección de máquinas del área de producción. (cambio de plástico carton y vinil).

-Se presenta corte del fluido eléctrico 415 de la mañana a las 13:00 horas de la tarde.

No se presenta ninguna novedad. Ins Juan Carlos Briceño

Tema eléctrico: 26-02-2020

1) Según comontado de la consultoria PYP el recorrido de la acometida para la red contra incendio se define en obra, con esta respuesta entre interventoría y obra se define instalar la tubería acometida de la red contra incendio de 3" como se indica en tubería IMC, se propone de 3" y con una protección como las usadas para el sistema de aire acondicionado, el recorrido se adjunta a continuación.

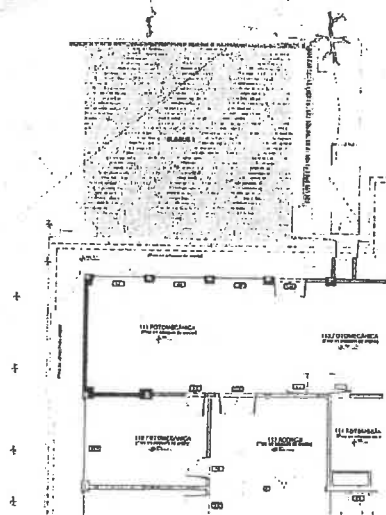

2) Teniendo en cuenta que el día miércoles se dio inicio a la instalación de Red contraincendios en Segundo Piso de Administración, según Acta del 18 de febrero entre los asesores Eléctricos e hidrosanitarios, se definió que se le da prioridad en ubicación a los Rociadores y las luminarias se ajustaron posterior a

la instalación del cable raso, para poder evidenciar si se requieren mover o conservar su ubicación.

Realizar la reubicación de la Iluminación implica mayor reposición de cable raso y mayor cantidad en cable 3x12 para las lámparas.

3) En el primer piso cuarto de equipos de red contra incendio se evidencia cable de tubería de red contra incendio y electrice pero a la fecha esta pendiente la protección que se acordó desde el día 06 de Marzo del 2020, se aclara que la protección se realiza con aislamiento térmica.

4) Las observaciones generadas el 6 de marzo, en la página 39 y 40 están pendientes de subsanar.

5) Se recuerda que desde el 08 de Enero 2020 libro 1 de obra, página 163 se solicita al contratista la solución para sustentar la tubería de escape de la planta eléctrica.

6) Se solicita al contratista informar la fecha de llegada de los equipos eléctricos, celdas, transformadores, planta, a la obra.

7) Para la conexión eléctrica entre la celda de entrada/salida, la celda de protección, y el transformador, se necesita cable XLPE, actualmente en presupuesto no se contempló este cable, se pensaba en reutilizar el existente, pero confirmando medidas después de quitar los promoldeados, no es suficiente para la conexión, por ello se solicita al contratista crear un NP para Cable Al 3X120mm² 15KV XLPE

a) Para la entrega y energización ~~de~~^a CODESA
entonces sus requisitos solicitan realizar la
prueba VLF a la red XLPE, que debe ser
gestionada con el contratista y debe crear
un NP para esta actividad actualmente
no está dentro de los ítem del presupuesto.

Ing. Electricista
Intercentro

EN RELACION A LA OBRA ENTRE SUPERVISIÓN AL CALIDAD MAYOR BUDGETO E INTERVENCIÓN SE EVIDENCIA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A LAS CUALES SE SOLICITA DAR PRIORIDAD EN AREA DE ADMINISTRACIÓN.

- ① ESTRUCTURA DRY WALL EN AREA OFICINAS ABISERAS.
SUBDIRECCION Y OFICINAS 202.
- ② FALSO TECHO SUPER BOARD. COSTADO NORTE.
- ③ PLACA CONTRAPISO ZONA GENERADOR ELECTRICO.
- ④ AMPLIACION SUB ESTACION / OBRAS CIVIL.
- ⑤ RESTAURACION DE ACABADO PISO COSTADO SUR ARCHIVO.
- ⑥ POZO DE INSPECCION $D = 1.20$: EXCAVACIONES EXISTENTES PUEDEN PRESENTAR SUCUACION Y AFECTACION DE OBRAS COLINDANTE, CUALQUIER IMPREVISTO DEBE SER HUMADO POR EL CONTRATISTA.
- ⑦ SISTEMA DETECCION INTEGRADO PRIMER PISO AREA ADMINISTRATIVA.

SE SOLICITA IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA Y DAR
 CATERIDOS EN LA EFECTUACION DE LAS ACTIVIDADES.
 INFORMARME ANTERIORMENTE.

FERNANDO AGUIRRE
 RESIDENTE INTERVIEW

26-06-2020 Se revisa y verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad COVID-19 Incluyen OGGO y Resolución 01 (Toma de Temperatura, Desinfección de zapatos, prendas, maletas y se revisa las condiciones de salud de cada trabajador

- Se revisa y verifica el armado de andamios para el cambio de piezas de madera que están entre 1' y 14'.

- Se revisa y verifica que el personal tenga las papeles al día de la Seguridad Social.

- La Interventora Arquitectura Urbana LTDA. Informa el día Viernes 26 de Junio de 2020 ingreso a la sede Imprenta Distrital personal de seguridad de la empresa SEGURCOL por la entrada del parqueadero de vehículos particulares ingresa dicho personal incumpliendo con los protocolos de Bioseguridad COVID-19 que se tiene establecida en la Imprenta Distrital.

- Se revisa y verifica que se está cumpliendo con el mantenimiento y protección de las máquinas de la Imprenta Distrital. Insp Juan Carlos Buitán 

27/06/2020

Clima: mañana: nublado Tarde:

Personal de obra:

- 1 maestro
- 3 Red incendio
- 2 Electricos
- 5 Reemplazo de maderas
- 4 ayudantes
- 3 oficiales
- 1 Aseo

Actividades en ejecución:

1. Compactación de relleno B-400 en la zona de producción
2. Instalación de LCI en la zona de administración, segundo piso
3. Continúa la instalación de Tablero, tomas trifasicas en la zona de producción y cambio de elementos de madera.
4. Desincorporado de columnetas en la zona de subestación
5. Maquillaje de vigas aceras y columnas, zona de producción.
6. Testereo  en piso de la planta eléctrica.

Se establece nivel de cielo raso en pvc, oficina abierta de 2,32m de altura y en las dos oficinas un nivel de 2,27 m de altura,

Se continua con el remplazo de maderas de estructura de cubierta en la cercha 13 eje H. y Se da inicio a la Intervención de la cercha 12. eje I entre 2-4 identificando maderas a remplazar, todas las intervenciones de cambios de elementos estan siendo supervisadas y avaladas por la Interventoria. De igual manera se continua con la inmunización de los elementos nuevos a cambiar por el sistema de inmersión, y los que se encuentran instalados se estan inmunizando por el sistema de aspersión.

Se informa a la Interventoria que el dia Lunes 29 de Junio se va a laborar en la actividad de inmunización de maderas

Alejandra B
Residente Técnica.

Lunes 29 de Junio 2020.

El día de hoy se realizaron actividades correspondientes, a remplazo de maderas de cubierta e inmunización de las mismas.

Alejandra B
Residente

Martes 30 de Junio del 2020

1 maestro general / 1 almacenista

componente reforzamiento estructural.

1 oficial y 1 ayudante realizan Instalacion de malla electrica para flujo de contrapeso en cuanta de planta electrica.

- 1 oficial y 1 ayudante realizan encapado de acero eléctrico.
- 2 ayudantes realizan acero en área de producción,
- 4 oficiales y 1 ayudante continúan con la instalación de elementos en madera en el cerco 13
- 3 oficiales continúan con instalación de cableado y tablero eléctrico en área de producción,

EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVAN ACTIVIDADES A LAS CUALES SE DEBEN DAR INICIO. ASÍ:

- ① ESTRUCTURA DEL BAÑO AREA OFICINAS ABIERTAS Y OFICINA 202
- ② FALSO TECHO SUPER BOMBO, BOSTHO, NORTE.
- ③ AMPLIACIÓN SUB ESTACIÓN (MANIPULATORIA).
- ④ POZO INSPECCION DIAMETRO 1:20

IGUALMENTE SE SOLICITA ESTUDIO FINALIZADO DE PERFILES Y LAS PLANTAS PARA REFORZAMIENTO PUDERTEH E/G ENTRE E/G 12-14 SOLICITUD HECHA DESDE 23 JUNIO 2020.



 FERNANDO AGUILAR

 RESIDENTE INTERVENCION.

Se realiza liberación de aceros (malla electrosoldada pos. 5mm) y testeros para la fundida del piso de la planta eléctrica ubicada en Archivo, también se libera acero y viga de arriague para rampa de acceso a la planta eléctrica. Se realizó prueba de presión piso 1 área Administrativa a la red contra incendios, dejándola cargada a 3000 psi durante 1 día.

Expandiendo las observaciones de la Interventoría se mencionan lo siguiente:

1. En actividad de la instalación de cieloraso (estructura) aun no está con fecha de inicio entregada en la programación del 28 nov. Ya se cuenta con los materiales en obra, para dar inicio una vez se cuente con la documentación completa del personal.

2. Para el pozo de alcantarillado, se está realizando la compra de materiales (Ladrillo Telette,); se ha dificultado la compra por escasez y fabricación en esta pandemia.
3. Se están realizando las respectivas cotizaciones y estudio de mercado, correspondiente, para realizar la entrega.

Se realizó recorrido para la liberación de las cercas y/o elementos a intervenir de las maderas de la cubierta.

Entre los Residentes de Obra Arq. Alejandra Balanzas y Arq. Fernando Aguirre, se plasmó sobre un plano de taller los elementos a intervenir en cada este.

Alejandra 

Profesora Ambiental: Se realizó recorrido diario de obra verificando los siguientes puntos:

1) uso de epp por parte de los trabajadores en todas las zonas de la sede

2) Se revisó permisos de trabajo en alturas por parte del consorcio.

3) se revisó actividad de continuación de embalaje y limpieza de equipos y mobiliario en la zona producción.

4) Se revisó desinfección y limpieza de áreas con uso de aspersor.

Se solicita al contratista realizar la subsanación de las siguientes observaciones:

- 1) Señalizar con cinta acopio de maderas.
- 2) Señalizar zona del pozo.
- 3) Realizar recolección de escombros en la zona pozo. Diana C Morales V. 

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 MES DE JUNIO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"	0			

ANEXO No. 9 **CONTROL Y SEGUIMIENTO A PAGO DE APORTES DE** **SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA** **LTDA /CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 /**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4233000-730-2019

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

4233000-730 DE 2019

FECHA:

JUNIO DEL 2020

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	PORCENTAJE DEDICACIÓN	EXAMEN OCUPACIONAL	FECHA ÚLTIMO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	Hernando Daza Berrio	18.939.369	Director de Interventoría	Positiva	Cruz Blanca	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
2	Paula Fernanda Morales Sanchez	52.959.013	Coordinadora de Interventoría	Positiva	Compensar	Porvenir	100%	SI	04/06/2020
3	Diana Catherine Morales Velasquez	1.026.572.178	Residente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	Positiva	famisanar	Porvenir	100%	SI	16/06/2020
4	Fernando Aguirre Medina	7.182.768	Residente de Interventoría	Positiva	Compensar	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
5	Juan Carlos Briceño	79.389.138	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Positiva	Salud Total	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020
6	Jose Abelino Vargas Tenjo	1.057.463.178	Inspector de Interventoría	Positiva	Medimas	Porvenir	100%	SI	16/06/2020
7	Eyson Fernando Zambrano	8.092.810	Conductor	Positiva	Compensar	Proteccion	100%	SI	16/06/2020
8	Katty Andrea Farfan Arias	1.031.146.000	Procesional de Ingenieria Civil de apoyo	Positiva	Sanitas	Colpensiones	100%	SI	16/06/2020

"Dentro de los procesos de licitación Pública y concursos de Méritos, tener un trato preferencial con las personas discapacitadas así: "En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema preferencial con personas con discapacidad, la entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal, de la persona jurídica, según corresponda, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección". La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, presenta la documentación del personal con discapacidad siendo: certificado de vinculación del trabajador con discapacidad, el formato de constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad emitida por la entidad MINISTERIO DE TRABAJO, y el soporte de seguridad social del trabajador con discapacidad; del señor HERNANDO DAZA BERRIO identificado con cedula de ciudadanía No. 18939069 de Agustín Codazzi

 Banco Caja Social

105



\$ 1,532,400

105

105105

105



✓ Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Perpetua (P&P) de Montaña, S. de RL de CV	Nº:	00000000000000000000
Tipo planilla:		Periodo correspondiente:	Periodo correspondiente: Periodo correspondiente
Salud y Dependencia:	Dependencia	Periodo correspondiente:	Periodo correspondiente: Salud
Número de radiación:	00000000000000000000	Total a pagar:	00000000000000000000
Fecha de vencimiento:	00/00/0000	Total de empleados:	
Fecha de pago:	00/00/0000	Número de administradores:	

Detalles del pago

Redes social • contacto	Instagram, etc.	Mejor contacto	WhatsApp, etc.
Dispositivos	Smartphone, tablet, laptop, etc.	Medio de pago	Plata de contacto, tarjeta, etc.
Banco	BANCO SANTANDER	Normas de aplicación	Normas de
Estado de la transacción	Transacción aprobada		

Total:

[illegible]

Este documento es la clasificada como PRIVADO por parte de Compromiso y Explotación de Información

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.



ee_compensator@yandex.ru


Comdenale Valle
← 5.5 km

Cp Fe 

Adaptation: <http://www.xjtu.edu.cn/English/department/department.htm> (Department of English)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–376

Paciente: HERNANDO DAZA BERRIO
Identificación: CC 18939069



CERTIFICACIÓN

A quien Interese:

Certifico que HERNANDO DAZA BERRIO de 56 años identificado con documento CC 18939069 presenta DISCAPACIDAD PERMANENTE dada por diagnóstico médico de:

H908 HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA
Q172 MICROTIA

TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidad sensorial auditiva.

DEFICIENCIA: en estructura de sistema auditivo.

LIMITACION PARA LA ACTIVIDAD: Audición que genera limitación en procesos de comunicación.

RESTRICCION EN LA PARTICIPACION: Áreas principales de la vida, Interacción social asociado a procesos de comunicación por hipoacusia.

Se expide a solicitud del PACIENTE a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2019

Av Calle 26 # 66A 48 PBX:4441234-FAX:

www.compensar.com.co

VIGILADO Supersalud
Vigilado Supersalud

VIGILADO SuperSubsidio

DR. LUIS CARLOS RODRIGUEZ H.
cc1023887099
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
IPS Carlos Rangel SAS

Cordialmente

RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS CARLOS, MEDICINA FISICA REHABI



El empleo
es de todos

Ministerio del Trabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	4506
FECHA RADICADO:	10/02/2020
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	830098495-4

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MAS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MAS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: C/A x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.	10%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD0324

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 2 de marzo de 2020

IVAN MANUEL ARANGO PÁEZ

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.



PERSONAL ANTIGUO

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO	
1	SERVISEGURIDAD SAS	GUERRERO CORREDOR HANNER	80,125,709	TRANSVERSAL	AUXILIAR ELECTRICO	1030559043
2	SERVISEGURIDAD SAS	GARZON MARTINEZ CARLOS AUGUSTO	5,893,456	TRANSVERSAL	AUXILIAR ELECTRICO	1030559043
3	SERVISEGURIDAD SAS	PERALTA CASTELLANOS DORANCE	3,019,591	TRANSVERSAL	SUPERVISOR SERVIDSEGURIDAD	1030559043
4	SERVISEGURIDAD SAS	RUBIO VEGA MAICOL ESTEBAN	1,023,933,050	TRANSVERSAL	AUXILIAR ELECTRICO	1030559043
5	SERVISEGURIDAD SAS	CARLOS ADRIAN RIAÑO ROJAS	79,977,480	TRANSVERSAL	AUXILIAR ELECTRICO	1030559043

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020					
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO
6 TRANSPORTES ERI ROMERO SAS	ROMERO DUQUINO WILMARK ALEJANDRO	79,939,510	TRANSVERSAL	VOLQUETAS	649577985
7 TRANSPORTES ERI ROMERO SAS	ROMERO DUQUINO PEDRO ELKIN	80,133,031	TRANSVERSAL	VOLQUETAS	649577985

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA APORTADA	FECHA PASO ABOGADO (PROMEDIO)
NI	80086683-4	TRANSPORTES ELI HOARNO S.A.	CRA 9 BIS 127 A 32	5251958	eli508@hotmail.com	PLANILLA APORTADA	2020-06
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUBAS / MUNICIPIO	FECHA PAGO (DIAS MENOS)	TIPO PLANILLA
SUCURSAL	C - MIPTME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	FECHA PAGO (DIAS MENOS)	E
EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD							SI
CANTIDAD							4332641
TOTAL A PAGAR							\$4.105.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NT	Colización Obligatoria	UFC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113851-0	35.200	0	0	0	0	0	35.200
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.000	0	0	0	0	0	352.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.600	0	0	0	0	0	105.600
EPS008	Compensar EPS	880066942-7	35.200	0	0	0	0	0	35.200
EPS010	EPS Sura	80008702-2	140.800	0	0	0	0	0	140.800
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	246.400	0	0	0	0	0	246.400
									7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FFP - Subsidio	Aporte FFP - Subsidio	Valor Mens Colización	Valor Mens FFP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800226730-9	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	422.400	0	0	0	0	0	0	422.400	18
25-14	Compensar	800336004-7	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ART	Nombre	NT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Subsidio	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización		
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	1.588.800	0	0	1.588.800	0	0	0	1.588.800	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Aporte	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización	Valor Mens Colización	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	880007338-1	915.200	0	0	0	0	915.200	28

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	MM/AAAA				EMPLEADOS	UNC
PERIODO SALARIO					26	0
2020-06	2020-05	E		43226541	TOTAL A PAGAR \$4,105,400	

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipos Administrativa	No. Administraciones Reportadas	Valor en pesos de IGE, LMA, IMW y Merna	Total \$ Paper	
Salud	6	915,200	915,200	
Penalón	3	886,400	886,400	
Riesgos Laborales	1	1,868,800	1,868,800	
CCF	1	915,200	915,200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	11	4,105,400	4,105,400	

TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAMISCALES Y SALUD	
NI		800556883-4	TRANSPORTES COMERCIO SAS	CRA 5 BIS 127 A 32	6251658	e150a@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio		
C - MIPYME <td>PRINCIPAL <td>PRINCIPAL <td>PPAL <td>BOGOTÁ D.C. <td>BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td> </td></td></td></td></td>		PRINCIPAL <td>PRINCIPAL <td>PPAL <td>BOGOTÁ D.C. <td>BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td> </td></td></td></td>	PRINCIPAL <td>PPAL <td>BOGOTÁ D.C. <td>BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td> </td></td></td>	PPAL <td>BOGOTÁ D.C. <td>BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td> </td></td>	BOGOTÁ D.C. <td>BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td> </td>	BOGOTÁ D.C. <td colspan="2">SI</td>	SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO APORTADA (MM/AAAA)	FECHA PAGO (MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
2020-06	2020-05	2020-05	E	43326541
CANTIDAD				TOTAL A PAGAR
26				\$4.105.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CONTRANTE				INFORMACIÓN IDENTIFICADORA										Prestación			SALUD				MISMO LABORAL				CEP				PARAMISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Identificación	Edad	Sexo	Religión	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia	Residencia

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO	
8	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	MENA PALACIOS CARLOS MARIO	1,003,932,556	TRANSVERSAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	43125955
9	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	MATIZ TORRES JOSE GIOVANY	1,007,614,754	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
10	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE	1,018,480,030	TRANSVERSAL	AUXILIAR TECNICO	43125955
11	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	GARZON RAMIREZ XIOMARA GIMENA	1,023,939,775	TRANSVERSAL	ASEO GENERAL	43125955
12	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	MENA MENA JULIO	1,033,789,264	TRANSVERSAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	43125955
13	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	PEREIRA CALDERON RICHARD JOSE	1,049,930,112	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
14	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	DIAZ JULIO YEISON	1,050,955,439	TRANSVERSAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	43125955
15	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ALVARADO RUIDIAZ OMAR JESID	1,126,119,523	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
16	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	GUERRERO FLOREZ FRANCISCO DADINSON	11,705,453	TRANSVERSAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	43125955
17	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	VALOYES MOSQUERA JOSE ALIRIO	11,707,366	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
18	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CARBACAS GOMEZ MARILUZ	45,530,754	TRANSVERSAL	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	43125955
19	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	MOSQUERA MOSQUERA JUAN DESIDERIO	4,837,625	TRANSVERSAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	43125955
20	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	BOLAÑO CRUZ INGRID ALEJANDRA	55,131,681	TRANSVERSAL	RESIDENTE TECNICA	43125955
21	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	FONSECA VARGAS WILLIAM	74,381,366	TRANSVERSAL	RESIDENTE SST	43125955
22	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	AMARIS PALOMINO JOBER ANTONIO	77,132,092	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
23	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	GOMEZ GARCES FREDI	79,416,146	TRANSVERSAL	DIRECTOR DE OBRA	43125955
24	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	VALOYES VALENCIA LIBARDO	79,722,611	TRANSVERSAL	OFICIAL DE CONSTRUCCION	43125955
25	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	GRANJA PALACIOS VICTOR HUGO	80,871,279	TRANSVERSAL	MAESTRO DE OBRA	43125955
26	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	SANDRA LUCIA PARRA	52,261,860	TRANSVERSAL	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	43436943

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901284258-1	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CL 93 70 91 OFI 812
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		
		DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PASAPORTE Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO APORTES (planilla)	FECHA PAGO PLANILLA (DIARIO)	CANTIDAD
2020-06	2020-05	11/08/2020	18
TOTAL A PAGAR			\$3.181.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113631-0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.400	0	0	0	0	0	56.400
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	14.100	0	0	0	0	0	14.100
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0	0	0	0	0	200.000
EPS017	Familianar EPS	630003564-7	234.500	0	0	0	0	0	234.500
EPS037	Nature EPS	900158284-2	93.400	0	0	0	0	0	93.400
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901067473-5	14.100	0	0	0	0	0	14.100
ESS007	EPS-S Mutual Ser	800000304-7	14.100	0	0	0	0	0	14.100

TOTALES PENSION

Código APP	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes PGP - Subsidio	Aportes PGP - Subsidio	Días Bona	Valor Bona Coligación	Valor Bona PGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protection (ING + Protección)	800228729-9	53.000	0	0	0	0	0	0	0	53.000	5
230301	Provenir	800224008-3	220.200	0	0	0	0	0	0	0	220.200	10
231001	Collados	800227840-6	70.100	0	0	0	0	0	0	0	70.100	1
25-14	Colpasiones	800338004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Bona Coligación	Valor Bona PGP	Valor Bona a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	800603780-5	1.177.200	No. Autorización	Valor	1.177.200	0	0	0	1.177.200	1.177.200	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Bona	Valor Bona Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	MEC013078-3	676.800	0	0	676.800	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	801294258-1	CONSORCIO PRUN SEDES 04	CL 88 70 91 OFI 812	7441529	estilante@primaniversa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
7.100	0	0	7.100	1
10.600	0	0	10.600	1

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (PENDIENTE)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAGNOSTICO)	NÚMERO PLANILLA
PERSONAS SALUD	PERSONAS PERSONAS			
2020-06	2020-05	E	11/08/2020	43125855
				TOTAL A PAGAR
				\$3.161.600

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradores	No. Afiliados Reportados	Valor total de RZL LMA, RPP y Mora
Salud	8	708.600
Pensión	4	583.300
Riesgos Laborales	1	1.177.200
CCF	1	876.800
ESAP	0	0
ICBF	1	10.600
MEN	0	0
SENA	1	7.100
TOTALES	16	3.161.600
		3.161.600

TIPO		DATOS DEL APORTANTE				
NI	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
	807284259-1	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		CL 88 70 91 OFI 812	7441528	asistenta@primaindustrial.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 €			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXCOMISARIO PASO PAPAVERCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ABECEDA	FECHA INICIO ABECEDA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAJO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	FECHA DE BAJOS	FECHA DE PASEO				EMPLAZADOS	SPC
2020-06		2020-05	E	1/002/020	43128966	18	0
					TOTAL A PAJAR...	\$3,181,800	

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Último ingreso exitoso: 2020-06-17 / 06:00:52 PM | Último ingreso fallido: 2020-02-26 / 05:11:15 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Mayo 2020. Periodo Salud: Mayo 2020.

Junio 18 de 2020 / 6:55 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SANDRA LUCIA PARRA JIMENEZ	Nit:	52261860
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Mayo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2020
Número de radicación:	43436943	Total a pagar:	\$286,000
Fecha de vencimiento:	12/06/2020	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	19/06/2020	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electrónico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	656960354
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0.00	\$5,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$157,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$123,200
						\$286,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información [» Ver planillas pagadas](#)

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla esté PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

[Imprimir transacción](#)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

 [miplanilla.com](https://www.miplanilla.com/)

 **Comfenalco Valle**
del agente

 **certicámara**

Powered by  

Acercas de los
certificados SSL



CC-8003-1

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO	
UNIVERSAL SEC SAS	CARRILLO ROJAS SAMUEL EDUARDO	7,717,488	TRANSVERSAL	REPRESENTANTE LEGAL	43130616	

27

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAISO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAISO (MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					ENCARGADO
					0
PAYROLL SALUD	2020-05	PAYROLL PSICOLOGIA	2020-05	E	
2020-06				43790816	
					TOTAL A PAGAR
					\$1,102,000

Código EPS	Número	M/T	Total en Colónes
EPS005	Sinfin EPS	900251440-6	184.100
EPS010	EPS Sura	8000B8702-2	200.000

[illegible][illegible]

Código ARL	Nombre	NTF	Cotización		Aportes Otros Semanas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	No. Remolde Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	800011153-4		45,600		45,600	0	45,600			456	45,600	4

Cedlogs CCF	Number	MT	Value Assets	Dis More	Value More Assets	Total & Pages	No. Affidavits
CCF21	Calum	860013570-3	384,100	0	0	384,100	4

Value Agents	Days Mera	Value More Agents	Total a Page	No. Affiliates
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
SCSF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administraciones	En mil	No. Administraciones Reportadas	Valor por mes de IZSE, LIMA, RPP y Mera		Total a Pagar
Pensión		2	384.100		384.100
		3	288.200		288.200
Pagos Laborales		1	45.800		45.800
CCF		1	384.100		384.100
ESAP		0	0		0
ICBF		0	0		0
MEN		0	0		0
SENA		0	0		0
TOTALES		7	1.102.000		1.102.000

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900460588-6	UNIVERSAL SCS SAS	CALLE 98 N 70-91 OFI 612
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL
DEPARTAMENTO		BOGOTÁ D. C.	
CIUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (QUINTESIMANO)
	2020-05	E	17/05/2020
PENSAJE SALUD	PENSAJE PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2020-06		43139116	4
TOTAL A PAGAR			\$1.102.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVENA												PREMIOS				SALUD				REDES LABORALES				CCF				PARAMORALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos / Nombres	Estado	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva</

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020					
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO
GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS	CASTAÑO BARRETO OSCAR	79,321,873	TRANSVERSAL	COORDINADOR DE PROYECTOS	43083209

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830110735-8	GRUPO CONSTRUCTOR PRIMERA	CALLE 88 N 70-81 OFI 812
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIRECCIÓN
UNICA	B - menos de 200 c		
CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
asistia@primamunivest.com			
CÓDIGO		CIUDAD / MUNICIPIO	
BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	
DEPARTAMENTO		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PARA ASOCIAR (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (MES/AÑO)
	2020-06	E	11/06/2020
MONTOS PAGOS			CANTIDAD
MONTOS PAGOS			5
MONTOS PAGOS			0
MONTOS PAGOS			0
MONTOS PAGOS			5897.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	30.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	200.000
EPS008	Compensar EPS	860308942-7	19.200
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.000

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
230301	Porvenir	800224008-8	27.000
231001	Colombia	800227040-8	73.300
25-14	Colopaciones	900330004-7	134.400

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.400

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre
CCF21	Callam

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	30.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	200.000
EPS008	Compensar EPS	860308942-7	19.200
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.000

Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
230301	Porvenir	800224008-8	27.000
231001	Colombia	800227040-8	73.300
25-14	Colopaciones	900330004-7	134.400

Código ARL	Nombre	NIT	Colectación Obligatorio
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.400

Código CCF	Nombre
CCF21	Callam

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830110735-8	GRUPO CONSTRUCTION BRILMA S.A.S.	CALLE 98 N 70-91 OFI 512
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		CORREO	
		asistente@planillaintegrada.com	
CIUDAD / MUNICIPIO		DEPARTAMENTO	
BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.	
SI			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO (DIAMENSA)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
	2020-05	E	41783209
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-05	\$987.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN EDITANTE									
INFORMACIÓN NOVEDADES									
PERSONA									
RESUMEN LABORALES									
SALUD									
ECF									
PARAFISCALES									
TOTAL									
Nº	Tip	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Salud	Salud	Salud	Salud
1	CC	1010204184	RODRIGUEZ ALVAREZ GERMAN CAMILO	25-14	M	250301	900.000	14-23	900.000
2	CC	1014244109	ORTIZ LANDIREZ ANDREA CATALINA	25-14	F	250302	480.000	14-23	480.000
3	CC	1030617297	LINARES UNARES DIEGO ALEXANDER	25-14	M	251001	1.450.000	14-23	1.450.000
4	CC	5278212	AVENDADO GONZALEZ SANDRA MILENA	25-14	F	251001	1.000.000	14-23	1.000.000
5	CC	17021173	CANTINO BARRERA OSCAR	25-14	M	251001	4.000.000	14-23	4.000.000

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
EMPRESA	TRABAJADOR*	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO	
29 ASESOR ELECTRICO	VALENCIA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	75,064,933	TRANSVERSAL	ASESOR	1030212483	

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGERETIE SAS		
Documento	NI 900735305	Dirección	CR 20 #45 A - 08
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6408684
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	VALENCIA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	Identificación	CC 75064933
		Total Afiliados	3

1. DATOS DEL AFILIADO

Documento	Residente	Exonerado	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 75064933						
Tipo Cotizante 01	00		VALENCIA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 61.100	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 457.000

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO	
30	ASESOR ESTRUCTURAL	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACABO	80,073,609	TRANSVERSAL	ASESOR	9406964102

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80073609		PIRELLA RODRIGUEZ JUAN JACOB	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 127 46 71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	9261778	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Límite	Fecha	Pago	Valor
2020-05	2020-05	64388192	1405916102	1			2020-06-01	2020-06-01	MANCIB CLIA SOCIAL	\$288,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 80073609	PIRELLA RODRIGUEZ JUAN JACOB	23-14	30	\$1,800,000	\$54,000	EP5044	30	\$1,800,000	\$225,000				\$0				\$0				\$0	
Total					\$1,800,000	\$54,000			\$1,800,000	\$225,000				\$0				\$0				\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$288,400	\$0	\$0	\$288,400

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO JUNIO 2020						
	EMPRESA	TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO DE TRABAJO	CARGO	PLANILLA JUNIO
31	ANCER CONSTRUCTOR SAS	AVILA ANGELICA	1,019,071,725	TRANSVERSAL	COORDINADORA	9407132030
32	ANCER CONSTRUCTOR SAS	GUTIERREZ CESAR	1,019,066,733	TRANSVERSAL	ASESOR	9407132030

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901206446	1	ANCER CONSTRUCTORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAMARIA 2DO SECTOR	Calle 134a # 111a - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7573874	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-05	655485601	9407132030	E	2020/06/17	2020/06/17	BANCOLOMBIA	7	\$221,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION		
			Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Saldo	Saldo	Saldo
			Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Saldo	Saldo	Saldo
SUCURSAL: VILLAMARIA 2DO SECTOR (2 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO E (2 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)									
1	655485601	ANGELA ANGELICA					\$1,228,925	\$1,228,925	\$1,228,925
2	655485601	ANTHONY CESAR					\$1,228,925	\$1,228,925	\$1,228,925
Total Afiliados (2)							\$2,457,850	\$2,457,850	\$2,457,850

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901206446	1	ANCER CONSTRUCTORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAMARIA 2DO SECTOR	Calle 134a # 111a - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7573874	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-05	655485601	9407132030	E	2020/06/17	2020/06/17	BANCOLOMBIA	7	\$221,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000	\$37,000	\$37,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400	\$26,400	\$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$85,600	\$0	\$0	\$10,600	\$10,600	\$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600	\$85,600	\$85,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	\$49,300	\$0	\$0	\$49,300	\$49,300	\$49,300
TOTAL			2	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	\$221,200	\$221,200

DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIONES DE LA PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	830110735-8	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS	CALLE 68 N 70-81 OFI 812	7441528	asistente@ordinarunivessal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (RANGEZADO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (RANGEZADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC
2020-06		2020-05	E	11/08/2020	43083208	5	0
						TOTAL A PAGAR	
						\$897.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	35.000
EPS005	Sanitas EPS	800281440-6	200.000
EPS008	Compasar EPS	850066942-7	18.200
EPS010	EPS Sura	900098370-2	58.000

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Otro Mens	Valor Mens Colización	Valor Mens UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	38.000	0		0			0	0	0	38.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0			0	0	0	200.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	18.200	0		0			0	0	0	18.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.000	0		0			0	0	0	58.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFR	Nombre	NIT	Contribución Obligatoria
230301	Poncharé	800224603-8	27.000
231001	Colombas	800227940-6	73.500
25-14	Colombas	800339004-7	134.300

TOTALES PENSIÓN											
Código APP	Nombre	NIT	Calificación Oligarquía	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subsidizada	Días Mens	Valor Mens Cotización	Valor Mens PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponaville	800224038	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	1
231001	Culindas	8002279405	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500	2
25-14	Copacabanas	8003390347	134.400	0	0	8	0	0	0	134.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTAL DE RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	Catización Obligada
14-23	Positiva Semestre	NT
		DE0014452.0

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NTF	Certificación Obligatoria	Incapacidades		Agortes Otros Solicitudes	Valor Hora Colaboración	Bonos Mora	Valor Mora Colaboración	Bonobols Colaboración	Mn. Realizado Bolsas a Favor	Valor Bolsas a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	Mn. Afiliados
				No. Autorizadas	Valor										
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	36.400				36.400	0	0	36.400			364	36.400	5

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF21	Calam

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Votar Aporte	Bols More	Votar More Aporte	Total a Pagar
CCF21	Calum	950011870-3	313.200	0		313.200
						6

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
0	0	0	0	0	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MENA					

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administrativa	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de ICS, LIMA, por y More	Total a Pagar	
Solid.	4	313.200	313.200	
Pensión	3	234.800	234.800	
Pasepas Librería	1	38.400	38.400	
CCF		313.200	313.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	- 0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	8	897.700	897.700	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	830110735-8	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS	CALLE 68 N 70-81 OFI 812	7441523	asistente@prismauniversal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PARA ASIGNARLA (PARALELA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (PARALELA)	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5 0
2020-06	2020-05	E	11/06/2020	43083208	TOTAL A PAGAR \$897.700

[illegible]

 	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	Versión: 3.0
		Fecha: Marzo 14 de 2019
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	36383
FECHA RADICADO:	18/10/2019
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS
IDENTIFICACIÓN:	830110735-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD0252

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 29 de octubre de 2019

IVAN MANUEL ARANGO PÁEZ

Verificó y Elaboró: IVANEGAS. 

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 MES DE JUNIO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA <small>ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ"</small>	0			

ANEXO No. 10

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INGRESOS PERSONAL NUEVO

CONSOLIDADO PERSONAL NUEVO QUE INGRESO EN EL PERIODO JUNIO 2020

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	AFP	EPS	FECHA CERTIFICADO DE ALTURAS	EXAMEN MEDICO INGRESO	INGRESO / NO INGRESO
1 HORINCO SAS	IMPRESA DISTRITAL	EMMANUEL CASTELLANOS CORTES	1,001,325,038	INSTALADOR	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	22/02/2020	20/02/2020	SI
2 HORINCO SAS	IMPRESA DISTRITAL	LUIS MIGUEL ACEVEDO MOLINA	1,066,529,509	INSTALADOR	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	30/05/2019	12/06/2020	SI
3 HORINCO SAS	IMPRESA DISTRITAL	NICOLAS YANPOOL ORTEGON ANZOLA	1,023,957,343	INSTALADOR	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	3/07/2019	28/06/2019	SI
4 CARTISAVAL SAS	IMPRESA DISTRITAL	ALEXANDER CASTRO CUMBE	80,493,057	OFICIAL	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	19/01/2020	8/01/2020	SI
5 CARTISAVAL SAS	IMPRESA DISTRITAL	JURGEN RENE CASTRO ROJAS	1,098,703,052	OFICIAL	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	19/01/2020	8/01/2020	SI
6 CARTISAVAL SAS	IMPRESA DISTRITAL	LUIS EDUARDO MUÑOZ MANJARRES	1,123,730,397	OFICIAL	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	18/01/2020	17/01/2020	SI
7 CARTISAVAL SAS	IMPRESA DISTRITAL	HAROLD RICARDO SANCHEZ ARAGON	79,518,118	AYUDANTE	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	9/07/2019	23/01/2020	SI
8 CARTISAVAL SAS	IMPRESA DISTRITAL	DAVID SOLAR HOYOS	1,037,472,861	AYUDANTE	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	4/03/2020	18/01/2020	SI
9 HIDRINCO SAS	IMPRESA DISTRITAL	OSCAR ANDRES OBANDO REYES	1,030,612,235	SUPERVISOR	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	6/02/2020	6/02/2020	NO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.001.325.038
CASTELLANOS CORTES

APELLIDO
EMMANUEL

EMMANUEL CASTELLANOS



OK



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1997

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

M

SEXO

28-DIC-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRARIO NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA LAZAR



P 1502150 01015377 M 1001325038 20160010

0061570516A 1

9974021360

105

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:

TOTAL PAGADO:	\$ 157.900
----------------------	-------------------

TOTAL PAGADO:	\$ 98,800
----------------------	------------------

105

Marshall Islands

Recibido por:

**Certificado de
Aptitud Laboral
Ingreso**



Fecha: 20/Feb/2020, Hora: 07:33:09 a.m.

Apellido: CASTELLANOS CORTES

Tipo Doc: CC

Empresa: HIDRINCO S.A.S.

Cargo: INSTALADOR

Lugar:

Direccion: Cra 58 No. 4B-53

Telefono: 3125304780-Jose Celular: 3125447675

Ciudad: Bogota D.C. - Puente Aranda

Nombre: EMMANUEL

Nro Identidad: 1001325038

HC: # 46626

Edad: 22 años

Sexo: Masculino ♂

Nacim: 25/Dic/1997

Rh: O+

Email: cmanueldc97@hotmail.com Estado Civil: Soltero

Exámenes Realizados

Audiometria Tamiz, CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS, Espirometria, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional con énfasis Osteomuscular, Glicemia, Perfil Lipidico, Visiometria

Concepto

Apto Para Trabajos En Alturas

Recomendaciones

Uso de EPP, Higiene Postural, Pausas Activas, Estilo De Vida Saludable, Higiene Y Seguridad En El Trabajo, Seguir Medidas Antivarices

Observaciones

IMPORTANTE:

1 - El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

2 - Señor(a) trabajador: a partir de la fecha, usted cuenta con 30 días para seguir y realizar las indicaciones del médico especialista en salud ocupacional registradas en este documento.

DECLARACION DEL ASPIRANTE: Manifiesto con mi firma o huella que no omiti datos relevantes en mis antecedentes que pudieran influir sobre la evaluación de mi estado actual de salud

Oscar Mauricio Monroy Suárez
Medico Esp. Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 6874/090819

Emmanuel C

EMMANUEL CASTELLANOS CORTES
CC 1001325038



Huella
Digital



CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

En cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017 Expedidas por el
Ministerio de trabajo para orientar formación en trabajo en alturas.

HACE CONSTAR:
EMMANUEL CASTELLANOS CORTES

Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1001325038

Asistió y Aprobó la acción de formación:
NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una intensidad horaria de 20 horas, los días 21 AL 22 del mes de FEB de 2020

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C.

Representante Legal DR NORMA RAMIREZ
Licencia Salud Ocupacional
No. 7545

Entrenador ELGA JOHANNA GARCIA
Licencia Salud Ocupacional
No. 0323/2012

Ente certificador ICONTEC Cod.
CS-CER657171



CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 1.066.529.509

ACEVEDO MOLINA

LUIS MIGUEL



Luis Miguel Acevedo

047



FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1998

AYAPEL
(CORDOBA)

1.69 A+ M

26-ENE-2017 AYAPEL

[Signature]

REGISTRACION NACIONAL
DE IDENTIFICACION



1 100140 CORDOBA 10-1066529509 2017-0410 0054911350A 2 47774966

Ku/ram 1708

105

[illegible][illegible][illegible]

Marilla Page 22

Recibido por:

Certificado de Aptitud Laboral Periodico



Fecha: 12/Jun/2020. Hora: 09:07:11 a.m.

Apellido: ACEVEDO MOLINA

Tipo Doc: CC

Empresa: HIDRINCO S.A.S.

Cargo: INSTALADOR

Lugar:

Dirección: CL 158 N-102 - 09

Teléfono: 3187051040 DEIBIS

Soltero

Ciudad: Bogotá D.C. - Suba

Nombre: LUIS MIGUEL

Nro Identidad: 1066529509

HC: # 48004

Edad: 21 años

Sexo: Masculino ♂

Nacim: 24/Nov/1998

Rh: A+

Celular: 3126868266 Email: LUIS2ACEV24@GMAIL.COM Estado Civil:

Exámenes Realizados

Audiometría Tamiz, CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Periodico con énfasis Osteomuscular, Glicemia, Optometria, Perfil Lipidico

Concepto

Apto Para Trabajos En Alturas, Apto Para Continuar Labor Actual Con Recomendacion Puntual

Recomendaciones

Uso de EPP. Higiene Postural, Pausas Activas, Estilo De Vida Saludable, Higiene Y Seguridad En El Trabajo, Usar Lentes Permanentes. Valoracion Optometria

Otras: LA EMPRESA COMO EL TRABAJADOR DEBEN ATENDER MUY PUNTUAL y ESTRUCTAMENTE LAS NORMAS y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD REGLAMENTADAS POR LOS ENTES DE CONTROL, A FIN DE PODER DESEMPEÑAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES LABORALES CON EL MENOR RIESGO POSIBLE DE CONTAGIO, TANTO A NIVEL PERSONAL COMO COMUNITARIO.

Observaciones

JUNIO 12 DE 2002: LUEGO DE HACER LA VALORACIÓN MEDICA OCUPACIONAL, SE CERTIFICA QUE EL ASPIRANTE EN MENCIÓN, SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE ASINTOMÁTICO y SIN SIGNOS CLÍNICOS EVIDENTES QUE SUGIERAN PROCESO INFECCIOSO ALGUNO. ESPECÍFICAMENTE PARA PENSAR EN CONTAGIO CON CORONAVIRUS u OTROS GÉRMENES CIRCULANTES EN EL AMBIENTE. LA PRESENTE OBSERVACIÓN SE HACE ATENDIENDO LO INDICADO EN LA CIRCULAR EXTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA REGLAMENTACIÓN GENERADO POR LA PANDEMIA ACTUAL-COVID 19.

IMPORTANTE:

1 - El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

2 - Señor(a) trabajador: a partir de la fecha, usted cuenta con 30 días para seguir y realizar las indicaciones del médico especialista en salud ocupacional registradas en este documento.

DECLARACION DEL ASPIRANTE: Manifiesto con mi firma o huella que no omiti datos relevantes en mis antecedentes que pudieran influir sobre la evaluación de mi estado actual de salud



**EL CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS**

HSEQ - UMLV

H.S.E.Q.

Labon Vital

No. Aprobación Mintrabajo: 08SE2019220100000012853

Nit. 900.891.785-1

PBX: 298 3537 Etx. 103

**CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS**

En cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017 Expedidas por el
Ministerio de Trabajo para orientar formación en trabajo en alturas.

CERTIFICA QUE

LUIS MIGUEL ACEVEDO MOLINA

IDENTIFICADO CON C.C. No. **1066529509** DE **CORDOBA**

**CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NIVEL AVANZADO**

CON UNA INTENSIDAD DE 40 HORAS LOS DÍAS 27-28-29-30 DEL MES MAYO DE 201 9

Edgar Rodríguez

**EDGAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

Licencia Salud Ocupacional No. 11893/18

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C.

Lizandro García

ENTRENADOR: LIZANDRO GARCIA

Licencia Salud Ocupacional No. 25-954/17

Verifique su certificado en www.unidadmedicalaborvital.com

Ente certificador: ICONTEC Cod.

CS-CER657171

Registro No.

0000145

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.023.957.343

ORTEGON ANZOLA

NICOLAS VANPOOL

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1996

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 A+ M

ESTATURA G.S. PM SEXO

27-ENE-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRACION NACIONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

[Barcode]

0043257691A 1 44025184

105

[illegible][illegible]

Planilla pagada

Recibido por:

**Certificado de
Aptitud Laboral
Ingreso**



Fecha: 28/Jun/2019, **Hora:** 08:31:03 a.m.

Apellido: ORTEGON ANZOLA

Nombre: NICOLAS YANPOOL

Tipo Doc: CC

Nro Identidad: 1023957343

Empresa: HIDRINCO S.A.S.

Cargo: OFICIAL DE OBRA

Lugar:

Dirección: CR 12 A ESTE N 37 SUR - 14

Teléfono: Celular: 3134884018

Email: NICOLASYANPOOL@GMAIL.COM

HC: # 38624

Edad: 23 años

Sexo: Masculino ♂

Nacimiento: 14/May/1996

Rh: A+

Soltero

Estado Civil:

Ciudad: Bogotá D.C. - San Cristóbal

Exámenes Realizados

Audiometría Tamiz, CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS, Espirometría, Examen Alturas, Glicemia, Perfil Lipídico, Visiometría

Concepto

Apto

Recomendaciones

Uso de EPP, Higiene Postural, Pausas Activas, Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

IMPORTANTE:

1 - El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

2 - Señor(a) trabajador: a partir de la fecha, usted cuenta con 30 días para seguir y realizar las indicaciones del médico especialista en salud ocupacional registradas en este documento.

DECLARACION DEL ASPIRANTE: Manifiesto con mi firma o huella que no omití datos relevantes en mis antecedentes que pudieran influir sobre la evaluación de mi estado actual de salud

Dr. JULIO E. SILVA RODRIGUEZ
Médico General
Registro Médico: 157781
Registro de la Especialidad: Salud Ocupacional
Especialidad: Salud Ocupacional
C.C. 1023957343



JULIO E SILVA RODRIGUEZ



**NICOLAS YANPOOL ORTEGON
ANZOLA
CC 1023957343**



**Huella
Digital**

Dirección: Cl. 81 #19A-12, Bogotá D.C.

6222445 - 2044352 - diamedical@gmail.com

H.S.E.Q.

Labor Vital

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

En cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017 Expedidas por el
Ministerio de trabajo para orientar formación en trabajo en alturas.

HACE CONSTAR:

NICOLAS ORTEGON ANZOLA

Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1023957343

Asistió y Aprobó la acción de formación:

NIVEL AVANZADO

Con una intensidad horaria de 40 horas, los días 28-29 Y 2-3 del mes de JULIO de 2019

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C.

Ente certificador ICONTEC Cod.
CS-CER657171

El ap

Representante Legal
Licencia Salud Ocupacional
No. 11893

Nelson Segura

Entrenador NELSON IVAN SEGURA
Licencia Salud Ocupacional
No. 12078

H.S.E.Q.

Labor Vital

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
MINISTERIO DE INTERIORES

C.C. 30 493.057
CASTRO CUMBE

ALEXANDER

[Handwritten signature]



Clínica IPS Resolución No 10519 de 24/08/2017

Nit: 900540214-0

EXAMEN DE: INGRESO ENFASIS ALTURAS

Control: 0

Bogotá, Enero 08 de 2020

Hora: 8,47

DATOS GENERALES

No Identificación: 80493057

Paciente: CASTRO CUMBE ALEXANDER

Fecha Nacimiento: Julio 07 de 1975

Lugar: GIRARDOT

Edad: 44

Estado Civil: SOLTERO (A)

No Hijos: 0

Sexo: Masculino

Escolaridad: SECUNDARIA COMPLETA

DATOS LABORALES

Empresa: CARTISAVAL CONSTRUCCIONES

Empresa Misión: NO APLICA

EPS: FAMISANAR

Act. Económica:

ARI: POSITIVA

AFP: COLPENSIONES

Cargo a Ocupar: OFICIAL

EXAMENES PARACLINICOS

Audiometría: VALORACION DE BANDAS CONVERSACIONALES, AGUDAS Y CONDICION AUDITIVA (NORMAL)

Visionometría: VISION LEJANA, PROXIMA, DE COLOR, PROFUNDIDAD, FONDO DE OJO, OTROS (NORMAL)

Psicométrico: NO SE REALIZA

Espirometría: CAPACIDAD VITAL FORZADA, VOLUMEN Y FLUJO ESPIRATORIO (NORMAL)

Optometría: NO SE REALIZA

Otros: PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO
CAMBIOS DE HABITOS ALIMENTARIOS, REALIZAR EJERCICIOS

RECOMENDACIONES
Uso elementos protección personal indicados para la actividad
Pausas Activas para MMSS
Higiene postural y de columna
Recomendaciones Dietarias

OBSERVACIONES
NINGUNO

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS ALTURAS

Declaración del trabajador. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora arriba mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.



Dr. Carlos A. Cárdenas S.
Especialista en Gerencia en
Medicina Resolución 155
10 de Enero del 2019
CARLOS ANTONIO GARCIA-SANCHEZ

CARTELA FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

REGISTRO MÉDICO: 4516

CLÍNICA S.O. RESOLUCIÓN 753

Alexander castro

FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE: CASTRO CUMBE ALEXANDER

CEDULA: 80493057



CR BAC N° 77-81
LAS FERIAS BOGOTÁ - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ORGANISMO CERTIFICADOR: BUREAU VERITAS
CODIGO DE ACREDITACION: 09-CPR-008

F-PS-010
VERSION 04

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL NUMERO 085E201822000000037067

A&E OCUPACIONALES

CERTIFICA QUE

ALEXANDER CASTRO CUMBE

Identificado con: Cedula Ciudadania

No. 80493057

NIVEL:

REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE

2020-01-18 / 2020-01-19

20 Horas

2020-01-19

Bogotá
Fecha de la Realización
de la Capacitación

Bogotá
Fecha de la Expedición
del certificado


SANDRA PACLÁ ICAÍ GUERRERO
Licencia en SST empresa
1143E 02 10-2017
Representante Legal


LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS
C.U. 1019065192
Licencia 1245 de 23-10-2012
ENTRENADOR

Código
80493057

La autenticidad de este documento se puede
verificar en <http://www.ayeocupacionales.com.co>
o al número de contacto 305 897 44 99

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.703.052

CASTRO ROJAS

APELLIDOS

JURGEN RENE

NOMBRES

JURGEN RENE CASTRO

FIRMA



OK



FECHA DE NACIMIENTO: 23-DIC-1990

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-2009 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-2700100-00158765-M-1098703052-20090607 0012254553A 32711334

Resolución No 10519 de 24/08/2017
Nº: 900540014-0

TIPO DE: INGRESO ENFASIS ALTURAS

Bogotá, Enero 08 de 2020

Hora: 8,59



DATOS GENERALES

Identificación: 1098703052 Paciente: CASTRO ROJAS JURGEN RENE

Fecha Nacimiento: Diciembre 23 de 1990 Lugar: BUCARAMANGA

Estado Civil: UNION LIBRE No Hijos: 0

Edad: 29

Educación: SECUNDARIA COMPLETA

Sexo: Masculino

EXAMENES LABORALES

Empresa: CARTISAVAL CONSTRUCCIONES

Grupo: FAMILIAR

Grupo: POSITIVA

Grupo: OFICIAL

Empresa Misión: NO APLICA

Act. Económica:

AFP: COLPENSIONES

EXAMENES PARA CLINICOS

Valoración de Bandas Conversacionales, Agudas y Conexión Auditiva (NORMAL)

Vision Lejana, Proxima, de Color, Profundidad, Fondo de Ojo, Otros (NORMAL)

NO SE REALIZA

Capacidad Vital Forzada, Volumen y Flujo Espiratorio (NORMAL)

NO SE REALIZA

Perfil Lipídico (NORMAL) Glicemia Basal (NORMAL)

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES
Realizar los elementos de protección propios del cargo
Cuidar los hábitos alimentarios, realizar ejercicios

RECOMENDACIONES
Utilizar los elementos de protección personal indicados para la actividad
Cuidar la alimentación para la salud
Cuidar la salud y de columna
Cuidar la salud dental

OBSERVACIONES

ADJUNTO MEDICO CON ENFASIS ALTURAS

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado. Firmo: [Firma] y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.

Dr. Carlos A. Sánchez
C.R. 4516
CARLOS SANCHEZ
C.R. 4516

RESOLUCION 753
Firma del Paciente
Nombre: CASTRO ROJAS JURGEN RENE
Cédula: 1098703052



CR ESC N° 77 - 61
LAS FERIAS BOGOTÁ - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ORGANISMO CERTIFICADOR: BUREAU VERITAS
CÓDIGO DE Acreditación: 05-0071-003

2428-003
VERSIÓN: 01

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL NÚMERO 08SE2816230000500227087

A&E OCUPACIONALES

CERTIFICA QUE

JURGEN RENE CASTRO ROJAS

Identificado con: Cédula Ciudadanía

No. 1098703052

NIVEL

REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE

2020-01-18 / 2020-01-19

20 Horas

2020-01-19

Bogotá
Fecha de la Realización
de la Capacitación

Bogotá
Fecha de la Expedición
del certificado


SANDRA PAOLA LIZA GUERRERO
Urbana en SST empresa
1455 (2011-2017)
Representante Legal


LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS
C.C. 1019065192
Cedula 1245 de 29-10-2012
ENTRENADOR

Código
1098703052

La autenticidad de este documento se puede
verificar en <http://www.ayecapocasionales.com.co>
o al numero de contacto 305 897 44 89

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.730.397

MUÑOZ MANJARREZ
APELLIDOS

LUIS EDUARDO
NOMBRES

Luis E. Muñoz



OK



FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1985

EL MOLINO
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEX

21-FEB-2005 EL MOLINO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REQUISITO NACIONAL



P-4600600-00004534-M-1123730397-20170512 0055382650A 3 6738849237

Preventsalud IPS Resolución No 10519 de 24/08/2017
Nit: 900540214-0

EXAMEN DE INGRESO ENFASIS ALTURAS

CONTROL: 0

Bogotá, Enero 17 de 2020

Hora: 8,01

DATOS GENERALES

No IDENTIFICACIÓN: 1123730397 PACIENTE: MUÑOZ MANJARREZ LUIS EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: Noviembre 16 de 1985 LUGAR: LA GUAJIRA

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE No HIJOS: 3

EDAD: 34

SEXO: MASCULINO

ESCOLARIDAD: SECUNDARIA INCOMPLETA

DATOS LABORALES

EMPRESA: CARTISAVAL CONSTRUCCIONES

EPS: FAMISANAR

ARL: SURA

CARGO A OCUPAR: OFICIAL

EMPRESA MISIÓN: NO APLICA

ACT. ECONÓMICA:

AFP:

PORVENIR



EXAMENES PARACLINICOS

AUDIOMETRÍA: VALORACIÓN DE BANDAS CONVERSACIONALES, AGUDAS Y CONDICION AUDITIVA (NORMAL)

VISIOMETRÍA: VISION LEJANA, PROXIMA, DE COLOR, PROFUNDIDAD, FONDO DE OJO, OTROS (NORMAL)

PSICOMÉTRICO: NO SE REALIZA

ESPIROMETRÍA: CAPACIDAD VITAL FORZADA, VOLUMEN Y FLUJO ESPIRATORIO (NORMAL)

OPTOMETRÍA: NO SE REALIZA

LABORATORIOS: PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

OTROS:

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESTRICCIONES MÉDICAS

NINGUNA

RECOMENDACIONES MÉDICAS

CAMBIOS DE HABITOS ALIMENTARIOS, REALIZAR EJERCICIOS

UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

RECOMENDACIONES LABORALES

USO ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS PARA LA ACTIVIDAD

PAUSAS ACTIVAS PARA MMSS. SEGÚN PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.

HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA PARA EVITAR LESIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACION DIETARIAS BAJA EN CARBOHIDRATOS (AZUCARES) LIPIDOS (GRASAS)

CAPACITACIÓN EN trabajo seguro, plan emergencia, riesgo ergonomico

OBSERVACIONES

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS ALTURAS

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicas y permitieron la elaboración del presente médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora arriba certificado mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.


Dr. Carlos A. Sánchez
Especialista en Gerencia en
Medicina del Trabajo
Licencia: Resolución 753
18 de Enero del 2019

CARLOS ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO)

REGISTRO MÉDICO: 4516


LICENCIA: RESOLUCION 753



FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE: MUÑOZ MANJARREZ LUIS EDUARDO

CEDULA: 1123730397



CR-68C N° 77-61
LAS FERIAS BOGOTÁ - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ORGANISMO CERTIFICADOR: BUREAU VERITAS
CODIGO DE ACREDITACION: 03-CPR-008

F:PS-010
VERSION 04

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL NUMERO 08SE2018220000000027067

A&E OCUPACIONALES

CERTIFICA QUE

LUIS EDUARDO MUÑOZ MANJARREZ

Identificado con: Cédula Ciudadanía

No. 1123730397

NIVEL

REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE

20 Horas

2020-01-17 / 2020-01-18

2020-01-18

Bogotá

Fecha de la Realización
de la Capacitación

Bogotá

Fecha de la Expedición
del certificado

SANDRA PAOLA LEAL GUERRERO
Licenciada en SST empresa
11436 02/10/2017
Representante Legal

ALEJANDRO ZAPATA MONTERO
C.C. 10452650
Licencia 2129 de 01-05-2018
ENTRENADOR

Código:
1123730397

La autenticidad de este documento se puede
verificar en <http://www.aeocupacionales.com.co>
o al numero de contacto 300 897 44 99

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.518.118

SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS

HAROLD RICARDO

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

22-DIC-1969

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70

A+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

23-MAY-1988 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00377613-M-0079518118-20120522

0030004572A 1

1331821350

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD LABORAL

CU 15 Sur No. 16-46 Tel: 757 53 35



Resolución No 10519 de 24/03/2017
RIF 990546214-0

EXAMEN DE INGRESO ENFASIS ALTURAS

CONTROL: 0

Bogotá, Enero 23 de 2020

Hora: 7,25

DATOS GENERALES

IDENTIFICACIÓN: 79518118

PACIENTE: SANCHEZ ARANGO HAROLD RICARDO

FECHA NACIMIENTO: Diciembre 22 de 1969

LUGAR: BOGOTÁ

ESTADO CIVIL: CASADO (A)

Nº HIJOS: 3

EDAD: 50

SEXO: MASCULINO

EDUCACIÓN: SECUNDARIA COMPLETA

DATOS LABORALES

EMPRESA: CARTISAVAL CONSTRUCCIONES

EMPRESA ANTERIOR: NO APLICA

TIPO: COMPENSAR

ACT. ECONÓMICA:

RECUERDA: NO RECUERDA

AFP:

PORVENIR

TIPO DE OCUPAR: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

EXAMENES PARA CLINICOS

OTOLINGÜÍSTICA: VALORACIÓN DE BANDAS CONVERSACIONALES, AGUDAS Y CONDICION AUDITIVA (NORMAL)

OTOMETRÍA: CONTROL ANUAL POR OPTOMETRÍA

OTOMÉTRICO: NO SE REALIZA

OTOMETRÍA: CAPACIDAD VITAL FORZADA, VOLUMEN Y FLUJO ESPIRATORIO (NORMAL)

OTOMETRÍA: NO SE REALIZA

LABORATORIOS: PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES MÉDICAS

OTOLINGÜÍSTICA

RECOMENDACIONES MÉDICAS

USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

VERIFICACION POR OPTOMETRÍA

RECOMENDACIONES LABORALES

USAR ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS PARA LA ACTIVIDAD

MOVILIDAD ACTIVAS PARA MMSS. SEGÚN PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.

POSTURA POSTURAL Y DE COLUMNA PARA EVITAR LESIONES OSTEOMUSCULARES.

PRÁCTICA EN trabajo seguro, plan emergencia, riesgo ergonomico

SEGUIR PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN VISUAL

OBSERVACIONES

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS ALTURAS

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicas y permitieron la elaboración del presente concepto. Yo, el suscrito, doy mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora. Yo, el suscrito, mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.

Dr. Carlos A. Cuervo S. Médico en General C.C. 3458 CARLOS ANTONIO CUERVO SANCHEZ 20 de Enero del 2020
FECHA Y SELLO DEL MÉDICO
Resolución 753

FIRMA DEL PACIENTE
NOMBRE: SANCHEZ ARANGO HAROLD RICARDO
CEDULA: 79518118

H.S.E.Q.



Labor Vital

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

En cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017 Expedidas por el
Ministerio de trabajo para orientar formación en trabajo en alturas.

HACE CONSTAR:

HAROLD RICARDO SANCHEZ ARANGO

Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79518118

Asistió y Aprobó la acción de formación:
NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una intensidad horaria de 20 horas, los días 08 AL 09 del mes de JULIO de 2019

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C.

EDGAR RODRIGUEZ
Representante Legal
Lic. Salud Ocupacional. 11893/18

ENTRENADOR:
NELSON IVAN SEGURA ORGANISTA
Lic. Salud Ocupacional. 12078/76

H.S.E.Q.

Labor Vital

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CURSOS DE ALTURAS

Certificador ICONTEC Cod.
CS-CER657171

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.472.861
SOLAR HOYOS

APELLIDOS
DAVID

NOMBRES
DAVID

FIRMA



005



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1987
SAN JUAN DE URABA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G. & RH SEXO
06-SEP-2007 SAN JUAN DE URABA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0500150-00438231-M-1037472861-20130006 0033268760A 8002377531

Licencia IPS Resolución No 10519 de 24/08/2017

Nit: 900540214-0

EXAMEN DE: INGRESO ENFASIS ALTURAS

CONTROL: 0

Bogotá, Enero 16 de 2020

Hora: 8,05

DATOS GENERALES

No IDENTIFICACIÓN: 1037472861

PACIENTE: SOLAR HOYOS DAVID

FECHA NACIMIENTO: Abril 06 de 1987

LUGAR: ANTIOQUIA

EDAD: 32

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE

No HIJOS: 4

SEXO: MASCULINO

ESCOLARIDAD: PRIMARIA COMPLETA

DATOS LABORALES

EMPRESA: CARTISAVAL CONSTRUCCIONES

EMPRESA MISIÓN: NO APLICA

EPS: SALUD TOTAL

ACT. ECONÓMICA:

ARE: NO RECUERDA

AFP:

COLPENSIONES

CARGO A OCUPAR: AYUDANTE

EXAMENES PARA CLINICOS

AUDIOMETRÍA: VALORACION DE BANDAS CONVERSACIONALES, AGUDAS Y CONDICION AUDITIVA (NORMAL)

VISIOMETRÍA: REALIZAR TEST DEL COLOR POR PRESUNTA ALTERACIÓN CROMÁTICA QUE AFECTA LA ACTIVIDAD

PSICOMÉTRICO: NO SE REALIZA

ESPIROMETRÍA: CAPACIDAD VITAL FORZADA, VOLUMEN Y FLUJO ESPIRATORIO (NORMAL)

OPTOMETRÍA: NO SE REALIZA

LABORATORIOS: PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

OTROS:

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESTRICCIONES MÉDICAS

NINGUNA

RECOMENDACIONES MÉDICAS

UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

RECOMENDACIONES LABORALES

USO ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS PARA LA ACTIVIDAD

PAUSAS ACTIVAS PARA MMSS. SEGÚN PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.

HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA PARA EVITAR LESIONES OSTEOMUSCULARES.

CAPACITACIÓN EN trabajo seguro, plan emergencia, riesgo ergonomico

OBSERVACIONES

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS ALTURAS

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicas y permitieron la elaboración del presente
médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora
arriba certificado mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.

Dr. Carlos A. Cuervo
E.M. 4516
Especialista en Gerencia en
Salud

CARLOS ANTONIO CUERVO SANCHEZ

Licencia: Resolución 753
16 de Enero del 2019

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

REGISTRÓ MÉDICO: 4516


LICENCIA: RESOLUCION 753

DAVID

FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE: SOLAR HOYOS DAVID

CEDULA: 1037472861



MYM ALTURAS

CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO S.A.S.

NIT 901.103.169-7

LIC. SST N°14956 del 28 de noviembre de 2018

Certificación NTC 6072:2014 otorgada por ICONTEC CS-CER 658417

Autorización de Min Trabajo N°08SE201922000000006629 del 1 de marzo de 2019

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

SOLAR HOYOS DAVID

Documento de Identidad N° 1037472861

Cursó y aprobó la acción de formación

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO-AVANZADO

Realizado entre el 03 de marzo a 04 de marzo del 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.

con una intensidad de 20 Horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 04 días del mes de marzo del 2020
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017

Registro bajo código No. B.M-0ZQHJ

Berónica Maya Rodríguez

Dra. Berónica Maya Rodríguez
C.C. 52429692
Representante Legal

Juan Carlos Niño

Juan Carlos Niño
C.C. 79843982
Reg. Entrenador 18562600 28/03/2014
Lic. SST 8654 31/07/2013



VERIFICACION: (112575900) www.mymalturas.com.co | verificacion@mymalturas.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
UNIF 991019293	3	GARTISVAL CONSTRUCCIONES S.A.S	B • MENOS DE 200 COTIZANTES	GARTISVAL	CEA 17 NO 44 - 37 CENTRO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	8331195	-ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	651197514	9407252569	E	2020/06/23	2020/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	57.257,00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
NIT 901019293	3	CARTISAVAL CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTISAVAL	CRA-17 NO. 4A - 37 CENTRO	RICAUITE-CUNDINAMARCA	8151195	ICBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
2020-05	651197514	9407232549	E	2020/06/23	2020/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0		57,257,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	\$3,748,600	\$0	\$0	\$0	\$3,748,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$562,000	\$0	\$0	\$0	\$562,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$1,659,800	\$0	\$0	\$0	\$1,659,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$1,386,300	\$0	\$0	\$0	\$1,386,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	27	\$1,630,300	\$0	\$0	\$0	\$1,630,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$939,100	\$0	\$0	\$0	\$939,100
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	\$939,100	\$0	\$0	\$0	\$939,100
ANEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	27	\$939,100	\$0	\$0	\$0	\$939,100
NUUEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$35,200
NUUEYA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	\$622,300	\$0	\$0	\$0	\$622,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$35,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$140,800	\$0	\$0	\$0	\$140,800
TOTAL				27	\$7,257,100	\$0	\$0	\$0	\$7,257,100

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.612.235
OBANDO REYES
AFELICIA
OSCAR ANDRES
NOMBRES

Oscar A. Oando



OK


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1992
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA O+ G.S. FM M SEXO

30-JUL-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDECE PERFECTA

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RAMA SANCHEZ FORERO



P-1500150 00256089 M-1030612235 20100618 002396482A 1 35100302

PLANILLA INTEGRADA A LIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1030612235
DESDE MAYO 2020 HASTA JUNIO 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: TIPO APORTANTE: D-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS DEL COTIZANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: DEFENSO SUBTIPO COTIZANTE: NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: NO	
--	--	---	--

PLANILLA No: 7754681351		TIPO DE PLANILLA: NOVEDADES		E PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		MAY - 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MAY - 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		UNICO	
MOVENADES													
SALARIO BÁSICO		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
SALARIO BÁSICO		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
\$ 3.000.000		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTES	
		R		IB</									

Certificado de Aptitud Laboral Periodico



Fecha: 06/Feb/2020, **Hora:** 07:02:19 a.m.

Apellido: OBANDO REYES

Tipo Doc: CC

Empresa: HIDRINCO S.A.S.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

Lugar:

Direccion: CARRERA 69 C N 5-26

Telefono: Celular: 3006129934 **Email:** oscar.obando@hidrico.com **Estado Civil:** Soltero

Ciudad: Bogota D.C. - Ciudad Kennedy

Nombre: OSCAR ANDRES

Nro Identidad: 1030612235

HC: # 46252

Edad: 27 años

Sexo: Masculino ♂

Nacim: 30/Abr/1992

Rh: O+

Exámenes Realizados

Audiometria Tamiz, CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS, Espirometria, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Periodico con énfasis Osteomuscular, Glicemia, Perfil Lipidico, Visiometria

Concepto

Apto Para Trabajos En Alturas

Recomendaciones

Uso de EPP, Higiene Postural, Pausas Activas, Estilo De Vida Saludable, Higiene Y Seguridad En El Trabajo, Aislamiento De Alérgenos, AISLARSE DEL RUIDO

Observaciones

IMPORTANTE:

1 - El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

2 - Señor(a) trabajador: a partir de la fecha, usted cuenta con 30 días para seguir y realizar las indicaciones del médico especialista en salud ocupacional registradas en este documento.

DECLARACION DEL ASPIRANTE: Manifiesto con mi firma o huella que no omiti datos relevantes en mis antecedentes que pudieran influir sobre la evaluación de mi estado actual de salud

Oscar Mauricio Monroy Suarez
Medico Esp. Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 6874/090819

OSCAR ANDRES OBANDO REYES
CC 1030612235



Huella Digital

De conformidad con la Resolución de autorización 2513 de 2016 emitida por el
SENA CENTRO DE LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
en cumplimiento resolución 1409 del 23 de julio del 2012

AS&MAT SAS

Asesoría en seguridad industrial y mantenimiento certificado



HACE CONSTAR QUE:

OSCAR ANDRES OBANDO REYES

Con cédula de ciudadanía No 1030612235

Curso y aprobó la acción de Formación:
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL COORDINADOR
Con una intensidad de 80 HORAS

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. (17) días del mes de septiembre de 2017

JAVS-COOR-073


ALAN MIJANGÓMEZ
ENTRENADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
I.C. 3096772009

La autenticidad del documento se puede verificar en la página WEB
WWW.ACCESSCOMPANY.COM.CO al correo validaciondecertificados2513@gmail.com
TEL: (1)5648570 // CEL: (57) 3224454724 Calle 35ª sur No 72n-56

INDUCCIONES A PERSONAL



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: Notificar los riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la ejecución de sus actividades en el contrato: "SECRETARIA GENERAL 731 DE 2019: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C." Notificar derecho a examen de retiro que el firmante tiene derecho en caso de ser empleado, se los puede practicar 5 días hábiles después de finalizado su contrato laboral.

Factores de Riesgo Existentes (Tachar a los que se encuentra expuesto)

☒	Físicos: Ruido, radiaciones no ionizantes, iluminación por exceso o deficiencia.	☒	Mecánico: elementos o partes de máquinas; herramientas, equipos, materiales proyectados sólidos o fluidos. (Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto).
☒	Químicos: humo no metálicos, humos metálicos, polvos, vapores, gases, material particulado	☒	Eléctrico: baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control, contacto indirecto con partes energizadas
☒	Biológicos: animales (mordedura de perros), insectos (picaduras de abejas), bacterias, intoxicación alimentaria (ingesta de agua no potable y alimentos en mal estado) enfermedades endémicas	☒	Locativos: superficies de trabajo irregulares, resbalosas, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas, caídas al mismo nivel o a diferente nivel
☒	Psicolaboral: contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico, jornada de trabajo, características del grupo social de trabajo o la organización.	☒	Públicos: robo de objetos personales y de trabajo, alracos, asaltos (vandalismo en la zona del proyecto), atentados, orden público.
☒	Fenómenos Naturales: inundaciones, movimientos sísmicos, tormentas y descargas eléctricas (rayos), precipitaciones (lluvias, granizadas)	☒	Seguridad vial: accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en las vías, exceso de confianza en la conducción, (desplazamiento en vehículos y/o desplazamiento a pie sobre la vía).
☒	Biomecánico: carga estática (postura de pie o sentado); Higiene Postural, levantamientos de cargas (levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro).		Otros:

ACCIONES PREVENTIVAS :

- Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis específicos al cargo
- Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes
- No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que haya paso de energía eléctrica
- Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra
- No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias
- Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas)
- Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes
- Cuando trabaje en alturas es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las líneas de vida o puntos de anclaje.
- Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.)
- No fume dentro de las áreas de trabajo y/o zonas del proyecto.
- Cumplir y promocionar la política de anti-alcoholismo y anti-drogadicción de la empresa
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra y la vía
- Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente
- Uso de los EPP acorde a la actividad que se va a ejecutar.
- No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
- Reporte oportunamente accidente o incidente de trabajo dentro de las 48 horas.

Nombre: <u>Emmanuel Castellanos C.</u>	Cedula: <u>1001325038</u>	Fecha: <u>24-06/20</u>
Cargo: <u>Instalador</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Sede: <u>Imprenta D.</u>
Responsable de la Notificación: <u>[Firma]</u>	Cargo: <u>Especialista SST</u>	
Cedula: <u>74361366</u>	Lic. SO: <u>Res. 1390 del 2014</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

<p>CONSORCIO PRUNI SEDES 04</p>  <p>PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.</p>	<p>SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C."</p> <p>CLIENTE: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA BOGOTA.</p>
--	--

CERTIFICADO NOTIFICACION DERECHO EXAMEN DE RETIRO

CONTRATO DE OBRA"

Respetados Señores,

Por medio de la presente yo Emmanuel Cortés identificado con c.c. 1001325038 expedida en Bogotá D.C. CERTIFICO que el Consorcio PRUNI SEDES 04 me ha informado de manera explícita y suficiente al respecto del derecho que tengo de realizarme el Examen Médico de Retiro, con un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de mi desvinculación laboral; en el centro médico PREVENTSALUD (Carrera 15 Sur 16-46 Barrio Restrepo), autorizado por la empresa y sin ningún costo a mi cargo.

Para Constancia se firma en Bogotá a los 24 días del mes de JUNIO del año 2020

Saludos Cordiales,

E. C. C.
Nombre: Emmanuel Castellanos
c.c. 1001325038
Ciudad: Bogotá D.C.pte



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NOMBRE	Emmanuel Castellanos Cortés
CARGO	Instalador
CEDULA No.	1001 325 038
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA:	24/06/2020

Por medio de la presente certifico que he recibido los Elementos de Protección Individual de parte de la empresa Consorcio PRUNI Sedes 04

ENTREGA DE EPI	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS												FECHA ENTREGA (Día/Mes/Año)	MOTIVO			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DEL QUIEN ENTREGA	
	CASCO	TAPABOCAS	GAFAS LENTE CLARO	GAFAS LENTE OSCURO	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	PELO EN CARNAZA	MANGAS EN CARNAZA	CARETA PARA SOLIDADURA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE HILAZA CON NITRILLO	MÁSCARILLA CON FILTRO		OTROS					
1ª Vez	x	x	x			x					x			24-06-20				E.C.C.	WJ
2ª Vez																			
3ª Vez																			
4ª Vez																			
5ª Vez																			
6ª Vez																			
7ª Vez																			
8ª Vez																			
9ª Vez																			
10ª Vez																			
11ª Vez																			
12ª Vez																			
13ª Vez																			
14ª Vez																			
15ª Vez																			
16ª Vez																			
17ª Vez																			
18ª Vez																			
19ª Vez																			
20ª Vez																			

Compromiso:

Compromiso:

- Me comprometo a hacer uso Obligatorio y Adecuado durante la jornada laboral de los elementos de protección individual (EPI) recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso Obligatorio y Adecuado de los elementos de protección individual (EPI).
- Haciendo USO Obligatorio y Adecuado de los Elementos de protección individual (EPI) - incluyendo ropa de trabajo ó atuendo personal seguro) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador (a) definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: (CST) Código Sustantivo Del Trabajo; Art. 36 a Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 85; Decreto 1293 de 1994; Art. 91. El presente compromiso quedará archivado en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y disponible para cualquier requerimiento de la empresa como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.
- Autizo realizar el descuento por nómina del valor indicado (vigente a la fecha) y correspondiente al elemento de protección individual (EPI) que solicite como reposición por pérdida y/o mal uso de mi parte.
- Me comprometo a hacer devolución de los elementos de protección individual (EPI) que he recibido, una vez inicie mi proceso de retiro de la empresa.

FORMATO PARA INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha:	24/06/2020	CONSORCIO PRUNI SEDES 04  UNIVERSAL SEC S.A.S.
Hora de inicio:	7:00 AM	
Nombre:	Emmanuel castellanos Cortes	
Cédula:	1001325038	
Cargo:	Instalador	

Consortio PRUNI Sedes 04, en cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Laborales Legales Vigentes, me ha informado acerca de los riesgos específicos y asociados a las tareas que debo realizar ó desarrollar en mi puesto de trabajo, así mismo me ha dado a conocer las medidas preventivas que debo tomar para hacer de esto un método seguro de trabajo.

Temática:

☒ **Decreto 614/1984** (bases para la organización de Salud Ocupacional en el país); **Normatividad: Ley 9/1979** (código sanitario); **Ley 100/1993** (Sistema General de Seguridad Social - SGSS); **Resolución 1016/1989** (organización, funcionamiento y forma del programa de salud ocupacional); **Ley 776/2002** (Organización, Administración y Prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales); **Ley 1010/2006** (Acoso Laboral: Comité Convivencia Laboral); **Ley 1335/2009** (Prevención Consumo tabaco); **Resolución 2013/1986** (comité Paritario de Salud Ocupacional -COPASO); **Decreto 1295/1994** (organización y administración del sistema de riesgos profesionales); **Resolución 1401/2007** (reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo); **Resolución 2346/2007** del Ministerio de Protección Social (Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales). **Ley 1562/2012** (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST); **Código Sustantivo del Trabajo- CST, Decreto 1072 de 2015** - Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo. **Resolución 0312 de 2019** - Estándares mínimos del SG-SST.

- ☒ Seguridad y Salud en el Trabajo (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), estándares de seguridad
- ☒ Políticas (de SST, Calidad, Política de Prevención de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia y Medio Ambiente)
- ☒ Medicina Preventiva; Medicina del Trabajo (Exámenes Ingreso, Control o Periódicos; Retiro)
- ☒ Higiene y Seguridad Industrial
- ☒ Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Industrial
- ☒ Plan de Manejo Ambiental
- ☒ Reglamento Interno de Trabajo
- ☒ Uso Obligatorio y Adecuado de los Elementos de Protección Individual - EPI (CST)
- ☒ Enfermedad Laboral (EL) - Incidente - Accidente de Laboral (AL) - Acto Inseguro - Condición Insegura
- ☒ Procedimiento Notificación Incidentes y Accidente Laboral; Diligenciamiento FURAT (Interno)
- ☒ Comité Convivencia Laboral
- ☒ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
- ☒ Brigadas de Emergencias - Control de Emergencias
- ☒ Programa Pausas Activas (Acondicionamiento Físico; Fortalecimiento Físico)
- ☒ Orden y Aseo en Puesto de trabajo; Responsabilidades
- ☒ Higiene Personal, Recomendaciones (Sitio ó Lugar de trabajo)
- ☒ Prohibición de laborar con elementos extraños a su actividad laboral (Anillos, cadenas, manillas, relojes, celulares, aretes, audífonos, otros)
- ☒ Prohibición laborar Bajo la Influencia de Alcohol y/o Drogas (Sustancias Psicoactivas)
- ☒ Tareas de alto riesgo (alturas, trabajos en caliente)

El Responsable SST instruye sobre los diferentes temas y debe garantizar que sean conocidos por el nuevo Trabajador (a), mostrando la responsabilidad, compromiso y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que este firmando.

Registro del Participante:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Emmanuel Cortes	1001325038	Instalador	E.C.C.

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área de Seguridad y Salud en el trabajo y evaluar la eficacia de la inducción. Se realiza de manera individual para los trabajadores que reciben diariamente la inducción como muestra de los conocimientos adquiridos.

FECHA: 24/06/2020

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Emmanuel Castellanos C.	1001325038	E.C.C.

Marque con una X la respuesta correcta:

1. El sistema de seguridad social esta conformado por:

A. ARL ☐

B. EPS ☐

C. AFP ☐

ANTERIORES ☒

2. Escriba en sus palabras la Política de Consorcio PRUNI Sedes 04

Velar por la seguridad y salud en el trabajo

3. Responda Verdadero (V) o Falso (F) según la afirmación:

A. Al realizar un trabajo en altura se requiere de un permiso de trabajo antes de iniciar?

☒ V

B. La inspección del puesto de trabajo se debe hacer mensualmente?

☐ F

C. En Consorcio PRUNI Sedes 04 está permitido fumar en cualquiera de los lugares de trabajo?

☐ F

4. Escriba tres (3) responsabilidades en SST que tiene usted como trabajador

1. Cuidar Integración física

2. Asistir A Charlas y Capacitaciones.

3. Cumplimiento de normas y Procedimientos.

5. Cuáles son los Elementos de Protección Individual que debe utilizar en sus labores?

Casco, Tapabocas, Guantes, Obed, Botas, Gafas, Tapadidos, Arnes.

6. Qué debe hacer usted en caso de Accidente de trabajo?

Informar Al SISO.

7. Diga 5 Peligros a los que usted está expuesto en su puesto de trabajo?

Trabajo en ALTURAS, uso de Maquinas, Ruido, uso de Herramientas manuales, Caídas A nivel.

8. Qué es el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial?

Son todos los Riesgos y Peligros existentes en la obra.

9. Que es el COPASST?

Comite Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo.

10. Que es el punto de encuentro en una evacuación?

Es el punto donde no hay Riesgo.

CALIFICACIÓN: 10.

¡BIENVENIDO A NUESTRO EMPRESA!

ROLES Y RESPONSABILIDADES

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la responsabilidad de la Gerencia con el apoyo de:


- Residente SST
- Jefes de áreas o procesos (Director de obra, Residente de obra)
- COPASST

Rol	Responsabilidad
Gerente	Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
	Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
	Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
	Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
	Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
	Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
	Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
	Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
	Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
	Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
Jefes de área (Director de obra, Residente de obra).	Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
	Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
	Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
	Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.



Rol	Responsabilidad
	Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
	Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comité de convivencia laboral	Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
	Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
	Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
	Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
	Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos.
	Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
	Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
Coordinador de alturas	Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias.
	Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas
	Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes.
	Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables.
	Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.

NOMBRE: Emmanuel Castellanos CÉDULA: 1001325038
CARGO: Instalador FIRMA: E.C.C



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: Notificar los riesgos a los cuales va a estar expuesto; las acciones preventivas a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar de manera permanente durante la ejecución de sus actividades en el contrato: "SECRETARIA GENERAL 731 DE 2019: 'REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.' Notificar derecho a examen de retiro que el firmante tiene derecho en caso de ser empleado, se los puede practicar 5 días hábiles después de finalizado su contrato laboral.

Factores de Riesgo Existentes (Tachar a los que se encuentra expuesto)

☒ SI	Físicos: Ruido, radiaciones no ionizantes, iluminación por exceso o deficiencia.	☒ SI	Mecánico: elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, materiales proyectados sólidos o fluidos. (Atrapamientos, golpes, caídas, aplastamientos, contacto).
☒ SI	Químicos: humo no metálicos, humos metálicos, polvos, vapores, gases, material particulado	☒ SI	Eléctrico: baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control, contacto indirecto con partes energizadas
☒ SI	Biológicos: animales. (mordedura de perros), insectos (picaduras de abejas), bacterias, intoxicación alimentaria (ingesta de agua no potable y alimentos en mal estado) enfermedades endémicas	☒ SI	Locativos: superficies de trabajo irregulares, resbalosas, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal utilizadas, caídas al mismo nivel o a diferente nivel
☒ SI	Psicolaboral: contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico, jornada de trabajo, características del grupo social de trabajo o la organización.	☒ SI	Públicos: robo de objetos personales y de trabajo, alracos, asaltos (vandalismo en la zona del proyecto), atentados, orden público.
☒ SI	Fenómenos Naturales: inundaciones, movimientos sísmicos, tormentas y descargas eléctricas (rayos), precipitaciones (lluvias, granizadas)	☒ SI	Seguridad vial: accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en las vía, exceso de confianza en la conducción, (desplazamiento en vehículos y/o desplazamiento a pie sobre la vía).
☒ SI	Biomecánico: carga estática (postura de pie o sentado); Higiene Postural, levantamientos de cargas (levantar cargas superiores a 25 kg del piso a la cintura y de 50 kg al hombro).		Otros:

ACCIONES PREVENTIVAS :

- Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis específicos al cargo
- Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes
- No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que haya paso de energía eléctrica
- Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra
- No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias
- Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas)
- Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes
- Cuando trabaje en alturas es necesario utilizar arnés de cuerpo y siempre asegurarse a las líneas de vida o puntos de anclaje.
- Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.)
- No fume dentro de las áreas de trabajo y/o zonas del proyecto.
- Cumplir y promocionar la política de anti-alcoholismo y anti-drogadicción de la empresa
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra y la vía
- Evite dejar herramientas botadas, ubíquelas en el lugar correspondiente
- Uso de los EPP acorde a la actividad que se va a ejecutar.
- No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades
- Reporte oportunamente accidente o incidente de trabajo dentro de las 48 horas.

Nombre: <u>Luis Acuedo</u>	Cedula: <u>966599501</u>	Fecha: <u>24-06-20</u>
Cargo: <u>instalador</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Sede: <u>Impianto Distributivo</u>
Responsable de la Notificación: <u>Willie Bosa</u>	Cargo: <u>Especialista SST</u>	
Cedula: <u>28381366</u>	Lic. SO: <u>Res 1340 del 2011</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
