

1. En el siguiente informe queda consignanada la información respectiva de las actividades civiles ejecutadas en la Reparacion, remodelación. y recuperacion de las instalaciones del concejo munipal de ginebra Valle. en desarrollo del contrato suscrito entre constructora makina sas y la presidencia del concejo municipal de Ginebra Valle del Cauca codificado como MC N° 038 - 2024, cuyo objeto es "contratar bajo la modalidad de minima cuantia, sin formula de reajuste, la adecuación, remodelación y reparación integral de la infraestructura, de las instalaciones del concejo para su normal desempeño y correcto funcionamiento en la "alcaldía Municipal.

2. FORMA Y VALOR DE PAGO:

Valor del contrato: \$37.809.147.00

Forma: Se hará mediante un acta de recibo final:

- Se deberá acompañar el corte de terminacion o entrega de obra, de la presentación de la factura comercial y recibo a satisfacción por parte de la interventoria, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes, ajeno esto al cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para la respectiva cancelación. Para el efecto, se medirá y revisará la obra ejecutada ítem por ítem y se obtendrá un porcentaje de ejecución para cada subproyecto, con relación a las cantidades de obra. El contratista también deberá allegar, fotocopia de autoliquidaciones del pago aportes de que trata el Artículo 50 de la Ley 789/02 y el Decreto 862 de 2013. – junto ala cuenta de cobro del contrato, el pago se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la radicación de las facturas y el acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por el interventor del contrato, con los documentos requeridos por la Administracion municipal, de acuerdo a el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Tiempo de ejecución programado (en días calendario)	25
Tiempo transcurrido en la ejecución (en días calendario)	25

**CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA
ALCALDIA MUNICIPAL
2023 - 2026**



INFORME FINAL – NOVIEMBRE DE 2024


CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

4.2	Mural interno full color de 6x3 mtrs representativo del municipio de Ginebra.	UND	1
4.3	Mural interno full color, Nombre del concejo 6x2 mtrs.	UND	1
4.4	Mural exterior concejo full color, 6x1 mtrs.	UND	1
5	LIMPIEZA GENERAL		
5.1	Retiro de saldos en sitio.	M3	12
5.2	Limpieza general.	M2	95

Lo anterior obedece a las cantidades finalmente ejecutadas las cuales se realizaron de la siguiente forma

**4. INSTALACIONES CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE SESIONES – RECEPCION Y COCINETA**

- 1.1 Desmonte de Cielo falso panel sin estructura. De las áreas correspondientes a la oficina del Concejo Mpal, la Sala de sesiones y la cocineta en un total de 95 metros cuadrados, cuyo material era inservible y paso a ser escombros que debieron ser retirados inmediatamente.
Fotos. 1.

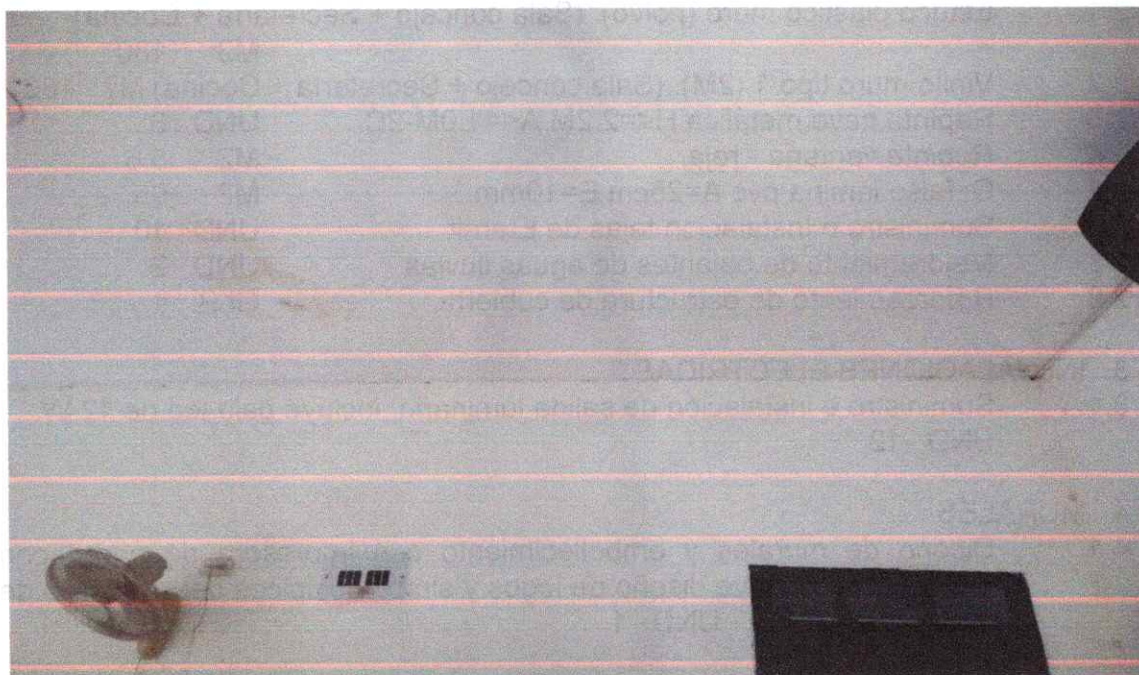

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

Días de atraso en la obra (en días calendario)	0
---	---

3. DESCRIPCION GENERAL

EL día 18 de Octubre del año 2024, se realizó el diagnóstico para las obras de reparación, adecuación y remodelación de las instalaciones del Concejo municipal de Ginebra Valle, en compañía del Presidente del concejo. JULIAN SOREL TRIANA, una vez aprobado este, se dio inicio a la ejecución de la obra, se determinaron las siguientes actividades:

1 PRELIMINARES

1.1	Desmonte de cielo falso panel + estructura.	M2	95
1.2	Desmonte de luminarias.	UND	12
1.3	Recorrido cubierta teja de eternit.	M2	95
1.4	Demolición estuco y pintura en muros internos.	M2	50
1.5	Impermeabilizacion Canales	ML	30
1.6	Limpieza de Canales	ML	30

2 ADECUACIONES CIVILES

2.1	Estuco plástico muro (polvo). (Sala concejo + Secretaría + Cocina)	M2	180
2.2	Vinilo muro tipo 1 (2M). (Sala concejo + Secretaría + Cocina)	M2	180
2.3	Repinte nave metálica $H \leq 2.2M$ $A \leq 1.0M$ -2C.	UND	6
2.4	Repinte ventana - reja.	M2	5,6
2.5	C. falso lamina pvc $A=25cm$ $E=10mm$.	M2	95
2.6	Suministro e Instalacion tejas de Eternit	UND	10
2.7	Mejoramiento de bajantes de aguas lluvias.	UND	2
2.8	Reforzamiento de estructura de cubierta.	GLB	1

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1	Suministro e instalación de salida luminaria, incluye bala led de 12 W.	UND	12
-----	---	-----	----

4 MURALES

4.1	Diseño de murales y embellecimiento con impresora de pared con pinturas UV. Incluye diseño de logos y simbolos tipicos del municipio de Ginebra Valle.	UND	1
-----	--	-----	---

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.








CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

1.2 Desmonte de luminarias. Por lógica consecuencia se debio proceder al desmonte de luminarias del sistema en servicio correspondiente a 12 unidades en regular estado, las cuales ya se había planteado su sustitucion. este hecho nos demostró que el sistema eléctrico existe, que databa de por lo menos 40 años o mas presentaba un alto grado de deterioro y peligro de incendio por corto circuito y no cumplia con ninguna norma de seguridad de las exigidas hoy por la ley y el estado, RETIE con riesgo permanente de la edificación y sus ocupantes, lo que obligo a su cambio total. (Tomas y switches).

Fotos. 2.





1.4 Demolición estuco y pintura en muros internos. Se efectuó la demolición de los elementos sobre los 50 metros cuadrados de muros internos, de las instalaciones del concejo, hallándose serias afectaciones y problemas de fondo, para su reestructuración debido al alto grado de humedad que contienen. Este hecho obligó un doble proceso de Pintura y estuco de las paredes interiores, debido a que por causa del exceso de humedad se deterioraban inmediatamente se terminaba la intervención, presentando nuevamente manchas y desprendimientos lo que obligó a la impermeabilización y tratamiento técnico encareciendo el trabajo y demorando el cumplimiento del cronograma propuesto. De igual manera las paredes externas por su estado y condición debieron ser intervenidas fuertemente. Pues el bajo nivel de mantenimiento y la falta de una intervención seria causan orificios, hongos, y desprendimiento de las corizas mas expuestas a la intemperie. Fotos 4.

1.3 Recorrido cubierta teja de eternit. se efectuo el recorrido de los 95 metros cuadrados, y no solo como estaba contemplado, si no que se debio proceder, a su desmonte y reinstalacion y dejando al descubierto un problema mayor en la infraestructura de soporte tal como lo vamos a exponer mas adelante.

Fotos.3.





1.5 Impermeabilizacion Canales. Se llevo a cabo esta tarea sobre los 30 metros propuestos, pero de una forma mucho mas contundente y profunda, que la estimada, en los presupuestos como se podrá entender en el desarrollo del tema de canales.

Fotos 5.





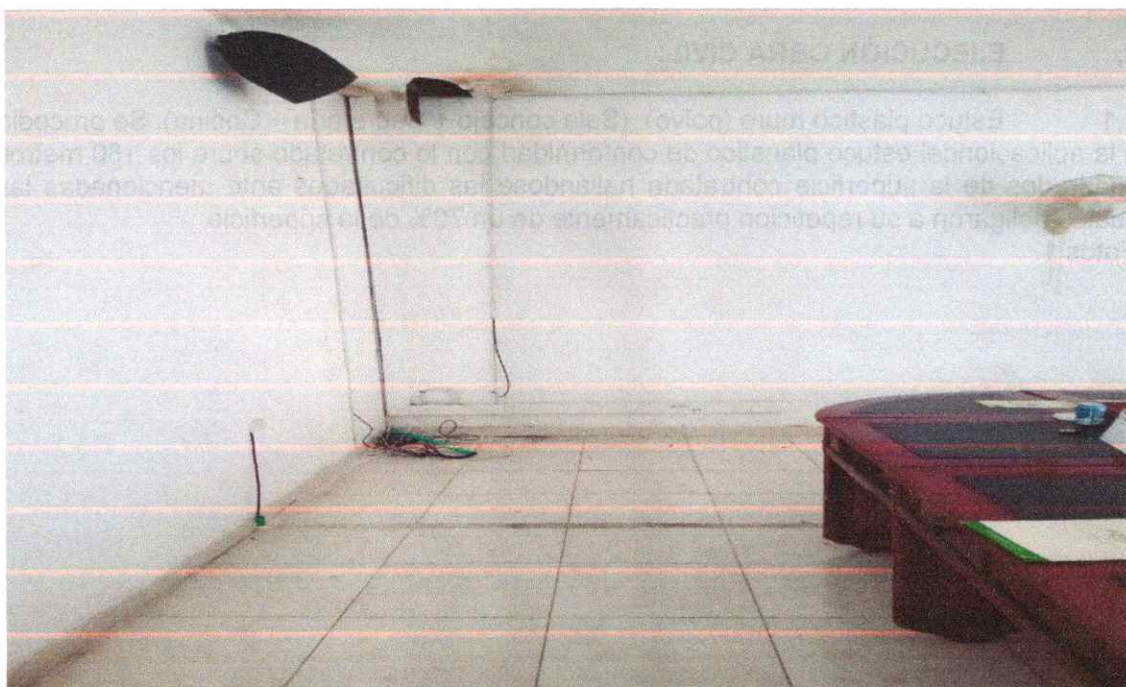

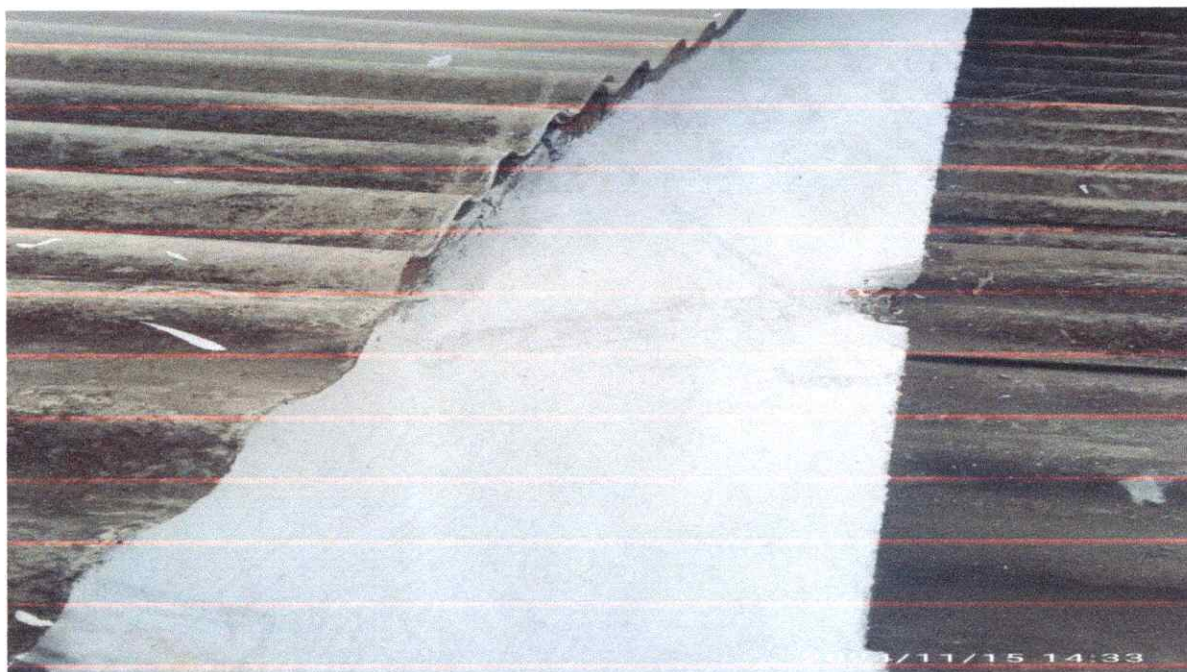

1.6 Limpieza de Canales. Iden. Punto anterior.



2, EJECUCIÓN OBRA CIVIL.

2.1 Estuco plástico muro (polvo). (Sala concejo + Secretaría + Cocina). Se procedio a la aplicaciondel estuco planstico de conformidad con lo contratado sobre los 180 metros cuadrados de la superficie contratada hallándose las dificultades ante mencionadas las cuales obligaron a su repetición prácticamente de un 70% de la superficie.

Fotos 1.

2024/11/5 08:49

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

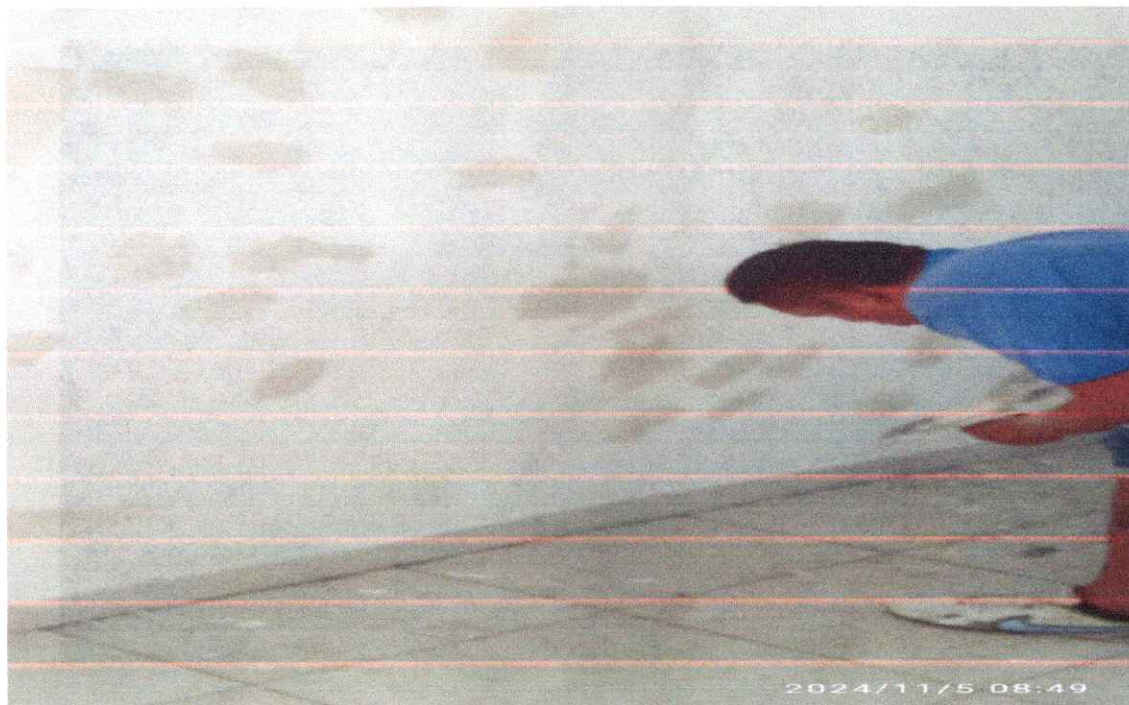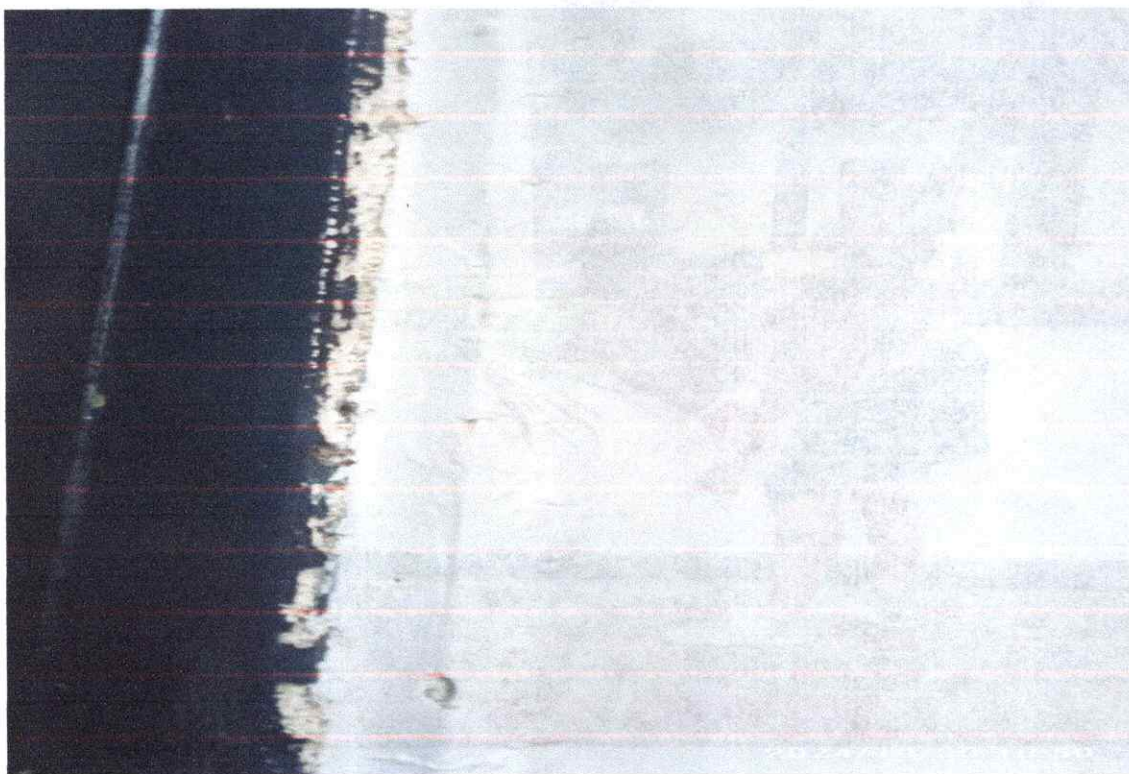







2.2 Vinilo muro tipo 1 (2M). (Sala concejo + Secretaría + Cocina). De igual manera que el estuco una vez superadas las dificultades, se aplico el vinilo a dos manos, sobre los 180 metros cuadrados de la superficie contratada en las instalaciones del concejo Mpal. Dando cumplimiento a lo pactado.

Fotos. 2.

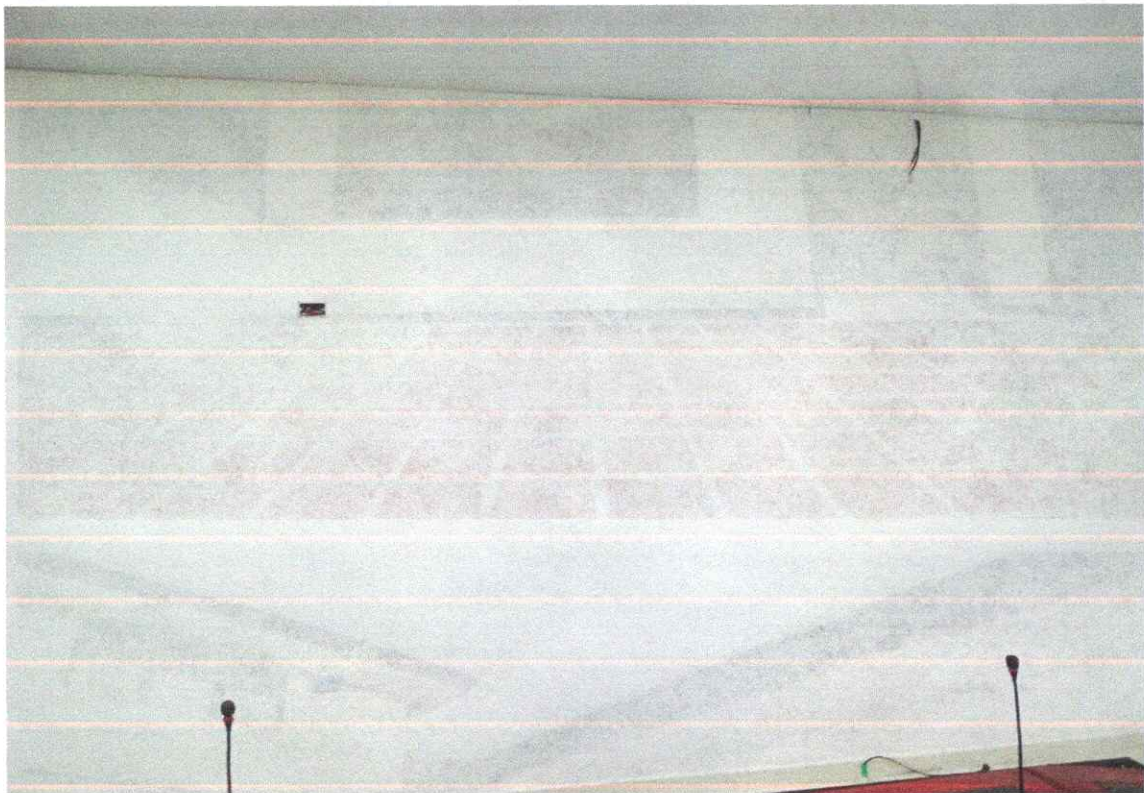

2.3 Repinte nave metálica $H \leq 2.2M$ $A \leq 1.0M$ -2C. Se dio cumplimiento al repinte de las 6 unidades, de naves metálicas. correspondientes, a las instalaciones del concejo y concertadas en el contrato.



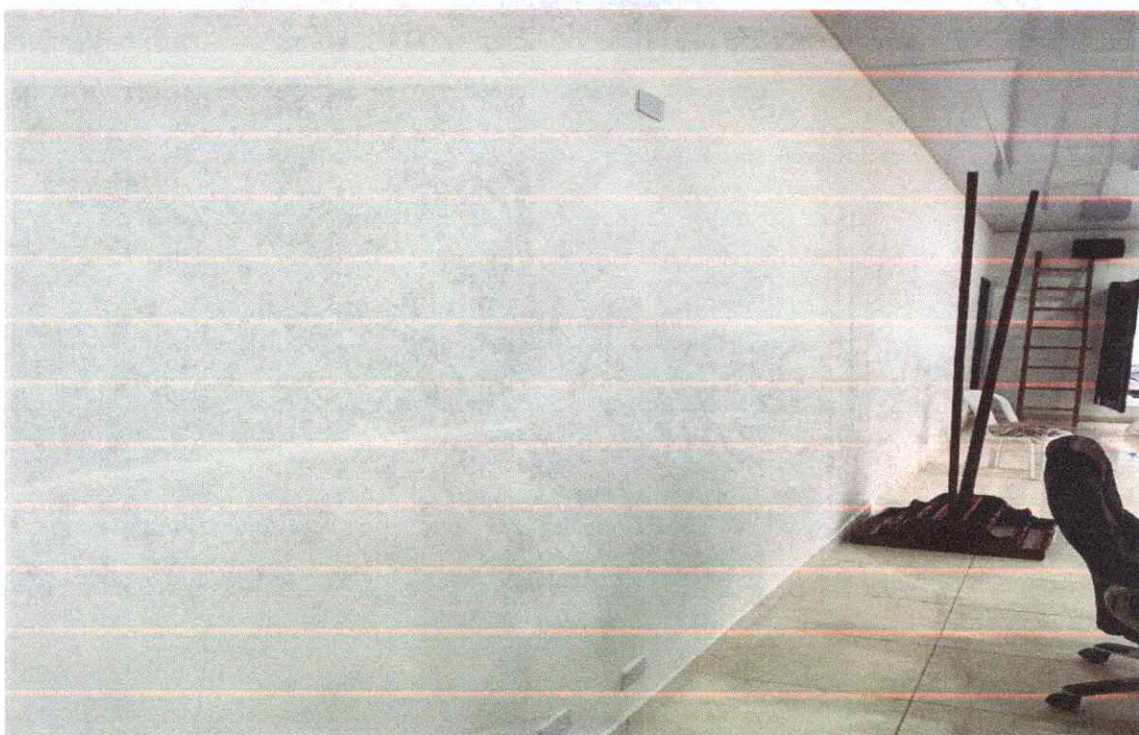



2.4 Repinte ventana - reja. De la misma amnera se realizo el repinte de los 5,6 metros cuadrados de la reja de la ventana. Fotos 4.










2.5 Cielo falso lamina pvc A=25cm E=10mm. Se adquirio y suministro e instalo, el Cielo Falso y su estructura metalica de soporte, con las características, medidas y condiciones pactadas contractualmente, para los 95 metros cuadrados correspondientes a las instalaciones del concejo municipal. Fotos 5.








2.6 Suministro e Instalacion tejas de Eternit. Este ítem, se cumplio a cabalida, tal como se estimará en el contrato, pero en adelante hallaran mejor explicación debido a que su cantidad y manejo, oblijo condiciones extracontractuales. Fotos 6.

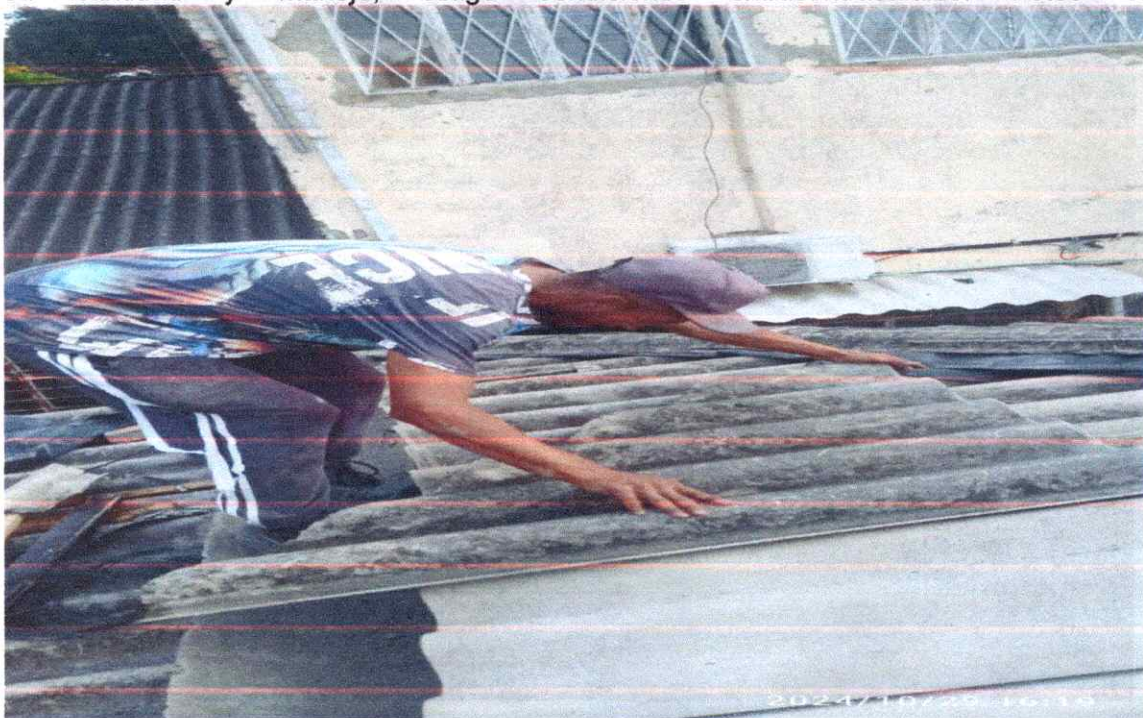

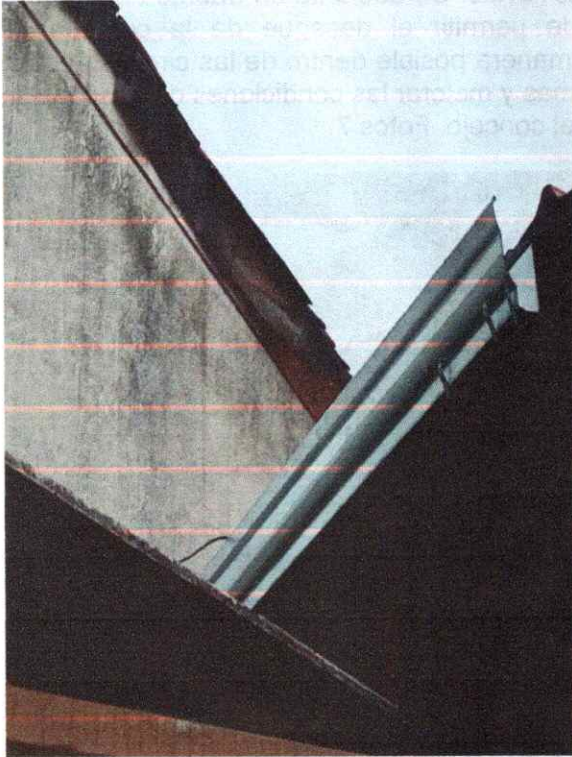

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

2.7 Mejoramiento de bajantes de aguas lluvias. Se adelanto un trabajo de limpieza dentro de los dos bajantes encargados de permitir el desague de la cubierta se reacomodaron y acondicionaron de la mejor manera posible dentro de las circunstancias. encontrándose la necesidad de instalar, uno mas y mejorar las condiciones de evacuación de las aguas lluvias sobre las instalaciones del concejo. Fotos 7.




CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLEDEL CAUCA

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.



CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

- 2.8 Reforzamiento de estructura de cubierta. Este ítem por su importancia y trascendencia lo trataremos mas adelante con mayor rigor y profundidad. Fotos 8.

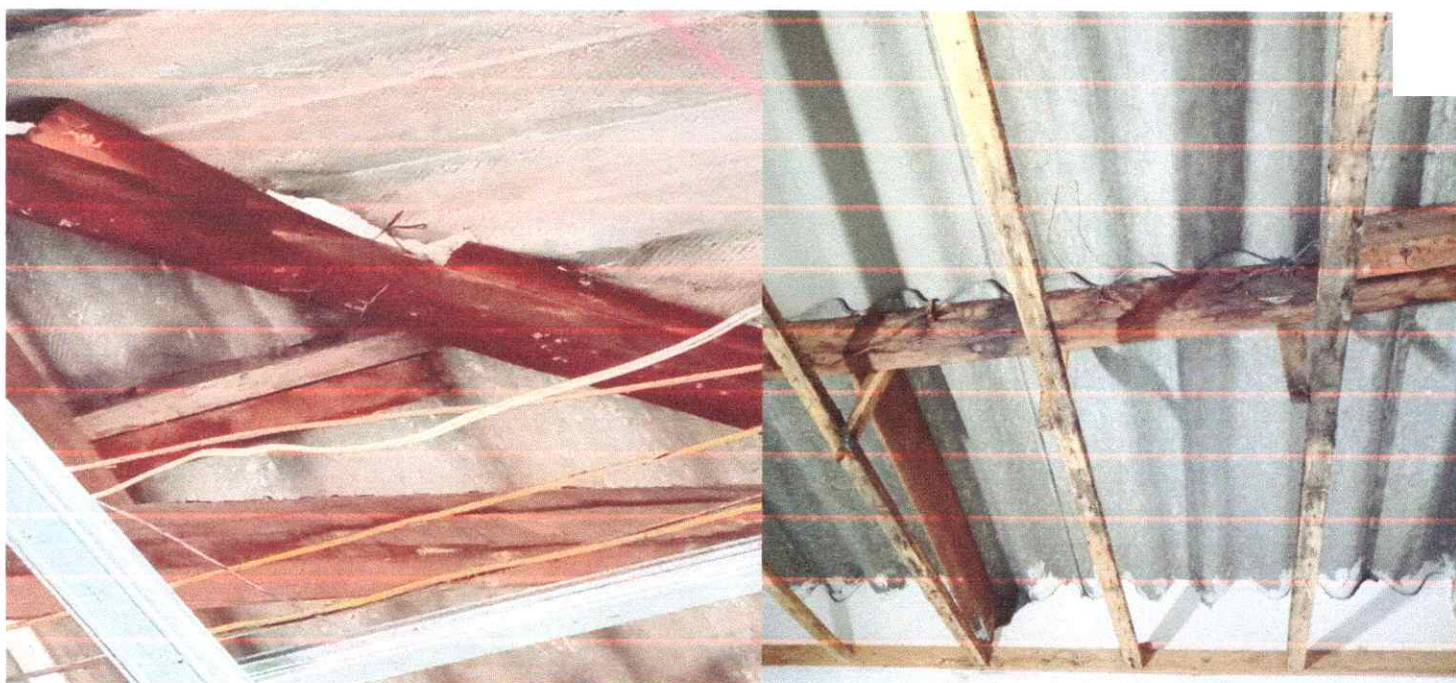

4 MURALES

- 4.1 Diseño de murales y embellecimiento con impresora de pared con pinturas UV. Incluye diseño de logos y simbolos tipicos del municipio de Ginebra Valle.

Se diseñaron los murales que engalanan las instalaciones del concejo Mpal. Teniendo en cuenta, la idiosincrasia de la ciudadanía, sus características costumbrista y culturales, el imaginario colectivo, su realidad socio afectiva y los espacios físicos naturales que conforman la ciudad y le dan su impronta particular haciéndola única entre las ciudades del país.

- 4.2 Mural interno full color de 6x3 mtrs representativo del municipio de Ginebra. Tal como se expreso, tomamos los conceptos del señor presidente del concejo, la ingeniera zoraida, el secretario de bienestar social y algunas personas de la ciudad para formarnos una idea global del querer expresado por el señor presidente del concejo lo cual fue plasmado, lo mas fielmente posible llevando asi un total mensaje ciudadano de empoderamiento y apropiacion de su tierra natal. Fotos 2.




3 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1 Suministro e instalación de salida luminaria, incluye bala led de 12 W. este ítem, se cumplió a cabalidad dentro de lo contratado, pero por su condición y características, también obligo condiciones extracontractuales debido a que el sistema eléctrico de las instalaciones, que databa de por lo menos 40 años o mas y no cumplía con ninguna norma de seguridad de las exigidas hoy por la ley y el estado, con riesgo permanente de la edificación y sus ocupantes, lo que obligo a su cambio total. Fotos 1.



4.3 Mural interno full color, Nombre del concejo 6x2 mtrs.

El mural Interno se construyo en cumplimiento delo acordado con caracteres de identificación del concejo Mpal. Y los símbolos de la ciudad de conformidad a lo acordado y contratado. Fotos 3.

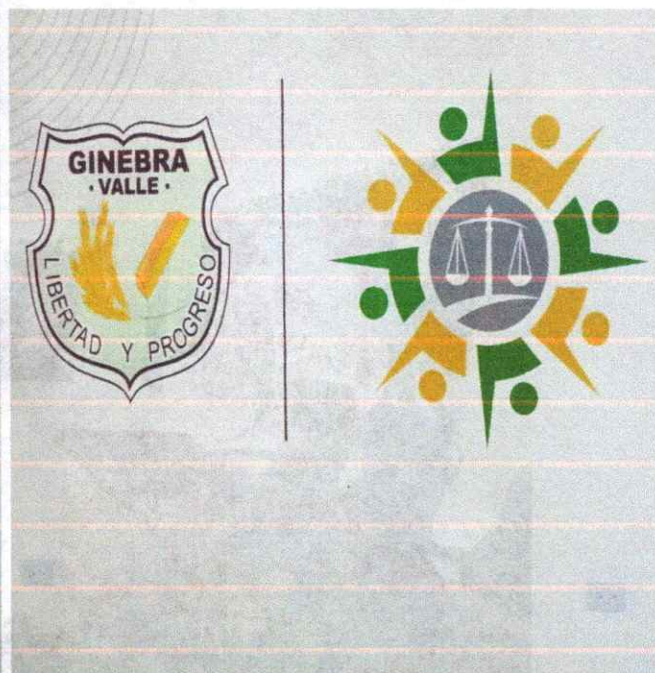

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.



OBRA ADICIONAL POR CONDICION DE LA INFRAESTRUCTURA

1	Impermeabilización e Inmunización de vigas de madera.	ML	87
2	Suministro e instalación de salida eléctrica.	UND	24
3	Reubicación de tablero de breaker's existente.	UND	1
4	Construcción de muro de H=12CM x 13.5M de largo, una hilada en ladrillo común.		
5	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias pvc cuadrado canal.	ML	17
6	Suministro e instalación Canal en lamina de aluminio galvanizada Cal.22	ML	13,5

EJECUCION

1 Impermeabilización e Inmunización de vigas de madera.
Debido a las circunstancias que se presentaron y frente a la necesidad de efectuar una intervencion total a la cubierta, conoedores de las falencias de la estructura de soporte, el alto grado de deterioro por broma o comején, producto de su vejes, tramos podridos, debido a la humedad por falta de cubierta o desacomodo o por fracturas en el tejado y conocida la necesidad de realizar una elevacio de la cubierta para poder intervenir y resolver los problemas de humeda en la estructura y los muros de las instalaciones se efectuo la inmunización de los 87 metros lineales de madera de la estructura de la cubierta.

2 Suministro e instalación de salida eléctrica.

3 Reubicación de tablero de breaker's existente.

En lo concerniente a este punto es necesario aclarar que, debido a las condiciones y el estado de las redes eléctricas y la ubicación de sus terminales, su temporalidad y utilidad, se hizo necesario su reemplazo total, tal como se describe, en este mismo documento. La ubicación de los tomacorrientes y el tablero de breaker's a una altura superior a los 2.2 metros, hacian supremamente difícil su acceso, especialmente en caso de presentarse, una emergencia, por corto circuito o conato de incendio en la edificación, sumado a que se tenía, el riesgo permanente de pérdida de equipos o daño de computadores, microfonos altavoces etc.

4 Construcción de muro de H=12CM x 13.5M de largo, una hilada en ladrillo común. Se necesito contruir en su lugar un muro de 13.5 metros lineales con dos hiladas de ladillo para poder alcanzar una profundidad de 20 cms. con el objeto de profundizar la canal de aguas lluvias colindante con la edificación del ara y la cual se hallaba fracturada por lo que provocaba las humedades permanentes en la pared del fondo de las instalaciones del concejo. Para este evento fue necesario levantar toda de estructura del techo o soporte de la cubierta manteniendo las condiciones técnicas y arquitectónicas de la edificación

5 Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias pvc cuadrado canal.

Se relizo el suministro y la instalación de un bajante de aguas lluvias de pvc para dar seguridad al desague de la canal galvanizada construida y colocada para recibir las aguas lluvias del tejado posterior de la sala del concejo Mpal.



4.4 Mural exterior concejo full color, 6x1 mtrs.

El mural externo se construyo en cumplimiento delo acordado con caracteres de identificación del Concejo Mpal.

5 LIMPIEZA GENERAL

5.1 Retiro de saldos en sitio.

Se efectuo el retiro pernente de los escombros, desechos y desperdicios, aunados a las basuras que se fueron generando constantemente, durante el desarrollo de las labores contractuales.

5.2 Limpieza general.

Tal como se hace en cada obra, toda vez terminadas las labores y cumplido el acto contractual, se efectuo el retiro final de desperdicios y elementos sobrantes, se hizo el aseo general de las áreas intervenidas para hacer la entrega a entera satisfacion de las obras contratadas con absoluta pulcritud.

mantenimiento del salón del concejo Municipal de la ciudad de Ginebra. Dentro de estas actividades podemos resaltar:

CANALES

Se alzaprimo el tejado sobre la canal en concreto existente, la cual estaba fracturada hecho que provocaba una filtración constante y el subsecuente deterioro de las estructuras y muros adyacentes.

Este hecho obligo al levantamiento del techo y la pega de dos hiladas de ladrillo que permitieran, profundizar la canal, para sobreponer otra en lamina que garantizara la no filtración del agua.

Par adelantar esta atrea se debio recorrer el tejado hallandose que la estructura estaba fuertemente afectada lo que obligo al requerimiento de conceptos técnicos de profesionales en ingeniería y Arquitectura para el cambio o reemplazo de elementos estructurales como la limeteza o viga cumbreira, puntales o soportes y el pie de rey, correas, alfardas y riostras. Determinación de movimientos desentejado, diseño y determinación de la recomposicion de la cubierta y el cambio y aumento de tejas.

se levanto la totalidad de la cubierta 20 cms para poder colocar una canal sobre la existente, de concreto de 14 mts de longitud con 30cms ancho por 20 cms de profundidad. Lo cual determina una capacidad de carga lo suficientemente apta para evacuar la superficie determinada sin riesgo de saturación.

El tejado posterior que tiene pendiente hacia el patio tracero requirió de instalar canal con bajantes a la zona exterior debido al exceso de humedad provocado por la caída libre de las aguas sobre la escara existente.

Conceptos ingenieros civil y arquitecto. obra vieja debe tener un manejo tecnico

- Alistado de nivelación para evacuacion de aguas en zonas de empozamiento.
- Sellamiento con epoxico SIKA en filtración de drenaje en canal.
- Pintura en aceite de carpintería metalica existente en cocina de zona intervenida

Durante el proceso se presentaron una serie de inconvenientes que generaron retraso en el buen desarrollo de las actividades, como fuertes y constantes precipitaciones durante todo el periodo de ejecución, además surgieron durante este proceso varias actividades no programadas o establecidas dentro del diagnostico inicial, lo que genero inconsistencias dentro del cronograma establecido inicialmente, no obstante, se logro entregar un excelente producto.

CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

6. Suministro e instalación Canal en lamina de aluminio galvanizada Cal.22.
Se construyo una canal galvanizada de 13.55 metros lineales, para sobre poner en la canal que fuera reconstruida y profundizada, con el objeto de dar una solución definitiva a los problemas de humedad y deterioro permanente, de las paredes de la sala principal del Concejo Mpl.

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CIELO RASO

- Generalmente no se requiere otro cuidado que una observación periódica comprobando que no existan fisuras o manchas de humedad.
- Deberán estar siempre secos.
- No someterlos a humedades ambientales superiores al 70 %, salpicar con agua.
- Si por cualquier causa recibe un exceso de agua, el revestimiento puede perder sus propiedades y únicamente podrá volver a su primitivo estado mediante una total sustitución.
- No sujetar elementos pesados anclados sólo al espesor del revestimiento.
- Sobre los techos, es posible que se encuentren conducciones eléctricas y tuberías que podrían dañarse e incluso producir accidentes al realizar taladros.
- Para la limpieza sólo es necesario desempolvar periódicamente con un paño seco.

MATERIALES

Se utilizaron pinturas tipo 1, se recomienda lo siguiente:

- Retirar el polvo en seco con escobas y/o cepillos no abrasivos
- Lavar únicamente con agua, es decir no utilizar productos químicos para retirar la mugre difícil de retirar con el cepillado en seco.
- Si se van a hacer retoques, se requiere aplicar la pintura en un solo sentido para evitar que las trazas de las brochas o rodillos utilizados queden notorios a la vista.

Actualmente y a la fecha, ya se culminaron todas las actividades presupuestadas dentro del contrato inicial, cabe anotar que el contratista ejecuto una serie de actividades no programadas o presupuestadas y las cuales no fueron cobradas, y otras que debieron ser contratadas dada su magnitud. Tal es el caso de las paredes con un alto grado de humedad y deterioro temporal,

de igual manera Modernización y actualización del sistema. Además de esto una vez se intervino el tejado se pudo observar un alto deterioro en la estructura de soporte por humedad y la necesidad de ser intervenida da la falta de cobertura esto con el afán de lograr un excelente producto final, llevando a feliz termino el contrato de


CONSTRUCTORA MAKINA SAS.

6. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El pasado 10 de noviembre de 2024, en recorrido programado por la interventoria del contrato, se realizo la entrega formal del proyecto al personal designado, quien recibio a satisfacci3n las actividades ejecutadas, permitiendo continuar con el proceso de liquidaci3n del contrato, para culminar los procesos civiles y legales, establecidos inicialmente en el mismo.

7. PORCENTAJES DE EJECUCI3N DE LA OBRA Y SUPERVISION TECNICA

Porcentaje programado	100.00%
Porcentaje ejecutado	100.00%
Porcentaje de atraso	0.00%



Se entrega informe final 28 de noviembre de 2024.

CARLOS HERNAN AGUDELO MARTINEZ
SOMAC. SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAKINA SAS.
NIT: 901343636 - 4

SOMAC Sociedad Constructora Mákina SAS
NIT.901343636-4



Diciembre 3 de 2024

Señores:

MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA,

Asunto: CUENTA DE COBRO.

El municipio de GINEBRA VALLE DEL CAUCA, debe a **CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S** identificada con nit. 901343636-4, la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE. (\$ 37.678.110)**, por concepto de contrato ejecutado, proceso de mínima cuantía **MC No. 035 – 2024. "REALIZAR ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE"**.

Att. CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S.
NIT. 901343636-4.
REP. LEGAL.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901343636	4	CONSTRUCTORA MAKINA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Calle 12 # 10 30	TULUA-VALLE	2332255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1870725349	9445566517	N	2025/01/11	2024/12/08	BANCOLOMBIA	99	\$660,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 16347154	AGUDELO CARLOS		0	\$0	\$0	EPS018	30	(\$1,000,000)	(\$40,000)	CCF57	30	(\$1,000,000)	(\$40,000)	14-11	30	(\$1,000,000)	(\$69,600)	30	\$0	\$0
2	CC 16347154	AGUDELO CARLOS		0	\$0	\$0	EPS018	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF57	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$278,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$278,400	\$28,700	\$0	\$307,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$278,400	\$28,700	\$0	\$307,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$16,500	\$0	\$176,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$160,000	\$16,500	\$0	\$176,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$16,500	\$0	\$176,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$160,000	\$16,500	\$0	\$176,500	
TOTAL				1	\$598,400	\$61,700	\$0	\$660,100	

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:

ALCALDIA DE GINEBRA
GINEBRA-VALLE.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, CERTIFICO Que **la empresa CONSTRUCTORA MAKINA SAS** identificada con NIT 901.343.636-4, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia, se firma en Tulua-Valle; a los 10 días del mes de Diciembre de 2024.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Contador Público y Representante Legal

Firma:



PAOLA ANDREA ARIAS.
Contador Público.
T.P. 176310-T

CARLOS HERNAN AGUDELO.
C.C. 16.347.154
Representante legal.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176310-T

PAOLA ANDREA
ARIAS
C.C. 31792221

RESOLUCION INSCRIPCION 090
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

FECHA 07/03/2013

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

187837



104876

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 42 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcca.com
