

		INFORME SEMANAL					34	
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.								
OBJETO								
INTERVENTOR		CONSORCIO COLEGIOS BOGOTÁ						
CONTRATISTA		CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES						
CONTRATANTE		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
SEMANA N°		34	DEL	1 de diciembre de 2024			AL	7 de diciembre de 2024
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .		No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023		Contrato No .		No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023		
Fecha de Iniciación		5/12/2023		Fecha de Iniciación		15/04/2024		
Fecha de Terminación		4/09/2024		Fecha de Terminación		14/12/2024		
Plazo Inicial		36 SEMANAS		Plazo Inicial		32 SEMANAS		
Valor Inicial		\$ 504.777.262		Valor inicial		\$ 6.322.397.994		
Adiciones		\$ 79.569.271,00		Adiciones		0		
Prorroga		TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS. (31-12-2024)		Prorroga		N.A.		
Suspensión		N.A.		Suspensión		N.A.		
2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL								
EJECUCION ACUMULADA :								
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR)	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%		
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%		
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%		
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%		
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%		
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%		
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%		
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%		
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%		
18	GRUPO 7	25,44%	10,33%	35,77%	37,69%	-1,92%		
19	GRUPO 7	35,77%	1,19%	36,96%	42,30%	-5,34%		
20	GRUPO 7	36,96%	1,97%	38,93%	45,96%	-7,03%		
21	GRUPO 7	38,93%	2,24%	41,17%	49,60%	-8,43%		
22	GRUPO 7	41,17%	5,05%	46,22%	53,30%	-7,08%		
23	GRUPO 7	46,22%	9,12%	55,34%	57,33%	-1,99%		
24	GRUPO 7	55,34%	0,00%	55,34%	60,82%	-5,48%		
25	GRUPO 7	52,26%	1,90%	54,16%	66,11%	-11,95%		
26	GRUPO 7	54,16%	0,99%	55,15%	65,43%	-10,28%		
27	GRUPO 7	55,15%	5,04%	60,19%	70,13%	-9,94%		
28	GRUPO 7	60,19%	6,81%	67,00%	76,68%	-9,68%		
29	GRUPO 7	67,00%	1,88%	68,88%	80,33%	-11,45%		
30	GRUPO 7	68,88%	1,89%	70,77%	86,20%	-15,43%		
31	GRUPO 7	70,77%	7,04%	77,81%	91,25%	-13,44%		
32	GRUPO 7	77,81%	3,07%	80,88%	95,09%	-14,21%		
33	GRUPO 7	80,88%	2,81%	83,69%	97,10%	-13,41%		
34	GRUPO 7	83,69%	4,30%	87,99%	97,54%	-9,55%		
2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL								
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:						ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	DESCRIPCIÓN	
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	100%	100%	0,00%	100%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizaron el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.	
2	Villemar el Carmen - Sede A	100%	100%	0,00%	100%	1.- Reparar las FILTRACIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6° o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024. El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.	
3	DILE Fontibón	100%	92,57%	-7,43%	100,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua. 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	Contrucción e instalación de escalera de gato. Instalación de tanques de agua. El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.	

4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	100%	100%	0,00%	100%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024.	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	100,00%	45,93%	-54,07%	100,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	Durante este periodo el Contratista no realizó actividades en este colegio.	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	100,00%	100%	0,00%	100,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercadería 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	100%	100%	0,00%	100%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Oval) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de máquinas	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	100%	100%	0,00%	100%	1-Construcción de aulita modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML. 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alfombra pesado	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	100,00%	79,70%	-20,30%	100,00%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pérgola en policarbonato en el área de piscina y/o ahora 3-Mejoramiento de piso con grama sintética en primera infancia	Instalación de unidades de juego. Instalación de césped.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	100%	100%	0,00%	100,00%	1-Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometidas trifásicas hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alfombra pesado	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	99,48%	86,01%	-13,47%	99,48%	1.- Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2.- Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra será el día 06-05-2024.	Excavaciones e instalación de carcamo.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	100%	100%	0,00%	100%	1.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicación del biciclotero	Las actividades de intervención ya fueron terminadas y el acta de entrega física del colegio, fue suscrita y radicada a la SED el 8/nov/2024.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicitó la construcción de una pérgola sobre el área restante de la zona de alimentación.
13	Tom Adams	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	1.- Terminación de cerramiento metálico faltante. 2-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permanece. 3.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	Aplicación de pintura sobre la placa e instalación de bajante de la canal.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	100,00%	65,95%	-34,05%	100,00%	1.- Mejoramiento integral de 2 baterías de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias. 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpintería metálica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balcones	Construcción e instalación de estructura metálica y cubierta baños nuevos. Pintura de muros en salones.	El 19 de julio del 2024 se definió el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el inicio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones serán habilitadas el 23 de agosto del 2024.

15	Paulo VI SEDE A	100,00%	93,96%	-6,04%	100,00%	<p>Bloque tipo ALIANZA</p> <p>1.- Escarificar muros y repintar</p> <p>2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro.</p> <p>3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS</p> <p>5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electrica</p> <p>7.- Iluminación e Interruptores</p> <p>8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta</p> <p>10.- Viga de concreto perimetral + transversales</p> <p>11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas</p>	Instalación de estructura para muro perimetral, construcción de estructura de pergolas.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	88,00%	90,67%	2,67%	88,00%	<p>1.- Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometa trifasica desde el tablero principal.</p> <p>2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas</p>	Intalación de ventaneria, instalacio de elementos electricos, toma corrientes e iluminación.	<p>Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024.</p> <p>Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.</p>
17	DILE Kennedy	100,00%	65,59%	-34,41%	100,00%	<p>1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso</p> <p>2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación</p> <p>4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas</p>	Instalación de estructura metalica y cubierta en la segunda area habilitada.	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detalladamente el alcance del proyecto.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.


¹ El informe semanal del presente periodo reportado fue elaborado con el presupuesto y la programación entregadas por el Contratista de Obra el 10 de octubre del 2024.

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO INCIAL INCLUIDO AUI	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	\$ 6.322.397.994	\$ 6.262.474.987,00	\$ 1.099.923.007	16,76%
MODIFICATORIO.	\$ -	\$ -	\$ -	-

3.1. VALOR DE LAS ACTAS			
Descripción de las actas		Valor acta	Saldo del contrato
Acta de corte N°1.	Comprende el periodo del 15 de abril al 14 de mayo del 2024	\$ 61.303.102	\$ 6.261.054.882
Acta de corte N°2.	Comprende el periodo del 15 de mayo al 14 de junio del 2024	\$ 369.335.384	\$ 5.902.719.508
Acta de corte N°3.	Comprende el periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2024	\$ 577.341.488	\$ 5.325.418.020
Acta de corte N°4.	Comprende el periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2024	\$ 1.140.028.339	\$ 4.185.389.681
Acta de corte N°5.	Comprende el periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2024	\$ 1.169.775.550	\$ 3.015.614.135
Acta de corte N°6.	Comprende el periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2024	\$ 840.869.141	\$ 2.174.744.994
Acta de corte N°7.	Comprende el periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2024	\$ 735.894.301	\$ 1.418.850.693
Acta de corte N°8.	Comprende el periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2024	\$ 359.927.695	\$ 1.059.923.007
TOTAL FACTURADO A LA FECHA Y PORCENTAJE EJECUCION MAS MODIFICATORIO		\$ 6.262.474.987	83,24%

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
OFICIALES	0	OFICIALES	9
AYUDANTES	0	AYUDANTES	19
ALMACENISTA	0	ALMACENISTA	1
MUJERES NO CALIFICADAS	0	MUJERES NO CALIFICADAS	0
INSPECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	2	INSPECTOR DE OBRA	3
INGENIERO RESIDENTE OBRA E INTERVENTORIA	2	INGENIERO RESIDENTE	2
DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
ASESOR SST	1	ASESOR SST	1
AUXILIAR SST	1	AUXILIAR SST	1
ASESOR AMBIENTAL	1	ASESOR AMBIENTAL	1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)
--

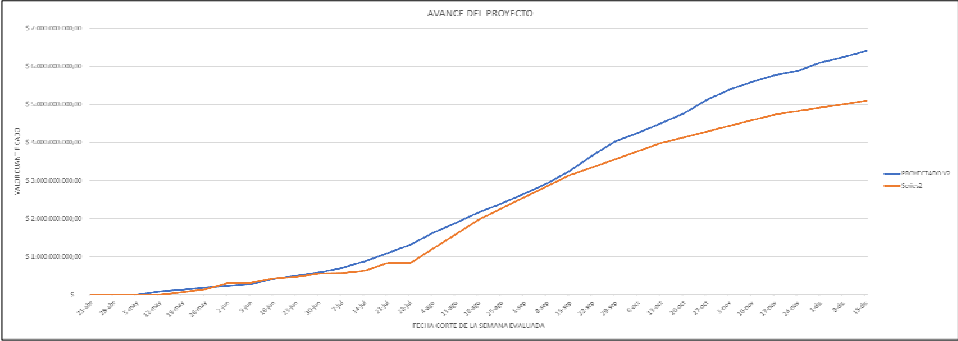

BALANCE DEL CONTRATO				
No.	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO V8	DIFERENCIA
1	Integrado de Fontibón	\$ 109.963.240,00	\$ 187.765.919,67	\$ -77.802.679,67
2	Villemar el Carmen	\$ 130.265.276,00	\$ 114.471.787,03	\$ 15.793.488,97
3	DILE Fontibón	\$ 83.662.772,00	\$ 85.595.286,73	\$ -1.932.514,73
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	\$ 12.621.176,00	\$ 11.128.885,67	\$ 1.492.290,33
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	\$ 257.631.233,00	\$ 31.223.323,42	\$ 226.407.909,58
6	Gabriel Betancourt Mejía	\$ 137.470.832,00	\$ 226.053.260,61	\$ -88.582.428,61
7	Kennedy Sede A	\$ 282.844.409,94	\$ 170.568.883,96	\$ 112.275.525,98
8	La Amistad Sede A	\$ 291.400.787,00	\$ 179.194.033,45	\$ 112.206.753,55
9	San Rafael - Sede A	\$ 419.806.996,00	\$ 429.715.142,39	\$ -9.908.146,39
10	Paulo VI	\$ 1.070.438.856,10	\$ 1.007.122.811,88	\$ 63.316.044,22
11	La Amistad Pinar del Río	\$ 237.789.266,00	\$ 112.495.453,86	\$ 125.293.812,14
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	\$ 932.915.494,00	\$ 1.499.014.391,24	\$ -566.098.897,24
13	El Japón	\$ 341.508.416,36	\$ 229.855.248,82	\$ 111.653.167,54
14	Tom Adams	\$ 323.933.646,00	\$ 168.245.472,97	\$ 155.688.173,03
15	Kennedy ANTONIA SANTOS SEDE B	\$ 412.697.198,60	\$ 402.678.402,41	\$ 10.018.796,19
16	San Pedro Claver	\$ 608.667.636,00	\$ 733.843.685,27	\$ -125.176.049,27
17	DILE Kennedy	\$ 394.884.590,00	\$ 354.102.123,80	\$ 40.782.466,20
	Emergencias	\$ 273.896.169,00	\$ 373.896.169,00	\$ -
	TOTAL	\$ 6.322.397.994,00	\$ 6.316.970.282,20	\$ 105.427.711,80

PROGRAMACION SEMANAL

PRESUPUESTO ASIGNADO													
No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
1	Integrado de Fontibón	E	Versalles			\$ 187.765.920	KR 108 #22-34						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	190,40			\$ 5.697,00	\$ 844.986,21	\$ 1.084.708,80	0,58%	190,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 CM a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	72,86			\$ 33.499,00	\$ 1.901.329,86	\$ 2.440.737,14	1,30%	72,86	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	198,42			\$ 33.321,00	\$ 5.150.387,80	\$ 6.611.562,82	3,52%	198,42	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	107,49			\$ 25.899,00	\$ 2.168.640,27	\$ 2.783.883,51	1,48%	107,49	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	4,00			\$ 13.736,00	\$ 42.801,28	\$ 54.944,00	0,03%	4,00	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)			M3	0,40			\$ 1.143.946,00	\$ 356.452,75	\$ 457.578,40	0,24%	0,40	
	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 20, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA			M2	4,06			\$ 247.028,00	\$ 781.283,54	\$ 1.002.933,68	0,53%	4,06	
	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ANDEN EN CONCRETO DE E= 0.10 3000PSI ESCOBIADO Y GUALIADO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE			M2	27,72			\$ 115.091,00	\$ 2.485.255,53	\$ 3.190.322,52	1,70%	27,72	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	27,72			\$ 22.800,00	\$ 492.339,33	\$ 632.016,00	0,34%	27,72	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	1.155,88			\$ 19.300,00	\$ 17.378.269,07	\$ 22.308.484,00	11,88%	1.155,88	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	6,00			\$ 207.295,00	\$ 968.894,60	\$ 1.243.770,00	0,66%	6,00	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	24,00			\$ 17.959,00	\$ 335.760,69	\$ 431.016,00	0,23%	24,00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	4,00			\$ 196.647,00	\$ 612.750,64	\$ 786.588,00	0,42%	4,00	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	VITOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R. CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	4,00			\$ 208.211,00	\$ 648.783,98	\$ 832.844,00	0,44%	4,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	14,00			\$ 189.960,00	\$ 2.071.699,00	\$ 2.659.440,00	1,42%	14,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	4,00			\$ 182.337,00	\$ 568.160,79	\$ 729.348,00	0,39%	4,00	
	PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PAÑETE LISO 1:4 CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	123,18			\$ 42.940,00	\$ 4.120.393,55	\$ 5.289.349,20	2,82%	123,18	
	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M2	387,47			\$ 20.466,00	\$ 6.177.425,43	\$ 7.929.961,02	4,22%	387,47	
	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	240,60			\$ 12.004,00	\$ 2.249.873,33	\$ 2.888.162,40	1,54%	240,60	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm.. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).			M2	172,87			\$ 231.879,00	\$ 31.226.082,99	\$ 40.084.922,73	21,35%	172,87	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	52,74			\$ 193.088,00	\$ 7.932.897,97	\$ 10.183.461,12	5,42%	52,74	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH			M	7,80			\$ 116.793,00	\$ 709.655,99	\$ 910.985,40	0,49%	7,80	
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DISPOSICION FINAL TEJA EN ASBESTO			KG	2.318,00			\$ 2.094,00	\$ 3.781.173,17	\$ 4.853.892,00	2,59%	2.318,00	
	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)			KG	2.318,00			\$ 2.618,00	\$ 4.727.369,32	\$ 6.068.524,00	3,23%	2.318,00	
2	Villemar el Carmen	A	Villemar El Carmen			\$ 114.471.787	CL 20D #96G-51						Sin intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	116,22			\$ 5.697,00	\$ 515.778,87	\$ 662.105,34	0,35%	116,22	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	46,12			\$ 31.660,00	\$ 1.137.461,40	\$ 1.460.159,20	0,78%	46,12	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 CM a 0,12 CM. Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	244,43			\$ 33.499,00	\$ 6.378.562,41	\$ 8.188.160,57	4,36%	244,43	
	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M2	244,43			\$ 45.324,00	\$ 8.630.166,95	\$ 11.078.545,32	5,90%	244,43	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	20,56			\$ 13.736,00	\$ 219.998,57	\$ 282.412,16	0,15%	20,56	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)			M2	245,73			\$ 149.577,00	\$ 28.632.512,43	\$ 36.755.556,21	19,58%	245,73	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	275,31			\$ 22.800,00	\$ 4.889.824,73	\$ 6.277.068,00	3,34%	275,31	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)			M2	185,55			\$ 32.430,00	\$ 4.687.533,30	\$ 6.017.386,50	3,20%	185,55	
	LAVADO H MAX= 5M, DE LADRILLO CON ACIDO NITRICO			M2	185,55			\$ 18.961,00	\$ 2.740.682,05	\$ 3.518.213,55	1,87%	185,55	
	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS			M2	185,55			\$ 26.427,00	\$ 3.819.840,97	\$ 4.903.529,85	2,61%	185,55	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	36,86			\$ 59.753,00	\$ 1.715.740,11	\$ 2.202.495,58	1,17%	36,86	
3	DILE Fontibón	N/A				\$ 85.595,287	CL 25B #88-55						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	REPLANTEO			M2	121,39			\$ 3.603,00	\$ 340.709,02	\$ 437.368,17	0,23%	121,39	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	121,39			\$ 25.899,00	\$ 2.449.076,58	\$ 3.143.879,61	1,67%	121,39	
	PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M2	121,39			\$ 20.466,00	\$ 1.935.318,02	\$ 2.484.367,74	1,32%	121,39	
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS			M2	121,39			\$ 151.666,00	\$ 14.341.930,16	\$ 18.410.735,74	9,81%	121,39	
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	N/A				\$ 11.128.886	CL 17 # 68-83						En intervención
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	3,23			\$ 80.080,00	\$ 201.494,43	\$ 258.658,40	0,14%	3,23	
	BASE GRANULAR CLASE C (B.G. C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	1,77			\$ 212.676,00	\$ 293.243,37	\$ 376.436,52	0,20%	1,77	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ANDEN EN CONCRETO DE E= 9,10 3000PSI ESCOBADO Y GUALIADO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE			M2	8,52			\$ 115.091,00	\$ 763.866,42	\$ 980.575,32	0,52%	8,52	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	8,52			\$ 22.800,00	\$ 151.325,08	\$ 194.256,00	0,10%	8,52	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	271,98			\$ 19.300,00	\$ 4.089.128,30	\$ 5.249.214,00	2,80%	271,98	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOXIDABLE			M2	22,50			\$ 129.411,00	\$ 2.268.246,09	\$ 2.911.747,50	1,55%	22,50	
5	INEM Francisco de Paula Santander	B	Casablanca			\$ 31.223.523	KR 79N #35A-09 sur						En intervención
								0	0	0	0	0	
6	Gabriel Betancourt Mejia	C	Villa Mejia Tagasto			\$ 226.053.261	CL 11a # 88a-27						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	93,50			\$ 31.660,00	\$ 2.305.998,29	\$ 2.960.210,00	1,58%	93,50	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	2.511,98			\$ 19.300,00	\$ 37.766.778,84	\$ 48.481.214,00	25,82%	2.511,98	
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	128,00			\$ 17.959,00	\$ 1.790.723,69	\$ 2.298.752,00	1,22%	128,00	
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)			M2	37,15			\$ 677.040,00	\$ 19.593.390,98	\$ 25.152.036,00	13,40%	37,15	
7	Kennedy	B	Antonia Santos II			\$ 402.678.402	CL 25 sur #69c-34						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	REPLANTEO			M2	509,17			\$ 3.603,00	\$ 1.429.102,99	\$ 1.834.539,51	0,98%	509,17	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	350,43			\$ 49.959,00	\$ 13.638.024,75	\$ 17.507.132,37	9,32%	350,43	
	DEMOLICION ALFAJIA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	51,15			\$ 19.241,00	\$ 766.672,24	\$ 984.177,15	0,52%	51,15	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	178,61			\$ 33.499,00	\$ 4.660.946,01	\$ 5.983.256,39	3,19%	178,61	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	60,34			\$ 28.198,00	\$ 1.325.439,99	\$ 1.701.467,32	0,91%	60,34	
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	89,86			\$ 10.087,00	\$ 706.097,86	\$ 906.417,82	0,48%	89,86	
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	12,68			\$ 30.428,00	\$ 300.558,57	\$ 385.827,04	0,21%	12,68	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			UN	19			\$ 17.274,00	\$ 255.671,89	\$ 328.206,00	0,17%	19,00	
	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	27,62			\$ 19.477,00	\$ 419.065,78	\$ 537.954,74	0,29%	27,62	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.			M3	350,6			\$ 26.757,00	\$ 7.307.785,46	\$ 9.381.004,20	5,00%	350,60	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	118,18			\$ 68.329,00	\$ 6.290.504,96	\$ 8.075.121,22	4,30%	118,18	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG. C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	59,09			\$ 193.254,00	\$ 8.895.675,67	\$ 11.419.378,86	6,08%	59,09	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG. C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	59,09			\$ 212.676,00	\$ 9.789.689,83	\$ 12.567.024,84	6,69%	59,09	
8	La Amistad	C	Pinar Del Rio			\$ 112.495.454	KR 83 #40bis-36 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	OSRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	20,00			\$ 31.660,00	\$ 493.261,67	\$ 633.200,00	0,34%	20,00	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	38,57			\$ 30.428,00	\$ 914.238,50	\$ 1.173.607,96	0,63%	38,57	
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	46,04			\$ 16.131,00	\$ 578.539,57	\$ 742.671,24	0,40%	46,04	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	694,35			\$ 19.300,00	\$ 10.439.319,93	\$ 13.400.955,00	7,14%	694,35	
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCÓN, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANUJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.			M2	38,57			\$ 843.316,00	\$ 25.338.239,56	\$ 32.526.698,12	17,32%	38,57	
	MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)			M	94,53			\$ 54.393,00	\$ 4.005.429,84	\$ 5.141.770,29	2,74%	94,53	
	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)			M2	63,65			\$ 687.755,00	\$ 34.101.118,45	\$ 43.775.605,75	23,31%	63,65	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	PANETES, ESTUCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	PANETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM			M	259,26			\$ 16.199,00	\$ 3.271.599,86	\$ 4.199.752,74	2,24%	259,26	
9	San Rafael	A	San Rafael			\$ 429.715.142	TV 781 #42B-81 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	583,37			\$ 5.697,00	\$ 2.588.968,52	\$ 3.323.458,89	1,77%	583,37	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	243,10			\$ 31.660,00	\$ 5.995.595,54	\$ 7.696.546,00	4,10%	243,10	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	97,13			\$ 33.321,00	\$ 2.521.203,34	\$ 3.236.468,73	1,72%	97,13	
	MANTENIMIENTOS								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE, (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)			M2	8,80			\$ 34.827,00	\$ 238.745,50	\$ 306.477,60	0,16%	8,80	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.			M3	636,01			\$ 26.757,00	\$ 13.256.773,05	\$ 17.017.719,57	9,06%	636,01	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	6,63			\$ 80.080,00	\$ 413.593,83	\$ 530.930,40	0,28%	6,63	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	265,97			\$ 68.329,00	\$ 14.157.096,00	\$ 18.173.464,13	9,68%	265,97	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	186,72			\$ 51.806,00	\$ 7.535.418,18	\$ 9.673.216,32	5,15%	186,72	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	114,96			\$ 193.254,00	\$ 17.306.597,99	\$ 22.216.479,84	11,83%	114,96	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	81,98			\$ 212.676,00	\$ 13.581.972,80	\$ 17.435.178,48	9,29%	81,98	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA			M3	69,21			\$ 150.247,00	\$ 8.100.486,77	\$ 10.398.594,87	5,54%	69,21	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	182,64			\$ 102.814,00	\$ 14.627.988,60	\$ 18.777.948,96	10,00%	182,64	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	217,54			\$ 22.800,00	\$ 3.863.762,56	\$ 4.959.912,00	2,64%	217,54	
	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS			M	30,60			\$ 91.965,00	\$ 2.192.201,45	\$ 2.814.129,00	1,50%	30,60	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS			M	27,60			\$ 42.591,00	\$ 915.721,43	\$ 1.175.511,60	0,63%	27,60	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS			M	24,60			\$ 13.010,00	\$ 249.315,26	\$ 320.046,00	0,17%	24,60	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CAJA DE INSPECCION 80 X 80, INCLUYE TAPA PREFABRICADA.			UN	2,00			\$ 744.961,00	\$ 1.160.646,57	\$ 1.489.922,00	0,79%	2,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			M	202,70			\$ 20.936,00	\$ 3.305.855,89	\$ 4.243.727,20	2,26%	202,70	
	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			M2	278,13			\$ 60.321,00	\$ 13.069.315,05	\$ 16.777.079,73	8,94%	278,13	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE EMBOQUILLADO			M	141,67			\$ 68.346,00	\$ 7.542.710,77	\$ 9.682.577,82	5,16%	141,67	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10 X 20 X 8 COLOR OCRE TRAFICO PESADO, INCLUYE BASE Y SELLO DE ARENA.			M2	395,07			\$ 114.280,00	\$ 35.170.678,20	\$ 45.148.599,60	24,05%	395,07	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE CON RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR INCLUYE CUADRILLA PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE EL RECUBRIMIENTO			M2	182,64			\$ 104.424,00	\$ 14.857.053,33	\$ 19.071.999,36	10,16%	182,64	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	97,13			\$ 193.088,00	\$ 14.609.828,96	\$ 18.754.637,44	9,99%	97,13	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	18,26			\$ 59.753,00	\$ 849.956,98	\$ 1.091.089,78	0,58%	18,26	
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			M2	97,13			\$ 4.613,00	\$ 349.038,47	\$ 448.060,69	0,24%	97,13	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.			UN	4,00			\$ 269.355,00	\$ 839.308,25	\$ 1.077.420,00	0,57%	4,00	
10	Paulo VI	A	Paulo VI			\$ 1.007.122.812	KR 78N #41-17/21 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	488,40			\$ 5.697,00	\$ 2.167.496,14	\$ 2.782.414,80	1,48%	488,40	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	47,25			\$ 31.660,00	\$ 1.165.330,68	\$ 1.495.935,00	0,80%	47,25	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	0,37			\$ 285.384,00	\$ 82.256,04	\$ 105.592,08	0,06%	0,37	
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	7,28			\$ 77.217,00	\$ 437.905,87	\$ 562.139,76	0,30%	7,28	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	15,93			\$ 49.959,00	\$ 619.963,29	\$ 795.846,87	0,42%	15,93	
	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E ≈ 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)			M	592,69			\$ 19.241,00	\$ 8.883.655,29	\$ 11.403.948,29	6,07%	592,69	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	215,11			\$ 33.499,00	\$ 5.613.437,63	\$ 7.205.969,89	3,84%	215,11	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	114,10			\$ 28.198,00	\$ 2.506.342,45	\$ 3.217.391,80	1,71%	114,10	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	VITOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	26,78			\$ 30.428,00	\$ 634.775,91	\$ 814.861,84	0,43%	26,78	
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	196,32			\$ 16.131,00	\$ 2.466.961,07	\$ 3.166.837,92	1,69%	196,32	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	516,53			\$ 33.321,00	\$ 13.407.568,85	\$ 17.211.296,13	9,17%	516,53	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	28,28			\$ 25.899,00	\$ 570.556,77	\$ 732.423,72	0,39%	28,28	
	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	26,10			\$ 21.352,00	\$ 434.125,73	\$ 557.287,20	0,30%	26,10	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)			UN	26,00			\$ 10.034,00	\$ 203.228,17	\$ 260.884,00	0,14%	26,00	
	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			UN	36,00			\$ 5.814,00	\$ 163.047,44	\$ 209.304,00	0,11%	36,00	
	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	14,84			\$ 19.477,00	\$ 225.160,61	\$ 289.038,68	0,15%	14,84	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	461,14			\$ 6.845,00	\$ 2.458.910,42	\$ 3.156.503,30	1,68%	461,14	
	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.			M3	181,00			\$ 26.757,00	\$ 3.772.701,57	\$ 4.843.017,00	2,58%	181,00	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	290,70			\$ 13.736,00	\$ 3.110.582,85	\$ 3.993.055,20	2,13%	290,70	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. ANCHO= 1,00 M PROFUNDIDAD = 1,20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	124,48			\$ 51.806,00	\$ 5.023.612,12	\$ 6.448.810,88	3,43%	124,48	
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO			M3	9,48			\$ 17.458,00	\$ 128.925,64	\$ 165.501,84	0,09%	9,48	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M	39,24			\$ 141.097,00	\$ 4.313.037,53	\$ 5.536.646,28	2,95%	39,24	
	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO			M	24,98			\$ 83.728,00	\$ 1.629.294,57	\$ 2.091.525,44	1,11%	24,98	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO			M	46,70			\$ 80.258,00	\$ 2.919.723,14	\$ 3.748.048,60	2,00%	46,70	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI			KG	502,58			\$ 6.691,00	\$ 2.619.586,18	\$ 3.362.762,78	1,79%	502,58	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	1.587,69			\$ 19.300,00	\$ 23.870.387,94	\$ 30.642.417,00	16,32%	1.587,69	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4			M2	78,21			\$ 56.455,00	\$ 3.439.546,27	\$ 4.415.345,55	2,35%	78,21	
	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D= 160 MM (INCLUYE RELLENO)			M	28,40			\$ 124.885,00	\$ 2.762.899,43	\$ 3.546.734,00	1,89%	28,40	
	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC S 4" INCLUYE ACCESORIOS			M	32,16			\$ 66.441,00	\$ 1.664.518,63	\$ 2.136.742,56	1,14%	32,16	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC S 3" INCLUYE ACCESORIOS			M	2,00			\$ 68.293,00	\$ 106.400,25	\$ 136.586,00	0,07%	2,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC S 2" INCLUYE ACCESORIOS			M	27,15			\$ 41.410,00	\$ 875.813,27	\$ 1.124.281,50	0,60%	27,15	
	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS			M	122,06			\$ 13.184,00	\$ 1.253.594,33	\$ 1.609.239,04	0,86%	122,06	
	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"			UN	28,00			\$ 51.393,00	\$ 1.120.981,54	\$ 1.439.004,00	0,77%	28,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"			UN	8,00			\$ 143.207,00	\$ 892.463,97	\$ 1.145.656,00	0,61%	8,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"			UN	13,00			\$ 80.811,00	\$ 818.371,11	\$ 1.050.543,00	0,56%	13,00	
	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1/2"			UN	3,00			\$ 120.712,00	\$ 282.103,30	\$ 362.136,00	0,19%	3,00	
	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM. INCLUYE TAPA PREFABRICADA			UN	1,00			\$ 552.209,00	\$ 430.169,82	\$ 552.209,00	0,29%	1,00	
	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA			UN	2,00			\$ 744.961,00	\$ 1.160.646,57	\$ 1.489.922,00	0,79%	2,00	
	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA			UN	1,00			\$ 929.256,00	\$ 723.888,76	\$ 929.256,00	0,49%	1,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04			M2	100,90			\$ 31.050,00	\$ 2.440.558,54	\$ 3.132.945,00	1,67%	100,90	
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM			M2	69,16			\$ 17.082,00	\$ 920.301,57	\$ 1.181.391,12	0,63%	69,16	
	MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 CM			M2	35,86			\$ 136.773,00	\$ 3.820.736,76	\$ 4.904.679,78	2,61%	35,86	
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.			M2	9,72			\$ 843.316,00	\$ 6.385.472,87	\$ 8.197.031,52	4,37%	9,72	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.			M2	3,40			\$ 469.825,00	\$ 1.244.375,63	\$ 1.597.405,00	0,85%	3,40	
	MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)			M	29,16			\$ 54.393,00	\$ 1.235.568,96	\$ 1.586.099,88	0,84%	29,16	
	PANETES, ESTUCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	PANETE Y ESTUCCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	PANETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATAIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	767,97			\$ 33.499,00	\$ 20.040.684,76	\$ 25.726.227,03	13,70%	767,97	
	PANETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	379,10			\$ 20.664,00	\$ 6.102.455,71	\$ 7.833.722,40	4,17%	379,10	
	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	856,40			\$ 12.004,00	\$ 8.008.277,32	\$ 10.280.225,60	5,48%	856,40	
11	La Amistad	A	La Amistad			\$ 179.194.033	KR 76 #35-30 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	100,05			\$ 5.697,00	\$ 444.017,18	\$ 569.984,85	0,30%	100,05	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	30,06			\$ 31.660,00	\$ 741.372,28	\$ 951.699,60	0,51%	30,06	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	3,55			\$ 306.480,00	\$ 847.553,17	\$ 1.088.004,00	0,58%	3,55	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	0,72			\$ 49.959,00	\$ 28.020,94	\$ 35.970,48	0,02%	0,72	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	100,05			\$ 33.499,00	\$ 2.610.870,88	\$ 3.351.574,95	1,78%	100,05	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	7,06			\$ 28.198,00	\$ 155.081,31	\$ 199.077,88	0,11%	7,06	
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	6,00			\$ 138.026,00	\$ 645.132,04	\$ 828.156,00	0,44%	6,00	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	26,50			\$ 13.736,00	\$ 283.558,46	\$ 364.004,00	0,19%	26,50	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	48,29			\$ 68.329,00	\$ 2.570.388,26	\$ 3.299.607,41	1,76%	48,29	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	15,01			\$ 193.254,00	\$ 2.259.673,24	\$ 2.900.742,54	1,54%	15,01	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	23,28			\$ 212.676,00	\$ 3.856.895,91	\$ 4.951.097,28	2,64%	23,28	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	100,05			\$ 102.814,00	\$ 8.013.196,77	\$ 10.286.540,70	5,48%	100,05	
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)			M3	0,25			\$ 1.143.946,00	\$ 222.782,97	\$ 285.986,50	0,15%	0,25	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	100,05			\$ 22.800,00	\$ 1.777.003,97	\$ 2.281.140,00	1,21%	100,05	
	ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	3.134,99			\$ 19.300,00	\$ 47.133.525,75	\$ 60.505.307,00	32,22%	3.134,99	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	16,00			\$ 207.295,00	\$ 2.583.718,94	\$ 3.316.720,00	1,77%	16,00	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	36,00			\$ 17.959,00	\$ 503.641,04	\$ 646.524,00	0,34%	36,00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	0,00%	-		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 196.647,00	\$ 153.187,66	\$ 196.647,00	0,10%	1,00	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL, GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 238.886,00	\$ 186.091,77	\$ 238.886,00	0,13%	1,00	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA TRIFÁSICA 50A 250V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-50R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7 M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN			UN	1,00			\$ 317.394,00	\$ 247.249,36	\$ 317.394,00	0,17%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA			UN	1,00			\$ 576.825,00	\$ 449.345,64	\$ 576.825,00	0,31%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA			UN	1,00			\$ 562.903,00	\$ 438.500,43	\$ 562.903,00	0,30%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA			UN	3,00			\$ 24.293,00	\$ 56.772,61	\$ 72.879,00	0,04%	3,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA			UN	1,00			\$ 160.667,00	\$ 125.159,31	\$ 160.667,00	0,09%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.			M	3,00			\$ 49.459,00	\$ 115.585,42	\$ 148.377,00	0,08%	3,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN			M	3,00			\$ 48.486,00	\$ 113.311,52	\$ 145.458,00	0,08%	3,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA- CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 535.706,00	\$ 417.314,01	\$ 535.706,00	0,29%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	8,00			\$ 189.960,00	\$ 1.183.828,00	\$ 1.519.680,00	0,81%	8,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	2,00			\$ 182.337,00	\$ 284.080,39	\$ 364.674,00	0,19%	2,00	
	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS			UN	2,00			\$ 228.048,00	\$ 355.297,97	\$ 456.096,00	0,24%	2,00	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS			UN	8,00			\$ 206.006,00	\$ 1.283.826,44	\$ 1.648.048,00	0,88%	8,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED			UN	8,00			\$ 57.924,00	\$ 360.981,54	\$ 463.392,00	0,25%	8,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04			M2	98,07			\$ 31.050,00	\$ 2.372.106,80	\$ 3.045.073,50	1,62%	98,07	
	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO = 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).			M	45,56			\$ 50.716,00	\$ 1.799.969,59	\$ 2.310.620,96	1,23%	45,56	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA			M2	98,07			\$ 133.900,00	\$ 10.229.471,84	\$ 13.131.573,00	6,99%	98,07	
	OBRA EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2"X 2"			M2	7,06			\$ 118.295,00	\$ 650.590,25	\$ 835.162,70	0,44%	7,06	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2.5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)			M2	148,50			\$ 137.783,00	\$ 15.938.907,46	\$ 20.460.775,50	10,90%	148,50	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	10,00			\$ 59.753,00		\$ -			
12	INEM Francisco de Paula Santander	A	Inem Francisco De Paula			\$ 31.223.323	CL 38C sur # 79-08						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRA PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	2.150,00			\$ 5.697,00	\$ 9.541.598,50	\$ 12.248.550,00	6,52%	2.150,00	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	211,90			\$ 31.660,00	\$ 5.226.107,35	\$ 6.708.754,00	3,57%	211,90	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	37,21			\$ 33.499,00	\$ 971.019,55	\$ 1.246.497,79	0,66%	37,21	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	1.476,03			\$ 33.321,00	\$ 38.313.309,68	\$ 49.182.795,63	26,19%	1.476,03	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)			UN	181,00			\$ 10.034,00	\$ 1.414.780,71	\$ 1.816.154,00	0,97%	181,00	
	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO			UN	12,00			\$ 81.832,00	\$ 764.963,78	\$ 981.984,00	0,52%	12,00	
	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)			M	168,00			\$ 6.053,00	\$ 792.166,39	\$ 1.016.904,00	0,54%	168,00	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.			M3	124,96			\$ 26.757,00	\$ 2.604.623,14	\$ 3.343.554,72	1,78%	124,96	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	25.653,71			\$ 19.300,00	\$ 385.694.946,64	\$ 495.116.603,00	263,69%	25.653,71	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13			M	49,70			\$ 102.005,00	\$ 3.949.247,10	\$ 5.069.648,50	2,70%	49,70	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERÍA)			M2	2.258,28			\$ 137.783,00	\$ 242.387.312,64	\$ 311.152.593,24	165,71%	2.258,28	
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO			KG	28.432,00			\$ 2.094,00	\$ 46.378.910,96	\$ 59.536.608,00	31,71%	28.432,00	
	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)			KG	28.432,00			\$ 2.618,00	\$ 57.984.712,94	\$ 74.434.976,00	39,64%	28.432,00	
13	El Japón	A	El Japon			\$ 229.855.249	KR 78G #38C-11 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	218,92			\$ 5.697,00	\$ 971.556,63	\$ 1.247.187,24	0,66%	218,92	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	57,70			\$ 31.660,00	\$ 1.423.059,90	\$ 1.826.782,00	0,97%	57,70	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	0,81			\$ 49.959,00	\$ 31.523,56	\$ 40.466,79	0,02%	0,81	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			\$ 66.647,00	\$ 12.483.138,33	\$ 16.024.604,68	8,53%	240,44	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM ± 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			\$ 33.499,00	\$ 6.274.440,73	\$ 8.054.499,56	4,29%	240,44	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	10,80			\$ 13.736,00	\$ 115.563,45	\$ 148.348,80	0,08%	10,80	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	71,16			\$ 80.080,00	\$ 4.439.115,68	\$ 5.698.492,80	3,03%	71,16	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	27,00			\$ 51.806,00	\$ 1.089.633,09	\$ 1.398.762,00	0,74%	27,00	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			\$ 193.254,00	\$ 4.943.882,03	\$ 6.346.461,36	3,38%	32,84	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			\$ 212.676,00	\$ 5.440.741,48	\$ 6.984.279,84	3,72%	32,84	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	218,92			\$ 102.814,00	\$ 17.533.723,52	\$ 22.508.040,88	11,99%	218,92	
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).			M3	0,28			\$ 1.143.946,00	\$ 249.516,93	\$ 320.304,88	0,17%	0,28	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	256,14			\$ 22.800,00	\$ 4.549.343,30	\$ 5.839.992,00	3,11%	256,14	
	ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	3.897,32			\$ 19.300,00	\$ 58.594.902,24	\$ 75.218.276,00	40,06%	3.897,32	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	15,00			\$ 207.295,00	\$ 2.422.236,50	\$ 3.109.425,00	1,66%	15,00	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	24,00			\$ 17.959,00	\$ 335.760,69	\$ 431.016,00	0,23%	24,00	
	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN TRITURADO 3/4" ANCHO =50CM			M3	9,89			\$ 180.644,00	\$ 1.391.734,17	\$ 1.786.569,16	0,95%	9,89	
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 196.647,00	\$ 153.187,66	\$ 196.647,00	0,10%	1,00	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 238.886,00	\$ 186.091,77	\$ 238.886,00	0,13%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA			UN	1,00			\$ 576.825,00	\$ 449.345,64	\$ 576.825,00	0,31%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA			UN	2,00			\$ 24.293,00	\$ 37.848,41	\$ 48.586,00	0,03%	2,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.			UN	1,00			\$ 50.637,00	\$ 39.446,13	\$ 50.637,00	0,03%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.			M	27,00			\$ 18.238,00	\$ 383.598,97	\$ 492.426,00	0,26%	27,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA IMC DE 1"			M	9,00			\$ 69.400,00	\$ 486.562,28	\$ 624.600,00	0,33%	9,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN			M	40,45			\$ 48.486,00	\$ 1.527.817,01	\$ 1.961.258,70	1,04%	40,45	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA- CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.			UN	1,00			\$ 535.706,00	\$ 417.314,01	\$ 535.706,00	0,29%	1,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	8,00			\$ 189.960,00	\$ 1.183.828,00	\$ 1.519.680,00	0,81%	8,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			UN	2,00			\$ 182.337,00	\$ 284.080,39	\$ 364.674,00	0,19%	2,00	
	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS			UN	2,00			\$ 228.048,00	\$ 355.297,97	\$ 456.096,00	0,24%	2,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS			UN	8,00			\$ 206.006,00	\$ 1.283.826,44	\$ 1.648.048,00	0,88%	8,00	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED			UN	8,00			\$ 57.924,00	\$ 360.981,54	\$ 463.392,00	0,25%	8,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			M2	67,41			\$ 60.321,00	\$ 3.167.592,59	\$ 4.066.238,61	2,17%	67,41	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE CON RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR INCLUYE CUADRILLA PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE EL RECUBRIMIENTO			M2	118,86			\$ 104.424,00	\$ 9.668.798,50	\$ 12.411.836,64	6,61%	118,86	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO			M2	29,20			\$ 24.965,00	\$ 567.872,56	\$ 728.978,00	0,39%	29,20	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	69,50			\$ 193.088,00	\$ 10.453.856,82	\$ 13.419.616,00	7,15%	69,50	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)			M	8,40			\$ 164.809,00	\$ 1.078.441,69	\$ 1.384.395,60	0,74%	8,40	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)			M2	116,82			\$ 137.783,00	\$ 12.538.607,20	\$ 16.095.810,06	8,57%	116,82	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	21,89			\$ 59.753,00	\$ 1.018.924,34	\$ 1.307.993,17	0,70%	21,89	
14	Tom Adams	A	Tom Adams			\$ 168.245,473	CL 40J sur #78-08						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	153,53			\$ 5.697,00	\$ 681.358,89	\$ 874.660,41	0,47%	153,53	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	28,40			\$ 31.660,00	\$ 700.431,57	\$ 899.144,00	0,48%	28,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	1,51			\$ 306.480,00	\$ 360.508,53	\$ 462.784,80	0,25%	1,51	
	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3,40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	7,27			\$ 98.488,00	\$ 557.768,76	\$ 716.007,76	0,38%	7,27	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	14,76			\$ 49.959,00	\$ 574.429,26	\$ 737.394,84	0,39%	14,76	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	13,62			\$ 28.198,00	\$ 299.179,53	\$ 384.056,76	0,20%	13,62	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	22,69			\$ 6.845,00	\$ 120.988,59	\$ 155.313,05	0,08%	22,69	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	10,50			\$ 13.736,00	\$ 112.353,35	\$ 144.228,00	0,08%	10,50	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	46,95			\$ 80.080,00	\$ 2.928.843,19	\$ 3.759.756,00	2,00%	46,95	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	12,30			\$ 51.806,00	\$ 496.388,41	\$ 637.213,80	0,34%	12,30	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	18,89			\$ 193.254,00	\$ 2.843.785,98	\$ 3.650.568,06	1,94%	18,89	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	18,89			\$ 212.676,00	\$ 3.129.586,07	\$ 4.017.449,64	2,14%	18,89	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M	20,50			\$ 141.097,00	\$ 2.253.243,36	\$ 2.892.488,50	1,54%	20,50	
	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM, NO INCLUYE REFUERZO			M	19,00			\$ 83.728,00	\$ 1.239.255,28	\$ 1.590.832,00	0,85%	19,00	
	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)			M	25,38			\$ 80.355,00	\$ 1.588.696,66	\$ 2.039.409,90	1,09%	25,38	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	25,48			\$ 102.814,00	\$ 2.040.742,17	\$ 2.619.700,72	1,40%	25,48	
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).			M3	0,25			\$ 1.143.946,00	\$ 222.782,97	\$ 285.986,50	0,15%	0,25	
	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ANDEN EN CONCRETO DE E= 0.10 3000PSI ESCOBIADO Y GUALIADO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE			M2	72,68			\$ 115.091,00	\$ 6.516.175,03	\$ 8.364.813,88	4,45%	72,68	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 80000 PSI			KG	465,33			\$ 6.691,00	\$ 2.425.428,86	\$ 3.113.523,03	1,66%	465,33	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	98,16			\$ 22.800,00	\$ 1.743.435,38	\$ 2.238.048,00	1,19%	98,16	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	1.929,69			\$ 19.300,00	\$ 29.012.243,51	\$ 37.243.017,00	19,83%	1.929,69	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	16,00			\$ 207.295,00	\$ 2.983.718,94	\$ 3.316.720,00	1,77%	16,00	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5			M2	44,46			\$ 55.705,00	\$ 1.929.301,47	\$ 2.476.644,30	1,32%	44,46	
	PANETES, ESTUCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PANETE MURO 1-4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	67,15			\$ 33.499,00	\$ 1.752.323,63	\$ 2.249.457,85	1,20%	67,15	
	PANETE MURO 1-4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	113,14			\$ 20.664,00	\$ 1.821.239,35	\$ 2.337.924,96	1,25%	113,14	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2'X 2'			M2	7,89			\$ 118.295,00	\$ 727.076,07	\$ 933.347,55	0,50%	7,89	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERÍA)			M2	161,50			\$ 137.783,00	\$ 17.334.232,69	\$ 22.251.954,50	11,85%	161,50	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	CORTE DE RAÍCES ÁRBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION			UN	1,00			\$ 429.805,00	\$ 334.817,32	\$ 429.805,00	0,23%	1,00	
15	Kennedy	A	Kennedy			\$ 170.568.884	CL 5 sur #72a-69						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	491,00			\$ 5.697,00	\$ 2.179.034,82	\$ 2.797.227,00	1,49%	491,00	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	104,00			\$ 31.660,00	\$ 2.564.960,66	\$ 3.292.640,00	1,75%	104,00	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	116,02			\$ 24.468,00	\$ 2.211.402,48	\$ 2.838.777,36	1,51%	116,02	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	608,87			\$ 14.193,00	\$ 6.731.862,51	\$ 8.641.691,91	4,60%	608,87	
	DESMONTE DE ADOQUIN EN CONCRETO MACZO 10 ANCHO X20 LARGO X 4.5 ALTO CM COLOR OCRE INCLUYE DEMOLICION DE CINTAS Y TRASIEGO DE MATERIAL			M2	-			\$ 25.811,00	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DESMONTE Y REINSTALACION DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACION DE NIVEL)			M2	70,52			\$ 53.494,00	\$ 2.938.690,41	\$ 3.772.396,88	2,01%	70,52	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	537,69			\$ 12.165,00	\$ 5.095.426,38	\$ 6.540.998,85	3,48%	537,69	
	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.			M3	63,31			\$ 26.757,00	\$ 1.319.611,80	\$ 1.693.985,67	0,90%	63,31	
	LIMPIEZA DE PLACA BASE MEJORAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	58,01			\$ 7.470,00	\$ 337.566,95	\$ 433.334,70	0,23%	58,01	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	54,00			\$ 17.959,00	\$ 755.461,56	\$ 969.786,00	0,52%	54,00	
	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS			UN	25,00			\$ 111.005,00	\$ 2.161.817,40	\$ 2.775.125,00	1,48%	25,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04			M2	56,61			\$ 31.050,00	\$ 1.369.276,70	\$ 1.757.740,50	0,94%	56,61	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE			M2	537,69			\$ 58.881,00	\$ 24.662.868,96	\$ 31.659.724,89	16,86%	537,69	
	MEDICANA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO			M	491,87			\$ 21.575,00	\$ 8.266.803,19	\$ 10.612.095,25	5,65%	491,87	
	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)			M	221,96			\$ 16.356,00	\$ 2.828.057,77	\$ 3.630.377,76	1,93%	221,96	
	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL -E= 0.08 M.			M2	56,61			\$ 64.749,00	\$ 2.855.371,89	\$ 3.665.440,89	1,95%	56,61	
	PANETES, ESTUOCOS Y PINTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO			M2	15,69			\$ 31.579,00	\$ 385.973,76	\$ 495.474,51	0,26%	15,69	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)			M2	634,43			\$ 79.207,00	\$ 39.145.670,34	\$ 50.251.297,01	26,76%	634,43	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR			M2	634,43			\$ 14.267,00	\$ 7.051.034,36	\$ 9.051.412,81	4,82%	634,43	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM			M2	58,01			\$ 294.039,00	\$ 13.287.530,10	\$ 17.057.202,39	9,08%	58,01	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			M2	892,09			\$ 4.613,00	\$ 3.205.742,13	\$ 4.115.211,17	2,19%	892,09	
	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE OBRA CON CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)			KG	2.224,00			\$ 2.031,00	\$ 3.518.691,28	\$ 4.516.944,00	2,41%	2.224,00	
16	San Pedro Claver	A	San Pedro Claver			\$ 733.843.685	KR 79C #41B-51 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	545,80			\$ 5.697,00	\$ 2.422.234,63	\$ 3.109.422,60	1,66%	545,80	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	90,20			\$ 31.660,00	\$ 2.224.610,11	\$ 2.855.732,00	1,52%	90,20	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	8,03			\$ 49.959,00	\$ 312.511,31	\$ 401.170,77	0,21%	8,03	
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	61,22			\$ 66.647,00	\$ 3.178.413,45	\$ 4.080.129,34	2,17%	61,22	
	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA: (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	11,09			\$ 89.974,00	\$ 777.293,50	\$ 997.811,66	0,53%	11,09	
	DESMONTE Y REINSTALACION DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACION DE NIVEL)			M2	42,08			\$ 53.494,00	\$ 1.753.546,40	\$ 2.251.027,52	1,20%	42,08	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	LIMPIEZA DE PLACA BASE MEJORAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	50,08			\$ 7.470,00	\$ 291.421,36	\$ 374.097,60	0,20%	50,08	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	28,10			\$ 13.736,00	\$ 300.678,97	\$ 385.981,60	0,21%	28,10	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	12,10			\$ 80.080,00	\$ 754.824,34	\$ 968.968,00	0,52%	12,10	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	273,80			\$ 68.329,00	\$ 14.573.872,56	\$ 18.708.480,20	9,96%	273,80	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	68,06			\$ 51.806,00	\$ 2.746.682,53	\$ 3.525.916,36	1,88%	68,06	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			\$ 193.254,00	\$ 11.855.380,93	\$ 15.218.752,50	8,11%	78,75	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			\$ 212.676,00	\$ 13.046.845,06	\$ 16.748.235,00	8,92%	78,75	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M3	3,46			\$ 908.627,00	\$ 2.449.053,07	\$ 3.143.849,42	1,67%	3,46	
	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M	105,60			\$ 141.097,00	\$ 11.606.951,16	\$ 14.899.843,20	7,94%	105,60	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO			M	25,50			\$ 80.789,00	\$ 1.604.829,40	\$ 2.060.119,50	1,10%	25,50	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	545,80			\$ 102.814,00	\$ 43.714.170,91	\$ 56.115.881,20	29,89%	545,80	
	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 20, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA			M2	93,60			\$ 247.028,00	\$ 18.011.856,98	\$ 23.121.820,80	12,31%	93,60	


No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CARCANO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL			M	31,56			\$ 321.364,00	\$ 7.900.792,90	\$ 10.142.247,84	5,40%	31,56	
	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ANCHO 0M PROFUNDIDAD 0.30 M (NO INCLUYE REFUERZO)			M	20,10			\$ 136.648,00	\$ 2.170.931,53	\$ 2.786.824,80	1,48%	20,10	
	CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 10 CM (INCLUYE FORMALETAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).			M	51,00			\$ 19.555,00	\$ 776.898,81	\$ 997.305,00	0,53%	51,00	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI			KG	1.547,02			\$ 6.691,00	\$ 8.063.496,78	\$ 10.351.110,82	5,51%	1.547,02	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)			M2	638,59			\$ 22.800,00	\$ 11.342.098,62	\$ 14.559.852,00	7,75%	638,59	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	6.075,12			\$ 19.300,00	\$ 91.337.396,59	\$ 117.249.816,00	62,44%	6.075,12	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm. (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	44,00			\$ 207.295,00	\$ 7.105.227,08	\$ 9.120.980,00	4,86%	44,00	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)			M2	35,20			\$ 139.106,00	\$ 3.814.389,03	\$ 4.896.531,20	2,61%	35,20	
	LAVADO H MAX= 5M, DE LADRILLO CON ACIDO NITRICO			M2	70,40			\$ 18.961,00	\$ 1.039.849,19	\$ 1.334.854,40	0,71%	70,40	
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACION 10 A 15 CM, EPÓXICO Y ACERO)			UN	64,00			\$ 17.959,00	\$ 895.361,84	\$ 1.149.376,00	0,61%	64,00	
	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI			M	47,84			\$ 11.664,00	\$ 434.685,49	\$ 558.005,76	0,30%	47,84	
	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC'S 4" INCLUYE ACCESORIOS			M	8,10			\$ 66.441,00	\$ 419.235,10	\$ 538.172,10	0,29%	8,10	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC'S 3" INCLUYE ACCESORIOS			M	9,85			\$ 68.293,00	\$ 524.021,23	\$ 672.686,05	0,36%	9,85	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC'S 2" INCLUYE ACCESORIOS			M	33,21			\$ 41.410,00	\$ 1.071.298,67	\$ 1.375.226,10	0,73%	33,21	
	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS			M	9,77			\$ 18.033,00	\$ 137.245,78	\$ 176.182,41	0,09%	9,77	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS			M	15,93			\$ 13.010,00	\$ 161.446,83	\$ 207.249,30	0,11%	15,93	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS			M	17,89			\$ 13.184,00	\$ 183.735,89	\$ 235.861,76	0,13%	17,89	
	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"			UN	9,00			\$ 51.393,00	\$ 360.315,49	\$ 462.537,00	0,25%	9,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"			UN	13,00			\$ 80.811,00	\$ 818.371,11	\$ 1.050.543,00	0,56%	13,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04			M2	5,69			\$ 31.050,00	\$ 137.629,12	\$ 176.674,50	0,09%	5,69	
	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M			M2	11,52			\$ 36.233,00	\$ 325.157,09	\$ 417.404,16	0,22%	11,52	
	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			M	166,70			\$ 20.936,00	\$ 2.718.728,05	\$ 3.490.031,20	1,86%	166,70	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE CON RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR INCLUYE CUADRILLA PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE EL RECUBRIMIENTO			M2	284,38			\$ 104.424,00	\$ 23.133.206,45	\$ 29.696.097,12	15,82%	284,38	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	VIPARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)			M2	82,80			\$ 677.040,00	\$ 43.669.792,01	\$ 56.058.912,00	29,86%	82,80	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).			M2	107,80			\$ 231.879,00	\$ 19.472.272,49	\$ 24.996.556,20	13,31%	107,80	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)			M2	363,09			\$ 137.783,00	\$ 38.971.433,72	\$ 50.027.629,47	26,64%	363,09	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							\$ -	\$ -		0,00%	-	
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	50,51			\$ 59.753,00	\$ 2.351.113,21	\$ 3.018.124,03	1,61%	50,51	
17	DILE Kennedy	N/A				\$ 354.102.124	KR 78j #39 sur (esquina)						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS								\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	21,46			\$ 16.131,00	\$ 269.666,79	\$ 346.171,26	0,18%	21,46	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	91,67			\$ 25.899,00	\$ 1.849.467,42	\$ 2.374.161,33	1,26%	91,67	
	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	38,18			\$ 21.352,00	\$ 635.054,42	\$ 815.219,36	0,43%	38,18	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)			UN	36,00			\$ 10.034,00	\$ 281.392,85	\$ 361.224,00	0,19%	36,00	
	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			UN	22,00			\$ 5.814,00	\$ 99.640,10	\$ 127.908,00	0,07%	22,00	
	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)			M	-			\$ 6.053,00	\$ -	\$ -	0,00%	-	
	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	53,77			\$ 19.477,00	\$ 815.827,91	\$ 1.047.278,29	0,56%	53,77	
Total						\$ 4.475.283.045			\$ 2.438.287.667,26	\$ 3.130.029.878,46			


OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
En las actividades de ejecución comprendido entre el periodo del 1 al 7 de diciembre del 2024, se presenta un retraso acumulado del -9,55%, entre ejecutado vs programado. Se acalara que la fecha del contrato termina el 14 de diciembre.
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
a). El día 15 de abril se suscribio el acta de inicio del contrato de obra
b). I.E.D. KENNEDY. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
c). EN JARDIN INFANTIL INTEGRADO DE FONTIBÓN SEDE E. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
d). I.E.D. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A. El Contratista de obra continua con la instalación de muros en superboard e instalación de tuberia electrica, toma corrientes, luminarias e interruptores, tambien esta realizando actividades de excavación e instalación de carcamo.. Por otra parte durante este periodo se ejecutaron actividades para la atención de la emergencia.
e). I E.D SAN RAFAEL. El Contratista de obra instalo las unidades de juegos en la zona de los juegos infantiles.
f). I.E.D EL JAPON. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
g). I E.D LA AMISTAD. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
h). I E.D TOM ADAMS. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio esta siendo suscrita para la entregada a la SED.
j). I E.D SAN PEDRO CLAVER. El Contratista se encuentra reaizando actividades de instalación de ventanas en aluminio. Tambien se encuentra realizando instalaciones de elementos electricos.
k). PABLO VI. El Contratista de obra continua con las actividades de construcción de pergolas, construcción cerramiento perimetral.
l). VILLEMAR EL CARMEN SEDE A. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
m). COLEGIO PINAR DEL RIO SEDE C. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
n). COLEGIO GABRIE BETANCOURTH. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
o). COLEGIO KENNEDY ANTONIO SANTOS SEDE B. El Contratista esta realizando actividades de instalación de estructura metalica y cubierta en los baños nuevos.
p). DILE FONTIBON. El Contratista durante este periodo realizo la instalación de la escalera de gato y los tanques de agua.
q). DILE KENNEDY. Instalación de estructura metalica y cubierta.
r). OTIC. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. El acta de entrega fisica del colegio ya fue suscrita y entregada a la SED.
s). INEM SEDE B. Durante este periodo el Contratista no realizo actividades en este colegio.
2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. El Contratista de Obra ha estado realizando ajustes a los presupuestos con el fin de balancear las cantidades de obra, respecto a las actividades realmente ejecutadas. Por otra parte el pasado 28 de noviembre en el comite de obra, fueron revisados los presupuestos por parte de la SED, en esta se realizaron algunos ajustes a las actividades de algunos colegios y se hicieron observaciones las cuales fueron remitidas por la Interventoría mediante comunicado CCB-SED-2412-002 del 2 de diciembre del 2024.
b). Respecto a el avance de obra, se evidencia que el Contratista tiene un atraso del -9,55%, entre lo programado y ejecutado.
3. JURIDICO Y CONTRACTUAL.
a). El modificadorio numero 1 para el Adicional y Prorroga del contrato de Interventoría quedo suscrito el pasado 4 septiembre del 2024 y fue publicado en Secop II, adicionalmente este sera facturado, de cuerdo a las indicaciones de la SED, en Acta Parcial de Interventoría No. 5.
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA
Durante la semana fueron desarrolladas actividades de excavaciones, rellenos, demoliciones de muros, pañeta de muros, contrucción e instalación de estructura metalica, instalación de cubierta, demarcación de zonas de alimentación, instalación de tuberia electrica y de iluminación, instalación de ventanas y puertas, entre otras.

DIAGRAMAS CIRCULARES


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE E VERSALLES				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	85,33%	31,15%	-54,18%	31,15%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	45,56%	34,25%	-11,31%	31,15%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	50,27%	35,76%	-14,51%	35,76%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	53,43%	35,76%	-17,67%	35,76%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	59,88%	37,70%	-22,18%	35,76%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	61,61%	45,06%	-16,55%	45,06%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	63,34%	45,73%	-17,61%	45,06%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	67,88%	47,69%	-20,19%	45,06%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	96,73%	49,94%	-46,79%	45,06%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	100%	54,85%	-45,15%	45,06%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	100%	62,96%	-37,04%	62,96%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	62,96%	-37,04%	62,96%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	68,06%	-31,94%	62,96%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	99,76%	73,23%	-26,53%	62,96%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	100%	87,10%	-12,90%	62,96%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	100%	95,70%	-4,30%	94,27%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	100%	100%	0,00%	94,27%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	94,27%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

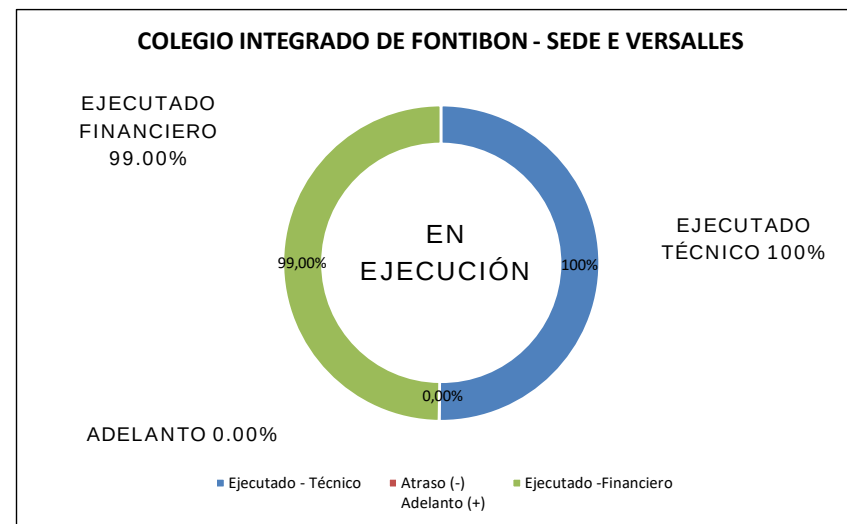


VILLEMAR DEL CARMEN SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
11. DEL 24 AL 29 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	8,67%	2,70%	-5,97%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	16,05%	5,83%	-10,22%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	11,80%	11,35%	-0,45%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	16,68%	11,35%	-5,33%	8,02%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	6,21%	8,37%	2,16%	8,37%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	9,49%	20,51%	11,02%	8,37%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	21,90%	50,86%	28,96%	50,86%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	35,56%	50,86%	15,30%	50,86%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	49,89%	52,75%	2,86%	50,86%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	61,40%	52,91%	-8,49%	50,86%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	67,20%	52,11%	-15,09%	50,86%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	87,34%	61,84%	-25,50%	61,84%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	96,54%	61,84%	-34,70%	61,84%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	85,09%	64,06%	-21,03%	61,84%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	100%	81,58%	-18,42%	61,84%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	100%	90,47%	-9,53%	61,84%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	100%	98,20%	-1,80%	97,69%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	100%	100%	0,00%	97,69%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	97,69%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

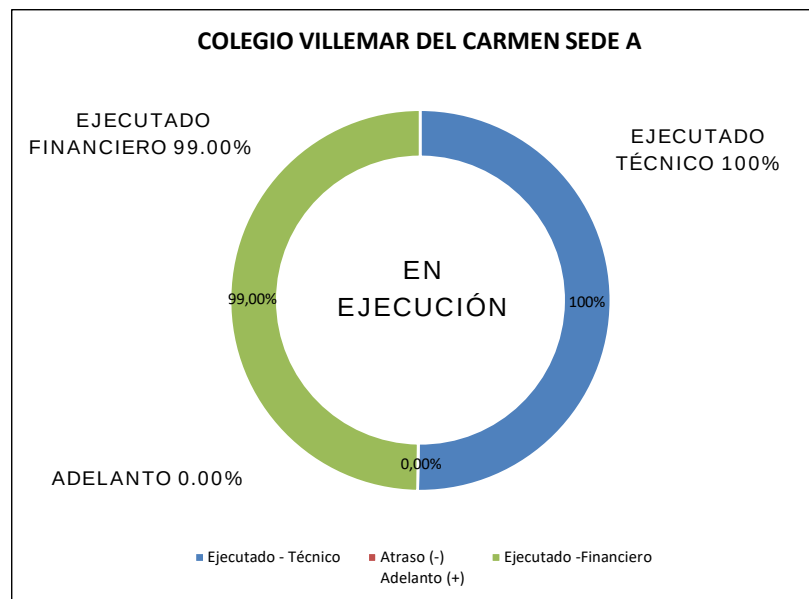


GABRIEL BETANCOURTH MEJIA SEDE C VILLA MEJIA TAGASTE				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	1,15%	0%	-1,06%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	3,41%	0%	-3,32%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,05%	0%	-3,05%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	18,10%	18,10%	18,10%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	3,05%	19,21%	16,16%	18,10%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	6,71%	30,14%	23,43%	18,10%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	10,38%	40,47%	30,09%	18,10%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	12,44%	31,68%	19,24%	18,10%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	29,39%	56,77%	27,38%	56,77%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	38,90%	56,77%	17,87%	56,77%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	35,26%	49,63%	14,37%	35,52%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	46,41%	56,70%	10,29%	35,52%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	55,09%	67,62%	12,53%	35,52%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	63,76%	78,90%	15,14%	77,07%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	72,43%	100%	27,57%	77,07%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	94,88%	100%	5,12%	77,07%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

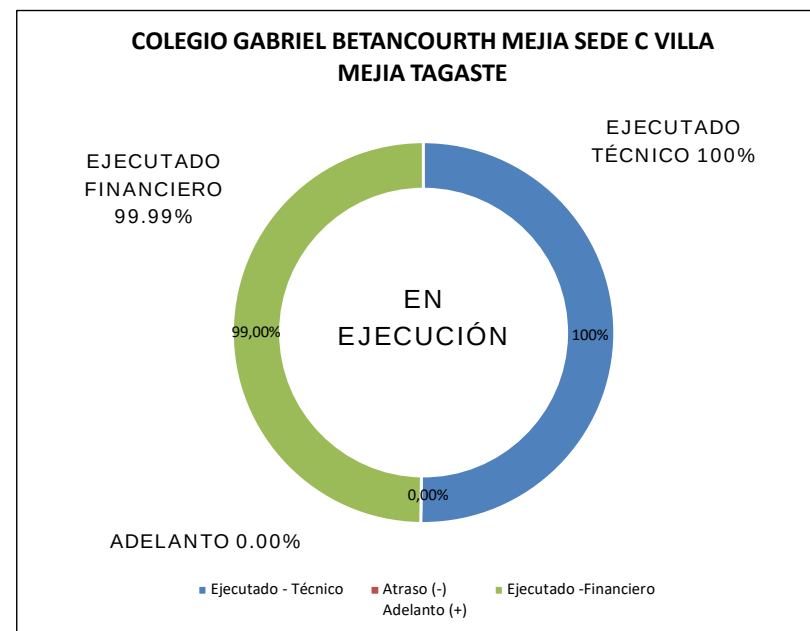


KENNEDY - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	28,85%	19,99%	-8,86%	16,71%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	33,88%	26,64%	-7,24%	16,71%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	70,15%	47,70%	-22,45%	16,71%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	80,89%	47,70%	-33,19%	46,10%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	91,61%	78,20%	-13,41%	46,10%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	94,57%	82,95%	-11,62%	46,10%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	95,19%	100%	4,81%	100%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	95,80%	100%	4,20%	100%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	96,43%	100%	3,57%	100%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	97,11%	100%	2,89%	100%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	98,78%	100%	1,22%	100%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	0%	100%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	100%	0%	100%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	100%	100%	0,00%	100%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	100%	100%	0,00%	100%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	100%	100%	0,00%	100%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	100%	100%	0,00%	100%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%

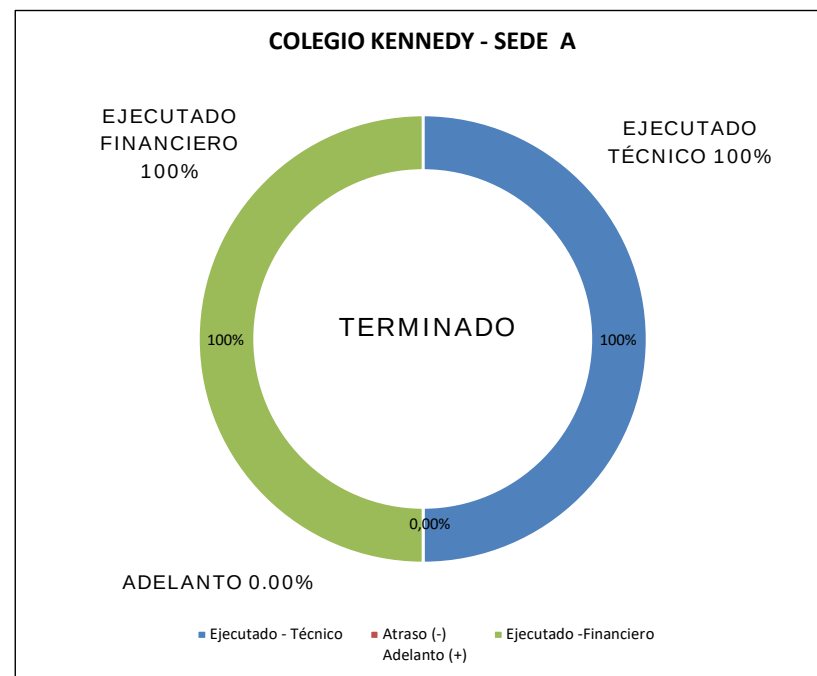


LA AMISTAD - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	59,90%	14,73%	-45,17%	9,20%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	66,76%	18,17%	-48,59%	9,20%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	48,96%	22,71%	-26,25%	9,20%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	53,65%	47,54%	-6,11%	47,54%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	59,56%	68,62%	9,06%	47,54%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	60,24%	70,65%	10,41%	47,54%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	65,99%	84,59%	18,60%	84,59%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	85,16%	84,59%	-0,57%	84,59%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	99,43%	87,18%	-12,25%	84,59%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	0%	84,59%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	83,67%	88,82%	5,15%	84,59%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	100%	95,10%	-4,90%	95,10%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	95,10%	-4,90%	95,10%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	91,98%	-8,02%	91,83%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	92,05%	81,51%	-10,54%	81,51%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	92,05%	84,97%	-7,08%	81,51%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	94,86%	93,85%	-1,01%	90,26%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	96,41%	100%	3,59%	90,26%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	90,26%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

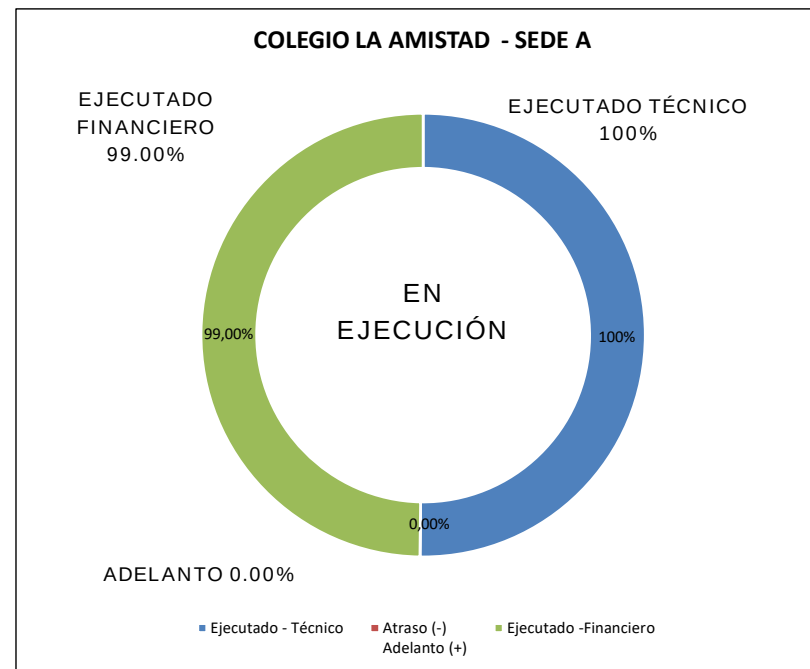


SAN RAFAEL - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
11. DEL 24 AL 29 DE JUNIO	11,66%	6,35%	-5,31%	5,61%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	13,02%	15,67%	2,65%	5,61%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	15,14%	16,16%	1,02%	5,61%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	21,96%	26,68%	4,72%	5,61%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	30,78%	26,68%	-4,10%	21,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	20,84%	22,85%	2,01%	21,14%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	23,23%	25,50%	2,27%	21,14%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	25,62%	33,79%	8,17%	33,79%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	43,80%	35,37%	-8,43%	33,79%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	44,66%	35,97%	-8,69%	33,79%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	46,62%	37,98%	-8,64%	33,79%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	48,26%	44,81%	-3,45%	33,79%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	49,91%	45,02%	-4,89%	45,02%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	51,32%	45,02%	-6,30%	45,02%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	52,51%	45,02%	-7,49%	45,02%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	81,30%	59,86%	-21,44%	45,02%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	83,19%	59,86%	-23,33%	45,02%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	85,24%	65,25%	-19,99%	65,25%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	85,67%	65,38%	-20,29%	65,25%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	89,90%	65,52%	-24,38%	65,25%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	98,28%	69,91%	-28,37%	69,91%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	70,15%	-29,85%	69,91%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	78,23%	-21,77%	69,91%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	79,70%	-20,30%	69,91%

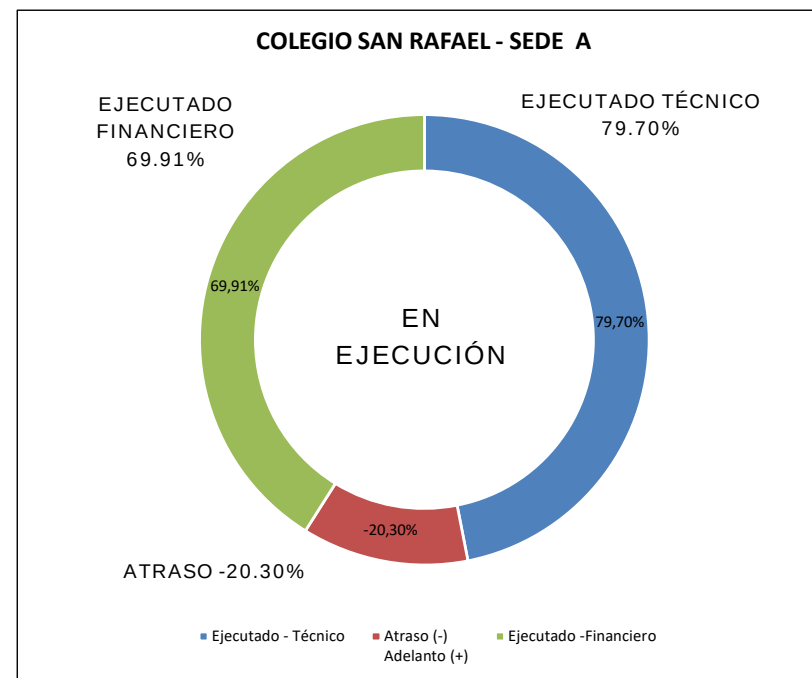


PAULO VI				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0,55%	0,25%	-0,30%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0,95%	1,34%	0,39%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	2,12%	2,37%	0,25%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,32%	2,37%	-0,95%	1,62%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	3,19%	3,09%	-0,10%	1,62%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	5,89%	3,09%	-2,80%	1,62%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	10,44%	9,16%	-1,28%	9,16%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	13,31%	9,49%	-3,82%	9,16%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	15,98%	11,88%	-4,10%	9,16%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	18,64%	12,19%	-6,45%	9,16%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	23,41%	13,78%	-9,63%	9,16%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	26,54%	23,17%	-3,37%	23,17%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	31,04%	23,17%	-7,87%	23,17%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	55,35%	19,88%	-35,47%	19,64%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	31,51%	21,22%	-10,29%	19,64%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	42,70%	36,11%	-6,59%	19,64%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	54,42%	43,23%	-11,19%	42,65%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	57,04%	47,56%	-9,48%	42,65%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	63,61%	47,87%	-15,74%	42,65%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	73,54%	65,10%	-8,44%	65,10%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	85,59%	75,76%	-9,83%	65,10%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	96,94%	80,61%	-16,33%	65,10%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100,00%	93,96%	-6,04%	65,10%

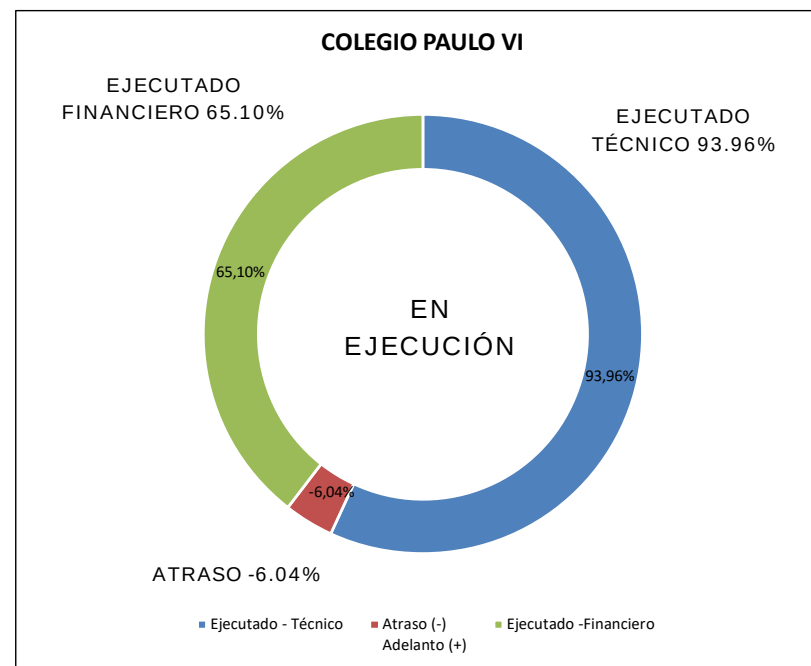


INEM SEDE A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
11. DEL 24 AL 29 DE JUNIO	7,83%	2,38%	-5,45%	1,74%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	7,49%	4,54%	-2,95%	1,74%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	7,83%	5,59%	-2,24%	1,74%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	10,15%	6,35%	-3,80%	1,74%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	13,48%	15,41%	1,93%	15,41%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	28,76%	33,19%	4,43%	15,41%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	34,01%	34,43%	0,42%	15,41%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	39,26%	50,34%	11,08%	50,34%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	44,52%	50,34%	5,82%	50,43%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	49,77%	52,41%	2,64%	50,34%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	55,10%	54,48%	-0,62%	50,43%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	60,43%	61,82%	1,39%	50,34%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	65,75%	79,39%	13,64%	79,39%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	71,08%	79,39%	8,31%	79,39%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	73,81%	75,98%	2,17%	75,98%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	71,30%	68,17%	-3,13%	68,17%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	75,14%	68,17%	-6,97%	68,17%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	80,85%	73,75%	-7,10%	72,92%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	84,96%	75,14%	-9,82%	72,92%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	89,19%	75,67%	-13,52%	72,92%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	92,47%	76,47%	-16,00%	76,47%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	94,93%	79,45%	-15,48%	76,47%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	98,34%	82,50%	-15,84%	76,47%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	99,48%	86,01%	-13,47%	76,47%

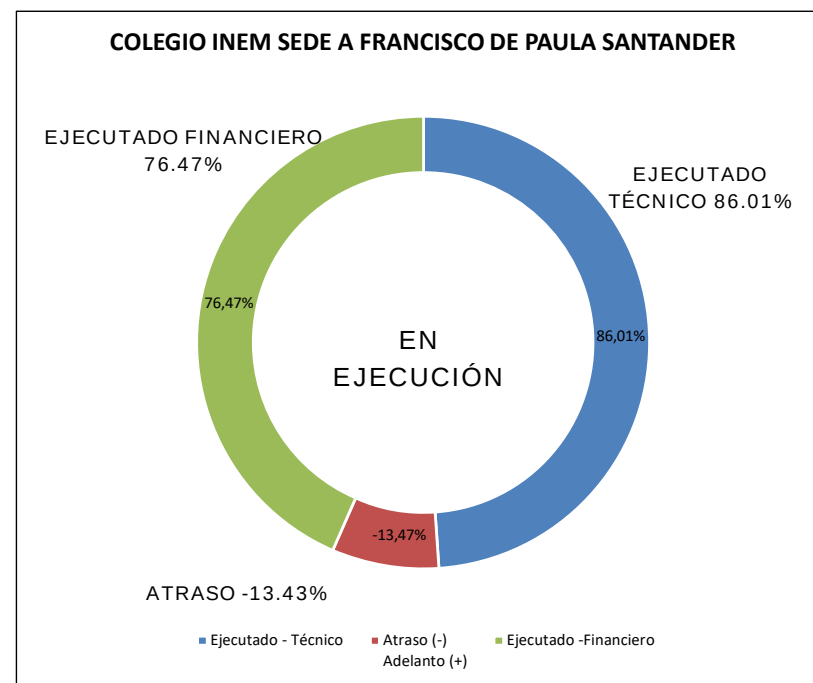


EL JAPON - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	70,13%	47,45%	-22,68%	41,64%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	77,37%	53,65%	-23,72%	41,64%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	68,45%	55,21%	-13,24%	41,64%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	72,93%	64,88%	-8,05%	64,88%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	89,09%	72,99%	-16,10%	64,88%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	91,62%	72,99%	-18,63%	64,88%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	99,75%	81,44%	-18,31%	81,44%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	100%	81,44%	-18,56%	81,44%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	100%	85,67%	-14,33%	81,44%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	100%	92,47%	-7,53%	81,44%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	95,29%	99,53%	4,24%	81,44%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	100%	95,23%	-4,77%	95,23%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	95,23%	-4,77%	95,23%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	95,23%	-4,77%	95,23%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	100%	94,98%	-5,02%	94,98%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	100%	94,98%	-5,02%	94,98%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	100%	100%	0,00%	99,00%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

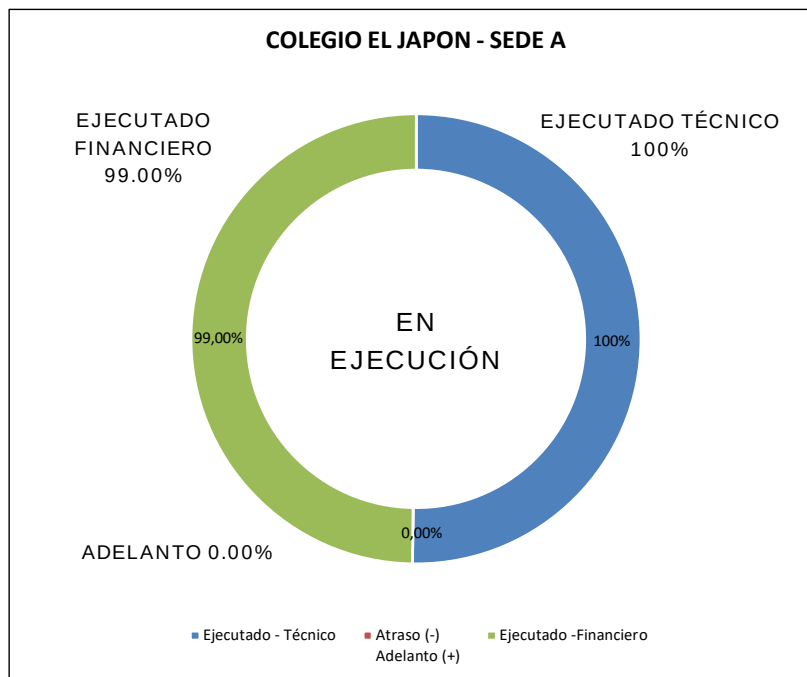


TOM ADAMS - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	25,21%	14,67%	-10,54%	5,62%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	43,08%	20,84%	-22,24%	5,62%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	36,55%	32,24%	-4,31%	5,62%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	43,93%	32,24%	-11,69%	24,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	50,60%	31,20%	-19,40%	24,14%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	55,76%	31,20%	-24,56%	24,14%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	59,90%	59,97%	0,07%	59,97%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	64,04%	62,24%	-1,80%	59,97%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	85,83%	63,82%	-22,01%	59,97%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	95,14%	79,59%	-15,55%	59,97%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	92,14%	74,21%	-17,93%	59,97%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	100%	78,53%	-21,47%	78,53%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	78,53%	-21,47%	78,53%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	83,96%	77,75%	-6,21%	72,84%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	58,55%	70,91%	12,36%	70,91%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	63,76%	71,04%	7,28%	70,91%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	81,68%	82,23%	0,55%	81,33%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	82,47%	86,27%	3,80%	81,33%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	84,18%	98,30%	14,12%	81,33%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

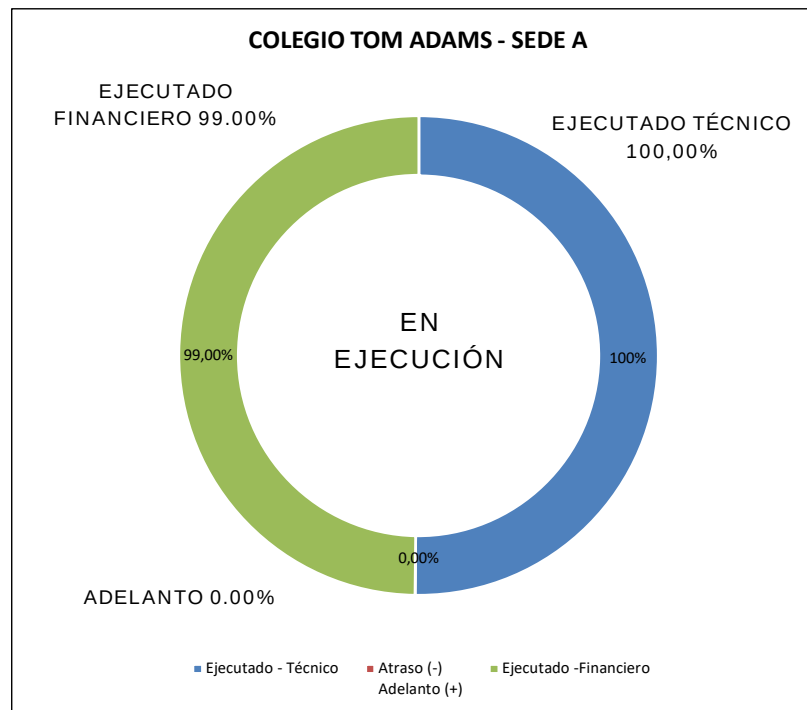


SAN PEDRO CLAVER - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	24,58%	23,32%	-1,26%	22,27%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	32,52%	24,52%	-8,00%	22,27%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	27,82%	25,41%	-2,41%	22,27%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	31,57%	30,92%	-0,65%	30,92%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	85,76%	38,63%	-47,13%	30,92%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	87,42%	41,68%	-45,74%	30,92%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	90,41%	49,06%	-41,35%	49,06%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	90,70%	50,37%	-40,33%	49,06%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	90,70%	50,99%	-39,71%	49,06%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	90,70%	51,17%	-39,53%	49,06%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	98,52%	60,04%	-38,48%	49,06%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	98,75%	66,34%	-32,41%	66,34%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	98,75%	66,34%	-32,41%	66,34%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	89,90%	73,10%	-16,80%	66,34%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	87,98%	71,37%	-16,61%	66,34%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	89,60%	71,37%	-18,23%	66,34%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	90,32%	77,07%	-13,25%	75,83%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	90,35%	80,58%	-9,77%	75,83%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	90,35%	85,01%	-5,34%	75,83%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	94,59%	93,55%	-1,04%	93,55%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	98,38%	95,98%	-2,40%	93,55%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	87,77%	89,90%	2,13%	93,55%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	90,67%	-9,33%	93,55%

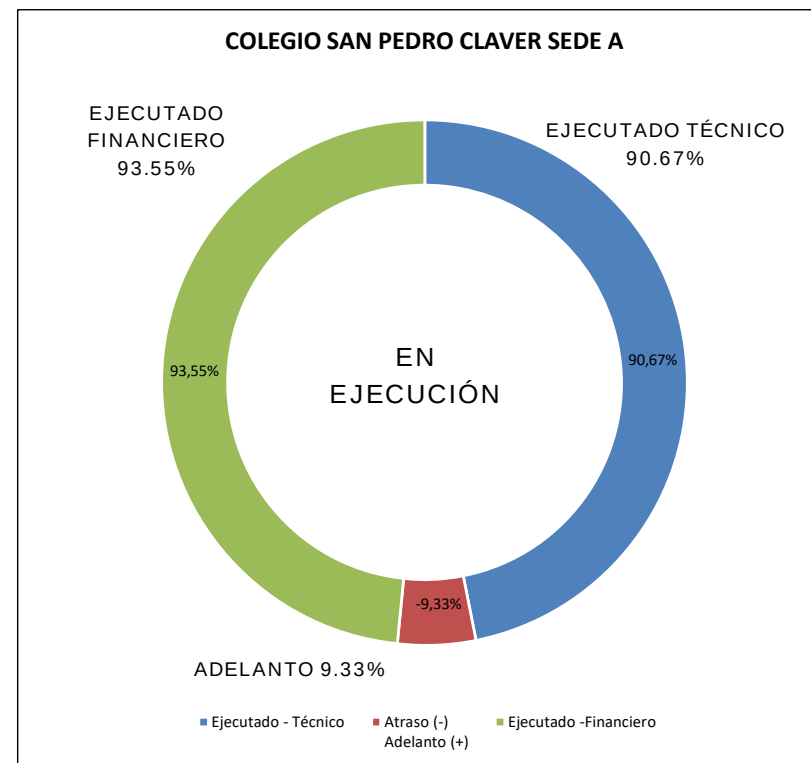


PINAR DEL RIO - SEDE C				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	7,09%	0%	-7,09%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0,00%	9,71%	9,71%	9,71%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	7,09%	11,68%	4,59%	9,71%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	14,15%	33,87%	19,72%	9,71%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	21,92%	33,87%	11,95%	9,71%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	29,34%	67,82%	38,48%	9,71%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	36,76%	81,48%	44,72%	81,48%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	44,17%	81,48%	37,31%	81,48%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	51,59%	81,48%	29,89%	81,48%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	72,10%	98,08%	25,98%	81,48%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	79,60%	98,15%	18,55%	81,48%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	85,53%	100%	14,47%	99,00%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	94,97%	100%	5,03%	99,00%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	99,00%

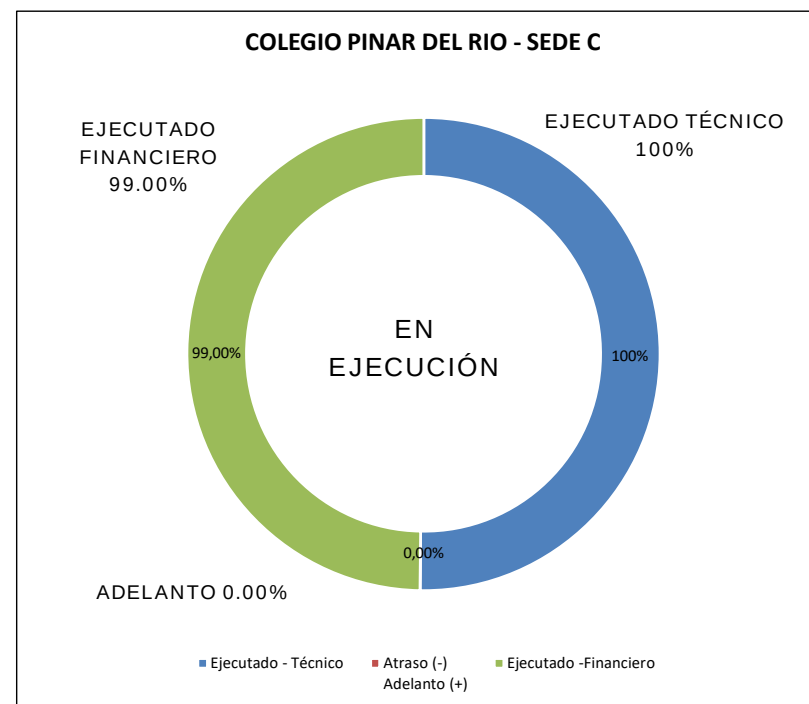


DILE KENNEDY				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	3,52%	0%	-3,12%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	5,92%	0%	-5,92%	0%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	12,58%	0,89%	-11,69%	0%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	20,59%	1,45%	-19,14%	1,45%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	25,25%	1,45%	-23,80%	1,45%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	28,56%	8,98%	-19,58%	1,45%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	37,59%	8,85%	-28,74%	1,45%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	41,97%	14,17%	-27,80%	1,45%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	54,96%	26,65%	-28,31%	26,65%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	68,18%	29,88%	-38,30%	26,65%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	81,62%	31,31%	-50,31%	26,65%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	89,67%	40,27%	-49,40%	40,27%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	99,55%	45,29%	-54,26%	40,27%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	61,89%	-38,11%	40,27%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	65,59%	-34,41%	40,27%

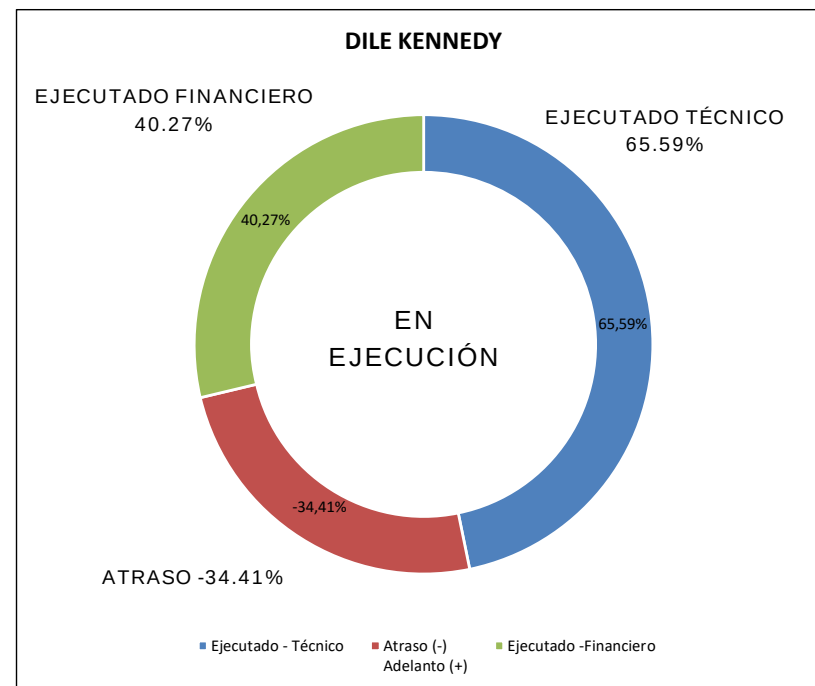


INEM Francisco de Paula Santander Sede B				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	6,12%	0%	-6,12%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	16,74%	0%	-16,74%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	29,89%	0%	-29,89%	0%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	50,97%	0%	-50,97%	0%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	85,06%	0%	-85,06%	0%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	0%	-100%	0%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	0%	-100%	0%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	25,88%	0%	-25,88%	0%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	30,40%	49,36%	18,96%	0%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	39,22%	53,77%	14,55%	53,77%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	45,84%	53,77%	7,93%	53,77%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	71,48%	56,22%	-15,26%	53,77%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	53,77%	-46,23%	53,77%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	53,77%	-46,23%	53,77%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	53,77%	-46,23%	53,77%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	53,77%	-46,23%	53,77%

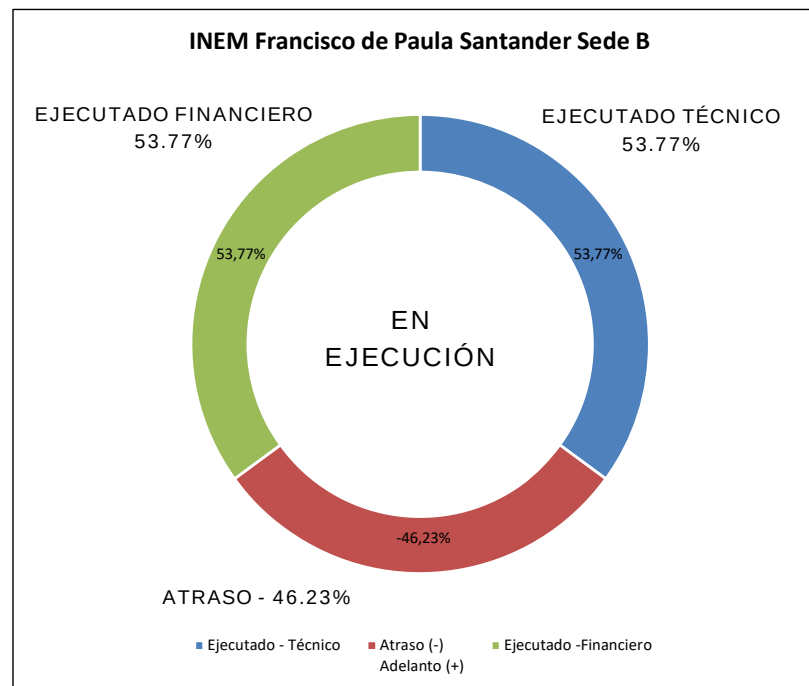

KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	1,52%	7,72%	6,20%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	1,67%	9,24%	7,57%	0%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	2,79%	13,35%	10,56%	0%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	11,66%	19,06%	7,40%	19,06%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	17,55%	19,06%	1,51%	19,06%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	36,81%	22,35%	-14,46%	19,06%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	38,34%	25,08%	-13,26%	19,06%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	45,25%	31,00%	-14,25%	19,06%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	53,77%	39,22%	-14,55%	38,99%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	66,05%	39,33%	-26,72%	38,99%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	88,47%	39,33%	-49,14%	38,99%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	95,97%	40,54%	-55,43%	40,54%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	99,25%	40,64%	-58,61%	40,54%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	99,34%	43,78%	-55,56%	40,54%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	65,95%	-34,05%	40,54%

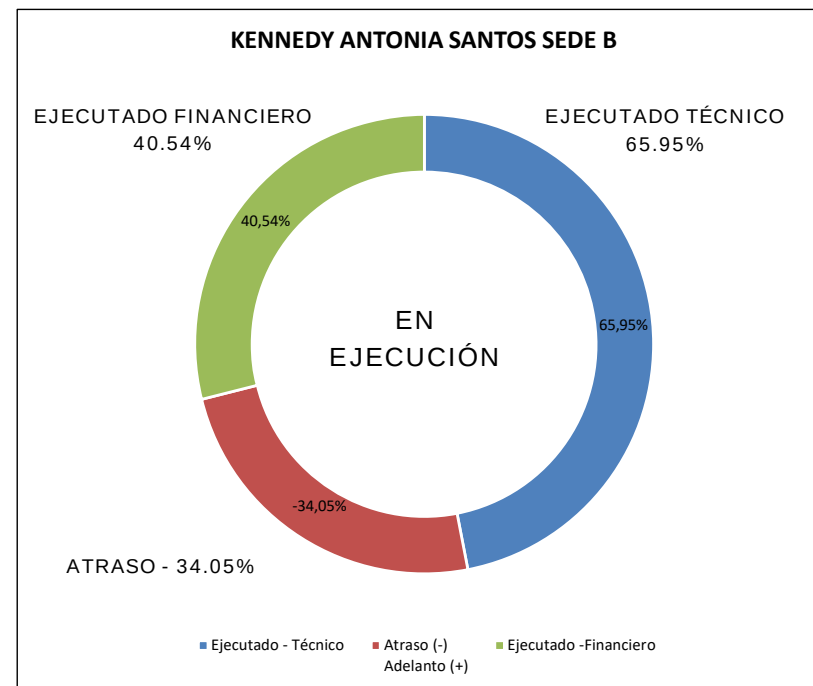


DILE FONTIBON				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
11. DEL 24 AL 29 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	1,30%	0,38%	-0,92%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	2,04%	6,17%	4,13%	0%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	7,16%	6,39%	-0,77%	0%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	8,70%	21,74%	13,04%	21,74%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	11,43%	21,74%	10,31%	21,74%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	15,86%	22,02%	6,16%	21,74%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	32,71%	28,97%	-3,74%	21,74%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	46,08%	31,42%	-14,66%	21,74%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	85,79%	52,89%	-32,90%	52,89%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	99,67%	52,89%	-46,78%	52,89%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	52,89%	-47,11%	52,89%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	84,59%	-15,41%	84,59%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	84,85%	-15,15%	84,59%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	89,30%	-10,70%	84,59%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	92,57%	-7,43%	84,59%

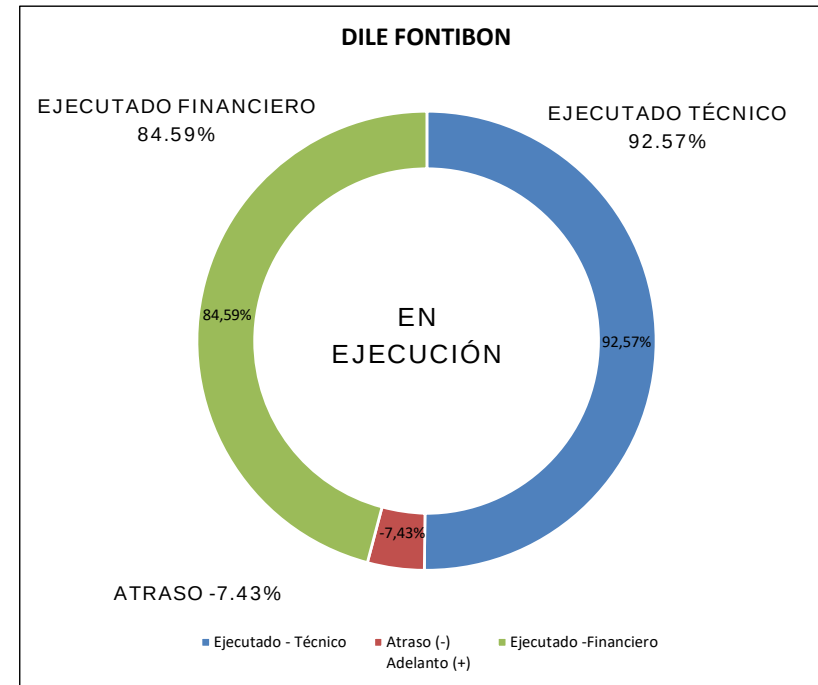

OTIC				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	0%	0%	0%	0%
22. DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE	7,02%	0%	-7,02%	0%
23. DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE	53,39%	78,48%	25,09%	78,48%
24. DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	100%	78,48%	-21,52%	78,48%
25. DEL 29 DE SEP AL 5 DE OCT	100%	78,48%	-21,52%	78,48%
26. DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE	100%	89,59%	-10,41%	78,48%
27. DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	100%	89,59%	-10,41%	78,48%
28. DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	100%	100%	0,00%	100%
29. DEL 27 OCT AL 2 NOV	100%	100%	0,00%	100%
30. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
31. DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
32. DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
33. DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%
34. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	100%	100%	0,00%	100%

RESIDENTE INTERVENTORÍA
JHON EDISON REYES ROJAS

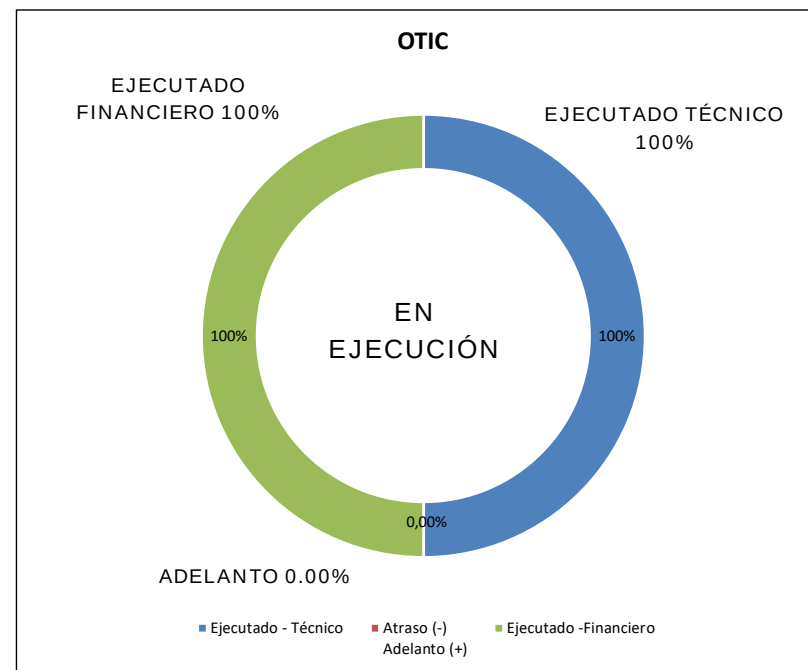

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MARTIN RAFAEL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 34 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	INFORME FOTOGRÁFICO	34
CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA		
INTERVENTORIA		
CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO INEM SEDE A



COLEGIO EL JAPON



DILE FONTIBON



COLEGIO SAN RAFAEL SEDE A



REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 34 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	INFORME FOTOGRÁFICO	34
CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ		
INTERVENTORIA		
CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO		

COLEGIO TOM ADAMS




COLEGIO SAN PEDRO CLAVER



COLEGIO INTEGRADO FONTIBON



COLEGIO PABLO VI

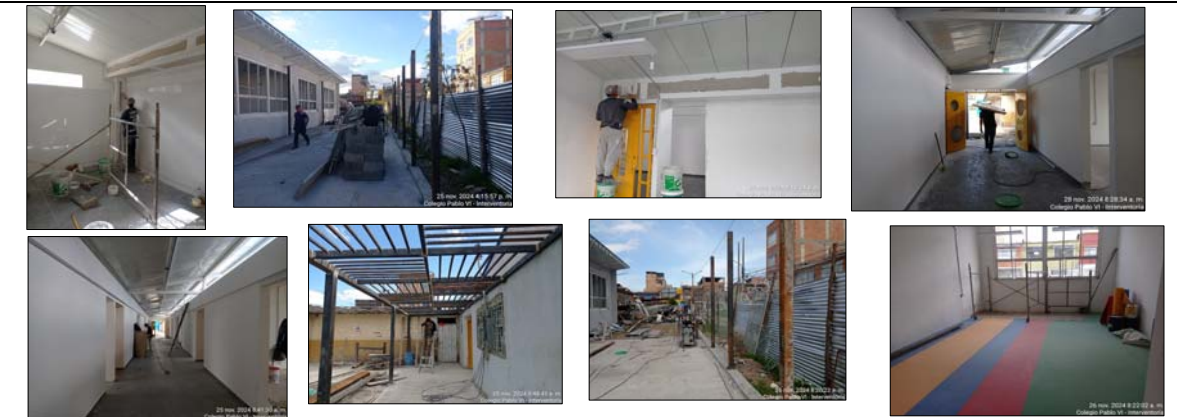


REGISTRO FOTOGRAFICO


SEMANAL No. 34 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	INFORME FOTOGRÁFICO	34
CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ		
INTERVENTORIA		
CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO		

COLEGIO LA AMISTAD

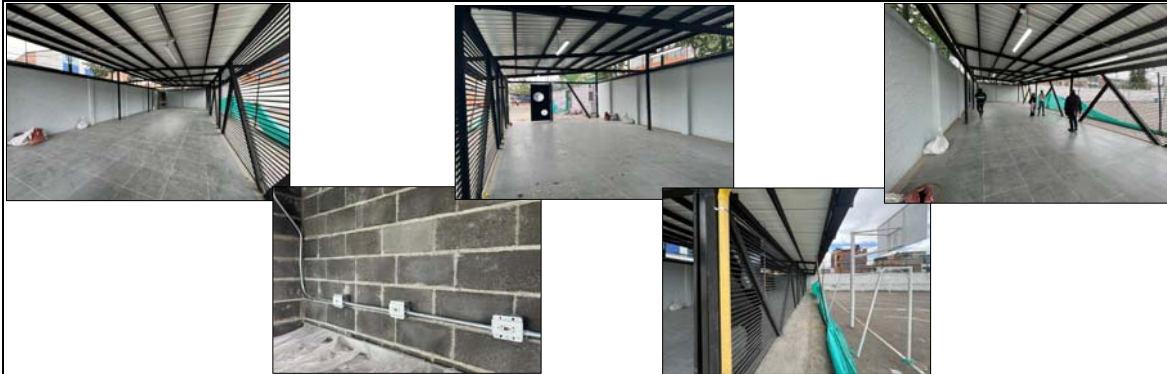

COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE A

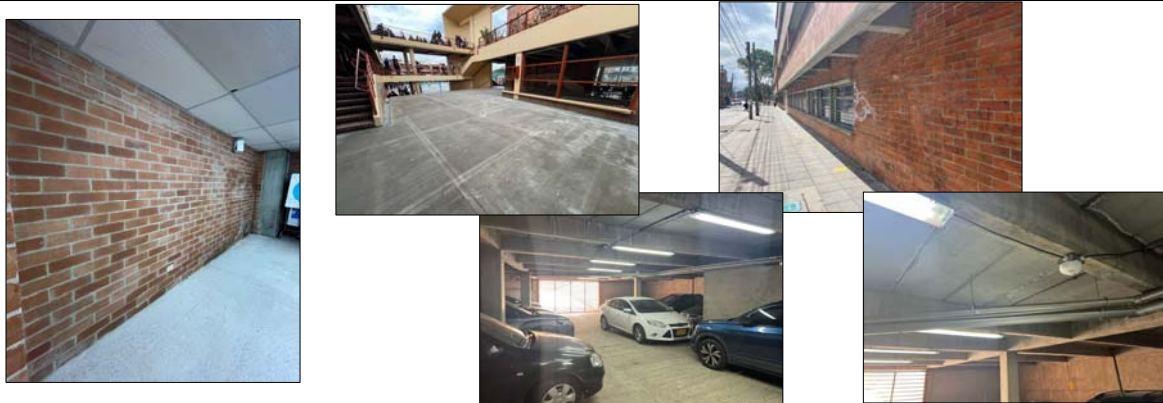

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA



LA AMISTAD - PINAR DEL RIO SEDE C



REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 34 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	INFORME FOTOGRÁFICO	34
CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ		
INTERVENTORIA		
CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO		

OBRA 14 FRENTE INTERVENIDOS

COLEGIO KENNEDY SEDE B ANTONIO SANTOS



EMERGENCIA - COLEGIO GABRIEL BETANCOURT SEDE A



DILE KENNEDY



EMERGENCIA COLEGIO VAN UDEM

