

**CONTRATO No. 483/2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO
PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"**

JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950

PAIPA-BOYACÁ
DICIEMBRE, 2024

Introducción

El presente informe con corte 06 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024, se refiere al proyecto de "Suministro de Material Pétreo y/o Afirmado para el Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación y Conservación de las Vías Urbanas y Rurales del Municipio de Paipa". Este proyecto es fundamental para asegurar la calidad y durabilidad de la infraestructura vial del municipio, facilitando la movilidad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

1. GENERALIDADES

El área del título minero 01035-15, donde se desarrolla el proyecto se encuentra localizado al Sureste del municipio de Paipa, a 9.8 Km del casco urbano, por la vía principal que de Paipa conduce a la vereda El Tunal, departamento de Boyacá.

1.1. Vías de acceso. El municipio de Paipa esta comunicado con el resto del país por la carretera central la cual esta pavimentada y la comunicación entre Paipa y la vereda El Tunal se realiza por una vía carreteable sin pavimentar.



Ubicación del título minero 01035-15.

INFORMACION CONTRACTUAL:

CONTRATO:	N° 483 DEL 06/11/2024
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"
ACTA DE INICIO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAIPA
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
VALOR CONTRATO:	Setenta y Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil trecientos noventa pesos (\$73.995.390,00) m/cte.
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE TERMINACION:	20 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto
PERIODO DE PAGO:	06 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024
VALOR A PAGAR:	Treinta y cuatro millones treinta y seis mil trescientos ochenta pesos (\$34.036.380,00) m/cte.
SALDO SIN EJECUTAR:	Treinta y nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil diez pesos (\$39.959.010,00) M/CTE

INFORMACION FINANCIERA: CANTIDADES CONTRACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	V/TOTAL
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" <respecto al tamaño>	M3	2.961	21.000,00	\$62.181.000
SUBTOTAL					\$62.181.000
IVA 19%					\$11.814.390
VALOR TOTAL					\$73.995.390

CANTIDADES EJECUTADAS:

No.	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	Cant.	Valor
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" <respecto al tamaño>	M3	21.000,00	1.362	\$28.602.000,00
SUBTOTAL					\$28.602.000,00
IVA 19%					\$5.434.380,00
VALOR TOTAL SUMINISTRO					\$34.036.380,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El suministro de recebo o afirmado contemplado en el objeto del presente contrato se ha estado adelantando en las diferentes vías del Municipio de Paipa; donde se adelantan procesos de adecuación, mantenimiento y rehabilitación, según la prioridad de atención.



				MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFRAMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" < respecto al tamaño >
				M3
228 602 000.00	21.000.00	1.383		
228 602 000.00			SUBTOTAL	
22 434 380.00			IVA 19%	
251 036 380.00			VALOR TOTAL SUMINISTRO	












Galaxy A33 5G




Galaxy A33 5G





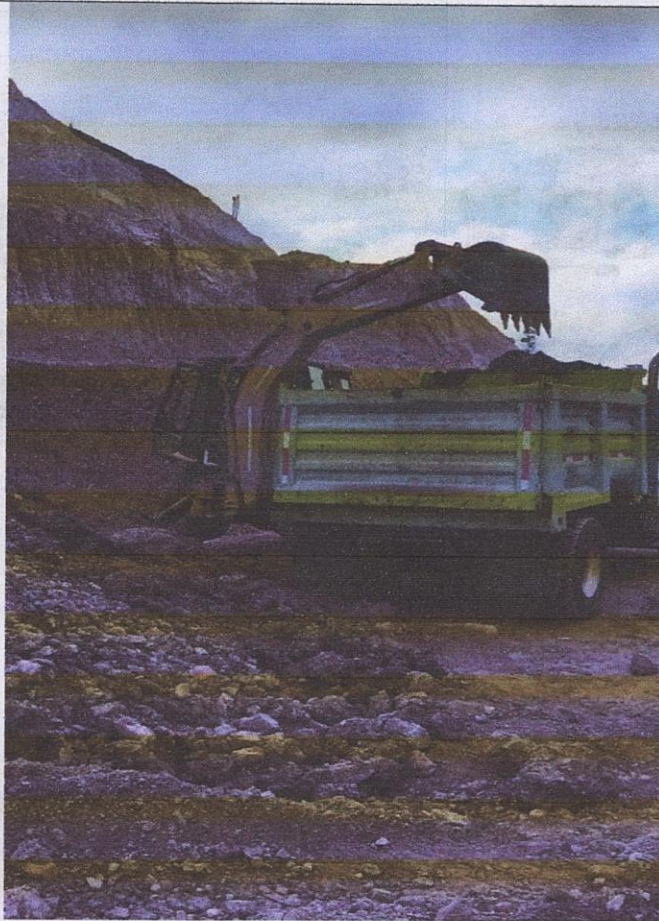

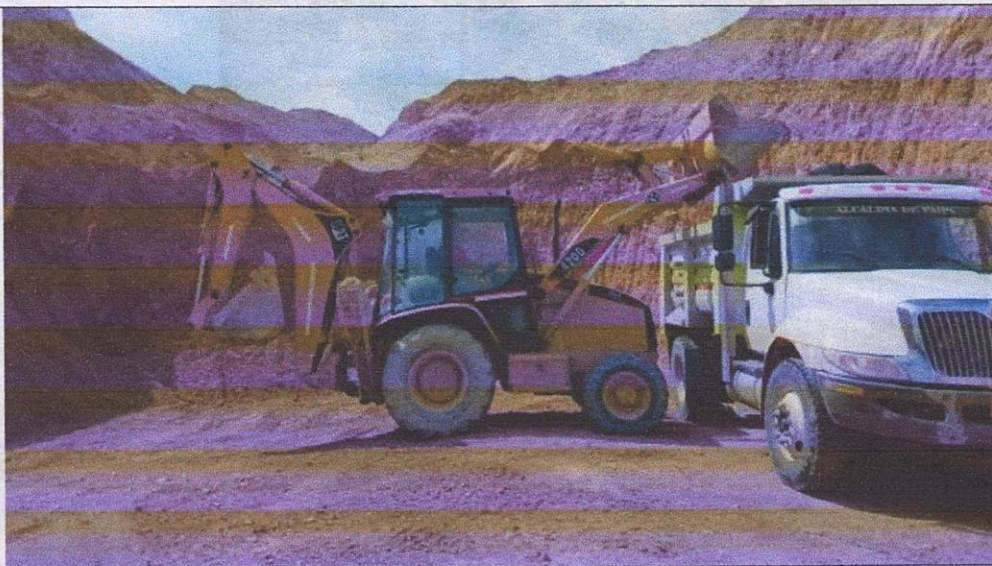



El municipio de Paipa viene ejecutando obras para garantizar el mejoramiento y la recuperación de su malla vial, para garantizar la ejecución de este contrato, la cantera San Antonio mantiene suficiente material de primera calidad según sea el caso disponible para suplir las exigencias que se encuentran en curso con los requisitos y características exigidas por el municipio.

J. Aristelio Garzón R.
JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950 de Paipa

CONTRATO DE SUMINISTRO 483-2024															
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA															
CONTRATISTA: JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ															
CANTERA: SAN ANTONIO VEREDA EL TUNAL PAIPA															
FECHA	VEHÍCULO	CONDUCTOR	CANTIDAD DE VIAJES										CANTIDAD VIAJES	CANTIDAD m³	DESTINO
CARGUE DESDE CANTERA															
6/11/2024	OCD 411		1	1	1	1							4	24	ACOPIO
	OCD 410		1	1	1							3	18	VARGAS 6 VENTANAS	
	OCD412		1	1	1	1						4	24	VIA DE ACCESO TANQUES DEL ITA	
7/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	VARGAS 6 VENTANAS	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	PANTANO VARGAS		
	OCD412		1	1	1						3	18	VIA DE ACCESO TANQUES DEL ITA		
8/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	VARGAS 6 VENTANAS	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1	1					4	24	SALITRE		
12/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	VIA SALITRE TOCA	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	PASTOREROS		
	OCD412		1	1							2	12	PEÑA AMARILLA		
13/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	VIA SALITRE TOCA	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	VIA BARILOCHE		
14/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	VIA BARILOCHE	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	VIA DE ACCESO TANQUES DEL ITA		
	OCD412		1	1	1						3	18	CANOCAS CLUB MILITAR		
15/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	CHITAL	
	OCD 410		1	1	1						3	18	LOS MEDIOS		
	OCD412		1	1	1						3	18	VIA CENTRAL Q. HONDA		
18/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	PASTOREROS	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	PUENTE TABLA		
	OCD412		1	1	1						3	18	QUEBRADA HONDA		
19/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	PUENTE TABLA	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	PASTOREROS		
20/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	CENTRO MINERO	
	OCD 410		1	1							2	12	SAN PEDRO		
	OCD412		1	1	1						3	18	RIO ARRIBA		
21/11/2024	OCD 411		1	1								2	12	ARMANDO SOLANO	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	CURIAL		
	OCD412		1	1	1						3	18	LA PLAYA		
22/11/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	JAZMINAL	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	LA PLAYA		
25/11/2024	OCD 411		1	1								2	12	BONZA	
	OCD 410		1	1							2	12	ACOPIO		
	OCD412		1	1							2	12	SAN PEDRO		
26/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	ACOPIO	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1	1					4	24	LA PLAYA-MURCIA		
27/11/2024	OCD 411		1	1								2	12	PALERMO	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1	1					4	24	QUEBRADA HONDA		
28/11/2024	OCD 411		1	1								2	12	SALITRE	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	BONZA		
29/11/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	RETIRO	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1							2	12	CURIAL		
2/12/2024	OCD 411		1	1	1	1						4	24	DARCENA PASO POLICIA	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	VIA DE ACCESO POZO ITA		
	OCD412		1	1	1						3	18	CORINTO		
3/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	VIA DE ACCESO POZO ITA	
	OCD 410		1	1							2	12	SAN PEDRO		
	OCD412		1	1	1						3	18	VIA DE ACCESO POZO ITA		
4/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	JAZMINAL	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	PASTOREROS		
5/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	RIO ARRIBA ANTENAS	
	OCD 410		1	1	1						3	18	ACOPIO		
	OCD412		1	1	1						3	18	RIO ARRIBA ANTENAS		
6/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	RIO ARRIBA	
	OCD 410		1								1	6	PALERMO		
	OCD412		1	1	1						3	18	CANOCAS RIO ARRIBA		
9/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	LOS MEDIOS	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	LOS MEDIOS		
	OCD412		1	1	1						3	18	LOS MEDIOS		
10/12/2024	OCD 411		1	1	1							3	18	RIO ARRIBA	
	OCD 410		1	1	1	1					4	24	CORINTO		
	OCD412		1	1	1						3	18	RIO ARRIBA		
TOTAL ACTA FINAL													227	1362	

CANTIDAD M3	1362
VALOR UNITARIO	\$ 21,000.00
SUBTOTAL	\$ 28,602,000.00
IVA 19%	\$ 5,434,380.00
VALOR TOTAL	\$ 34,036,380.00

J. Aristelio Garzon R.

CONTRATISTA: JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ

CONTRATISTA

Jorge Edwin Lopez Torres

JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SUPERVISOR

<div>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACIA MUNICIPIO DE PAIPA</div>						CONTRATO DE SUMINISTRO 483-2024 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA							FECHA DE INICIACIÓN REAL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			HOJA 1 DE 1	
CONTRATISTA: INTERVENTOR SUPERVISOR:						JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ JORGE EDWIN LOPEZ TORRES							FECHA TERMINACIÓN CON PRORROGA: 20 DE DICIEMBRE DE 2024			ACTA FINAL	
V. INICIAL						\$ 73,995,390.00							FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:				
V. ADICIONAL													46.00%				
VALOR TOTAL						\$ 73,995,390.00							82.22%			20 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONDICIONES ORIGINALES													SUMINISTRÓ EJECUTADO			ACUMULADO	
No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	V/TOTAL	+/-	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor			
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" <respecto al tamaño>	M3	2,961.00	21,000.00	62,181,000.00		1362			28,602,000.00			1,362	28,602,000.00			
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					62,181,000.00					28,602,000.00				28,602,000.00			
IVA 19%					11,814,390.00					5,434,380.00				5,434,380.00			
VALOR TOTAL SUMINISTRO					73,995,390.00					34,036,380.00				34,036,380.00			
VALOR TOTAL CONTRATADO						73,995,390.00											
VALOR ADICIONAL						0.00											
VALOR TOTAL EJECUTADO						34,036,380.00											
VALOR TOTAL ANTICIPO						0.00											
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES						0.00											
SALDO SIN EJECUTAR																	
VALOR TOTAL POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA						39,959,010.00											
SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$34,036,380.00) M/CTE.						34,036,380.00											
<div>Jorge Edwin Lopez Torres</div>						<div>J. Aristelio Garzon R.</div>											
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SUPERVISOR						JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ CONTRATISTA											



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ECU-ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

202400034

PROVEEDOR: JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ

NIT O CC: 74323950-8

DIRECCIÓN: VEREDA EL TUNAL

CORREO:

TELÉFONO: 3138028738

DESCRIPCIÓN: SA SI MP 003 2024, CONTRATO 483 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, REGISTRADO MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JA 7 DE FECHA 13/12/2024

COMPROBANTE DE ENTRADA 202400034

FECHA: 13/12/2024

TIPO CONTRATO: SUMINISTRO

NO CONTRATO: 483.2024

NO FACTURA: JA 7

Item	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Valor Total
1	104010248	MATERIAL PETREO -Y/O AFIRMADO A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA	UNIDAD	1,362.00	\$21,000.00	19.00	\$34,036,380.00

SUBTOTAL \$28,602,000.00

IMPUESTOS \$5,434,380.00

TOTAL \$34,036,380.00

RESUMEN

10401 MATERIA PRIMA O ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION.	\$28,602,000.00
--	-----------------

SUBTOTAL \$28,602,000.00

IMPUESTOS \$5,434,380.00

TOTAL \$34,036,380.00

SON TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.C.

LEADY JOHANA FONSECA MELO
ALMACENISTA

VLADIMIR CASTIBLANCO

Elaboró
