

CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT. 900854470-8

ESTUDIOS DE SUELOS-CONSULTORIA

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



Pasto, 30 de diciembre del 2024

INT-3193-022-2024

SEÑORES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NARIÑO

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO No 3153 DEL 2024 PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED Terciaria a cargo de INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ASUNTO: Solicitud prorroga contrato de obra 3153 del 2024

Cordial Saludo

Por medio de la presente, respetuosamente nos permitimos solicitar se conceda una prórroga de tres meses al contrato de obra No 3153-2024, cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED Terciaria a cargo de INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Lo anterior en virtud de que se los puntos a intervenir con el contrato de obra pública a los sitios críticos han tenido que ser visitados por parte de INVIAS, y dar prioridad a los municipios según la urgencia por lo que el plazo contractual es reducido ante la situación de atender varios sitios

Adjunto oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista de obra, en donde se describe las siguientes justificaciones:

- *La jornada invernal imperante en las diferentes zonas de ejecución de las obras, no han permitido el avance normal de ellas, ocasionando suspensiones reiterativas de las jornadas labores, como también la afectación en el rendimiento de la ejecución de actividades como son las excavaciones, desalojos, rellenos y fundición de concretos, etc.*
- *El inicio de temporada navideña ha impactado negativamente en la disponibilidad de personal de mano de obra no calificada, por cuanto se han retirado de los frentes por este motivo.*

CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT. 900854470-8


ESTUDIOS DE SUELOS-CONSULTORIA

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



- Por el mismo motivo citado en el punto anterior, los proveedores de suministros como son tuberías, concretos, agregados, etc, han suspendido sus servicios por efectos de cierre de sus establecimientos, debido a los inventarios que adelantan y al periodo de vacaciones de sus empleados.*

Atentamente



INTERVENTOR DE OBRA

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO - INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS- UNIVERSIDAD DE NARIÑO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA- UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Mat. N°. 52202099485 NRÑ

C.C. N°. 98.396.846 de Pasto

Pasto, 13 de diciembre de 2024

SH-DI-108

Ingeniero
EMERSON LEANDRO TULCAN
Interventor de Obra
Correo: interventoriamontoagotable@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato No. 3153-2024

Objeto: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Solicitud de Prórroga

Ingeniero Tulcán:

De manera cordial le solicitamos se apruebe prórroga al plazo del contrato citado en la referencia, por el término de tres (3) meses, a partir de su fecha final, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

- ✓ La jornada invernal imperante en las diferentes zonas de ejecución de las obras, no han permitido el avance normal de ellas, ocasionando suspensiones reiterativas de las jornadas labores, como también la afectación en el rendimiento de la ejecución de actividades como son las excavaciones, desalojos, rellenos y fundición de concretos, etc.
- ✓ El inicio de temporada navideña ha impactado negativamente en la disponibilidad de personal de mano de obra no calificada, por cuanto se han retirado de los frentes por este motivo.
- ✓ Por el mismo motivo citado en el punto anterior, los proveedores de suministros como son tuberías, concretos, agregados, etc, han suspendido sus servicios por efectos de cierre de sus establecimientos, debido a los inventarios que adelantan y al periodo de vacaciones de sus empleados.



Agradecemos su atención.

Atentamente,

Efrain Santander España
Representante Legal
CONSTRUCTORA SH SAS

CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT. 900854470-8

ESTUDIOS DE SUELOS-CONSULTORIA

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



Pasto, 30 de diciembre del 2024

INT-3193-023-2024

SEÑORES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NARIÑO

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO No 3153 DEL 2024 PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ASUNTO: Verificación de garantías y seguros

Cordial Saludo

Por medio de la presente, respetuosamente nos permitimos informar que el contrato de obra No 3153-2024, cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO se encuentra con la pólizas actualizadas según la fecha de terminación inicial que corresponde al 31 de dic del 2024.

Atentamente



INTERVENTOR DE OBRA

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO - INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS- UNIVERSIDAD DE NARIÑO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA- UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Mat. N°. 52202099485 NRÑ

C.C. N°. 98.396.846 de Pasto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/12/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No.

3153 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA SH SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3193 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

3 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

1/10/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	18/11/2024	Balance de cantidades de obra
2	5/12/2024	Balance de cantidades de obra

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/12/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 853,748,014.00

50% EN SMMLV: \$ 328.36
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 853,748,014.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. SH-DI-108 de fecha 13 de diciembre de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: se apruebe la prórroga al plazo del contrato de obra por el termino (3) tres meses, a partir de la fecha final.
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total					

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Diciembre de 2024 la obra presenta un avance físico ejecutado del 46.51%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 34.93%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 394,232.17 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 397,113,100.00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 397,113,100.00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: NA Valor amortizado: NA Saldo por amortizar: NA
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Diciembre de 2024 \$ 397,113,100.00 Último mes facturado: dic-24
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 456,634,914.00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:
La prórroga en tiempo se debe a que es necesario dar mayor alcance al objeto del contrato, atendiendo los sitios críticos a lo largo de la red terciaria a cargo del INVIAS sobre el departamento de Nariño

JURÍDICA:
los proyectos podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren sustancialmente sus actividades y su alcance

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)
Esta prórroga se hace necesario, con el fin de no incumplir con las metas planteadas originalmente en el proyecto.
La prórroga no genera sobrecostos al proyecto

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)
NA

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)
NA

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)
NA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)
NA

Notas:
1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Representante Legal CONSTRUCTORA SA SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: 52202-40790 NRÑ

Firma
Nombre: EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-099485 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: Maria del Pilar Ceron Benavides
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: Maria del Pilar Ceron Benavides
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ

Vo.Bo.Firma NA
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora Pedro Jesus Tulcan

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Maria del Pilar Ceron Benavides
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

26/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NARIÑO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ NA _____ DE _____ NA _____

(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

NA _____

SEGUIMIENTO No. 3

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3153 DE 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31/03/2025

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/10/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3193 DE 2024

INTERVENTOR: EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 853,748,014.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 853,748,014.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos		(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%
DEMOLICIÓN DE ROCAS	\$10,393	\$10,393	1.27%	53.77%	% P 0.85%		0.85%			0.37%	0.37%					100.00%
	\$12,991	\$12,991	1.58%	\$6,986	\$ P \$6,986		\$6,986			\$3,003	\$3,003					
					% E 0.85%											
REMOCIÓN DE DERRUMBES	\$331,632	\$331,632	40.42%	0.00%	% P					5.62%	5.62%					95.00%
	\$92,250	\$92,250	11.24%	\$0	\$ P					\$46,125	\$46,125					
					% E											
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$18,227	\$18,227	2.22%	58.26%	% P 2.25%		2.25%	0.15%	0.57%	0.57%	0.57%					90.00%
	\$33,851	\$33,851	4.13%	\$19,721	\$ P \$18,503		\$18,503	\$1,219	\$ 4,709.85	\$ 4,709.85	\$ 4,709.85					
					% E 2.25%			0.15%								
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	\$6,499	\$6,499	0.79%	0.00%	% P						0.04%					85%
	\$342	\$342	0.04%	\$0	\$ P						\$342.030					
					% E											
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO	\$9,864	\$9,864	1.20%	33.72%	% P 0.20%		0.20%	2.49%	1.76%	1.76%	1.76%					80%
	\$65,350	\$65,350	7.96%	\$22,036	\$ P \$1,640		\$1,640	\$20,386	\$ 14,437.73	\$ 14,437.73	\$ 14,437.73					3%
					% E 2.49%											
CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F' C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$212,552	\$212,552	25.90%	58.24%	% P 16.64%		16.64%	2.59%	4.60%	4.60%	4.60%					75%
	\$271,004	\$271,004	33.03%	\$157,820	\$ P \$136,575		\$136,575	\$21,245	\$ 37,727.98	\$ 37,727.98	\$ 37,727.98					
					% E 0.47%			2.59%								
CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F' C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$6,862	\$6,862	0.84%	56.58%	% P 0.49%		0.49%			0.36%						70%
	\$6,862	\$6,862	0.84%	\$3,883	\$ P \$3,883		\$3,883			\$2,479						
					% E 0.47%											
CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F' C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$20,878	\$20,878	2.54%	0.00%	% P						0.51%					65%
	\$4,176	\$4,176	0.51%	\$0	\$ P						\$4,176					
					% E											
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	\$131,152	\$131,152	15.98%	66.76%	% P 14.51%		14.51%	1.63%	4.02%	4.02%	4.02%					60%
	\$198,367	\$198,367	24.17%	\$132,428	\$ P \$119,035		\$119,035	\$13,394	\$ 32,969.56	\$ 32,969.56	\$ 32,969.56					
					% E 14.51%			1.63%								
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	\$4,575	\$4,575	0.56%	0.00%	% P											55%
	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$ P											
					% E											
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	\$34,736	\$34,736	4.23%	#iDNI/01	% P											50%
	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$ P											
					% E											
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	\$33,184	\$33,184	4.04%	0.00%	% P						1.09%					45%
	\$8,948	\$8,948	1.09%	\$0	\$ P						\$8,948					
					% E											
Demolición de Estructuras de concreto, con medios manuales	\$4,022	\$4,022	0.49%	\$4,022	% P 0.49%			0.49%								40%
					\$ P \$4,022			\$4,022								
					% E 0.49%											
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	\$32,367	\$32,367	3.94%	\$14,161	% P 1.73%			1.73%	1.11%	1.11%	1.11%					35%
					\$ P \$14,161			\$14,161	\$ 9,103.35	\$ 9,103.35	\$ 9,103.35					
					% E 1.73%											
Geodren	\$24,426	\$24,426	2.98%	\$0	% P				0.99%	0.99%	0.99%					30%
					\$ P \$8,142				\$8,142	\$8,142	\$8,142					
					% E											
Transporte de materiales (tubería y concreto)			0.00%	20.12%	% P 0.30%			0.30%	0.40%	0.40%	0.40%					25%
	\$12,221	\$12,221	1.49%	\$2,459	\$ P \$2,459			\$2,459	\$ 3,254.02	\$3,254	\$3,254					
					% E 0.30%											
subbase Granular Clase A incluye transporte			0.00%	42.90%	% P 0.82%			0.82%			1.09%					20%
	\$15,594	\$15,594	1.90%	\$6,690	\$ P \$6,690			\$6,690			\$ 8,903.99					
					% E 0.82%											
Pavimento en concreto Hidraulico (Analizado para tránsito NT3)	\$14,683	\$14,683	1.79%	\$14,683	% P 1.79%			1.79%								15%
					\$ P \$14,683			\$14,683								
					% E 1.79%											
CINTA DE PVC 15 CM			0.00%	0.00%	% P				0.09%							10%
	\$774	\$774	0.09%	\$0	\$ P				\$774							
					% E											
Acelerante para concreto			0.00%	41.85%	% P			1.14%	0.53%	0.53%	0.53%					5.00%
	\$22,327	\$22,327	2.72%	\$9,344	\$ P \$9,344			\$9,344	\$ 4,327.76	\$ 4,327.76	\$ 4,327.76					
					% E 1.14%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 820,554,350															0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/12/2024

(Día / Mes / Año)

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

PROGRAMADO

\$ Valor

EJECUTADO

\$ Valor

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	34.93%	13.11%	8.94%	20.33%	22.69%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$107,611	\$73,374	\$166,779	\$185,827					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	34.93%	48.04%	56.99%	77.31%	100.00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$394,232	\$467,606	\$634,385	\$820,212					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	34.93%	13.11%								
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$107,611								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	34.93%	48.04%								
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$394,232								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGO) PROVISIÓN PARA		\$ -	%
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
\$ -	\$ -	%	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	\$ -	\$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ 394,232.17	48%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 820,554.35		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA

Representante Legal CONSTRUCTORA SA SAS

Contratista

Matrícula Profesional No.: 52202-40790 NRN

Aprueba Firma:

Nombre: EMERSON LEONARDO VULCAN ALVARADO

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-099485 NRN

PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATO DE OBRA CIVIL No.: 3153 de 2024
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH S.A.S

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Fecha Inicio: Lunes 4 de noviembre 2024 Fecha finalizacion: martes 31 marzo del 2025

Item	Nombre de tarea	Und	Cantidad	VR UNIT	VR, PARCIAL	Duración días	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
							1/10/2024	1/11/2024	1/12/2024	1/01/2025	1/02/2025	1/03/2025
201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	75.0	\$ 173,220.00	\$ 12,991,500.00	11		\$ 6,985,963.00			\$ 3,002,768.00	\$ 3,002,769.00
211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	4740.0	\$ 19,462.00	\$ 92,249,880.00	0					\$ 46,124,940.00	\$ 46,124,940.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1300.0	\$ 26,039.00	\$ 33,850,700.00	11		\$ 18,502,532.00	\$ 1,218,625.00	\$ 4,709,847.67	\$ 4,709,847.67	\$ 4,709,847.67
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	10.0	\$ 34,203.00	\$ 342,030.00	0						\$ 342,030.00
610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	530.0	\$ 123,301.00	\$ 65,349,530.00	3		\$ 1,639,903.00	\$ 20,396,451.00	\$ 14,437,725.67	\$ 14,437,725.67	\$ 14,437,724.67
630.4	CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F' C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	255.0	\$ 1,062,760.00	\$ 271,003,800.00	24		\$ 136,575,288.00	\$ 21,244,572.00	\$ 37,727,980.33	\$ 37,727,980.33	\$ 37,727,979.33
630.6	CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F' C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	12.0	\$ 571,834.00	\$ 6,862,008.00	1		\$ 3,882,753.00			\$ 2,979,255.00	
630.7	CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F' C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	10.0	\$ 417,560.00	\$ 4,175,600.00	0						\$ 4,175,600.00
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	24200.0	\$ 8,197.00	\$ 198,367,400.00	15		\$ 119,034,703.00	\$ 13,393,570.00		\$ 32,969,563.50	\$ 32,969,563.50
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.0	\$ 11,977.00	\$ -	0						
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.0	\$ 289,465.00	\$ -	0						
900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	5973.0	\$ 1,498.00	\$ 8,947,533.00	0						\$ 8,947,533.00
NP1	Demolición de Estructuras de concreto, con medios manuales	m3	14.0	\$ 287,047.00	\$ 4,021,528.00	2			\$ 4,021,528.00			
NP2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	32.0	\$ 1,011,483.00	\$ 32,367,456.00	0			\$ 14,160,762.00		\$ 9,103,347.00	\$ 9,103,347.00
NP3	Geodren	m	96.4	\$ 253,386.00	\$ 24,426,410.00	0				\$ 8,142,136.67	\$ 8,142,136.67	\$ 8,142,136.67
NP4	Transporte de materiales	m3-km	2783.2	\$ 4,391.00	\$ 12,221,031.00	0			\$ 2,458,960.00	\$ 3,254,024.00	\$ 3,254,024.00	\$ 3,254,023.00
NP5	subbase Granular Clase A incluye transporte	m3	40.0	\$ 389,842.00	\$ 15,593,680.00	0			\$ 6,689,689.00			\$ 8,903,991.00
NP6	Pavimento en concreto Hidraulico (Analizado para transito NT3)	m3	13.0	\$ 1,129,457.00	\$ 14,682,941.00	0			\$ 14,682,941.00			
NP7	CINTA DE PVC 15 CM	m	12.0	\$ 64,510.00	\$ 774,120.00	0				\$ 774,120.00		
NP8	Acelerante para concreto	kg/m3	200.0	\$ 111,636.00	\$ 22,327,200.00	0			\$ 9,343,933.00	\$ 4,327,756.00	\$ 4,327,756.00	\$ 4,327,755.00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO	GLB	1.0	\$ 27,000,000.00	\$ 27,000,000.00	47						\$ 27,000,000.00
	IVA	GLB	1.0	\$ 6,193,666.39	\$ 6,193,666.00	47		\$ 2,094,539.11	\$ 786,388.31	\$ 536,191.62	\$ 1,218,772.12	\$ 1,557,775.24
	COSTO TOTAL				\$ 853,748,013.00							
				\$ 853,748,013.00								
					SUMA DE INVERSION MENSUAL \$ (PROGRAMADA)		-	288,715,681	\$ 108,397,419	\$ 73,909,782	\$ 167,998,116	\$ 214,727,015
					SUMA TOTAL DE INVERSION ACOMULADA \$ (PROGRAMADA)		\$ 0	\$ 288,715,681	\$ 397,113,100	\$ 471,022,882	\$ 639,020,998	\$ 853,748,013


Efraín Santander España
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
										VERSIÓN	1
										PÁGINA	
										FECHA	26/12/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ DE _____ (Indicar mes y año)	
										SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATO No.: 3153 DE 2024										PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO										PLAZO ACUMULADO: 31/03/2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/10/2024 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3193 DE 2024										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
INTERVENIOR: EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO										FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 853,748,014.00	
										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____	
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 853,748,014.00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos		(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	
DEMOLICIÓN DE ROCAS	\$10,393	\$10,393	1.27%	53.77%	% P		0.85%			0.37%	0.37%					100.00%
	\$12,991	\$12,991	1.58%	\$6,986	\$ P		\$6,986			\$3,003	\$3,003					
					\$ E		\$6,986									
					% E		0.85%									
REMOCIÓN DE DERRUMBES	\$331,632	\$331,632	40.42%	0.00%	% P					5.62%	5.62%					95.00%
	\$92,250	\$92,250	11.24%	\$0	\$ P					\$46,125	\$46,125					
					\$ E											
					% E											
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	\$18,227	\$18,227	2.22%	58.26%	% P		2.25%	0.15%	0.57%	0.57%	0.97%					90.00%
	\$33,851	\$33,851	4.13%	\$19,721	\$ P		\$18,503	\$1,219	\$ 4,709.85	\$ 4,709.85	\$ 4,709.85					
					\$ E		\$18,503	\$1,219								
					% E		2.25%	0.15%								
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	\$6,499	\$6,499	0.79%	0.00%	% P						0.04%					85%
	\$342	\$342	0.04%	\$0	\$ P						\$342,030					
					\$ E											
					% E											
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO	\$9,864	\$9,864	1.20%	33.72%	% P		0.20%	2.49%	1.76%	1.76%	1.76%					80%
	\$65,350	\$65,350	7.96%	\$22,036	\$ P		\$1,640	\$20,396	\$ 14,437.73	\$ 14,437.73	\$ 14,437.73					1%
					\$ E		\$1,640	\$20,396								
					% E		0.20%	2.49%								
CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F' C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$212,552	\$212,552	25.90%	58.24%	% P		16.64%	2.59%	4.60%	4.60%	4.60%					75%
	\$271,004	\$271,004	33.03%	\$157,820	\$ P		\$136,575	\$21,245	\$ 37,727.98	\$ 37,727.98	\$ 37,727.98					
					\$ E		\$136,575	\$21,245								
					% E		16.64%	2.59%								
CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F' C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$6,862	\$6,862	0.84%	56.58%	% P		0.47%			0.36%						70%
	\$6,862	\$6,862	0.84%	\$3,883	\$ P		\$3,883			\$2,979						
					\$ E		\$3,883									
					% E		0.47%									
CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F' C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	\$20,878	\$20,878	2.54%	0.00%	% P						0.51%					65%
	\$4,176	\$4,176	0.51%	\$0	\$ P						\$4,176					
					\$ E											
					% E											
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	\$131,152	\$131,152	15.98%	66.76%	% P		14.51%	1.63%	4.02%	4.02%	4.02%					60%
	\$198,367	\$198,367	24.17%	\$132,428	\$ P		\$119,035	\$13,394	\$ 32,969.56	\$ 32,969.56						
					\$ E		\$119,035	\$13,394								
					% E		14.51%	1.63%								
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	\$4,575	\$4,575	0.56%	0.00%	% P											55%
	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$ P											
					\$ E											
					% E											
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	\$34,736	\$34,736	4.23%	#iDNI/01	% P											50%
	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$ P											
					\$ E											
					% E											
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	\$33,184	\$33,184	4.04%	0.00%	% P						1.09%					45%
	\$8,948	\$8,948	1.09%	\$0	\$ P						\$8,948					
					\$ E											
					% E											
Demolición de Estructuras de concreto, con medios manuales	\$4,022	\$4,022	0.49%	100.00%	% P			0.49%								40%
					\$ P			\$4,022								
					\$ E			\$4,022								
					% E			0.49%								
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	\$32,367	\$32,367	3.94%	43.75%	% P			1.73%	1.11%	1.11%						35%
					\$ P			\$14,161	\$ 9,103.35	\$9,103						
					\$ E			\$14,161								
					% E			1.73%								
Geodren	\$24,426	\$24,426	2.98%	\$0	% P				0.99%	0.99%	0.99%					30%
					\$ P				\$8,142	\$8,142						
					\$ E											
					% E											
Transporte de materiales (tubería y concreto)			0.00%	20.12%	% P			0.30%	0.40%	0.40%	0.40%					25%
	\$12,221	\$12,221	1.49%	\$2,459	\$ P			\$2,459	\$ 3,254.02	\$3,254	\$3,254					
					\$ E			\$2,459								
					% E			0.30%								
subbase Granular Clase A incluye transporte	\$15,594	\$15,594	1.90%	\$6,690	% P			0.82%			1.09%					20%
					\$ P			\$6,690			\$ 8,903.99					
					\$ E			\$6,690								
					% E			0.82%								
Pavimento en concreto Hidraulico (Analizado para tránsito NT3)	\$14,683	\$14,683	1.79%	100.00%	% P			1.79%								15%
					\$ P			\$14,683								
					\$ E			\$14,683								
					% E			1.79%								
CINTA DE PVC 15 CM	\$774	\$774	0.09%	\$0	% P				0.09%							10%
					\$ P				\$774							
					\$ E											
					% E											
Acelerante para concreto	\$22,327	\$22,327	2.72%	\$9,344	% P			1.14%	0.53%	0.53%	0.53%					5.00%
					\$ P			\$9,344	\$ 4,327.76	\$ 4,327.76	\$ 4,327.76					
					\$ E			\$9,344								
					% E			1.14%								0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 820,554,350															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
30/12/2024
(Día / Mes / Año)

TIPO DE DISEÑO
BARRAS
CURVAS

PROGRAMADO
\$ Valor
\$ Valor

EJECUTADO
\$ Valor
\$ Valor

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	34.93%	13.11%	8.94%	20.33%	22.69%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$107,611	\$73,374	\$166,779	\$185,827					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	34.93%	48.04%	56.99%	77.31%	100.00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$394,232	\$467,606	\$634,385	\$820,212					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	34.93%	13.11%								
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$107,611								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	34.93%	48.04%								
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$286,621	\$394,232								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO			
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGO) PROVISIÓN PARA			\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
	\$ -		\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -		\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	\$ -		\$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)			\$ 394,232.17	48%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 820,554.35			

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:


Aprueba Firma:
Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Representante Legal CONSTRUCTORA SA SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: 52202-40790 NRN


Aprueba Firma:
Nombre: EMERSON LEIZAOLA ALVARADO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-099485 NRN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA										

FECHA																												30/12/2024 (Día / Mes / Año)			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIA NARIÑO														DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No: 3153 DE 2024														CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24														PROYECTO: NARIÑO ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3193 DE 2024														INTERVENTOR: EMERSON LEANDRO TULCAN													

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		22	24	24	24	22	24		24	24	24	24	24	24		24	22	22	24	24	24		24	23	23	23	23					540
Lluvias moderadas		2				2											2	2						1	1	1	1					12
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	552	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Dada la naturaleza del contrato y que por tanto, las obras se encontraran dispersas en el departamento, se diligenciará el formato por cada municipio intervenido. - Frente Ospina	
---	--

<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA</div> <div>Director de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.: 52202-40790 NRÑ</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: Jaqueline Hernandez Meza</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 19202-220386 CAU</div>
---	---


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/12/2024
(Día / Mes / Año)

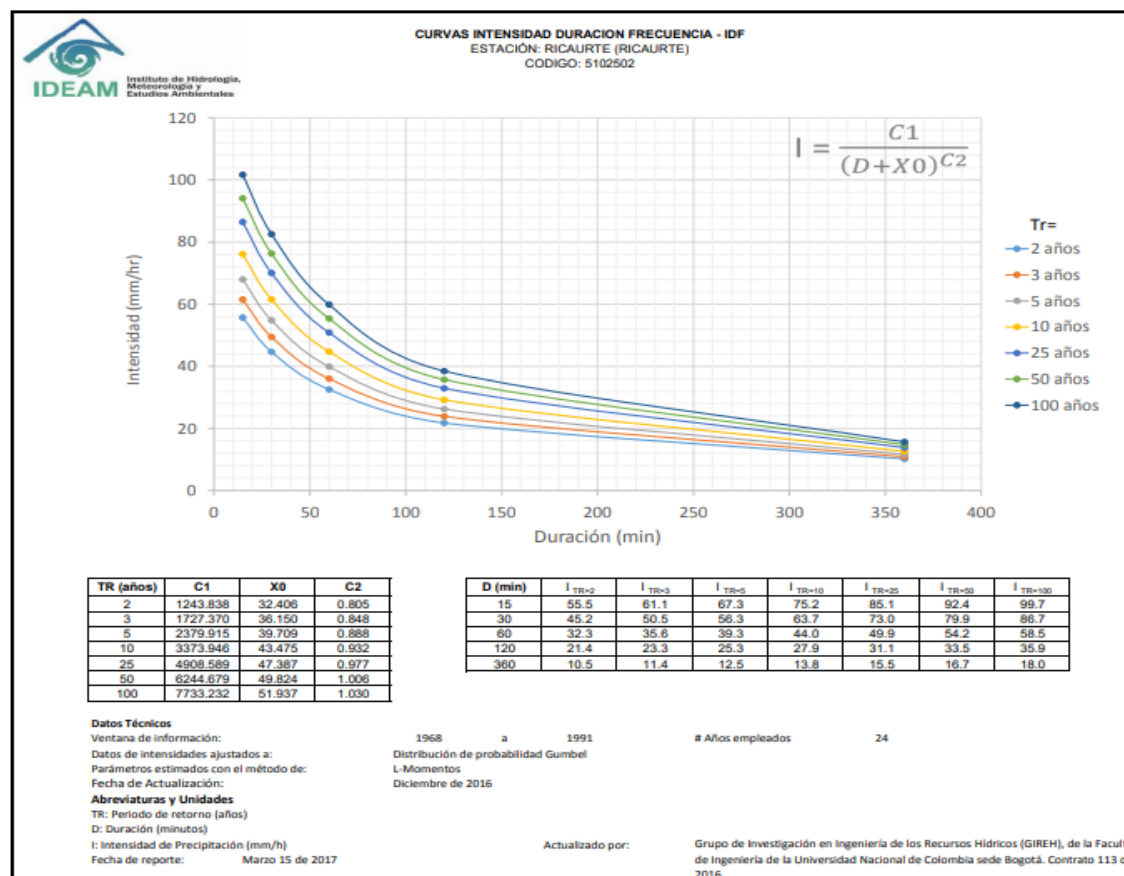


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA										
																				FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO											
CONTRATO DE OBRA No: 3153 DE 2024																				CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24																				PROYECTO: NARIÑO											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3193 DE 2024																				INTERVENTOR: EMERSON LEANDRO TULCAN											
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO - YACUANQUER																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco	24	24	22	22	22	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	23	23	23			24			515
Lluvias moderadas	0		2	2	0						2									2			1	1	1						11
Lluvias intensas																															0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	526
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																															
OBSERVACIONES: Frente de trabajo de Yacuanquer																															
<div><div></div><div>Firma Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 52202-40790 NRÑ</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: Jaqueline Hernandez Meza Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-220386 CAU</div></div>																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/12/2024
(Día / Mes / Año)

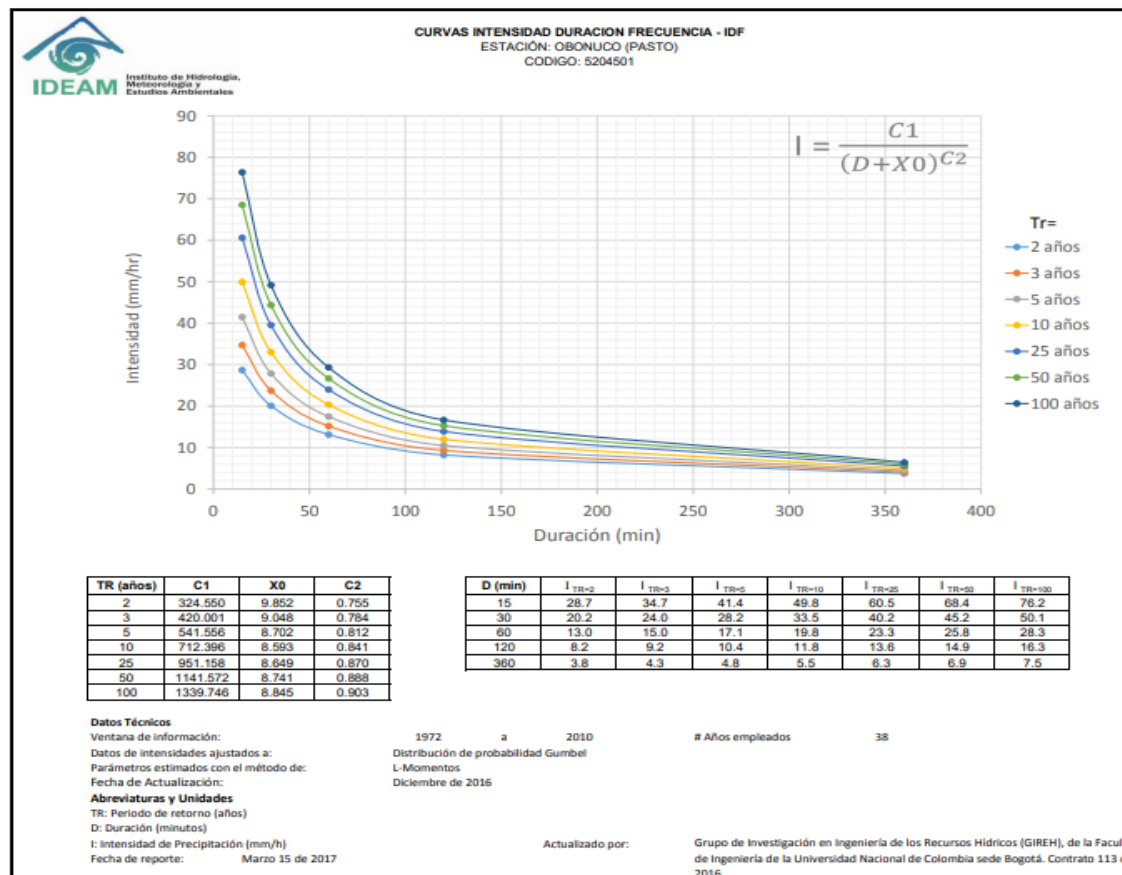

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																		
		VERSIÓN	1																																																		
		PÁGINA																																																			
		FECHA	30	12	2024																																																
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO																																																			
CONTRATO DE OBRA No. 3153 DE 2024		CONTRATISTA: CONSORCIO SH																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIA, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO																																																					
FECHA DE INICIO: 01/10/2024 PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 853,748,014.00 VALOR ACUMULADO: \$ 853,748,014.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3193		INTERVENTOR: EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																					
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 85,374,801.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20</td><td>\$ 170,749,602.80</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30</td><td>\$ 256,124,404.20</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 85,374,801.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0	\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 170,749,602.80	Calidad de Estudios y Diseños	0	\$ -	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 256,124,404.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10</td><td>2024</td><td>16</td><td>8</td><td>2025</td></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>2024</td><td>16</td><td>2</td><td>2028</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>2025</td><td>16</td><td>2</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			1	10	2024	16	8	2025	1	10	2024	16	2	2028	16	2	2025	16	2	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																			
Cumplimiento	10	\$ 85,374,801.40																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0	\$ -																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 170,749,602.80																																																			
Calidad de Estudios y Diseños	0	\$ -																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 256,124,404.20																																																			
VIGENCIA																																																					
Desde			Hasta																																																		
1	10	2024	16	8	2025																																																
1	10	2024	16	2	2028																																																
16	2	2025	16	2	2028																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080500 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																					
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																					
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td>N/A</td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	Otros		N/A	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10</td><td>2024</td><td>16</td><td>2</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			1	10	2024	16	2	2025																					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00																																																			
Otros		N/A																																																			
VIGENCIA																																																					
Desde			Hasta																																																		
1	10	2024	16	2	2025																																																
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021065 OTRAS PÓLIZAS No. N/A Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 03/10/2024																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	30	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños						Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra						Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____


OBSERVACIONES:

A la fecha no se han suscrito modificaciones en tiempo o dinero, así como tampoco suspensiones y reinicios.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma _____

Nombre: Emerson Leandro Tulcan Alvarado

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-099485 NrÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
