



LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoría No. 4297 Interventoría: PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 1 MES O PERIODO: dic-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	INTRODUCCIÓN		14
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento ítems no previstos		20
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		30
5.1	Información general del contrato		30
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		31
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de Información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		31
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	31
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	33
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	33
7	Conclusiones y recomendaciones		34
8	Anexos		34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		34
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Resolución de designación No. 049 de fecha 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	


Contrato de Obra No.	4053-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA
Contrato de Interventoría No.	4297	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	1	MES O PERIODO:	dic-23
---------------------	---	----------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	36
1	INTRODUCCIÓN		37
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		37
2.1	Localización		37
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		38
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		38
2.4	Características técnicas del proyecto		39
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		42
3.1	Información general del contrato		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		43
3.3	Seguimiento Items no previstos		43
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		43
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		43
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	43
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	49
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		52
5.1	Información general del contrato		52
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		53
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		53
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		55
8	Anexos		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Resolución de designación No. 049 de fecha 27 DE NOVIEMBRE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4643-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA
Contrato de Interventoría No.	4297	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	1	MES O PERIODO:	
---------------------	---	----------------	--

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	58
1	INTRODUCCIÓN		59
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		59
2.1	Localización		59
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		60
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		60
2.4	Características técnicas del proyecto		61
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		64
3.1	Información general del contrato		64
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		65
3.3	Seguimiento ítems no previstos		65
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		65
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		65
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	65
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	71
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		74
5.1	Información general del contrato		74
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		75
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		75
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	76
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		77
8	Anexos		77
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Resolución de designación No. 049 de fecha 27 DE NOVIEMBRE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoría No. 4297 Interventoría: PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 1 MES O PERIODO: _____

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	80
1	INTRODUCCIÓN		81
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		81
2.1	Localización		81
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		82
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		82
2.4	Características técnicas del proyecto		83
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		86
3.1	Información general del contrato		86
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		87
3.3	Seguimiento ítems no previstos		87
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		87
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		87
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	87
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	93
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		96
5.1	Información general del contrato		96
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		97
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		97
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	97
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		100
8	Anexos		100
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		100
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 049 de fecha 27 DE NOVI EMBI

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



PROYECTO SANABRIA SAS



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nº 4297-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONVENIO N.º 4643-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JAPON

CONVENIO N.º 4053-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONVENIO N.º 3809-2023 JUNTA DE ACCION COMUNA LA ATARRAYA

CONVENIO N.º 3980-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

INFORME MENSUAL N.º 01

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Contenido

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	12
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1	12
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1. INTRODUCCION	14
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	14
2.1. LOCALIZACION	14
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	15
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA	15
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	16
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	20
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	20
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	20
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	20
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	20
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS	20
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	21
4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	21
4.1. INFORME SEMANAL	21
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	27
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	27
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO	27
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	27
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	27
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	27
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	30
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO	30
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL	30
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	30
4.8.4. ACTAS DE REUNION	30

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	30
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	30
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	31
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	31
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	33
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO	33
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34
8. ANEXOS	34
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	34
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS	34
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	34
I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	35
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1	35
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2	36
1. INTRODUCCION	37
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	37
2.1. LOCALIZACION	37
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	38
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA	38
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	39
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	42
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	42
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	43
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	43
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	43

3.3.	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	43
3.4.	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	43
4.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	43
4.1.	INFORME SEMANAL.....	43
4.2.	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	49
4.3.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	49
4.4.	ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO	49
4.5.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	49
4.6.	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	49
4.7.	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	49
4.8.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	52
4.8.1.	INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO	52
4.8.2.	PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL	52
4.8.3.	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.....	52
4.8.4.	ACTAS DE REUNION	52
5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	52
5.1.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	52
5.2.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	53
5.3.	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	53
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.1.	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	53
6.2.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.3.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	53
6.4.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.5.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	54
6.5.1.	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO	54
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	55
8.	ANEXOS	55
8.1.	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	55
8.2.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS	55
8.3.	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	56

II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 57

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1	57
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2	58
1. INTRODUCCION	59
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	59
2.1. LOCALIZACION	59
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	60
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA	60
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	61
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	64
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	64
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	65
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	65
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	65
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS	65
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	65
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	65
4.1. INFORME SEMANAL	65
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	71
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	71
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO	71
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	71
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	71
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	71
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	74
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO	74
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL	74
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	74
4.8.4. ACTAS DE REUNION	74
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	74
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	74
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	75

5.3.	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	75
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	75
6.1.	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	75
6.2.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	75
6.3.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	75
6.4.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	75
6.5.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	76
6.5.1.	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO	76
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	77
8.	ANEXOS	77
8.1.	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	77
8.2.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS	77
8.3.	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	78
III.	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	79
	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1	79
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2	80
1.	INTRODUCCION	81
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	81
2.1.	LOCALIZACION	81
2.2.	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	82
2.3.	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA	82
2.4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	83
3.	INFORMACION CONTRATO DE OBRA	86
3.1.	INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	86
3.2.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	87
3.2.1.	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.....	87
3.2.2.	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	87
3.3.	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	87
3.4.	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	87
4.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	87

4.1.	INFORME SEMANAL.....	87
4.2.	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	93
4.3.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	93
4.4.	ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO	93
4.5.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	93
4.6.	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	93
4.7.	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....	93
4.8.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	96
4.8.1.	INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO.....	96
4.8.2.	PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL	96
4.8.3.	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.....	96
4.8.4.	ACTAS DE REUNION	96
5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	96
5.1.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.....	96
5.2.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	97
5.3.	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	97
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	97
6.1.	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	97
6.2.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	97
6.3.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	97
6.4.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	97
6.5.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	99
6.5.1.	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO	99
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	100
8.	ANEXOS	100
8.1.	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	100
8.2.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS	100
8.3.	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	100

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
Contrato de Obra No.4643-2023...		Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN	
Contrato de Interventoría No.4297.....		Interventoría: PROYECTO SANABRIA SAS.....	
Objeto Contrato de Obra: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
INFORME MENSUAL No. 1		MES O PERIODO: dic-23	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	ME PI-MN 1-IN-15-FR-2	13
1	INTRODUCCIÓN		14
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento ítems no previstos		20
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		21
4.1	Informe Semanal	ME PI-MN 1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	ME PI-MN 1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	ME PI-MN 1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	ME PI-MN 1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	ME PI-MN 1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	ME PI-MN 1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	ME PI-MN 1-IN-15-FR-12	27
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	ME PI-MN 1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	ME PI-MN 1-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	ME PI-MN 1-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	ME PI-MN 1-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	ME PI-MN 1-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	ME PI-MN 1-IN-14-FR-1	N/A
		ME PI-MN 1-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		30
5.1	Información general del contrato		30
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		31
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		31
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-13	31
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	ME PI-MN 1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	ME PI-MN 1-IN-3-FR-1	N/A
		ME PI-MN 1-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	ME PI-MN 1-IN-9-FR-2	33
	• Seguimiento al Plan de Cargas	ME PI-MN 1-IN-9-FR-3	33
7	Conclusiones y recomendaciones		34
8	Anexos		34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		34
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.			
Firma: _____ Nombre: _____ SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Resolución de designación No. _____ de fecha _____			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	
				VERSION	
				PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: DICIEMBRE	FECHA: 4/01/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
---	--	-------------------------------	--	------------------------	--

CONVENIO No.: 4643-2023	PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 19/12/2023	VALOR INICIAL: \$ 194.052.521,00
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A	VALOR ADICIONALES: \$ -
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024	VALOR ACUMULADO: \$ -
	PLAZO ACUMULADO: 4 MESES	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4297-2023	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>UND</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	UND	5	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>UND</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	UND	0	0	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																		
Pavimentación Mejoramiento	UND	5																																		
Estructuras Alcantarillas																																				
Mantenimiento Muro de Contención																																				
Otros (Especificar cuales)																																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																	
Pavimentación Mejoramiento	UND	0	0																																	
Estructuras Alcantarillas																																				
Mantenimiento Muro de Contención																																				
Otros (Especificar cuales)																																				

AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ 145.302.830,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ 4.359.085,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ 44.390.606,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td> <td>\$ 194.052.521,00</td> </tr> </tbody> </table>	VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR	OBRAS	\$ 145.302.830,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.359.085,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.390.606,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 194.052.521,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																												
	VALOR																											
OBRAS	\$ 145.302.830,00																											
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.359.085,00																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.390.606,00																											
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 194.052.521,00																											
	VALOR	ACUMULADO																										
OBRAS	\$ -	\$ -																										
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																										
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																										

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: - MANO DE OBRA NO CALIFICADA: - EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: - TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 3	Foto 4
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO



Firma: JUAN CARLOS SANABRIA
 Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipio de La Dorada”** entre el Instituto Nacional de Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-1015-2023, se celebra el convenio 4643-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS**, **EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 01** correspondiente al periodo comprendido entre el **23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556

Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819

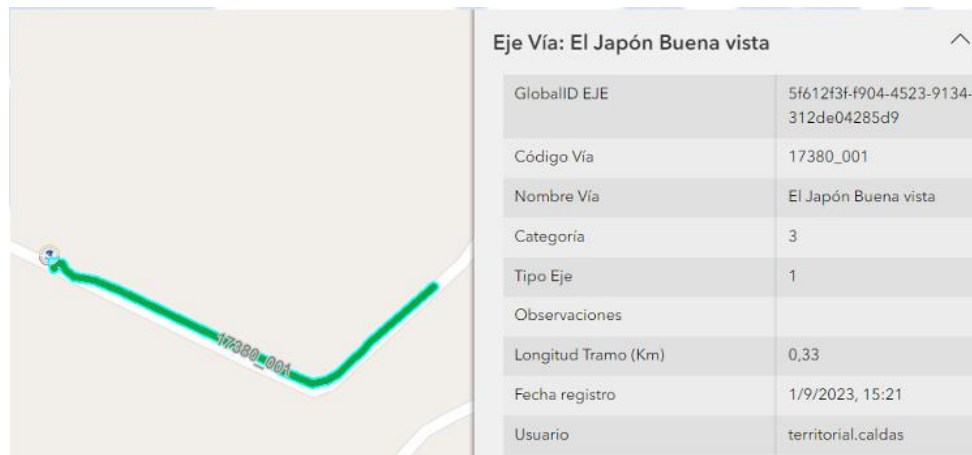


Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda El Japón
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC EL JAPON

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, el cual comprende un tramo de 33 metros lineales a intervenir, tiene existente una batea, la cual ha perdido su funcionalidad con el paso del tiempo, puesto que en las épocas de invierno que afronta el municipio, el cauce del río sobrepasa el nivel de la vía en más de 1.2m de altura lo cual impide el paso vehicular y deja incomunicadas las veredas en la zona de influencia.

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556

Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en La Vereda El Japón

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda El Japón, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4643-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda El Japon a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL**.

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 4. ALCANTARILLAS, del cual se copia textualmente:

“La alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

La profundidad de instalación de la tubería deberá satisfacer los requerimientos geotécnicos de la cimentación y estructurales del tipo de tubería seleccionada durante y después de la construcción. En el numeral 4.4 del Manual de Drenaje para Carreteras se desarrolla todos los aspectos a ser considerados para su diseño. Desde el punto de vista seguridad de ser posible por las condiciones locales de la topografía del terreno, los muros cabecales en el caso de la configuración aleta - aleta y/ o poceta - aleta, se podrían localizar lo más lejanos del borde externo de la calzada, siempre y cuando no se excedan los límites del derecho de vía ni que esta prolongación afecte el presupuesto de la obra. La longitud del ancho sugerido para la poceta es de 1.80 m, sin embargo, si las condiciones constructivas y económicas no lo permite, se podrá disminuir hasta 1.50 m, el cual es el mínimo sugerido por Manual de Drenaje para carreteras (2009).



Durante la etapa de construcción de las alcantarillas se deben considerar en un todo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, 2013 y de manera particular los artículos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tubería artículos 661-13 y 663-13. Considerando los anteriores elementos como los más esenciales para el drenaje de una vía terciaria, en los siguientes planos se presenta los esquemas típicos para una alcantarilla tipo poceta-aleta, tubería en concreto reforzado, tubería plástica, cuneta y filtro.




Las dimensiones que se señalan toman en consideración los valores mínimos que en materia de diseño geométrico e hidráulico han sido establecidos en los diferentes Manuales del Instituto Nacional de Vías, por tal razón corresponden a modelos que pueden ser modificados dependiendo de las particularidades de cada proyecto y de las condiciones locales asociadas a la topografía, estabilidad del suelo, volúmenes de escorrentía a evacuar, tipo de encole o de descole, criterios de seguridad vial, cimentación del tipo de tubería seleccionada, etc.

Este capítulo presenta los esquemas típicos de las obras de drenaje tipo alcantarilla circular sencilla, obra que como mínimo se deben considerar durante el diseño de la corona de la calzada de una carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías de tal manera que con adecuado manejo de la escorrentía superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida útil y el estado de conservación de la misma.

Si la pendiente en el descole de la alcantarilla es mayor al 6%, se recomienda el diseño de un descole en aliviadero o dissipador de energía, tal como está descrito en la sección 4.1.4.2 del Manual de Drenaje para carreteras del Invías (2009).”


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

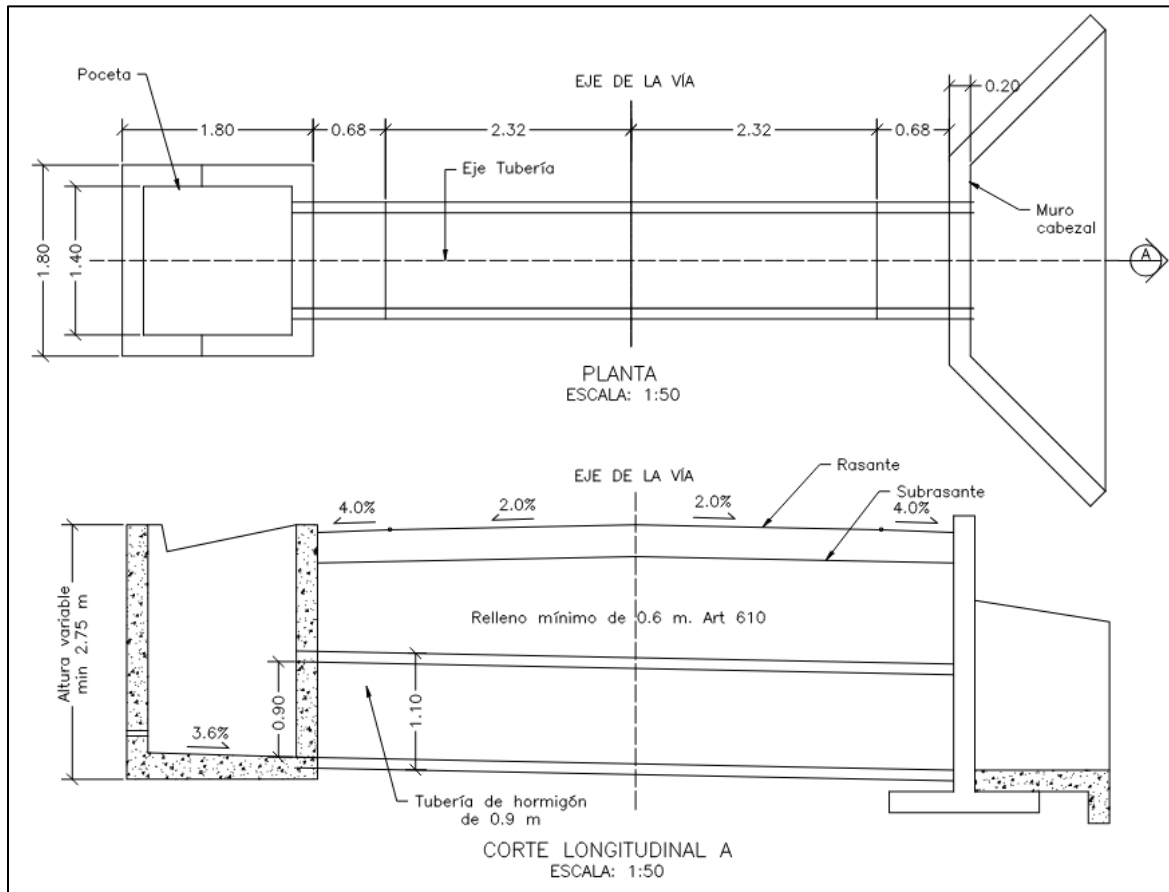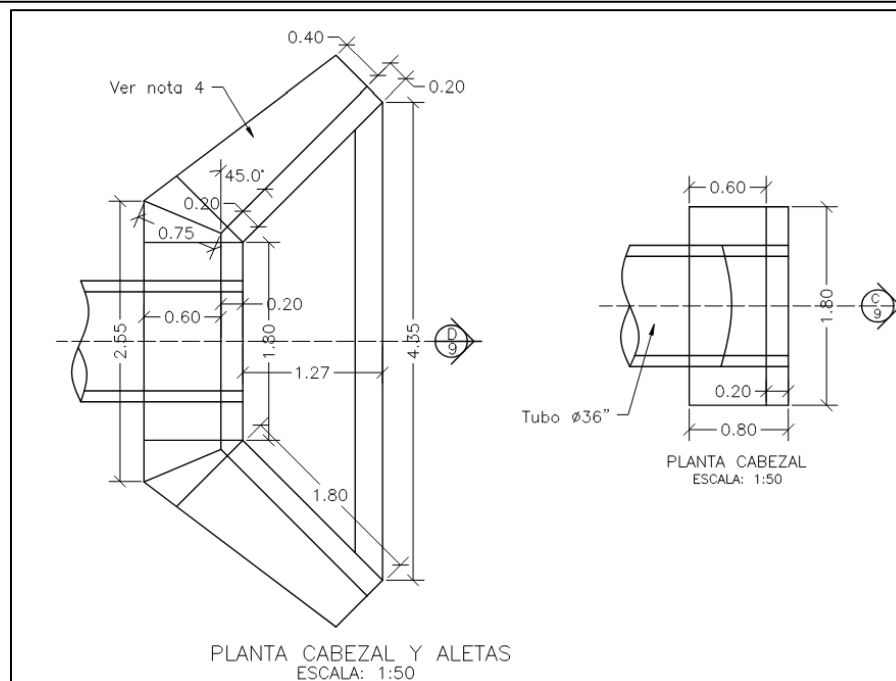

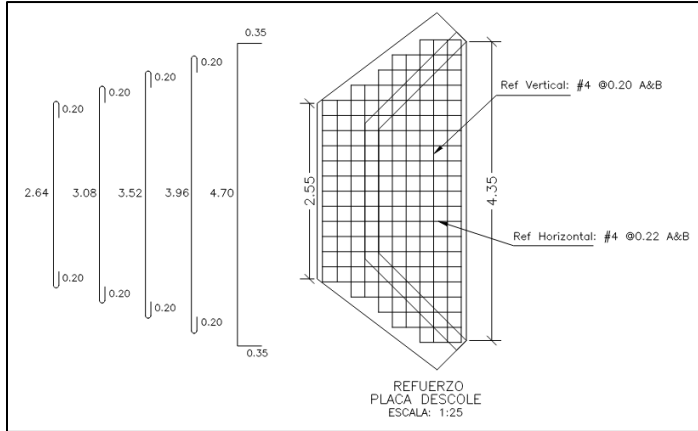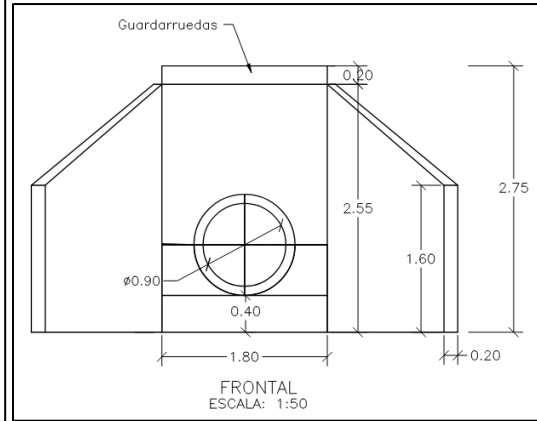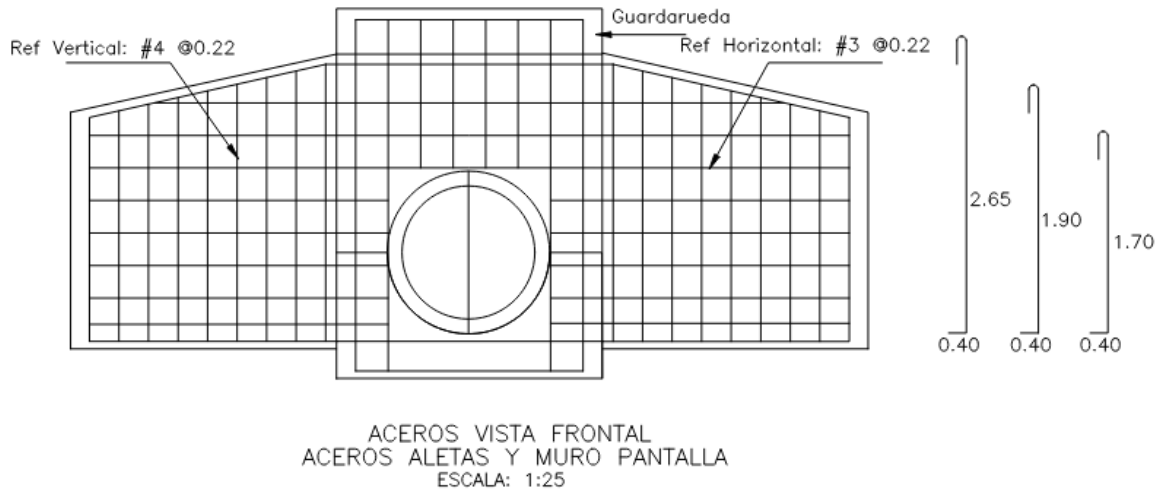

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

GANCHO A 90°

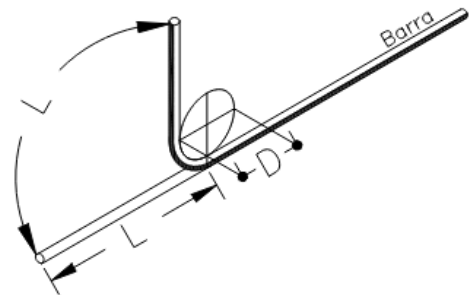

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4643 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON
NIT:	900.867.709-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	33 metros lineales
Valor inicial:	\$ 194.052.521,00
Adiciones:	\$0,00
Valor total	\$ 194.052.521,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de iniciación:	19/12/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, el conveniente no realizo actividades de obra puesto que la orden de inicio del convenio se dio el 19 de diciembre y no se había realizado desembolso a la cuenta, se solicitó por parte del conveniente una prórroga la cual fue aprobada por el invias.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades constructivas, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento ambiental.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades de socialización, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento de la gestión social.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizo la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- Se realizará la revisión de las hojas de vida que remita la JAC con el personal requerido como son maestro, residente y contador.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria N° 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 01 - 23 nov al 30 nov 2023
2. Informe semanal 02 - 30 nov al 07 dic 2023
3. Informe semanal 03 - 07 nov al 14 dic 2023
4. Informe semanal 04 - 14 nov al 21 dic 2023
5. Informe semanal 05 - 21 nov al 28 dic 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	
(Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		SEMANA No.: 1 del 23/11/2023 al 30/11/2023 (Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva))
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud -74.684619, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.				
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.		
CONVENIO No. 3980-2023		CONTRATO No. 4297-2023		
FECHA DE INICIO: 23/11/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		
VALOR INICIAL: \$ 194.052.521,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00		
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 194.052.521,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00		
		VALOR ANTICIPO: \$ -		
		VALOR AMORTIZADO: \$ -		
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 194.052.521,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 194.052.521,00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIO				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 194.052.521,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.590.822,65 0,82%				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %				
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65, se dio orden de inicio al convenio pero a la fecha no cuenta con desembolso				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00 100%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 7,69%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: x				
PERIODO FACTURADO: \$ -				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %				
Meta Física Ejecutada %				
Meta Física (Programa de Obra)				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico				
Tramo y/o Sector 1 Tramo y/o Sector 2 Tramo y/o Sector (n) Total %				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
DISPONIBLE				
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1				
No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0				
No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: 0				
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0				
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
Se inicia con la recopilación de información del convenio Se establece comunicación con el contratista del convenio Se da orden de inicio al convenio el día 29 de noviembre de 2023				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Programación de visitas de campo				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
N/A N/A N/A				
Indicar localización y actividad				
Indicar localización y actividad				
Indicar localización y actividad				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades				
FIRMA: NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA				
Matrícula Profesional No.: 25202-37430				
Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.				



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO: _____ VERSION: _____ PÁGINA: _____																																																															
			FECHA: _____ (Día / Mes / Año)																																																															
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																		
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 2 del 30/11/2023 al 7/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____																																																																
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																		
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																
CONVENIO No. 3980- 2023		INTEGRANTES: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																
FECHA DE INICIO: 23/11/2023		CONTRATO No. 4297-2023																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO O VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																																
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023																																																																
VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																
VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																		
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																
<div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div> <div><table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.765.816,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.590.822,65 0,79%</td><td colspan="2">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO: _____</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2">Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65</td></tr></table></div>				CONVENIO		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.765.816,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.590.822,65 0,79%	RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	PERIODO FACTURADO: _____		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	VALOR FACTURA: \$ -		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65														
CONVENIO		INTERVENTORÍA																																																																
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.765.816,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																															
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																															
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.590.822,65 0,79%	RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																																
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	PERIODO FACTURADO: _____																																																																
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	VALOR FACTURA: \$ -																																																																
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																																																
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																	
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65																																																																		
III. AVANCE FÍSICO																																																																		
Meta Física Programada % _____		Avance o Atraso Físico % _____																																																																
Meta Física Ejecutada % _____		MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>•</td><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	•			•			•			<table><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejcc						Prog						Ejcc						Prog						Ejcc					
Meta Física (Programa de Obra)																																																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																
•																																																																		
•																																																																		
•																																																																		
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																		
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																													
Prog																																																																		
Ejcc																																																																		
Prog																																																																		
Ejcc																																																																		
Prog																																																																		
Ejcc																																																																		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).		Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																
		VERTIMENTOS: SI NO N/A																																																																
		EMISIONES: SI NO N/A																																																																
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																
		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																
ESTADO: _____																																																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																		
	OBRA	INTER																																																																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0																																																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1																																																																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																		
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza visita el día 05/12/2023 a la vereda La Atarraya con el fin de identificar el punto de intervención Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																		
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																		
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div></div>																																																																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades		FIRMA: _____ NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 25202-37430																																																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	
FECHA		(Dia / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	
OBJETO CONVENIO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud -74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.	
CONVENIO No. 3980-2023		CONTRATO No. 4297-2023	
FECHA DE INICIO: 23/11/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	
VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00	
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -	
VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00	
		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
<div><div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.765.816,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.590.822,65</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -</div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65.</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 6.118.550,08</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: x</div><div>PERIODO FACTURADO: \$ -</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div></div></div>			
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada % Meta Física Ejecutada %			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra			
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual): SI NO N/A OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0 TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunion programada por la supervision de Invias el día 11/12/2023en la oficina principal Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO N/A Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades Se asiste a reuniones programadas por la supervisión			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA:  NOMBRE: JUAN CARALLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 25802-37420			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																															
			VERSIÓN																																																																																																																															
			PÁGINA																																																																																																																															
			FECHA																																																																																																																															
Edu / Mes / Año																																																																																																																																		
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																		
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 4 del 14/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																		
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																		
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																		
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																
CONVENIO No. 3980-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		CONTRATO No. 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																
FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023																																																																																																																																
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																		
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																																																																																
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde el valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.765.816,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - %</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.590.822,65 0,79%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td colspan="2">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65</td></tr></table>					CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.765.816,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.590.822,65 0,79%			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %	PERIODO FACTURADO:		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %	VALOR FACTURA:		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %			Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65																																																																													
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.765.816,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																															
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.590.822,65 0,79%																																																																																																																																	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																																																																																																
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %	PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %	VALOR FACTURA:																																																																																																																																
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %																																																																																																																																	
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65																																																																																																																																		
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																		
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																		
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="6">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12">* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR (n):</td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	+			Prog											Ejcc											Prog											Ejcc											Prog											Ejcc									* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:												TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																							
+			Prog																																																																																																																															
			Ejcc																																																																																																																															
			Prog																																																																																																																															
			Ejcc																																																																																																																															
			Prog																																																																																																																															
			Ejcc																																																																																																																															
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																		
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																																		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	DISPONIBLE																																																																																																																														
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																																																																															
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO																																																																																																																															
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																																																																															
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																																																																																		
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																		
ESTADO:																																																																																																																																		
OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1																																																																																																																																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1																																																																																																																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0																																																																																																																																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0																																																																																																																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																																		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																																		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																																		
ACTOS DE VECINDAD REALIZADOS: 0																																																																																																																																		
DIRECCIÓN SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																		
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																																																																																																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																		
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunión programada por la supervisión de Invias el día 11/12/2023 en la oficina principal. Se solicita a la JAC se adelanta el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																		
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC.																																																																																																																																		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																		
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha. El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.																																																																																																																																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																		
N/A																																																																																																																																		
N/A																																																																																																																																		
N/A																																																																																																																																		
Indicar localización y actividad																																																																																																																																		
Indicar localización y actividad																																																																																																																																		
Indicar localización y actividad																																																																																																																																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																		
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades. Se asiste a reuniones programadas por la supervisión.																																																																																																																																		
FIRMA: 																																																																																																																																		
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA																																																																																																																																		
Matrícula Profesional No.: 25002-37430																																																																																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO _____ VERSION _____ PÁGINA _____	FECHA _____ (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 5 del 21/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____	
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684815, de la Vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA	INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.		
CONVENIO No. 3980- 2023	VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00	CONTRATO No. 4297-2023	VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO: 23/11/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 23/11/2023	VALOR ADICIONES: \$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	VALOR ANTICIPO: \$ -
			VALOR AMORTIZADO: \$ -
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
CONVENIO		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.765.816,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 115.868.149,00 100%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,00%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 5,28%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.590.822,65 0,79%		SI NO	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ ☒	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -		PERIODO FACTURADO: _____	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -		VALOR FACTURA: \$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -		Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas, mensajería instantánea y correo electrónico	
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las gólizas del convenio por un valor de \$ 1.590.822,65			
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Meta Física Ejecutada % _____			
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada	
Descripción de la Meta Física Contractual		Avance Físico	
Unidad		Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %	
Cantidad			
Progr			
Ejcc			
Progr			
Ejcc			
Progr			
Ejcc			
Progr			
Ejcc			
* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).		Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico	
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: N/A		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____	
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____	
VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____	
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra	
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades	
ESTADO: _____			
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA INTER		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunión programada por la supervisión de Invias el día 11/12/2023 en la oficina principal. Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha			
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
N/A		N/A	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
N/A		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades. Se asiste a reuniones programadas por la supervisión		FIRMA _____ NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 25202-37430	
Digital: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del ROPD. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Correo, Interventor y Dirección Territorial			

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se ha dado inicio a las obras, por lo tanto, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al convenio, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del convenio se adjunta la informacion continuación

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA					
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONVENIO No. 4643-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 194.052.521,00

VALOR ACUMULADO: \$ 194.052.521,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 38.810.504
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.702.626,1
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 58.215.756

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	11	2023	31	10	2024
N/A	N/A	N/A	N/A		
27	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	11	2023	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 0 SUSPENSIÓN No.: 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	36%	\$ 38.810.504
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9%	\$ 9.702.626,1
Estabilidad y/o Calidad de Obra	55%	\$ 58.215.756

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	11	2023	1	3	2025
N/A	N/A	N/A	N/A		
27	11	2023	30	4	2027
30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 0 SUSPENSIÓN No.: 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321

OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobación de pólizas de la prórroga 01.

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se realizó desembolso a la cuenta de la JAC

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron reuniones.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	\$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- El 19 de diciembre se remitió oficio corregido para la solicitud de prórroga al contrato de interventoria.
- Se realizo el acompañamiento continuo con la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifican las solicitudes de prórroga de los convenios y el contrato de interventoría los cuales tenían fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2023, prorrogando al 30 de abril del 2024.
- No se ha realizado la aprobación de personal puesto que no se han remitido las correspondientes hojas de vida.

El programado para este periodo del convenio es del 0,00%, puesto que no se ha recibido un cronograma para aprobación.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relacionan equipos o vehículos

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relaciona personal a la Interventoria.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se realizaron actas de cobro parcial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al contrato de interventoria 4297-2023, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del contrato se adjunta la informacion continuación:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-INV-15-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 79.541.150,93
VALOR ACUMULADO: \$ 115.868.149,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 7.954.115,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.908.230,2
Calidad del servicio	30%	\$ 23.862.345,3

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	11	2023	30	6	2024
-	-	-	-	-	-
8	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.586.814,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.173.629,6
Calidad del servicio	30%	\$ 34.760.444,4

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año			
8	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma: _____
Nombre: _____
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

[illegible]

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no ha remitido las hojas de vida para aprobación del personal lo cual ha retrasado el inicio de las obras.
- Se recomienda realizar el desembolso de los recursos a la Junta de acción Comunal lo más pronto posible para que una vez aprobadas las hojas de vida del personal se pueda iniciar con las correspondientes actividades preliminares a iniciar la obra, como son el levantamiento topográfico, ensayos de CBR, la contratación de exámenes médicos y contratación de personal profesional para el desarrollo del cronograma de actividades y demás actividades técnicas.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.



Registro fotográfico – Estado actual de la vía a intervenir en La Vereda El Japón.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4053-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA
Contrato de Interventoría No.	4297	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	1	MES O PERIODO:	dic-23
---------------------	---	----------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	36
1	INTRODUCCIÓN		37
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		37
2.1	Localización		37
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		38
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		38
2.4	Características técnicas del proyecto		39
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		42
3.1	Información general del contrato		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		43
3.3	Seguimiento Items no previstos		43
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		43
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		43
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	43
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	49
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		52
5.1	Información general del contrato		52
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		53
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		53
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		55
8	Anexos		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
 Nombre: _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO VERSION PAGINA																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS																																				
CONVENIO No.: 4053-2023		PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 24/11/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A																																				
OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA		VALOR INICIAL: \$ 200.929.132,00 VALOR ADICIONALES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ - DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 199.929.132,00 DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																				
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4297-2023		INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>mt</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	mt	168	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>ML</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																				
Pavimentación Mejoramiento	mt	168																																				
Estructuras Alcantarillas																																						
Mantenimiento Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																			
Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0																																			
Estructuras Alcantarillas																																						
Mantenimiento Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																						
AVANCE FINANCIERO																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ 150.371.172,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ 4.511.135,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ 46.046.825,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td> <td>\$ 200.929.132,00</td> </tr> </tbody> </table>			VALOR	OBRAS	\$ 150.371.172,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.511.135,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 46.046.825,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.929.132,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -										
	VALOR																																					
OBRAS	\$ 150.371.172,00																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.511.135,00																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 46.046.825,00																																					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.929.132,00																																					
	VALOR	ACUMULADO																																				
OBRAS	\$ -	\$ -																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																				
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																				
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																						
INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: MANO DE OBRA NO CALIFICADA: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																				
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																						
Foto 1 Indicar la localización y actividad.		Foto 2 Indicar la localización y actividad.																																				
Foto 3 Indicar la localización y actividad.		Foto 4 Indicar la localización y actividad.																																				
Foto 5 Indicar la localización y actividad.		Foto 6 Indicar la localización y actividad.																																				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica) A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO																																						
Firma:  Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-37430 Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																						

1. INTRODUCCION

El proyecto **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipio de La Dorada”** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-653-2023, se celebra el convenio 4053-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS**, **EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 01** correspondiente al periodo comprendido entre el **23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.673648 y longitud -75.427575 y punto de referencia final el PR 2+700 con coordenadas latitud 5.667733 y longitud -75.428956, de la vía La Mermita – Coca de Huevo de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130

Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de Buenavista
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC BUENAVISTA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, el cual comprende un tramo de aproximadamente 2600 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta vía.

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130

Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en el corregimiento Buenavista.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en el Corregimiento de Buenavista, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4053-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural del Corregimiento de Buenavista a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL**.

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:

“La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01




variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berna cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.

Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

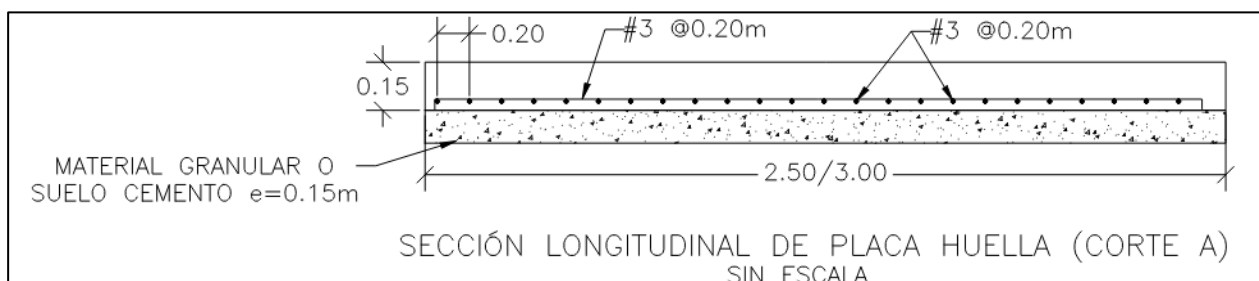

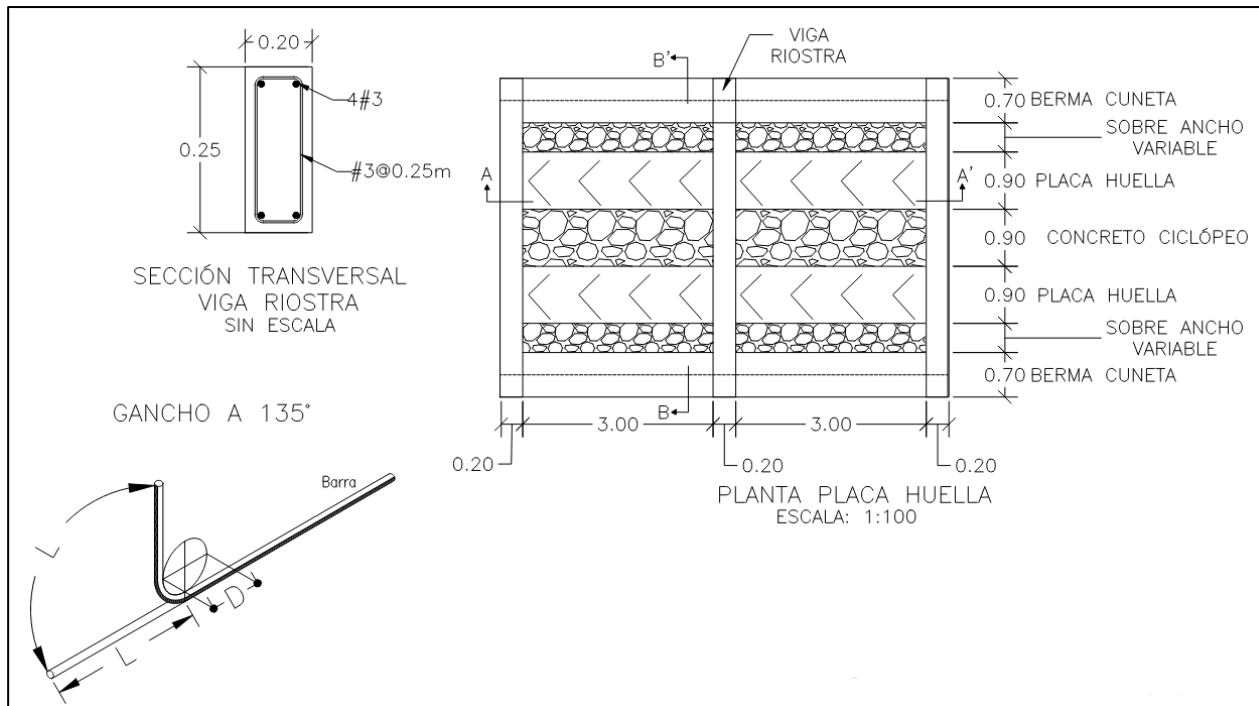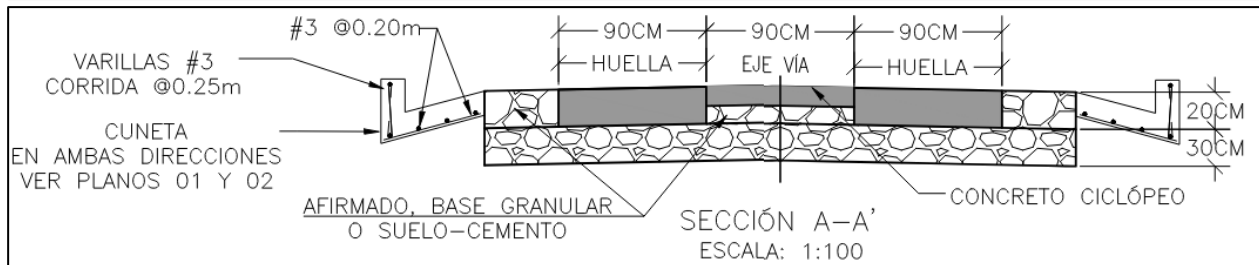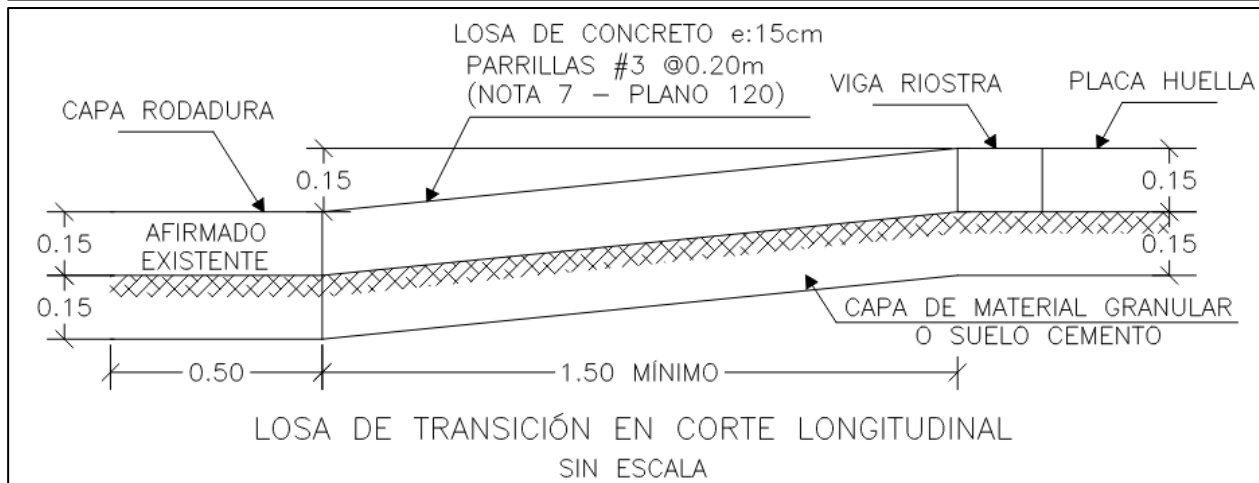

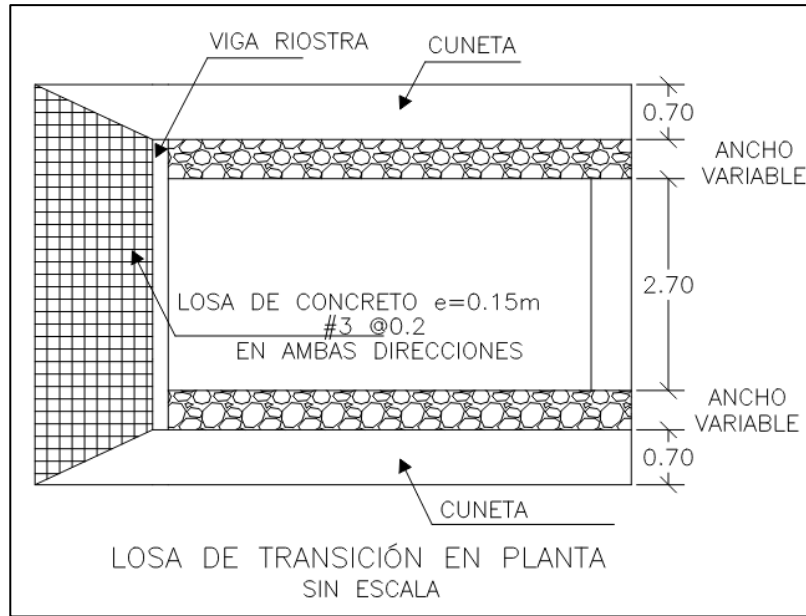

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4053 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA
NIT:	810.005.838-6
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	2630 metros lineales
Valor inicial:	\$ 200.929.132,00
Adiciones:	\$0,00
Valor total	\$ 200.929.132,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	24/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorrogas 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, el conveniente no inicio actividades de obra puesto no se han realizado las actividades preliminares como son la aprobación de las hojas de vida del personal, contratación de personal, levantamiento topográfico y ensayo CBR, se solicitó por parte del conveniente una prórroga la cual fue aprobada por el Invias.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades constructivas, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento ambiental.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades de socialización, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento de la gestión social.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- Se realizará la revisión de las hojas de vida que remita la JAC con el personal requerido como son maestro, residente y contador.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria N° 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 01 - 23 nov al 30 nov 2023
2. Informe semanal 02 - 30 nov al 07 dic 2023
3. Informe semanal 03 - 07 nov al 14 dic 2023
4. Informe semanal 04 - 14 nov al 21 dic 2023
5. Informe semanal 05 - 21 nov al 28 dic 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:	
			FECHA:	(Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS
			SEMANA No.:	1 del 23/11/2023 al 30/11/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:			Santiago Hernández Rendón	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.				
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			PROYECTOS SANABRIA SAS.	
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	\$	200.929.132,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	200.929.132,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:
				\$ 79.541.151,00
			FECHA DE INICIO:	23/11/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023
			VALOR ADICIONES:	\$ -
			VALOR ACUMULADO:	\$ 79.541.151,00
			VALOR ANTICIPO:	\$ -
			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.929.132,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.929.132,00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIO				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.929.132,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %				
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ - %				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.727.365,24 0,86%				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %				
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00 100%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 7,69%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO x				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____				
PERIODO FACTURADO: _____				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____				
Meta Física Ejecutada % _____				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Meta Física (Programa de Obra)				
Descripción de la Meta Física Contractual				
Unidad				
Cantidad				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico				
Tramo y/o sector 1				
Tramo y/o sector 2				
Tramo y/o sector (n)				
Total				
%				
Prog				
Ejgc				
Prog				
Ejgc				
Prog				
Ejgc				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____				
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____				
TRAMO Y/O SECTOR 2: _____				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
UBICACIÓN: N/a				
PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN: N/a				
PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: _____				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1				
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0				
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0				
ACTAS DE VECONDAD REALIZADAS: 0				
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____				
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
Se inicia con la recopilación de información del convenio				
Se entabla comunicación con el contratista del convenio				
Se da orden de inicio al convenio el día 29 de noviembre de 2023				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Programación de visitas de campo				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
N/A				
N/A				
N/A				
Indicar localización y actividad				
Indicar localización y actividad				
Indicar localización y actividad				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
POR PARTE DEL CONTRATISTA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades				
FIRMA: _____				
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA				
Matrícula Profesional No.: 26202-37420				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA																																																																																																																																																																	
		FECHA	(Dia / Mes / Año)																																																																																																																																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS																																																																																																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																																																	
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																																																			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																																																	
CONVENIO No. 4053- 2023		CONTRATO No. 4297-2023																																																																																																																																																																	
FECHA DE INICIO: 24/11/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023																																																																																																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																																																																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023																																																																																																																																																																	
VALOR INICIAL: \$ 200.929.132,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																																	
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 200.929.132,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																																	
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																																																	
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																																																	
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																																			
CONVENIO / CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																																																	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.929.132,00																																																																																																																																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.929.132,00																																																																																																																																																																	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																																	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.929.132,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.727.365,24 0,86%</td><td colspan="2"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24</td></tr></table>				CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.929.132,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.727.365,24 0,86%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		SI	NO		X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24																																																																																																											
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																																																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.929.132,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																																																																																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																																																																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																																																																																																																																
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																																																																
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.727.365,24 0,86%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		SI	NO		X																																																																																																																																																												
SI	NO																																																																																																																																																																		
	X																																																																																																																																																																		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																																																																																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																																																		
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24																																																																																																																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																			
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																																			
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="4">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12">* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)</td></tr><tr><td colspan="12">Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR (n):</td></tr></table>				Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	+			Prog											Ejec											Prog											Ejec									+			Prog											Ejec											Prog											Ejec									* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)												Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico												TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:												TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																																								
+			Prog																																																																																																																																																																
			Ejec																																																																																																																																																																
			Prog																																																																																																																																																																
			Ejec																																																																																																																																																																
+			Prog																																																																																																																																																																
			Ejec																																																																																																																																																																
			Prog																																																																																																																																																																
			Ejec																																																																																																																																																																
* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)																																																																																																																																																																			
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																																																																																																																			
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																																			
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																																																			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																			
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																													
UBICACIÓN: N/A						ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____																																																																																																																																																													
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____																																																																																																																																																													
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____																																																																																																																																																													
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____																																																																																																																																																													
VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____						EMISSIONES: SI _____ NO _____ N/A _____																																																																																																																																																													
OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____						OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																																													
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																																																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																																													
ESTADO:																																																																																																																																																																			
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																			
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																																																																																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 0 1																																																																																																																																																																			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 0 1																																																																																																																																																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 0																																																																																																																																																																			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0 0																																																																																																																																																																			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																																																			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																																																																			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																																			
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.																																																																																																																																																																			
Se realiza visita el día 05/12/2023 a la vereda La atarraya con el fin de identificar el punto de intervención																																																																																																																																																																			
Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																																																																			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																			
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																																																																																																																			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																																			
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha.																																																																																																																																																																			
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																																																																			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																			
Corregimiento Buenavista - Visita a campo junto con la supervisión Invias																																																																																																																																																																			
Corregimiento Buenavista - Visita a campo junto con la supervisión Invias																																																																																																																																																																			
Corregimiento Buenavista - Visita a campo junto con la supervisión Invias																																																																																																																																																																			
NOTA: Las fotografías y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																																																			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																																																			
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades																																																																																																																																																																			
FIRMA: NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 20202-37420																																																																																																																																																																			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
			FECHA
			(Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 3 del 7/12/2023 al 14/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	
OBJETO CONVENIO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIA.			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA	INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.		
CONVENIO No: 4053-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.929.132,00	CONTRATO No: 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00		
FECHA DE INICIO: 24/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -		
	VALOR AMORTIZADO: \$ -		
	SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.929.132,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.929.132,00	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
CONVENIO		INTERVENTORIA	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.929.132,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00 100%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,00%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 7,69%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.727.365,24 0,86%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %		X	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %		No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %		PERIODO FACTURADO:	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %		VALOR FACTURA: \$ -	
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
		Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea	
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %			
Meta Física Ejecutada %			
Meta Física (Programa de Obra)		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad Cantidad	Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %	Descripción Equipo Mínimo Total Disponible
		Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec	
* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).			Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n):			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra	OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades		
ESTADO:			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0	OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0	ACTAS DE VEEDAD REALIZADAS: 0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunión programada por la supervisión de Invias el día 11/12/2023en la oficina principal. Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha. El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
N/A	N/A	N/A	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades Se asiste a reuniones programadas por la supervisión		FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 25202-37430	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PAGINA																																																																																																																																																						
		FECHA	(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																					
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																								
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 4 del 14/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																																							
OBJETO CONVENIO:	AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA		CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																																						
CONVENIO No. 4053-2023	VALOR INICIAL: \$ 200.929.132,00	CONTRATO No. 4297-2023	VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																					
FECHA DE INICIO: 24/11/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 23/11/2023	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																																					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																																					
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																																					
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.929.132,00																																																																																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.929.132,00																																																																																																																																																						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.929.132,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - %</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.727.365,24 0,86%</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - %</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - %</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - %</td><td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.929.132,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.727.365,24 0,86%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %	PERIODO FACTURADO:		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %	VALOR FACTURA:	\$ -	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %			Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24																																																																																																				
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																																						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.929.132,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																																																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																																																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																																																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.727.365,24 0,86%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X																																																																																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %	PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %	VALOR FACTURA:	\$ -																																																																																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																																																																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %																																																																																																																																																							
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24																																																																																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																								
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="4">+</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">+</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">+</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR (n):</p>				Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	+			Prog									Ejec										Prog										Ejec										+			Prog									Ejec										Prog										Ejec										+			Prog									Ejec										Prog										Ejec									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																													
+			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
+			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
+			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
			Prog																																																																																																																																																					
			Ejec																																																																																																																																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="2">DISPONIBLE</td><td colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VERTIMENTOS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual):</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra</td><td colspan="4">OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra</td></tr><tr><td colspan="4">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td colspan="4">OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades</td></tr><tr><td colspan="4">ESTADO:</td><td colspan="4"></td></tr></table>				FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI NO	N/A				LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A		UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A				LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A						VERTIMENTOS:	SI NO	N/A						EMISIONES:	SI NO	N/A						OTROS (Especificar cual):	SI NO	N/A		OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra				P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades				ESTADO:																																																												
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																				
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
				VERTIMENTOS:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
				EMISIONES:	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
				OTROS (Especificar cual):	SI NO	N/A																																																																																																																																																		
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																																				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																																				
ESTADO:																																																																																																																																																								
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																								
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>0</td><td rowspan="5">OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>0</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</td><td>0</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>0</td><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1</td></tr></table>					OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0	OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																										
	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0	OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																																																																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0																																																																																																																																																				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0																																																																																																																																																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0																																																																																																																																																						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																																																								
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunion programada por la supervision de Invias el día 11/12/2023 en la oficina principal Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																																																								
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																																																																																																								
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																																																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																								
<table><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td></tr></table>						N/A	N/A	N/A	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																													
N/A	N/A	N/A																																																																																																																																																						
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																																						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																																								
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																																								
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades Se asiste a reuniones programadas por la supervisión																																																																																																																																																								
FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 75202-37430																																																																																																																																																								



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO VERSION PAGINA																																																																											
			FECHA	(Día / Mes / Año)																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																														
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																														
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 5 del 21/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																														
OBJETO CONVENIO: ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																														
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																														
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																														
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																														
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																														
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																												
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	\$	200.929.132,00																																																																										
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	200.929.132,00																																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	115.868.149,00																																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																								
				VALOR AMORTIZADO:	\$	-																																																																								
				SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																														
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023																																																																											
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	200.929.132,00																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA		\$	200.929.132,00																																																																										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	79.541.151,00																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$	-																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA		\$	79.541.151,00																																																																										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																														
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.929.132,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.727.365,24 0,86%</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %</div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.727.365,24</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 115.868.149,00 100%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 5,28%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0,00%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: X</div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div></div></div>																																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																																														
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																														
Meta Física Ejecutada %																																																																														
<div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad										Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible													Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																												
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																									
Prog																																																																														
Ejec																																																																														
Prog																																																																														
Ejec																																																																														
Prog																																																																														
Ejec																																																																														
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																												
Total																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																														
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE																																																																														
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																									
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																									
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																														
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																														
ESTADO: OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																														
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																														
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																																														
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																														
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunión programada por la supervisión de Invias el día 11/12/2023 en la oficina principal Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																														
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																														
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																														
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																														
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																														
Indicar localización y actividad																																																																														
Indicar localización y actividad																																																																														
Indicar localización y actividad																																																																														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																														
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades Se asiste a reuniones programadas por la supervisión																																																																														
FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matricula Profesional No.: 25202-37430																																																																														

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se ha dado inicio a las obras, por lo tanto, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al convenio, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del convenio se adjunta la informacion continuación

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

	FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)
--	-------	-------	-------	-------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 4053-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 24/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 200.929.132.00
VALOR ACUMULADO: \$ 200.929.132.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.185.826	24	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.046.457	24	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.278.739	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000	24	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																													
ADICIONAL No.: 0		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: 0		SUSPENSIÓN No.: 0																																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>2024</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2029</td> </tr> </tbody> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			24	10	2023	1	3	2025	N/A	N/A	N/A	N/A			24	10	2023	30	4	2027	30	4	2024	30	4	2029
VIGENCIA																																													
Desde			Hasta																																										
24	10	2023	1	3	2025																																								
N/A	N/A	N/A	N/A																																										
24	10	2023	30	4	2027																																								
30	4	2024	30	4	2029																																								
Cumplimiento	20%	\$ 40.185.826																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.046.457																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.278.739																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																													
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																													
ADICIONAL No.: 0		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: 0		SUSPENSIÓN No.: 0																																							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2023	30	4	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año												
VIGENCIA																																													
Desde			Hasta																																										
27	11	2023	30	4	2024																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000																																											
Otros	N/A	N/A																																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 OTRAS PÓLIZAS No. N/A Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																													
OBSERVACIONES:																																													
No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobación de pólizas de la prórroga 01.																																													
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 300px;"></div> </div> Firma: JUAN CARLOS SANABRIA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-37430 <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small>																																													

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron reuniones.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	\$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- El 19 de diciembre se remitió oficio corregido para la solicitud de prórroga al contrato de interventoria.
- Se realizo el acompañamiento continuo con la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifican las solicitudes de prórroga de los convenios y el contrato de interventoría los cuales tenían fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2023, prorrogando al 30 de abril del 2024.
- No se ha realizado la aprobación de personal puesto que no se han remitido las correspondientes hojas de vida.

El programado para este periodo del convenio es del 0,00%, puesto que no se ha recibido un cronograma para aprobación.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relacionan equipos o vehículos

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relaciona personal a la Interventoria.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se realizaron actas de cobro parcial

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al contrato de interventoria 4297-2023, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del contrato se adjunta la informacion continuación:

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO REGIONAL, EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEP/ING-10-9-FR-2

1

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CALDAS

PLAN DE CARGAS INICIAL

PLAN DE CARGAS FINAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:

4648-2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

PLAZO ACUMULADO:

3 MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE

OBJETO:

INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMBIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE LA DORADA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29/11/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

INTERVENIDOR:

PROYECTO SANABRIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENCIÓN - 4297

SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN

RESOLUCIÓN No.:

49

DE

27/11/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 79.541.151,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 36.328.998,00

CONTRATO DE OBRA No.:

4643-2023, 4053-2023, 3809-2023, 3980-2023

CONTRATISTA:

JAC EL JAPÓN, BLENKVISTA, LA ATARRAYA Y LA HABANA - LA DORADA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 115.868.149,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR		2023								2024								TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (H-mes)	Valor Total (\$)	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		H-M	VALOR				
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR						
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
PERSONAL PORFESIONAL																												
		Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00		1,00	\$ 5.800.000,00					0	0	0	0	5.7500	4.350.000,00	0,7500	4.350.000,00	5.7500	4.350.000,00	5.7500	4.350.000,00	5.7500	4.350.000,00	0,0000	17.400.000,00		
		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00		1,00	7.800.000,00					0	0	0	0	1.0000	2.600.000,00	1,0000	2.600.000,00	1,0000	2.600.000,00	1,0000	2.600.000,00	1,0000	2.600.000,00	0,0000	10.400.000,00		
		Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,60	1.680.000,00					0	0	0	0	0,2200	644.000,00	0,2200	644.000,00	0,2200	644.000,00	0,2200	644.000,00	0,2200	644.000,00	0,0000	2.520.000,00		
		Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,60	1.680.000,00					0	0	0	0	0,2200	700.000,00	0,2200	700.000,00	0,2200	700.000,00	0,2200	700.000,00	0,2200	700.000,00	0,0000	2.800.000,00		
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de mano)																												
		Especialistas en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000,00			\$ 3.731.649,00																						
		Especialistas en Control de y/o Gestión	\$ 5.000.000,00																									
		Especialistas en Estructuras	\$ 5.000.000,00																									
		Especialistas en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000,00																									
		Especialistas en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000,00																									
PERSONAL TÉCNICO																												
		Inspector	\$ 1.200.000,00		6,00	7.200.000,00					0	0	0	0	1.000	1.200.000,00	1,0000	1.200.000,00	1,0000	1.200.000,00	1,0000	1.200.000,00	1,000	1.200.000,00	0,00	4.800.000,00		
		Ingeniero SST	\$ 1.200.000,00																									

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no ha remitido las hojas de vida para aprobación del personal lo cual ha retrasado el inicio de las obras.
- Se recomienda realizar el desembolso de los recursos a la Junta de acción Comunal lo más pronto posible para que una vez aprobadas las hojas de vida del personal se pueda iniciar con las correspondientes actividades preliminares a iniciar la obra, como son el levantamiento topográfico, ensayos de CBR, la contratación de exámenes médicos y contratación de personal profesional para el desarrollo del cronograma de actividades y demás actividades técnicas.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

	
<p>Estado de la via a fecha 05/12/2023</p>	<p>Recorrido en conjunto personal Invias 05/12/2023</p>

	
<p>Recorrido en conjunto personal Invias 05/12/2023</p>	<p>Recorrido en conjunto personal Invias 05/12/2023</p>

Registro fotográfico – Estado actual de la vía a intervenir en Corregimiento Buenavista.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

Contrato de Obra No.	4643-2023	Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA
Contrato de Interventoría No.	4297	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	1	MES O PERIODO:	
---------------------	---	----------------	--

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	58
1	INTRODUCCIÓN		59
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		59
2.1	Localización		59
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		60
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		60
2.4	Características técnicas del proyecto		61
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		64
3.1	Información general del contrato		64
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		65
3.3	Seguimiento Items no previstos		65
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		65
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		65
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	65
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	71
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		74
5.1	Información general del contrato		74
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		75
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		75
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	76
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		77
8	Anexos		77
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CALDAS</u>	PERIODO MES: <u>DICIEMBRE</u>	FECHA: <u>4/01/2024</u> <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--------------------------------------	-------------------------------	---

CONVENIO No.: <u>3809-2023</u>	PLAZO INICIAL: <u>3 MESES</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>200.779.147,00</u>	
	FECHA DE INICIO: <u>29/11/2023</u>	VALOR ADICIONALES: \$ <u>-</u>	
OBJETO: <u>ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</u>	FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>N/A</u>		
CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA</u>	FECHA DE REANUDACIÓN: <u>N/A</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u>	
	FECHA DE VENCIMIENTO: <u>30/04/2024</u>	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ <u>199.779.147,00</u>	
	PLAZO ACUMULADO: <u>4 MESES</u>	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ <u>-</u>	

CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>4297-2023</u>	INTERVENTOR: <u>PROYECTO SANABRIA SAS</u>	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>SANTIAGO HERNANDEZ RENDON</u>
---	---	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>m²</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	m ²	170	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>ML</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																		
Pavimentación Mejoramiento	m ²	170																																		
Estructuras Alcantarillas																																				
Mantenimiento Muro de Contención																																				
Otros (Especificar cuales)																																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																	
Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0																																	
Estructuras Alcantarillas																																				
Mantenimiento Muro de Contención																																				
Otros (Especificar cuales)																																				

AVANCE FINANCIERO																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ 150.473.039,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ 4.514.191,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ 45.791.917,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td> <td>\$ 200.779.147,00</td> </tr> </table>		VALOR	OBRAS	\$ 150.473.039,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.514.191,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.791.917,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.779.147,00	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -
	VALOR																									
OBRAS	\$ 150.473.039,00																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.514.191,00																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.791.917,00																									
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.779.147,00																									
	VALOR	ACUMULADO																								
OBRAS	\$ -	\$ -																								
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																								
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																								

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ <u>-</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>-</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>-</u>	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: <u>-</u> MANO DE OBRA NO CALIFICADA: <u>-</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: <u>-</u> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: <u>-</u>
--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 3	Foto 4
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO


 Firma: _____
 Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipio de La Dorada”** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-507-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS**, **EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01** correspondiente al periodo comprendido entre el **23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000

Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Atarraya
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA ATARRAYA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta vía.

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000

Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000

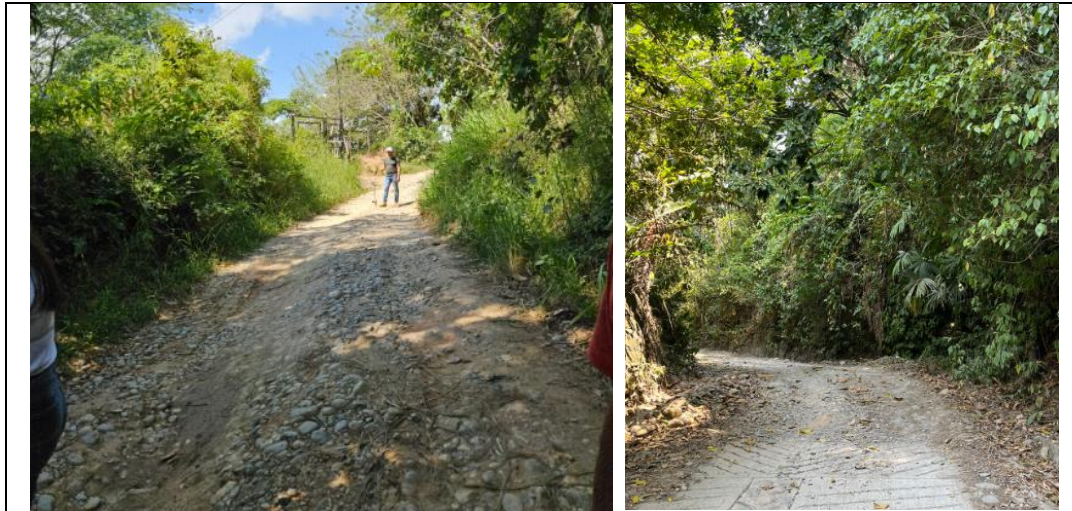


Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Atarraya.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La atarraya, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3809-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Atarraya a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL**.

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:

“La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01




central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.

Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

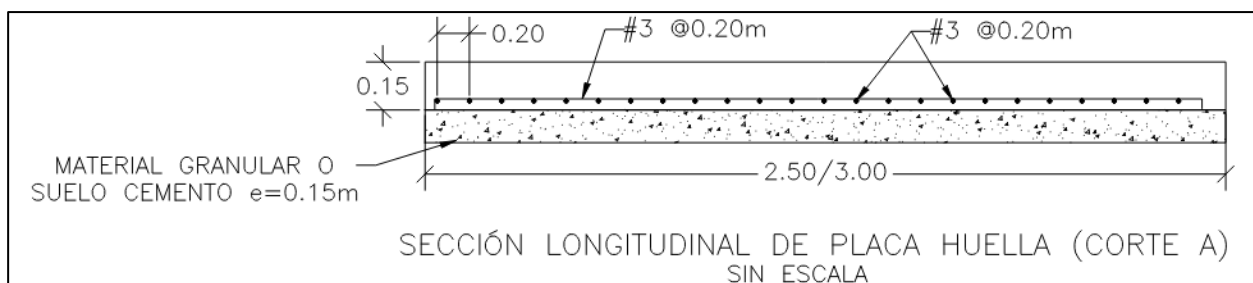

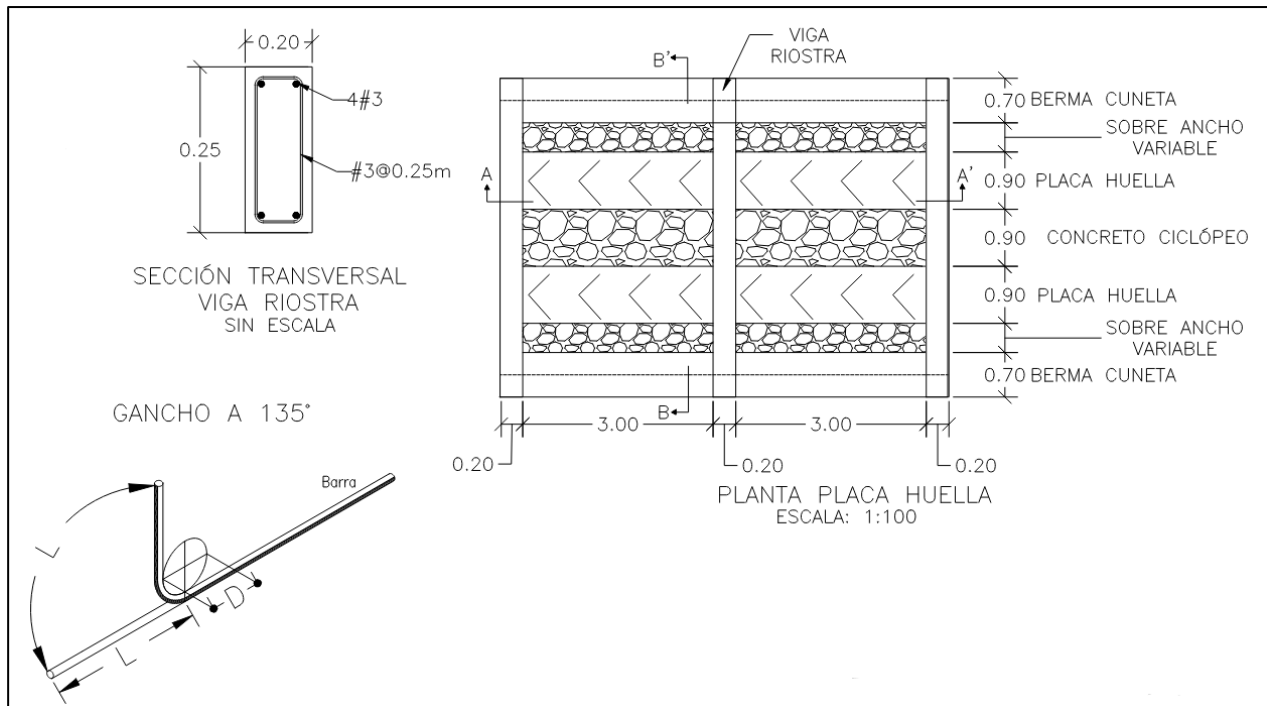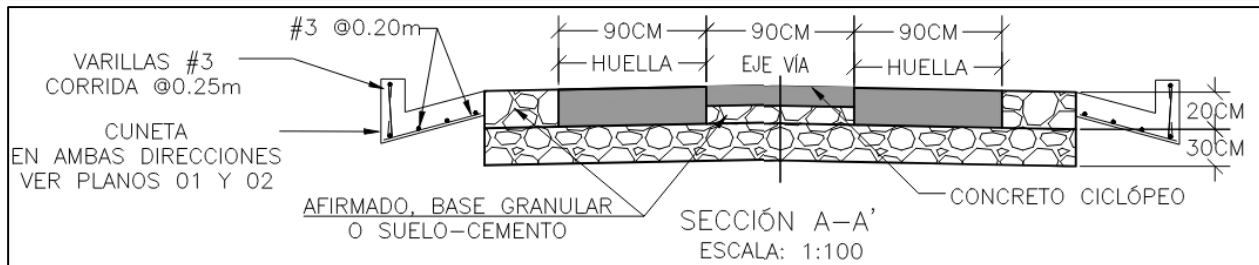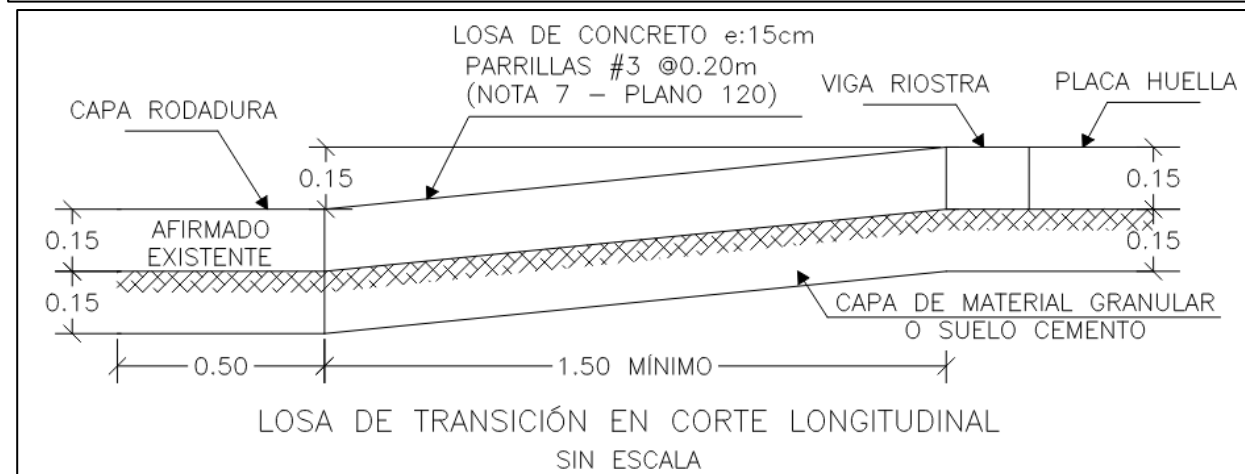

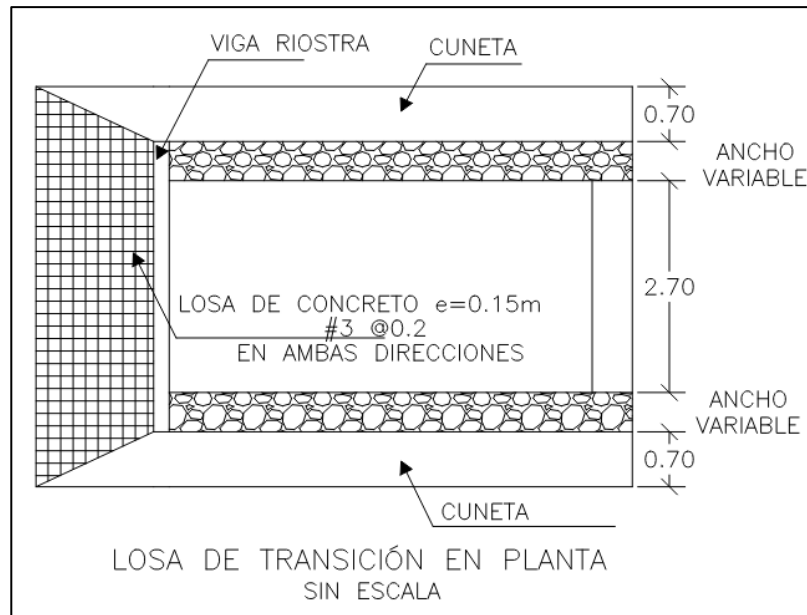

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3809 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA
NIT:	901.022.262
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	550 metros lineales
Valor inicial:	\$ 200.779.147,00
Adiciones:	\$0,00
Valor total	\$ 200.779.147,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorrogada 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES**

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, el conveniente no inicio actividades de obra puesto no se han realizado las actividades preliminares como son la aprobación de las hojas de vida del personal, contratación de personal, levantamiento topográfico y ensayo CBR, se solicitó por parte del conveniente una prórroga la cual fue aprobada por el Invias.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades constructivas, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento ambiental.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades de socialización, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento de la gestión social.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- Se realizará la revisión de las hojas de vida que remita la JAC con el personal requerido como son maestro, residente y contador.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**4.1. INFORME SEMANAL**

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria N° 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

6. Informe semanal 01 - 23 nov al 30 nov 2023
7. Informe semanal 02 - 30 nov al 07 dic 2023
8. Informe semanal 03 - 07 nov al 14 dic 2023
9. Informe semanal 04 - 14 nov al 21 dic 2023
10. Informe semanal 05 - 21 nov al 28 dic 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																																														
			VERSIÓN																																																																																																																																														
			PÁGINA																																																																																																																																														
			FECHA																																																																																																																																														
(Dia / Mes / Año)																																																																																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																	
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		SEMANA No.: 1 del 23/11/2023 al 30/11/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																														
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																	
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																	
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																																	
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																															
CONVENIO No. 3809-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.779.147,00		CONTRATO No. 4287-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																															
FECHA DE INICIO: 29/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.147,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																															
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																															
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																	
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																															
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																																															
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																															
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO</th><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200.779.147,00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>79.541.151,00</td><td>100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>6.118.550,08</td><td>7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>1.760.304,06</td><td>0,88%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06</td><td colspan="4">Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</td></tr></tbody></table>					CONVENIO				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200.779.147,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	79.541.151,00	100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	6.118.550,08	7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.760.304,06	0,88%					(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%					TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%					AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%					INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%					INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%					Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06				Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																								
CONVENIO				INTERVENTORIA																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200.779.147,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	79.541.151,00	100%																																																																																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			0,00%																																																																																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	6.118.550,08	7,69%																																																																																																																																										
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			0,00%																																																																																																																																										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.760.304,06	0,88%																																																																																																																																														
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%																																																																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%																																																																																																																																														
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%																																																																																																																																														
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%																																																																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%																																																																																																																																														
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06				Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																																																																																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																	
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																	
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th><th colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o Sector 1</th><th>Tramo y/o Sector 2</th><th>Tramo y/o Sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">•</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">•</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">•</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejcc</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR (n):</p>					Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o Sector 1	Tramo y/o Sector 2	Tramo y/o Sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	•			Prog									Ejcc									Prog									Ejcc									•			Prog									Ejcc									Prog									Ejcc									•			Prog									Ejcc									Prog									Ejcc								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o Sector 1	Tramo y/o Sector 2	Tramo y/o Sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																						
•			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
•			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
•			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
			Prog																																																																																																																																														
			Ejcc																																																																																																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO DISPONIBLE</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra</td><td colspan="2">OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra</td></tr><tr><td colspan="2">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td colspan="2">OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades</td></tr><tr><td colspan="2">ESTADO:</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO DISPONIBLE			LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO			LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra		P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades		ESTADO:																																																																																																																
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																															
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO DISPONIBLE																																																																																																																																														
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																																																																																														
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO																																																																																																																																														
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																																																																																																														
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																															
ESTADO:																																																																																																																																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th></th><th>OBRA</th><th>INTER</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>0</td><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>0</td><td>0</td><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.</p>						OBRA	INTER		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1																																																																																																																							
	OBRA	INTER																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																																														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																																														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0																																																																																																																																														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1																																																																																																																																																
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																	
Se inicia con la recopilación de información del convenio Se entabla comunicación con el contratista del convenio Se da orden de inicio al convenio el día 29 de noviembre de 2023																																																																																																																																																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																	
Programación de visitas de campo																																																																																																																																																	
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																	
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha																																																																																																																																																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																																																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td></tr></tbody></table>								N/A	N/A	N/A	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																				
N/A	N/A	N/A																																																																																																																																															
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																																	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																	
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades																																																																																																																																																	
FIRMA:  NOMBRE: JUAN CARALLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 20302-37430																																																																																																																																																	
Original: Informe mensual de Interventoría, Activo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial																																																																																																																																																	



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION FOLIO																																																																																																																								
		FECHA	(Día / Mes / Año)																																																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																										
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		SEMANA No.: 2 del 30/11/2023 al 7/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEDICAMENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																										
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																								
CONVENIO No.: 3809-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.779.147,00		CONTRATO No.: 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																								
FECHA DE INICIO: 29/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.147,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																								
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																								
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																										
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																								
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.779.147,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.760.304,06 0,88%</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2">Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr></table>				CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.779.147,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.760.304,06 0,88%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	PERIODO FACTURADO:		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																									
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.779.147,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																																																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																																																																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																																																																																							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.760.304,06 0,88%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X																																																																																																																							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	PERIODO FACTURADO:																																																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -																																																																																																																							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																									
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																										
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible				Prog												Ejec												Prog												Ejec												Prog												Ejec																																
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																															
			Prog																																																																																																																							
			Ejec																																																																																																																							
			Prog																																																																																																																							
			Ejec																																																																																																																							
			Prog																																																																																																																							
			Ejec																																																																																																																							
El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																										
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																																																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																										
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																										
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																										
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																										
UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																										
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																																																																										
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																										
ESTADO: OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																										
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																										
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0																																																																																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 ACTAS DE VEJECINDAD REALIZADAS: 0																																																																																																																										
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																										
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																										
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza visita el día 05/12/2023 a la vereda La Atarraya con el fin de identificar el punto de intervención Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																										
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																										
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																																																																										
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																										
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor																																																																																																																										
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																										
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades																																																																																																																										
FIRMA: NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matricula Profesional No.: 25202-37430																																																																																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MROD. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.																																																																																																																										



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																																																																																
					VERSION																																																																																																																																																
					PÁGINA																																																																																																																																																
FECHA																																																																																																																																																					
(Dia / Mes / Año)																																																																																																																																																					
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		SEMANA No.: 3 del 7/12/2023 al 14/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																																	
OBJETO CONVENIO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																					
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																					
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																																					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA				INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																																	
CONVENIO No. 3809- 2023 VALOR INICIAL: \$ 200.779.147,00				CONTRATO No. 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																	
FECHA DE INICIO: 29/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.147,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023				FECHA DE VENCIMIENTO O VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																																	
				VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																																	
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																																																																																																																			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																																			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200.779.147,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 79.541.151,00 100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - %</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 6.118.550,08 7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA</td><td>\$ - %</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.760.304,06 0,88%</td><td colspan="2"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>x</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06</td></tr></table>							CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.779.147,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.760.304,06 0,88%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>x</td></tr></table>		SI	NO		x	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %			Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06																																																																																										
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.779.147,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 79.541.151,00 100%																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - %	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	0,00%																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - %	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.118.550,08 7,69%																																																																																																																																																		
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ - %	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																																																		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.760.304,06 0,88%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>x</td></tr></table>		SI	NO		x																																																																																																																																														
SI	NO																																																																																																																																																				
	x																																																																																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %																																																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %																																																																																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - %																																																																																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %																																																																																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %																																																																																																																																																				
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06																																																																																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																					
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12">* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</td></tr><tr><td colspan="6">TRAMO Y/O SECTOR 1:</td><td colspan="6">TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="6">TRAMO Y/O SECTOR (n):</td><td colspan="6"></td></tr></table>							Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	-			Prog									Ejec										Prog										Ejec										-			Prog									Ejec										Prog										Ejec										* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:						TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																													
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																										
-			Prog																																																																																																																																																		
			Ejec																																																																																																																																																		
			Prog																																																																																																																																																		
			Ejec																																																																																																																																																		
-			Prog																																																																																																																																																		
			Ejec																																																																																																																																																		
			Prog																																																																																																																																																		
			Ejec																																																																																																																																																		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																					
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="2">DISPONIBLE</td><td colspan="3">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>N/A</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VERTIMENTOS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra</td><td colspan="3">OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td colspan="3">OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades</td></tr><tr><td colspan="4">ESTADO:</td><td colspan="3"></td></tr></table>							FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A			LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A					APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A			LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	Ocupación de CAUCES:	SI NO	N/A					VERTIMENTOS:	SI NO	N/A					EMISIONES:	SI NO	N/A					OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra			OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra							P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades			ESTADO:																																																										
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A																																																																																																																																															
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	Ocupación de CAUCES:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
				VERTIMENTOS:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
				EMISIONES:	SI NO	N/A																																																																																																																																															
				OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																																																																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																																	
ESTADO:																																																																																																																																																					
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																					
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>1</td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>0</td><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>0</td><td>0</td><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td><td colspan="2">1</td><td colspan="4"></td></tr></table>								OBRA	INTER				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1																																																																																																														
	OBRA	INTER				OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0																																																																																																																																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0																																																																																																																																																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0																																																																																																																																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1																																																																																																																																																				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																					
Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunion programada por la supervisión de Inviás el día 11/12/2023en la oficina principal. Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																																																					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																					
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																																																																																																					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																					
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha																																																																																																																																																					
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																																																					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																					
<table><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td><td>Indicar localización y actividad</td></tr></table>							N/A	N/A	N/A	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																									
N/A	N/A	N/A																																																																																																																																																			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																																																																																																			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																																					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES																																																																																																																																																					
POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																																					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																					
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades. Se asiste a reuniones programadas por la supervisión																																																																																																																																																					
FIRMA: NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 26202-37430																																																																																																																																																					
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial																																																																																																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	(Día / Mes / Año)

L. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CALDAS

SEMANA No.:

4

del

14/12/2023

al

21/12/2023

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

Santiago Hernández Rendón

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA				INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.			
INTEGRANTES:							
CONVENIO No. 3809- 2023		VALOR INICIAL: \$ 200.779.147,00		CONTRATO No. 4297-2023		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00	
FECHA DE INICIO: 29/11/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 23/11/2023		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.147,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		VALOR ANTICIPO: \$ -	
						VALOR AMORTIZADO: \$ -	
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.779.147,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.779.147,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.779.147,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.760.304,06 0,88%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %

Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00 100%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 7,69%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

0

ACTAS DE VERIDAD REALIZADAS:

0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se realiza asiste a reunion programada por la supervision de Invias el día 11/12/2023en la oficina principal
Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/a

Indicar localización y actividad

N/a

Indicar localización y actividad

N/a

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades
Se asiste a reuniones programadas por la supervisión

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA

Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RVRIS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.



	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSION PÁGINA</div>																																																							
		FECHA	(Día / Mes / Año)																																																						
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																									
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																									
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS																																																						
		SEMANA No.:	5 del 21/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																									
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																							
CONVENIO No.	3809- 2023	CONTRATO No.	4297-2023																																																						
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	FECHA DE INICIO:	23/11/2023																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023																																																						
VALOR INICIAL:	\$ 200.779.147,00	VALOR INICIAL:	\$ 79.541.151,00																																																						
VALOR ADICIONES:	\$ -	VALOR ADICIONES:	\$ -																																																						
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.779.147,00	VALOR ACUMULADO:	\$ 79.541.151,00																																																						
		VALOR ANTICIPO:	\$ -																																																						
		VALOR AMORTIZADO:	\$ -																																																						
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -																																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.779.147,00																																																							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																									
<div><div><div>CONVENIO</div><div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</div><div>\$ 200.779.147,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</div><div>\$ 1.760.304,06</div><div>0,88%</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div>\$ -</div><div>%</div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.760.304,06</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ 79.541.151,00</div><div>100%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div></div><div>0,00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ 6.118.550,08</div><div>7,69%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div></div><div>0,00%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div><div>SI</div><div>NO</div><div></div><div>x</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div></div></div></div></div>																																																									
III. AVANCE FÍSICO																																																									
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																									
Meta Física Ejecutada %																																																									
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div><div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></div><div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div></div></div>				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad										Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																							
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																				
Prog																																																									
Ejec																																																									
Prog																																																									
Ejec																																																									
Prog																																																									
Ejec																																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																									
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																							
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO																																																						
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																						
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO																																																						
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																						
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																							
ESTADO:																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																									
		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VICINDAD REALIZADAS:																																																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																																									
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																									
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza existe la reunión programada por la supervisión de Invias el día 11/12/2023 en la oficina principal. Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																									
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																									
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC.																																																									
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																									
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha. El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.																																																									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																									
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div></div>																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.																																																									
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades. Se asiste a reuniones programadas por la supervisión.		FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 25002-37430																																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.																																																									

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se ha dado inicio a las obras, por lo tanto, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al convenio, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del convenio se adjunta la informacion continuación

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA			

FECHA				
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ATRRAYA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 29/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 200.779.147,00

VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.147,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.155.829	12	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.957	12	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.233.744	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000	12	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: 0		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: 0		SUSPENSIÓN No.: 0																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Amparo</th> <th style="width: 20%;">% Amparo</th> <th style="width: 40%;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.185.826</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.046.457</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.278.739</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.185.826	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.046.457	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.278.739	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td colspan="3">N/A</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>2024</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2029</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			12	10	2023	1	3	2025	N/A	N/A	N/A	N/A			12	10	2023	30	4	2027	30	4	2024	30	4	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	20%	\$ 40.185.826																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.046.457																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.278.739																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
12	10	2023	1	3	2025																																																				
N/A	N/A	N/A	N/A																																																						
12	10	2023	30	4	2027																																																				
30	4	2024	30	4	2029																																																				
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL</p> <p>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____</p>																																																									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: 0		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: 0		SUSPENSIÓN No.: 0																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Seguro</th> <th style="width: 20%;">% Asegurado</th> <th style="width: 40%;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>100%</td> <td>\$ 232.000.000</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000	Otros	N/A	N/A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			12	10	2023	30	4	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000																																																							
Otros	N/A	N/A																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
12	10	2023	30	4	2024																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 OTRAS PÓLIZAS No. N/A</p> <p>Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____</p>																																																									
OBSERVACIONES:																																																									
No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobación de pólizas de la prórroga 01.																																																									
<p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p>																																																									
<p>Firma: </p> <p>Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-37430</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																																									

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron reuniones.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	\$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR**

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- El 19 de diciembre se remitió oficio corregido para la solicitud de prórroga al contrato de interventoria.
- Se realizo el acompañamiento continuo con la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifican las solicitudes de prórroga de los convenios y el contrato de interventoría los cuales tenían fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2023, prorrogando al 30 de abril del 2024.
- No se ha realizado la aprobación de personal puesto que no se han remitido las correspondientes hojas de vida.

El programado para este periodo del convenio es del 0,00%, puesto que no se ha recibido un cronograma para aprobación.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Durante este periodo no se relacionan equipos o vehículos

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relaciona personal a la Interventoria.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se realizaron actas de cobro parcial

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al contrato de interventoria 4297-2023, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del contrato se adjunta la informacion continuación:

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

[illegible]

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no ha remitido las hojas de vida para aprobación del personal lo cual ha retrasado el inicio de las obras.
- Se recomienda realizar el desembolso de los recursos a la Junta de acción Comunal lo más pronto posible para que una vez aprobadas las hojas de vida del personal se pueda iniciar con las correspondientes actividades preliminares a iniciar la obra, como son el levantamiento topográfico, ensayos de CBR, la contratación de exámenes médicos y contratación de personal profesional para el desarrollo del cronograma de actividades y demás actividades técnicas.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

	
<p>Estado de la via a fecha 05/12/2023</p>	<p>Recorrido en conjunto personal Invias 05/12/2023</p>

	
<p>Recorrido en conjunto personal Invias 05/12/2023</p>	<p>Recorrido en conjunto con la comunidad 05/12/2023</p>

Registro fotográfico – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Atarraya.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

III. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA	
Contrato de Obra No. 4643-2023		Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPON	
Contrato de Interventoría No. 4297		Interventoría: PROYECTO SANABRIA SAS	
Objeto Contrato de Obra: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
INFORME MENSUAL No. 1		MES O PERIODO:	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	80
1	INTRODUCCIÓN		81
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		81
2.1	Localización		81
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		82
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		82
2.4	Características técnicas del proyecto		83
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		86
3.1	Información general del contrato		86
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		87
3.3	Seguimiento ítems no previstos		87
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		87
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		87
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	87
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	93
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		96
5.1	Información general del contrato		96
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		97
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		97
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	97
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		100
8	Anexos		100
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		100
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A
<p>Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p> <p>Resolución de designación No. _____ de fecha _____</p>			
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA S.A.S.</p> <p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>			

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	<small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</small> RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	<small>CÓDIGO</small> <small>VERSION</small> <small>PÁGINA</small>																																				
		<small>FECHA</small> 4/01/2024 <small>(Dia / Mes / Año)</small>																																				
<small>UNIDAD EJECUTORA:</small> SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		<small>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</small> CALDAS																																				
<small>PERIODO MES:</small> DICIEMBRE																																						
<small>CONVENIO No.:</small> 3980-2023		<small>PLAZO INICIAL:</small> 3 MESES <small>FECHA DE INICIO:</small> 29/11/2023 <small>FECHA DE SUSPENSIÓN:</small> N/A																																				
<small>OBJETO:</small> ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		<small>VALOR INICIAL :</small> \$ 200.765.816,00 <small>VALOR ADICIONALES:</small> \$ -																																				
<small>CONTRATISTA:</small> JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		<small>FECHA DE REANUDACIÓN:</small> N/A <small>FECHA DE VENCIMIENTO:</small> 30/04/2024 <small>PLAZO ACUMULADO:</small> 4 MESES																																				
		<small>VALOR ACUMULADO:</small> \$ - <small>DESEMBOLSO CONCEDIDO:</small> \$ 199.765.816,00 <small>DESEMBOLSO AMORTIZADO:</small> \$ -																																				
<small>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</small> 4297-2023		<small>INTERVENTOR:</small> PROYECTO SANABRIA SAS																																				
		<small>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:</small> SANTIAGO HERNANDEZ RENDON																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>ml</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	ml	166	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentación Mejoramiento</td> <td>ML</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estructuras Alcantarillas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Muro de Contención</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																				
Pavimentación Mejoramiento	ml	166																																				
Estructuras Alcantarillas																																						
Mantenimiento Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																			
Pavimentación Mejoramiento	ML	0	0																																			
Estructuras Alcantarillas																																						
Mantenimiento Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																						
AVANCE FINANCIERO																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ 150.527.845,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ 4.515.835,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ 45.722.136,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td> <td>\$ 200.765.816,00</td> </tr> </tbody> </table>			VALOR	OBRAS	\$ 150.527.845,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.515.835,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.722.136,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.765.816,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -										
	VALOR																																					
OBRAS	\$ 150.527.845,00																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.515.835,00																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 45.722.136,00																																					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.765.816,00																																					
	VALOR	ACUMULADO																																				
OBRAS	\$ -	\$ -																																				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																				
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																				
<small>Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio</small>																																						
<small>INVERSIÓN EN OBRA</small> <small>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</small> \$ - <small>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</small> \$ - <small>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</small>		<small>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</small> <small>MANO DE OBRA CALIFICADA:</small> _____ <small>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</small> _____ <small>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</small> _____ <small>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</small> _____																																				
<small>REGISTRO FOTOGRÁFICO</small>																																						
Foto 1 Indicar la localización y actividad.		Foto 2 Indicar la localización y actividad.																																				
Foto 3 Indicar la localización y actividad.		Foto 4 Indicar la localización y actividad.																																				
Foto 5 Indicar la localización y actividad.		Foto 6 Indicar la localización y actividad.																																				
<small>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</small> <small>A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO</small>																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20%;"> <small>Firma</small>  <small>Nombre:</small> JUAN CARLOS SANABRIA <small>Director de Interventoría</small> <small>Matrícula Profesional No.:</small> 25202-37430 </div> <div style="width: 80%; font-size: small;"> <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</small> <small>Copias: Interventor, Dirección Territorial</small> </div> </div>																																						

1. INTRODUCCION

El proyecto **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipio de La Dorada”** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-613-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01** correspondiente al periodo comprendido entre el **23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Habana se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.632200 Longitud -74.783800 5.632200

Punto Final: Latitud 5.038542 Longitud -75.645228

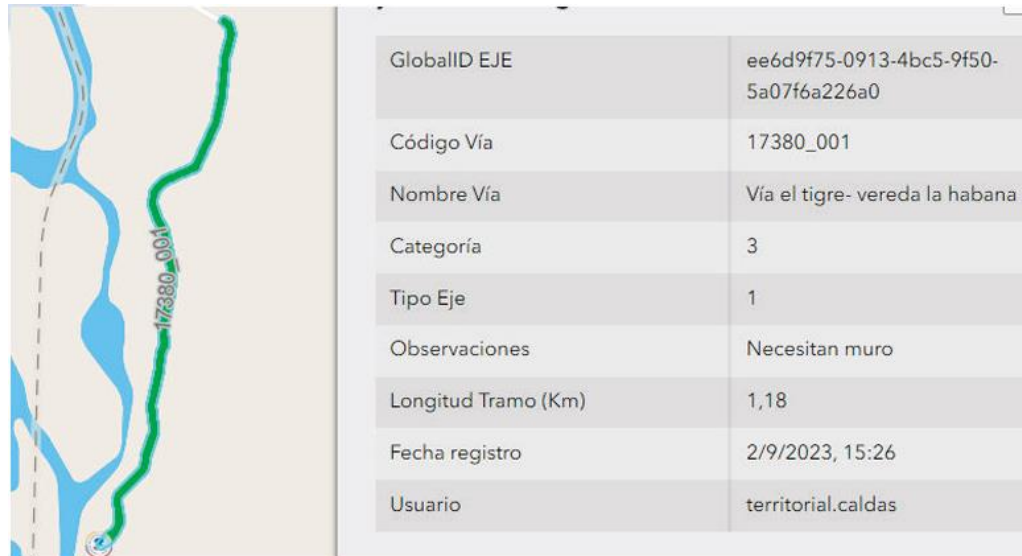


Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Habana

Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA HABANA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Directamente se afecta el municipio de la Dorada en el departamento de Caldas, el cual se compone el 10% de población rural, y este tipo de obras crean beneficios de movilidad, transitabilidad, en general mejora las condiciones actuales de comunicación entre veredas, principalmente al ejecutar placas huellas y obras complementarias, que garanticen mayor tiempo de obras realizadas con calidad.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta vía.

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000

Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Habana.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La atarraya, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3980-2023 que tiene por objeto **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Habana a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL**.

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:

“La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01




central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.

Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

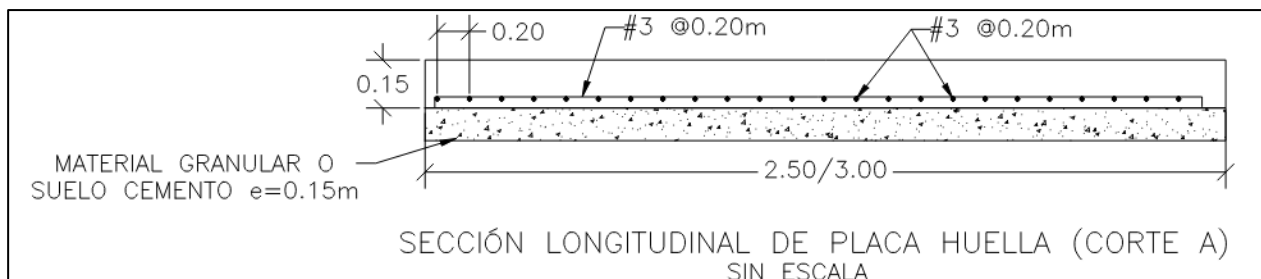

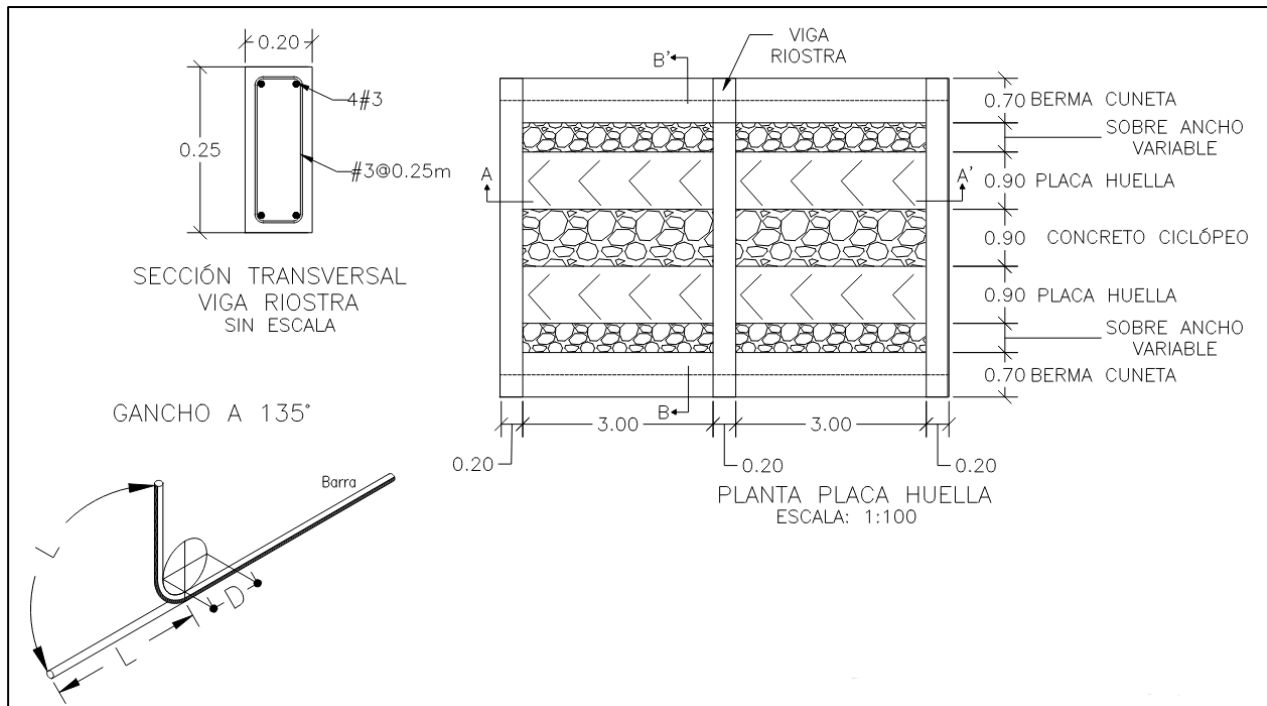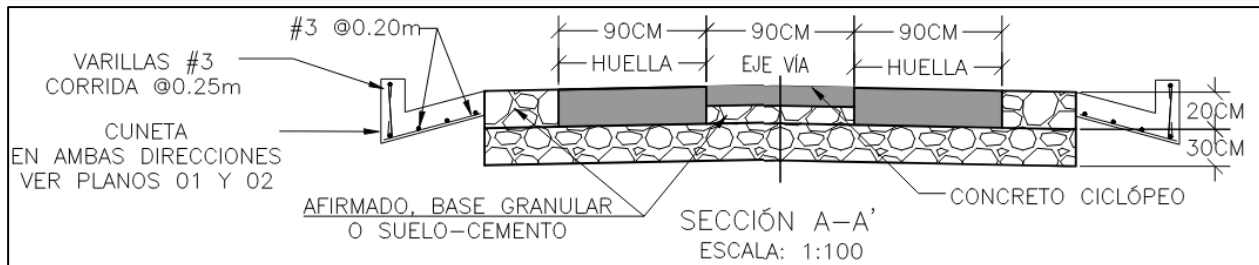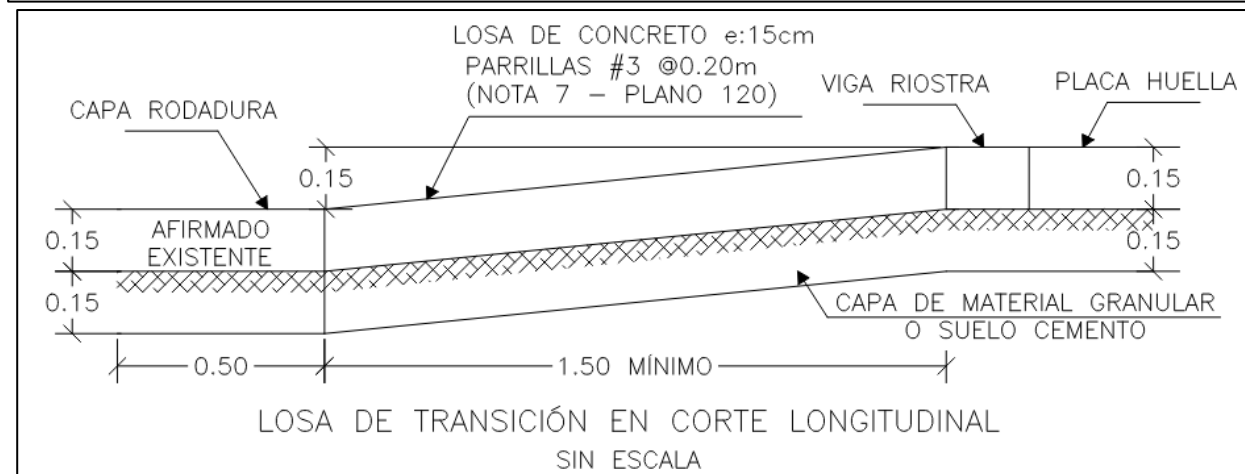

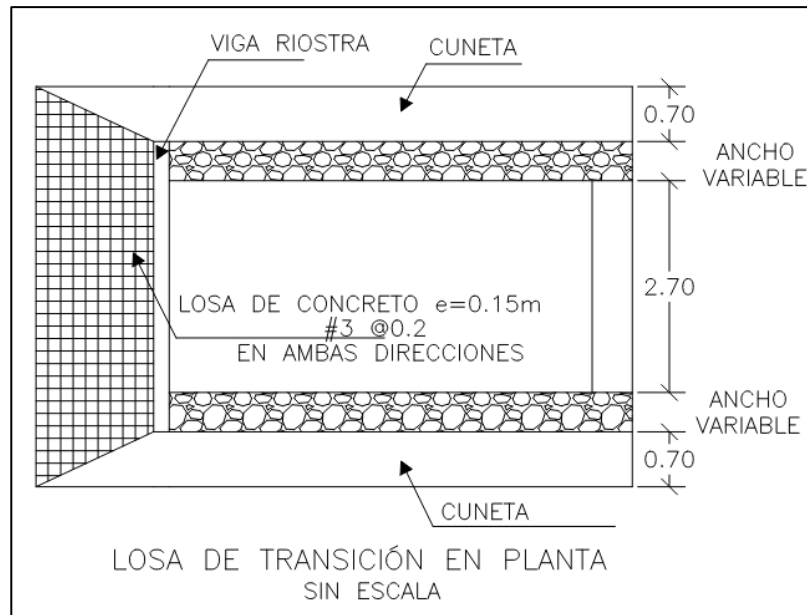

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3980 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA
NIT:	810.005.741-0
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	1180 metros lineales
Valor inicial:	\$ 200.765.816,00
Adiciones:	\$0,00
Valor total	\$ 200.765.816,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorrogas 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES**

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, el conveniente no inicio actividades de obra puesto no se han realizado las actividades preliminares como son la aprobación de las hojas de vida del personal, contratación de personal, levantamiento topográfico y ensayo CBR, se solicitó por parte del conveniente una prórroga la cual fue aprobada por el Invias.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades constructivas, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento ambiental.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, no se realizaron actividades de socialización, por lo que no fue necesario realizar el seguimiento de la gestión social.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- Se realizará la revisión de las hojas de vida que remita la JAC con el personal requerido como son maestro, residente y contador.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**4.1. INFORME SEMANAL**

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria N° 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

11. Informe semanal 01 - 23 nov al 30 nov 2023
12. Informe semanal 02 - 30 nov al 07 dic 2023
13. Informe semanal 03 - 07 nov al 14 dic 2023
14. Informe semanal 04 - 14 nov al 21 dic 2023
15. Informe semanal 05 - 21 nov al 28 dic 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:	
		FECHA:	(Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS
		SEMANA No.:	1 del 23/11/2023 al 30/11/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		Santiago Hernández Rendón	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.	
CONVENIO No. 3980- 2023		CONTRATO No. 4297-2023	
FECHA DE INICIO: 23/11/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	
VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00	
VALOR ADICIONES: \$		VALOR ADICIONES: \$	
VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00	
		VALOR ANTICIPO: \$	
		VALOR AMORTIZADO: \$	
		SALDO POR AMORTIZAR: \$	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
<div><div><div>CONVENIO</div><div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</div><div>\$ 200.765.816,00</div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</div><div>\$ 1.740.306,00</div><div>0,87%</div></div><div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div></div><div></div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div>\$ -</div><div>%</div></div><div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306</div><div></div></div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ 79.541.151,00</div><div>100%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ 6.118.550,08</div><div>7,69%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div></div><div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div></div><div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div></div><div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$ -</div></div><div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div></div></div><div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div><div></div></div></div></div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO: VERSION: PÁGINA:																																																																																																																																													
		FECHA:	(Día / Mes / Año)																																																																																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																															
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS																																																																																																																																												
SEMANA No.: 2 del 30/11/2023 al 7/12/2023		Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																																																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																															
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																															
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																																																																																																													
CONVENIO No. 3980- 2023		CONTRATO No. 4297-2023																																																																																																																																													
FECHA DE INICIO: 23/11/2023		FECHA DE INICIO: 23/11/2023																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023																																																																																																																																													
VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																													
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																													
VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																																																																																																													
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																													
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																													
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																																													
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																																																																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																																																																																																													
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="4">CONVENIO</td><td colspan="4">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200.765.816,00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>79.541.151,00</td><td>100%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>6.118.550,08</td><td>7,69%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>1.740.306,00</td><td>0,87%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306</td><td colspan="4">En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</td></tr></table>				CONVENIO				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200.765.816,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	79.541.151,00	100%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	6.118.550,08	7,69%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			0,00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.740.306,00	0,87%					(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%	PERIODO FACTURADO:				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%	VALOR FACTURA: \$ -				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%					INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%					Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306				En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																															
CONVENIO				INTERVENTORIA																																																																																																																																											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200.765.816,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	79.541.151,00	100%																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			0,00%																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	6.118.550,08	7,69%																																																																																																																																								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			0,00%																																																																																																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.740.306,00	0,87%																																																																																																																																												
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%	PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%	VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%																																																																																																																																												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%																																																																																																																																												
Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306				En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																											
				Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea																																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																															
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																															
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada/ Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="2">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">+</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12">* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</td></tr><tr><td colspan="12">Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="12">TRAMO Y/O SECTOR (n):</td></tr></table>				Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada/ Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	+			Prog											Ejec									+			Prog											Ejec									+			Prog											Ejec									* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico												TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:												TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada/ Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																				
+			Prog																																																																																																																																												
			Ejec																																																																																																																																												
+			Prog																																																																																																																																												
			Ejec																																																																																																																																												
+			Prog																																																																																																																																												
			Ejec																																																																																																																																												
* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																															
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																																																																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																															
ESTADO: OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																																																																																																															
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1																																																																																																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1																																																																																																																																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0																																																																																																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																																																																																																															
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																															
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza visita el día 05/12/2023 a la vereda La atarraya con el fin de identificar el punto de intervención Se solicita a la JAC se adelanten el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																																																																																																															
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																															
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																																																																																																															
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																															
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha																																																																																																																																															
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																																																																																															
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																															
N/A																																																																																																																																															
N/A																																																																																																																																															
N/A																																																																																																																																															
Indicar localización y actividad																																																																																																																																															
Indicar localización y actividad																																																																																																																																															
Indicar localización y actividad																																																																																																																																															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																																																															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																																																																																															
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																																																																																															
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades																																																																																																																																															
Firma: Juan Carlos Sanabria																																																																																																																																															
Nombre: Juan Carlos Sanabria																																																																																																																																															
Matrícula Profesional No.: 25202-37430																																																																																																																																															
Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del RMMS.																																																																																																																																															
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Intervento y Dirección Territorial.																																																																																																																																															



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO																																																																																																																									
			VERSION																																																																																																																									
			PAGINA																																																																																																																									
			FECHA																																																																																																																									
(Día / Mes / Año)																																																																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	SEMANA No.: 3 del 7/12/2023 al 14/12/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																												
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																												
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																																																																																												
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																												
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		PROYECTOS SANABRIA SAS																																																																																																																									
CONVENIO No.	3980-2023	VALOR INICIAL:	\$	200.765.816,00																																																																																																																								
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	200.765.816,00																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																												
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																																																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.765.816,00																																																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																											
	SALDO DE VIGENCIA	\$	200.765.816,00																																																																																																																									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	79.541.151,00																																																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-																																																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$	79.541.151,00																																																																																																																									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																												
<div><div><div>CONVENIO</div><div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</div><div>\$</div><div>200.765.816,00</div><div></div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</div><div>\$</div><div>1.740.306,00</div><div>0,87%</div></div><div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div>\$</div><div>-</div><div>%</div></div></div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306</div></div> <tr><td colspan="5"><div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$</div><div>79.541.151,00</div><div>100%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$</div><div>6.118.550,08</div><div>7,69%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div><div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div></div><div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div></div><div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$</div><div>-</div></div></div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div></td></tr> <tr><td colspan="5">III. AVANCE FÍSICO</td></tr> <tr><td colspan="5">Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %</td></tr> <tr><td colspan="5">Meta Física Ejecutada %</td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></td></tr> <tr><td colspan="5">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr> <tr><td colspan="5"><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></td></tr> <tr><td colspan="5">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div><div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div></div><div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div><div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div></td></tr>					<div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$</div><div>79.541.151,00</div><div>100%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$</div><div>6.118.550,08</div><div>7,69%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div><div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div></div><div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div></div><div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$</div><div>-</div></div></div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div>					III. AVANCE FÍSICO					Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					Meta Física Ejecutada %					<div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad													Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						MAQUINARIA Y EQUIPO					<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>					Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible													Total			IV. GESTIÓN AMBIENTAL					<div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div><div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div></div> <div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div> <div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div>				
<div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$</div><div>79.541.151,00</div><div>100%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$</div><div>6.118.550,08</div><div>7,69%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div></div><div></div><div>0,00%</div></div><div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div><div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div></div><div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div></div><div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$</div><div>-</div></div></div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div>																																																																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																												
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																												
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																												
<div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad													Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec																																																																				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																										
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																							
Prog																																																																																																																												
Ejec																																																																																																																												
Prog																																																																																																																												
Ejec																																																																																																																												
Prog																																																																																																																												
Ejec																																																																																																																												
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																												
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>					Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible													Total																																																																																																								
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																										
Total																																																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																												
<div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div><div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div><div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div></div> <div><div>UBICACIÓN:</div><div>N/A</div></div> <div><div>PERMISO MINERO:</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>LICENCIA AMBIENTAL:</div><div>SI</div><div>NO</div></div>																																																																																																																												

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		COIGO																																																							
			VERSION																																																							
			PAGINA																																																							
			FECHA:																																																							
(Día / Mes / Año)																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																										
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		SEMANA No.: 4 del 14/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																										
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																										
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																										
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																										
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: INTEGRANTES:																																																								
CONVENIO No. 3980- 2023 VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00		CONTRATO No. 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																								
FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 79.541.151,00																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																								
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																								
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																										
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																								
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																										
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.765.816,00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.740.306,00 0,87%</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %</div> <div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las pólizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306</div>																																																										
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 79.541.151,00 100%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 6.118.550,08 7,69%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0,00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div> <div>Na. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div> <div>PERIODO FACTURADO:</div> <div>VALOR FACTURA: \$ -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div>																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																										
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																										
Meta Física Ejecutada %																																																										
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad										Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																								
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																					
Prog																																																										
Ejec																																																										
Prog																																																										
Ejec																																																										
Prog																																																										
Ejec																																																										
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																										
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>					Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible													Total																																						
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																								
Total																																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																										
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																								
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																																																								
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																								
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																								
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																								
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																								
		VERTIENTOS: SI NO N/A																																																								
		EMISIONES: SI NO N/A																																																								
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																								
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																										
ESTADO:		OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																								
V. GESTIÓN SOCIAL																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0		OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0																																																								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0		ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: 0																																																								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																								
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																										
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																										
Se continúa con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realizó asiste a reunión programada por la supervisión de Inviás el día 11/12/2023 en la oficina principal Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																										
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																										
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																										
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																										
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
<div>FOTO 1</div> <div>FOTO 2</div> <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div> <div>Indicar localización y actividad</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																										
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES																																																										
POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																										
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																										
FIRMA																																																										
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA																																																										
Matrícula Profesional No.: 25082-37430																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría, Actos de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO																																																										
			VERSION																																																										
			PAGINA																																																										
			FECHA	(Dia / Mes / Año)																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																													
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																													
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	SEMANA No.: 5 del 23/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Santiago Hernández Rendón GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN ELODEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																													
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																													
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																													
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																													
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.																																																													
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA		INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.																																																											
CONVENIO No:	3980- 2023	VALOR INICIAL:	\$ 200.765.816,00	CONTRATO No: 4297-2023 VALOR INICIAL: \$ 79.541.151,00																																																									
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO: 23/11/2023 VALOR ADICIONES: \$ 36.326.990,00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 115.968.149,00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																									
				VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																									
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																													
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023																																																											
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.765.816,00																																																											
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																											
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 79.541.151,00																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																													
<div><div><div>CONVENIO</div><div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</div><div>\$ 200.765.816,00</div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</div><div>\$ - %</div></div><div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div><div>\$ - %</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</div><div>\$ - %</div></div><div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</div><div>\$ 1.740.306,00 0,87%</div></div><div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div></div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ - %</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div>\$ - %</div></div><div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>\$ - %</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ - %</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div>\$ - %</div></div><div><div>Observaciones: A la fecha no se ha entregado por parte de la junta el correspondiente cronograma de obra, a la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de \$ 1.740.306</div><div></div></div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div><div>\$ 115.968.149,00 100%</div></div><div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div><div>0,00%</div></div><div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div><div>\$ 6.118.550,08 5,28%</div></div><div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div><div>0,00%</div></div><div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div><div>SI NO</div><div>x</div></div></div><div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div></div></div><div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div></div></div><div><div>VALOR FACTURA:</div><div>\$ -</div></div><div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div></div></div><div><div>Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajería instantánea</div><div></div></div></div></div>																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																													
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																													
Meta Física Ejecutada %																																																													
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div></div></div><div><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div><div></div></div></div> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1:</div><div></div></div> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div><div></div></div> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div></div></div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad													Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																											
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																								
Prog																																																													
Ejec																																																													
Prog																																																													
Ejec																																																													
Prog																																																													
Ejec																																																													
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																													
FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.																																																													
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	N/A																																																									
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																										
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO																																																										
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO																																																										
OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra																																																													
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																													
ESTADO:																																																													
OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades																																																													
V. GESTIÓN SOCIAL																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0 1																																																													
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 1																																																													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0																																																													
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 0 0																																																													
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1																																																													
OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, aun no se han programado la socialización.																																																													
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																													
Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad. Se realiza asiste a reunion programada por la supervision de Invias el dia 11/12/2023en la oficina principal Se solicita a la JAC se adelante el proceso de las cotizaciones de los laboratorios para toma de muestras CBR, Topografía, materiales, y demás.																																																													
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																													
Verificación de las cotizaciones que se deben entregar por la JAC																																																													
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																													
El proyecto no cuenta con cronograma aprobado por la interventoría a la fecha																																																													
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																													
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																													
N/A																																																													
N/A																																																													
N/A																																																													
Indicar localización y actividad																																																													
Indicar localización y actividad																																																													
Indicar localización y actividad																																																													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																													
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																													
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades Se asiste a reuniones programadas por la supervision																																																													
FIRMA: JUAN CARLOS SANABRIA																																																													
NOMBRE: 25202-37430																																																													
Matrícula Profesional No. 25202-37430																																																													
Original: Informe mensual de Interventoría, Actas de Gestión del RVOAS.																																																													
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.																																																													

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se ha dado inicio a las obras, por lo tanto, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al convenio, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del convenio se adjunta la informacion continuación

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA			

	FECHA			
	(Día) (Mes) (Año)			

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 200.765.816,00

VALOR ACUMULADO: \$ 200.765.816,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.153.163	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	19	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.291	N/A	N/A	N/A	N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.229.745	19	10	2023	31	12	2026
			31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000	Desde			Hasta		
Otros	N/A	N/A	19	10	2023	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 0/01/1900

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 0 SUSPENSIÓN No.: 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.185.826
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.046.457
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.278.739

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	10	2023	1	3	2025
N/A	N/A	N/A	N/A		
19	10	2023	30	4	2027
30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 0 SUSPENSIÓN No.: 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	\$ 232.000.000
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	10	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobación de pólizas.

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron reuniones.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	\$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 01**5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR**

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- El 05 de diciembre solicito por correo electrónico el envío de las hojas de vida de los profesionales de la JAC.
- El 15 de diciembre se realizó la solicitud de adición al contrato de interventoria.
- El 19 de diciembre se remitió oficio corregido para la solicitud de prórroga al contrato de interventoria.
- Se realizo el acompañamiento continuo con la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifican las solicitudes de prórroga de los convenios y el contrato de interventoría los cuales tenían fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2023, prorrogando al 30 de abril del 2024.
- No se ha realizado la aprobación de personal puesto que no se han remitido las correspondientes hojas de vida.

El programado para este periodo del convenio es del 0,00%, puesto que no se ha recibido un cronograma para aprobación.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Durante este periodo no se relacionan equipos o vehículos

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se relaciona personal a la Interventoria.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se realizaron actas de cobro parcial

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se realizó la aprobación de la prórroga 01 al contrato de interventoria 4297-2023, por lo tanto, se identifica un cambio en las pólizas del contrato se adjunta la informacion continuación:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
 PLAZO INICIAL: 3 MESES
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 79.541.150,93
 VALOR ACUMULADO: \$ 115.868.149,00
 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 7.954.115,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.908.230,2
Calidad del servicio	30%	\$ 23.862.345,3

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	11	2023	30	6	2024
-	-	-	-	-	-
8	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.586.814,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.173.629,6
Calidad del servicio	30%	\$ 34.760.444,4

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año			
8	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:
 Nombre: Juan Carlos Sanabria
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
 Nombre: Supervisor Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPIEDAD ECONOMICA ATRIBUIDA										CONDICIONES ACTA ANTERIOR										CONDICIONES ACTA ACTUAL									
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OTRO	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Miles de Pesos)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Miles de Pesos)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Miles de Pesos)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Miles de Pesos)	Valor Total (\$)											
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																													
PERSONAL PROFESIONAL																													
		Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00	1,00	\$ 5.800.000,00																								
		Asesor(a) Planeación e Interventoría	\$ 2.800.000,00	3,00	\$ 7.800.000,00																								
		Asesor(a) Ambiental	\$ 2.800.000,00	3,00	\$ 7.800.000,00																								
		Asesor(a) Social	\$ 2.800.000,00	3,00	\$ 7.800.000,00																								
PUNTO ADICIONAL DE ESPECIALISTAS (se anexo este listado)																													
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
		Asesor(a) en el área de	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00																								
PERSONAL TECNICO																													
		Asesor(a)	\$ 1.200.000,00	6,00	\$ 7.200.000,00																								
		Asesor(a) SST	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00																								
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																													
FACTOR MULTIPLICADOR																													
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																													
OTROS COSTOS DIRECTOS																													
MATERIALES																													
		Material de construcción y mantenimiento	\$ 1.400.000,00	10,0	\$ 1.400.000,00																								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																													
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 200.000,00	12,0	\$ 2.400.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 200.000,00	12,0	\$ 2.400.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 200.000,00	12,0	\$ 2.400.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 200.000,00	12,0	\$ 2.400.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 200.000,00	12,0	\$ 2.400.000,00																								
OTROS COSTOS																													
		Transporte	\$ 200.000,00	2,0	\$ 400.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 400.000,00	3,0	\$ 1.200.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 400.000,00	3,0	\$ 1.200.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 400.000,00	3,0	\$ 1.200.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 400.000,00	3,0	\$ 1.200.000,00																								
		Alquiler de equipo y oficina	\$ 400.000,00	3,0	\$ 1.200.000,00																								
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS																													
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS																													
FACTOR = 10%																													
COSTO TOTAL																													

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no ha remitido las hojas de vida para aprobación del personal lo cual ha retrasado el inicio de las obras.
- Se recomienda realizar el desembolso de los recursos a la Junta de acción Comunal lo más pronto posible para que una vez aprobadas las hojas de vida del personal se pueda iniciar con las correspondientes actividades preliminares a iniciar la obra, como son el levantamiento topográfico, ensayos de CBR, la contratación de exámenes médicos y contratación de personal profesional para el desarrollo del cronograma de actividades y demás actividades técnicas.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

	
Estado de la via a fecha 05/12/2023	Estado de la via a fecha 05/12/2023

Registro fotográfico – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Habana.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra



Ing. Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Elaboro: Ing. Paula A. Ramirez
