

INFORME FINAL DE OBRA



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA**

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

INFORME

LIQUIDACION

12 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 334 DE 2024

REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE”.

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7
R/L: LUIS ABRAHÁN BOHÓRQUEZ BARRETO
C.C. 74.810.213 de Sabanalarga
Dirección: Barrio Paraiso, Casa No. 37
No de contacto: 3112870979
Email: lbohorquez33@hotmail.com
Sabanalarga -Casanare



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

INTRODUCCION

Esta obra es adjudicada por la empresa **V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA** cuyo representante legal es el Ing. LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO, luego de un proceso de selección y de cumplir con la experiencia exigida por la entidad contratante, el contrato tiene un plazo de QUINCE (15) días, se realizará dentro de condiciones normales climatológicas.

Con la ejecución de este proyecto se pretende consolidar el sentido de pertenencia de toda la comunidad, que el ambiente de su entorno sea acogedor, armónico para los turistas y personas locales. Este embellecimiento es muy importante para el centro poblado de Sabanalarga.

Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras.

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 52.030.330,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 00
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 52.030.330,00
CONTRATISTA:	V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
CORREO ELECTRONICO:	lbohorquez33@hotmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A.
REINICIO:	N/A.

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas



INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL	QUINCE (15) DIAS

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	SABANALARGA	VEREDA:	N.A
CORREGIMIENTO:	N.A.	BARRIO:	N.A.
COORDENADAS	4°85'44.45" N	A	73°38'07.88" O

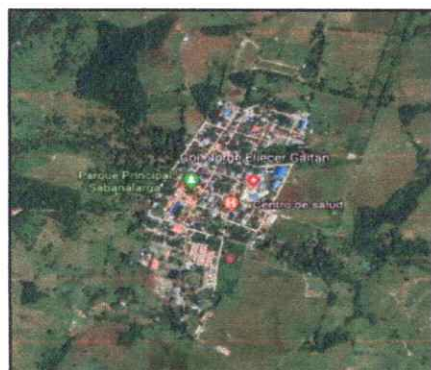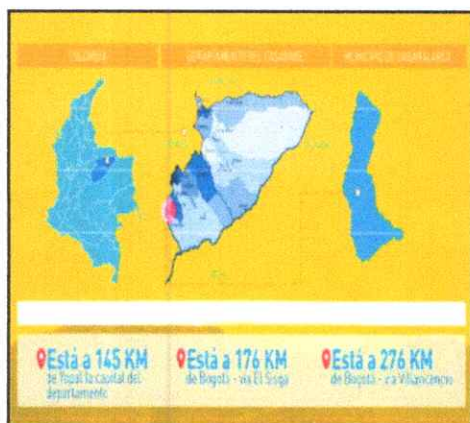



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas del contrato según acta de recibo.

PRESUPUESTO						
ITEM	ESPECIFICACIONES GENERALES	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPONENTE VIAL					
1.1	7.439	Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m	ml	6490.00	\$ 2,168.00	\$ 14,070,320.00
1.2	7.440	Pintura vinilo exterior superficie rustica (1 mano)	ml	6490.00	\$ 5,849.00	\$ 37,960,010.00
SUB TOTAL						\$ 52,030,330.00
VALOR TOTAL						\$ 52,030,330.00
DESGLOSE DEL AIU OFRECIDO						
Administracion				A	24%	
Imprevistos				I	1%	
Utilidad				U	5%	
TOTAL, AIU					30%	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU						\$ 52,030,330.00



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas


INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

VALOR DEL PROYECTO

RESUMEN PRESUPUESTAL

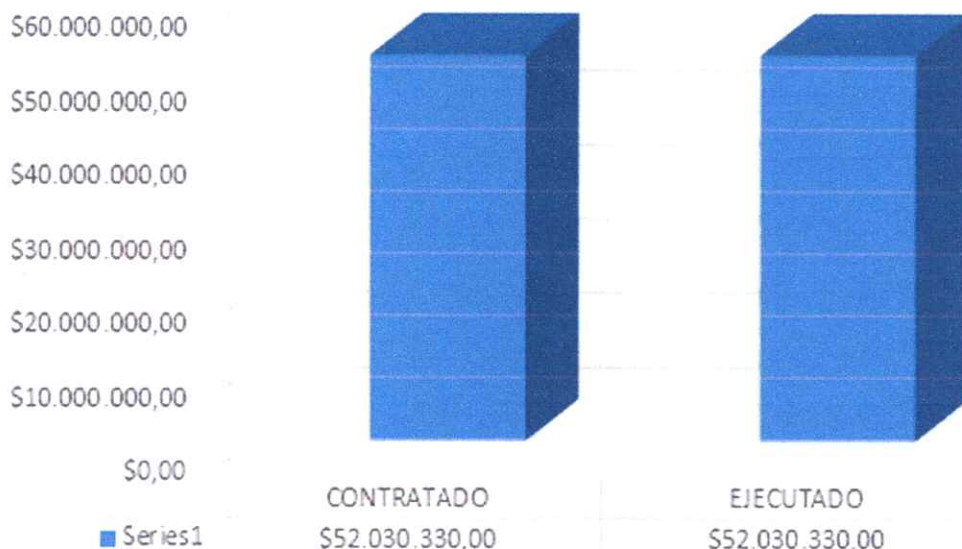

AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

El contratista V&G CONSTRUCCIONES CIVILES R/L LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO conto con el siguiente personal en la obra para el desarrollo de las actividades correspondiente al contrato:

No	NOMBRE DE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	INGRESO	RETIRO
1	BARRETO EDUIN	AYUDANTE	79838234	12/12/24	25/12/24

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

2	BARRETO JUAN ANTONIO	AYUDANTE	74810366	12/12/24	25/12/24
3	BOHORQUEZ BARRETO LUIS ABRAHAM	RESIDENTE	74810213	01/12/24	30/12/24
5	BOHORQUEZ CUESTA WILSON URIEL	AYUDANTE	74810083	12/12/24	25/12/24
6	DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE	74810361	12/12/24	25/12/24
7	OLMOS ROMERO JUAN FERNANDO	AYUDANTE	74810558	12/12/24	25/12/24

INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

Recordando que el presente contrato se lleva a cabo en el municipio de Sabanalarga que requiere mejorar las condiciones de la infraestructura vial urbana, que conforman el ámbito del espacio público del municipio, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran pavimentada en su mayoría la malla vial urbana. Este embellecimiento se realiza a través de la limpieza y pintura de sardineles y/o bordillos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

PLANEACION: Se definieron las metas, se fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazaron planes para integrar y coordinar las actividades con el maestro general de obra.

ORGANIZACIÓN: Consistió en determinar que tareas hay que hacer, quien las hace, como se hacen, como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones.

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

DIRECCION: Se motivaron a los oficiales, influir en los obreros y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados.

COORDINACION: Consiste en unificar los esfuerzos organizacionales (Alcaldía-contratista-contratista suministro material pétreo-mano de obra).

CONTROL: Se vigilo el desempeño de los oficiales, compararlo con las especificaciones de construcción dadas y emprender las acciones correctivas que hicieron falta.

1. AREA TECNICA

ACTIVIDADES DE OBRA-PROCESO CONSTRUCTIVO

1. EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

1.1 Limpieza de franja de trabajo

Unidad de medida: metro Lineal (mL)

Descripción: Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para realizar la limpieza de la franja de trabajo en bordillos y/o sardineles existentes, conforme a lo estipulado en las memorias de cantidades y las ubicaciones indicadas, a través del uso de la hidro lavadora, el lavado a presión de cada una de las secciones a intervenir, esta actividad debe garantizar el retiro de las suciedades y la franja totalmente limpia para posterior la aplicación de la pintura.

Medida y forma de pago: La unidad de medida de pago será el número de metro Lineal (ML) de lavado del piso y bordillo, debidamente ejecutado y aprobado por el supervisor. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

1.2 Pintura vinilo exterior superficie rustica 1 mano

Unidad de medida: metro Lineal (mL)

Descripción: Este ítem se refiere al suministro y aplicación de pintura vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar, de color blanco, en las secciones de bordillo y/o sardineles existentes, conforme a lo estipulado en las memorias de calculo y las ubicaciones indicadas, se deberá garantizar la homogeneidad de la pintura a lo largo de los ramos intervenidos, así como la limpieza de las franjas adyacentes que por alguna razón resulten manchadas de pintura.

Medida y forma de pago: La unidad de medida de pago será por metro Lineal (ml) de una mano de pintura aplicada en lo indicado por el supervisor y recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	6
TORRENTA	0

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :	334 DE 2024
-----------------------	--------------------

LLUVIOSO	0
SOLEADO	6

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Anexo: FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

OBSERVACIONES:

El presente informe comprende las actividades realizadas desde el periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 26 diciembre de 2024, en el cual se dio alcance al objeto contractual con la **REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE**".

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación, se presenta una descripción del proceso constructivo de cada uno de los ítems que se realizaron durante el presente periodo del informe.

EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ML
Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m		



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para realizar la limpieza de la franja de trabajo en bordillos y/o sardineles existentes, conforme a lo estipulado en las memorias de cantidades y las ubicaciones indicadas, a través del uso de la hidro lavadora, el lavado a presión de cada una de las secciones a intervenir, esta actividad debe garantizar el retiro de las suciedades y la franja totalmente limpia para posterior la aplicación de la pintura.

EJECUCIÓN

Esta limpieza se realiza con una planta eléctrica y una hidro lavadora en las franjas indicadas para realizar la pintura.

MANO DE OBRA

Cuadrilla AA (Albañería)

MATERIALES

EQUIPO

- Herramienta Menor 10% M.O. AA.

FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el número de metro Lineal (ML) de lavado del piso y bordillo, debidamente ejecutado y aprobado por el supervisor. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte

Pintura vinilo exterior superficie rustica 1 mano

**UNIDAD DE
MEDIDA ML**

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la aplicación de vinilo sobre muros exteriores tipo Koraza de Pintuco o similar, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría

EJECUCIÓN

El producto se tiene que aplicar sobre la superficie limpie, dejándolo actuar durante 5 a 10 minutos para que la pintura aplicada se adhiera a los bordillos y tenga su resistencia requerida

MANO DE OBRA

Cuadrilla AA (Albañilería)

MATERIALES

EQUIPO



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA**

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

- Herramienta menor 10% M.O. AA.
- Cuadrilla cc-1(pintura)

FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro Lineal (ml) de una mano de pintura aplicada en lo indicado por el supervisor y recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
LUIS ABRAHAM BARRETO BOHORQUEZ	ING RESIDENTE DE OBRA	100%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla de pago mes de DICIEMBRE

9479024140

Acorde con los lineamientos de la secretaria de obras del municipio de Sabanalarga, quien actúa como supervisor del proyecto, se realiza mes a mes el acta de control y seguimiento a la seguridad social y aportes parafiscales, las cuales se adjuntan a continuación.



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Código: F-CT-101 Versión: 1 Fecha Actualización: 09 / 08 / 2021 Página: __ de __
--	---	---

CONTRATO N°	334 DE 2024	PROYECTO N°	N/A
-------------	-------------	-------------	-----

OBJETO DEL PROYECTO:	REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
CONTRATISTA:	V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT:	900.021.702-7
INTERVENTORÍA:	N/A
SUPERVISOR:	GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION:	ING. JUAN DAVID RAMIREZ MALAYER

NUMERO DE PLANILLA:		9479024140				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				12 de diciembre de 2024 a *****			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotiza- dos	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	Caja de compensa- ción	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesiona- les				
LUIS ABRAHAM BOHORGUEZ BARRETO	RESIDENTE	74.810.213	\$ 1.300.000,00	30	CAPRESOCA	\$ 52.000,00	PROTECCION	*****	\$ 90.500,00			\$ 52.000,00	\$ 402.500,00
BARRETO JUAN ANTONIO	AYUDANTE	74.810.366	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLFONDOS	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
BOHORGUEZ CUESTA WILSON URIEL	AYUDANTE	74.810.083	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLFONDOS	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE	74.810.361	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLPENSIONES	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA	AYUDANTE	23.623.475	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PROTECCION	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
OLMOS ROMERO JUAN FERNANDO	AYUDANTE	74.810.558	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PORVENIR	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
BARRETO EDUIN	AYUDANTE	79.838.234	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PORVENIR	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00
Total												\$ 1.530.500,00	



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	Código: F-CT-110 Versión: 1 Fecha Actualización: 09 / 08 / 2021 Página: __ de __
--	--	---

CONTRATO N°

334 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
CONTRATISTA:	Y&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT:	900.021.702-7
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR	GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION	ING. JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 12 de diciembre de 2024 - 25 de diciembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacio n	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACIÓN							Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVE L	Caja de Compensación	
LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO	RESIDENTE	74.810.213	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 2.350.300,00	CAPRESOCA		PROTECCION		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
BARRETO JUAN ANTONIO	AYUDANTE	74.810.346	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLFONDOS		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
BOHORQUEZ CUESTA WILSON URIEL	AYUDANTE	74.810.003	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLFONDOS		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE	74.810.361	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLPENSIONES		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA	AYUDANTE	23.623.475	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PROTECCION		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
OLMOS ROMERO JUAN FERNANDO	AYUDANTE	74.810.559	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PORVENIR		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00
BARRETO EDUIN	AYUDANTE	79.838.234	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PORVENIR		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		COMFACASANARE	\$ 1.300.000,00

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	04
Empleos directos generados:	1
Empleos indirectos generados:	1

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	19
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	19
Género	Femenino	0
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		19

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

ACTAS				
ACTA No.	FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO No.
1	12 DE DICIEMBRE DE 2024	QUINCE (15) DIAS	INICIO DE OBRA	
2	26 DE DICIEMBRE DE 2024	QUINCE (15) DIAS	TERMINACION	

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :	334 DE 2024
-----------------------	--------------------

PRORROGAS, SUSPENSIÓN, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO				
ACTA No.	FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO No.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN				
ADICIONAL No.	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN	FOLIO No.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN				
ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ACTUALIZADO	JUSTIFICACIÓN	FOLIO No.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :	334 DE 2024
-----------------------	--------------------

2. GARANTIAS:

3. ANEXO No. :	0
FECHA DE APROBACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09-12-2024	30-04-2025	\$ 5.203.033,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09-12-2024	31-12-2027	\$ 5.601.516,50
CALIDAD DEL SERVICIO	09-12-2024	30-06-2025	\$ 5.203.033,00

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09-12-2024	31-12-2024	\$ 260.000.000

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE OBRA	CÓDIGO: F-CT-124
		VERSIÓN: 01
		FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021
		RESPONSABLES: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. : 334 DE 2024

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES						

Avance físico ejecutado 100% y avance financiero ejecutado 100%



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
1.1	Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m	100%	100%





ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024





ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01


FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

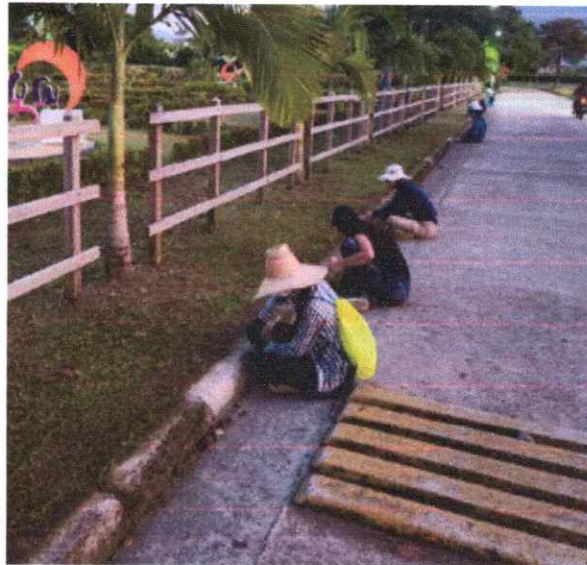

OBSERVACIONES:

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
1.2	Pintura vinilo exterior superficie rustica 1 mano	100%	100%



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01



FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

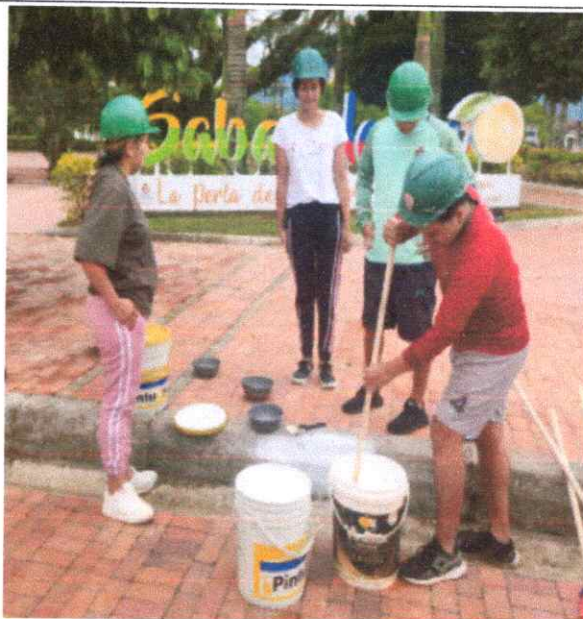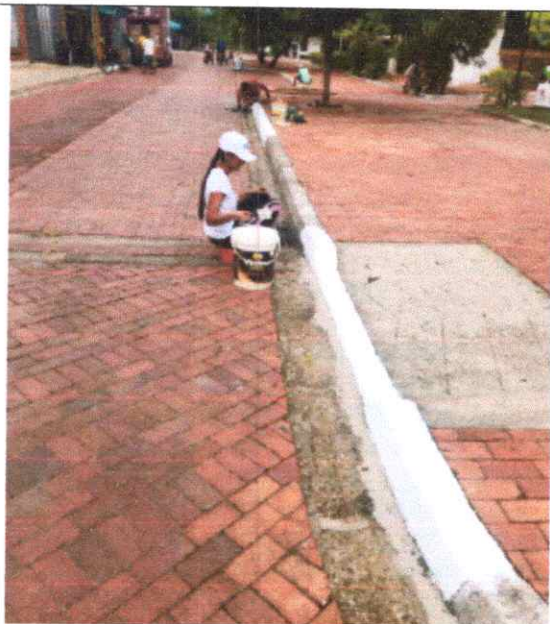



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA**

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024





**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA**

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024





ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024



OBSERVACIONES:



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE OBRA

CÓDIGO: F-CT-124

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 09 / 08 / 2021

RESPONSABLES: Secretaria de
Planeación y Obras Públicas

INFORME FINAL

CONTRATO No. :

334 DE 2024

CONCLUSIONES

Esta actividad con pintura blanca es un proceso fundamental para la señalización y seguridad en las carreteras y vías de tránsito. con la colaboración de los ayudantes contratados se unieron para llevar a cabo esta labor.

Equipados con las herramientas y pintura adecuadas, estos ayudantes se esfuerzan por garantizar que las marcas viales sean precisas y bien definidas. La elección de pintura blanca asegura una alta visibilidad, lo que es esencial para guiar a los conductores de manera segura.

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, (26) días del mes de diciembre de 2024.

Firma

Nombre: LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
R/L V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

Firma

Nombre: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Firma

Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER
Apoyo a la supervisión

MEMORIAS DE OBRA

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Código: F- CT-131
		Versión: 1
		Fecha Actualización: 09 / 08 / 2021
		Página: ____ de ____

CONTRATO N°	334 DE 2024
--------------------	--------------------


FECHA DE INICIO:	12/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2024
OBJETO PROYECTO:	REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE".		
CONTRATISTA :	V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	Liquidación del contrato de Obra Publica 334 de 2024
--------------	--


CAPITULO:	EMBELLECIMIENTO VIAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LIMPIEZA DE FRANJA DE TRABAJO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ANCHO	LARGO	AREA	CANTIDAD
BORDILLOS VIALES				6490
				6490,00
PASAN:				
			SUBTOTAL	6490,00
			TOTAL	6490,00



Firma 
V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
 CONTRATISTA

Firma 
LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
 RESIDENTE DE OBRA

Firma 
 Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER
 APOYO A LA SUPERVISION

Firma 
GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
 SUPERVISOR

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Código: F- CT-131 Versión: 1 Fecha Actualización: 09 / 08 / 2021 Página: ____ de ____

CONTRATO N°	334 DE 2024
--------------------	--------------------

FECHA DE INICIO:	12/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2024
OBJETO PROYECTO:		REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.	
CONTRATISTA :		V&G CONSTRUCCIONES CIVILES	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		N/A	
INTERVENTORIA:		N/A	


ACTA:	Liquidación del contrato de Obra Publica 334 de 2024
--------------	--


CAPITULO:		EMBELLECIMIENTO VIAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
1.2	Pintura vinilo exterior superficie rustica 1 mano	ML	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA				6490,00	6.490,00
PASAN:				SUBTOTAL	6490,00
				TOTAL	6490,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma 
Nombre: R/L LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
CONTRATISTA V&G CONSTRUCCIONES CIVILES

Firma 
Nombre: LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
RESIDENTE DE OBRA

Firma 
Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAYER
APOYO A LA SUPERVISION

Firma 
Nombre: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

PROGRAMACION DE OBRA

1787

REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE".

[illegible]

CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO N°

334 DE 2024

PROYECTO N°

N/A

OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

CONTRATISTA:

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

NIT:

900.021.702-7

INTERVENIENTE:

N/A

SUPERVISOR:

GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ


APOYO A LA SUPERVISION:

ING. JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER

NUMERO DE PLANILLA:		9479024140					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					12 de diciembre de 2024		a		26 de diciembre de 2024	
Nombre personal		Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar			
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales							
LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO		RESIDENTE	74.810.213	\$ 1.300.000,00	30	CAPRESOCA	\$ 52.000,00	PROTECCION	\$ 208.000,00	\$ 90.500,00			\$ 52.000,00	\$ 402.500,00			
BARRETO JUAN ANTONIO		AYUDANTE	74.810.366	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLFONDOS	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
BOHORQUEZ CUESTA WILSON URBEL		AYUDANTE	74.810.083	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLFONDOS	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER		AYUDANTE	74.810.361	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	COLPENSIONE S	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA		AYUDANTE	23.623.475	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PROTECCION	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
OLIVOS ROMERO JUAN FERNANDO		AYUDANTE	74.810.598	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PORVENIR	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
BARRETO EDUIN		AYUDANTE	79.838.234	\$ 606.667,00	14	CAPRESOCA	\$ 24.300,00	PORVENIR	\$ 97.100,00	\$ 42.300,00			\$ 24.300,00	\$ 188.000,00			
Total													\$	1.530.500,00			

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 26-12-24

Firma: 

Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER
PROFESIONAL DE APOYO

Firma: 

Nombre: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ACTA PAGO DE OBRA



Código: F- CT-108
Versión: 2
Fecha Actualización
Página: de


Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No	FECHA	RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR
1271	09 DE DICIEMBRE DE 2024	3.7.24.01.001.30.02.02.05.02	2.000.330,00	\$ 2.000.330,00
1270	09 DE DICIEMBRE DE 2024	3.7.24.01.001.30.02.02.05.01	\$50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
TOTAL				\$ 52.000.330,00

NOTAS


1. El contador del contratista e interventor. Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista V&G CONSTRUCCIONES CIVILES, identificado con el NIT 900 021 702-7, cumple con la cláusula QUINTA (5) forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los períodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 334 de 2024, representado legalmente por LUIS ABRAHAM BOHORQUIZ BARRETO, durante su ejecución, ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados. Si ☐ de fecha NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día:


Firma:
Nombre: V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA


Firma:
Nombre: LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
RESIDENTE DE OBRA

jueves, 26 de diciembre de 2024


Firma:
Nombre: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR


Firma:
Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER
APOYO A LA SUPERVISION

Nota: en la presente acta se debiera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ACTA RELACION PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N°		334 DE 2024
REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE		
CONTRATISTA: V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA 900.021.702-7		
NIT: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ		
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR APOYO A LA SUPERVISION ING. JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER		


PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:																12 de diciembre de 2024	a	25 de diciembre de 2024
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSION	AFILIACION				Ingreso Base de Cotización				
										%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación					
LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO	RESIDENTE	74.810.213	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 2.350.300,00	CAPRESOCA		PROTECCION		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
BARRETO JUAN ANTONIO	AYUDANTE	74.810.366	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLFONDOS		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
BOHORQUEZ CUESTA WILSON URIEL	AYUDANTE	74.810.083	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLFONDOS		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
DAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE	74.810.361	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		COLPENSIONES		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA	AYUDANTE	23.623.475	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PROTECCION		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
OLIVOS ROMERO JUAN FERNANDO	AYUDANTE	74.810.558	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PORVENIR		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				
BARRETO EDUIN	AYUDANTE	79.838.234	INGRESO	12/12/2024	25/12/2024	\$ 1.300.000,00	CAPRESOCA		PORVENIR		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		COMIFACASANARE	\$ 1.300.000,00				

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; Incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los



Firma:
Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER
PROFESIONAL CONTRATADO



Firma:
Nombre: LUIS A. BOHORQUEZ BARRETO
RESIDENTE DE OBRA



Firma:
Nombre: GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por el apoyo a la Supervisión.

Nota: Los formales deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

Sabanalarga Cas, diciembre 23 de 2024


Doctora
SANDRA LORENA RANGEL SANTISTEBAN
Personera Municipal
Sabanalarga Casanare

REFERENCIA: Solicitud de Paz y Salvo laboral

Estimado Doctora:

De acuerdo al asunto de referencia me permito solicitar el documento paz y salvo laboral de la empresa V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA CON NIT, 900.021.702-7 del contrato de obra pública 334 de 2024 que tiene por objeto: para **"REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"**. Ya que no tengo ninguna obligación pendiente derivado de este contrato, que tubo de fecha de inicio el día 12/12/2024 y terminación el día 23/12/2024.

Lo anterior por solicitud del proceso de liquidación del contrato, agradezco su colaboración.


LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
Representante Legal de V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.



Personería Municipal
de Sabanalarga Casanare

CERTIFICACIÓN

Código: F- PM -003
Versión: 6
Fecha Actualización: 08-07-2024

CERTIFICACIÓN No. 086

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

CERTIFICA:

Que en la Personería Municipal de Sabanalarga Casanare, a la fecha no se han reportado quejas o reclamaciones según el contrato de Obra No. 334 de 2024, de 21 de octubre de 2023, cuyo objeto es **"REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"**, ejecutado por la empresa **V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA – NIT: 900.021.702 - 7**.

La presente certificación se expide en el Despacho de la Personería Municipal, a solicitud del interesado, a los veintiseis (26) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).


SANDRA LORENA RANGEL SANTISTEBAN
Personera Municipal

Revisó y Aprobó: Dra. Sandra Lorena Rangel Santisteban
Digitó: Jhenith Lesmes.
C:\Users\Secretaria\Documents\información 2024\Formatos Codificados\F-PM-003 Certificaciones2024.doc

V&G - Construcciones Civiles Ltda
Nit 900.021.702-7

V&G

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7

CERTIFICA

Que DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER con cedula de ciudadanía 74.810.361 se desempeñó como ayudante de obra en el contrato de Obra 334 de 2024 que tiene por objeto "REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE". con fecha de inicio el 12 de diciembre de 2024 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2024, con un salario de \$ 1.300.000, pagados al término de la obra

Cordialmente,

Francisco Javier Diaz
DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER
C.C 74.810.361

V&G

Sabanalarga - Barrio El Paraíso / Casa # 37
construccionsciviles_ltda@hotmail.com
Cel - 3112870979

V&G - Construcciones Civiles Ltda
Nit 900.021.702-7

V&G

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7

CERTIFICA

Que BARRETO EDUIN con cedula de ciudadanía 79.838.234 se desempeñó como ayudante de obra en el contrato de Obra 334 de 2024 que tiene por objeto "REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE". con fecha de inicio el 12 de diciembre de 2024 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2024, con un salario de \$ 1.300.000, pagados al término de la obra

Cordialmente,

Edwin Barreto
BARRETO EDUIN
C.C 79.838.234

V&G

Sabanalarga - Barrio El Paraíso / Casa # 37
construccionsciviles_ltda@hotmail.com
Cel - 3112870979

V&G - Construcciones Civiles Ltda
Nit 900.021.702-7

V&G

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7

CERTIFICA

Que OLMOS ROMERO JUAN FERNANDO con cedula de ciudadanía 74.810.558 se desempeñó como ayudante de obra en el contrato de Obra 334 de 2024 que tiene por objeto "REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE". con fecha de inicio el 12 de diciembre de 2024 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2024, con un salario de \$ 1.300.000, pagados al término de la obra

Cordialmente,

JUAN OLMOS R
OLMOS ROMERO JUAN FERNANDO
C.C 74.810.558

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7

CERTIFICA

Que GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA con cedula de ciudadanía 23.623.475 se desempeñó como ayudante de obra en el contrato de Obra 334 de 2024 que tiene por objeto "REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE". con fecha de inicio el 12 de diciembre de 2024 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2024, con un salario de \$ 1.300.000, pagados al término de la obra

Cordialmente,


GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA
C.C 23.623.475

V&G - Construcciones Civiles Ltda
Nit 900.021.702-7

V&G

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7

CERTIFICA

Que BARRETO JUAN ANTONIO con cedula de ciudadanía 74.810.366 se desempeñó como ayudante de obra en el contrato de Obra 334 de 2024 que tiene por objeto "REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS BORDILLOS Y/O SARDINELES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE". con fecha de inicio el 12 de diciembre de 2024 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2024, con un salario de \$ 1.300.000, pagados al término de la obra

Cordialmente,


BARRETO JUAN ANTONIO
C.C 74.810.366

Sabanalarga - Barrio El Paraíso / Casa # 37
construccionsciviles_ltda@hotmail.com
Cel - 3112870979

PAGO SENA FIC

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social V Y G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA identificado con el NIT 900021702, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
334 DE 2024	REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE	Sabanalarga	130,076	2024-12	27-DIC-2024	1156052753
		Total	130,076			

Expedido por el SENA, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-30

Generado por : YORLENY CAROLINA ROCHA PINEDA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 189227906 - 339526

SENA, MÁS TRABAJO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122622039	1156052753	27/12/2024

Número de Identificación

900021702

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

7

Departamento

CASANARE

Dirección de Domicilio

KR 07 05 17

Localización

Nacional

Correo electrónico

lbohorquez33@hotmail.com

Regional

Casanare

Número Licencia de Obra

N/A

Nombre Obra

Realizar el embellecimiento de

Fecha Terminación Obra

26/12/2024

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

12000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

V & G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

YOPAL (CASANARE)

Ciudad de Domicilio

SABANALARGA

Teléfono de Contacto

+57,311 2870979

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-085-000000

Número Contrato de Obra

334 DE 2024

Fecha Inicio Obra

12/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

Sabanalarga

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

52030330.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

130076.00

Valor del Pago

130076.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	122622039	1156052753	27/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900021702**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.96.97.166**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado

\$ 130,076.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 130,076.00	COP\$ 130,076.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900201702	7	V Y G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS BOHOREQUEZ	CRA 7 # 5-17	YOPAL - CAGANARE	6249975	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1150537212	9479024140	E	2025/01/03	2024/12/24	BANCOLOMBIA	0	\$1,530,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
1	CC 79838234	BARRETO EDUIN	23001	14		\$606.667	EPSC25	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
2	CC 74810266	BARRETO JUAN ANTONIO	23101	14		\$606.667	EPSC25	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
3	CC 74810213	BOHORQUEZ BARRETO LUIS ALEXANDER	23021	30	\$1.300.000	\$208.000	EP5005	30	\$1.300.000	\$52.000	CCF69	30	\$1.300.000	\$90.500	14-23	30	\$1.300.000	\$90.500
4	CC 74810083	BOHORQUEZ CUESTA WILSON URIEL	23101	14		\$606.667	EPSC25	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
5	CC 74810261	DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	25-14	14		\$606.667	EPSC25	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
6	CC 23623475	GARNICA GUERRERO MARCELA ALEXANDRA	23001	14		\$606.667	EPSC25	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
7	CC 74810558	OLIVOS ROMERO JUAN FERNANDO	23001	14		\$606.667	EP5041	14		\$606.667	\$24.300	CCF69	14		\$606.667	14-23	14	\$606.667
Total Afiliados(7)					\$4,940,002	\$790,600			\$4,940,002	\$197,800			\$4,940,002	\$197,800			\$4,940,002	\$344,300
																		\$0

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$790,600	\$0	\$0	\$790,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$305,100	\$0	\$0	\$305,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$344,300	\$0	\$0	\$344,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$344,300	\$0	\$0	\$344,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$197,800	\$0	\$0	\$197,800
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	\$197,800	\$0	\$0	\$197,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$197,800	\$0	\$0	\$197,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$24,300	\$0	\$0	\$24,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL				7	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500

Espacio para
Logo Corporativo

V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
NIT 900.021.702-7
BARRIO EL PARAISO CASA No. 37
ESQUINA
Tel: (608) 3112870979
Sabanalarga - Colombia
lbohorquez33@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 20

Señores	MUNICIPIO DE SABANALARGA		
NIT	891.857.823-6	Teléfono	(608) 6245006
Dirección	Carrera 7 No. 5-29	Ciudad	Sabanalarga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 08:17
Expedición	30/12/2024, 08:17
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 334 DE 2024	1.00	52,030,330.00	52,030,330.00	0.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y dos millones treinta mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 52,030,330.00

Observaciones:

Total Bruto	52,030,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	52,030,330.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086289545 aprobado en 20241228 prefijo FE desde el número 20 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10*1000
CUFE: 976e7a37be19224073aaa090585fc58b6445b2bd9213eb665ae19eb5f6c7e814bd3e2fed6da756f3ba4e9653f8a1a7c0
