

**VEGA FORERO INGENIERIA SAS**

NIT 900999942-5

calle 7 carrera 1A esquina, Pitalito, Huila,

Tel: +573212118447

vegaforeroingenieria@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**No. FESV4**

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Municipio de Pitalito	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	30/12/2024
DIRECCIÓN	Cra 3 No 4-78, Colombia, Pitalito, Huila, 417030	FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2024
TELÉFONO	8360010	NIT	891180077-0

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	COSTO DIRECTO	Unidad	\$44.999.480	1		\$44.999.480
2	ADMINISTRACION	Unidad	\$12.149.859	1		\$12.149.859
3	UTILIDAD	Unidad	\$1.349.984	1		\$1.349.984



Moneda: COP

Generado: 2024-12-30 19:13:14-05:00

Validación DIAN: 2024-12-30 19:14:16-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Instrumento no definido

Contrato No MP-SGIS-MC-OP-051-2024 Cuyo objeto es
"REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION
DE BASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE
CALAMO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO

CUFE: 8d968d70683791bc046c473db6f3d6abc48def59d38b1ad5b1d8cdea3d3358e1d6391b0dd89bd25189edc20da4150b68

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal \$58.499.323

Total \$58.499.323

Total de líneas: 3



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764086246947 de 2024-12-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FESV1 hasta FESV10 con vigencia hasta 2026-12-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Certificado Bancario

Martes, 29 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VEGA FORERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900999942, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45368182811	2016/11/11	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONTRATO DE OBRA No. MP-SGIS-MC-OP-051-2024

**OBJETO: REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION
DEBASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO EN EL
MUNICIPIO DE PITALITO**

INFORME FINAL

**DICIEMBRE
2024**



+ (57) 321 -211 8447
@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com
@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCION.....	3
PROCESO 0020 de 2024:	3
LOCALIZACION:.....	3
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	4
ALCANCE DEL CONTRATO	5
ESTADO DE LA EDIFICACION ANTES DEL MANTENIMIENTO:.....	5
ACTIVIDADES EJECUTADAS.	5
AVANCE FÍSICO.....	7
BALANCE ECONÓMICO.....	8
AVANCE EN TIEMPO.....	9
GARANTÍAS DEL CONTRATO	9
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	11



+(57) 321 -211 8447
@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com
@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre y 30 de diciembre de 2024 durante el desarrollo de las actividades inherentes al contrato de obra **MP-SGIS-MC-OP-051-2024** suscrito entre la **ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA** y **VEGA FORERO INGENIERIA SAS** y que tiene por objeto **REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION DEBASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO ENEL MUNICIPIO DE PITALITO**

DESCRIPCION

PROCESO MP-SGIS-MC-OP-051-2024

El Municipio de Pitalito en el plan de desarrollo denominado el gobierno de la gente 2024 2027 dentro del municipio de Pitalito existe una meta la cual es “**plaza de mercado mantenida**”. El principal componente es **REALIZAR MANUTENCION DE LA PLAZA DE MERCADO**.

Que la alcaldía de municipio de Pitalito es la entidad encargada de administrar el correcto funcionamiento de la plaza mercado minorista de Cálamo, cómo consta en el acuerdo 058 2008 “por medio del cual se autoriza alcalde para recibir de Empitalito ESP, el programa de la galería municipal.

Que para el adecuado funcionamiento de la plaza de mercado es necesario contratar los servicios para la rehabilitación de la zona de acceso del centro de disposición de basuras o chut de basuras lo cual permite mejorar de manera notoria el control de basuras arrojadas día a día por los comerciantes y residentes de los alrededores de la galería evitando la comunicación de basuras los malos olores y permitiendo el acceso del carro recolector de basura.

Que la secretaría de gobierno inclusión social en áreas cumplimiento a las múltiples obligaciones señaladas por la ley especialmente las relacionadas con las prestaciones de servicios públicos esenciales, con el fin de propiciar una plaza de mercado mantenida en óptimas condiciones, garantizando las diferencias acciones a que haya lugar la administración municipal, determina la necesidad y justifica la contratación de los bienes y servicios necesarios para realizar rehabilitación, cerramiento y mantenimiento del centro disposición de basuras de plaza mercado minorista de cálamo

LOCALIZACION:

La ejecución del contrato **MP-SGIS-MC-OP-051-2024** de acuerdo a los estudios previos, se realizó en el municipio de Pitalito – Huila, en la plaza de mercado minorista de Cálamo, sector Shut de Basuras



Ilustración 1: Ubicación Municipio de Pitalito en Colombia



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

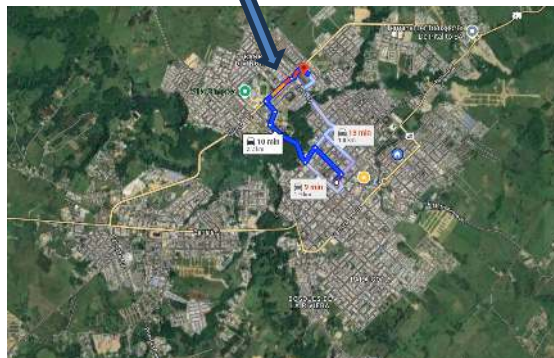


Ilustración 2: Ubicación Galería desde el Edificio la Chapolera

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Municipio de Pitalito, Huila
TIPO DE PROCESO	Selección de mínima cuantía MP-SGIS-MC-OP-051-2024
CONTRATO No.:	MP-SGIS-MC-OP-051-2024
FECHA DE FIRMA:	5 de diciembre de 2024
OBJETO:	Rehabilitación del acceso al centro de disposición de basuras de la plaza de mercado minorista de Calamo en el municipio de Pitalito
VALOR INICIAL:	Cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta mil Trescientos veintitres pesos Mcte (\$46.840.323)
VALOR ADICION	Once Millones seiscientos cincuenta y nueve mil pesos Mcte(\$ 11.659.000)
VALOR TOTAL:	Cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil trecientos veinte tres pesos mcte (\$ 58'499.323)
PLAZO INICIAL:	Cincuenta (50) días contados a partir de la suscripción Del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
PLAZO FINAL	Cincuenta (50) días contados a partir de la suscripción Del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
CONTRATISTA:	Vega Forero Ingeniería S.A.S. Nit: 900.999.942 – 5 R.l.: ing. Alejandro vega forero c.c. No. 1.094.914.167 de Armenia – Quindío
SUPERVISOR	Dr Francisco Javier Cardozo Tovar Secretario de Gobierno e inclusión Social
ANTICIPO:	0.00%
FECHA DE INICIACIÓN:	5 de diciembre de 2024
FECHA OTRO SI No 1	28 de diciembre de 2024



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:		Pitalito, Huila

ALCANCE DEL CONTRATO

ESTADO DE LA EDIFICACION ANTES DEL MANTENIMIENTO:

Una vez realizado el acta de inicio se realizo recorrido de obra con el SUPERVISOR DEL CONTRATO donde se encontró que en el lugar proliferaban los malos olores y las disposición de basuras de todo tipo tanto de usuarios de galería como externos a ellas, un suelo de placa en mal estado con fisuras y grietas de gran Tamaño.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El alcance del contrato es realizar la rehabilitación del acceso al shut de basuras, es por tanto que se realizaron las siguientes actividades:

1,0	PRELIMINARES
1,1	Trazado, localización y replanteo de la placa.
1,2	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
2,1	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm
2,2	Demolición de bordillo en concreto
2,3	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos
2,4	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3,1	Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR
3,2	Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR
3,3	Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.
3,4	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo
4	ITEMS NO PREVISTOS
4,1	Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno
4,2	Portón de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

CANTIDADES (PRESUPUESTO) EJECUTADAS

Las actividades iniciales del Contrato son las siguientes:

				CONDICIONES ORIGINALES			
N°	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	171,62	\$ 2.016,00	\$ 345.986
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	50,04	\$ 26.000,00	\$ 1.301.040
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	171,62	\$ 19.016,00	\$ 3.263.526
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	25,88	\$ 5.736,00	\$ 148.448
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	26,52	\$ 41.400,00	\$ 1.097.928
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	73,46	\$ 31.500,00	\$ 2.313.990
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 27.560.100
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compatación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	34,32	\$ 45.000,00	\$ 1.544.400
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compatación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	33,46	\$ 133.000,00	\$ 4.450.180
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidraulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diametro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diametro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	30,89	\$ 638.000,00	\$ 19.707.820
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	28,58	\$ 65.000,00	\$ 1.857.700
SUBTOTAL OBRAS							\$ 36.031.018
			ADMINISTRACION		27%		\$ 9.728.375
			UTILIDAD		3%		\$ 1.080.930
			VALOR TOTAL A.I.U				\$ 10.809.305
			VALOR TOTAL				\$ 46.840.323

Durante la ejecución del Contrato se tuvieron necesidades que generaron adicionar recursos al contrato y realizar un acta de modificación, de Mayores y Menores Cantidades e ítems nuevos, con la creación de Ítems No Previstos, teniendo unas actividades y cantidades finales de la siguiente manera:

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

N°	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	\$ 2.016,00	171,62	\$ 345.986
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	\$ 26.000,00	50,04	\$ 1.301.040
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	\$ 19.016,00	171,62	\$ 3.263.526
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	\$ 5.736,00	25,88	\$ 148.448
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	\$ 41.400,00	26,52	\$ 1.097.928
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	\$ 31.500,00	73,46	\$ 2.313.990
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 27.522.400
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 45.000,00	34,32	\$ 1.544.400
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 133.000,00	33,46	\$ 4.450.180
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	\$ 638.000,00	30,89	\$ 19.707.820
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	\$ 65.000,00	28	\$ 1.820.000
4	ITEMS NO PREVISTOS						\$ 9.006.162
4,1			Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	\$ 250.000,00	28,02	\$ 7.006.162
4,2			Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	\$ 250.000,00	8	\$ 2.000.000
SUBTOTAL OBRAS							\$ 44.999.480
			ADMINISTRACION				\$ 12.149.859
			UTILIDAD				\$ 1.349.984
			VALOR TOTAL A.I.U				\$ 13.499.844
			VALOR TOTAL				\$ 58.499.323

AVANCE FÍSICO

Se realizaron todas las actividades contratadas teniendo un Avance Físico del 100 %, como se referencia en la siguiente tabla.

N°	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	%
	GENERAL	PARTICULAR				
1,0	PRELIMINARES					100%
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	171,62	100%
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	50,04	100%
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES					100%
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	171,62	100%



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	25,88	100%
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	26,52	100%
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	73,46	100%
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					100%
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	34,32	100%
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	33,46	100%
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	30,89	100%
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	28	100%
4	ITEMS NO PREVISTOS					100%
4,1			Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	28,02	100%
4,2			Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	8	100%

BALANCE ECONÓMICO

Al realizar el Balance Económico del contrato, se determina que las actividades proyectadas y programadas en el contrato fueron ejecutadas al 100 %.

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
	GENERAL	PARTICULAR							
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026	100%	\$ -
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	\$ 2.016,00	171,62	\$ 345.986	100%	\$ -
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	\$ 26.000,00	50,04	\$ 1.301.040	100%	\$ -
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892	100%	\$ -
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	\$ 19.016,00	171,62	\$ 3.263.526	100%	\$ -
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	\$ 5.736,00	25,88	\$ 148.448	100%	\$ -
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	\$ 41.400,00	26,52	\$ 1.097.928	100%	\$ -
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	\$ 31.500,00	73,46	\$ 2.313.990	100%	\$ -
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 27.522.400	100%	\$ -
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 45.000,00	34,32	\$ 1.544.400	100%	\$ -
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la	m³	\$ 133.000,00	33,46	\$ 4.450.180	100%	\$ -

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

			especificación invías Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR						
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	\$ 638.000,00	30,89	\$ 19.707.820	100%	\$ -
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	\$ 65.000,00	28	\$ 1.820.000	100%	\$ -
4	ITEMS NO PREVISTOS						\$ 9.006.162	100%	\$ -
4,1			Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	\$ 250.000,00	28,02	\$ 7.006.162	100%	\$ -
4,2			Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	\$ 250.000,00	8	\$ 2.000.000	100%	\$ -
SUBTOTAL OBRAS							\$ 44.999.480	100%	\$ -
			ADMINISTRACION				\$ 12.149.859		
			UTILIDAD				\$ 1.349.984		
			VALOR TOTAL A.I.U				\$ 13.499.844		
			VALOR TOTAL				\$ 58.499.323	100%	\$ -

AVANCE EN TIEMPO

El contrato tiene Acta de inicio del 5 de diciembre de 2024 y con fecha de terminación el 30 de diciembre de 2024. El presente informe Final se realiza el día 30 de diciembre de 2024, teniendo un tiempo de ejecución final de 25 días calendario. El contrato se ejecuta con un 100.00% del tiempo contractual.

FECHA DE ACTA DE INICIO	5 de diciembre de 2024
FECHA OTRO SI	28 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024
FECHA DE ENTREGA	30 de diciembre de 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

El contrato tiene la siguiente Cronología con las Pólizas de Garantía:



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN			
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 0	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/11/2024	15/07/2025	\$ 9.368.064,60
PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	15/01/2028	\$ 9.368.064,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/01/2025	15/01/2028	\$ 9.368.064,60
No. PÓLIZA		CHU – 100006843 – Anexo 0	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL	26/11/2024	15/01/2025	\$ 260.000.000,00

PÓLIZAS DEL ACTA DE INICIO			
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 2	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	5/12/2024	24/07/2025	\$ 9.368.064,60
PRESTACIONES SOCIALES	5/12/2024	24/01/2028	\$ 9.368.064,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/01/2025	24/01/2028	\$ 9.368.064,60
No. PÓLIZA		CHU – 100006843 – Anexo 2	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL	5/12/2024	24/01/2025	\$ 260.000.000,00

PÓLIZAS DEL OTRO SI			
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 3	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	5/12/2024	24/07/2025	\$ 11.699.864,60
PRESTACIONES SOCIALES	5/12/2024	24/01/2028	\$ 11.699.864,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/01/2025	24/01/2028	\$ 11.699.864,60
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 2	
NOMBRE DEL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

AMPARO			ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL	5/12/2024	24/01/2025	\$ 260.000.000,00

PÓLIZAS DEL ACTA DE TERMINACION			
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 4	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	5/12/2024	24/07/2025	\$ 11.699.864,60
PRESTACIONES SOCIALES	5/12/2024	24/01/2028	\$ 11.699.864,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/01/2025	24/01/2028	\$ 11.699.864,60
No. PÓLIZA		CHU – 100035598 – Anexo 3	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL	5/12/2024	24/01/2025	\$ 260.000.000,00

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se recomienda realizar lavado continuo de la placa de concreto teniendo en cuenta que estará expuesta a lixiviados constantemente, así mismo poner en funcionamiento la placa el día 17 de enero de 2025, día en el cual la resistencia del concreto de placa cumple los 28 días. Así mismo se recomienda un mantenimiento con pintura preventivo del cerramiento teniendo en cuenta que al estar expuesto a materiales como basura y un ambiente agresivo esta presentara un desgaste mayor.



JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
C.C. 1.094.914.167



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

REGISTROS FOTOGRAFICOS



Fotografía 1: Estado Inicial del lugar de la obra. .



Fotografía 2: Estado inicial del acceso al Shut de basuras de la Galería



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 3. Cerramiento en Tela Verde- Costado Zorras.



Fotografía 4. Cerramiento en tela verde - costado Avenida circunvalar



Fotografía 5: Demolición de placa de concreto



+ (57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 6: Demolición de placa y retiro de escombros.



Fotografía 7. Excavación mecánica



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 8: Retiro de material proveniente de excavación.



Fotografía 9: Suministro de Material de Afirmado



+(57) 321 -211 8447
@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com
@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 10. Instalación de Material de afirmado



Fotografía 11. Compactación de material de afirmado



+(57) 321 -211 8447



vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 12. Instalación de subbase



Fotografía 13. Instalación de concreto MR 39



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria




VEGA FORERO

INGENIERIA SAE



Fotografía 14. Placa de concreto de 18cm de espesor- Acero de refuerzo para Bordillo sobre placa

ANEXOS

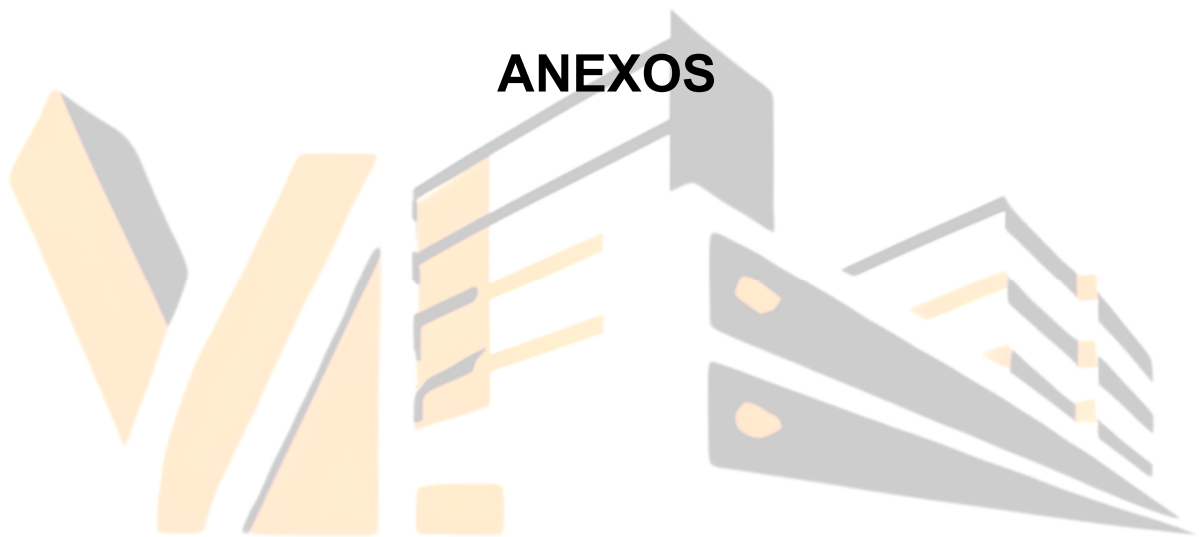

+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria



VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL



+(57) 321 -211 8447



@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria





RAZÓN SOCIAL :	RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121882541
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31996797
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31996797
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094914167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	32003575
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32003575
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2025
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32004169
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32004169
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000	\$ 206.000
Subtotal Salud		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000	\$ 206.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.800	\$ 131.800
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.800	\$ 131.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000	\$ 33.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.200	\$ 601.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

11/02/2025

VEGA FORERO

INGENIERIA SAE

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1'094.914.167 de Armenia, Quindío, en mi condición de representante legal de VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 900.999.942 – 5, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS— los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP— las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—.

En constancia, se firma en Pitalito – Huila, a los 30 días del mes de Diciembre de 2024.



JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L. VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S



+(57) 321 -211 8447

@vegaforeroingenieria



vegaforeroingenieria@gmail.com

@vegaforeroingenieria

